

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidades de asignación	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CONTRATO DE OBRA -IDU 2407-2024**		**$ 14.164.344.902,38**	**280 días**	**lun 20/01/25**	**jue 22/01/26**	
2		Inicio Contrato		$ 0,00	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	
3		**2. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE OBRA**		**$ 0,00**	**26 días**	**lun 20/01/25**	**jue 20/02/25**	
4		PRESENTACION , REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA		$ 0,00	4 días	lun 20/01/25	jue 23/01/25	2
5		DESGLOSE AIU Y APU CONTRACTUALES		$ 0,00	4 días	lun 20/01/25	jue 23/01/25	4CC
6		CRONOGRAMA DEL PROYECTO		$ 0,00	4 días	lun 20/01/25	jue 23/01/25	5CC
7		ENTREGA PMT		$ 0,00	4 días	lun 20/01/25	jue 23/01/25	6CC
8		RELACION DE EQUIPO MINIMO		$ 0,00	4 días	lun 20/01/25	jue 23/01/25	7CC
9		VISITA DE INICIO CON LOS ESPECIALISTAS		$ 0,00	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	8CC
10		ENTREGA PLAN DE CALIDAD		$ 0,00	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	9CC+9 días
11		20 % DEL INVENTARIO DE DAÑOS		$ 0,00	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	10CC
12		PLAN DE DIALOGO CIUDADANO		$ 0,00	1 día	jue 30/01/25	vie 31/01/25	11CC
13		ENTREGA DEL MAO A INTERVENTORIA		$ 0,00	4 días	jue 30/01/25	mar 4/02/25	12CC
14		RADICACION MAO AL IDU		$ 0,00	1 día	jue 20/02/25	jue 20/02/25	13FC+12 días
15		APERTURA DEL PIN		$ 0,00	1 día	jue 20/02/25	jue 20/02/25	14CC
16		**INICIO ETAPA DE OBRA**		**$ 14.164.344.902,38**	**280 días**	**lun 20/01/25**	**jue 22/01/26**	
17		Inicio Etapa de Obra		$ 0,00	0 días	mié 5/03/25	mié 5/03/25	15FC+10 días
18		**ETAPA DE OBRA**		**$ 14.164.344.902,38**	**280 días**	**lun 20/01/25**	**jue 22/01/26**	
19		SUBTOTAL COSTOS DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO		$ 0,00	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	
20		COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ACTIVIDADES DE OBRA		$ 0,00	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	
21		COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR		$ 0,00	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	
22		ACTIVIDADES DE ACERO		$ 0,00	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	21CC
23		VALOR PARA EL FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA		$ 0,00	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	22CC
24		**CARRERA 15**		**$ 1.679.748.347,93**	**181 días**	**mié 2/04/25**	**vie 28/11/25**	
25		PK 503753		$ 42.718.757,28	14 días	mié 2/04/25	mar 22/04/25	17CC+20 días
26		PK 525176		$ 70.617.791,42	16 días	mar 22/04/25	mar 13/05/25	25
27		PK 525185		$ 6.172.277,18	3 días	mié 14/05/25	vie 16/05/25	26
28		PK 525188		$ 2.328.216,00	3 días	sáb 17/05/25	mié 21/05/25	27
29		PK 525194		$ 41.955.196,07	6 días	mié 21/05/25	mié 28/05/25	28
30		PK 525199		$ 31.347.686,96	6 días	jue 29/05/25	vie 6/06/25	29
31		PK 525203		$ 28.763.723,43	8 días	vie 6/06/25	mar 17/06/25	30
32		PK 525204		$ 17.526.924,22	10 días	mar 17/06/25	mié 2/07/25	31
33		PK 525208		$ 3.195.253,71	6 días	vie 6/06/25	vie 13/06/25	31CC
34		PK 525209		$ 8.298.107,86	6 días	vie 6/06/25	vie 13/06/25	33CC

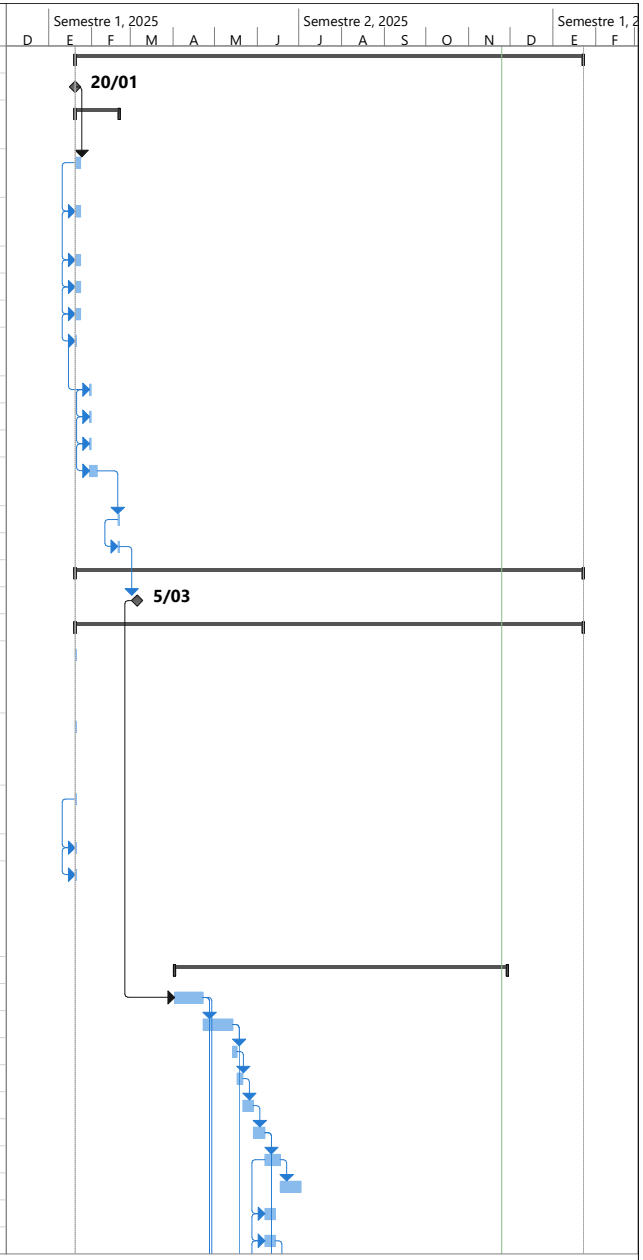

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: mar 25/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidades de asignación	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
35		PK 525220		$ 47.730.004,16	14 días	sáb 14/06/25	vie 4/07/25	34
36		PK 525223		$ 38.100.947,77	10 días	sáb 14/06/25	vie 27/06/25	35CC
37		PK 525226		$ 77.550.408,67	18 días	sáb 28/06/25	mar 22/07/25	36
38		PK 525231		$ 18.733.430,41	12 días	sáb 28/06/25	mar 15/07/25	37CC
39		PK 525239		$ 74.269.533,08	16 días	sáb 28/06/25	sáb 19/07/25	38CC
40		PK 525244		$ 16.160.245,40	14 días	lun 21/07/25	mié 6/08/25	39
41		PK 525270		$ 8.989.862,46	10 días	lun 21/07/25	vie 1/08/25	40CC
42		PK 525275		$ 16.858.454,81	8 días	vie 1/08/25	mié 13/08/25	41
43		PK 525276		$ 4.370.678,42	4 días	vie 1/08/25	mié 6/08/25	42CC
44		PK 525284		$ 16.153.432,73	4 días	vie 8/08/25	mié 13/08/25	43
45		PK 92053224		$ 13.795.258,53	4 días	vie 8/08/25	mié 13/08/25	44CC
46		PK 92053882		$ 4.350.879,24	6 días	mié 13/08/25	jue 21/08/25	45
47		PK 92073675		$ 46.120.306,60	3 días	mié 13/08/25	sáb 16/08/25	46CC
48		PK 92073999		$ 14.213.901,76	10 días	mar 19/08/25	sáb 30/08/25	47
49		PK 92074023		$ 15.356.860,72	7 días	mar 19/08/25	mié 27/08/25	48CC
50		PK 92074024		$ 223.661,79	1 día	mié 27/08/25	jue 28/08/25	49
51		PK 92074744		$ 53.329.998,13	6 días	jue 28/08/25	jue 4/09/25	50
52		PK 92074745		$ 33.844.061,58	3 días	jue 28/08/25	lun 1/09/25	51CC
53		PK 525225		$ 120.906.614,97	21 días	mar 2/09/25	sáb 27/09/25	52
54		PK 525230		$ 58.879.871,31	14 días	lun 29/09/25	jue 16/10/25	53
55		PK 525248		$ 14.849.311,14	4 días	vie 17/10/25	mié 22/10/25	54
56		PK 92074001		$ 20.184.362,22	5 días	mié 22/10/25	mar 28/10/25	55
57		PK 92074000		$ 12.394.586,42	4 días	mié 29/10/25	lun 3/11/25	56
58		PK 525284		$ 11.544.180,28	4 días	lun 3/11/25	vie 7/11/25	57
59		PK 525279		$ 17.202.019,15	5 días	vie 7/11/25	jue 13/11/25	58
60		PK525243		$ 13.836.894,89	4 días	vie 14/11/25	mié 19/11/25	59
61		PK 92073981		$ 35.587.274,44	7 días	mar 2/09/25	mié 10/09/25	53CC
62		PK 24130647		$ 70.078.612,51	16 días	mié 10/09/25	mar 30/09/25	61
63		PK 525274		$ 21.695.718,66	5 días	mié 1/10/25	mar 7/10/25	62
64		PK 525198		$ 57.074.709,62	9 días	mar 7/10/25	lun 20/10/25	63
65		PK 525180		$ 24.189.858,63	4 días	lun 20/10/25	vie 24/10/25	64
66		PK 24133980		$ 5.536.708,76	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25	65
67		PK 525222		$ 74.454.784,65	14 días	mar 28/10/25	jue 13/11/25	66
68		PK 525235		$ 45.327.094,63	7 días	vie 14/11/25	sáb 22/11/25	67
69		PK 525213		$ 20.152.577,31	3 días	lun 24/11/25	mié 26/11/25	68
70		PK 703491		$ 50.258.865,59	7 días	mar 2/09/25	mié 10/09/25	61CC
71		PK 92053882		$ 14.271.124,66	4 días	mié 10/09/25	lun 15/09/25	70
72		PK 525194		$ 607.040,39	2 días	mar 16/09/25	mié 17/09/25	71
73		PK 92053879		$ 1.058.656,48	2 días	jue 18/09/25	vie 19/09/25	72
74		PK 3582		$ 236.169,44	2 días	sáb 20/09/25	mar 23/09/25	73
75		PK 525226		$ 518.579,50	1 día	mar 23/09/25	mié 24/09/25	74
76		PK 525185		$ 1.253.735,17	2 días	mié 24/09/25	vie 26/09/25	75
77		PK 525203		$ 29.233.764,34	6 días	vie 26/09/25	vie 3/10/25	76
78		PK 525208		$ 13.377.865,32	4 días	sáb 4/10/25	jue 9/10/25	77
79		PK 92074022		$ 94.287,18	1 día	jue 9/10/25	vie 10/10/25	78

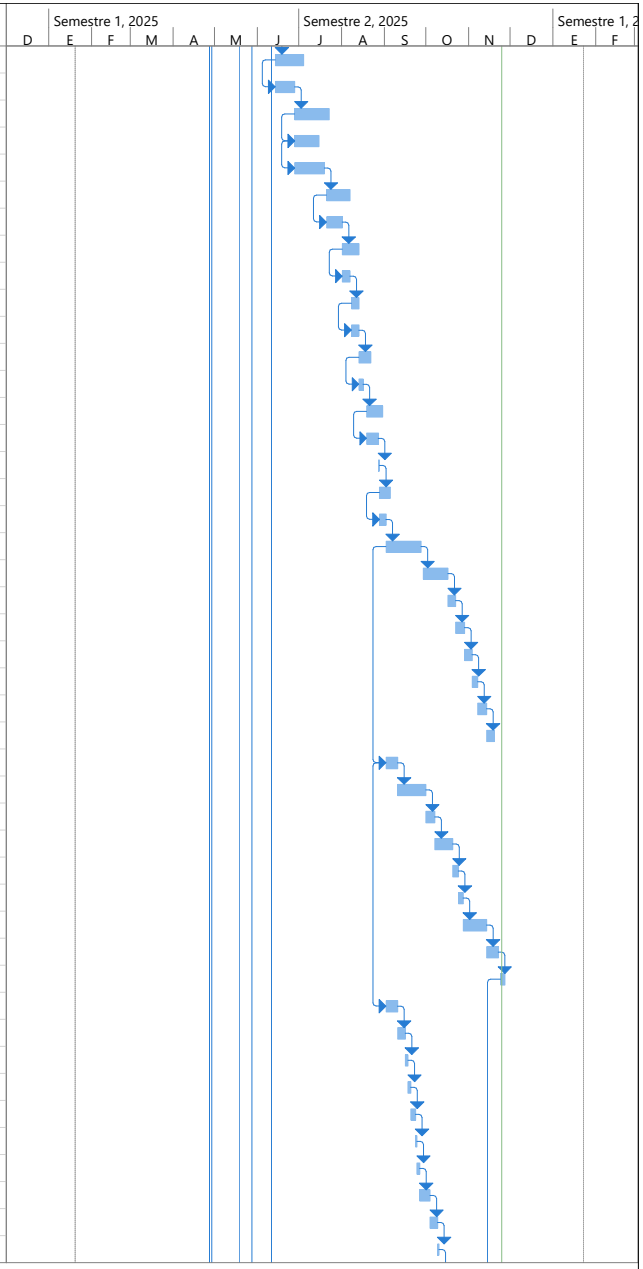

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: mar 25/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidades de asignación	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
80		PK92074023		$ 3.233.574,21	2 días	vie 10/10/25	mar 14/10/25	79
81		PK 525204		$ 339.433,86	2 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	80
82		PK 92074025		$ 321.262,25	2 días	vie 17/10/25	lun 20/10/25	81
83		PK 92074675		$ 54.719.118,74	9 días	lun 20/10/25	jue 30/10/25	82
84		PK 525186		$ 26.681.353,54	5 días	vie 31/10/25	jue 6/11/25	83
85		PK 525193		$ 13.528.473,22	5 días	jue 6/11/25	mié 12/11/25	84
86		PK 138904		$ 19.860.492,28	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	69CC
87		PK 138905		$ 20.682.050,46	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	86
88		PK 138906		$ 12.996.838,72	1 día	mié 26/11/25	mié 26/11/25	87
89		PK 525202		$ 7.281.549,37	1 día	jue 27/11/25	jue 27/11/25	88
90		PK 525200		$ 4.668.393,76	1 día	vie 28/11/25	vie 28/11/25	89
91		PK 525184		$ 27.554.679,47	3 días	mar 25/11/25	jue 27/11/25	87CC
92		**CARREA 73A**		**$ 322.380.174,12**	**16 días**	**vie 6/06/25**	**vie 27/06/25**	
93		PK 34012250		$ 29.356.207,94	5 días	vie 6/06/25	jue 12/06/25	34CC
94		PK 34012247		$ 4.801.532,98	5 días	vie 6/06/25	jue 12/06/25	93CC
95		PK 34012246		$ 59.165.218,60	5 días	vie 13/06/25	jue 19/06/25	94
96		PK 34012245		$ 84.116.415,13	3 días	vie 13/06/25	mar 17/06/25	95CC
97		PK 160085		$ 5.333.473,24	3 días	mar 17/06/25	vie 20/06/25	96
98		PK 91017697		$ 16.397.194,80	5 días	mar 17/06/25	mar 24/06/25	97CC
99		PK 160089		$ 123.210.131,43	3 días	mié 25/06/25	vie 27/06/25	98
100		**CARRERA 13**		**$ 225.849.632,94**	**23 días**	**mar 29/04/25**	**mié 28/05/25**	
101		CIV 2001243 - PK 504275		$ 92.854.569,27	8 días	mar 29/04/25	vie 9/05/25	25FC+5 días
102		CIV 2001224 - PK 504278		$ 25.231.740,61	5 días	vie 9/05/25	jue 15/05/25	101
103		CIV 2001214 - PK 504281		$ 107.763.323,06	10 días	vie 16/05/25	mié 28/05/25	102
104		**AV CIUDAD DE CALI**		**$ 4.390.313.040,06**	**278 días**	**lun 20/01/25**	**mar 20/01/2**	
105		CIV 11005562 - PK 518632		$ 58.262.333,52	12 días	mar 22/04/25	jue 8/05/25	25
106		CIV 11014833 - PK 91038804		$ 7.092.345,90	4 días	mar 22/04/25	sáb 26/04/25	105CC
107		CIV 11014834 - PK 91038808		$ 24.960.934,80	6 días	lun 28/04/25	mar 6/05/25	106
108		CIV 11014835 - PK 91038812		$ 5.230.736,60	4 días	mar 6/05/25	sáb 10/05/25	107
109		CIV 11014835 - PK 91038814		$ 18.182.062,60	6 días	lun 28/04/25	mar 6/05/25	106
110		CIV 11007244 - PK 91038815		$ 172.509.890,00	26 días	mar 6/05/25	lun 9/06/25	109
111		CIV 11004808 - PK 92051264		$ 73.381.902,20	12 días	mar 10/06/25	mié 25/06/25	110
112		CIV 11007371 - PK 92058203		$ 93.992.432,80	14 días	jue 26/06/25	mar 15/07/25	111
113		CIV 11007470 - PK 92058206		$ 15.332.029,40	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25	109CC
114		CIV 11005964 - PK 92070062		$ 63.446.668,20	12 días	vie 2/05/25	vie 16/05/25	113
115		CIV 11014698 - PK 92084141		$ 93.336.361,10	20 días	sáb 17/05/25	jue 12/06/25	114
116		CIV 11014698 - PK 92084142		$ 30.616.198,20	7 días	vie 13/06/25	sáb 21/06/25	115
117		CIV 11014720 - PK 92084487		$ 160.381.440,40	26 días	mar 24/06/25	lun 28/07/25	116
118		CIV 11007244 - PK 24136236		$ 91.107.951,56	12 días	mar 24/06/25	mié 9/07/25	117CC
119		CIV 11014835 - PK 34010968		$ 9.771.916,31	2 días	jue 10/07/25	vie 11/07/25	118
120		CIV 11014836 - PK 34010979		$ 6.197.468,84	2 días	jue 10/07/25	vie 11/07/25	119CC
121		CIV 11007371 - PK 34010982		$ 24.217.273,50	1 día	sáb 12/07/25	lun 14/07/25	120
122		CIV 11007470 - PK 34010983		$ 18.799.953,72	1 día	lun 14/07/25	mar 15/07/25	121
123		CIV 11014698 - PK 34013855		$ 74.948.259,94	3 días	mar 15/07/25	vie 18/07/25	122
124		CIV 11014833 - PK 34014378		$ 56.105.582,07	3 días	vie 18/07/25	mar 22/07/25	123

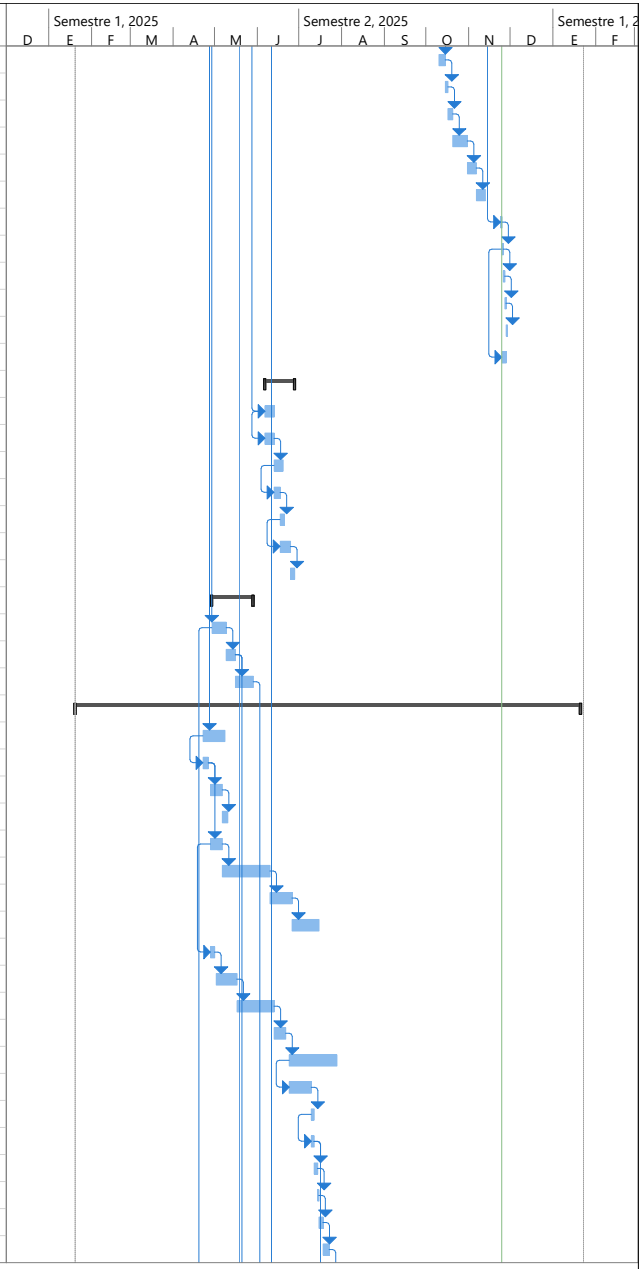

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: mar 25/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidades de asignación	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
125		CIV 11014834 - PK 34014380		$ 22.663.699,50	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	124
126		CIV 11014702 - PK 34011952		$ 8.827.503,55	1 día	mié 23/07/25	mié 23/07/25	125CC
127		CIV 11014702- PK 34013860		$ 67.208.711,41	4 días	jue 24/07/25	mar 29/07/25	126
128		CIV 11007470 - PK 92058205		$ 16.143.341,40	4 días	sáb 12/07/25	jue 17/07/25	120
129		PK 518624		$ 69.540.766,00	9 días	mar 29/07/25	lun 11/08/25	127
130		CIV 11005964 - PK 518599		$ 26.269.865,90	18 días	sáb 12/07/25	lun 4/08/25	128CC
131		CIV 11005562 - PK 518624		$ 13.095.861,70	12 días	mar 5/08/25	jue 21/08/25	130
132		CIV 11004808 - PK 92073595		$ 11.043.621,60	2 días	vie 22/08/25	lun 25/08/25	131
133		CIV 11014720 - PK 92084489		$ 198.812.093,70	24 días	mar 5/08/25	vie 5/09/25	131CC
134		CIV 11004808 - PK 24137169		$ 43.711.832,99	2 días	lun 11/08/25	mié 13/08/25	129
135		CIV 11005562 - PK 24137167		$ 42.390.276,99	2 días	mié 13/08/25	vie 15/08/25	134
136		CIV 11014720 - PK 34013983		$ 12.948.811,06	1 día	vie 15/08/25	sáb 16/08/25	135
137		CIV 11001649 - PK 518844		$ 23.383.373,27	1 día	mar 19/08/25	mar 19/08/25	136
138		CIV 11014833 - PK 34014377		$ 46.479.119,64	2 días	mié 20/08/25	jue 21/08/25	137
139		CIV 11014834 - PK 34014379		$ 3.573.604,63	1 día	vie 22/08/25	vie 22/08/25	138
140		CIV 11004808 - PK 24137461		$ 13.481.305,70	1 día	sáb 23/08/25	lun 25/08/25	139
141		CIV 11014720- PK 34013982		$ 41.949.390,68	2 días	lun 25/08/25	mié 27/08/25	140
142		CIV 11001783 - PK 24137174		$ 23.069.280,40	1 día	mié 27/08/25	jue 28/08/25	141
143		CIV 11001783 - PK 34012163		$ 10.446.162,89	1 día	jue 28/08/25	vie 29/08/25	142
144		CIV 11014835 - PK 34014381		$ 16.007.893,60	1 día	vie 29/08/25	sáb 30/08/25	143
145		CIV 11014836 - PK 34014382		$ 11.975.830,17	1 día	lun 1/09/25	lun 1/09/25	144
146		CIV 11014720 - PK 92084488		$ 5.585.745,10	4 días	sáb 6/09/25	jue 11/09/25	133
147		CIV 11014836 - PK 91034581		$ 98.103.646,91	2 días	jue 11/09/25	sáb 13/09/25	146
148		CIV 11007268 -PK 172104		$ 50.587.517,37	8 días	lun 15/09/25	mié 24/09/25	147
149		CIV 11014513 - PK 903359		$ 58.412.337,97	11 días	mié 24/09/25	mié 8/10/25	148
150		CIV 11014510 - PK 24130738		$ 34.436.776,19	8 días	mié 8/10/25	lun 20/10/25	149
151		CIV 11014498- PK 24130736		$ 6.037.679,03	3 días	lun 20/10/25	jue 23/10/25	150
152		CIV 11014498 - PK 34011069		$ 11.965.216,45	4 días	jue 23/10/25	mar 28/10/25	151
153		CIV 11014515 - PK 518850		$ 14.619.337,68	4 días	mié 29/10/25	lun 3/11/25	152
154		CIV 11001649 - PK 34011093		$ 34.436.776,19	9 días	lun 3/11/25	jue 13/11/25	153
155		CIV 11001783- PK 24137182		$ 37.111.630,84	9 días	vie 14/11/25	mar 25/11/25	154
156		CIV 11014515- PK 34011094		$ 12.628.747,15	4 días	mié 26/11/25	lun 1/12/25	155
157		CIV 11014498- PK 24130728		$ 23.997.233,45	8 días	lun 1/12/25	mié 10/12/25	156
158		CIV 11014520 - PK 24130741		$ 35.896.542,87	9 días	jue 11/12/25	lun 22/12/25	157
159		CIV 11015964 - PK 518606		$ 78.097.070,43	10 días	mar 23/12/25	sáb 3/01/26	158
160		CIV 11001783 - PK 518843		$ 15.456.494,80	1 día	mié 8/10/25	jue 9/10/25	150CC
161		CIV 11001649 - PK 92062429		$ 60.707.815,00	2 días	jue 9/10/25	sáb 11/10/25	160
162		CIV 11014515 -PK 92062434		$ 39.857.496,40	2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25	161
163		CIV 11014498 - PK 24131428		$ 67.467.301,80	4 días	jue 16/10/25	mar 21/10/25	162
164		CIV 11014520 - PK 92081887		$ 7.879.186,40	1 día	mar 21/10/25	mié 22/10/25	163
165		CIV 11014513 - PK 903360		$ 157.521.643,70	6 días	mié 22/10/25	mié 29/10/25	164
166		CIV 11014510 - PK 92062435		$ 94.775.494,60	4 días	jue 30/10/25	mar 4/11/25	165
167		CIV 11014515- PK 92062432		$ 7.983.896,10	1 día	mar 4/11/25	mié 5/11/25	166
168		CIV 11014515 - PK 92062433		$ 32.329.111,70	2 días	mié 5/11/25	vie 7/11/25	167
169		CIV 11001649 - PK 92062430		$ 17.859.132,50	1 día	vie 7/11/25	sáb 8/11/25	168

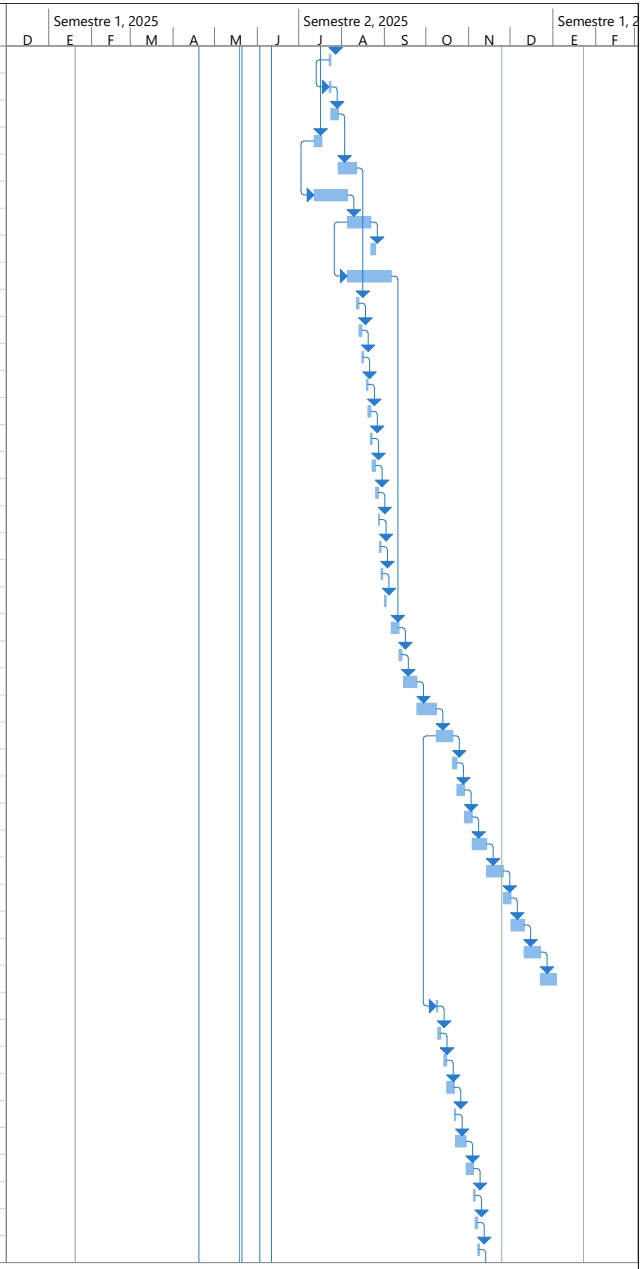

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: mar 25/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidades de asignación	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
170		CIV 11001649 -PK 92062431		$ 71.935.272,90	4 días	lun 10/11/25	jue 13/11/25	169
171		CIV 11001783 - PK 518851		$ 10.932.289,90	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	170
172		CIV 11005964 - PK 518599		$ 119.040.244,31	2 días	sáb 15/11/25	mar 18/11/25	171
173		PK 518600		$ 3.309.477,05	1 día	mar 18/11/25	mié 19/11/25	172
174		PK 518844		$ 23.383.373,27	1 día	mié 19/11/25	jue 20/11/25	173
175		PK 92084734		$ 80.322.586,80	1 día	lun 1/12/25	mar 2/12/25	172FC+10 días
176		PK 92084151		$ 115.381.110,00	4 días	mar 2/12/25	sáb 6/12/25	175
177		PK 92085623		$ 11.620.494,10	2 días	lun 8/12/25	mar 9/12/25	176
178		PK 92058071		$ 56.810.352,00	1 día	mié 10/12/25	mié 10/12/25	177
179		PK 92057994		$ 40.867.934,20	2 días	jue 11/12/25	vie 12/12/25	178
180		PK 92058296		$ 35.622.534,00	2 días	sáb 13/12/25	mar 16/12/25	179
181		PK 92058233		$ 24.106.403,70	3 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25	180
182		PK 92072179		$ 5.739.621,20	4 días	vie 19/12/25	mié 24/12/25	181
183		PK 903352		$ 4.488.452,80	3 días	lun 1/12/25	jue 4/12/25	175CC
184		PK 92081081		$ 49.547.416,20	9 días	jue 4/12/25	mar 16/12/25	183
185		PK 92058256		$ 2.554.656,80	2 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25	184
186		PK 92084149		$ 33.060.442,20	7 días	jue 18/12/25	vie 26/12/25	185
187		PK 92084145		$ 1.677.820,00	6 días	sáb 27/12/25	sáb 3/01/26	186
188		PK 92058204		$ 47.949.941,30	6 días	lun 5/01/26	lun 12/01/26	187
189		PK 518615		$ 1.091.928,30	2 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26	188
190		PK 92085634		$ 19.163.034,90	4 días	mié 14/01/26	lun 19/01/26	189
191		PK 518660		$ 1.451.275,90	2 días	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	184CC
192		PK 92085662		$ 9.430.765,20	11 días	lun 8/12/25	sáb 20/12/25	191
193		PK 903354		$ 80.205.552,20	12 días	lun 22/12/25	lun 5/01/26	192
194		PK 903358		$ 51.510.151,30	8 días	mar 6/01/26	jue 15/01/26	193
195		PK 34013859		$ 22.497.593,64	2 días	lun 20/01/25	mar 21/01/25	
196		PK 34013857		$ 23.684.861,97	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25	195
197		PK 34011268		$ 10.567.288,49	1 día	lun 1/12/25	mar 2/12/25	183CC
198		PK 34010981		$ 8.087.215,33	1 día	mar 2/12/25	mié 3/12/25	197
199		PK 24137126		$ 11.467.785,16	2 días	mié 3/12/25	vie 5/12/25	198
200		PK 34012166		$ 13.114.789,18	1 día	vie 5/12/25	sáb 6/12/25	199
201		PK 518616		$ 8.516.449,55	1 día	lun 8/12/25	lun 8/12/25	200
202		PK 518661		$ 8.264.207,06	1 día	mar 9/12/25	mar 9/12/25	201
203		PK 519131		$ 76.858.878,75	6 días	mié 10/12/25	mié 17/12/25	202
204		PK 34011949		$ 6.079.050,87	1 día	mié 17/12/25	jue 18/12/25	203
205		PK 24137172		$ 67.404.836,29	6 días	jue 18/12/25	jue 25/12/25	204
206		PK 24137173		$ 30.111.245,77	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25	205
207		PK 903353		$ 70.095.099,12	4 días	lun 29/12/25	vie 2/01/26	206
208		PK 701825		$ 187.156.031,02	6 días	vie 2/01/26	vie 9/01/26	207
209		PK 24120349		$ 32.299.250,57	1 día	sáb 10/01/26	lun 12/01/26	208
210		PK 91013652		$ 27.573.017,17	1 día	lun 12/01/26	mar 13/01/26	209
211		PK 24120376		$ 60.682.390,52	6 días	mar 13/01/26	mar 20/01/26	210
212		**PARQUE USAQUEN**		**$ 549.640.265,23**	**50 días**	**mié 14/05/25**	**sáb 19/07/25**	
213		PK 130		$ 32.786.878,29	8 días	mié 14/05/25	vie 23/05/25	26
214		PK 131		$ 53.665.281,19	10 días	mié 14/05/25	lun 26/05/25	213CC

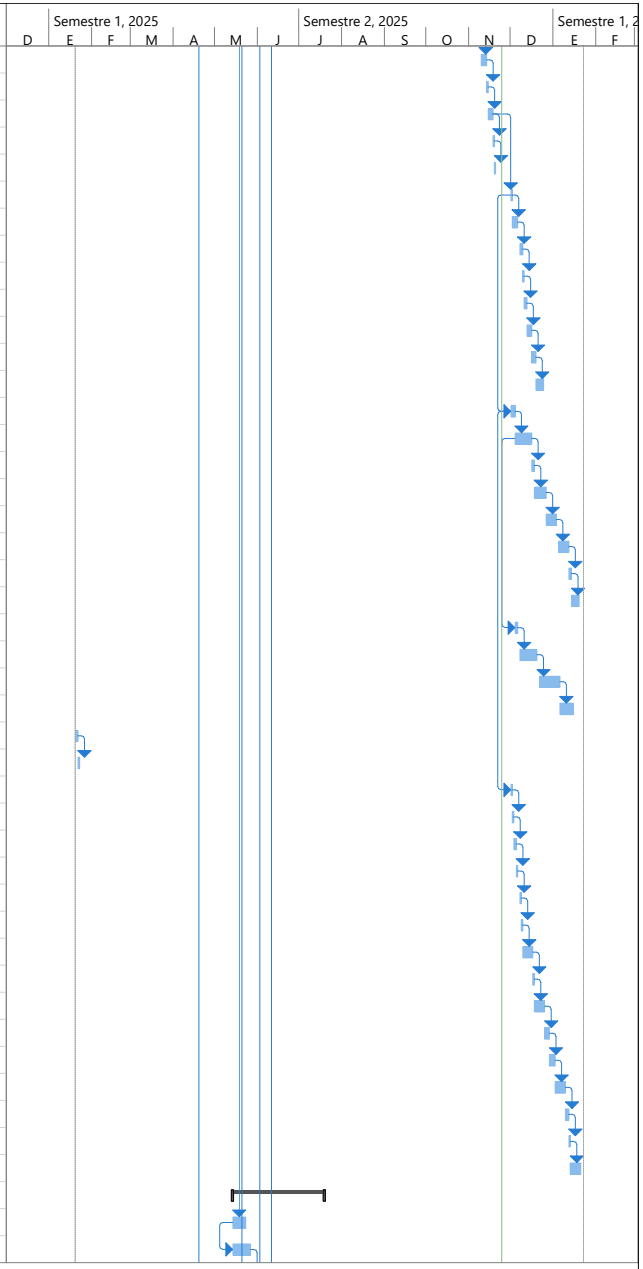

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: mar 25/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidades de asignación	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
215		PK 132		$ 39.135.762,30	6 días	mar 27/05/25	mié 4/06/25	214
216		PK 133		$ 16.555.785,91	8 días	mar 27/05/25	vie 6/06/25	215CC
217		PK 142		$ 24.355.414,72	6 días	mar 27/05/25	mié 4/06/25	216CC
218		PK 143		$ 26.856.455,42	8 días	mié 4/06/25	vie 13/06/25	217
219		PK 3857		$ 17.977.667,43	4 días	sáb 14/06/25	jue 19/06/25	218
220		PK 3887		$ 19.556.487,80	4 días	jue 19/06/25	mié 25/06/25	219
221		PK 3888		$ 9.947.471,11	3 días	mié 4/06/25	sáb 7/06/25	218CC
222		PK 3889		$ 3.516.307,65	2 días	lun 9/06/25	mar 10/06/25	221
223		PK 3890		$ 3.420.239,32	2 días	mié 11/06/25	jue 12/06/25	222
224		PK 3892		$ 17.660.072,92	4 días	vie 13/06/25	mié 18/06/25	223
225		PK 3939		$ 35.501.700,79	7 días	mié 18/06/25	vie 27/06/25	224
226		PK 136466		$ 17.220.701,12	3 días	sáb 28/06/25	jue 3/07/25	225
227		PK 521186		$ 26.060.125,94	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	226
228		PK 136457		$ 157.741.070,64	5 días	vie 4/07/25	jue 10/07/25	227
229		PK 136466		$ 17.220.701,12	1 día	vie 11/07/25	vie 11/07/25	228
230		PK 139283		$ 15.231.070,78	1 día	sáb 12/07/25	lun 14/07/25	229
231		PK 139284		$ 15.231.070,78	5 días	lun 14/07/25	sáb 19/07/25	230
232		**CARRERA 19**		**$ 2.568.248.699,39**	**84 días**	**mar 29/04/25**	**mié 20/08/25**	
233		PK 510001		$ 1.096.668,26	3 días	mar 29/04/25	vie 2/05/25	101CC
234		PK 510050		$ 1.572.580,78	2 días	sáb 3/05/25	mar 6/05/25	233
235		PK 510057		$ 1.158.743,62	2 días	mar 6/05/25	jue 8/05/25	234
236		PK 510017		$ 42.877.144,59	3 días	jue 8/05/25	lun 12/05/25	235
237		PK 510073		$ 94.909.561,59	2 días	mar 13/05/25	mié 14/05/25	236
238		PK 510174		$ 22.420.807,09	3 días	jue 15/05/25	lun 19/05/25	237
239		PK 510396		$ 17.848.431,33	2 días	lun 19/05/25	mié 21/05/25	238
240		PK 517022		$ 41.194.193,51	3 días	mié 21/05/25	sáb 24/05/25	239
241		PK 702687		$ 17.402.596,81	2 días	lun 26/05/25	mar 27/05/25	240
242		PK 24130275		$ 26.789.367,21	3 días	mié 28/05/25	vie 30/05/25	241
243		PK 24136799		$ 46.358.164,54	2 días	sáb 31/05/25	mié 4/06/25	242
244		PK 24136800		$ 23.156.563,46	3 días	mié 4/06/25	sáb 7/06/25	243
245		PK 24136801		$ 12.246.041,53	2 días	lun 9/06/25	mar 10/06/25	244
246		PK 34013747		$ 101.534.745,65	4 días	mié 11/06/25	lun 16/06/25	245
247		PK 34013748		$ 65.795.923,15	4 días	lun 16/06/25	vie 20/06/25	246
248		PK 34013749		$ 16.018.821,68	2 días	vie 20/06/25	mar 24/06/25	247
249		PK 35002696		$ 53.500.026,44	2 días	mié 25/06/25	jue 26/06/25	248
250		PK 510015		$ 356.777.813,00	2 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	249
251		PK 510071		$ 190.560.531,89	4 días	mar 1/07/25	sáb 5/07/25	250
252		PK 510176		$ 160.053.357,69	4 días	lun 7/07/25	jue 10/07/25	251
253		PK 510394		$ 146.860.291,71	2 días	vie 11/07/25	lun 14/07/25	252
254		PK 517020		$ 216.772.813,93	3 días	lun 14/07/25	jue 17/07/25	253
255		PK 24121620		$ 126.175.419,79	5 días	jue 17/07/25	mié 23/07/25	254
256		PK 24121622		$ 177.847.466,75	4 días	jue 24/07/25	mar 29/07/25	255
257		PK 24121623		$ 163.530.544,57	4 días	mar 29/07/25	sáb 2/08/25	256
258		PK 24121625		$ 36.023.189,17	2 días	lun 4/08/25	mar 5/08/25	257
259		PK 24123308		$ 273.633.758,57	6 días	mié 6/08/25	jue 14/08/25	258

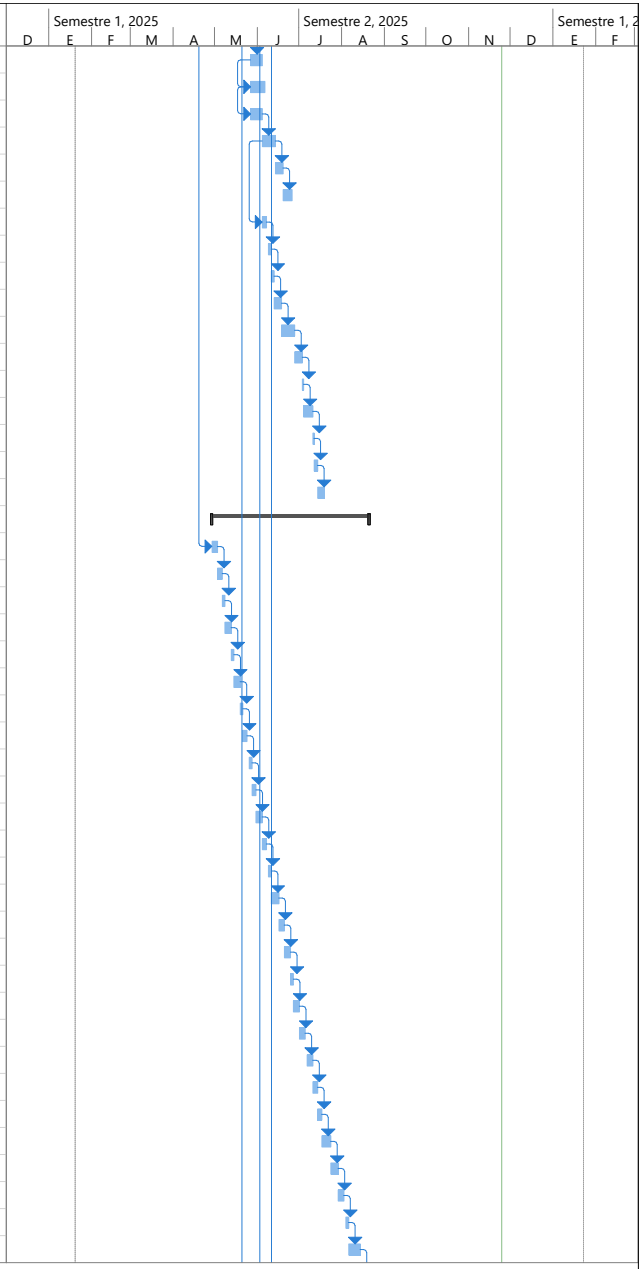

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: mar 25/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidades de asignación	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
260		PK 24123333		$ 134.133.131,08	4 días	jue 14/08/25	mié 20/08/25	259
261		**AV CALLE 153**		**$ 1.759.281.908,33**	**64 días**	**vie 16/05/25**	**lun 11/08/25**	
262		PK 92070063		$ 151.729.337,53	16 días	vie 16/05/25	vie 6/06/25	102
263		PK 92070066		$ 14.053.242,94	4 días	jue 29/05/25	mié 4/06/25	103
264		PK 92055133		$ 126.630.319,12	16 días	mié 4/06/25	mié 25/06/25	263
265		PK 92055106		$ 125.964.168,75	16 días	mié 4/06/25	mié 25/06/25	264CC
266		PK 92070067		$ 240.547.300,31	18 días	jue 26/06/25	sáb 19/07/25	265
267		PK 24130848		$ 197.194.238,76	15 días	jue 26/06/25	mié 16/07/25	266CC
268		PK 92081789		$ 5.892.179,26	4 días	jue 26/06/25	mié 2/07/25	265
269		PK 34012759		$ 11.070.675,50	1 día	mié 2/07/25	jue 3/07/25	268
270		PK 34010588		$ 32.936.143,23	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	269
271		PK 34012752		$ 20.164.160,23	1 día	vie 4/07/25	sáb 5/07/25	270
272		PK 34012753		$ 14.187.449,01	1 día	lun 7/07/25	lun 7/07/25	271
273		PK 34012755		$ 19.351.855,25	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	272
274		PK 34012754		$ 11.663.413,34	1 día	mié 9/07/25	mié 9/07/25	273
275		PK 34012757		$ 512.696,19	2 días	jue 10/07/25	vie 11/07/25	274
276		PK 34012758		$ 15.998.886,78	3 días	sáb 12/07/25	mié 16/07/25	275
277		PK 34012756		$ 114.497,91	2 días	mié 16/07/25	vie 18/07/25	276
278		PK 34010578		$ 72.842.346,59	1 día	vie 18/07/25	sáb 19/07/25	277
279		PK 34012760		$ 75.980.902,69	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25	278
280		PK 34012762		$ 37.873.984,22	4 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25	279
281		PK 34012763		$ 21.898.357,71	4 días	sáb 26/07/25	jue 31/07/25	280
282		PK 91011819		$ 19.529.478,19	2 días	jue 31/07/25	sáb 2/08/25	281
283		PK 91011857		$ 286.628.101,28	2 días	lun 4/08/25	mar 5/08/25	282
284		PK 91029327		$ 164.415.622,75	1 día	mié 6/08/25	mié 6/08/25	283
285		PK 91029325		$ 57.037.106,07	1 día	vie 8/08/25	vie 8/08/25	284
286		PK 531112		$ 35.065.444,72	1 día	sáb 9/08/25	lun 11/08/25	285
287		**AV SUBA**		**$ 638.665.017,49**	**171 días**	**vie 6/06/25**	**vie 16/01/26**	
288		PK 92081388		$ 117.602.004,44	18 días	vie 6/06/25	mié 2/07/25	30
289		PK 92079855		$ 46.777.549,36	10 días	mié 2/07/25	mar 15/07/25	288
290		PK 92079690		$ 37.254.129,30	8 días	mar 15/07/25	jue 24/07/25	289
291		PK 92081381		$ 25.741.048,67	8 días	vie 25/07/25	lun 4/08/25	290
292		PK 92079683		$ 75.702.468,32	5 días	vie 25/07/25	jue 31/07/25	291CC
293		PK 92081371		$ 65.563.389,48	18 días	jue 31/07/25	mar 26/08/25	292
294		PK 92079684		$ 113.713.614,53	24 días	mar 26/08/25	jue 25/09/25	293
295		PK 92081378		$ 36.640.410,82	8 días	jue 25/09/25	lun 6/10/25	294
296		PK 92079676		$ 34.249.869,22	8 días	lun 6/10/25	jue 16/10/25	295
297		PK 92084090		$ 2.281.179,84	4 días	vie 17/10/25	mié 22/10/25	296
298		PK 92084091		$ 8.201.366,97	6 días	mié 22/10/25	mié 29/10/25	297
299		PK 92079684		$ 16.468.870,56	6 días	vie 19/12/25	vie 26/12/25	298FC+40 días
300		PK 92081371		$ 26.110.410,91	8 días	sáb 27/12/25	mar 6/01/26	299
301		PK 92079676		$ 32.358.705,07	8 días	mié 7/01/26	vie 16/01/26	300
302		**CALLE 134**		**$ 406.238.925,80**	**81 días**	**jue 25/09/25**	**mié 7/01/26**	
303		PK 530376		$ 43.693.248,58	9 días	jue 25/09/25	mar 7/10/25	294
304		PK 92084186		$ 66.771.747,19	10 días	mar 7/10/25	mar 21/10/25	303

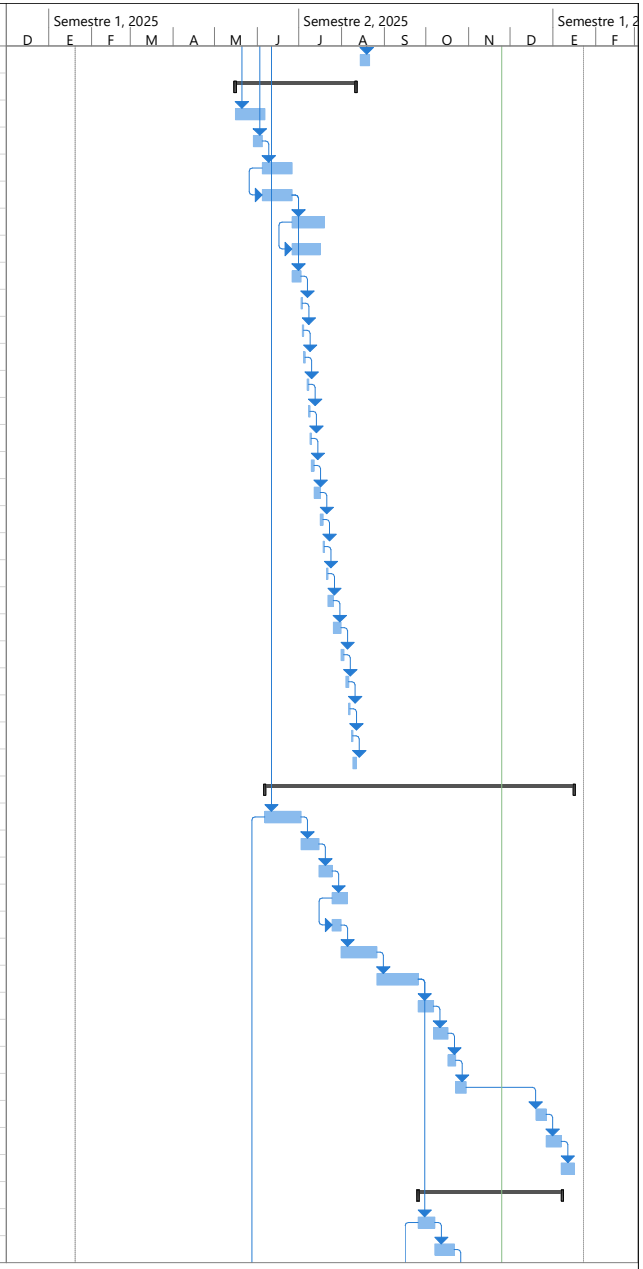

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: mar 25/11/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidades de asignación	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
305		PK 92055675		$ 40.200.933,31	10 días	lun 1/12/25	vie 12/12/25	311FC+1 día
306		PK 24131605		$ 31.196.711,36	7 días	mar 21/10/25	mié 29/10/25	304
307		PK 527161		$ 12.577.015,86	4 días	jue 30/10/25	mar 4/11/25	306
308		PK 527155		$ 32.759.069,13	9 días	sáb 13/12/25	mié 24/12/25	305
309		PK 34014180		$ 68.326.541,82	10 días	mar 4/11/25	lun 17/11/25	307
310		PK 530382		$ 23.835.214,19	11 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	308
311		PK 92070065		$ 86.878.444,36	10 días	lun 17/11/25	vie 28/11/25	309
312		**CARRERA 5**		**$ 26.462.598,05**	**10 días**	**jue 25/09/25**	**mié 8/10/25**	
313		CIV 2001211 - PK 7408		$ 10.464.437,14	5 días	jue 25/09/25	mié 1/10/25	303CC
314		CIV 2001192 - PK 7410		$ 15.998.160,91	5 días	jue 2/10/25	mié 8/10/25	313
315		**CARRERA 11**		**$ 113.179.288,08**	**14 días**	**mié 8/10/25**	**lun 27/10/25**	
316		CIV 2000790 PK 24130428		$ 113.179.288,08	14 días	mié 8/10/25	lun 27/10/25	314
317		**TIBABUYES**		**$ 222.708.292,83**	**34 días**	**mié 8/10/25**	**vie 21/11/25**	
318		PK 92051888		$ 37.661.893,71	6 días	mié 8/10/25	jue 16/10/25	316CC
319		PK 92052135		$ 12.167.563,91	7 días	vie 17/10/25	sáb 25/10/25	318
320		PK 92052137		$ 112.287.376,94				
321		PK 92073612		$ 60.591.458,27	5 días	sáb 15/11/25	vie 21/11/25	319
322		**AV BOYACA**		**$ 88.974.829,43**	**20 días**	**mié 8/10/25**	**mar 4/11/25**	
323		PK 603151		$ 68.265.550,78	12 días	mié 8/10/25	vie 24/10/25	318CC
324		PK 904522		$ 8.667.043,97	3 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25	323
325		PK 92050757		$ 12.042.234,68	5 días	mié 29/10/25	mar 4/11/25	324
326		**SALITRE**		**$ 47.448.838,23**	**8 días**	**mar 4/11/25**	**jue 13/11/25**	
327		PK 389611		$ 47.448.838,23	8 días	mar 4/11/25	jue 13/11/25	325
328		**PLAZA DE LA HOJA**		**$ 126.998.144,16**	**10 días**	**vie 14/11/25**	**mié 26/11/25**	
329		PK 92090441		$ 126.998.144,16	10 días	vie 14/11/25	mié 26/11/25	326
330		INSTALACION MOBILIARIO		$ 325.482.338,87	40 días	mar 4/11/25	mié 24/12/25	327CC
331		ATENCION EMERGENCIA PUENTI		$ 140.000.000,00	60 días	mar 4/11/25	lun 19/01/26	330CC
332		ATENCION EMERGENCIA SEGMENTOS		$ 304.526.821,71	30 días	mar 16/12/25	jue 22/01/26	327FC+25 días
333		**CALLE 90**		**$ 228.197.739,73**	**66 días**	**vie 6/06/25**	**mié 3/09/25**	
334		PK 9887		$ 30.805.809,68	6 días	vie 6/06/25	vie 13/06/25	288CC
335		PK 9888		$ 28.295.496,32	10 días	sáb 14/06/25	vie 27/06/25	334
336		PK 9889		$ 32.623.212,29	10 días	sáb 28/06/25	vie 11/07/25	335
337		PK 9891		$ 24.015.879,30	10 días	sáb 12/07/25	jue 24/07/25	336
338		PK 9892		$ 39.686.822,78	10 días	vie 25/07/25	mié 6/08/25	337
339		PK 9894		$ 41.030.626,40	10 días	vie 8/08/25	jue 21/08/25	338
340		PK 9896		$ 31.739.892,96	10 días	vie 22/08/25	mié 3/09/25	339
341		FIN ETAPA DE OBRA		$ 0,00	0 días	lun 1/12/25	lun 1/12/25	

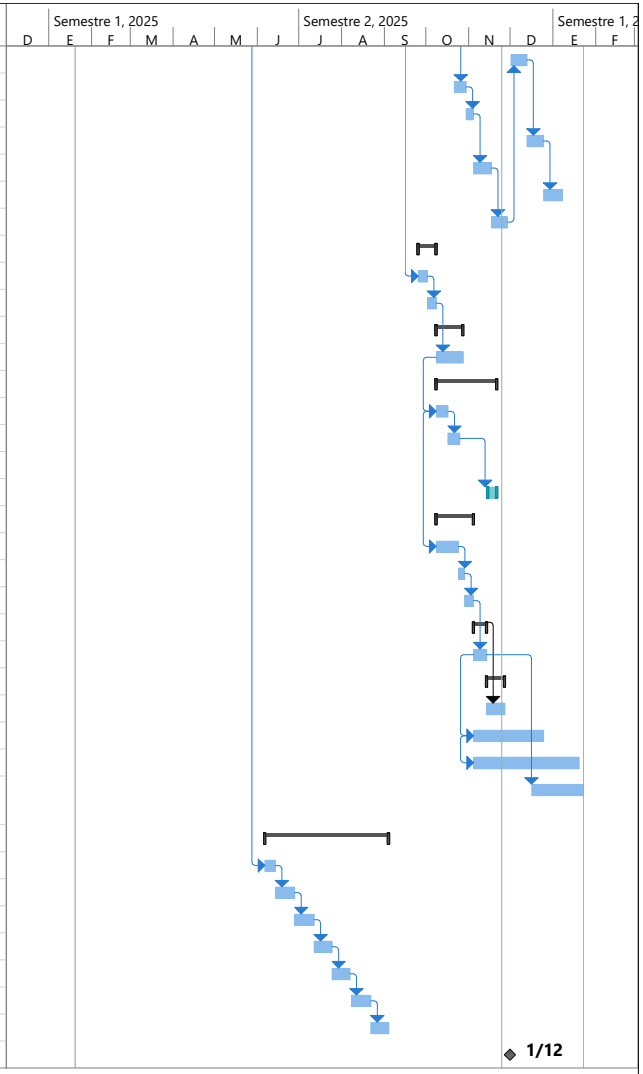

Proyecto: CRONOGRAMA DETA
Fecha: mar 25/11/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo		
