ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 6 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

incomunicación en la zona, motivado por la creciente que se genera en el arroyo. Asociado a esto se ha presentado lluvias aguas arriba (ver anexo reporte IDEAM), generando creciente en el arroyo, impidiendo así la ejecución de las actividades de manera segura.



FOTO 1,2,3 y 4: Registro fotográfico, comportamiento del arroyo Severinez, cuando hay presencia lluvias en la zona o aguas arriba.

2. El proyecto a corte del 25 de julio del 2024, cuenta con un porcentaje de ejecución de obras del 57,4%, por situaciones no imputable al contratista, teniendo en cuenta lo justificado anteriormente, es decir, por bajos rendimientos debido a presencia de lluvias lo que ha imposibilitado la ejecución oportuna de actividades que son antecesoras

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y que la fecha de inicio de actividades de obra fue el 5 de diciembre del 2022 y el plazo del cumplimiento del 100% del contrato es el 31 de julio del 2024, se cree que el tiempo no es suficiente para la culminación del proyecto, le solicitamos que el nuevo plazo para la

Ve a Configuración para

Calle 32 # 15- 52 barrio el Edén - Fijo: 7943254 - NIT: 901027791-4 - Correo: [illegible]

CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

ejecución de actividades sea hasta el 15 de septiembre del 2024 a partir de la fecha de vencimiento del plazo actual de terminación se decir 31 de julio del 2024.

Sin otro particular,

Cordialmente,

[illegible]
Mario Alberto Pabon Reyes
C. C. 73.555.384
Representante Legal
Consorcio Puentes de Córdoba

Calle 32 # 15- 52 barrio el Edén - Fijo: 7943254 - NIT: 901027791-4 - Correo: [illegible]

NOVENA: Mediante oficio CVN-1078-2022 de fecha 30 de julio de 2024 el CONSORCIO VIAL NACIONAL recomienda Prorroga No 6 al Contrato de obra publica LP-013-2022 como seguidamente se evidencia.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 6 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

CONSORCIO VIAL NACIONAL

Montelíbano, 30 de julio de 2024. CVN-1095-2022

Doctor:
JESUS DAVID CONTRERAS
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA
[illegible]
Tierralta – Córdoba

REFERENCIA: LP-013-2022 "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE PRORROGA No 6 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2024

La Interventoría CONSORCIO VIAL NACIONAL en atención a solicitud realizada por parte del Consorcio Puentes de Córdoba, mediante comunicado CPC-TIERRALTA-168-2024 del día 29 de julio de 2024, quienes ejecutan el Contrato No. LP-013-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021", justificado básicamente con el propósito de lograr cumplir las metas físicas programadas en el proyecto dado que el tiempo restante del contrato resulta insuficiente; manifiesta lo siguiente:

Ante dicha solicitud de prórroga, la Interventoría Consorcio Vial Nacional se ve en la necesidad de recordarle al Municipio de Tierralta que, en cumplimiento de nuestras funciones contractuales, dado el atraso presentado conforme a la reprogramación del Programa de Inversiones No. 6 Vigente, se radicó el oficio CVN-1095-2022 de fecha 16 de julio de 2024 ante el Municipio de Tierralta con asunto "SOLICITUD DE PROCESO SANCIONATORIO DEFINITIVO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL", en el cual se sustentan las causas reales del atraso en la ejecución del contrato de obra referido, que no son las expuestas por el Consorcio Puentes de Córdoba en el comunicado CPC-TIERRALTA-168-2024.

Así mismo, dentro de las actividades de seguimiento y control del proyecto en ejecución, mediante nuestro informe semanal No 97 a corte de 25 de julio de 2024, el proyecto cuenta con los siguientes indicadores:

- Avance Programado Acumulado: 95,67% ($7.065.003.388,67)
- Avance Ejecutado Acumulado: 67,06% ($4.213.822.297,10)
- Atraso: 28,61% ($2.851.080.090,57)

No obstante, se sirva de atender la solicitud, para que el contratista de obra Consorcio Puentes de Córdoba, tenga la oportunidad de ejecutar las metas físicas programadas en beneficio del proyecto y de la comunidad directamente asistida en el área de influencia, la interventoría CONSORCIO VIAL NACIONAL, considera conveniente tomar en cuenta la solicitud del contratista de obra para PRORROGAR el contrato de la referencia por el término de dos (2) meses y cinco (45) días solicitados. Es importante advertir que el contratista de obra Consorcio Puentes de Córdoba a la fecha contiene con un atraso importante en la ejecución de las obras, por lo tanto, el presunto incumplimiento definitivo en cuanto del contratista de obra CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA que manifestamos mediante nuestro oficio CVN- 1095-22022 del 16 de julio de 2024, continua vigente y el Municipio de Tierralta debe continuar el trámite correspondiente.

Así las cosas, la Interventoría CONSORCIO VIAL NACIONAL, considera conveniente que el MUNICIPIO DE TIERRALTA gestione la prórroga del contrato de obra No LP-013-2022 por un término de cuarenta y cinco (45) días, es decir, hasta el 15 de septiembre de 2024, solicitados por el Consorcio Puentes de Córdoba.

Cordialmente

JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAL NACIONAL
cc -Ing. Nilsdar Lemos – Supervisor del Contrato INVIAS
- Ing. Alvaro Gaona A.- Gestor Proyecto INVIAS
- Ing. Jorge Muñoz Castillo – Supervisor Contrato Otro Municipio Tierralta
- Consorcio Puentes de Córdoba
ANEXOS: CPC-TIERRALTA-168-2024 SOLICITUD DE PRORROGA No 6

Calle 22 # 29 - 83 Colmenar Teléfono: (7) 6782256 6782256 6878199 Celular: [illegible] 4606991
E-mail: vialnacional@gmail.com - guarda@sandag.com.co Montelíbano - Colombia

DECIMA: Considerando lo antes expuesto esta entidad prorrogara el termino de ejecución del presente contrato a fin de cumplir con los fines perseguidos con dicha contratación, en atención a la recomendación efectuada por la interventoría.

DECIMA PRIMERA: Mediante documento interno de fecha 30 de julio de 2024 el secretario de obras públicas municipales remitió solicitud para la formalización de prorroga de obra publica No LP-013-2022, tal como seguidamente se evidencia:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 6 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

NOTA INTERNA

Tierralta, 30 de Julio de 2024.

300/129-1

PARA: **JESÚS DAVID CONTRERAS RODRÍGUEZ**
Alcalde Municipal.

DE: **JORGE ELIECER MUÑOZ CASTILLO**
Secretario de Obras Públicas.

ASUNTO: Solicitud de prorroga al contrato de obra No. LP-013-2022.

Estimado doctor Contreras, cordial saludo

En cumplimiento de mis funciones como Secretario de Obras Públicas del municipio de Tierralta, me permito comunicarle la necesidad de realizar una prórroga por un (1) mes y quince días, contados a partir del 31 de Julio de 2024, que es la actual fecha de terminación del contrato de obra cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".

El contratista manifiesta lo siguiente: "Por motivos de lluvias entre los meses de abril y julio, han generado una disminución en los rendimientos de obra y como es de conocimiento, las actividades se realizan sobre el arroyo Severinera, lo cual, no permite que se realicen las actividades en presencia de lluvia, asociado a esto se ha presentado fuertes lluvias aguas arriba, generando creciente en el arroyo e impidiendo así la ejecución de las actividades de manera segura."

Así mismo, la interventoría del proyecto en mención realiza la recomendación de la prórroga y a su vez considera conveniente que el Municipio gestione la prórroga por un término de cuarenta y cinco (45) días, es decir, hasta el 15 de septiembre de 2024.

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

Agradeciendo su atención y consideración, confiamos en que, en virtud de las circunstancias expuestas, se pueda conceder la prórroga solicitada y seguir avanzando en la ejecución de este importante proyecto.

Cordialmente,

JORGE ELIECER MUÑOZ CASTILLO
Secretario de Obras Públicas.

Elaboró: Dasley D- Tec. Administrativo D
Proyectó: Jesus D- Contratista Prest. Serv.

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA pública No 013 – 2022, **HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024,** suscrito entre el MUNICIPIO DE TIERRALTA entidad territorial del orden local, representada legalmente por el Señor **JESUS DAVID CONTRERAS RODRIGUEZ** persona mayor de edad vecino y conciliado en Tierralta- Córdoba, identificado con la cedula de ciudadanía No 80.796.556 de Tierralta, en su calidad de Alcalde Municipal y el **CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA**, identificado con Nit No. 901627711-9 representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.203.584 DE CARTAGENA, que tiene por objeto la **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 6 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

CLÁUSULA SEGUNDA: La presente prorroga no genera pagos adicionales al contratista de los que ya vienen previsto para dicho contrato por acuerdo entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar las garantías suscritas en el contrato de obra LP-013-2022, conforme a la presente prorroga.

CLAUSULA CUARTA: Las demás clausulas del contrato quedaran de la manera establecida inicialmente.

Para constancia se firma en el municipio de Tierralta, a los treinta (30) días del mes de julio de 2024.

JESUS DAVID CONTRERAS RODRIGUEZ
Alcalde
MUNICIPIO DE TIERRALTA
ENTIDAD CONTRATANTE.

CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.
Nit No.901627711-9,
R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.
C.C. No. 73.203.584 DE CARTAGENA.
CONTRATISTA.

Proyecto: Sebastián R- Abogado Contratista SR
Reviso: Ciro & Montoya S.A.S.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

APROBACIÓN PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA: Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de LICITACION PUBLICA No. LP-MT-013-2022, cuyo objeto "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021". Por valor de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($5.384.604.822.00), incluido AIU todos los costos directos e indirectos y demás que haya lugar, equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 Con un plazo de ejecución de: HASTA 31 DE DICIEMBRE.

VALOR CON ADICION SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($7.384.604.822).

SE HACE APROBACION DE POLIZA POR MEDIO DE ANEXO 10 Y 11, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGÚN PRORROGA No 6 TENIENDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

PÓLIZA N°.	36-44-101054903
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
TOMADOR:	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPAROS	**VIGENCIA:**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 - 15/03/2025	$1,615,381,447.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	02/09/2022 - 15/09/2027	$1,476,920,964.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022- 15/09/2029	$18,211,446.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2022 – 31/12/2027	$2,215,381,446.60
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022 - 15/03/2025	$738,460,482.20

PÓLIZA N°.	36-40-101021458
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S. A
TOMADOR:	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	**VIGENCIA:**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	02/09/2022 - 15/09/2024	$650.000.000.00

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta, a los Diez (10) días del mes de septiembre de 2024.

RODER HERNAN RAMOS MELLAO.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Proyecto: Sebastián Rivero-Abogado Contratista. SR

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	09	2024	02	09	2022	00:00	15	09	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-8
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 013 DE2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTEVEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCODELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	15/09/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	15/09/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	15/09/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y DE CONFORMIDAD CON PRORROGA NO. 6 SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 15/09/2024
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****196,602.00	$ *******3,000.00	$ ******37,924.00	$ **********237,527.00	$ ******650,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AXEGURO LIMITADA	235508	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3458323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	09	2024	02	09	2022	00:00	15	09	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA		TELÉFONO: 7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	15/09/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	15/09/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	15/09/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	15/09/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

YEIMY BUITRAGO 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	09	2024	02	09	2022	08:00	15	09	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553

BENEFICIARIO:

P. GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****196,602.00	$ *******3,000.00	$ ******37,924.00	$ **********237,527.00	$ ******650,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
AXECURO LIMITADA	235508	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998031167(8020)110071040443303900)000000337527(96)20220903

REFERENCIA PAGO: 1100710404423-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	09	2024	02	09	2022	00:00	15	09	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:** 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-6
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	**CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA	**TELÉFONO:** 7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
INGENICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S	901330275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

YEINYBUITRAGO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	38	38-44-101054903	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	09	2024	02	09	2022	00:00	15	09	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103838103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO No 611 DE 2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOSDEPLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1941 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

NOTA:
-CALIDAD DEL SERVICIO SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA.
- EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022	15/03/2025	$1,615,381,447.00	$1,615,381,447.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022	15/09/2027	$1,476,920,964.40	$1,476,920,964.40
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022	15/09/2029	$18,211,446.00	$18,211,446.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2022	31/12/2027	$2,215,381,445.60	$2,215,381,445.60
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022	15/03/2025	$738,460,482.20	$738,460,482.20

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y DE CONFORMIDAD CON PRORROGA NO. 6 SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 15/09/2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****638,772.00	$ *******8,000.00	$ *****160,886.00	$ *********1,007,658.00	$ ****6,064,355,786.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AXEGURO LIMITADA	235508	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	38	38-44-101054983	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	09	2024	02	09	2022	00:00	15	09	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO 7771553
ADICIONAL:		

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****838,772.00	$ *******8,000.00	$ *****160,886.00	$ **********1,007,658.00	$ ****6,064,355,786.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AXEGURO LIMITADA	235508	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100710404422 3(3900)0000010075 38(96)20230702

REFERENCIA PAGO: 1100710404422-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	38	36-44-101054903	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	09	2024	02	09	2022	00:00	15	09	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-8	
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.887-4	
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO: 7771553	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407851-6	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CLAUDIATORRESSUS 2

Scanned with CamScanner

238

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101054903, anexo 11, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 7 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

CONTRATO DE OBRA	No.013-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA
CONTRATISTA	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA. Nit 901627711-9 R/L: MARIO ALBERTO PETRO REYES. C.C: 73.203.584
OBJETO	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.
VALOR INICIAL	CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($5.384.604,822.00), incluido todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar
PLAZO INCIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir de que se haya cumplido los requisitos de ejecución y legalización del contrato y, se haya suscrito el acta de inicio
PRORROGA NUMERO 1	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA FEHCA DE LA PREVISTA PARA LA FINALIZACION
PRORROGA NUMERO 2	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA FEHCA DE LA PREVISTA PARA LA FINALIZACION

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 7 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

PRORROGA NUMERO 3	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA FEHCA DE LA PREVISTA PARA LA FINALIZACION
PRORROGA NUMERO 4	HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA PREVISTA PARA LA FINALIZACION.
SUSPENSION 1	FECHA DE SUSCRIPCION 26 DE FEBRERO DE 2024. FECHA DE TERMINACION DE LA SUSPENSION 25 DE MARZO DE 2024.
PRORROGA A LA SUSPENSION NUMERO 1	FECHA DE SUSCRIPCION 22 DE MARZO DE 2024 FECHA DE TERMINACION 05 DE ABRIL DE 2024.
FECHA ACTA DE REINICIO NUMERO 1	2 DE ABRIL DEL 2024
ADICIONAL EN PLAZO 5	DESDE EL 2 DE ABRIL, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024.
VALOR DEL ADICIONAL 1	DOS MIL MILONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.00), incluido todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar.
PRORROGA NUMERO 6	HASTA EL QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRORROGA NUMERO 7	**HASTA EL (05) DE OCTUBRE DE 2024**

Entre los suscritos a saber **EL MUNICIPIO DE TIERRALTA**, entidad territorial del orden local, representada legalmente por el señor **JESUS DAVID CONTRERAS RODRIGUEZ,** persona mayor de edad vecino y domiciliado en Tierralta - Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía No.80.796.556 de Tierralta, en su calidad de Alcalde Municipal, como

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 7 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

consta en el Acta de posesión de fecha primero (01) de enero de 2024, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE TIERRALTA**, debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad con la Constitución Política y la Ley 80 de 1993, quien en adelante para todos los efectos legales del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra el **CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA**, identificado con Nit No. 901627711-9, representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.203.584 DE CARTAGENA, quien declara que ni él ni el consorcio que representa se encuentran incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley para celebrar este negocio jurídico, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente Adicional No. 1 al CONTRATO DE OBRA No.013-2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Que entre el **MUNICIPIO DE TIERRALTA** y el **CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA**, identificado con Nit No. 901627711-9, representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.203.584 DE CARTAGENA celebraron en fecha 02 de Septiembre de 2022, el Contrato de Obra No.013-2022, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021."**, por un valor de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($5.384.604,822.00), incluido todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

SEGUNDA: Que dicho contrato es derivado del Convenio Interadministrativo No. 1961-2021 con EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) DEPARTAMENTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y el MUNICIPIO DE TIERRALTA, el cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

TERCERA: Que el acta de inicio del **CONTRATO DE OBRA No. LP-013-2022**, se suscribió en fecha 19 de septiembre de 2022, con el **CONSORCIO VIAL NACIONAL**, quien actúa en calidad de interventor y el **CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA** Nit 901627711-9 Representada legalmente por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES** identificado con

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 7 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

la cedula de ciudadanía No 73.203.584 DE CARTAGENA- Ingeniero Civil M.P 22202152753, como contratista.

CUARTA: Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que: "(....) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".

QUINTA: Que la Ley 80 de 1993, dentro de sus disposiciones, establece el deber de las entidades públicas de adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales como es la continúa y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines y que estén destinados a satisfacer necesidad colectivas en forma general, permanente y continua , bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.

SEXTA: Que el principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades de interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de la "Justicia Distributiva" (...), las modificaciones en el CONTRATO pueden traducirse tanto en aumento (Adicionales) como en una disminución (Reducciones) de las prestaciones. **Roberto Dromi. Derecho Administrativo. Edición Quinta, Página 348.**

SEPTIMA: Que el Ius Variandi de la administración contratante es ilimitado en extensión o intensidad ya que el interés público prima sobre cualquier otra consideración, de lo cual resulta claro, que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse, so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de los previsto del artículo 3 de la Ley 80 de 1993.

OCTAVA: Que el CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA mediante oficio de fecha 11 de septiembre de 2024 remitió al CONSORCIO VIAL NACIONAL solicitud de prorroga numero 7 al contrato de obra pública No LP-013-2022, en el siguiente sentido:

CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA

Montería, 11 de septiembre del 2024

CPC-TIERRALTA-293-2024

INGENIERO
JUAN E. VILLALOBOS
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAL NACIONAL

REF. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No 7

Apreciado Ingeniero Villalobos, reciba un cordial saludo.

CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA

ITEM		ITEM		DESCRIPCION	% DE AVANCE
7.00	630.1	630.09		Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS	100%
8.00	630.3	630.00		Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero	75%
9.00	630.4 P	630.00		Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación	91%
10.00	630.4	630.00		Concreto clase P (140 kg/cm2 o 2000 PSI)	100%
11.00	631 VP	631.00		Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1.1 m (incluye acero de refuerzo)	100%
12.00	640.1	640.00		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	80%
13.00	641.1	641.00		Acero de Pretfuerzo	71%
14.00	642.1	642.00		Apoyo elastomerico	100%
15.00	642.2	642.00	PART	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	0%
16.00	632.1 P	632.10	PART	Baranda metalica para puente vehicular	0%

Tierra
13 (Es
4 - 01
loba.g

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 7 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA

ITEM				DESCRIPCION	% DE AVANCE
				VAL ITEM NO PREVISTO	
34.00	MES		PART	Plan de manejo para vigs postensadas	100%
35.00	MES		PART	Suministro e instalación de valor general hydrostatic ensamblado con gravedad hydrostatic VAT, diámetro 6.5 m, altura máxima 1.50 m	0%
36.00	MES		PART	Suministro e instalación de formaletas tipo cantilever prefabricado 120ton	0%
37.00	MES		PART	Suministro e instalación de modelo arquitectónico en formaletas 3D	0%
38.00	MES	100.1	100.00	Parqueadero de operación Valle Rico SAS ESP	75%

ASPECTO GESTIÓN SOCIAL

El contrato de obra NO cuenta con provisión para el pago de la GESTIÓN SOCIAL

ASPECTO GESTIÓN AMBIENTAL

El contrato de obra NO cuenta con provisión para el pago de la GESTIÓN AMBIENTAL. Este contrato cuenta con un permiso de ocupación de cauce a título del Municipio de Tierralta, el cual fue aprobado mediante resolución No.3-0248 por la Corporación Autónoma de los Valles Sinú y San Jorge - CVS, por lo tanto, las obras de compensación ambiental son de responsabilidad del municipio de Tierralta.

ASPECTO FINANCIERO

La presente solicitud no requiere soporte financiero al proyecto. Se mantiene vigente el numeral No 3 y adicional del contrato

ASPECTO JURIDICO

1. El día 12 de noviembre del 2021, se suscribió convenio interadministrativo No. 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021entre el municipio de Tierralta y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, cuyo plazo de terminación es el 31 de diciembre del 2022
2. El día 2 de septiembre del 2022, se suscribió entre el representante legal del municipio de Tierralta y el representante legal del Consorcio Puentes de Córdoba contrato de obra pública No LP-NO 013-2022 – cuyo objeto es Construcción de un puente vehicular sobre la Quebrada Severinera en la vía que comunica a los municipios de Planeta Rica y Tierralta, departamento de Córdoba en el marco del convenio interadministrativo no. 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021.

Calle 20 # 15- 32 barrio el Edén - Fijo: 7842214 - MÓVIL 3046277513 - Correo: contratospuentescordoba@hotmail.com

CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA

2. En la carretera No 6 CV TIERRALTA PLANETA RICA tramo variante [illegible] el cierre del corredor vehicular se inicia el 15 de septiembre de 2021

ASPECTO TECNICO

1. Durante la ejecución del contrato entre el mes de agosto, se presentaron fuertes lluvias intensas y fuertes en la obra como se mencionó a continuación

MES PRESENCIA DE LLUVIA	TOTAL DIAS AFECTADOS
AGOSTO	7
TOTAL	TOTAL

La presencia de lluvias sobre las zonas de aguas generaron una disminución en los rendimientos de obra y cuerpo de no cumplimiento, las actividades se realizan sobre el cauce Severinera, la cuadrilla permite que se realicen las actividades programadas de obra, por seguridad y salud en el trabajo, la incomunicación en la obra, motivado por la creciente que se generó en el cauce. Ausencia o cese de la presentación formal, escrita ante los mismos reporte CDMB, generando retrasos en el avance, imposibilidad de la ejecución en las actividades de manera segura.



Foto 1. Creciente arroyo sin presencia de lluvias aguas arriba, imposibilita ejecución de actividades obras de protección y canalización de arroyo

Foto 2. Lluvia en la obra, imposibilita ejecución de actividades de pavimentación

Calle 20 # 15- 32 barrio el Edén - Fijo: 7842214 - MÓVIL 3046277513 - Correo: contratospuentescordoba@hotmail.com

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 7 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

CONSORCIO
PUENTES DE CÓRDOBA



FOTO 3 y 4. Registro fotográfico comportamiento del arroyo Severiner, cuando hay presencia lluvias aguas arriba

2. El proyecto a corte del 11 de septiembre del 2024, cuenta con un porcentaje de ejecución de obras del 68,3%, por situaciones no imputables al contratista, teniendo en cuenta lo justificado anteriormente, es decir, por bajos rendimientos debido a presencia de lluvias lo que ha imposibilitado la ejecución oportuna de actividades que son antecesoras

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y que la fecha de inicio de actividades de obra fue el 5 de diciembre del 2022 y el plazo del cumplimiento del 100% del contrato es el 15 de septiembre del 2024, es claro que el tiempo no es suficiente para la culminación del proyecto, le solicitamos que el nuevo plazo para la ejecución de actividades sea hasta el 5 de octubre del 2024 a partir de la fecha de vencimiento del plazo actual de terminación es decir 15 de septiembre del 2024.

Sin otro particular

Cordialmente,

Mario Alberto Pérez Reyes
C. C. 73.283.584
Representante Legal
Consorcio Puentes de Córdoba

Calle 52 # 15- 02 barrio el Edén - Fijo: 7948214 - NIT: 901627715-9 - Correo: [illegible]

NOVENA: Mediante oficio CVN-1147-2022 de fecha 13 de septiembre de 2024 el CONSORCIO VIAL NACIONAL recomienda Prorroga No 7 al Contrato de obra publica LP-013-2022 como seguidamente se evidencia.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 7 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO** CONSORCIO VIAL NACIONAL **IA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Montelíbano, 13 de septiembre de 2024. CVN-1147-3822

Doctor
JESUS DAVID CONTRERAS
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA
Cll 4 No. 14-13 (Esquina)
Tierralta – Córdoba

REFERENCIA: LP-013-2022 "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1961 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021".

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE PRORROGA No 7

La Interventoría CONSORCIO VIAL NACIONAL en atención a la solicitud realizada para la Prorroga No. 7 del contrato de obra, consistente en un plazo adicional de 20 días, hasta el 5 de octubre, por parte del CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA mediante comunicado CPC-TIERRALTA-193-2024 del día 12 de septiembre de 2024, mediante el cual solicitan el Contrato No. LP-013-2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021", manifiesto cordialmente con el propósito de lograr cumplir las metas físicas programadas en el proyecto dado que el tiempo restante del contrato resulta insuficiente, manifiesto lo siguiente:

Antes dicha solicitud de prórroga, la interventoría Consorcio Vial Nacional se ve en la necesidad de recordarle al Municipio de Tierralta que, en cumplimiento de nuestras funciones contractuales, dado el atraso presentado conforme a la reprogramación del Programa de Inversiones No. 7 vigente, se generó el oficio CVN-1109-2022 entre el Municipio de Tierralta con asunto: "INTERACCIÓN DE SOLICITUD DE PROCESO SANCIONATORIO DEFINITIVO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL" de fecha 15 de agosto de 2024, en el cual se sustentan las causas reales del atraso en la ejecución del contrato de obra referencia, que no son las expuestas por el Consorcio Puentes de Córdoba en el comunicado CPC-TIERRALTA-193-2024.

Así mismo, dentro de las actividades de seguimiento y control del proyecto en ejecución, mediante nuestro informe mensual No 104 a corte de 12 de septiembre de 2024, el proyecto cuenta con los siguientes indicadores:

- [illegible]
- [illegible]
- Total Atraso: 27,59% ($2.000.761.985,37)

No obstante el atraso en la obra, en aras de atender la solicitud, para que el contratista de obra Consorcio Puentes de Córdoba tenga la oportunidad de ejecutar las metas físicas programadas en beneficio del proyecto y de la comunidad directa del área de influencia, la interventoría consideró Vial Nacional considera conveniente tener en cuenta la solicitud del contratista de obra para PRORROGAR el contrato de obra de la referencia por el término de veinte (20) días calendario solicitados, es decir, hasta el 5 de octubre de 2024. Es importante advertir que el contratista de obra Consorcio Puentes de Córdoba a la fecha continua con un atraso importante en la ejecución de las obras, por lo tanto, el presunto incumplimiento definitivo en contra del contratista de obra1 que manifestamos mediante nuestro oficio CVN- 1109-2022 del 15 de agosto de 2024, continua vigente y el Municipio de Tierralta debe continuar el trámite correspondiente.

Calle 33 # 26- 62 Cañaveral Teléfono [illegible] Celular [illegible]
E-mail [illegible] PONEDERA Córdoba

CONSORCIO VIAL NACIONAL

Atentamente,

JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAL NACIONAL

cc. [illegible]

Calle 33 # 26- 62 Cañaveral Teléfono [illegible] Celular [illegible]
E-mail [illegible] PONEDERA Córdoba

DECIMA: Considerando lo antes expuesto esta entidad prorrogara el termino de ejecución del presente contrato a fin de cumplir con los fines perseguidos con dicha contratación, en atención a la recomendación efectuada por la interventoría.

DECIMA PRIMERA: Mediante nota interna de fecha 13 de septiembre de 2024 el secretario de obras públicas municipales remitió solicitud para la formalización de prorroga de obra publica No LP-013-2022, tal como seguidamente se evidencia:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 7 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

NOTA INTERNA

Tierralta, 13 de septiembre de 2024.

200/198

PARA: **JESÚS DAVID CONTRERAS RODRÍGUEZ**
Alcalde Municipal.

DE: **JORGE ELIECER MUÑOZ CASTILLO**
Secretario de Obras Públicas.

ASUNTO: Solicitud de prorroga al contrato de obra No. LP-013-2022.

Estimado doctor Contreras, cordial saludo

En cumplimiento de mis funciones como Secretario de Obras Públicas del municipio de Tierralta, me permito comunicarle la necesidad de realizar una prórroga por un plazo adicional de 20 días, hasta el 5 de octubre, contados a partir del 15 de septiembre de 2024, que es la actual fecha de terminación del contrato de obra cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".

Los argumentos presentados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados debidamente por la interventoría son los siguientes:

- A corte del día 11 de septiembre del 2024, y una vez realizada conciliación de cantidades entre el Consorcio Puentes de Córdoba y el Consorcio Vial Nacional, el proyecto cuenta con un porcentaje de ejecución del 60,3%
- Durante la ejecución del contrato entre el mes de agosto, se presentaron lluvias de moderadas a fuertes en la obra como se relaciona a continuación:

MES PRESENCIA DE LLUVIA	TOTAL DIAS AFECTADOS
AGOSTO	7
TOTAL	7 DIAS

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

Las lluvias ocurridas durante el mes de agosto han afectado negativamente el rendimiento de las obras, ya que las actividades se están llevando a cabo en la quebrada Severinera, donde no es posible ejecutar en presencia de lluvias. Esto se debe a razones de seguridad, salud en el trabajo y la incomunicación en la zona ocasionada por el aumento del caudal en el arroyo. Además, las precipitaciones en zonas aguas arriba han provocado crecientes adicionales, lo que ha impedido la ejecución segura de las labores. (Se adjunta reporte del IDEAM).



Foto 1. Creciente arroyo por presencia de lluvias aguas arriba. Imposibilita ejecución de actividades obras de protección y construcción de puente

Foto 2. Lluvia en la zona, imposibilita ejecución de actividades de pavimentacion

Foto 3 y 4. Registro fotográfico, comportamiento del arroyo Severinera, cuando hay presencia lluvias aguas arriba

Acogiendo las recomendaciones de la Interventoría Consorcio Vial Nacional, se considera conveniente aprobar la solicitud de prórroga presentada por el contratista Consorcio Puentes de Córdoba, extendiendo el plazo del contrato de obra por 20 días calendario adicionales, hasta el 5 de octubre de 2024. No obstante, se debe tener en cuenta que el contratista continúa con un atraso significativo en la ejecución de las obras, por lo que el trámite relacionado con el posible incumplimiento sigue en curso.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 7 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

Agradeciendo su atención y consideración, confiamos en que, en virtud de las circunstancias expuestas, se pueda conceder la prórroga solicitada y seguir avanzando en la ejecución de este importante proyecto.

Cordialmente,

JORGE [illegible] MUÑOZ CASTILLO
Secretario de Obras Públicas.

Elaboró: Daisy D- Tec. Administrativo
Proyectó: Alvaro M- Contratista Prest. Serv.

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA pública No 013 – 2022, **HASTA EL 05 DE OCTUBRE DE 2024,** suscrito entre el MUNICIPIO DE TIERRALTA entidad territorial del orden local, representada legalmente por el Señor **JESUS DAVID CONTRERAS RODRIGUEZ** persona mayor de edad vecino y conciliado en Tierralta- Córdoba, identificado con la cedula de ciudadanía No 80.796.556 de Tierralta, en su calidad de Alcalde Municipal y el **CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA**, identificado con Nit No. 901627711-9 representado por el señor **MARIO ALBERTO PETRO REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.203.584 DE CARTAGENA, que tiene por objeto la **"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

CLÁUSULA SEGUNDA: La presente prorroga no genera pagos adicionales al contratista de los que ya vienen previsto para dicho contrato por acuerdo entre las partes.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

PRORROGA 7 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: **CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar las garantías suscritas en el contrato de obra LP-013-2022, conforme a la presente prorroga.

CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del contrato quedaran de la manera establecida inicialmente.

Para constancia se firma en el municipio de Tierralta, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2024.

JESUS DAVID CONTRERAS RODRIGUEZ.
Alcalde
MUNICIPIO DE TIERRALTA
ENTIDAD CONTRATANTE.

CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.
Nit No.901627711-9,
R/L. MARIO ALBERTO PETRO REYES.
C.C. No. 73.203.584 DE CARTAGENA.
CONTRATISTA.

Proyecto: Sebastián R- Abogado Contratista
Reviso: Ciro & Montoya S.A.S.

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	13

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2024	02	09	2022	00:00	05	10	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO No. 013 DE 2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA BEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOSDEPLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

NOTA:
-CALIDAD DEL SERVICIO SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA.
- EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL MPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022	05/04/2025	$1,615,381,447.00	$1,615,381,447.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/09/2022	05/10/2027	$1,476,920,964.40	$1,476,920,964.40
CALIDAD DEL SERVICIO	02/09/2022	05/10/2029	$18,211,446.00	$18,211,446.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/09/2022	05/04/2025	$738,460,482.20	$738,460,482.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/10/2024	05/10/2029	$2,215,381,446.60	

ACLARACIONES

DE ACUERDO AL COMUNICADO DE LA ENTIDAD SE AJUSTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA A PARTIR DEL 05/10/2024 HASTA EL 05/10/2029 DEL CONTRATO No 013 DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****6,064,355,786.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AXEGURO LIMITADA	235508	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

250

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	13

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2024	02	09	2022	00:00	05	10	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.627.711-9

DIRECCION: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

(ASEGURADO) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TIERRALTA — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.096.807-0

DIRECCION: CALLE 6 # 14-13 — CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA — TELEFONO: 7771553

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3458323 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CRISTIANCHAPARRO

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101054903, anexo 13, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2024

36-44-101054903

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101054903	13

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2024	02	09	2022	00:00	05	10	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA	TELÉFONO: 7771553
ADICIONAL:		

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****6,064,355,786.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AXEGURO LIMITADA	235508	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2024	02	09	2022	00:00	05	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN: CL 32 NRO 15 - 52 BRR EL EDEN — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13 — CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA — TELÉFONO: 7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1320-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 32-03-22 -1320-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 013 DE2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTEVEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCODELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	05/10/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	05/10/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	05/10/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA 7 AL CONTRATO LP No. 013 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. DE FECHA 13/09/2024, SE PRORROGA HASTA EL 05/10/2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******85,479.00	$ *******3,000.00	$ ******16,811.00	$ **********105,290.00	$ ******650,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AXEGURO LIMITADA	235508	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2024	02	09	2022	00:00	05	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	05/10/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	05/10/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10,00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	05/10/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10,00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	02/09/2022	05/10/2024	$650,000,000.00	$650,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIRLAYALBINO 2

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	11

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2024	02	09	2022	00:00	05	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA		NIT: 901.627.711-9
DIRECCION: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELEFONO: 3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE TIERRALTA		NIT: 800.096.807-0
DIRECCION: CALLE 4 # 14-13	CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA		TELEFONO: 7771553

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCON SAS	800043463-3	55.00
IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.	901320275-1	40.00
CONSTRUCTORA TERLUZ SAS	901407951-6	5.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-40-101021458

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIRLAYALBINO

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-40-101021458	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2024	02	09	2022	00:00	05	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	NIT: 901.627.711-9	CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN	MONTERIA, CORDOBA	3103638103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT: 800.096.807-0	CALLE 4 # 14-13	TIERRALTA, CORDOBA	7771553

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******85,479.00	$ *******3,000.00	$ ******16,811.00	$ **********105,290.00	$ ******650,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AXEGURO LIMITADA	235508	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11007104045167(3900)000000105290(96)20230902

REFERENCIA PAGO: 1100710404516-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Scanned with CamScanner



en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627231	6	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	X - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 58 13-12	MONTERIA-CORDOBA	7843714	


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite Pago		Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	10220063545	9476678333	E	2024/10/03	2024/10/03	BANCOLOMBIA	0	$7,423,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES			
	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1063789024	ALEAN SUAREZ CARLOS ANDRES		X																231001	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF16	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	N	$53,900
2	CC	1063053517	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAUTH																		23-54	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$276,000	30	$0	$0	SI	$1,236,000
3	CC	1003045101	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	X	X																230301	5	$216,667	$34,700	EPS001	5	$216,667	$8,700	CCF16	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	SI	$67,200
4	CC	1041342753	PEREZ HERNANDEZ JHON FREDY		X																230301	4	$173,334	$27,800	CCFC55	4	$173,334	$7,000	CCF16	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
5	CC	15679748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID		X																230301	5	$216,667	$34,700	ESSC07	5	$216,667	$8,700	CCF16	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	SI	$67,200
6	CC	1003674385	ROMAN FUENTES LUISA FERNANDA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$407,500
7	CC	1063281899	ROMAN NARVAEZ MIRIAM BEATRIZ		X																230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF16	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
8	CC	1063274734	SALGADO CASARRUBIA DEIVIS DANIEL		X																230301	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$7,000	CCF16	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
9	CC	1063274713	SALGADO CASARRUBIA JHON CARLOS		X																230301	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$7,000	CCF16	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
10	CC	78673949	SALGADO TIRADO LENGER FRANCISCO	X	X																230301	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF16	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	SI	$67,200
11	CC	15671229	SALUM SEJIN JUAN CARLOS	X	X																231001	6	$400,000	$64,000	EPS041	6	$400,000	$16,000	CCF16	6	$400,000	$16,000	14-11	6	$400,000	$27,600	6	$0	$0	SI	$123,600
12	CC	15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL		X																230301	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF16	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	SI	$67,200
13	CC	15675042	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	X	X																231001	5	$216,667	$34,700	ESSC07	5	$216,667	$8,700	CCF16	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	SI	$67,200
14	CC	78214283	TORRES FERRAO CARLOS ARTURO		X																23-54	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF16	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
Total	Afiliados(14)																					$7,423,339	$1,252,300			$7,423,339	$313,500			$7,800,006	$312,600			$7,423,339	$544,900		$0	$0		$2,423,300

Scanned with CamScanner

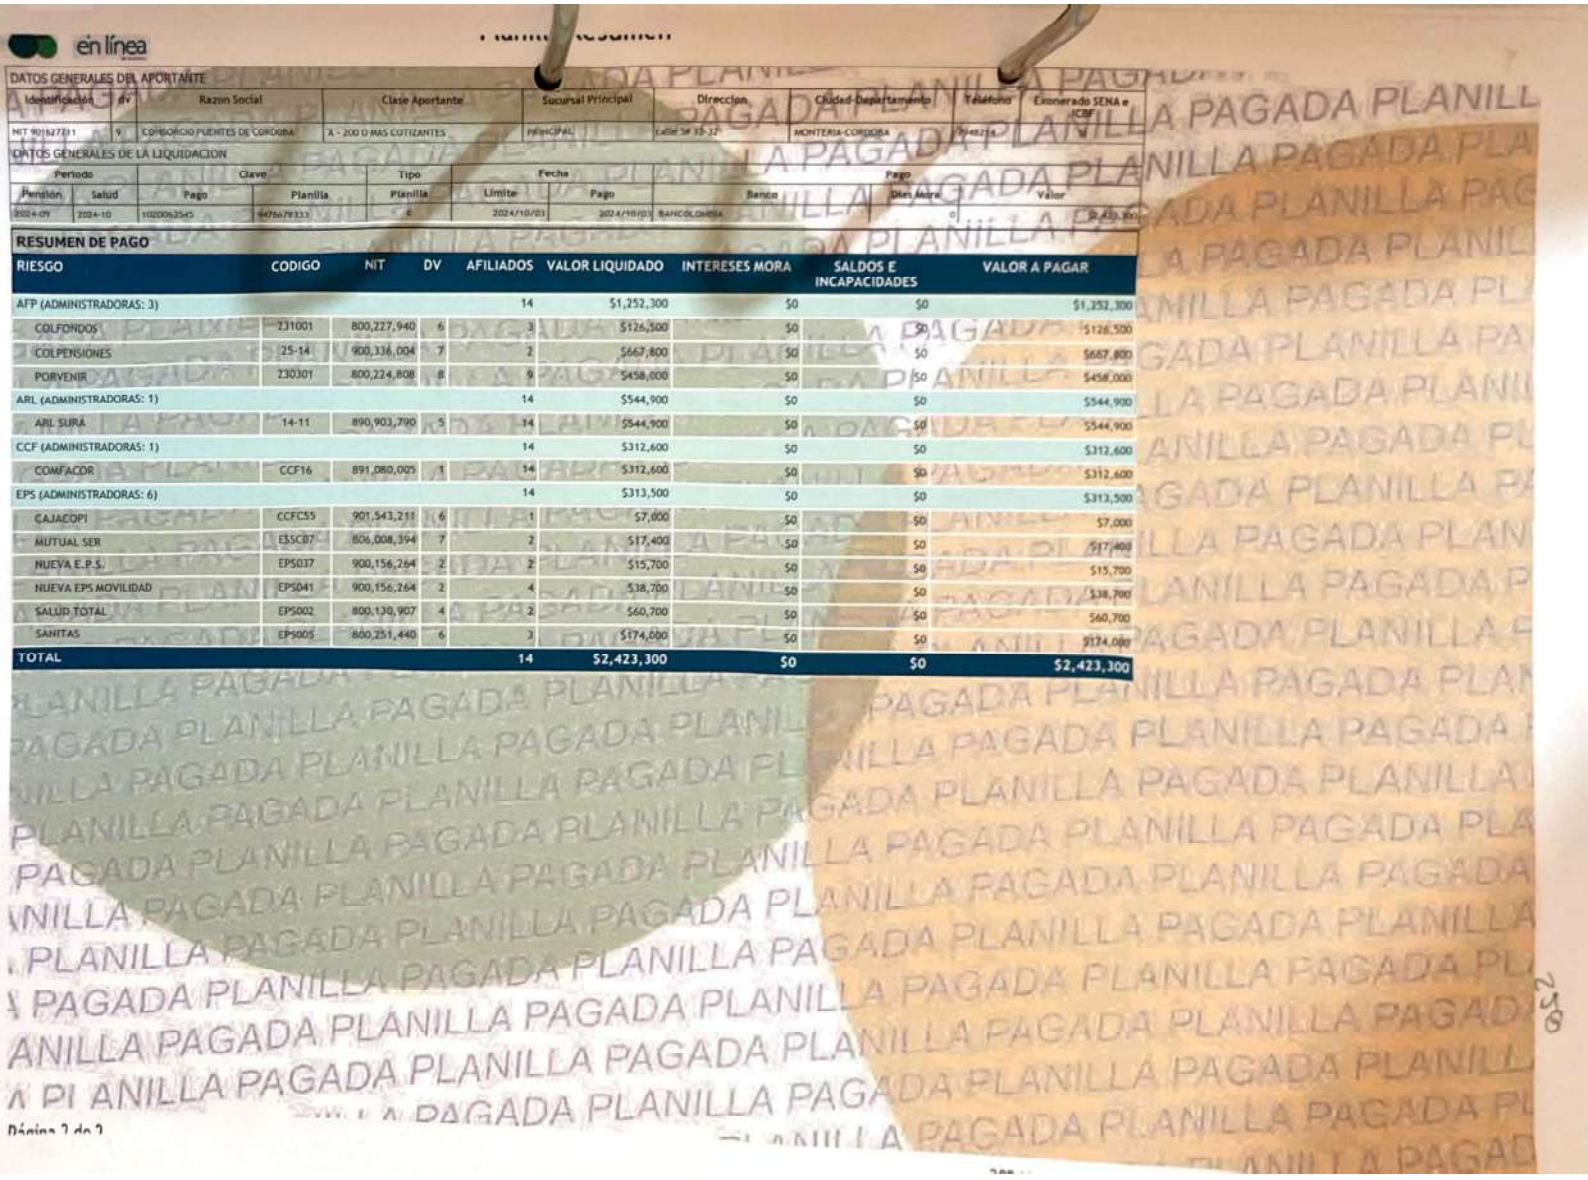

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627311	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 34 35-32	MONTERIA-CORDOBA	7948716	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1020063545	447667833	E	2024/10/03	2024/10/03	BANCOLOMBIA	0	$2,423,300


RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$1,252,300	$0	$0	$1,252,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$126,500	$0	$0	$126,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$667,800	$0	$0	$667,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$458,000	$0	$0	$458,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$544,900	$0	$0	$544,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$544,900	$0	$0	$544,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$312,600	$0	$0	$312,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$312,600	$0	$0	$312,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$313,500	$0	$0	$313,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$7,000	$0	$0	$7,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$17,400	$0	$0	$17,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$15,700	$0	$0	$15,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$38,700	$0	$0	$38,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$60,700	$0	$0	$60,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$174,000	$0	$0	$174,000
TOTAL				**14**	**$2,423,300**	**$0**	**$0**	**$2,423,300**

Página 2 de 2

Scanned with CamScanner


en línea
PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
Razón Social
Clase Aportante
Sucursal Principal
Dirección
Ciudad
Teléfono
CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
A - 200 O MAS COTIZANTES
PRINCIPAL
MONTERIA CORDOBA
Periodo
Clase
Tipo
Fecha
Pago
Planilla
Pago
Banco
Valor
EMPLEADO
NOVEDADES
PENSION
SALUD
CCF
RIESGOS
PARAFISCALES
Afiliados(14)
259

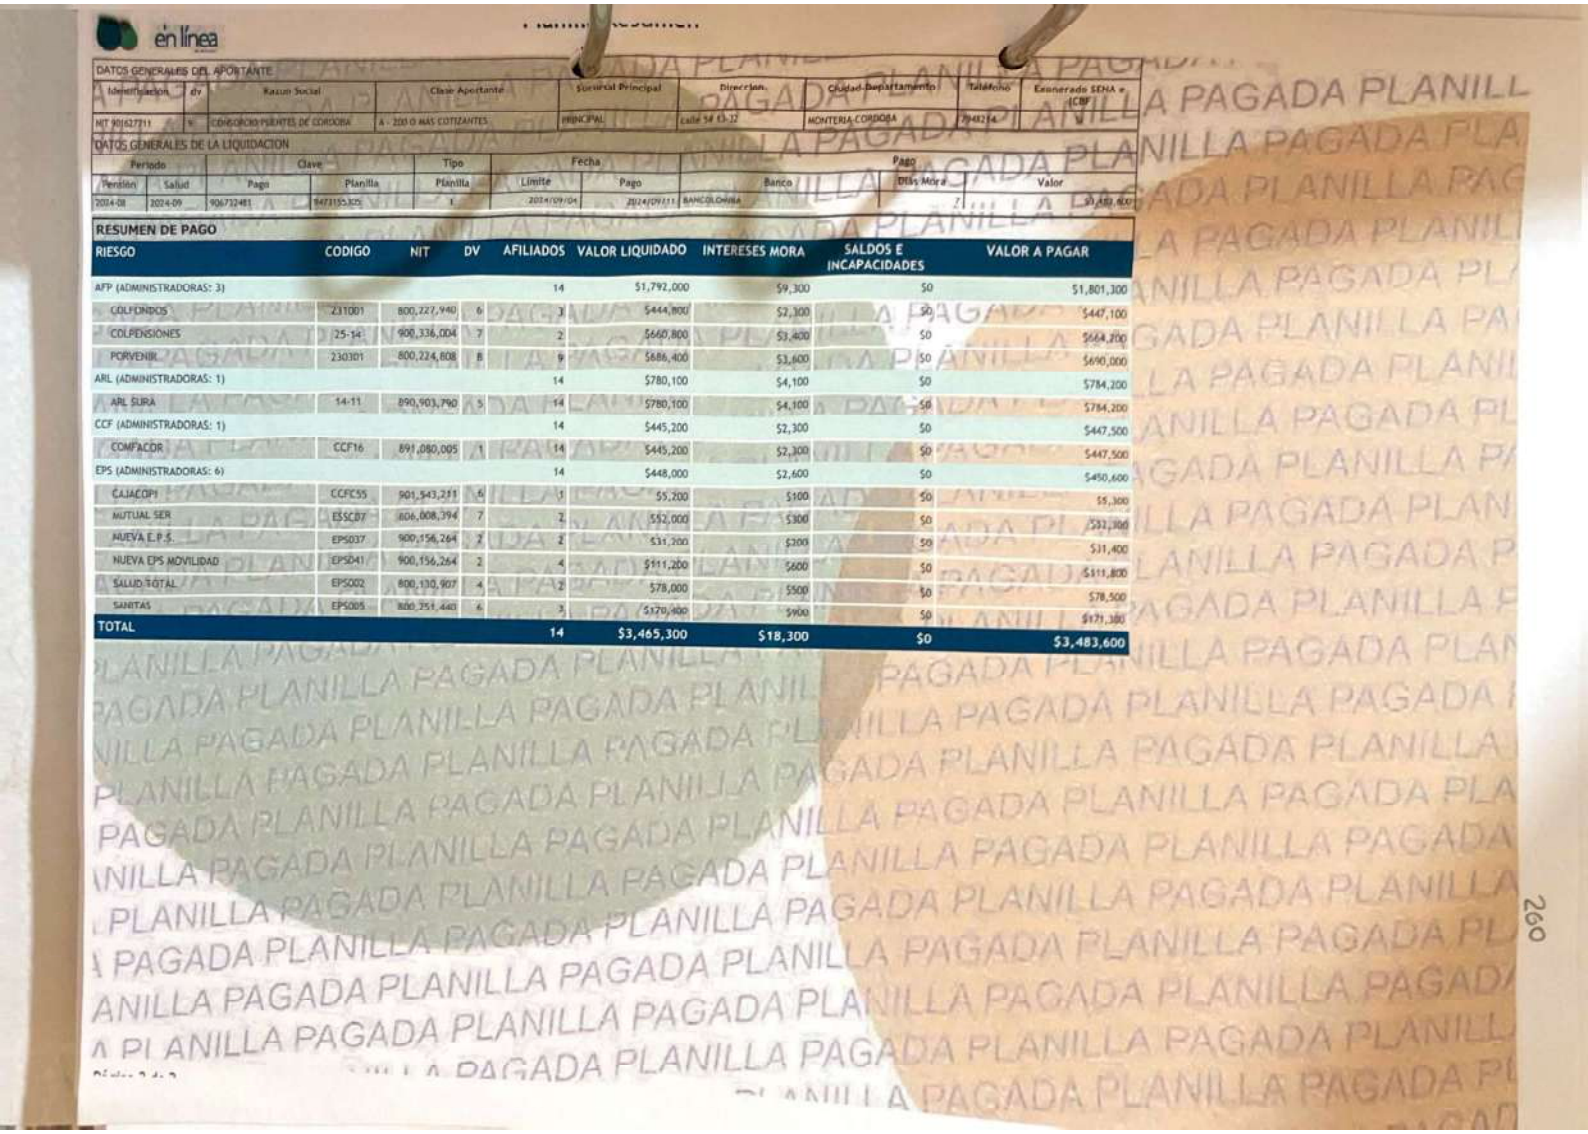

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	5	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 43-22	MONTERIA CORDOBA	7948214	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	906732481	8473155305	I	2024/09/04	2024/09/11	BANCOLOMBIA	7	$3,483,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$1,792,000	$9,300	$0	$1,801,300
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	3	$444,800	$2,300	$0	$447,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$660,800	$3,400	$0	$664,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$686,400	$3,600	$0	$690,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$780,100	$4,100	$0	$784,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$780,100	$4,100	$0	$784,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$445,200	$2,300	$0	$447,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$445,200	$2,300	$0	$447,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$448,000	$2,600	$0	$450,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,251	6	1	$5,200	$100	$0	$5,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$52,000	$300	$0	$52,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$31,200	$200	$0	$31,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPSD41	900,156,264	2	4	$311,200	$600	$0	$311,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$78,000	$500	$0	$78,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$170,400	$900	$0	$171,300
TOTAL				**14**	**$3,465,300**	**$18,300**	**$0**	**$3,483,600**

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 15-37	MONTERIA-CORDOBA	7948214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	842387640	94709803 17	E	2024/08/05	2024/08/14	BANCOLOMBIA	9	$2,679,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES				
	Identificacion		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN JUDITH																		23-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF116	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,800,000	$278,400	30	$0	$0	N	$1,278,400
2	CC	1007744620	GONZALEZ GUTIERREZ AMORES FELIPE	X	X																230301	3	$130,000	$20,800	ESSC37	3	$130,000	$5,200	CCF116	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$8,100	3	$0	$0	N	$48,100
3	CC	1003045101	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	X	X																230301	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF116	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$216,667	$13,100	5	$0	$0	N	$64,300
4	CC	15679748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	X	X																230301	5	$216,667	$34,700	ESSC37	5	$216,667	$8,700	CCF116	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$13,100	5	$0	$0	N	$67,200
5	CC	1007674385	ROMAN FUENTES LUISA FERNANDA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF116	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
6	CC	1063083086	SALGADO OVIEDO LAURI ANTONIO	X	X																230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF116	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$173,334	$10,100	4	$0	$0	N	$53,100
7	CC	15611229	SALUDO SERNA JUAN CARLOS																		231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF116	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,000	30	$0	$0	N	$619,000
8	CC	1066748433	SANDOVAL RODRIGUEZ AMORES GUILLERMO	X	X																230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF116	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$8,100	3	$0	$0	N	$48,100
9	CC	15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL	X	X																230301	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF116	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$13,100	5	$0	$0	N	$64,300
10	CC	1063081342	ZABALA ALVIS VICTOR AMORES	X	X																230301	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$219,667	$8,700	CCF116	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$216,667	$13,100	5	$0	$0	N	$64,300
Total	Afiliados(10)																						$4,600,002	$1,376,200			$4,600,002	$344,300			$4,554,669	$347,600			$4,800,002	$598,800		$0	$0		$2,660,900

2024/08/14 05:57 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627211	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 58 15-12	MONTERIA CORDOBA	7948214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-08	842387640	9470980317	E	2024/08/05	2024/08/14	BANCOLOMBIA	9	$2,679,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,376,200	$9,300	$0	$1,385,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$2,200	$0	$322,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$4,300	$0	$644,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$416,200	$2,800	$0	$419,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$598,800	$4,100	$0	$602,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$598,800	$4,100	$0	$602,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$341,600	$2,300	$0	$343,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	10	$341,600	$2,300	$0	$343,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$344,200	$2,500	$0	$346,700
AUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$13,900	$100	$0	$14,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$12,200	$100	$0	$12,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$97,400	$700	$0	$98,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$60,700	$500	$0	$61,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$1,100	$0	$161,100
TOTAL				10	$2,660,800	$18,200	$0	$2,679,000

2024/08/14 05:57 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 58 53-37	MONTERIA-CORDOBA	7948214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	820635194	94697200035	E	2024/07/04	2024/08/05 BANCOLOMBIA	32	$2,402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificacion		Nombre	NOVEDADES ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	dp	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN ALAITH																		25-14	30	$4,000,000	$440,000	EPS025	30	$4,000,000	$560,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	N	$1,438,400
2	CC	10950737	MARTINEZ CABRALES JAVIER DAVID	X	X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
3	CC	6844753	ORTEGA MARTINEZ FIDEL ENRIQUE	X	X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	N	$13,700
4	CC	1003045101	PAYARES ATAZO MIGUEL ENRIQUE	X	X																230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	N	$132,500
5	CC	15679748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	X	X																230301	10	$433,334	$69,400	ESSC07	10	$433,334	$17,400	CCF16	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	N	$134,400
6	CC	1007674385	ROMAN FUENTES, LUISA FERNANDA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
7	CC	1063080388	SALGADO OVIEDO JAIR ANTONIO	X	X																230309	5	$216,667	$34,700	EPS012	5	$216,667	$8,700	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	N	$66,300
8	CC	6614053	SALGADO TIRADO JUAN FRANCISCO	X	X																25-14	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	N	$13,500
9	CC	15611229	SALUM SEJIN JUAN CARLOS																		231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,300	30	$0	$0	N	$619,300
10	CC	15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL	X	X																230301	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF16	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	N	$67,200
11	CC	15675043	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	X	X																231001	5	$216,667	$34,700	ESSC07	5	$216,667	$8,700	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	N	$66,300
12	CC	1063087342	ZABALA ALVIS VICTOR AMORES	X	X																230301	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	N	$66,300
Total		Afiliados(12)																					$9,163,338	$1,466,600			$9,163,338	$367,000			$9,842,005	$562,100			$9,163,338	$638,100		$0	$0		$3,034,000

2024/08/14 05:56 PM

263

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901427711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-37	MONTERIA-CORDOBA	7948214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	820635194	9469720035	E	2024/07/04	2024/08/05	BANCOLOMBIA	32	$2,902,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,466,600	$35,400	$0	$1,502,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$354,700	$8,600	$0	$363,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$647,000	$15,600	$0	$662,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$457,900	$11,000	$0	$468,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,000	$200	$0	$7,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$638,200	$15,400	$0	$653,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$638,200	$15,400	$0	$653,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$362,200	$8,700	$0	$370,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	12	$362,200	$8,700	$0	$370,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$367,000	$9,000	$0	$376,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$27,900	$700	$0	$28,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$10,500	$300	$0	$10,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$99,200	$2,400	$0	$101,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$69,400	$1,700	$0	$71,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$3,900	$0	$163,900
TOTAL				**12**	**$2,834,000**	**$68,500**	**$0**	**$2,902,500**

2024/08/14 05:56 PM

264

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627791	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	7369446497	94682180255	E	2024/06/06	2024/06/05	BANCOLOMBIA	0	$2,919,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 26203317	CARRASCAL LEORENTE AYLEH MAUTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
2	CC 10950737	MARTINEZ CABRALES JAVIER DAVID	230201	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF16	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,300	3	$0	$0
3	CC 6844753	ORTEGA MARTINEZ FIDEL ENRIQUE	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF16	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
4	CC 1003045101	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
5	CC 15679748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	15	$650,000	$104,000	ESSC07	15	$650,000	$26,000	CCF16	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,500	15	$0	$0
6	CC 1002674385	ROMAN FUENTES LUISA FERNANDA	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS002	25	$1,083,334	$43,400	CCF16	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
7	CC 1063080388	SALGADO OVIEDO JAIR ANTONIO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF16	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
8	CC 78672949	SALGADO TIRADO JERGER FRANCISCO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF16	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
9	CC 15611229	SALUM SEJIN JOAN CARLOS	231001	22	$1,466,667	$234,700	EPS041	22	$1,466,667	$58,700	CCF16	22	$1,466,667	$58,700	14-11	22	$1,466,667	$103,100	22	$0	$0
10	CC 1047119879	TORO MORALES DEHIS MANUEL	230301	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF16	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,500	15	$0	$0
11	CC 15675042	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	231001	10	$433,334	$69,400	ESSC07	10	$433,334	$17,400	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
12	CC 1063081342	ZABALA ALEYIS VICTOR ANDRES	230301	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
Total	Afiliados(12)				$9,280,003	$1,485,100			$9,280,003	$371,500			$9,154,003	$366,400			$9,280,003	$646,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,485,100	$25,900	$0	$1,511,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$304,100	$5,300	$0	$309,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$11,100	$0	$651,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$520,200	$9,100	$0	$529,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$20,800	$400	$0	$21,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$646,500	$11,300	$0	$657,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$646,500	$11,300	$0	$657,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$366,400	$6,400	$0	$372,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	12	$366,400	$6,400	$0	$372,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$371,500	$6,700	$0	$378,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$43,400	$800	$0	$44,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$12,200	$300	$0	$12,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS043	900,156,264	2	4	$95,100	$1,700	$0	$96,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$60,800	$1,100	$0	$61,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$2,800	$0	$162,800
TOTAL				12	$2,869,500	$50,300	$0	$2,919,800

2024/06/28 03:44 PM

295

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7848214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	6320620130	94653190101	E	2024/04/03	2024/05/10	BANCOLOMBIA	37	$1,277,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAUTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400	$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,000	$19,900	$0	$659,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$19,900	$0	$659,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,400	$8,700	$0	$287,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$278,400	$8,700	$0	$287,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$5,000	$0	$165,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$160,000	$5,000	$0	$165,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$5,000	$0	$165,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$5,000	$0	$165,000
TOTAL				**1**	**$1,238,400**	**$38,600**	**$0**	**$1,277,000**

2024/05/31 10:39 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-12	MONTERIA-CORDOBA	7948214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	632062030	9465390101	E	2024/04/03	2024/05/10	BANCOLOMBIA	37	$1,277,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAIDTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000		1	$4,000,000	$160,000	$4,000,000	$278,400		$0	$0


RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,000	$19,900	$0	$659,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$19,900	$0	$659,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,400	$8,700	$0	$287,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$278,400	$8,700	$0	$287,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$5,000	$0	$165,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$160,000	$5,000	$0	$165,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$5,000	$0	$165,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$5,000	$0	$165,000
TOTAL				1	$1,238,400	$38,600	$0	$1,277,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/05/31 10:39 AM

Scanned with CamScanner

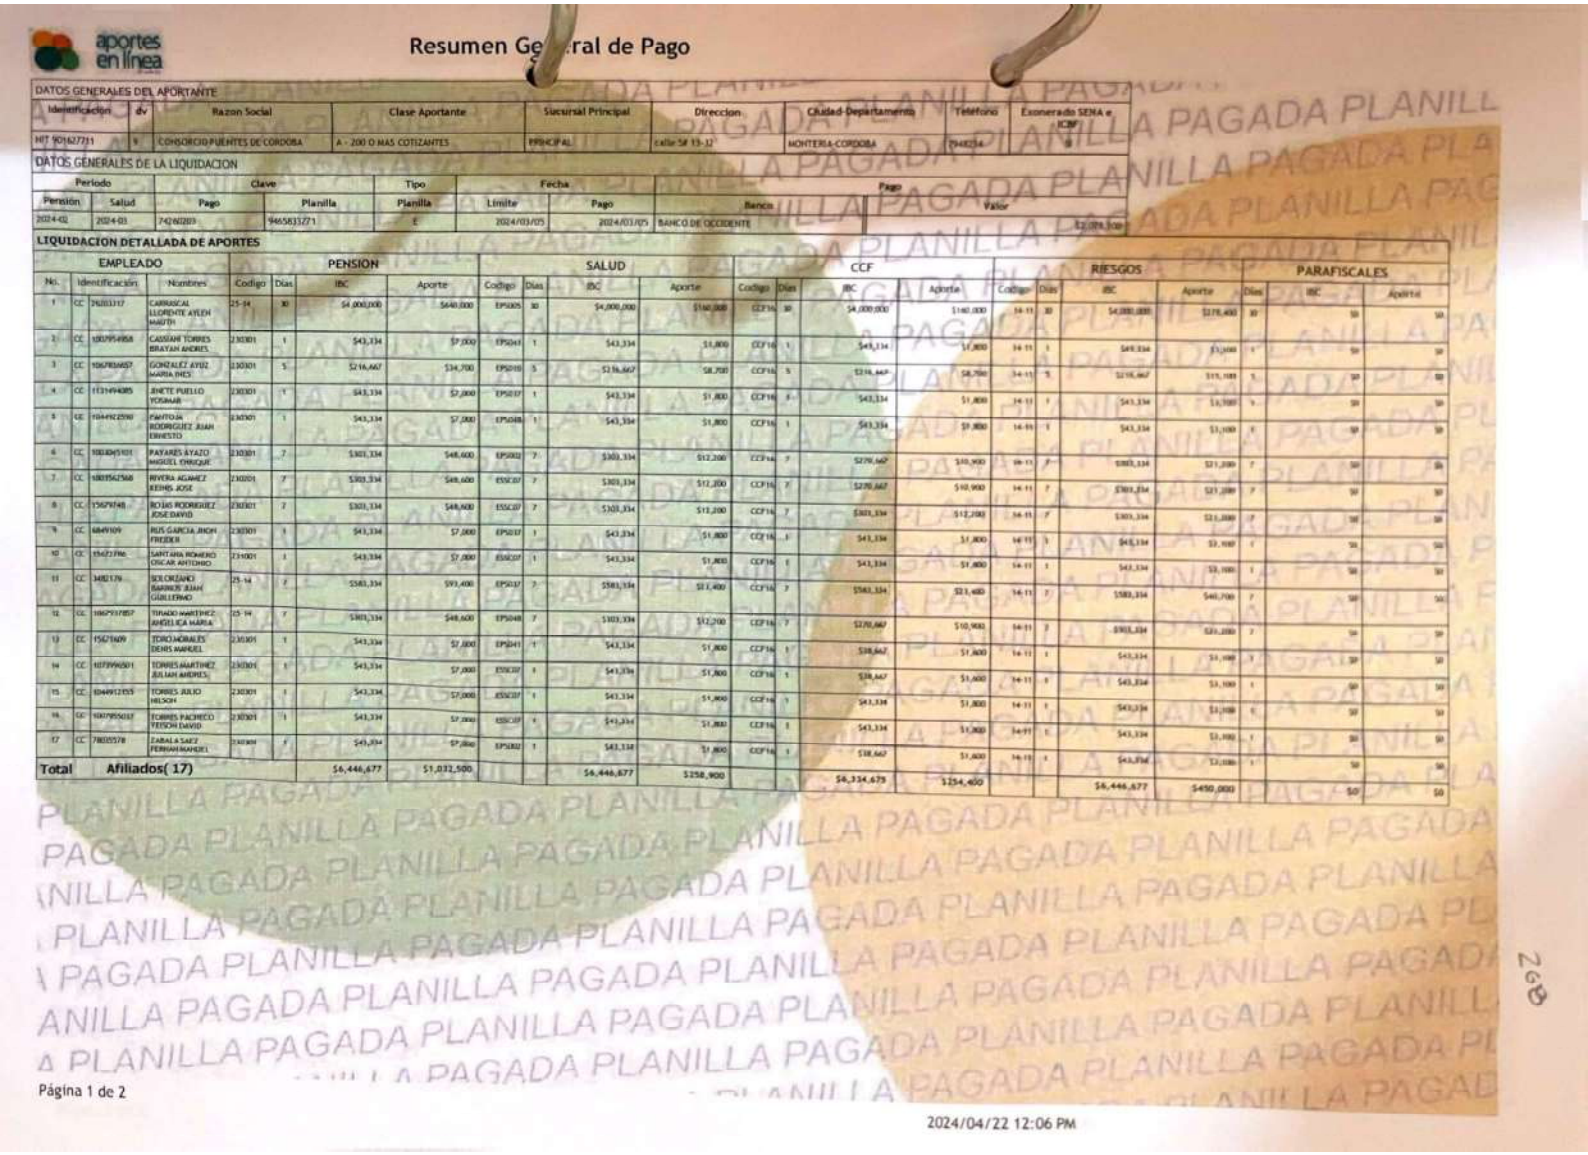

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO FUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 58 13-12	MONTERIA-CORDOBA	7948234	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-03	742602203	9465833271	E	2024/03/05	2024/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	$2,074,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MARTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
2	CC	1002954958	CASSIANI TORRES BRAYAN ANDRES	230301	1	$43,334	$7,000	EPS043	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
3	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	5	$216,667	$34,700	EPS010	5	$216,667	$8,700	CCF16	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
4	CC	1131494085	JINETE PUELLO YOSMAR	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
5	CC	1044922590	PANTOJA RODRIGUEZ JUAN ERNESTO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS048	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
6	CC	1003045101	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$303,334	$21,700	7	$0	$0
7	CC	1003562566	RIVERA AGAMEZ KEVIN JOSE	230201	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$303,334	$21,700	7	$0	$0
8	CC	1067974748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF16	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,700	7	$0	$0
9	CC	6849109	RUS GARCIA JHON FREDDI	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
10	CC	15621796	SANTANA ROMERO OSCAR ANTONIO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
11	CC	3492179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	7	$583,334	$93,400	EPS037	7	$583,334	$23,400	CCF16	7	$583,334	$23,400	14-11	7	$583,334	$40,700	7	$0	$0
12	CC	1067937857	TIRADO MARTINEZ ANGELICA MARIA	25-14	7	$303,334	$48,600	EPS048	7	$303,334	$12,200	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
13	CC	15621609	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
14	CC	1073996501	TORRES MARTINEZ JULIAN ANDRES	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
15	CC	1044912155	TORRES JULIO NELSON	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
16	CC	1067955037	TORRES PACHECO YEISON DAVID	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
17	CC	78035578	ZABALA SAEZ FERNAN MANUEL	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
Total	**Afiliados(17)**					$6,446,677	$1,032,500			$6,446,677	$258,900			$6,334,679	$254,400			$6,446,677	$450,000		$0	$0

2024/04/22 12:06 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,032,500	$42,400	$0	$1,074,900
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$7,000	$300	$0	$7,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$782,000	$32,100	$0	$814,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$194,900	$8,000	$0	$202,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$48,600	$2,000	$0	$50,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$450,000	$18,500	$0	$468,500
ARE SURA	14-11	890,903,790	5	17	$450,000	$18,500	$0	$468,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$254,400	$10,500	$0	$264,900
COMFACOR	CCF36	891,080,005	1	17	$254,400	$10,500	$0	$264,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$258,900	$10,900	$0	$269,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$14,000	$600	$0	$14,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$8,700	$400	$0	$9,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$31,600	$1,300	$0	$32,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$27,000	$1,200	$0	$28,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$3,600	$200	$0	$3,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$14,000	$600	$0	$14,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$6,600	$0	$166,600
TOTAL				**17**	**$1,995,800**	**$82,300**	**$0**	**$2,078,100**

2024/04/22 12:06 PM

269

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO FUENTES-DC CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 17-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	472449715	9463422919	E	2024/02/05	2024/02/21	BANCOLOMBIA	18	$1,438,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAITH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$228,400	30	$0	$0
2	CC	1067936657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1003191528	MARQUEZ HISPERUZA JAIDER MANUEL	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
4	CC	1003045101	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
5	CC	15679748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	15672736	SARTANA ROMERO OSCAR ANTONIO	231001	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
7	CC	3682179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
8	CC	1067937857	TIRADO MARTINEZ ANGELICA MARIA	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS048	15	$650,000	$26,000	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$650,000	$45,200	15	$0	$0
9	CC	15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	7	$303,334	$48,600	EPS041	7	$303,334	$12,200	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
10	CC	15675042	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	231001	2	$86,667	$13,900	ESSC07	2	$86,667	$3,500	CCF16	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
11	CC	1073996503	TORRES MARTINEZ JULIAN ANDRES	230301	12	$520,000	$83,200	ESSC07	12	$520,000	$20,800	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$520,000	$36,300	12	$0	$0
12	CC	78035578	ZABALA SAEZ FERNAR MANUEL	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
Total	**Afiliados(12)**					$10,920,003	$1,747,500			$10,920,003	$437,100			$10,728,669	$429,500			$10,920,003	$760,600		$0	$0

2024/04/15 11:47 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,747,500	$28,500	$0	$1,776,000
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	2	$20,900	$400	$0	$21,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,144,000	$18,600	$0	$1,162,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$582,600	$9,500	$0	$592,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$760,600	$12,400	$0	$773,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$760,600	$12,400	$0	$773,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$429,500	$7,000	$0	$436,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	12	$429,500	$7,000	$0	$436,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$437,100	$7,400	$0	$444,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$26,000	$500	$0	$26,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$900	$0	$52,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$78,100	$1,300	$0	$79,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000	$1,700	$0	$101,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$12,200	$200	$0	$12,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$8,800	$200	$0	$9,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$2,600	$0	$162,600
TOTAL				**12**	**$3,374,700**	**$55,300**	**$0**	**$3,430,000**

2024/04/15 11:47 AM

271

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	433971502	94625997 45	E	2024/01/04	2024/01/05	BANCOLOMBIA	12	$3,389,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	26333317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAUTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$336,400	30	$0	$0
2	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1003191520	MARQUEZ HISPERUZA JAIDER MANUEL	230301	12	$464,000	$74,300	EPS002	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
4	CC	15679748	BOJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	3482179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
6	CC	15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
7	CC	1073996501	TORRES MARTINEZ JULIAN ANDRES	230301	12	$464,000	$74,300	ESSC07	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
8	CC	78035578	ZABALA SAEZ FERNAN MANUEL	230301	11	$425,334	$68,100	EPS002	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,600	11	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$10,637,334	$1,702,200			$10,637,334	$425,700			$10,637,334	$425,700			$10,637,334	$740,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,702,200	$49,100	$0	$1,751,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,040,000	$30,000	$0	$1,070,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$662,200	$19,100	$0	$681,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$740,600	$21,400	$0	$762,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$740,600	$21,400	$0	$762,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$425,700	$12,300	$0	$438,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	$425,700	$12,300	$0	$438,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$425,700	$12,600	$0	$438,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$1,400	$0	$47,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$65,000	$1,900	$0	$66,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000	$2,900	$0	$102,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$18,600	$600	$0	$19,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$35,700	$1,100	$0	$36,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$4,700	$0	$164,700
TOTAL				**8**	**$3,294,200**	**$95,400**	**$0**	**$3,389,600**

2024/04/15 11:45 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	548087702	9460504508	E	2023/12/05	2023/12/19	BANCOLOMBIA	14	$3,305,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
2	CC	26202317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAITH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
3	CC	1066729219	DIAZ LAMBRAÑO OVER SEGUNDO	230201	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
4	CC	1133796343	FLOREZ HERNANDEZ ONLEY ANDRES	230301	5	$193,334	$31,000	ESSC07	5	$193,334	$7,800	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
5	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	7285857	MARTINEZ CARMONA JOSE ARTURO	230301	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
7	CC	1003045101	PAVARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
8	CC	1003562568	RIVERA AGAMEZ KEVIN JOSE	230201	5	$193,334	$31,000	ESSC07	5	$193,334	$7,800	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
9	CC	15679748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1192895125	ROMERO FLOREZ ROMULO	230201	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
11	CC	6618213	SALGADO TIRADO JUAN FRANCISCO	25-14	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
12	CC	78627949	SALGADO TIRADO LENGER FRANCISCO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
13	CC	1192895150	SANDOVAL AGUILAR JUAN PABLO	230301	3	$116,000	$18,600	CCFC55	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
14	CC	1064188428	SANDOVAL FLOREZ OMAR ANTONIO	230301	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
15	CC	3482179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
16	CC	15671609	TORO MORALES DEIBIS MANUEL	230301	5	$193,334	$31,000	EPS041	5	$193,334	$7,800	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
17	CC	15679542	TORO SARDONAL LUIS ALBERTO	231001	3	$116,000	$18,600	ESSC07	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
18	CC	1072994501	TORRES MARTINEZ JULIAN ANDRES	230301	3	$116,000	$18,600	ESSC07	3	$116,000	$4,700	CCF16	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$10,521,337	$1,684,000			$10,521,337	$421,700			$10,521,337	$421,700			$10,521,337	$732,800		$0	$0

2023/12/19 10:52 AM

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,684,000	$23,100	$0	$1,707,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$18,600	$300	$0	$18,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,046,200	$14,300	$0	$1,060,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$551,000	$7,500	$0	$558,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$68,200	$1,000	$0	$69,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$732,800	$10,000	$0	$742,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$732,800	$10,000	$0	$742,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$421,700	$5,800	$0	$427,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	18	$421,700	$5,800	$0	$427,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$421,700	$6,000	$0	$427,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$4,700	$100	$0	$4,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$700	$0	$47,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$73,000	$1,000	$0	$74,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$111,000	$1,600	$0	$112,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$12,500	$200	$0	$12,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$6,300	$100	$0	$6,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$167,800	$2,300	$0	$170,100
TOTAL				18	$3,260,200	$44,900	$0	$3,305,100

2023/12/19 10:52 AM

291

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	5	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	323793531	5458740886	E	2023/11/03	2023/12/07	BANCO DAVIVIENDA	34	$4,810,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	23030101	30	$1,160,000	$185,600	EPS025	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1003046257	CARDENAS FLOREZ LISETH PAOLA	23020101	12	$464,000	$74,200	ESSC07	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
3	CC	26202317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAITH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
4	CC	1133794343	FLOREZ HERNANDEZ ORLEY ANDRES	23030101	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1067936457	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	23030101	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1077662704	OVIEDO MERCADO AMBERT ALFONSO	23030101	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
7	CC	1003045101	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	23030101	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
8	CC	1003562588	RIVERA AGAMEZ KEVIN JOSE	23020101	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1067967748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	23030101	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	6618233	SALGADO TIRADO JUAN FRANCISCO	25-14	7	$270,667	$43,400	ESSC07	7	$270,667	$10,900	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
11	CC	78677949	SALGADO TIRADO LENGER FRANCISCO	23030101	7	$270,667	$43,400	EPS017	7	$270,667	$10,900	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
12	CC	3482179	SOLORZANO BARROS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$400,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
13	CC	15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL	23030101	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC	15675042	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	23030101	7	$270,667	$43,400	ESSC07	7	$270,667	$10,900	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
Total	**Afiliados(14)**					$15,045,335	$2,407,700			$15,045,335	$602,200			$15,045,335	$602,200			$15,045,335	$1,047,000		$0	$0

2023/12/07 09:50 AM

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$2,407,700	$81,000	$0	$2,488,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$43,400	$1,500	$0	$44,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,083,400	$36,400	$0	$1,119,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,021,000	$34,300	$0	$1,055,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$259,900	$8,800	$0	$268,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,047,800	$35,200	$0	$1,083,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,047,800	$35,200	$0	$1,083,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$602,200	$20,300	$0	$622,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$602,200	$20,300	$0	$622,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$602,200	$20,500	$0	$622,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$1,600	$0	$48,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$179,600	$6,100	$0	$185,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$112,500	$3,800	$0	$116,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$1,600	$0	$48,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$10,900	$400	$0	$11,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,400	$7,000	$0	$213,400
TOTAL				14	$4,659,900	$157,000	$0	$4,816,900

2023/12/07 09:50 AM

2 de 2

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900627791	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7840114	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	240523672	9457435819	E	2023/10/04	2023/10/24	BANCO DAVIVIENDA		$1,858,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	ALVAREZ MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$46,400	30	$0	$0
2	CC	78395386	AGRESOTT JAIR	231001	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
3	CC	78689953	ALVAREZ REINALDO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
4	CC	1003048257	CARDENAS LISETH	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$46,400	30	$0	$0
5	CC	162033157	CARRASCAL ATLEN	23-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-15	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
6	CC	10902489	DIAZ ALBEIRO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
7	CC	1003160003	ESPITIA ANDRES	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
8	CC	1133796343	FLOREZ ORLEY	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1067836657	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1073934619	MARTINEZ MANUEL	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
11	CC	6844602	MORALES HECTOR	230201	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
12	CC	1003367665	ORTEGA SEBASTIAN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
13	CC	1077948704	OVIEDO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC	1003045501	PAYARES MIGUEL	230301	12	$464,000	$74,300	EPS002	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-15	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
15	CC	1003962568	RIVERA KEIMIS	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	15670748	ROJAS JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	1063083888	SALGADO JAIR	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
18	CC	1067044493	SALGADO JORGE	230301	12	$464,000	$74,300	ESSC24	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-15	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
19	CC	6618313	SALGADO JUAN	25-14	12	$464,000	$74,300	ESSC07	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-15	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
20	CC	1067729549	SALGADO LERGER	230301	12	$464,000	$74,300	EPS037	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-15	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
21	CC	1063283168	SIERRA JAMER	230301	12	$464,000	$74,300	ESSC24	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-15	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
22	CC	3482179	SOLORZANO JUAN	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-15	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
23	CC	1067716629	TORO DEMIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
24	CC	1067529042	TORO LUIS	231001	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
25	CC	1063081342	ZABALA VICTOR	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
Total	Afiliados(25)				$18,486,670	$2,958,300			$18,486,670	$740,200			$18,486,670	$740,200			$18,486,670	$1,287,300	$0	$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$2,958,300	$0	$3,025,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$12,400	$0	$12,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,114,300	$0	$1,139,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$1,435,600	$0	$1,468,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$396,000	$0	$405,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,287,300	$0	$1,316,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$1,287,300	$0	$1,316,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$740,200	$0	$757,100
COMFACOR	CCF36	891,080,005	1	25	$740,200	$0	$757,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$740,200	$0	$757,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$37,200	$0	$38,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$48,000	$0	$49,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$205,800	$0	$210,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$168,200	$0	$172,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$51,200	$0	$52,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$20,200	$0	$20,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$209,600	$0	$214,400
TOTAL				**25**	**$5,726,000**	**$0**	**$5,856,700**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

2023/10/26 03:57 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion...	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 17-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	240527672	9457435819	E	2023/10/04	2023/10/26	BANCO DAVIVIENDA		19,859,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	78935386	AGRESOT JAIR	231001	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
3	CC	78688953	ALVAREZ REINALDO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
4	CC	1003042257	CARDENAS LISETH	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	26203317	CARRASCAL AYLEN	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-15	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
6	CC	10902489	DIAZ ALBEIRO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
7	CC	1005160003	ESPITIA ANDRES	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
8	CC	1133796343	FLOREZ ORLEY	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1067816657	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1073974619	MARTINEZ MANUEL	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
11	CC	6844602	MORALES HECTOR	230201	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
12	CC	1007367665	ORTEGA SEBASTIAN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
13	CC	1073968704	OVIEDO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC	1003045101	PAYARES MIGUEL	230301	12	$464,000	$74,300	EPS002	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-15	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
15	CC	1003562568	RIVERA KEINIS	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	15679748	ROJAS JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	1063082388	SALGADO JAIR	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
18	CC	1067924493	SALGADO JORGE	230301	12	$464,000	$74,300	ESSC24	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-15	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
19	CC	6418213	SALGADO JUAN	25-14	12	$464,000	$74,300	ESSC07	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-15	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
20	CC	78672949	SALGADO LERGER	230301	12	$464,000	$74,300	EPS037	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-15	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
21	CC	1063282108	SIERRA JAFIER	230301	12	$464,000	$74,300	ESSC24	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-15	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
22	CC	3482179	SOLORZANO JUAN	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-15	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
23	CC	15671609	TORO DENIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
24	CC	15675042	TORO LUIS	231001	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
25	CC	1063081342	ZABALA VICTOR	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-15	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
Total	**Afiliados(25)**					$18,486,670	$2,958,300			$18,486,670	$740,200			$18,486,670	$740,200			$18,486,670	$1,287,300		$0	$0

2023/10/26 03:57 PM

279

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$2,958,300	$0	$3,025,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$12,400	$0	$12,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,114,300	$0	$1,139,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$1,435,600	$0	$1,468,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$396,000	$0	$405,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,287,300	$0	$1,316,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$1,287,300	$0	$1,316,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$740,200	$0	$757,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	$740,200	$0	$757,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$740,200	$0	$757,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$37,200	$0	$38,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$48,000	$0	$49,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$205,800	$0	$210,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$168,200	$0	$172,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$51,200	$0	$52,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$20,200	$0	$20,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$209,600	$0	$214,400
TOTAL				**25**	**$5,726,000**	**$0**	**$5,856,700**

2023/10/26 03:57 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	1722421678	94560581?4	E	2023/09/05	2023/09/20	BANCO DAVIVIENDA	15	$1,189,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	78305386	AGRESOT URZOLA JAIR HUMBERTO	231001	9	$348,000	$55,700	ESSC24	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
3	CC	78689953	ALVAREZ ARTEAGA REINALDO ANTONIO	230301	9	$348,000	$55,700	EPS005	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
4	CC	1003046257	CARDENAS FLOREZ LISETH PAOLA	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	26203317	CARRASCAL VELORENTE AYLEN MAUTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
6	CC	10903489	DIAZ BERNAL ALBEIRO	230301	9	$348,000	$55,700	EPS041	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
7	CC	1005160003	ESPITIA LUENGAS ANDRES FELIPE	230301	9	$348,000	$55,700	EPS002	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
8	CC	1133798343	FLOREZ HERRANDEZ ORLEY ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1073943704	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	1003045101	PAYARES ATAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	9	$348,000	$55,700	EPS002	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
12	CC	1003962368	RIVERA AGAMEZ KEINIS JOSE	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	15629748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC	1063080388	SALGADO OVIEDO JAIR ANTONIO	230301	9	$348,000	$55,700	EPS037	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
15	CC	1067924493	SALGADO ROYOS JORGE LUIS	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC24	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
16	CC	6618213	SALGADO TIRADO JUAN FRANCISCO	25-14	9	$348,000	$55,700	ESSC07	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
17	CC	78672949	SALGADO TIRADO LENGER FRANCISCO	230301	9	$348,000	$55,700	EPS037	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
18	CC	1063282108	SIERRA RAMOS JAVIER ANTONIO	230301	9	$348,000	$55,700	ESSC24	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
19	CC	3482179	SOLORZANO BARRIOS JUAN LUIS LERMIS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
20	CC	15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
21	CC	15675042	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	231001	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
22	CC	1063081342	ZABALA ALVIS VICTOR ANDRES	230301	7	$270,667	$43,400	EPS041	7	$270,667	$10,900	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
Total	**Afiliados(22)**					$19,956,001	$3,193,300			$19,956,001	$799,100			$19,956,001	$799,100			$19,956,001	$1,390,400		$0	$0

2023/09/20 04:30 PM

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$3,193,300	$52,600	$0	$3,245,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$117,600	$2,000	$0	$119,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,095,700	$18,000	$0	$1,113,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$1,608,800	$26,500	$0	$1,635,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$6,100	$0	$377,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,390,400	$22,900	$0	$1,413,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$1,390,400	$22,900	$0	$1,413,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$799,100	$13,200	$0	$812,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	22	$799,100	$13,200	$0	$812,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$799,100	$13,500	$0	$812,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$43,500	$800	$0	$44,300
EPS SURA (ANTES SOSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$800	$0	$47,200
MUTUAL SER	ESSC87	806,008,394	7	6	$215,100	$3,600	$0	$218,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$174,400	$2,900	$0	$177,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$71,300	$1,200	$0	$72,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$28,000	$500	$0	$28,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$220,400	$3,700	$0	$224,100
TOTAL				**22**	**$6,181,900**	**$102,200**	**$0**	**$6,284,100**

2023/09/20 04:30 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO FUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	976876662	9454789869	E	2023/08/03	2023/08/11	BANCO DAVIVIENDA	8	$3,467,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC 78305386	AGRESOT ORZOLA JAIR HUMBERTO	231001	11	$425,334	$68,100	ESSC24	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
3	CC 78638953	ALVAREZ ARTEAGA REINALDO ANTONIO	230301	11	$425,334	$68,100	EPS005	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
4	CC 1003046257	CARDENAS FLOREZ LISETH PAOLA	230201	26	$1,005,334	$160,900	ESSC07	26	$1,005,334	$40,300	CCF16	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	$70,000	26	$0	$0
5	CC 26203117	CARRASCAL FLORENTE AYLEH MAITH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
6	CC 10902489	DIAZ BERNAL ALBEIRO	230301	11	$425,334	$68,100	EPS041	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
7	CC 1005160003	ESPITIA LUENGAS ANDRES FELIPE	230301	13	$502,667	$80,500	EPS002	13	$502,667	$20,200	CCF16	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0
8	CC 1133946343	FLOREZ HERNANDEZ ORLEY ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC 1067836657	GONZALEZ AYUL MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC 1073904704	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC 1003045101	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	13	$502,667	$80,500	EPS002	13	$502,667	$20,200	CCF16	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0
12	CC 1003562568	RIVERA AGAMEZ KEINIS JOSE	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC 15679748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC 1063080388	SALGADO OVIEDO JAIR ANTONIO	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
15	CC 1067924493	SALGADO HOYOS JORGE LUIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC 78672949	SALGADO TIRADO LERGER FRANCISCO	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
17	CC 1063082108	SIERRA RAMOS JAVIER ANTONIO	230301	11	$425,334	$68,100	ESSC24	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
18	CC 3482179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
19	CC 15673609	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
20	CC 15675042	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	231001	V	$348,000	$55,700	ESSC07	V	$348,000	$14,000	CCF16	V	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	V	$0	$0
Total	Afiliados(20)				$20,690,672	$3,311,000			$20,690,672	$828,500			$20,690,672	$828,500			$20,690,672	$1,441,100		$0	$0

2023/08/11 02:29 PM

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$3,311,000	$30,000	$0	$3,341,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$123,800	$1,200	$0	$125,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,040,000	$9,400	$0	$1,049,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$1,800,700	$16,200	$0	$1,816,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$346,500	$3,200	$0	$349,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,441,300	$13,000	$0	$1,454,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$1,441,300	$13,000	$0	$1,454,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$828,500	$7,500	$0	$836,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	20	$828,500	$7,500	$0	$836,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				20	$828,500	$7,900	$0	$836,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$80,600	$800	$0	$81,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$500	$0	$46,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$193,500	$1,800	$0	$195,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$180,600	$1,700	$0	$182,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$63,500	$600	$0	$64,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$40,400	$400	$0	$40,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$223,500	$2,100	$0	$225,600
TOTAL				**20**	**$6,409,300**	**$58,400**	**$0**	**$6,467,700**

2023/08/11 02:29 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO FUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31481929	94533477725	E	2023/07/06	2023/07/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,068,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	78305386	AGRESOT VIRZOLA JAIR HUMBERTO	221001	16	$618,667	$99,000	ESSC24	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
3	CC	78680953	ALVAREZ ARTEAGA REINALDO ANTONIO	230301	15	$580,000	$92,800	EPS005	15	$580,000	$23,200	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
4	CC	26203117	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MARTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,800	30	$0	$0
5	CC	10902489	DIAZ BERNAL ALBEIRO	230301	16	$618,667	$99,000	EPS041	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
6	CC	1133796343	FLOREZ HERNANDEZ ORLEY ANDRES	230301	25	$966,667	$154,700	ESSC07	25	$966,667	$38,700	CCF16	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0
7	CC	1067836457	GONZALEZ AYUS MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	1077963706	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1003562568	RIVERA AGAMEZ KEINIS JOSE	230301	25	$966,667	$154,700	ESSC07	25	$966,667	$38,700	CCF16	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0
10	CC	1067917408	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	1063083388	SALGADO OVIEDO JAIR ANTONIO	230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
12	CC	1067914495	SALGADO MOYOS JORGE LUIS	230301	5	$193,334	$31,000	ESSC24	5	$193,334	$7,800	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
13	CC	78672949	SALGADO TIRADO LEBER EVARISTO	230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
14	CC	1063282108	SIERRA RAMOS JAVIER ANTONIO	230301	16	$618,667	$99,000	ESSC24	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
15	CC	3402179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-04	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
16	CC	1067937857	TIRADO MARTINEZ ANGELICA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	1067716091	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total		Afiliados(17)			$19,260,003	$3,081,800			$19,260,003	$770,800			$19,260,003	$770,800			$19,260,003	$1,341,200		$0	$0

2023/07/06 05:13 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$3,081,800	$0	$0	$3,081,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$99,000	$0	$0	$99,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$0	$0	$1,225,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,602,500	$0	$0	$1,602,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$154,700	$0	$0	$154,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,341,200	$0	$0	$1,341,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,341,200	$0	$0	$1,341,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$770,800	$0	$0	$770,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	$770,800	$0	$0	$770,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$770,800	$0	$0	$770,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$57,400	$0	$0	$57,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$123,800	$0	$0	$123,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$196,000	$0	$0	$196,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$71,200	$0	$0	$71,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$229,600	$0	$0	$229,600
TOTAL				**17**	**$5,964,600**	**$0**	**$0**	**$5,964,600**

2023/07/06 05:13 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7840214	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31491329	94511347775	E	2023/07/06	2023/07/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,661,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	7930586	AGRESOT ORJUELA JAIR HUMBERTO	231001	16	$618,667	$99,000	ESSC24	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-15	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
3	CC	78680953	ALVAREZ ARTEAGA REINALDO ANTONIO	230301	15	$580,000	$92,800	EPS005	15	$580,000	$23,200	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-15	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
4	CC	26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLER MARTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-15	30	$4,000,000	$278,800	30	$0	$0
5	CC	10902489	DIAZ BERNAL ALBEIRO	230301	16	$618,667	$99,000	EPS041	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-15	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
6	CC	1133796343	FLOREZ HERNANDEZ CARLEY ANDRES	230301	25	$966,667	$154,700	ESSC07	25	$966,667	$38,700	CCF16	25	$966,667	$38,700	14-15	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0
7	CC	1067858657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	1077968706	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1003967569	RIVERA AGAMEZ KEWIS JOSE	230301	25	$966,667	$154,700	ESSC07	25	$966,667	$38,700	CCF16	25	$966,667	$38,700	14-15	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0
10	CC	1067957408	ROSAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	1063882388	SALGADO OVIEDO JAIR ANTONIO	230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-15	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
12	CC	1067924693	SALGADO HOYOS JORGE LUIS	230301	5	$193,334	$30,800	ESSC24	5	$193,334	$7,800	CCF16	5	$193,334	$7,800	14-15	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
13	CC	78672949	SALGADO TIRADO JORGE FRANCISCO	230301	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-15	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
14	CC	1063282108	SIERRA RAMOS JAVIER ANTONIO	230301	16	$618,667	$99,000	ESSC24	16	$618,667	$24,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-15	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
15	CE	348219	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-15	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
16	CC	1067937052	TEJADO MARTINEZ ANGELICA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	1067[illegible]	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(17)**				$19,260,003	$3,081,600			$19,260,003	$770,800			$19,260,003	$770,800			$19,260,003	$1,341,100		$0	$0

2023/07/06 05:13 PM

Scanned with CamScanner

en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$3,081,800	$0	$0	$3,081,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$99,000	$0	$0	$99,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$0	$0	$1,225,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,602,500	$0	$0	$1,602,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$154,700	$0	$0	$154,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,341,200	$0	$0	$1,341,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,341,200	$0	$0	$1,341,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$770,800	$0	$0	$770,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	$770,800	$0	$0	$770,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$770,800	$0	$0	$770,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$57,400	$0	$0	$57,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$123,800	$0	$0	$123,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$196,000	$0	$0	$196,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$71,200	$0	$0	$71,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$229,600	$0	$0	$229,600
TOTAL				**17**	**$5,964,600**	**$0**	**$0**	**$5,964,600**

2023/07/06 05:13 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-05	2023-06	2122434508	96459114450	E	2023/06/05	2023/06/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$1,681,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$40,600	30	$0	$0
2	CC	1100689583	ALVAREZ PEREZ CARLOS ANTONIO	230301	3	$193,334	$31,000	ESSC07	3	$193,334	$7,800	CCF16	3	$193,334	$7,800	14-11	3	$193,334	$13,500	3	$0	$0
3	CC	1067960563	ARIAS NAVARRO JOET MIGUEL	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
4	CC	26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAUTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$108,400	30	$0	$0
5	CC	15031799	DE LOS REYES MIGUEL MARIANO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
6	CC	1066729219	DIAZ LAMBRAÑO OVER SEGUNDO	230201	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
7	CC	1133796343	FLOREZ HERNANDEZ ORLEY ANDRES	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
8	CC	1073974405	GONZALEZ ACOSTA FAIDER ELIAR	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
9	CC	1067836057	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$40,600	30	$0	$0
10	CC	1003191520	MARQUEZ MEPEYRIZA JAIDER MANUEL	230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
11	CC	15675038	MARTINEZ RAMOS HECTOR DAVID	231001	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
12	CC	1095037	MARTINEZ CABRALES JAVIER DAVID	230201	9	$348,000	$55,700	EPS041	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
13	CC	1073974619	MARTINEZ MIRANDA MANUEL ALEJANDRO	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
14	CC	1066729226	MONTES SALGADO ALEXIS MANUEL	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
15	CC	6844602	MORALES MARTINEZ HECTOR FABIAN	230201	9	$348,000	$55,700	EPS041	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
16	CC	7902921	NEGRETE FUENTES FRANCISCO JAVIER	230201	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
17	CC	15675070	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE	230301	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
18	CC	6844751	ORTEGA MARTINEZ FIDEL ENRIQUE	230301	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
19	CC	1073968704	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$40,600	30	$0	$0
20	CC	1003045101	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
21	CC	1003045101	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
22	CC	78033729	PEROZA ALVAREZ CARLOS GUSTAVO	230301	9	$348,000	$55,700	EPS041	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
23	CC	1003561568	RIVERA AGAMEZ KEIHIS JOSE	230201	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
24	CC	15679748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$40,600	30	$0	$0
25	CC	1073992766	SALGADO HERNANDEZ CARLOS ARTURO	230201	1	$38,667	$6,200	CCFESS	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
26	CE	3682179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
27	CC	1067931857	TIRADO MARTINEZ ANGELICA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$40,600	30	$0	$0
28	CC	15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0

2023/06/06 09:36 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

29	CC	15673428	TORO MORALES EDUARDO ENRIQUE	230301	10		$386,667		$61,900	EPS048	10		$386,667		$15,500	CCF16	10		$386,667		$15,500	14-11	10		$386,667		$27,800	10			$0	
30	CC	15679042	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	230301	10		$386,667		$61,900	ESSC07	10		$386,667		$15,500	CCF16	10		$386,667		$15,500	14-11	10		$386,667		$27,800	10			$0	
Total			Afiliados(29)				$18,216,007		$2,915,200				$18,216,007		$729,700				$18,216,007		$729,700				$18,216,007		$1,269,500				$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$2,915,200	$3,600	$0	$2,918,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$123,800	$200	$0	$124,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$1,500	$0	$1,227,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$1,250,100	$1,500	$0	$1,251,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$315,700	$400	$0	$316,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,269,500	$1,500	$0	$1,271,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$1,269,500	$1,500	$0	$1,271,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$729,700	$900	$0	$730,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	29	$729,700	$900	$0	$730,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$729,700	$1,400	$0	$731,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$1,600	$100	$0	$1,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$100	$0	$46,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$48,000	$100	$0	$48,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$100,700	$200	$0	$100,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$180,600	$300	$0	$180,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$90,100	$200	$0	$90,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$55,900	$100	$0	$56,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,400	$300	$0	$206,700
TOTAL				**29**	**$5,644,100**	**$7,400**	**$0**	**$5,651,500**

2023/06/06 09:36 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 34 15-12	MONTERIA-CORDOBA	7940214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	20668737239	9450606452	E	2023/05/04	2023/05/08	BANCO DAVIVIENDA	4	$1,776,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC 1067960563	ARIAS NAVARRO JOET MIGUEL	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
3	CC 26203317	CARRASCAL FLORENTE AYLEN MARTH	15-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-15	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
4	CC 150331799	DE LOS REYES MIGUEL MARIANO	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
5	CC 1066739019	DIAZ LAMBRARO OVER SEGUNDO	230201	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-15	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
6	CC 1123796343	FLOREZ HERNANDEZ ORLEY ANDRES	230301	8	$309,334	$49,500	ESS007	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
7	CC 1073974405	GONZALEZ ACOSTA FAIDER ELIAR	230301	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
8	CC 1067836457	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC 1003191520	MARQUEZ ROPERUZA JAIDER MANUEL	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
10	CC 15675038	MARTINEZ RAMOS HECTOR DAVID	231001	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
11	CC 1095007	MARTINEZ CABRALES JAVIER DAVID	230201	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
12	CC 1073074619	MARTINEZ MIRANDA MANUEL ALEJANDRO	230201	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
13	CC 1066729336	MONTES SALGADO ALEXIS MANUEL	230301	8	$309,334	$49,500	EPS010	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
14	CC 6844602	MORALES MARTINEZ HECTOR FABIAN	230201	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-15	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
15	CC 78029211	NEGRETE FUENTES FRANCISCO JAVIER	230201	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-15	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
16	CC 15675070	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
17	CC 6844753	ORTEGA MARTINEZ FIDEL ENRIQUE	230301	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
18	CC 1073968704	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
19	CC 1003045101	PATARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
20	CC 78033729	PEREDA ALVAREZ CARLOS GUSTAVO	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
21	CC 1003562568	RIVERA AGAMEZ KEINIS JOSE	230201	8	$309,334	$49,500	ESS007	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
22	CC 17079748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESS007	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
23	CC 1073997746	SALGADO HERNANDEZ CARLOS ARTURO	230201	8	$309,334	$49,500	COFC00	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
24	CC 3482179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	15-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-15	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
25	CC 1067937857	TIRADO MARTINEZ ANGELICA MARIA	15-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-15	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
26	CC 15671609	TORO MORALES DEHIS MANUEL	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
27	CC 15673428	TORO MORALES EDUARDO ENRIQUE	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
28	CC 15673042	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	231001	8	$309,334	$49,500	ESS037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-15	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
Total	**Afiliados(28)**				$18,564,012	$2,970,600			$18,564,012	$743,100			$18,564,012	$743,100			$18,564,012	$1,293,600		$0	$0

2023/05/08 09:30 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$2,970,600	$14,400	$0	$2,985,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$99,000	$500	$0	$99,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$5,900	$0	$1,231,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$1,286,900	$6,200	$0	$1,293,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$359,100	$1,800	$0	$360,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,293,800	$6,200	$0	$1,300,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$1,293,800	$6,200	$0	$1,300,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$743,100	$3,600	$0	$746,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	28	$743,100	$3,600	$0	$746,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$743,100	$3,700	$0	$746,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$12,400	$100	$0	$12,500
EPS SURA (ANTES SOSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$58,800	$300	$0	$59,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$83,600	$400	$0	$84,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$196,000	$1,000	$0	$197,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$83,700	$400	$0	$84,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$102,200	$500	$0	$102,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,400	$1,000	$0	$207,400
TOTAL				**28**	**$5,750,600**	**$27,900**	**$0**	**$5,778,500**

2023/05/08 09:30 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO FUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2009277811	9449271224	E	2023/04/05	2023/04/05	BANCOLOMBIA	0	$1,859,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC 1067960563	ARIAS NAVARRO JOET MIGUEL	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
3	CC 24303317	CARRASCAL LLORENTE AYLEH NAUTH	15-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
4	CC 15031799	DE LOS REYES MIGUEL MARIANO	230301	13	$502,667	$80,500	EPS002	13	$502,667	$20,200	CCF16	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0
5	CC 1133396343	FLOREZ HERNANDEZ ORLEY ANDRES	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
6	CC 1073974405	GONZALEZ ACOSTA FAIDER ELIAR	230201	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
7	CC 1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC 1003191520	MARQUEZ HISPERUIZA JAIDER MANUEL	230301	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
9	CC 15675038	MARTINEZ RAMOS HECTOR DAVID	231001	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
10	CC 1095902737	MARTINEZ CARRALES JAVIER DAVID	230201	11	$425,334	$68,100	EPS041	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
11	CC 1073974619	MARTINEZ MIRANDA MANUEL ALEJANDRO	230201	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
12	CC 1066729228	MONTES SALGADO ALEXIS MANUEL	230301	8	$309,334	$49,500	EPS010	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
13	CC 15675070	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE	230301	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
14	CC 6844753	ORTEGA MARTINEZ FIDEL ENRIQUE	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
15	CC 1073968704	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC 1003045101	PAYARES AYAZO MIGUEL ENRIQUE	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
17	CC 78033729	PEROZA ALVAREZ CARLOS GUSTAVO	230301	11	$425,334	$68,100	EPS041	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
18	CC 1003562368	RIVERA AGAMEZ KEDIS JOSE	230201	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
19	CC 15679748	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
20	CC 1073992746	SALGADO HERNANDEZ CARLOS ARTURO	230201	8	$309,334	$49,500	COFC95	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
21	CC 3482379	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
22	CC 1067937857	TIRADO MARTINEZ ANGELICA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
23	CC 15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
24	CC 15673418	TORO MORALES EDUARDO ENRIQUE	230301	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF16	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
25	CC 15675042	TORO SANDOVAL LUIS ALBERTO	231001	11	$425,334	$68,100	ESSC07	11	$425,334	$17,100	CCF16	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
Total	Afiliados(25)				$18,912,009	$3,026,500			$18,912,009	$757,300			$18,912,009	$757,300			$18,912,009	$1,318,000		$0	$0

2023/04/05 11:02 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$3,026,500	$0	$0	$3,026,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$136,200	$0	$0	$136,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$0	$0	$1,225,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$1,373,800	$0	$0	$1,373,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$290,900	$0	$0	$290,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,318,000	$0	$0	$1,318,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$1,318,000	$0	$0	$1,318,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$757,300	$0	$0	$757,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	$757,300	$0	$0	$757,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$757,300	$0	$0	$757,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$12,400	$0	$0	$12,400
EPS SURA (ANTES SÓSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$58,800	$0	$0	$58,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$94,500	$0	$0	$94,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$191,400	$0	$0	$191,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$93,100	$0	$0	$93,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$100,700	$0	$0	$100,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,400	$0	$0	$206,400
TOTAL				**25**	**$5,859,100**	**$0**	**$0**	**$5,859,100**

2023/04/05 11:02 AM

294

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO FUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 34# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7840234	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	19566843133	9448008183	E	2023/03/03	2023/03/07	BANCO DAVIVIENDA	4	$4,320,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067960041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	26203317	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAUTH	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
3	CC	15031799	DE LOS REYES MIGUEL MARIANO	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
4	CC	1133796343	FLOREZ HERNANDEZ ORLEY AMORES	230301	7	$270,667	$43,400	ESSC07	7	$270,667	$10,900	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
5	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1073974619	MARTINEZ MIRANDA MANUEL ALEJANDRO	230201	6	$232,000	$37,200	EPS010	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
7	CC	15673090	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE	230301	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
8	CC	1073968204	OVIEDO MERCADO AMORES ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1003562568	RIVERA AGAMEZ KERIS JOSE	230201	8	$309,334	$49,500	ESSC07	8	$309,334	$12,400	CCF16	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
10	CC	15670148	ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID	230301	27	$1,044,000	$167,100	ESSC07	27	$1,044,000	$41,800	CCF16	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,900	27	$0	$0
11	CC	3482179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
12	CC	1067917857	TIRADO MARTINEZ MIGUELICA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	15671609	TORO MORALES DENIS MANUEL	230301	7	$270,667	$43,400	EPS041	7	$270,667	$10,900	CCF16	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
14	CC	15673428	TORO MORALES EDUARDO ENRIQUE	230301	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
Total			Afiliados(14)			$14,040,002	$2,246,900			$14,040,002	$561,900			$14,040,002	$561,900			$14,040,002	$977,900		$0	$0

2023/03/07 10:21 AM

296

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,246,900	$11,100	$0	$2,258,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,225,600	$6,000	$0	$1,231,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$934,600	$4,600	$0	$939,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$86,700	$500	$0	$87,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$977,900	$4,800	$0	$982,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$977,900	$4,800	$0	$982,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$561,900	$2,800	$0	$564,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$561,900	$2,800	$0	$564,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	$561,900	$3,100	$0	$565,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$65,100	$400	$0	$65,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$109,300	$600	$0	$109,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$29,500	$200	$0	$29,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$58,800	$300	$0	$59,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$206,400	$1,000	$0	$207,400
TOTAL				**14**	**$4,348,600**	**$21,800**	**$0**	**$4,370,400**

2023/03/07 10:21 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627211	5	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1905408081	9444604860	E	2023/02/03	2023/02/07	BANCOLOMBIA	4	$3,037,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1067940041	AGAMEZ GARCES MARIA CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0
2	CC 26202347	CARRASCAL LLORENTE AYLEN MAUTH	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF16	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$268,000	30	$0	$0
3	CC 1066729219	DIAZ LAMBRAÑO OVER SEGUNDO	230301	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
4	CC 1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC 1003191520	MARQUEZ MONCRIEFF JAIDER MANUEL	230301	12	$464,000	$74,300	EPS002	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
6	CC 15675038	MARTINEZ RAMOS HECTOR DAVID	231001	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
7	CC 10950737	MARTINEZ CABRALES JAVIER DAVID	230301	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
8	CC 1073734619	MARTINEZ MIRANDA MANUEL ALEJANDRO	230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
9	CC 1065014867	MONTOYA GUERRA CELIN PASCUAL	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
10	CC 15676942	MORALES HOYOS JOSE SILVESTRE	231001	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
11	CC 78029211	NEGRETE FUENTES FRANCISCO JAVIER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
12	CC 15675070	ORTEGA LOPEZ ALEJANDRO ENRIQUE	230301	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF16	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
13	CC 1079964704	OVIEDO MERCADO ANDRES ALFONSO	230301	4	$154,667	$24,800	CCPC55	4	$154,667	$6,200	CCF16	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
14	CC 78033729	PEROZA ALVAREZ CARLOS GUSTAVO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
15	CC 3482179	SOLORZANO BARRIOS JUAN GUILLERMO	25-14	11	$916,667	$146,700	EPS037	11	$916,667	$36,700	CCF16	11	$916,667	$36,700	14-11	11	$916,667	$63,900	11	$0	$0
16	CC 15673428	TORO MORALES EDUARDO ENRIQUE	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
17	CC 15675042	TORO SARDONAL LUIS ALBERTO	231001	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
Total	**Afiliados(17)**				**$9,754,670**	**$1,561,100**			**$9,754,670**	**$390,700**			**$9,754,670**	**$390,700**			**$9,754,670**	**$679,600**		**$0**	**$0**

2023/02/07 12:20 PM

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

293

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,561,300	$7,600	$0	$1,568,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$105,300	$500	$0	$105,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$762,700	$3,700	$0	$766,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$557,000	$2,700	$0	$559,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$136,300	$700	$0	$137,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$479,400	$3,300	$0	$482,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$479,400	$3,300	$0	$482,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$390,700	$1,900	$0	$392,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	$390,700	$1,900	$0	$392,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$390,700	$2,200	$0	$392,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	8	1	$6,200	$100	$0	$6,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$3,200	$100	$0	$3,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$89,300	$500	$0	$89,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$59,000	$300	$0	$59,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$32,600	$200	$0	$32,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$200,400	$1,000	$0	$201,400
TOTAL				17	$3,022,100	$15,000	$0	$3,037,100

2023/02/07 12:20 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Enumerado SENA e ICBF
NIT 901427711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7940314	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1852419471	9445233456	E	2023/01/04	2023/01/18	BANCO DAVIVIENDA	4	$1,870,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1067960041	AGAMEZ MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$46,400	30	$0	$0
2	CC 26202317	CARRASCAL ARLEN	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF16	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$346,400	30	$0	$0
3	CC 1067836657	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS037	30	$1,150,000	$46,000	CCF16	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$103,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**				$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$496,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$960,000	$6,600	$0	$966,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$616,000	$4,200	$0	$620,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$344,000	$2,400	$0	$346,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$417,700	$2,900	$0	$420,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$417,700	$2,900	$0	$420,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$240,000	$1,700	$0	$241,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$240,000	$1,700	$0	$241,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$240,000	$1,800	$0	$241,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,000	$400	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$194,000	$1,400	$0	$195,400
TOTAL				3	$1,857,700	$13,000	$0	$1,870,700

2023/01/06 08:10 PM

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7840774	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	9443189822	9443189822	E	2022/12/05	2022/12/05	BANCO BOGOTA	0	$1,857,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1067960041		AGAMEZ MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC 26203317		CARRASCAL AYLEN	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF16	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$268,000	30	$0	$0
3	CC 1067836657		GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS037	30	$1,150,000	$46,000	CCF16	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$80,100	30	$0	$0
Total	Afiliados(3)					$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$417,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$960,000	$0	$0	$960,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$616,000	$0	$0	$616,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$344,000	$0	$0	$344,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$417,700	$0	$0	$417,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$417,700	$0	$0	$417,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$240,000	$0	$0	$240,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$240,000	$0	$0	$240,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$240,000	$0	$0	$240,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,000	$0	$0	$46,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$194,000	$0	$0	$194,000
TOTAL				3	$1,857,700	$0	$0	$1,857,700

2022/12/02 04:05 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 54 13-11	MONTERIA-CORDOBA	7442 [illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	9442601538	9442601538	E	2022/11/03	2022/11/01	BANCO BOGOTA	0	$1,883,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte
1	CC 1067968941	AGAMEZ MARIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC 1067933117	CARRASCAL AYLEN	25-14	30	$3,850,000	$616,000	EPS005	30	$3,850,000	$154,000	CCF16	30	$3,850,000	$154,000	14-11	30	$3,850,000	$268,065	30	$0	$0
3	CC 1067934657	GONZALEZ MARIA	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS037	30	$1,750,000	$70,000	CCF16	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$121,845	30	$0	$0
4	CC 1073983764	OVIEDO ANDRES	230301	1	$33,334	$5,400	CCFC55	1	$33,334	$1,400	CCF16	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,320	1	$0	$0
Total	Afiliados(4)				$6,033,334	$969,400			$6,033,334	$241,400			$6,033,334	$241,400			$6,033,334	$420,150		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$965,400	$7,900	$0	$973,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$616,000	$5,000	$0	$621,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$349,400	$2,900	$0	$352,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$420,100	$3,400	$0	$423,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$420,100	$3,400	$0	$423,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$241,400	$2,000	$0	$243,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$241,400	$2,000	$0	$243,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$241,400	$2,100	$0	$243,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$1,400	$100	$0	$1,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,000	$400	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$194,000	$1,600	$0	$195,600
TOTAL				4	$1,868,300	$15,400	$0	$1,883,700

2022/11/10 04:04 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901627711	9	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 5# 13-32	MONTERIA-CORDOBA	7948214	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1721138165	9441784813	E	2022/10/05	2022/10/25	BANCO DAVIVIENDA	20	$757,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 26203317	CARRASCAL AYLEN	25-14	12	$1,540,000	$246,400	EPS005	12	$1,540,000	$61,600	CCF16	12	$1,540,000	$61,600	14-11	12	$1,540,000	$107,800	12	$0	$0
2	CC 1067836657	GONZALEZ MARIA	230301	12	$460,000	$73,600	EPS037	12	$460,000	$18,400	CCF16	12	$460,000	$18,400	14-11	12	$460,000	$32,200	12	$0	$0
3	CC 1073968704	OVIEDO ANDRES	230301	12	$400,000	$64,000	CCFC55	12	$400,000	$16,000	CCF16	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	$27,900	12	$0	$0
Total Afiliados(3)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$167,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$384,000	$7,500	$0	$391,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$246,400	$4,800	$0	$251,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$137,600	$2,700	$0	$140,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$167,200	$3,200	$0	$170,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$167,200	$3,200	$0	$170,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$96,000	$1,900	$0	$97,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$96,000	$1,900	$0	$97,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$96,000	$2,000	$0	$98,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$16,000	$400	$0	$16,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$18,400	$400	$0	$18,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$61,600	$1,200	$0	$62,800
TOTAL				3	$743,200	$14,600	$0	$757,800

2022/10/24 07:28 PM

Scanned with CamScanner

INFORME DE OBRA

CONTRATO:

LP-NO.013-2022

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

Scanned with CamScanner

INTRODUCCIÓN

El contrato de obra No. LP-NO.013-2022 suscrito entre el Municipio de Tierralta y el Consorcio Puentes de Cordoba, que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, se está ejecutando en la zona rural del municipio de Tierralta del departamento de Córdoba, específicamente sobre la quebrada Severinera, en la vía que comunica el municipio de Tierralta con el municipio de Planeta Rica, por parte del contratista, con un plazo de ejecución de 23,5 meses, contados a partir del 19 de septiembre de 2022, la cual corresponde a la fecha del acta de inicio, y la interventoría técnica, administrativa y financiera realizada por el Consorcio Vial Nacional.

Las obras a ejecutar corresponden a la construcción de un puente vehicular el cual será de 30 metros de longitud, un ancho de vía de 6,5 metros y anden de 1 metro. Este puente contará por una cimentación profunda con sistema de pilotes, su estructura en la que se construirá estribo y aletas y una super estructura la cual está formada por vigas postensadas, vigas auxiliares y su tablero. Así mismo se contempla la construcción de los accesos al puente en concreto, las obras de protección de la ribera y/o la estabilización de taludes.

El presente informe mensual corresponde al periodo desde el 28 de agosto del 2024 hasta el 27 de septiembre del 2024, en el cual se soporta el estado de la ejecución del contrato y sus obras respectivas, atendiendo a los componentes administrativo, financiero y técnico, teniendo en cuenta en este último, los ejes de calidad, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo a través de la implementación del Plan De Adaptación De La Guía Ambiental – PAGA.

El desarrollo del informe, comprende los siguientes capítulos y anexos que muestran categóricamente el estado de avance físico de las obras, en ocasión a la aplicación de las especificaciones técnicas de construcción y los estudios y diseños apropiados por el Consorcio Puentes de Córdoba para la ejecución de las obras, las actuaciones administrativas y el estado financiero del contrato.

En el Capítulo 1, se encuentra la información general del proyecto.

En el Capítulo 2, se encuentra el informe Administrativo.

En el Capitulo 3, se encuentra el informe Financiero.

En el capitulo 4, se encuentra el informe Técnico.

En el capítulo 5, se muestran las dificultades, inconvenientes e imprevistos que fueron relevantes para la ejecución de las obras y sus rendimientos que afectaron el cronograma de actividades.

Scanned with CamScanner

Los anexos de este informe comprenden los soportes de que dan evidencia de lo descrito en cada capítulo, asociados a cada actividad ejecutada física, administrativa y financiera.

Por último, se establecen las conclusiones y recomendaciones que se dieron lugar durante el periodo.

OBJETIVO DEL INFORME.

Describir en forma detallada el estado de la ejecución del contrato de obra N° LP-NO.013-2022 con objeto CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 y las obras establecidas dentro del alcance y meta física del mismo, atendiendo a los componentes administrativo, financiero y técnico, teniendo en cuenta en este último, los ejes de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a través de la implementación del Plan De Adaptación De La Guía Ambiental – PAGA y demás obligaciones contractuales.

ALCANCE DEL INFORME.

El presente informe tiene como alcance describir las actividades ejecutadas relacionadas con los componentes administrativos, financieros y técnico del contrato de obra N° LP-NO.013-2022 con objeto CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 durante el periodo 28 de agosto del 2024 hasta el 27 de septiembre del 2024, un porcentaje de ejecución del **25,9659308798420%** con respecto al valor total del contrato de obra No LP-NO.013-2022 es decir $ 7.384.604.822. El componente técnico incluirá avance de obra e implementación de los ejes de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la implementación del Plan De Adaptación De La Guía Ambiental – PAGA.

Scanned with CamScanner

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

1.1. Información básica del contrato de obra.

INFORMACION GENERAL	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
LOCALIZACION DEL PROYECTO	QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE TIERRALTA
CONTRATO N°	LP-NO.013-2022
PLAZO INICIAL	3,4 MESES
FECHA DE INICIO	19 -09-22
PRORROGA N1	9 MESES fecha 30-12-2024 hasta 30–09-23
PRORROGA N2	2 MESES fecha 28/09/2023 hasta 30-11-23
PRORROGA N3	1 MES fecha 22/11/2023 hasta 31-12-23
PRORROGA N4	2 MESES fecha 28/12/2024 hasta 29-02-23
SUSPENSION N1	26-02-2024
AMPLIACION SUSPENSION No1	22-03-2024
FECHA DE REINICIO N1	2-04-2024
PRORROGA N5	3 meses 2/04/2024 hasta el 31-07-24
PRORROGA N6	2,5 meses 30/06/2024 Hasta el 15-09-24
PRORROGA N7	20 dias hasta el 5–10-2024
FECHA DE TERMINACION	15-09-24
VALOR INICIAL	$ 5.384.604.822,10
VALOR ADICIONAL No1	$ 2.000.000.000
VALOR TOTAL A EJECUTAR	$7.384.604.822,10
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NACIONAL
SUPERVISOR	ING. JORGE ELIECER MUÑOZ CASTILLO

1.2. Localización del proyecto.

NOMBRE DEL MUNICIPIO: TIERRALTA
NIT: 800096807:0
CÓDIGO DANE: 23855
GENTILICIO: Tierraltense

Es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería, capital departamental, conocido por

Scanned with CamScanner

tener uno de los parques nacionales naturales más grande del mundo llamado el Nudo de Paramillo, protegido por las Naciones Unidas. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.


EXTENSIÓN Y LÍMITES

Considerando lo consignado tanto en el Plan de Desarrollo, así como lo reportado en el Plan de Ordenamiento Territorial, además, las consultas en el instituto Geográfico Agustín Codazzi; el Municipio de Tierralta tiene una extensión superficial de aproximadamente 4.728 Km2, y sus límites son los siguientes:

- **Norte**: Montería.
- **Oriente**: Planeta Rica.
- **Sur**: Montelíbano y el departamento de Antioquia.
- **Occidente**: Valencia y el departamento de Antioquia.

1.2 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL SITIO DE LA OBRA

Vereda Severinera

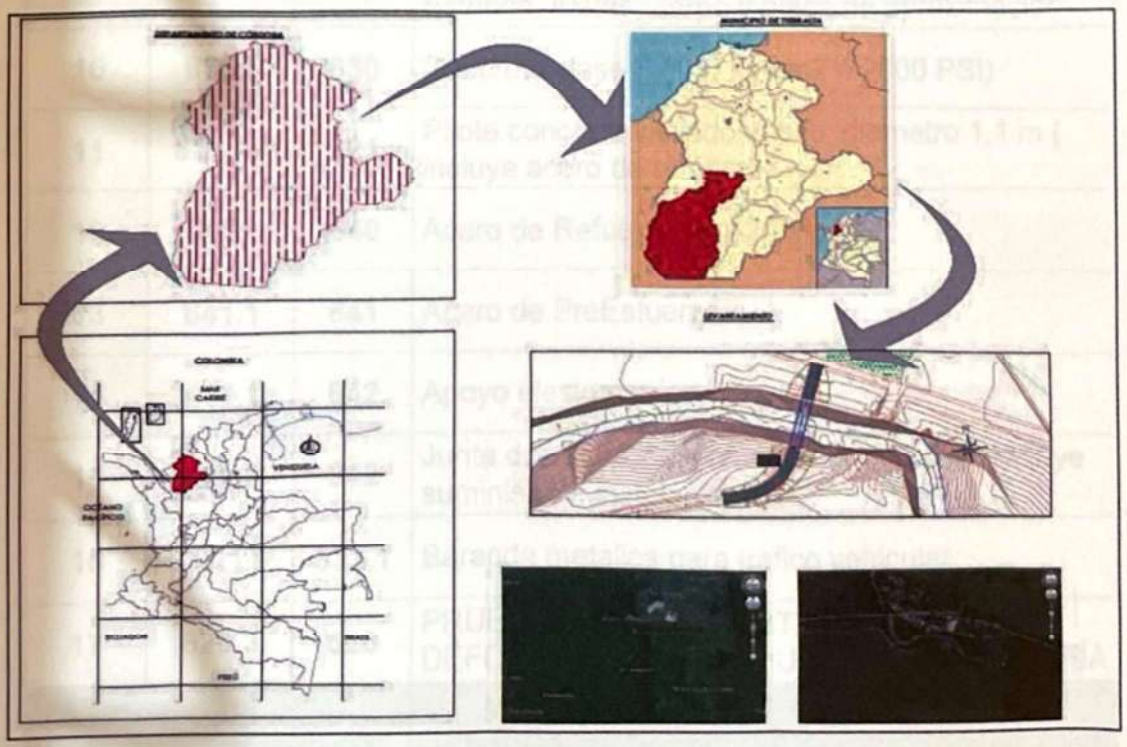

1.3. Descripción de las obras objeto del proyecto – Condiciones iniciales.

Scanned with CamScanner

	ITEM		DESCRIPCION
			I. EXPLANACIONES
1	210.2.2	210	Excavación en material común de la explaneación y canales
2	220.1	220	Terraplenes
3	201.6	200	Demolición de estructuras
			II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO L= 30 M
4	600.2.4	600	Excavaciones varias en material común bajo agua.
5	600.2.3	600	Excavaciones varias en material común en seco .
6	320.3	320	Subbase Granular Clase C.
7	630.1	630	Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS
8	630.3	630	Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero
9	630.4 P	630	Concreto Resistencía 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación
10	630.6	630	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)
11	621.1P	621	Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo)
12	640.1	640	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa
13	641.1	641	Acero de PreEsfuerzo.
14	642.1	642	Apoyo elastometrico
15	642.2	642	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)
16	632.1 P	632,1	Baranda metalica para trafico vehicular
17	620.3	620	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
			III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.

Scanned with CamScanner

	ITEM		DESCRIPCION
18	630.7P	630	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo
19	682.3	682	Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC
20	621.1-2P	621	Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0,4 m (incluye acero de refuerzo)
21	673.2	673	Material Granular Drenante
22	673.1.1	673	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
			IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
23	320.3	320	Subbase Granular Clase C.
24	311.1	311	Afirmado (Material para mejoramiento)
25	500.1	500	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
26	630.4	630	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
27	640.1	640	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
			V. TRANSPORTE
28	900.2	900	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).
			VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
29	700.1	700	Línea de Demarcación con Pintura en Frío.
30	710.1	710	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm
31	730.1	730	Defensa Metálica
32	730.2	730	Sección Final
33	740.1	740	Captafaros

Scanned with CamScanner

1.4. Descripción de las obras objeto del proyecto – Condiciones actualizadas.

ITEM			DESCRIPCION
			I. EXPLANACIONES
210.2.2	210		Excavación en material común de la explaneación y canales
220.1	220		Terraplenes
201.6	200		Demolición de estructuras

			II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO L= 30 M
600.2.4	600		Excavaciones varias en material común bajo agua.
600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco .
320.3	320		Subbase Granular Clase C.
630.1	630		Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS
630.3	630		Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero
630.4 P	630		Concreto Resistencía 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación
630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)

Scanned with CamScanner

ITEM			DESCRIPCION
621.1P	621		Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo)
640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa
641.1	641		Acero de PreEsfuerzo.
642.1	642		Apoyo elastometrico
642.2	642	PART	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)
632.1 P	632	PART	Baranda metalica para trafico vehicular
620.3	620		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
			III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.
630.7P	630	PART	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo
682.3	682		Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC
621.1-2P	621		Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0,4 m (incluye acero de refuerzo)
673.2	673		Material Granular Drenante

Scanned with CamScanner

ITEM			DESCRIPCION
673.1.1	673		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido
			IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
320.3	320		Subbase Granular Clase C.
311.1	311		Afirmado (Material para mejoramiento)
500.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
640.1	640		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
			V. TRANSPORTE
900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).
			VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
700.1	700		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.
710.1	710		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm
730.1	730		Defensa Metálica

Scanned with CamScanner

ITEM			DESCRIPCION
730.2	730		Sección Final
740.1	740		Captafaros
			VII. ITEM NO PREVISTO
NP1		PART	Plan de izaje para viga postensada
NP2		PART	Suministro e instalación de tubo geotexil hydrotube ensamblado con geotextil hydrotex 150, perímetro 9,0 m, altura máxima 1,60 m
NP3		PART	Suministro e instalación de formaleta textil colchacreto articulado 1300
NP4		PART	Suministro e instalación de manto antisocavación en hydrotex 95
NP5	500.1	500	Pavimento de concreto hidraulico MR 40

2. INFORME ADMINISTRATIVO

2.1. Revisión del contrato y documentos del proyecto. Indicar si se requirió modificatorios u otros sí al contrato, etc.

CONTRATO DE OBRA: fecha de suscripción 2 de septiembre del 2022.

PRORROGA No 1: A la fecha se solicitó y aprobó prorroga No 1 de fecha 30 de diciembre del 2022 (Anexa soporte). La prórroga solicitada fue hasta el 30 de septiembre del 2024, a partir del 31 de diciembre del 2022, fecha de terminación inicial del contrato.

Scanned with CamScanner

PRORROGA No 2: A la fecha se solicitó y aprobó prorroga No 2 de fecha 28 de septiembre del 2023 (Anexa soporte). La prórroga solicitada fue hasta el 30 de noviembre del 2024 a partir del 30 de noviembre del 20223, fecha de terminación de acuerdo a prorroga No 1

PRORROGA No 3: A la fecha se solicitó y aprobó prorroga No 3 de fecha 27 de noviembre del 2023 (Anexa soporte). La prórroga solicitada fue hasta a partir del 32 de diciembre del 2023, fecha de terminación de acuerdo a prorroga No 2.

PRORROGA No 4: A la fecha se solicitó y aprobó prorroga No 4 de fecha 29 de diciembre del 2023 (Anexa soporte). La prorroga solicitada fue hasta el 29 de febrero de 2024 a partir del 31 de diciembre del 2022, fecha de terminación de acuerdo a prorroga No 3

ADICIONAL No 1 EN TIEMPO Y VALOR: A la fecha se solicitó y aprobó Adicional No 1 en tiempo y valor con fecha de 2 de abril del 2024 y valor de $ 2.000.000.000 (Anexa soporte). La prórroga solicitada fue hasta el 30 de junio del 2024 a partir del 4 de abril del 2022, fecha de terminación de acuerdo a prorroga No 4

PRORROGA No 6: A la fecha se solicitó y aprobó prorroga No 6 de fecha 30 de junio del 2024 (Anexa soporte). La prórroga solicitada fue hasta el 15 de septiembre de 2024 a partir del 30 de diciembre del 2022, fecha de terminación de acuerdo a adicional No 1 No 5

PRORROGA No 7: A la fecha se solicitó y aprobó prorroga No 7 de fecha 13 de septiembre del 2024 (Anexa soporte). La prórroga solicitada fue hasta el 5 de octubre de 2024 a partir del 15 de septiembre del 2024, fecha de terminación de acuerdo a prorroga No 6.

2.2. VALOR PAGADO NETO= Valor acta - Pago de impuestos - Amortizaciones

A la fecha se han efectuados descuento de impuesto al consorcio Puentes de Córdoba por parte de la entidad contratante Municipio de Tierralta.

CONSOLIDADO ORDENES DE PAGO					
DESCRIPCION	ACTA PARCIAL No 1	ACTA PARCIAL No 2	ACTA PARCIAL No 3	ACTA PARCIAL No 4	ACTA PARCIAL No 5
Valor del acta	1.842.654.418,40	1.048.130.835,14	508.049.672,80	281.273.139,07	1.022.674.024,50
Amortizacion por anticipo (%)	552.796.325,00	314.439.250,54	152.414.901,84	84.381.941,72	306.802.207,35
ACTA-AMORTIZ =CDO+ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.289.858.093,40	733.691.584,60	355.634.770,96	196.891.197,35	715.871.817,15
Costos de obra	**1.229.153.812,88**	**733.691.584,60**	**355.634.770,96**	**196.891.197,35**	**715.871.817,15**

Scanned with CamScanner

CONSOLIDADO ORDENES DE PAGO					
DESCRIPCION	**ACTA PARCIAL No 1**	**ACTA PARCIAL No 2**	**ACTA PARCIAL No 3**	**ACTA PARCIAL No 4**	**ACTA PARCIAL No 5**
Descuento impuesto costos directos de obra					
RET. CON OBRA	35.639.002,77	20.962.617,00	10.160.993,00	5.625.463,00	20.453.480,00
UNICOR	17.819.501,38	10.481.308,00	5.080.497,00	2.812.731,00	10.226.740,00
PRO-CULTURA	17.819.501,38	10.481.308,00	5.080.497,00	2.812.731,00	10.226.740,00
ESTAMPA PRO	71.278.005,54	41.925.233,00	20.321.987,00	11.250.926,00	40.906.961,00
PRODEPORTE	26.729.252,08	15.721.963,00	7.620.745,00	4.219.097,09	15.340.110,37
BONBERIL	17.819.501,38	10.481.308,00	5.080.496,70	2.812.731,00	10.266.740,25
FOND. SEG	89.097.506,92	52.406.542,00	25.402.483,60	14.063.656,95	51.133.701,23
RETE ICA	14.255.601,11	8.385.047,00	4.064.397,37	2.250.185,00	8.181.392,20
TOTAL DESCUENTO	**290.457.872,56**	**170.845.326,00**	**82.812.096,67**	**45.847.521,04**	**166.735.865,05**
Estudio y diseño. Revision ajuste y/o actualizacion modificacion y complementacion de estudio y diseños	**60.704.280,00**				
Descuentos impuestos estudios y diseños					
RET. CON OBRA	5.611.320,00				
UNICOR	510.120,00				
PRO-CULTURA	607.042,80				
ESTAMPA. PRO	2.040.480,00				
PRODEPORTE	910.564,20				
FOND. SEG	485.634,24				
RETE ICA	1.453.842,00				
TOTAL DECUENTO	**11.619.003,24**				
Total desembolso	**987.781.217,08**	**562.846.258,60**	**272.822.674,29**	**151.043.676,31**	**549.175.952,10**

2.3. Suscripción de actas: Acta de inicio, suspensiones, reinicio, etc.

ACTA DE INICIO: de fecha 19 de septiembre del 2022 (anexa soporte).

SUSPENSION No 1: de fecha de 26 de febrero del 2024 (anexa soportes).

AMPLIACION A LA SUSPENSION No 1: de fecha 22 de marzo del 2024 (anexa soportes)

REINICIO No 1: de fecha 2 de abril del 2024 (anexa soportes)

Scanned with CamScanner

2.4. Actualización de pólizas y aprobación de las mismas por la entidad. (Anexa soportes)

POLIZA No	36-44-101054903	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
ADJUDICACION DEL CONTRATO		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2023	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/012/2025	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2023	$1.615.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
ADJUDICACION		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 31/12/2022	$500.000.000

POLIZA No	36-44-101054903	
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA	
ACTA DE INICIO		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2023	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/012/2025	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2023	$1.615.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

Scanned with CamScanner

POLIZA No	36-40-101021458
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA
ACTA DE INICIO	

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 31/12/2022	$500.000.000

POLIZA No	36-44-101054903
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA
PRORROGA No 1	

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/03/2024	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/09/2026	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/03/2024	$1.015.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA
PRORROGA No 1	

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 30/09/2023	$500.000.000

POLIZA No	36-44-101054903
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA
PRORROGA No 2	

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/05/2024	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 30/11/2026	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/05/2024	$1.015.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

Scanned with CamScanner

POLIZA No	36-40-101021458
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA

PRORROGA No 2

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 30/11/2023	$500.000.000

POLIZA No	36-44-101054903
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA

PRORROGA No 3

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 30/06/2024	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 31/12/2026	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 30/06/2024	$1.015.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA

PRORROGA No 3

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 31/12/2023	$500.000.000

Scanned with CamScanner

POLIZA No	36-44-101054903
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA

PRORROGA No 4

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 31/08/2024	$538.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 02/03/2027	$ 1.076.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$1.615.381.447
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 31/08/2024	$1.615.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$10.211.284

POLIZA No	36-40-101021458
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA

PRORROGA No 4

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 02/03/2023	$500.000.000

POLIZA No	36-44-101054903
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA

SUSPENSION No1 REINICIO No Y ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No 1

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 31/01/2025	$738.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 02/03/2027	$ 1.476.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$2.215.381.446,6
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 31/01/2025	$1.615.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 02/09/2027	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA

SUSPENSION No1 REINICIO No Y ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No 1

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 31/07/2024	$650.000.000

Scanned with CamScanner

POLIZA No	36-44-101054903
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA

PRORROGA No 6

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02/09/2022 – 15/03/2025	$738.460.483
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	02/09/2022 – 15/09/2027	$ 1.476.920.965
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	$2.215.381.446,6
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	02/09/2022 – 15/03/2025	$1.615.381.447
CALIDAD DE SERVICIO	02/09/2022 – 15/09/2029	$18.211.284

POLIZA No	36-40-101021458
COMPAÑÍA DE SEGURO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
TOMADOR	**CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA.**
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA

PRORROGA No 6

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	02/09/2022 – 15/09/2024	$650.000.000

2.5. Listado de personal contratado y afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales y el correspondiente soporte del pago y paz y salvo. (Anexa soportes)

2.6. Descripción del personal profesional del proyecto, según pliego de condiciones y la oferta.

Se envió mediante oficio No CPC-TIERRALTA-006-2022 de fecha 22 de septiembre del 2023 las hojas de vida del personal mínimo exigido de acuerdo al pliego.

Se aprobó mediante oficio CVN-041-2022 de fecha 26 de septiembre del 2023.

PROFESIONAL	CARGO
AYLEN MAUTH CARRASCAL LLORENTE	Directora de obra
JOSE MANUEL DIAZ PINTO	Residente de obra
JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO	Especialista Ambiental
MARIA INES GONZALES AYUS	Coordinador SST

Scanned with CamScanner

2.7. Solicitudes de homologaciones de personal, cuando aplique.

Se solicito mediante oficio No CPC-TIERRALTA-059-2023 de fecha 12 de enero de 2023, homologación del residente de obra inicialmente aprobado.

Se avala homologación mediante oficio No CVN-258-2023 de fecha 16 de enero del 2023

PREFESIONAL	DEDICACION	RESIDENTE DE OBRA	HOMOLOGAR
RESIDENTE DE OBRA	100%	JOSE MANUEL DIAZ PINTO - CC. 15.042.131	JUAN GUILLERMO SOLORZANO BARRIOS. C.C No 3.482.179

Se solicito mediante oficio No CPC-TIERRALTA-169-2024 de fecha 4 de abril de 2023, homologación del residente de obra inicialmente aprobado.

Se avala homologación mediante oficio No CVN-894-2022 de fecha 5 de abril del 2024

PREFESIONAL	DEDICACION	RESIDENTE DE OBRA	HOMOLOGAR
RESIDENTE DE OBRA	100%	JUAN GUILLERMO SOLORZANO BARRIOS. C.C No 3.482.179	JUAN CARLOS SALUM SEJIN C.C No 15.611.229

2.8. Manejo de la correspondencia. (Anexa soportes – MEDIO MAGNETICO)

3. INFORME FINANCIERO.

3.1. Organización y presentación de la documentación solicitada por la entidad para la aprobación del Plan de inversión del anticipo y cronograma, o renuncia de anticipo, según el caso: La fiducia se encuentra liquidada

3.2. Organización y presentación de la documentación requerida para la gestión del trámite de pago de los reembolsos y/o cobros asociados al manejo de los recursos en calidad de anticipo: La fiducia se encuentra liquidada

Scanned with CamScanner

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 574.928.116,00	$ 574.928.116,00	$ -	$ 574.928.116,00	$ -
2	TRANSPORTE	$ 185.896.985,00	$ 185.896.985,00	$ -	$ 185.896.985,00	$ -
3	MANO DE OBRA	$ 854.556.346,00	$ 854.556.346,00	$ -	$ 854.556.346,00	$ -
	TOTALES	$ 1.615.381.447,00	$ 1.615.381.447,00	$ -	$ 1.615.381.447,00	$ -

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	FEAN35	19-dic-22	EDUAR TONY ARCIA	$ 81.230.025,18	3	MANO DE OBRA
FACTURA	FE30	19-dic-22	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 346.048.148,21	3	MANO DE OBRA
FACTURA	FE29	19-dic-22	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 58.814.686,97	2	TRANSPORTE
FACTURA	SIO1723	21-dic-22	STECKERL	$ 109.547.782,40	1	MATERIAL
FACTURA	SI01726	21-dic-22	STECKERL	$ 146.106.662,52	1	MATERIAL
FACTURA	SI01779	15-feb-23	STECKERL	$ 115.816.921,00	1	MATERIAL
FACTURA	FEV-16	24-feb-23	IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS	$ 101.728.377,00	1	MATERIAL
FACTURA	FEV-17	24-feb-23	IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS	$ 28.499.611,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FE31	2-mar-23	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 11.268.387,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FE32	15-mar-23	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 29.407.343,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FEV-18	15-mar-23	IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS	$ 14.249.806,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FE33	15-mar-23	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 173.024.074,00	3	MANO DE OBRA
FACTURA	FEV-19	15-mar-23	IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS	$ 50.864.189,00	1	MATERIAL

Scanned with CamScanner

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	FEAN37	15-mar-23	EDUARD TONY ARCIA NOHAVA	$ 40.615.013,00	3	MANO DE OBRA
FACTURA	FE34	27-mar-23	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 29.407.344,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FEV-20	27-mar-23	IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS	$ 14.249.807,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FE35	27-mar-23	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 173.024.074,00	3	MANO DE OBRA
FACTURA	FEV-21	27-mar-23	IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS	$ 50.864.189,00	1	MATERIAL
FACTURA	FEAN38	27-mar-23	EDUARD TONY ARCIA NOHAVA	$ 40.615.012,00	3	MANO DE OBRA

3.3. Presentación de actas parciales y resumen del balance.

A la fecha se han presentado pago de acta parcial No 1, No 2, No 3, No 4 y No 5 se resumen así:

DESCRIPCION	ACTA PARCIAL No 1	ACTA PARCIAL No 2	ACTA PARCIAL No 3	ACTA PARCIAL No 4	ACTA PARCIAL No 5
Valor del acta	1.842.654.418,40	1.048.130.835,14	508.049.672,80	281.273.139,07	1.022.674.024,50
Amortización por anticipo (%)	552.796.325,00	314.439.250,54	152.414.901,84	84.381.941,72	306.802.207,35
ACTA-AMORTIZ =CDO+ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.289.858.093,40	733.691.584,60	355.634.770,96	196.891.197,35	715.871.817,15
Costos de obra	**1.229.153.812,88**	**733.691.584,60**	**355.634.770,96**	**196.891.197,35**	**715.871.817,15**

Scanned with CamScanner

4. INFORME TÉCNICO

4.1. Presupuesto y APUS aprobados por la entidad en la oferta económica. Fueron suministrado a la interventoria.

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONÓMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				EXPLANEACIONES				
1	210.2.2	201		EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACI'ON Y CANALES	M3	660,00	$ 12.094,00	$ 7.982.040,00
2	220.1	202		TERRAPLENES	M3	2.364,00	$ 32.020,00	$ 75.695.280,00
3	201.6	200		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	200,00	$ 222.122,00	$ 44.424.400,00
	Subtotal							**$ 128.101.720,00**
				CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30				
4	600.2.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	M3	400,00	$ 79.452,00	$ 31.780.800,00
5	600.2.3	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	940,90	$ 74.410,00	$ 70.012.369,00
6	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	21,00	$ 296.822,00	$ 6.233.262,00
7	630.1	630		CONCRETO RESISTENCIA 35 MPA (A)(5000 PSI) PARA VIGAS	M3	34,00	$ 1.727.492,00	$ 58.734.728,00

Scanned with CamScanner

8	630.3	630		CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (C) (4000 PSI) PARA DIAFRAGMA Y TABLERO	M3	68,00	$ 1.500.674,00	$ 102.045.832,00
9	630.4 P	630		CONCRETO RESISTENCIA 24.5 MPA (3500 PSI) PARA ESTRIBOS,ALETAS,ZARPA Y PLACA DE APROXIMACIÓN	M3	250,00	$ 1.329.945,00	$ 332.486.250,00
10	630.6	630		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000 PSI)	M3	7,10	$ 660.145,00	$ 4.687.030,00
11	62.1 P	621		PILOTE CONCRETO VACIADO IN-SITU, DIAMETRO 1,1M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	444,00	$ 3.955.413,00	$ 1.756.203.372,00
12	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	38.987,00	$ 8.638,00	$ 336.769.706,00
13	641.1	641		ACERO DE PREESFUERZO	TF/M	58.588,20	$ 2.409,00	$ 141.138.974,00
14	642.1	642		APOYO ELASTOMETRICO	UND	6,00	$ 617.491,00	$ 3.704.946,00
15	642.2	642	PARTICULAR	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTÓMERA REFORZADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	12,00	$ 1.141.607,00	$ 13.699.284,00
16	632.1P	632	PARTICULAR	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	M	60,00	$ 830.166,00	$ 49.809.960,00
17	620.3	620		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	UNA	1,00	$ 77.542.211,00	$ 77.542.211,00
	Subtotal							**$ 2.984.848.724,00**
				PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE				
18	630.7P	630	PARTICULAR	REVESTIMIENTO EN PIEDRA PEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE TALUD Y FONDO	M3	400,70	$ 770.531,00	$ 308.751.772,00
19	682.3	682	4.01.16	COLCHAGAVIÓN EN MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	M3	96,00	$ 389.394,00	$ 37.381.824,00
20	621.1-2P	621		PILOTE CONCRETO VACIADO IN-SITU,PARA ANCLAJE DIAMETRO 0,4 M(INCLUYE ACERO REFUERZO)	M	144,00	$ 2.062.890,00	$ 297.056.160,00
21	673.2	673		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	186,00	$ 252.910,00	$ 47.041.260,00
22	673.1.1	673		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	1.331,00	$ 9.399,00	$ 12.510.069,00
	Subtotal							**$ 702.741.085,00**
				PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO				
23	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	440,00	$ 296.822,00	$ 130.601.680,00

Scanned with CamScanner

24	311.1	311		AFIRMADO(MATERIAL PARA MEJORAMIENTO)	M3	330,00	$ 213.578,00	$ 70.480.740,00
25	500.1	500		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	400,00	$ 935.666,00	$ 374.266.400,00
26	630.4	630		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)-CUNETAS	M3	120,00	$ 770.236,00	$ 92.428.320,00
27	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY = 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)	KG	6.000,00	$ 8.638,00	$ 51.828.000,00
	Subtotal							$ 719.605.140,00
				TRANSPORTE				
28	900.2	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANEACÓN,CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M) MEDIDOS APARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3/MK	340.000,00	$ 1.807,00	$ 614.380.000,00
	Subtotal							$ 614.380.000,00
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				
29	700.1	700		LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIÓ	M	1.200,00	$ 2.086,00	$ 2.503.200,00
30	710.1	710		SEÑAL VERTICAL DE TRNASITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	7,00	$ 561.555,00	$ 3.930.885,00
31	730.1	730		DEFENSA METALICA	M	80,00	$ 177.857,00	$ 14.228.560,00
32	730.2	730		SECCIÓN FINAL	UND	4,00	$ 88.182,00	$ 352.728,00
33	740.1	740		CAPTAFAROS	UND	20,00	$ 16.439,00	$ 328.780,00
	Subtotal							$ 21.344.153,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 5.171.020.822,00

OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y / O COMPLEMENTARIAS	$ 152.879.720,10
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS PLACA HUELLA,PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE)	$ 51.012.000,00

Scanned with CamScanner

IVA-REVISIÓN,AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESRUDIOS DE DISEÑO	$ 9.692.280,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS,REVISIÓN,AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESRUDIOS DE DISEÑO	**$ 60.704.280,00**
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.171.020.822,00**
VALOR TOTAL	**$ 5.384.604.822,00**

4.2. Solicitudes de revisión y aprobación de la reprogramación de obra y Plan de contingencia. A la fecha se cuenta con reprogramación No 7

4.3. Solicitud de revisión del balance económico del contrato, acta de mayores y menores cantidades. A la fecha se tiene aval de balance No 3 de fecha 2 de agosto del 2024.

4.4. Solicitud de aprobación de estudios, diseños, especificaciones:

Se dio aval por parte de la interventoría de la revisión de los estudios y diseños así:

COMPONENTE	OFICIO APROBACIÓN	FECHA
Hidráulico	CVN-125-2022	1 de noviembre del 2022
Geotécnico	CVN-167-2022	28 de noviembre del 2022
Estructural	CVN-273-2023	26 de enero del 2023
Geométrico	CVN-269-2023	29 de enero del 2023

COMPONENTE	OFICIO APROBACIÓN	FECHA
Hidráulico	CVN-922-2022	25 de abril del 2024
Geotécnico	CVN-959-2022	20 de mayo del 2024

4.5. Resumen de actividades ejecutadas acumuladas.

Durante el periodo comprendido entre el 19 de septiembre del 2022 y el 27 de septiembre del **2024**, se ejecutaron las siguientes actividades.

Etapa 1: Dentro de la documentación suministrada por la entidad no se evidencio el diseño geométrico del proyecto, por lo tanto el contratista presento dicho diseño de acuerdo a la normatividad vigente.

Se presento aval mediante oficio No CVN-269-2023 de fecha 29 de enero del 2023, estudio y diseño geométrico del proyecto.

Scanned with CamScanner

El consorcio Puentes de Córdoba mediante los oficios No CPC-TIERRALTA-119-2023 y CPC-TIERRALTA-124-2023, presenta diseño geométrico, de acuerdo a lo aprobado por la entidad contratante Alcaldía de Tierralta mediante oficio No 300-062 de fecha 19 de abril del 2023, en el que se aprueba y se solicita que se implemente al proyecto al alternativa No 2 de los diseños geométricos presentados, teniendo en cuenta que no se puede implementar el diseño geométrico aprobado inicialmente, el cual cumple con la normatividad vigente, toda vez existe limitante predial, que impide la implementación del mismo.

El dia 2 de abril del 2024, se dio aval del adicional en tiempo y valor No 1, en el mismo contemplaba realizar los estudios y diseños para las obras de protección requeridas.

Etapa 2: ejecución de obras civiles, las actividades acumuladas a la fecha son las siguientes:

4.6. Cantidades de obras ejecutadas en el periodo y porcentajes acumulado de avance fisico de la obra

ITEM				DESCRIPCION	% DE AVANCE
				I. EXPLANACIONES	
1	210.2.2	210		Excavación en material común de la explaneación y canales	100,0%
2	220.1	220		Terraplenes	100,0%
3	201.6	200		Demolición de estructuras	100,0%
				Total EXPLANACIONES	**100,0%**
				II. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE POSTENSADO L= 30 M	
4	600.2.4	600		Excavaciones varias en material común bajo agua.	100,0%
5	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco .	100,0%
6	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	0,0%
7	630.1	630		Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS	100,0%
8	630.3	630		Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero	98,0%

Scanned with CamScanner

ITEM				DESCRIPCION	% DE AVANCE
9	630.4 P	630		Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximación	93,7%
10	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	100,0%
11	621.1P	621		Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo)	100,0%
12	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	93,1%
13	641.1	641		Acero de PreEsfuerzo.	100,0%
14	642.1	642		Apoyo elastometrico	100,0%
15	642.2	642	PART	Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	0,0%
16	632.1 P	632,1	PART	Baranda metalica para trafico vehicular	100,0%
17	620.3	620		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	0,0%
Total 'CONSTRUCCION PUENTE POSTENSADO L=30 M					95,9%
				III. PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.	
18	630.7P	630	PART	Revestimiento en piedra pegada para protección de talud y fondo	96,9%
19	682.3	682		Colchogavión de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	0,0%
20	621.1-2P	621		Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0,4 m (incluye acero de refuerzo)	100,0%
21	673.2	673		Material Granular Drenante	100,0%
22	673.1.1	673		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	96,9%
Total PROTECCIÓN DE LA RIBERA Y EL FONDE DEL CAUCE					94,3%

Scanned with CamScanner

ITEM				DESCRIPCION	% DE AVANCE
				IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	
23	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	86,7%
24	311.1	311		Afirmado (Material para mejoramiento)	#¡DIV/0!
25	500.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	#¡DIV/0!
26	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	0,0%
27	640.1	640		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	65,4%
Total PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO					**63,6%**
				V. TRANSPORTE	
28	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	100,0%
Total SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA					100,0%
				VI. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	
29	700.1	700		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	#¡DIV/0!
30	710.1	710		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	0,0%
31	730.1	730		Defensa Metálica	0,0%
32	730.2	730		Sección Final	#¡DIV/0!
33	740.1	740		Captafaros	#¡DIV/0!
Total SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					**0,0%**
				VII. ITEM NO PREVISTO	
34	NP1		PART	Plan de izaje para viga postensada	100,0%

Scanned with CamScanner

ITEM				DESCRIPCION	% DE AVANCE
35	NP2		PART	Suministro e instalación de tubo geotexil hydrotube ensamblado con geotextil hydrotex 150, perímetro 9,0 m, altura máxima 1,60 m	100,0%
36	NP3		PART	Suministro e instalación de formaleta textil colchacreto articulado 1300	30,8%
37	NP4		PART	Suministro e instalación de manto antisocavación en hydrotex 95	83,4%
38	NP5	500.1	500	Pavimento de concreto hidraulico MR 40	82,7%
				Total ITEM NO PREVISTO	66,6%

4.7. Gestión de la calidad en obra (Anexa soportes)

Durante la ejecución de las obras se realizaron ensayos de laboratorios de acuerdo a la normatividad vigente.

Así mismo se solito a los proveedores los certificados de calidad de los productos.

4.8. Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. (Anexa soporte en medio digital)

4.9. Gestión ambiental. (Anexa soporte en medio digital)


Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021



DESCRIPCION Y OBSERVACIONES: IINSTALACION DE TERRAPLEN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

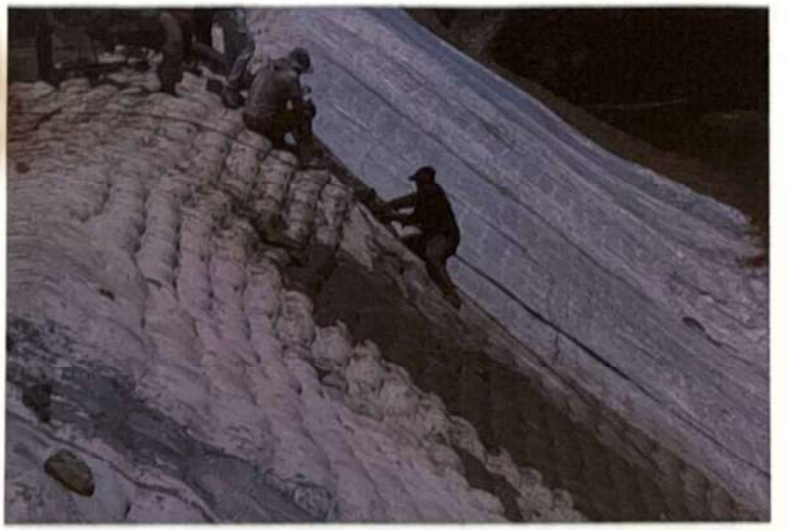

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES: INSTALACION DE COLCHACRETO

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021



DESCRIPCION Y OBSERVACIONES: INSTALACION DE COLCHACRETO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021



DESCRIPCION Y OBSERVACIONES: INTSLACION DE TABLERO, BARANDA, ANDEN

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021



DESCRIPCION Y OBSERVACIONES: INSTALACION DE COLCHACRETO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021



DESCRIPCION Y OBSERVACIONES: INSTALACION DE MANTO ANTISOCACVACION

Scanned with CamScanner

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	402-24
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103638103
FECHA DE INFORME:	miércoles, 25 de septiembre de 2024	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	VIGAS DIAFRAGMA	4000	PREMEZCLADO	28/08/2024	4/09/2024	7	15.1	179.1	444.68	248.3	24.3	3547	89	89	E	
2	C2	VIGAS DIAFRAGMA	4000	PREMEZCLADO	28/08/2024	11/09/2024	14	15.1	179.1	490.29	273.8	26.8	3911	98	98	E	
3	C3	VIGAS DIAFRAGMA	4000	PREMEZCLADO	28/08/2024	25/09/2024	28	15.1	179.1	531.50	296.8	29.1	4240	106	106	C	

TIPOS DE FALLA:



OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S.

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO KENNEDY ROYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio «INGELABCON S.A.S.», los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

Scanned with CamScanner

337

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S.
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO Nº	402-24
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103638103
FECHA DE INFORME:	sábado, 5 de octubre de 2024	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	TABLERO	4000	PREMEZCLADO	7/09/2024	14/09/2024	7	15.1	179.1	439.39	245.4	24.0	3505	88	88	E	
2	C2	TABLERO	4000	PREMEZCLADO	7/09/2024	21/09/2024	14	15.1	179.1	497.11	277.6	27.2	3966	99	99	C	
3	C3	TABLERO	4000	PREMEZCLADO	7/09/2024	5/10/2024	28	15.1	179.1	538.04	300.4	29.4	4292	107	107	D	

TIPOS DE FALLA:



OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S.
JEYSON JAVIER ATENCIA ACUAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO ERNESTO ROTOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio «INGELABCON S.A.S., las cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
Nit. 901.126.673-8
Oficina: Carrera 9a #34-33 Barrio Gaspina Perez – Montería–Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com

Scanned with CamScanner

CODIGO: EL-F-C001	FORMATOS	INGELABCON S.A.S
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	
PAGINA 1 DE 1	NTC -673	

CLIENTE:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9	ORDEN DE SERVICIO N°	402-24
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	UBICACIÓN:	VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTÁCTO:	MARIO PETRO REYES	EMAIL:	consorciopuentedecordoba2022@gmail.com	CEL:	3103638103
FECHA DE INFORME:	miércoles, 25 de septiembre de 2024	CONSECUTIVO:	001		

ITEM	COD. CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	RESIST. (PSI) ESPECIF.	TIPO CONCRETO	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	CILINDRO			CARGA (KN)	RESISTENCIA (kg/cm2)	RESISTENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (PSI)	% EVOLUCIÓN	PROM. % EVOL	TIPO FALLA	OBSERVACIÓN
							DIAS	D. (cm)	A. (cm2)								
1	C1	VIGAS DIAFRAGMA	4000	PREMEZCLADO	28/08/2024	4/09/2024	7	15,1	179,1	444,68	248,3	24,3	3547	89	89	E	
2	C2	VIGAS DIAFRAGMA	4000	PREMEZCLADO	28/08/2024	11/09/2024	14	15,1	179,1	490,29	273,8	26,8	3911	98	98	E	
3	C3	VIGAS DIAFRAGMA	4000	PREMEZCLADO	28/08/2024	25/09/2024	28	15,1	179,1	531,50	296,8	29,1	4240	106	106	C	

TIPOS DE FALLA:



OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S
JEYSON JAVIER ATENCIA ADAMES
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO KENNEDY HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio «INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.104.673-8
Oficina: Carrera No 83A-33 Barrio Ospina Perez – Montería –Córdoba
Cel. 314 631 7410 – Email: ingelabcon@gmail.com

Scanned with CamScanner
