CONSORCIO SAN DIEGO

Prorroga No.1

Email: consorciosandiego@gmail.com

MODIFICATORIO No1: PRÓRROGA NO.1 AL CONTRATO No LP-MM-006-2022.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTELÍBANO
NIT:	800.096.763-5
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
NIT O C.C.:	901603485-5
OBJETO:	CONSTRUCCION VIA MONTELIBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,2)
ADICIONES:	No aplica.
VALOR TOTAL:	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,2)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES
AMPLIACIONES:	UN (01) AÑO
PLAZO TOTAL:	UN AÑO (01) Y SEIS (06) MESES.
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**Modificatorio No 1:** : **Prórroga:** POR UN TÉRMINO DE UN AÑO (01). CONTADOS A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NACIONAL
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES – JHON ADOLFO CORREA VILLARREAL.

Entre los suscritos: **JOSÉ DAVID CURA BUELVAS,** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 98.668.758, quien actúa en calidad de Alcalde del Municipio de Montelíbano – Córdoba, identificado con Nit 800.096.763-5, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE,** y por la otra, **CONSORCIO HSAN DIEGO**, identificado con NIT 901603485-5, representada legalmente por **LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 73.215.196, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** se ha convenido realizar la presente modificatorio No.1 al Contrato LP-MM-006-2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el proyecto **"CONSTRUCCION VIA MONTELIBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR"**, contrato de obra No: LP-MM-006-2022, fue adjudicado el 28 de junio del 2022.

2. Que el acta de inicio del contrato de Obra fue firmada el 23 de agosto de 2022, previa legalización del contrato de obra, con un plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2022.

3. Que mediante solicitud fecha 24 de noviembre del 2022 el contratista de obra solicita a la interventoría prorroga al contrato inicial, dado los siguiente:

- Que la metodología del instituto nacional de vías contempla una etapa inicial de revisión de estudios y diseños iniciales con un plazo de 2 meses y el tiempo restante será para la etapa de obra.

- Que la etapa de revisión y/o ajuste del diseño, aportado por el municipio y que sirvió como base para la contratación de las obras, evidenció muchas deficiencias, lo que conllevo a esta etapa a extenderse a un total de tres (3) meses y seis (6) días.

- Que, en el desarrollo de la revisión y ajustes de diseños, se evidenciaron deficiencias en el componente geotécnico aportado para el diseño inicial de la estructura del pavimento en todos los tramos. Por tanto, se hizo necesario la realización de nuevos estudios de la subrasante, y rediseñar la estructura del pavimento en su totalidad.

- Que en la zona en la cual se desarrollan las obras, en los meses de septiembre, octubre y lo corrido de noviembre, ha presentado muchas precipitaciones de mediana y alta intensidad, que no han permitido el normal desarrollo de las actividades necesarias para los nuevos estudios y de las obras, viéndose afectado el cronograma de ejecución de las mismas.

- Que el alcance del proyecto de referencia y las cantidades contempladas en el tiempo actual de ejecución, no son razonables, debido a que es un proyecto de gran envergadura donde se interviene 13km de vías y actualmente en el país existe un desabastecimiento de materiales, maquinaria y transporte debido al gran número de obras que se están ejecutando y la ola invernal país.

4. Que, la interventoría mediante oficio del 29 de diciembre de 2022, avala la solicitud de prórroga del contratista de obras CONSORCIO SAN DIEGO,

ACUERDAN:

PRIMERO: MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA: Modificar la CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO, la cual queda así: El plazo estimado para la ejecución del

presente contrato será desde el 31 de diciembre de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2023, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. En todo caso el plazo de contrato no podrá exceder la vigencia del Convenio Interadministrativo No 1968-2021.

SEGUNDO: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: las demás cláusulas del contrato no modificadas en este documento, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.

TERCERO: PUBLICACIÓN. La presente modificación, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

CUARTO: DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: 1) Solicitud de prórroga al proyecto presentada por el contratista de obra **CONSORCIO SAN DIEGO, 2)** Aval de interventoría donde justifica la necesidad de modificar el contrato y 3) Prórroga del Convenio Interadministrativo No 1968-2021.

Para constancia se firma en el Municipio de Montelíbano (Córdoba) a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2022.

JOSÉ DAVID CURA BUELVAS
El Contratante

CONSORCIO SAN DIEGO
R.L LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO
El Contratista

JHON ADOLFO CORREA VILLARREAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

CONSORCIO SAN DIEGO

Prorroga No.2

Email: consoriciosandiego@gmail.com

Los

MODIFICATORIO No.2: PRÓRROGA No.2 AL CONTRATO No LP-MM-006-2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTELÍBANO
NIT:	800.096.763-5
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO RL. LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO
NIT:	901.603.485-5
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR"
VALOR:	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L **($26.997.426.440,20)**
ADICIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL:	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L **($26.997.426.440,20)**
PLAZO:	CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DÍAS
AMPLIACIONES:	UN (01) AÑO
PLAZO TOTAL:	UN (01) AÑO CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DÍAS
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**MODIFICATORIO No: 02.** **PRÓRROGA:** SEIS (06) MESES Contados a partir del 31 de diciembre de 2023.
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL NACIONAL
SUPERVISOR:	Secretaria de Infraestructura Física y Telecomunicaciones – Jhon Adolfo Correa Villarreal

Entre los suscritos: **LUIS ANGEL ARGEL PETRO,** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 10.951.361, quien actúa en calidad de alcalde (e) del Municipio de Montelíbano – Córdoba, identificado con NIT 800.096.763-5, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra, **CONSORCIO SAN DIEGO,** identificado con NIT 901.782.231-8 representada legalmente por LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 73.215.196, quien actúa en nombre propio, y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido realizar el presente modificatorio No 2 al Contrato No. LP-MM-006-2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que, mediante solicitud de EL CONTRATISTA con fecha de 08 de noviembre de 2023, solicita a la INTERVENTORIA prorrogar el contrato inicial, dado lo siguiente:
   - Que las lluvias intensas y precipitaciones pluviales han dificultado las actividades de construcción.
   - Que los conflictos sociales y bloqueos de vías han causado retrasos en la programación.
2. Que a veintidós (22) de diciembre el proyecto "CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR", contrato de obra No: LP-MM-006-2022 se encuentra con un avance del 52,58% de ejecución financiera.
3. Que el plazo final del contrato está definido por el plazo actual del convenio 1968-2021, hasta 31 de diciembre de 2023.
4. Que es imposible la culminación de las actividades en el plazo faltante, por lo cual se solicita prorrogar el convenio 1968-2021.
5. Que el veintiséis (26) fue aceptado por el CONTRATANTE, la modificación del Convenio No 1968-2021 en el cuál, dicho convenio se prorrogó hasta 31 de diciembre de 2024.
6. Que la INTERVENTORIA mediante oficio del 28 de noviembre de 2023, avala la solicitud de prórroga del contratista de obra CONSORCIO SAN DIEGO.
7. Por ende, es necesario prorrogar el contrato No LP-MM-006-2022 según lo solicitado.
8. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO, que la cláusula cuarta de acuerdo al otrosí no 1 establece un plazo de 1 año, 4 meses y 8 días, el cual será modificado por una ampliación de 6 meses. En todo caso el plazo de contrato no podrá exceder la vigencia del Convenio Administrativo No 1968_2021.

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar las modificaciones respectivas en las garantías aportadas para la ejecución del contrato y presentarlas al Municipio.

TERCERO: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: las demás cláusulas del contrato no modificadas en este documento, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.

CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente modificación, una vez perfeccionada deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

QUINTO: DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: 1) Solicitud de prórroga al proyecto presentada por el contratista de obra CONSORCIO SAN DIEGO, 2) Aval de interventoría donde justifica la necesidad de modificar el contrato y 3) Prórroga del Convenio Interadministrativo No 1968-2021.

Para constancia se firma en el municipio de Montelíbano, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023

LUIS ANGEL ARGEL PETRO
El CONTRATANTE

CONSORCIO SAN DIEGO
RL. LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO
El CONTRATISTA

CONSORCIO SAN DIEGO

Prorroga No.3

Email: consoriciosandiego@gmail.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO
Nit Nro. 800096763-5

PRORROGA CONTRATO

PRORROGA No. 3
No: LP-MM-006-2022.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTELIBANO
NIT	800096763-5
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN DIEGO
NIT DE CONTRATISTA	901603485-5
OBJETO	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO ANCLAR.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
ADICION PRESUPUESTO	NO APLICA
VALOR TOTAL	VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUTROCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DIAS
PRORROGA 1	UN (01) AÑO
PRORROGA 2	SEIS (06) MESES
MODIFICACION ACTUAL	**MODIFICATORIO No 3.** **PRORROGA:** CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 30 DE JUNIO DE 2024.
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NACIONAL
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES – BENJAMIN SUAREZ ORTIZ

Entre los suscritos IVAN ALFREDO VERGARA, identificado con cedula de ciudadanía 78.300.280, quien actúa como alcalde encargado del municipio de Montelíbano – Córdoba, identificado con el Nit: 800096763-5, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **CONSORCIO SAN DIEGO**, identificado con NIT: 901603485-5 representada legalmente por LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 73.215.196, quien actúa en nombre propio, y quien para los efectos del presente contrato se denominará como **EL CONTRATISTA**, se ha convenido realizar el presente modificatorio No. 3 al contrato LP-MM-006-2022, previas las siguientes

110

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO
Nit Nro. 800096763-5

PRORROGA CONTRATO

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante oficio EL CONTRATISTA con fecha 17 de junio de 2024, solicitó ante la INTERVENTORIA tercera prorrogar el contrato inicial exponiendo los siguientes fundamentos:
   - El tiempo solicitado de 4 meses y 15 días es estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento adecuado de todas las actividades pendientes de ejecución.
   - La dificultad de accesibilidad a la zona de obra y entrada de equipos pesados que retrasaban el ingreso (tractomulas, cama-bajas, volquetas doble troque y maquinaria amarilla) -sector de los caracoles;
   - Las lluvias intensas y precipitaciones pluviales han dificultado las actividades de construcción.
2. Que a veintisiete (27) de junio de 2024 "CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO ANCLAR." Contrato obra No. LP-MM-006-2022 se encuentra con un avance del 63,62% de ejecución financiera.
3. Que el plazo final del contrato está definido por el plazo actual del convenio 1968-2021, Hasta el 15 de noviembre de 2024.
4. Que es imposible la culminación de las actividades en el plazo faltante, por lo cual se solicita prorrogar el contrato de obra inmerso en el convenio 1968-2021
5. Que la INTERVENTORÍA mediante oficio de (21) de junio avala la solicitud de prórroga presentada por el CONTRATATISTA, donde se modifica del término del contrato obra LP-MM-006-2022 inmerso en el convenio No. 1968-2021 hasta el 15 de noviembre 2024.
6. Por lo anteriormente dicho se encuentra en cumplimiento de los requisitos legales para realizar la ampliación del plazo del contrato obra LP-MM-006-2022, según lo solicitado.

Que, como consecuencia de lo anterior, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO de **obra LP-MM-006-2022**, en cuatro (4) meses y quince (15) días adicionales a los contenidos en la prórroga N° 2. Estimando un plazo de terminación hasta el 15 de noviembre de 2024. En todo caso el plazo de contrato no podrá exceder la vigencia del convenio administrativo No 1968-2021

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar las modificaciones respectivas a las garantías aportadas para la ejecución del contrato y presentarlas al municipio.

TERCERO: VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Las demás clausulas del contrato no modificadas en este contrato, continúan en los mismos términos y condiciones.

CUARTO: PUBLICACION la presente modificación, una vez perfeccionada deberá ser publicada en el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP, que administra la agencia nacional de contratación pública – Colombia compra eficiente, conforme a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO
Nit Nro. 800096763-5

PRORROGA CONTRATO

QUINTO: DOCUMENTOS ANEXOS: hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: 1) solicitud de prorroga al proyecto presentada por el contratista de obra CONSORCIO SAN DIEGO, 2) aval de interventoría donde justifica la necesidad de modificar el contrato y 3) Prorroga del convenio Interadministrativo No 1968-2021.

Para constancia se firma en el municipio de Montelíbano, a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2024.

IVAN ALFREDO VERGARA
Contratante
alcalde encargado.
Otero.
Municipio de Montelíbano Córdoba.

CONSORCIO SAN DIEGO
contratista
R.L. Luis Alejandro Marrugo

CONSORCIO SAN DIEGO

Prorroga No.4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO
Nit Nro. 800096763-5

PRORROGA CONTRATO

PRORROGA No. 4
No: LP-MM-006-2022.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTELIBANO
NIT	800096763-5
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN DIEGO
NIT DE CONTRATISTA	901603485-5
OBJETO	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO ANCLAR.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
ADICION PRESUPUESTO	NO APLICA
VALOR TOTAL	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,02)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DIAS
PRORROGA 1	UN (01) AÑO
PRORROGA 2	SEIS (06) MESES
PRORROGA 3	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
MODIFICACION ACTUAL	**MODIFICATORIO No 4. PRORROGA:** UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NACIONAL
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES – BENJAMIN SUAREZ ORTIZ

Entre los suscritos **PAUL DAVID DUQUE IBAÑEZ**, identificado con cedula de ciudadanía 1.066.571.642, quien actúa como alcalde encargado del municipio de Montelíbano – Córdoba, identificado con el Nit: 800096763-5, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **CONSORCIO SAN DIEGO**, identificado con NIT: 901603485-5 representada legalmente por **LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 73.215.196, quien actúa en nombre propio, y quien para los efectos del presente contrato se denominará como **EL CONTRATISTA**, se ha convenido realizar el presente modificatorio No. 4 al contrato LP-MM-006-2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante solicitud de EL CONTRATISTA con fecha 22 de octubre de 2024, solicitó ante la INTERVENTORIA prorrogar el contrato inicial dado lo siguiente:
- El tiempo solicitado de 1 mes y 15 días es estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento adecuado de todas las actividades pendientes de ejecución.
2. Que a siete (07) de noviembre de 2024 "CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO ANCLAR." Contrato obra No. LP-MM-006-2022 se encuentra con un avance del 74,87% de ejecución en obra y 68,39% en ejecución financiera.

3. Que el plazo final del contrato está inmerso por el plazo actual del convenio 1968-2021, Hasta el 31 de diciembre de 2024.
4. Que es imposible la culminación de las actividades en el plazo faltante, por lo cual se solicita prorrogar el contrato de obra inmerso en el convenio 1968-2021
5. Que la INTERVENTORÍA INVIAS mediante oficio de (23) de octubre avala la solicitud de prórroga por el CONTRATATISTA, donde se modifica del término del contrato obra LP-MM-006-2022 inmerso en el convenio No. 1968-2021 hasta el 31 de diciembre de 2024.
6. Por ende, se hace necesario prorrogar el contrato obra LP-MM-006-2022, según lo solicitado.

Que, como consecuencia de lo anterior, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO, que la cláusula cuarta de acuerdo con el otrosí No 2 el cual establece un plazo inicial de 1 año, cuatro meses y ocho días, con ampliación de 6 meses; el cual será modificado por una ampliación de cuatro meses y quince días. En todo caso el plazo de contrato no podrá exceder la vigencia del convenio administrativo No 1968-2021

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar las modificaciones respectivas a las garantías aportadas para la ejecución del contrato y presentarlas al municipio.

TERCERO: VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no modificadas en este contrato, continúan en los mismos términos y condiciones.

CUARTO: PUBLICACION la presente modificación, una vez perfeccionada deberá ser publicada en el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP, que administra la agencia nacional de contratación pública – Colombia compra eficiente, conforme a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios.

QUINTO: DOCUMENTOS ANEXOS: hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: 1) solicitud de prorroga al proyecto presentada por el contratista de obra CONSORCIO SAN DIEGO, 2) aval de interventoría donde justifica la necesidad de modificar el contrato y 3) Prorroga del convenio interadministrativo No 1968-2021.

Para constancia se firma en el municipio de Montelibano, a los siete (7) días del mes de noviembre de 2024.

PAUL DAVID DUQUE IBAÑEZ
Contratante
alcalde encargado.
Municipio de Montelibano Córdoba.

CONSORCIO SAN DIEGO
contratista
R.L. Luis Alejandro Marrugo Otero.

CONSORCIO SAN DIEGO

Prorroga No.5

Email: consoriciosandiego@gmail.com

PRORROGA No. 5
No: LP-MM-006-2022.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTELIBANO
NIT	800096763-5
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN DIEGO
NIT DE CONTRATISTA	901603485-5
OBJETO	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO ANCLAR.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
ADICION PRESUPUESTO	NO APLICA
VALOR TOTAL	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,02)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DIAS
PRORROGA 1	UN (01) AÑO
PRORROGA 2	SEIS (06) MESES
PRORROGA 3	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 4	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
MODIFICACION ACTUAL	**MODIFICATORIO No 5. PRORROGA:** DOS (02) MESES HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NACIONAL
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES – BENJAMIN SUAREZ ORTIZ

Entre los suscritos **GABRIEL ALBERTO CALLE DEMOYA,** identificado con cedula de ciudadanía 78.291.609, quien actúa como alcalde del municipio de Montelíbano – Córdoba, identificado con el Nit: 800096763-5, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **CONSORCIO SAN DIEGO,** identificado con NIT: 901603485-5 representada legalmente por **LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 73.215.196, quien actúa en nombre propio, y quien para los efectos del presente contrato se denominará como **EL CONTRATISTA,** se ha convenido realizar el presente modificatorio No. 5 al contrato LP-MM-006-2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante solicitud de EL CONTRATISTA con fecha 12 de diciembre de 2024, solicitó ante la INTERVENTORIA prorrogar el contrato inicial dado lo siguiente:
- El tiempo solicitado de 2 meses es estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento adecuado de todas las actividades pendientes de ejecución.
2. Que a treinta (30) de diciembre de 2024 "CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO ANCLAR." Contrato obra No. LP-MM-006-2022 se encuentra con un avance del 75.87% de ejecución en obra y 73.07% en ejecución financiera

3. Que el plazo final del contrato LP-MM-006-2022 que sería prorrogado hasta el 28 de febrero de 2025 está inmerso en el plazo actual del convenio 1968-2021, que tiene fecha de culminación hasta el 15 de julio de 2025.
4. Que es imposible la culminación de las actividades en el plazo faltante, por lo cual se solicita prorrogar el contrato de obra LP-MM-006-2022 inmerso en el convenio 1968-2021.
5. Que la INTERVENTORÍA mediante oficio de trece (13) de diciembre avala la solicitud de prórroga por el CONTRATATISTA, donde se modifica del término del contrato obra LP-MM-006-2022 inmerso en el convenio No. 1968-2021 hasta el 28 de febrero de 2025.
6. La justificación de solicitud de prorroga esta basada en lo insuficiente del tiempo restante de ejecución a causa de que la obra ha sido afectada por las condiciones climáticas adversas en la región, específicamente las fuertes lluvias, conflictos sociales que han resultado en bloqueos de vías y escasez de materiales de mezcla densa en caliente MDC-19 por parte de los proveedores, tal como reposa en el oficio OFIC-CDS-414v.2 por parte de la interventoría.
7. Por ende, se hace necesario prorrogar el contrato obra LP-MM-006-2022, según lo solicitado.

Que, como consecuencia de lo anterior, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO, que la cláusula cuarta de acuerdo al otrosí No 2 el cual establece un plazo inicial de un (01) año, cuatro (04) meses y ocho (08) días, con ampliación de seis (06) meses; con cuarta ampliación en cuatro (04) meses y quince (15 días) el cual será modificado por una quinta ampliación de dos (02) meses definido hasta el veintiocho (28) de febrero de 2025. En todo caso el plazo de contrato no podrá exceder la vigencia del convenio administrativo No 1968-2021

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar las modificaciones respectivas a las garantías aportadas para la ejecución del contrato y presentarlas al municipio.

TERCERO: VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no modificadas en este contrato, continúan en los mismos términos y condiciones.

CUARTO: PUBLICACION la presente modificación, una vez perfeccionada deberá ser publicada en el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP, que administra la agencia nacional de contratación pública – Colombia compra eficiente, conforme a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios.

QUINTO: DOCUMENTOS ANEXOS: hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: 1) solicitud de prorroga al proyecto presentada por el contratista de obra CONSORCIO SAN DIEGO, 2) aval de interventoría donde justifica la necesidad de modificar el contrato oficio CVN-1256-2022 y 3) Prorroga del convenio Interadministrativo No 1968-2021.

Para constancia se firma en el municipio de Montelíbano, a los siete (30) días del mes de diciembre de 2024.

GABRIEL ALBERTO CALLE DEMOYA
Alcalde municipal de Montelíbano

CONSORCIO SAN DIEGO
R.L. Luis Alejandro Marrugo Otero

CONSORCIO SAN DIEGO

Suspensión No.1
y prorroga a suspensión No.1

Email: consoriciosandiego@gmail.com

SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO No. LP-MM-006-2022.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTELÍBANO
NIT:	800.096.763-5
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAL NACIONAL
NIT:	901.578.761-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO R.L. LUIS ALEJANDRO MARRUGO
NIT:	901603485-5
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA VIA MONTELIBANO LAS PARCELAS-CORREGIMIENTO EL ANCLAR"
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
ADICIONES:	No aplica
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(04) MESES Y OCHO (08) DIAS
AMPLIACIONES:	CINCO PRORROGAS.
PRORROGA 1	UN (01) AÑO
PRORROGA 2	SEIS (06) MESES
PRORROGA 3	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 4	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 5	DOS (02) MESES HASTA EL 28 DE FEBRERO.
PLAZO TOTAL:	DOS (02) AÑOS, SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS.
SUPERVISOR:	Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones – Benjamín Suarez Ortiz.

Entre los suscritos **GABRIEL CALLE DEMOYA,** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 78.291.609, quien actúa en calidad de Alcalde del Municipio de Montelíbano, Córdoba, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE,** por otra parte **LUIS ALEJANDRO MARRUGO**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 73.215.196, representante legal de **CONSORCIO SAN DIEGO** denominado **CONTRATISTA**; por la otra, **JUAN ELICER VILLALOBOS PEREZ,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.228.199, director de interventoría de **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** denominado **INTERVENTOR** y el Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, el señor **BENJAMIN SUAREZ ORTIZ**; denominado **SUPERVISOR,** se ha convenido suscribir la presente suspensión del plazo al Contrato No. LP-MM-006-2022, previa las siguientes:

420

CONSIDERACIONES:

1. Que el día, 24 de febrero de 2025, a través de un oficio por parte del CONSORCIO SAN DIEGO, a la interventoría COSROCIO VIAL NACIONAL, presentó ante interventoría solicitud de suspensión de contrato de obra, solicitud en la cual manifiesta que le es imposible continuar con las actividades programadas de imprimación de asfalto por carencia de material por parte de su proveedor en la zona.
2. El señor JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ director de interventoría del CONSORCIO VIAL NACIONAL, expide oficio CVN-1328-2022 donde avala la solicitud de suspensión al contrato de obra enviada por el representante legal del CONSORCIO SAN DIEGO, la cual está motivada por la dificultad de suministro de mezcla asfáltica por parte del proveedor autorizado, oficio que entra al expediente del contrato.
3. En mérito de lo anterior,

ACUERDAN:

PRIMERO. Suspender el término del contrato No. LP-MM-006-2022 a partir del 25 de febrero de 2025 por quince (15) días calendario con fecha prevista de reinicio el doce (12) de marzo de 2025 o hasta que se supere las causales que llevo a la suspensión del contrato, fecha en que deberán suscribir el Acta de Reanudación de actividades.

SEGUNDO. El contratista deberá modificar las garantías ya constituidas del contrato No. LP-MM- 006-2022, de conformidad con lo establecido en la presente acta de suspensión.

Para constancia se firma en el Municipio de Montelibano (Córdoba), el veinticinco (25) del mes febrero de 2025.

GABRIEL CALLE DEMOYA ALCALDE DE MONTELÍBANO
El Contratante

LUIS ALEJANDRO MARRUGO
R.L. CONSORCIO SAN DIEGO
El Contratista

BENJAMIN SUARES ORTIZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

JUAN ELICER VILLALOBOS PEREZ
D.I. CONSORCIO VIAL NACIONAL
Interventor

Proyectó: Isaac Latorre – asesor jurídico.

SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO No. LP-MM-006-2022.
(AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1)

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTELÍBANO
NIT:	800.096.763-5
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAL NACIONAL
NIT:	901.578.761-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO R.L. LUIS ALEJANDRO MARRUGO
NIT:	901603485-5
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA VIA MONTELIBANO LAS PARCELAS-CORREGIMIENTO EL ANCLAR"
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
ADICIONES:	No aplica
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(04) MESES Y OCHO (08) DIAS
AMPLIACIONES:	CINCO PRORROGAS.
PRORROGA 1	UN (01) AÑO
PRORROGA 2	SEIS (06) MESES
PRORROGA 3	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 4	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 5	DOS (02) MESES HASTA EL 28 DE FEBRERO.
PLAZO TOTAL:	DOS (02) AÑOS, SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS.
SUPERVISOR:	Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones – Benjamin Suarez Ortiz.

Entre los suscritos **GABRIEL CALLE DEMOYA,** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 78.291.609, quien actúa en calidad de Alcalde del Municipio de Montelíbano, Córdoba, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE,** por otra parte **LUIS ALEJANDRO MARRUGO,** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 73.215.196, representante legal de **CONSORCIO SAN DIEGO** denominado **CONTRATISTA**; por la otra, **JUAN ELICER VILLALOBOS PEREZ,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.228.199, director de interventoría de **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** denominado **INTERVENTOR** y el Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, el señor **BENJAMIN SUAREZ ORTIZ**; denominado **SUPERVISOR,** se ha convenido suscribir la presente suspensión del plazo al Contrato No. LP-MM-006-2022, previa las siguientes:

122

CONSIDERACIONES:

1. Que el día, 25 de febrero de 2025, mediante acuerdo de parte se decidió suspender la obra, por un término de quince (15) días con fecha prevista de reinicio hasta el doce (12) de marzo, por la contingencia manifestada en el documento de suspensión No. 1; a la postre de esta suspensión el día 11 de marzo, la interventoría CONSORCIO VIAL NACIONAL avala mediante el oficio CVN-1338-2022, en atención a la solicitud realizada por parte del contratista de obra CONSORCIO SAN DIEGO, mediante comunicado OFIC-CSD-447 de 11 de marzo de 2025, con asunto "con asunto " Solicitud de prorroga a suspensión temporal del proyecto debido a escasez de materiales de agregados para MDC-19 ", en el que justifica la necesidad de AMPLIAR LA SUSPENSION No 1 DEL CONTRATO DE OBRA de la referencia, por un término de ocho (8) días calendarios, es decir, desde el día 12 de marzo de 2025 hasta el 20 de marzo de 2025, con el único propósito de que sean superadas las causas que originaron la motivación de la suspensión No 1 del contrato mediante comunicado OFIC-CSD-442 del 24 de febrero de 2025, por lo que informan que aún no han sido superadas, ya que persiste la escasez de materiales de agregados necesarios para la elaboración de la mezcla densa en caliente tipo MDC-19.
2. En mérito de lo anterior:

ACUERDAN:

PRIMERO. Ampliar la Suspensión No.1 del contrato LP-MM-006-2022 (en los términos de la suspensión No.2) que inicialmente estaría fijada hasta el día 12 de marzo de 2025 hasta el 20 de marzo de 2025 (es decir 8 días más de suspensión) o hasta que se supere las causales que llevo a la suspensión del contrato, fecha en que deberán suscribir el Acta de Reanudación de actividades.
SEGUNDO. El contratista deberá modificar las garantías ya constituidas del contrato No. LP-MM- 006-2022, de conformidad con lo establecido en la presente acta de suspensión.

Para constancia se firma en el Municipio de Montelíbano (Córdoba), el doce (12) del mes marzo de 2025.

GABRIEL CALLE DEMOYA ALCALDE DE MONTELÍBANO
El Contratante

LUIS ALEJANDRO MARRUGO
R.L. CONSORCIO EL ANCLAR.
El Contratista

BENJAMIN SUAREZ ORTIZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

JUAN ELICER VILLALOBOS PEREZ
D.T. CONSORCIO VIAL NACIONAL
Interventor

Proyectó: Isaac Latorre – asesor jurídico

CONSORCIO SAN DIEGO

Reinicio No.1

Email: consoriciosandiego@gmail.com

ACTA DE REINICIO No.1 AL CONTRATO No. LP-MM-006-2022.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTELÍBANO
NIT:	800.096.763-5
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAL NACIONAL
NIT:	901.578.761-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO R.L. LUIS ALEJANDRO MARRUGO
NIT:	901603485-5
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA VIA MONTELIBANO LAS PARCELAS-CORREGIMIENTO EL ANCLAR"
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
ADICIONES:	No aplica
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(04) MESES Y OCHO (08) DIAS
AMPLIACIONES:	CINCO PRORROGAS.
PRORROGA 1	UN (01) AÑO
PRORROGA 2	SEIS (06) MESES
PRORROGA 3	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 4	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 5	DOS (02) MESES HASTA EL 28 DE FEBRERO.
SUSPENSIÓN:	DESDE EL 25 DE FEBRERO HASTA EL 19 DE MARZO DE 2025.
PLAZO TOTAL:	DOS (02) AÑOS, SEIS (06) MESES Y OCHO (08) DIAS.
SUPERVISOR:	Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones – Benjamín Suarez Ortiz.

Entre los suscritos **GABRIEL CALLE DEMOYA,** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 78.291.609, quien actúa en calidad de Alcalde del Municipio de Montelíbano, Córdoba, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por otra parte **LUIS ALEJANDRO MARRUGO**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 73.215.196, representante legal de **CONSORCIO SAN DIEGO** denominado **CONTRATISTA**; por la otra, **JUAN ELICER VILLALOBOS PEREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.228.199, director de interventoría de **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** denominado **INTERVENTOR** y el Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, el señor **BENJAMIN SUAREZ ORTIZ**; denominado **SUPERVISOR,** se ha convenido suscribir la presente acta de reanudación al Contrato No. LP-MM-006-2022, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El contrato de obra **LP-MM-006-2022,** cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA VIA MONTELIBANO LAS PARCELAS-CORREGIMIENTO EL ANCLAR", Se encontraba suspendido desde el día 25 de febrero de 2025 hasta el 19 de marzo de 2025 (23 días calendario).

2. Las causales de suspensión de ejecución de obras, las cuales se discriminaron en las actas de suspensión, fueron superadas, tal como lo indica la interventoría de CONSORCIO VIAL NACIONAL, en el oficio CVN-1342-2022 dicta:" A la falta de material denso, Actualmente se puede constatar y verificar que esta situación ha sido superada a nivel departamental y en los alrededores del proyecto en ejecución por los diferentes proveedores de este material".

EN CONCORDANCIA CON LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES SE ESTIPULA:

PRIMERO. Reiniciar las actividades del contrato obra LP-MM-006-2022, con el propósito de darle satisfactorio cumplimiento a los objetos contractuales. Teniendo por fecha de reinicio el día 20 de marzo de 2025.
SEGUNDO. Notificar y recordarle a el contratista que deberá modificar las garantías ya constituidas del contrato No. LP-MM- 006-2023, de conformidad con lo establecido en la presente acta de reinicio.

Para constancia se firma en el Municipio de Montelíbano (Córdoba), el vente (20) del mes marzo de 2025.

GABRIEL CALLE DEMOYA ALCALDE DE MONTELÍBANO
El Contratante

LUIS ALEJANDRO MARRUGO
R.L. CONSORCIO SAN DIEGO.
El Contratista

BENJAMIN SUAREZ ORTIZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

JUAN ELICER VILLALOBOS PEREZ
D.I CONSORCIO VIAL NACIONAL
Interventor

Proyectó: Isaac Latorre – asesor jurídico.

126

Prorroga No.6

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO
Nit Nro. 800096763-5

PRORROGA CONTRATO

PRORROGA No. 6
No: LP-MM-006-2022.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTELIBANO
NIT	800096763-5
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN DIEGO
NIT DE CONTRATISTA	901603485-5
OBJETO	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO ANCLAR.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
ADICION PRESUPUESTO	NO APLICA
VALOR TOTAL	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,02)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DIAS
PRORROGA 1	UN (01) AÑO
PRORROGA 2	SEIS (06) MESES
PRORROGA 3	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 4	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 5	DOS (02) MESES.
MODIFICACION ACTUAL	**MODIFICATORIO No 6. PRORROGA:** UN (01) MES Y QUINCE (15 DIAS)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NACIONAL
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES – BENJAMIN SUAREZ ORTIZ

Entre los suscritos **GABRIEL ALBERTO CALLE DEMOYA**, identificado con cedula de ciudadanía 78.291.609, quien actúa como alcalde del municipio de Montelíbano – Córdoba, identificado con el Nit: 800096763-5, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **CONSORCIO SAN DIEGO,** identificado con NIT: 901603485-5 representada legalmente por **LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 73.215.196, quien actúa en nombre propio, y quien para los efectos del presente contrato se denominará como **EL CONTRATISTA**, se ha convenido realizar el presente modificatorio No. 6 al contrato LP-MM-006-2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante solicitud de EL CONTRATISTA con fecha 24 de FEBRERO de 2025, solicitó ante la INTERVENTORIA mediante el comunicado OFIC-CSD-441 prorrogar el contrato inicial dado lo siguiente:

- El tiempo solicitado de cuarenta y cinco (45) días es estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento adecuado de todas las actividades pendientes de ejecución.

2. Que, a la fecha de solicitud de prórroga, es decir el veinticinco (24) de febrero de 2025 "CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO ANCLAR." Contrato obra No. LP-MM-006-2022 se encuentra con un avance del 83.14% de ejecución en obra.

3. Que El contrato de obra LP-MM-006-2022, se encontraba suspendido desde el 25 de febrero hasta el 19 de marzo de 2025, tuvo por fecha de reinicio el día 20 de marzo quedando aun 4 días pendientes de ejecución es decir la fecha límite del contrato se extendió desde el 28 de febrero hasta el 23 de marzo de 2025.
4. Que el plazo final del contrato LP-MM-006-2022 que sería prorrogado hasta el siete (07) de mayo de 2025 está inmerso en el plazo actual del convenio 1968-2021, que tiene fecha de culminación hasta el 15 de julio de 2025.
5. Que es imposible la culminación de las actividades en el plazo faltante, por lo cual se solicita prorrogar el contrato de obra LP-MM-006-2022 inmerso en el convenio 1968-2021.
6. Que la **INTERVENTORÍA** mediante oficio de veinticuatro (24) de febrero avala la solicitud de prórroga por el CONTRATATISTA, donde se modifica del término del contrato obra LP-MM-006-2022 inmerso en el convenio No. 1968-2021 hasta siete (07) de mayo de 2025.
7. La justificación de solicitud de prorroga está basada en lo insuficiente del tiempo restante de ejecución a causa de que la obra ha sido afectada por las condiciones climáticas adversas en la región, específicamente las fuertes lluvias, conflictos sociales que han resultado en bloqueos de vías y escasez de materiales de mezcla densa en caliente MDC-19 por parte de los proveedores, avalado parte de la interventoría.
8. Por ende, se hace necesario prorrogar el contrato obra LP-MM-006-2022, según lo solicitado.

Que, como consecuencia de lo anterior, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO, que la cláusula cuarta de acuerdo al otrosí No 2 el cual establece un plazo inicial de un (01) año, cuatro (04) meses y ocho (08) días, con ampliación de seis (06) meses; con cuarta ampliación en cuatro (04) meses y quince (15 días); con quinta ampliación de dos (02) meses y una sexta ampliación de cuarenta y cinco (45) días definidos hasta el siete (07) de mayo de 2025. En todo caso el plazo de contrato no podrá exceder la vigencia del convenio administrativo No 1968-2021

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar las modificaciones respectivas a las garantías aportadas para la ejecución del contrato y presentarlas al municipio.

TERCERO: VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no modificadas en este contrato, continúan en los mismos términos y condiciones.

CUARTO: PUBLICACION la presente modificación, una vez perfeccionada deberá ser publicada en el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP, que administra la agencia nacional de contratación pública – Colombia compra eficiente, conforme a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios.

QUINTO: DOCUMENTOS ANEXOS: hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: 1) solicitud de prorroga al proyecto presentada por el contratista de obra CONSORCIO SAN DIEGO, 2) aval de interventoría donde justifica la necesidad de modificar el contrato oficio CVN-1331V2-2022 y 3) Prorroga del convenio Interadministrativo No 1968-2021.

Para constancia se firma en el municipio de Montelíbano, al veintiuno (21) días del mes de marzo de 2025.

GABRIEL ALBERTO CALLE DEMOYA
Alcalde municipal de Montelíbano

CONSORCIO SAN DIEGO
R.L. Luis Alejandro Marrugo Otero.

Suspensión No.2
y prorroga a suspensión No.2

SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO No. LP-MM-006-2022.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTELÍBANO
NIT:	800.096.763-5
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAL NACIONAL
NIT:	901.578.761-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO R.L. LUIS ALEJANDRO MARRUGO
NIT:	901603485-5
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA VIA MONTELIBANO LAS PARCELAS-CORREGIMIENTO EL ANCLAR"
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
ADICIONES:	No aplica
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(04) MESES Y OCHO (08) DIAS
AMPLIACIONES:	CINCO PRORROGAS.
PRORROGA 1	UN (01) AÑO
PRORROGA 2	SEIS (06) MESES
PRORROGA 3	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 4	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 5	DOS (02) MESES HASTA EL 28 DE FEBRERO.
SUSPENSION 1	VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2025
REINICIO 1	DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2025
PRORROGA 6	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2025
PLAZO TOTAL:	DOS (02) AÑOS, SIETE (07) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.
SUPERVISOR:	Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones – Benjamín Suarez Ortiz.

Entre los suscritos **GABRIEL CALLE DEMOYA,** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 78.291.609, quien actúa en calidad de Alcalde del Municipio de Montelibano, Córdoba, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE,** por otra parte **LUIS ALEJANDRO MARRUGO**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 73.215.196, representante legal de **CONSORCIO SAN DIEGO** denominado **CONTRATISTA**; por la otra, **JUAN ELICER VILLALOBOS PEREZ,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.228.199, director de interventoría de **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** denominado **INTERVENTOR** y el Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, el señor **BENJAMIN SUAREZ ORTIZ**; denominado

131

SUPERVISOR, se ha convenido suscribir la presente suspensión del plazo al Contrato No. LP-MM-006-2022, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día, 6 de mayo de 2025, a través de un oficio OFIC-CSD-460 por parte del contratista CONSORCIO SAN DIEGO, a la interventoría CONSORCIO VIAL NACIONAL, presentó ante interventoría solicitud de suspensión de contrato de obra, solicitud en la cual manifiesta que le es imposible continuar con las actividades programadas de imprimación de asfalto por carencia de material por parte de su proveedor en la zona.
2. El señor JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ director de interventoría del CONSORCIO VIAL NACIONAL, expide oficio CVN-1397-2022 donde avala la solicitud de suspensión al contrato de obra enviada por el representante legal del CONSORCIO SAN DIEGO, la cual está motivada por la dificultad de suministro de mezcla asfáltica por parte del proveedor autorizado, oficio que entra al expediente del contrato.
3. En mérito de lo anterior,

ACUERDAN:

PRIMERO. Suspender el término del contrato No. LP-MM-006-2022 a partir del 7 de mayo de 2025 por diez (10) días calendario con fecha prevista de reinicio el diecisiete (17) de mayo de 2025 o hasta que se supere las causales que llevo a la suspensión del contrato, fecha en que deberán suscribir el Acta de Reanudación de actividades.

SEGUNDO. El contratista deberá modificar las garantías ya constituidas del contrato No. LP-MM- 006-2022, de conformidad con lo establecido en la presente acta de suspensión.

Para constancia se firma en el Municipio de Montelíbano (Córdoba), el siete (7) días del mes mayo de 2025.

GABRIEL CALLE DEMOYA ALCALDE DE MONTELÍBANO
El Contratante

LUIS ALEJANDRO MARRUGO
R.L. CONSORCIO SAN DIEGO
El Contratista

BENJAMIN SUARES ORTIZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

JUAN ELICER VILLALOBOS PEREZ
D.I. CONSORCIO VIAL NACIONAL
Interventor

Proyectó: Isaac Latorre – asesor jurídico

SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO No. LP-MM-006-2022.
(AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2)

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTELÍBANO
NIT:	800.096.763-5
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAL NACIONAL
NIT:	901.578.761-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO R.L. LUIS ALEJANDRO MARRUGO
NIT:	901603485-5
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA VIA MONTELIBANO LAS PARCELAS-CORREGIMIENTO EL ANCLAR"
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
ADICIONES:	No aplica
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(04) MESES Y OCHO (08) DIAS
AMPLIACIONES:	CINCO PRORROGAS.
PRORROGA 1	UN (01) AÑO
PRORROGA 2	SEIS (06) MESES
PRORROGA 3	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 4	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 5	DOS (02) MESES HASTA EL 28 DE FEBRERO.
SUSPENSION 1	VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2025
REINICIO 1	DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2025
PRORROGA 6	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2025
PLAZO TOTAL:	DOS (02) AÑOS, SIETE (07) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.
SUPERVISOR:	Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones – Benjamin Suarez Ortiz.

Entre los suscritos **GABRIEL CALLE DEMOYA,** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 78.291.609, quien actúa en calidad de Alcalde del Municipio de Montelíbano, Córdoba, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE,** por otra parte **LUIS ALEJANDRO MARRUGO**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 73.215.196, representante legal de **CONSORCIO SAN DIEGO** denominado **CONTRATISTA**; por la otra, **JUAN ELICER VILLALOBOS PEREZ,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.228.199, director de interventoría de **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** denominado **INTERVENTOR** y el Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, el señor **BENJAMIN SUAREZ ORTIZ**; denominado

SUPERVISOR, se ha convenido suscribir la presente ampliación de suspensión del plazo al Contrato No. LP-MM-006-2022, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día, 7 de Mayo de 2025, mediante acuerdo de parte se decidió suspender la obra, por un término de diez (10) días con fecha prevista de reinicio hasta el diecisiete (17) de mayo, por la contingencia manifestada en el documento Acta de suspensión No. 2; a la postre de esta suspensión el día 16 de mayo, la interventoría CONSORCIO VIAL NACIONAL avala mediante el oficio CVN-1399-2022, en atención a la solicitud realizada por parte del contratista de obra CONSORCIO SAN DIEGO, mediante comunicado OFIC-CSD-461 de 16 de mayo de 2025, con asunto "Solicitud de prórroga a la suspensión No.2", en el que justifica la necesidad de AMPLIAR LA SUSPENSION No 2 DEL CONTRATO DE OBRA, por un término de cuatro (4) días calendarios, con el único propósito de que sean superadas las causas que originaron la motivación de la suspensión No 2 del contrato por lo que informan que aún no han sido superadas, ya que persiste la escasez de materiales de agregados necesarios para la elaboración de la mezcla densa en caliente tipo MDC-19.
2. En mérito de lo anterior:

ACUERDAN:

PRIMERO. Ampliar la Suspensión No.2 del contrato LP-MM-006-2022 (en los términos de la suspensión No.2) que inicialmente estaría fijada hasta el 16 mayo con fecha de reinicio el día 17 de mayo de 2025, la cual quedaría con la prórroga de la suspensión con fecha de reinicio el 21 de mayo de 2025 (es decir 4 días más de suspensión) o hasta que se supere las causales que motivaron a la suspensión del contrato, fecha en que deberán suscribir el Acta de reinicio de actividades.

SEGUNDO. El contratista deberá modificar las garantías ya constituidas del contrato No. LP-MM- 006-2022, de conformidad con lo establecido en la presente acta de suspensión.

Para constancia se firma en el Municipio de Montelíbano (Córdoba), el dieciséis (16) del mes mayo de 2025.

GABRIEL CALLE DEMOYA ALCALDE DE MONTELÍBANO
El Contratante

LUIS ALEJANDRO MARRUGO
R.L. CONSORCIO EL ANCLAR.
El Contratista

BENJAMIN SUAREZ ORTIZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

JUAN FELICER VILLALOBOS PEREZ
D.I. CONSORCIO VIAL NACIONAL
Interventor

Proyectó: Isaac Latorre – asesor jurídico

CONSORCIO SAN DIEGO

Reinicio No.2

ACTA DE REINICIO No.2 AL CONTRATO No. LP-MM-006-2022.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTELÍBANO
NIT:	800.096.763-5
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAL NACIONAL
NIT:	901.578.761-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO R.L. LUIS ALEJANDRO MARRUGO
NIT:	901603485-5
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE LA VIA MONTELIBANO LAS PARCELAS-CORREGIMIENTO EL ANCLAR"
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
ADICIONES:	No aplica
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(04) MESES Y OCHO (08) DIAS
AMPLIACIONES:	CINCO PRORROGAS.
PRORROGA 1	UN (01) AÑO
PRORROGA 2	SEIS (06) MESES
PRORROGA 3	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 4	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 5	DOS (02) MESES HASTA EL 28 DE FEBRERO.
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 25 DE FEBRERO HASTA EL 19 DE MARZO DE 2025.
PRORROGA 6	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2025
PLAZO TOTAL:	DOS (02) AÑOS, SIETE (07) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.
SUPERVISOR:	Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones – Benjamín Suarez Ortiz.

Entre los suscritos **GABRIEL CALLE DEMOYA,** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 78.291.609, quien actúa en calidad de Alcalde del Municipio de Montelíbano, Córdoba, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE,** por otra parte **LUIS ALEJANDRO MARRUGO**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 73.215.196, representante legal de **CONSORCIO SAN DIEGO** denominado **CONTRATISTA**; por la otra, **JUAN ELICER VILLALOBOS PEREZ,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.228.199, director de interventoría de **CONSORCIO VIAL NACIONAL,** denominado **INTERVENTOR** y el Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, el señor **BENJAMIN SUAREZ ORTIZ;** denominado **SUPERVISOR,** se ha convenido suscribir la presente acta de reinicio al Contrato No. LP-MM-006-2022, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El contrato de obra **LP-MM-006-2022,** cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA VIA MONTELIBANO LAS PARCELAS-CORREGIMIENTO EL ANCLAR", Se encontraba suspendido desde el día 7 de mayo de 2025 hasta el 20 de mayo de 2025.

2. Las causales de suspensión de ejecución de obras, las cuales se discriminaron en las actas de suspensión No. 2, y fueron superadas, pues no hay manifestación contraria por parte del contratista de obra CONSORCIO SAN DIEGO ni de la interventoría CONSORCIO VIAL NACIONAL

EN CONCORDANCIA CON LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES SE ESTIPULA:

PRIMERO. Reiniciar las actividades del contrato obra LP-MM-006-2022, con el propósito de darle satisfactorio cumplimiento a los objetos contractuales. Teniendo por fecha de reinicio el día 21 de mayo de 2025.
SEGUNDO. Notificar y recordarle a el contratista que deberá modificar las garantías ya constituidas del contrato No. LP-MM- 006-2023, de conformidad con lo establecido en la presente acta de reinicio.

Para constancia se firma en el Municipio de Montelíbano (Córdoba), el veintiuno (21) del mes mayo de 2025.

GABRIEL CALLE DEMOYA ALCALDE DE MONTELÍBANO
El Contratante

LUIS ALEJANDRO MARRUGO
R.L. CONSORCIO SAN DIEGO.
El Contratista

BENJAMIN SUAREZ ORTIZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

JUAN ELICER VILLALOBOS PEREZ
D.I CONSORCIO VIAL NACIONAL
Interventor

Proyectó: Isaac Latorre – asesor jurídico

CONSORCIO SAN DIEGO

Prorroga No.7

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO
Nit Nro. 800096763-5

PRORROGA CONTRATO

PRORROGA No. 7
No: LP-MM-006-2022.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTELIBANO
NIT	800096763-5
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN DIEGO
NIT DE CONTRATISTA	901603485-5
OBJETO	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO ANCLAR.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,20)
ADICION PRESUPUESTO	NO APLICA
VALOR TOTAL	VEINTISÉIS MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON DOS CENTAVOS ($26.997.426.440,02)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DIAS
PRORROGA 1	UN (01) AÑO
PRORROGA 2	SEIS (06) MESES
PRORROGA 3	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 4	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PRORROGA 5	DOS (02) MESES.
SUSPENSION 1	DESDE EL 25 DE FEBRERO HASTA EL 19 DE MARZO DE 2025.
PRORROGA 6	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2025
SUSPENSION 2	DESDE 7 DE MAYO HASTA EL VEINTE DE MAYO 2025
MODIFICACION ACTUAL	**MODIFICATORIO No 7. PRORROGA:** UN (01) MES Y NUEVE (9) DIAS – DESDE EL VIENTITRES (23) DE MAYO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025.
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL NACIONAL
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES – BENJAMIN SUAREZ ORTIZ

Entre los suscritos **GABRIEL ALBERTO CALLE DEMOYA**, identificado con cedula de ciudadanía 78.291.609, quien actúa como alcalde del municipio de Montelíbano – Córdoba, identificado con el Nit: 800096763-5, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **CONSORCIO SAN DIEGO**, identificado con NIT: 901603485-5 representada legalmente por **LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 73.215.196, quien actúa en nombre propio, y quien para los efectos del presente contrato se denominará como **EL CONTRATISTA**, se ha convenido realizar el presente modificatorio No. 7 al contrato LP-MM-006-2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante solicitud de EL CONTRATISTA con fecha 5 de MAYO de 2025, solicitó ante la INTERVENTORIA mediante el comunicado OFIC-CSD-458 prorrogar el contrato Inicial dado lo siguiente:

- El tiempo solicitado hasta el 30 de junio del 2025 es estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento adecuado de todas las actividades pendientes de ejecución.

2. Que, a la fecha de solicitud de prórroga, es decir el cinco (5) de mayo de 2025 "CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO ANCLAR." Contrato obra No. LP-MM-006-2022 se encuentra con un avance del 88,09% de ejecución en obra.
3. Que El contrato de obra LP-MM-006-2022, se encontraba suspendido desde el 7 de mayo hasta el 20 de mayo de 2025, tuvo por fecha de reinicio el día 21 de mayo quedando aun 2 días pendientes de ejecución es decir la fecha límite del contrato se extendió se extendió desde el 21 de mayo hasta el 22 de mayo de 2025.
4. Que el plazo final del contrato LP-MM-010-2023 que sería prorrogado hasta el treinta (30) de junio de 2025 está inmerso en el plazo actual del convenio 1968-2021, que tiene fecha de culminación hasta el 15 de julio de 2025.
5. Que es imposible la culminación de las actividades en el plazo faltante, por lo cual se solicita prorrogar el contrato de obra LP-MM-006-2022 inmerso en el convenio 1968-2021.
6. Que la INTERVENTORÍA mediante oficio de dieciséis (16) de mayo avala la solicitud de prórroga por el CONTRATATISTA, donde se modifica del término del contrato obra LP-MM-006-2022 inmerso en el convenio No. 1968-2021 hasta treinta (30) de junio de 2025.
7. La justificación de solicitud de prorroga está basada en el tiempo restante de ejecución es insuficiente a causa de que la obra ha sido afectada por las condiciones climáticas adversas en la región, específicamente las fuertes lluvias, y escasez de materiales de mezcla densa en caliente MDC-19 por parte de los proveedores, avalados estos motivos por parte de la interventoría.
8. Por ende, se hace necesario prorrogar el contrato obra LP-MM-006-2022, según lo solicitado.

Que, como consecuencia de lo anterior, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO, que la cláusula cuarta de acuerdo al otrosí No 2 el cual establece un plazo inicial de un (01) año, cuatro (04) meses y ocho (08) días, con ampliación de seis (06) meses; con cuarta ampliación en cuatro (04) meses y quince (15 días); con quinta ampliación de dos (02) meses, una sexta ampliación de cuarenta y cinco (45) días definidos hasta el siete (07) de mayo de 2025 y una séptima ampliación del contrato por un mes y nueve días, definidos hasta el treinta (30) de junio de 2025. En todo caso el plazo de contrato no excede la vigencia del convenio administrativo No 1968-2021

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a realizar las modificaciones respectivas a las garantías aportadas para la ejecución del contrato y presentarlas al municipio.

TERCERO: VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no modificadas en este contrato, continúan en los mismos términos y condiciones.

CUARTO: PUBLICACION la presente modificación, una vez perfeccionada deberá ser publicada en el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP, que administra la agencia nacional de contratación pública – Colombia compra eficiente, conforme a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios.

QUINTO: DOCUMENTOS ANEXOS: hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: 1) solicitud de prorroga al proyecto presentada por el contratista de obra CONSORCIO SAN DIEGO, 2) aval de interventoría donde justifica la necesidad de modificar el contrato oficio CVN-1399-2022 y 3) Prorroga del convenio interadministrativo No 1968-2021.

Para constancia se firma en el municipio de Montelíbano, al veintidós (22) días del mes de mayo de 2025.

GABRIEL ALBERTO CALLE DEMOYA
Alcalde municipal de Montelíbano

CONSORCIO SAN DIEGO
R.L. Luis Alejandro Marrugo Otero.

CONSORCIO SAN DIEGO

Acta Final Numérica

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROYECTO MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	GER-GEO-03-A-ACTA-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: (Día/ Mes / Año)

ENTIDAD EJECUTORA: CONSORCIO VIAL NACIONAL — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — ACTA No.: 7 — ACTA PARC.: 07 — VALOR BÁSICO ACTA: $ 7.561.660.730,00 — MES: Ayo 2025

CONTRATO No.: LP-ANI-005-2022 (Indique número y año) — OBJETO: Construcción Vía Montelíbano- Las Palmitas – Cerro Matoso III Anillo — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO (Indique no. nit y razón social del contrato según certificado rut)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 373 de 2022 — INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 20 DE ENERO 2026 (En meses según contrato principal) — FECHA DE INICIO: 20/05/2025 (Indique día/mes/año) — FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 20/07/2025 — FECHA DE REANUDACIÓN 1: 20/08/2025 (Indique día/mes/año) — VALOR INICIAL ($): 36.837.435.440,00 (Según contrato principal) — VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) ($+A+B): $ 33.887.420.440,00

PLAZO ADICIONAL (DÍAS): 33 (8 DE 7 Y 7 DE 2026) (En meses según los prorrogas o/o suspensiones) — FECHA DE VENCIMIENTO: 20/09/2026 (Incluido las suspensiones, indique día/mes/año) — FECHA DE REANUDACIÓN 2: 20/08/2025 — FECHA DE REANUDACIÓN 3: 21/08/2025 (Indique día/mes/año) — VALOR ADICIONES ($): $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONTRATO MÁS ACTUALIZACIÓN Acta de suspensión y prórroga No. 2 de fecha 24/06/2025		OBRA EJECUTADA					
											ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		GRAL	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. EXPLANACIONES																
1	3102.3	310		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	21.907,38	$ 72.129	$ 366.138.131,00	20.405,40	$ 350.150.131,00	20.405,40	$ 350.150.131,00	-	$ -	20.405,400	$ 350.150.131,00
2	320.1	320		Terraplenes	m3	7.466,00	$ 27.540	$ 39.099.124,00	25.091,00	$ 700.478.132,00	25.091,00	$ 700.478.132,00	-	$ -	25.091,000	$ 700.478.132,00
				SUBTOTAL				$ 504.197.300,00		$ 1.050.610.000,00		$ 1.050.610.000,00		$ -		$ 1.050.610.000,00
5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONCRETOS Y ACEROS DE REFUERZO																
	ALCANTARILLAS DE LOSA Y TUBERÍA, CONCRETO HIDRÁULICO [ESTE]															
3	600.2 (1)	600		Excavaciones varias en material común, excepto el marro	m3	1.034,10	$ 95.618	$ 102.999.472,00	522,00	$ 38.136.996,00	522,00	$ 38.136.996,00	-	$ -	522,000	$ 38.136.996,00
4	307.6	300		Demolición de estructuras	m3	10,00	$ 300.000	$ 3.000.000,00	33,00	$ 4.000.023,00	33,00	$ 4.000.023,00	-	$ -	33,000	$ 4.000.023,00
5	307.1	307		Cajeón de concreto reforzado tipo 0 de 600 mm de diámetro interior	m	480,00	$ 662.999	$ 317.759.520,00	80,00	$ 76.634.624,00	80,00	$ 76.634.624,00	-	$ -	80,000	$ 76.634.624,00
6	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2) 2000 PSI	m3	13,20	$ 633.131	$ 8.356.697,00	90,31	$ 34.586.447,00	90,31	$ 34.586.447,00	-	$ -	90,310	$ 34.586.447,00
7	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2) 3000 PSI	m3	700,00	$ 787.424	$ 551.196.784,00	81,00	$ 63.804.830,00	81,00	$ 63.804.830,00	-	$ -	81,000	$ 63.804.830,00
8	660.1	660		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	37.600,00	$ 8.903	$ 335.003.560,00	5.990,00	$ 53.330.050,00	5.990,00	$ 53.330.050,00	-	$ -	5.990,000	$ 53.330.050,00
9	610.3	610		Pilotes para Estructuras con Hincado	m3	1.984,00	$ 161.004	$ 302.000.000,00	400,61	$ 86.442.210,00	400,61	$ 86.442.210,00	-	$ -	400,610	$ 86.442.210,00
				SUB TOTAL				$ 1.576.963.173,00		$ 357.337.836,00		$ 357.337.836,00		$ -		$ 357.337.836,00
10. ESTRUCTURAS DE MURO DE SOSTENIMIENTO [CONCRETO M]																
	MUROS CLASE I, II, III, S															
10	600.2 (1)	600		Excavaciones varias en material común en seco o húmedo	m3	382,00	$ 19.000	$ 7.262.000,00	656,00	$ 35.715.147,00	656,00	$ 35.715.147,00	-	$ -	656,000	$ 35.715.147,00
11	201.2	200		Demolición de estructuras	Gl	25,00	$ 336.000	$ 8.400.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12	630.3	630		Concreto clase F (140 kg/cm2) 2000 PSI	m3	6,00	$ 809.121	$ 4.741.700,00	20,00	$ 16.881.168,00	20,00	$ 16.881.168,00	-	$ -	20,000	$ 16.881.168,00
13	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2) 3000 PSI	m3	47,12	$ 787.400	$ 36.144.000,00	168,52	$ 132.191.300,00	168,52	$ 132.191.300,00	-	$ -	168,520	$ 132.191.300,00
14	660.1	660		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	5.713,00	$ 8.903	$ 37.831.000,00	18.991,74	$ 169.468.854,00	18.991,74	$ 169.468.854,00	-	$ -	18.991,740	$ 169.468.854,00
15	610.2	610		Pilotes para Estructuras con Hincado	m3	72,00	$ 191.004	$ 13.813.008,00	402,13	$ 87.800.079,00	402,13	$ 87.800.079,00	-	$ -	402,130	$ 87.800.079,00
				SUBTOTAL				$ 93.836.708,00		$ 450.749.696,00		$ 450.749.696,00		$ -		$ 450.749.696,00
24. PAVIMENTOS CONCRETO ASFÁLTICO, MICRO, SMA CALIDAD MF																
	SISTEMA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO															
16	330.3	330		Riego Emulsión Clase E	m3	5.700,00	$ 370.004	$ 1.809.024.800,00	5.068,24	$ 1.869.263.231,00	5.068,00	$ 1.861.304.100,00	18,24	$ 8.161.217,00	5.068,240	$ 1.869.263.231,00
17	330.3	330		Riego Emulsión Clase E	m2	12.424,00	$ 263.006	$ 3.268.664.864,00	7.204,00	$ 2.000.415.129,00	7.204,00	$ 2.000.415.129,00	24,00	$ 6.668.304,00	7.204,000	$ 2.000.415.129,00
18	311.1	311		Afirmado (Material para mejoramiento)	m3	8.700,00	$ 370.000	$ 1.209.715.000,00	3.001,73	$ 411.578.914,00	-	$ -	3.001,73	$ 411.578.914,00	3.001,730	$ 411.578.914,00
19	330.1	330		SUBRASANTE (ESTABILIZADO CON CAL/BIO, CEMENTO O SIMILAR)	m2	11.400,00	$ 320.004	$ 1.464.705.600,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20	450.2	450		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	28.000,00	$ 4.207	$ 120.705.600,00	37.091,98	$ 156.772.705,00	36.000,00	$ 152.172.000,00	1.091,98	$ 4.600.705,00	37.091,980	$ 156.772.705,00
21	450.3 P	450P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	4.040,00	$ 1.295.871	$ 5.235.072.360,00	3.070,00	$ 3.981.849.000,00	2.994,79	$ 3.837.457.621,00	265,84	$ 344.373.719,00	3.070,333	$ 3.981.849.000,00
22	450.4	450		Concreto clase S (35 kg/cm2) 3000 PSI - ILIMITE	m2	22.000,00	$ 707.400	$ 2.012.136.000,00	1.000,87	$ 1.000.887.000,00	500,00	$ 356.140.000,00	500,87	$ 644.747.000,00	1.000,870	$ 1.000.887.000,00
23	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm2 (59.600 PSI)	kg	61.000,00	$ 8.903	$ 780.000.000,00	54.116,13	$ 482.021.971,00	36.000,00	$ 179.979.429,00	18.116,13	$ 302.414.571,00	54.116,130	$ 482.021.971,00
				SUBTOTAL				$ 15.307.736.289,00		$ 9.904.328.950,00		$ 8.799.955.453,00		$ 1.895.217.479,00		$ 9.695.074.709,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MENSUAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MODULO DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	GEOVIAS-FO-CI-PR-7
VERSIÓN	1
HOJA	
FECHA	28/04/2020 (día/mes/año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAL DE CESARES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — ACTA No. 7 — ACTA FINAL: — VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.997.482.730,00 — MES: Junio 2020

CONTRATO No.: LP-ANI-026-2020 (Indique: Número y año)
OBJETO: Construcción Vía Montelíbano- La Pascuita – Corregimiento El Aguila
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MOCARI
(Indique si: una o Unión del Unidos del contrato según corresponda)
INTERVENTORÍA No.: 005 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL MOCARI

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2020 (En meses según corresponda (días/año))
FECHA DE INICIO: 28/05/2020 (Indique día de inicio(día))
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 31/05/2020
FECHA DE REINICIACIÓN 1: (Indique día mes(mes))
VALOR INICIAL ($): $ 26.997.426.940,29 (Según contrato adicional)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) ($+A+B): $ 26.997.426.940,29

PLAZO ACUMULADO: 31 DICIEMBRE 2020 (En meses según corresponda (días/año))
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2020 (Indique día mes(mes))
FECHA DE REINICIACIÓN 1: 28/05/2020
FECHA DE REINICIACIÓN 2: 31/05/2020 (Indique día mes(mes))
VALOR ANTICIPO ($): $

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	DISPOSICIÓN		DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta de mayores y menores No. 1 de fecha 28/05/2020)		OBRA EJECUTADA					
		SPAL	OAAT									ACUMULADO ANTERIOR		PERIODO ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
						CANTIDAD	VR. UNIT	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. MURO DE CONTENCIÓN EN APROBADO																	
	MURO EN GAVIONES																
24	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco o mezcla.	m3	700,00	$ 30.818	$ 21.572.600,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	600.5	600		Gaviones tipo I (140 kg/cm2 a 2000 PSI)	m3	1.000	$ 682.727	$ 682.727.000,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	661.4	661		Cerrado de Malla de alambre de Acero Galvanizado Clase II revestimiento en aleación Zn/Al/Mm/Mg y PVC	m2	7.200,00	$ 9.500	$ 68.760.000,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	670.1.1	670		Geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	800,00	$ 6.425	$ 5.140.000,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL							$ 796.480.813,00			$ -		$ -		$ -		$ -
	SUMINISTRO EN CONCRETO HIDRAULICO 3.000 PSI DE CATAMALIA																
	METROS SUMINISTRO HIDRAULICO																
30	500.2	500		Gabiones tipo Caja (1;	m3	4.284,00	$ 265.426	$ 1.137.194.184,00		2.828,77	$ 748.697.650,00	2.828,77	$ 748.697.650,00	-	$ -	2.828,779	$ 748.697.650,00
31	501.1	501		Revestido Plástico para colchonetas	m3	2.778,00	$ 170.000	$ 472.260.000,00		2.828,00	$ 480.817.847,00	-	$ -	2.258,84	$ 400.517.847,00	2.258,848	$ 400.517.847,00
32	5000.1	500		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	3.001,00	$ 828.310	$ 2.486.406.927,00		3.001,77	$ 3.000.000.000,00	2.172,00	$ 2.020.837.760,00	1,14	$ 1.058.280,00	2.271,779	$ 3.000.000.040,00
33	5000.2	500		Concreto clase D (210 kg/cm2) a 3000 PSI) - CUNETAS	m3	1.240,00	$ 797.400	$ 988.968.254,00		1.000,00	$ 797.400.000,00	1.040,00	$ 788.495.170,00	61,38	$ 38.421.648,00	1.101,888	$ 827.911.208,00
34	5450.1	545		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2.000.000 PSI	kg	61.540,00	$ 8.000	$ 492.464.720,00		64.171,00	$ 720.110.440,00	28.139,24	$ 627.255.970,00	3.066,57	$ 91.842.448,00	63.173,810	$ 720.190.448,00
	SUBTOTAL							$ 5.859.866.205,00			$ 6.756.422.900,00		$ 6.205.421.495,00		$ 551.033.837,00		$ 6.756.455.938,00
	VIL MURO EN CONCRETO REFORZADO																
	MURO EN CONCRETO REFORZADO MEDIA ORDEN																
33	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco o mezcla.	m3	650,00	$ 30.818	$ 20.178.970,00		3.722,40	$ 114.697.249,00	3.722,40	$ 114.697.249,00	-	$ -	3.722,400	$ 114.697.249,00
34	600.5	600		Gaviones tipo I (140 kg/cm2) a 2000 PSI	m3	80,00	$ 682.727	$ 54.554.545,00		80,80	$ 55.715.273,00	80,80	$ 55.715.273,00	-	$ -	80,800	$ 55.715.273,00
35	600.4	600		Concreto clase D (210 kg/cm2) a 3000 PSI (ALIVIO)	m3	150,00	$ 828.000	$ 124.200.000,00		915,60	$ 758.615.835,00	915,60	$ 758.615.835,00	-	$ -	915,600	$ 758.615.835,00
36	645.1	645		Acero de refuerzo FY =240 Mpa	kg	20.641,00	$ 8.000	$ 165.128.000,00		95.966,97	$ 828.382.744,00	95.966,97	$ 828.382.744,00	-	$ -	95.966,970	$ 828.382.744,00
37	670.2	670		Relleno con Gaviones con suelos	m3	812,00	$ 189.834	$ 154.215.048,00		2.704,65	$ 559.207.148,00	2.704,65	$ 559.207.148,00	-	$ -	2.704,650	$ 559.207.148,00
	SUBTOTAL							$ 773.886.566,00			$ 2.346.218.649,00		$ 2.346.218.649,00		$ -		$ 2.346.218.649,00
	VIL TRANSPORTE																
38	900.3	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para la disposición (superficie del material (1.000 m) mediante a 2000 de distancia medidas (Km).	m3/km	542.268,00	$ 1.813	$ 981.819.978,00		3.041.047,72	$ 6.597.940.869,00	3.041.047,72	$ 6.597.940.869,00	-	$ -	3.041.047,720	$ 6.597.940.869,00
	SUBTOTAL							$ 981.819.978,00			$ 6.597.940.869,00		$ 6.597.940.869,00		$ -		$ 6.597.940.869,00
	EL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																
	DEMARCACIONES HORIZONTALES Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL																
39	710.1	710		Señal Vertical de Tránsito tipo I con lámina reflectiva tipo III (0 x 70) cm	und	124,00	$ 500.000	$ 62.000.000,00		172,00	$ 86.000.000,00	51,00	$ 25.500.000,00	121,00	$ 60.500.000,00	172,000	$ 86.000.000,00
40	720.1	720		Línea de Demarcación con Pintura en Frío	m	33.000,00	$ 3.400	$ 112.200.000,00		21.826,40	$ 74.170.271,00	-	$ -	21.826,40	$ 74.170.271,00	21.826,400	$ 74.170.271,00
41	724.1	724		Tacha Reflectiva.	und	1.000,00	$ 1.000	$ 1.000.000,00		3.000,00	$ 3.000.000,00	-	$ -	3.000,00	$ 3.000.000,00	3.000,000	$ 3.000.000,00
GP1	750.1	750		Obras varias	m		$ 307.894	$ -		150,00	$ 79.178.400,00	-	$ -	150,00	$ 79.178.400,00	150,000	$ 79.178.400,00
	SUBTOTAL							$ 143.836.180,00			$ 272.648.671,00		$ 85.750.000,00		$ 186.898.671,00		$ 272.648.671,00

Página 2 de 3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	GINFOMAN-MAN-PR-01
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE/CAUCA — ACTA No.: 7 — ACTA FINAL: — VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.907.492.700,00 — MES: Junio 2025

CONTRATO No.: VJ-LPA-006-2023 (Indique número y año)
OBJETO: Construcción Vía Woodfillsona Las Pencias – Corozalenito (Chinchi)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS REGIONALES
(Indique la razón social del oferente según consta en el RUT)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 370 de 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS REGIONALES

PLAZO INICIAL: HASTA 19 DICIEMBRE 2025 (Consignar según contrato principal)
FECHA DE INICIO: 28/06/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 28/06/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 28/06/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL ($): $ 28.997.426.606,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluidos SOLICITADOS): $ 28.997.426.606,00

PLAZO ACUMULADO: 31 MESES Y 3 DIAS (En meses adjuntar prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2025 (Indique día/mes/año, incluir días/meses)
FECHA DE REINICIACIÓN 1: 29/06/2025
FECHA DE REINICIACIÓN 2: 21/08/2025 (Indique día/mes/año)
MAYOR ADICIONES (%): $ - -

No. DE ORDEN	TIPO DE PAGO	ESPECIFICACIÓN ORIGINAL	ESPECIFICACIÓN NUEVA	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANTIDAD	VR. UNIT	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de mayores y menores No. 3 de fecha 24/03/2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VALOR
1 CARACTERIZACIÓN VIAL																
42				Caracterización del corredor	ml	20.000	$ 700.000	$ 14.000.000,00	20,00	$ 14.000.000,00	-	$ -	20,00	$ 14.000.000,00	20.000	$ 14.000.000,00
				SUBTOTAL				$ 14.000.000,00		$ 14.000.000,00	-	$ -		$ 14.000.000,00		$ 14.000.000,00
				SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA				$ 28.776.514.775,00		$ 28.776.514.775,00	80,91%	$ 26.072.021.772,00	9,09%	$ 2.907.492.700,00	100,00%	$ 28.779.514.475,00
				DEBAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				$ 220.978.137,00		$ 220.978.137,00		$ -		$ -		$ -
				REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Plans Viales, Pavimento y Estructuras de Drenaje)				$ 71.700.000,00		$ 71.700.000,00		$ 71.700.000,00				$ 71.700.000,00
				GA – INTERVENTORÍA AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 13.000.000,00		$ 13.000.000,00		$ 13.000.000,00		$ -		$ 13.000.000,00
				TOTAL BIENES Y OBRAS, INVERSIÓN, ACCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 85.420.488,00		$ 85.420.488,00		$ 85.420.488,00		$ -		$ 85.420.488,00
				COSTO				$ 17,00		$ 17,00		$ -		$ -		$ 17,00
				VALOR TOTAL				$ 28.997.426.606,00		$ 28.997.426.606,00	80,00%	$ 26.157.142.260,00	9,91%	$ 2.907.492.700,00	90,91%	$ 29.064.919.306,00

* Todos los cargos que deban corresponder a las reclamaciones serán presentados oportunamente, ajustados a modificación correspondiente.

AIU: 30 %
Utilidad: 0 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 10.799.057.376,00	100,00%
Valor Amortización Anticipo Acta	$ 10.799.057.376,00	100,00%
Valor Amortización Anticipo Acta	$ -	
Valor Amortización Acumulado	$ 10.799.057.376,00	100,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO ANTERIOR: $ 2.907.492.700,00 — VR. BÁSICO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 2.907.492.700,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.907.492.700,00 — VR. TOTAL A PAGAR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.
(Deducir el valor habido sin comercialización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que haya lugar en el contrato de obra.

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior se firma:

Firma: Luis Henry [illegible]
Nombre: LUIS HENRY CAICEDO MARTINEZ
CONCESIONARIO LEGAL
Contratista

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]
CONCESIONARIO VIAS REGIONALES
Interventor

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]
SUPERVISOR
Contratante

Original: Archivo del Contratista, Interventoría y Supervisión.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventoría y Supervisión.

CONSORCIO SAN DIEGO

Memoria De Cantidades del acta Final de obra

Email: consoriciosandiego@gmail.com

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1	Excavación en material común de la exploración y canales	M3	30.435,40

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA			Area (m2)	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
TRAMO EL PINDO						
K0+000	K1+691	1690,71			1,4819	2.505,47
K1+971	K2+512	541,59			3,0703	1.662,87
K3+025	K3+562	137,03			4,7109	645,54
K3+938	K4+059	120,84			5,7550	695,19
K4+363	K5+139	775,98			2,7222	2.112,40
K5+283	K5+458	175,99			6,1485	1.082,07
		3443,14				
TRAMO EL ANCLAR						
K0+000	K7+120	7120,00			3,0522	21.731,86
		7120,00				
					TOTAL	30.435,40
					Acumulado Acta 6	30.435,40
					ACTA FINAL	0

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MURRIETA
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: JUAN FELIPE VILLALOBOS PINEDA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO – LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
2	Terraplenes	M3	-

LOCALIZACIÓN LINEAMIENTO 1		MEDIDA LARGO	ANCHO	ALTO	Area (m2)	SUBTOTAL
TRAMO EL FINDO						
K0+000	K1+691	1690,71			0,4338	733,45
K1+971	K2+512	541,59			2,8480	1.542,47
K3+025	K3+563	137,08			3,6355	498,17
K3+938	K4+059	120,84			8,1899	989,67
K4+363	K5+139	775,98			2,7436	2.128,55
K5+382	K5+658	175,99			2,7500	483,97
		3443,14				
TRAMO EL ANCLAR						
K0+000	K7+120	7120,00			2,7423	19.525,00
		7120,00				

TOTAL	25.901,68
Acumulado Acta 6	25.901,68
ACTA FINAL	-

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: JAIRO MERCADO VERGARA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
3	Excavaciones varias en material común en seco a mano.	M3	-

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	Area (m2)	SUBTOTAL
TRAMO EL PINDO						
1	K0+844	8,00	2,00	2,05		32,80
2	K1+349	7,50	2,00	2,70		40,50
3	K1+624	8,50	2,00	2,03		34,51
4	K4+955	8,80	2,00	2,00		35,20
5	K4+780	5,60	2,00	1,50		16,80
TRAMO EL ANCLAR						
1	K1+355	7,50	2,00	2,03		30,45
2	K1+148	10,00	2,00	2,08		41,60
3	K1+585	8,50	2,00	2,08		35,36
4	K2+885	9,00	2,00	2,40		43,20
5	K3+901	7,95	2,00	2,78		44,20
6	K4+390	8,40	2,00	3,38		56,78
7	K4+860	8,15	2,00	2,08		33,90
8	K5+646	9,30	2,00	2,06		38,49
9	K6+558	9,50	2,00	2,00		38,00
					TOTAL	522,00
					Acumulado Acta 6	522,00
					ACTA FINAL	-

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MADRIGAL
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: JESUS DE LA LOMA PARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA FINAL DE OBRA	CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR	4	Demolición de estructuras	M3	-
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL				

LOCALIZACION LINEAMIENTO		MEDIDA			Area (m2)	SUBTOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	ANCHO	ALTO			
TRAMO EL PINDO							
1	K0+844	7,00			0,8571	6,00	
2	K1+349	7,00			0,9286	6,50	
3	K1+634	7,00			0,4286	3,00	
4	K4+950	7,00			0,4286	3,00	
5	K4+780						
TRAMO EL ANCLAR							
1	K1+355						
2	K1+168						
3	K1+585						
4	K2+885						
5	K3+981	7,00			0,7143	5,00	
6	K4+290						
7	K4+660						
8	K5+646						
9	K6+558						



OBSERVACIONES:		
Cobrado en acta parcial de obra No.1	TOTAL	23,50
	Acumulado Acta 6	23,50
	ACTA FINAL	-

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA FINAL DE OBRA	CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
5	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	ML	-

LOCALIZACION UNIDAMBITO 1		MEDIDA			Area (m2)	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
TRAMO EL PINDO						
1	K0+844	7,00				7,00
2	K1+349	7,00				7,00
3	K1+524	7,00				7,00
4	K4+950	7,00				7,00
5	K4+780	7,00				7,00
TRAMO EL ANCLAR						
1	K1+355	7,00				7,00
2	K1+168	7,00				7,00
3	K1+585	7,00				7,00
4	K2+885	7,00				7,00
5	K3+901	7,00				7,00
6	K4+290	7,00				7,00
7	K4+860	7,00				7,00
8	K5+646	7,00				7,00
9	K6+558	7,00				7,00
					TOTAL	98,00
					Acumulado Acta 6	98,00
					ACTA FINAL	-

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEUBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
6	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	-

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1	MEDIDA			Area (m2)	SUBTOTAL
	CANTIDAD	VOLUMEN	ESPESOR		
TRAMO EL PINDO					
SOLERA	8,00		0,08	3,9650	2,54
POSETA	2,00		0,08	3,6100	0,58
TUBERIA	5,00		0,08	10,5000	4,20
ATRAQUE	5,00		0,30	8,4000	12,60
TRAMO EL ANCLAR					
SOLERA	14,00		0,08	3,9650	4,44
POSETA	4,00		0,08	2,8500	0,91
TUBERIA	9,00		0,08	10,5000	7,56
ATRAQUE	9,00		0,30	8,4000	22,68
				TOTAL	55,51
				Acumulado Acta 6	55,51
				ACTA FINAL	-

OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No.1

REGISTRO FOTOGRAFICO



POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
7	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	-

LOCALIZACION LINEAMIENTO		MEDIDA			Area (m2)	SUBTOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		CANTIDAD	ANCHO	Espesor			
TRAMO EL PINDO							
1	E0+848	2,00		0,20	14,8250	5,93	
2	E1+349	2,00		0,20	16,5000	6,60	
3	E1+524	2,00		0,20	13,4500	5,38	
4	E4+950	2,00		0,20	15,0500	6,02	
5	E4+780	2,00		0,20	15,0500	6,02	
TRAMO EL ANCLAR							
1	E1+305	2,00		0,20	13,8000	5,52	
2	E1+168	2,00		0,20	16,0000	6,40	
3	E1+585	2,00		0,20	11,9250	4,77	
4	E2+885	2,00		0,20	10,7000	4,28	
5	E3+901	2,00		0,20	17,6750	7,07	
6	E4+290	2,00		0,20	19,8000	7,92	
7	E4+840	2,00		0,20	12,5750	5,03	
8	E5+446	2,00		0,20	14,0250	5,61	
9	E6+558	2,00		0,20	13,3250	5,33	
OBSERVACIONES: Cobrado en acta parcial de obra No.1					TOTAL	81,88	
					ACUMULADO	81,88	
					ACTA FINAL	-	



POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

251

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO	3	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa	KG	-
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL				

LOCALIZACION (ABSCISADO)		ARMADO			Peso Kg/m	Peso Total KG	REGISTRO FOTOGRAFICO
		DIAMETRO	Long. Und	Cant.			
Refuerzo horizontal diafos y muros							
Losa Inferior diafos		3/8"	3.44	3.00	0.56	5.773	
		3/8"	3.45	3.00	0.56	1.000	
		3/8"	3.47	3.00	0.56	2.302	
		3/8"	3.79	3.00	0.56	3.488	
		3/8"	3.58	4.00	0.56	11.679	
Losa superior diafos		3/8"	3.50	1.00	0.56	1.386	
		3/8"	3.50	1.00	0.56	2.811	
		3/8"	3.45	3.00	0.56	4.439	
		3/8"	3.50	4.00	0.56	11.971	
Muros		1/2"	3.45	8.00	0.994	27.451	
		1/2"	1.60	4.00	0.994	12.720	
					Total refuerzo horizontal diafos y muros		83.680
Refuerzo placa inferior							
Placa de diafos	1/2"	1/2"	3.48	3.00	0.994	5.324	
	3/8"	1/2"	3.48	3.00	0.994	5.324	
	1/2"	1/2"	3.47	3.00	0.994	5.308	
	3/8"	1/2"	3.47	3.00	0.994	5.308	
	1/2"	1/2"	3.44	1.00	0.994	1.755	
	3/8"	1/2"	3.44	1.00	0.994	1.755	
	1/2"	1/2"	3.84	2.00	0.994	7.577	
	3/8"	1/2"	3.84	2.00	0.994	7.577	
	1/2"	1/2"	3.82	2.00	0.994	7.550	
	3/8"	1/2"	3.82	2.00	0.994	7.550	
	1/2"	1/2"	4.77	4.00	0.994	18.858	
	3/8"	1/2"	4.77	4.00	0.994	18.858	
	1/2"	1/2"	1.77	2.00	0.994	3.508	
	3/8"	1/2"	1.77	2.00	0.994	3.508	
	1/2"	1/2"	1.51	2.00	0.994	2.994	
	3/8"	1/2"	1.51	2.00	0.994	2.994	
	1/2"	1/2"	1.86	2.00	0.994	3.686	
	3/8"	1/2"	1.86	2.00	0.994	3.686	
	1/2"	1/2"	7.34	4.00	0.994	29.177	
	3/8"	1/2"	7.34	4.00	0.994	29.177	
	1/2"	1/2"	0.77	2.00	0.994	1.530	
	3/8"	1/2"	0.77	2.00	0.994	1.530	
	1/2"	1/2"	1.50	2.00	0.994	2.984	
	3/8"	1/2"	1.50	2.00	0.994	2.984	
	1/2"	1/2"	1.86	2.00	0.994	3.686	
	3/8"	1/2"	1.86	2.00	0.994	3.686	
	1/2"	1/2"	7.34	4.00	0.994	29.177	
	3/8"	1/2"	7.34	4.00	0.994	29.177	
					Total refuerzo placa inferior		168.858
					Total refuerzo Colocado en contrafuerte		341.9928
TRAMO EL PRADO							
1	0+000			3.00	2.469 KG/M	370.35	
2	0+040			3.00	2.469 KG/M	370.35	
3	0+080			3.00	2.469 KG/M	370.35	
4	0+120			3.00	2.469 KG/M	370.35	
5	0+160			3.00	2.469 KG/M	370.35	
		TOTAL TRAMO EL PRADO		15.00			2.469,00
TRAMO EL ANCLAR							
1	0+000			3.00	2.469 KG/M	370.35	
2	0+040			3.00	2.469 KG/M	370.35	
3	0+080			3.00	2.469 KG/M	370.35	
4	0+120			3.00	2.469 KG/M	370.35	
5	0+160			3.00	2.469 KG/M	370.35	
6	0+200			3.00	2.469 KG/M	370.35	
7	0+240			3.00	2.469 KG/M	370.35	
8	0+280			3.00	2.469 KG/M	370.35	
9	0+320			3.00	2.469 KG/M	370.35	
		TOTAL TRAMO ANCLAR		30.00			3.697,50





OBSERVACIONES:
Cobrable en de la parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre:
DIRECTOR INTERVENTORIA

ACTA FINAL

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
9	Relleno para Estructuras con recebo	M3	-

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTURA	Area (m2)	SUBTOTAL
TRAMO EL PINDO						
1	K0+844	7,50	3,00	2,05		30,75
2	K1+349	7,50	3,00	2,70		40,50
3	K1+524	7,50	3,00	2,03		30,45
4	K1+950	7,50	3,00	2,00		30,00
5	K2+280	7,50	3,00	1,50		22,50
SOLERA	8,00			0,30	3,9650	9,52
POZETA	2,00			0,80	3,6100	2,17
TUBERIA	5,00			0,30	10,5000	15,75
VOLUMEN TUBERIA	5,00	7,00			0,95	-33,25
TRAMO EL ANCLAR						
1	K1+555	7,50	3,00	2,03		30,45
2	K1+148	7,50	3,00	2,08		31,20
3	K1+105	7,50	3,00	2,08		31,20
4	K2+885	7,50	3,00	2,40		36,00
5	K3+761	7,50	3,00	2,78		41,70
6	K4+290	7,50	3,00	2,38		35,70
7	K4+860	7,50	3,00	2,08		31,20
8	K5+146	7,50	3,00	2,08		31,20
9	K6+558	7,50	3,00	2,00		30,00
SOLERA	14,0			0,30	3,9650	16,65
POZETA	4,0			0,30	2,8500	3,42
TUBERIA	9,0			0,30	10,5000	28,35
VOLUMEN TUBERIA	9,0	7,00			0,95	-59,85
					TOTAL	450,41
					Acumulado Acta 6	450,41
					ACTA FINAL	-

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MATEUCCI
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: JUAN PABLO CERVELLA LOBOS PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEUBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
10	Excavaciones varias en material común en seco o húmedo	M3	-

LOCALIZACION EJE/ALINEAMIENTO			CUERPO DE BOX				ALETAS				SOLERA	SUBTOTAL
			LARGO	ANCHO	SOBRE ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	AREA	
	TRAMO EL FINDO											
1	KO+870	(1X1)	6,50	1,50	1,00	1,88	1,53	1,20	1,50	4,00	1,23	38,27
2	K2+140	(2X1)	6,50	2,60	1,00	1,98	1,65	1,80	1,60	4,00	1,58	59,04
3	K2+470	(2X1)	6,50	2,60	1,00	1,98	1,65	1,80	1,60	4,00	1,58	59,04
4	K4+610	(1X1)	6,50	1,50	1,00	1,88	1,53	1,20	1,50	4,00	1,23	38,27
	TRAMO EL ANCLAR											
1	K0+590	(1X1)	6,50	1,50	1,00	1,88	1,53	1,20	1,50	4,00	1,23	38,27
2	K0+948	(1X1)	6,50	1,50	1,00	1,88	1,53	1,20	1,50	4,00	1,23	38,27
3	K1+123	(3X1)	6,50	2,60	1,00	1,98	1,65	1,80	1,60	4,00	1,58	59,04
4	K1+270	(1X1)	6,50	1,50	1,00	1,88	1,53	1,20	1,50	4,00	1,23	38,27
5	K1+805	(2X1)	6,50	2,60	1,00	1,98	1,65	1,80	1,60	4,00	1,58	59,04
6	K2+410	(3X1)	6,50	3,40	1,00	1,98	1,78	2,20	1,60	4,00	1,78	75,09
7	K3+255	(2X1)	6,50	2,60	1,00	1,98	1,65	1,80	1,60	4,00	1,58	59,04
8	K3+965	(3X1)	6,90	3,60	1,00	1,98	1,78	2,20	1,60	4,00	1,78	78,72
										TOTAL		639,85
										Acumulado Acta 6		639,85
										ACTA FINAL		-

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:
Colocado en acta parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: [illegible] CESAR MONTOYA BOLIVAR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
12	Concreto clase F (140 kg/cm2) 0 2000 PSI)	M3	-

LOCALIZACION LINEAMIENTO			CUERPO DE BOX			ALETAS				SOLERA	SUBTOTAL
			LARGO	ANCHO	ESPESOR	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANT	AREA	
	TRAMO EL PINDO										
1	K0+670	(1X1)	6,50	1,50	0,08	1,53	1,20	0,04	4,00	1,23	3,81
2	K2+160	(2X1)	6,50	2,60	0,08	1,55	1,80	0,04	4,00	1,58	3,75
3	K2+470	(2X1)	6,50	2,60	0,08	1,55	1,80	0,04	4,00	1,58	3,75
4	K4+610	(1X1)	6,50	1,50	0,08	1,53	1,20	0,04	4,00	1,23	3,81
	TRAMO EL ANCLAR										
1	K0+550	(1X1)	6,50	1,50	0,08	1,53	1,20	0,04	4,00	1,23	3,81
2	K0+944	(1X1)	6,50	1,50	0,08	1,53	1,20	0,04	4,00	1,23	3,81
3	K1+123	(2X1)	6,50	2,60	0,08	1,55	1,80	0,04	4,00	1,58	3,75
4	K1+270	(1X1)	6,50	1,50	0,08	1,53	1,20	0,04	4,00	1,23	3,81
5	K1+805	(2X1)	6,50	2,60	0,08	1,55	1,80	0,04	4,00	1,58	3,75
6	K2+410	(3X1)	6,50	3,60	0,08	1,70	2,20	0,04	4,00	1,78	3,54
7	K2+855	(2X1)	6,50	2,60	0,08	1,55	1,80	0,04	4,00	1,58	3,75
8	K3+965	(3X1)	6,90	3,60	0,08	1,70	2,20	0,04	4,00	1,78	3,65
									TOTAL		29,98
									Acumulado Acta 6		29,98
									ACTA FINAL		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No. 1

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARTUCCI
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
13	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	-

	LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA CUERPO DE BOX			VOLUMEN ALETAS Y GUARDARUEDA	SUBTOTAL
			LARGO	ANCHO	VOLUMEN		
	TRAMO EL PINDO						
1	K0+870	(1X1)	6.50	1.33	8.65	3.18	11.83
2	K2+160	(2X1)	6.50	2.29	14.89	3.60	18.49
3	K2+470	(2X1)	6.50	2.29	14.89	3.60	18.49
4	K4+610	(1X1)	6.50	1.33	8.65	3.18	11.83
	TRAMO EL ANCLAR						
1	K0+550	(1X1)	6.50	1.33	8.65	3.18	11.83
2	K0+994	(1X1)	6.50	1.33	8.65	3.18	11.83
3	K1+123	(2X1)	6.50	2.29	14.89	3.60	18.49
4	K1+270	(1X1)	6.50	1.33	8.65	3.18	11.83
5	K1+605	(2X1)	6.50	2.29	14.89	3.60	18.49
6	K2+410	(2X1)	6.50	2.89	18.79	4.02	22.81
7	K3+255	(2X1)	6.50	2.29	14.89	3.60	18.49
8	K3+965	(2X1)	6.90	2.89	19.94	4.02	23.96
						TOTAL	198.32
						Acumulado Acta 6	198.32
						ACTA FINAL	-

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA FINAL DE OBRA	CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO - LAS PARCELAS- CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
14	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	KG	-

UBICACION UNIDAD/ITEM	ANCHO	ESPESOR	Peso Esp/ml	No. Elementos	Peso Total
BOX 1X1 L:30 m					
Refuerzo Cuerpo de box-culvert					
Ref.1 A&B	9.64	1.07	0.994	8	82,130
Ref.2 A&B	7.00	1.07	0.994	8	59,631
Ref.2 A&C	7.00	1.07	0.994	18	134,169
Ref.3	1.50	1.07	0.994	36	68,769
Ref.4 interno	3.22	1.07	0.994	32	87,850
Ref.4 externo	3.50	1.07	0.994	32	95,493
Ref.5	1.30	1.07	0.994	32	44,282
Refuerzo Guarda rueda y aletas					
Ref.1	1.30	1.07	0.994	24	30,784
Ref.2	1.20	0.97	0.969	16	18,948
Ref.3	1.10	0.97	0.969	16	16,953
Ref.4	1.10	0.97	0.969	16	16,728
Total acero para Box-Culvert 1x1 x 6.00 m					814,728
BOX 2X1 L:30 m					
Refuerzo Cuerpo de box-culvert					
Ref.1 A&B	12.67	1.07	1.282	16	154,870
Ref.2 A&B	7.00	1.07	1.282	16	179,340
Ref.2 A&C	7.00	1.07	1.282	36	323,049
Ref.3	1.40	1.07	1.282	32	117,620
Ref.4 interno	1.80	1.07	1.282	32	165,267
Ref.4 externo	3.50	1.07	1.282	32	368,640
Ref.5	1.30	1.07	1.282	32	74,263
Refuerzo Guarda rueda y aletas					
Ref.1	1.30	1.07	0.994	64	95,474
Ref.2	1.20	1.07	0.994	56	83,495
Ref.3	2.28	1.07	0.994	48	122,728
Ref.4	1.95	1.07	0.994	48	98,009
Total acero para Box-Culvert 2x1 x 6.00 m					1884,184
BOX 3X1 L:30 m					
Refuerzo Cuerpo de box-culvert					
Ref.1 A&B	12.67	1.07	1.282	24	232,305
Ref.2 A&B	7.00	1.07	1.282	24	269,010
Ref.2 A&C	7.00	1.07	1.282	48	430,649
Ref.3	1.30	1.07	1.282	48	166,304
Ref.4 interno	1.80	1.07	1.282	48	165,267
Ref.4 externo	3.50	1.07	1.282	48	177,245
Ref.5	1.40	1.07	1.282	48	74,263
Refuerzo Guarda rueda y aletas					
Ref.1	1.30	1.07	1.282	96	191,488
Ref.2	1.50	1.07	0.994	56	83,495
Ref.3	3.28	1.07	0.994	48	154,330
Ref.4	1.95	1.07	0.994	48	98,009
Total acero para Box-Culvert 3x1 x 6.00 m					2451,480
TRAMO EL PINDO					
1	KM+670	(100)	6.00		816,72
2	KM+169	(200)	6.00		3826,99
3	KM+670	(300)	6.00		3826,99
4	KM+169	(100)	6.00		816,72
TRAMO EL ANCLAR					
1	KM+580	(100)	6.00		816,72
2	KM+164	(100)	6.00		816,72
3	KM+120	(200)	6.00		3269,00
4	KM+670	(100)	6.00		816,72
5	KM+669	(300)	6.00		3826,99
6	KM+169	(200)	6.00		3826,99
7	KM+581	(200)	6.00		3826,99
8	KM+164	(100)	6.00		3826,99

TOTAL	18.061,74
[illegible]	18.061,74
ACTA FINAL	-

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA
Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARROQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA
Firma:
Nombre: [illegible]
DIRECTOR INTERVENTORIA

1 x 8

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCION VÍA MONTELIBANO – LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
15	Relleno para Alcantarillas con recebo	M3	

UBICACION ENSANCHE I			CUERPO DE BOX				ALETAS				SOLERA	SUBTOTAL	VOLUMEN BOX	SUBTOTAL
			LARGO	ANCHO	SOBRE ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	AREA			
TRAMO EL PINDO														
MEJORAMIENTO														
1	K0+870	(1X1)	6.80	3.50	0.00	1.50	1.20	0.30	4.00	1.20				5.86
2	K0+160	(2X1)	6.90	2.90	0.00	1.65	1.80	0.30	4.00	1.56				9.55
3	K0+490	(2X1)	6.50	3.40	0.00	1.65	1.80	0.00	4.00	1.78				9.88
4	K0+670	(1X1)	6.00	1.50	0.00	1.50	1.20	0.00	4.00	1.20				5.86
LATERALES														
1	K0+870	(1X1)	6.80	1.80	1.00	1.88	1.53	1.38	1.50	4.00	1.20	38.17	34.615	21.54
2	K0+160	(2X1)	6.90	2.40	1.00	1.98	1.65	1.80	1.60	4.00	1.56	38.04	37.08	22.00
3	K0+670	(2X1)	6.50	2.60	1.00	1.98	1.65	1.80	1.60	4.00	1.58	38.04	37.08	22.00
4	K0+670	(1X1)	6.00	1.80	1.00	1.88	1.53	1.38	1.50	4.00	1.20	38.17	34.615	21.54
TRAMO EL ANCLAR														
MEJORAMIENTO														
1	K0+870	(1X1)	6.80	1.80	0.00	1.50	1.20	0.30	4.00	1.20				5.86
2	K0+960	(1X1)	6.80	1.50	0.00	1.50	1.20	0.00	4.00	1.20				5.86
3	K1+120	(2X1)	6.80	2.60	0.00	1.65	1.80	0.30	4.00	1.58				9.56
4	K1+270	(1X1)	6.80	1.80	0.00	1.50	1.20	0.30	4.00	1.20				5.86
5	K1+800	(2X1)	6.50	2.60	0.00	1.65	1.80	0.30	4.00	1.58				9.55
6	K2+410	(2X1)	6.70	3.00	0.00	1.70	2.00	0.30	4.00	1.78				12.68
7	K2+205	(2X1)	6.80	2.60	0.00	1.65	1.80	0.30	4.00	1.58				9.58
8	K2+960	(2X1)	6.00	3.60	0.00	1.70	2.00	0.00	4.00	1.70				13.01
LATERALES														
1	K0+550	(1X1)	6.80	1.80	1.00	1.88	1.53	1.38	1.50	4.00	1.20	38.17	34.615	21.54
2	K0+960	(1X1)	6.80	1.80	1.00	1.88	1.53	1.38	1.50	4.00	1.20	38.17	34.615	21.54
3	K1+120	(2X1)	6.80	2.60	1.00	1.98	1.65	1.80	1.60	4.00	1.58	38.04	37.08	22.00
4	K1+270	(1X1)	6.80	1.80	1.00	1.88	1.53	1.38	1.50	4.00	1.20	38.17	34.615	21.54
5	K1+800	(2X1)	6.80	2.60	1.00	1.98	1.65	1.80	1.60	4.00	1.58	38.04	37.08	22.00
6	K2+410	(2X1)	6.80	3.00	1.00	1.98	1.70	2.00	1.60	4.00	1.78	38.08	37.40	22.80
7	K2+205	(2X1)	6.80	2.60	1.00	1.98	1.65	1.80	1.60	4.00	1.58	38.04	37.08	22.00
8	K2+960	(2X1)	6.80	3.60	1.00	1.98	1.70	2.00	1.60	4.00	1.78	38.08	37.40	22.80

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No.1

TOTAL	480,38
Acumulado Acta 6	457,13
ACTA FINAL	

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Plano 1 de 1

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
16	Base Granular Clase C	M3	18.24

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	Area (m2)	SUBTOTAL
TRAMO EL ANCLAR						
KD+000	K7+200	7200,00	5,10	0,15		5940,00
		7200,00				
BOCA CALES						
	KD+650	6,50	3,00	0,15		2,93
	K2+780	8,00	5,20	0,15		6,24
	K3+390	5,00	2,50	0,15		1,88
	K3+730	4,30	2,40	0,15		1,51
	K5+210	8,00	3,20	0,15		5,76
	K6+270	5,00	2,30	0,15		1,73
				TOTAL		5.958,24
				Acumulado Acta 6		5.940,00
OBSERVACIONES:				ACTA FINAL		18,24

REGISTRO FOTOGRAFICO



POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: JOHN ALEXANDER VILLAMIZAR PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEBRANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
17	Subbase Granular Clase B.	M3	24,32

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	Area (m2)	SUBTOTAL
TRAMO EL ANCLAR						
K0+000	K7+200	7200.00	5.50	0.20		7920.00
BOCA CALLES						
	K0+650	6.50	3.00	0.20		3.90
	K2+780	8.00	5.20	0.20		8.32
	K3+300	5.00	2.50	0.20		2.50
	K3+730	4.20	2.40	0.20		2.02
	K5+210	8.00	3.30	0.20		5.28
	K6+270	5.00	2.30	0.20		2.30
					Total ejecutado	7.944,32
					Acumulado Acta 6	7.920,00
					ACTA FINAL	24,32

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: JUAN PABLO BETANCOURTH PEREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEBUBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR	18	Afirmado (Material para mejoramiento)	M3	2.631,75
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL				

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA					Area (m2)	SUBTOTAL
		LARGO	OBSERVACION		ANCHO	ALTO		
K0+000	K0+003	3,00	Cost Derecho	CUNETA			0,0690	0,21
K0+003	K0+107	102,00	Cost Derecho	DEFENSA CON 25 X 40			0,3064	31,26
K0+107	K0+172	65,00	Cost Derecho	CUNETA			1,4304	92,98
K0+182	K0+230	48,00	Cost Derecho	CUNETA EN MURO			0,0600	2,91
K0+271	K0+346	75,00	Cost Derecho	CUNETA EN MURO			0,0605	4,59
K0+348	K0+384	36,00	Cost Derecho	CUNETA			0,4166	14,52
K0+386	K0+490	100,00	Cost Derecho	DEFENSA CON 25 X 40			0,2918	29,00
K0+490	K0+503	13,00	Cost Derecho	CUNETA			0,3350	4,36
K0+508	K0+550	42,00	Cost Derecho	CUNETA			0,3807	15,92
K0+580	K0+830	250,00	Cost Derecho	CUNETA			0,3949	98,73
K0+834	K0+881	47,00	Cost Derecho	CUNETA			0,2062	21,07
K0+900	K1+074	74,00	Cost Derecho	CUNETA			0,2486	22,37
K1+000	K1+078	78,00	Cost Derecho	CUNETA			0,0268	22,17
K1+300	K1+400	107,00	Cost Derecho	CUNETA			0,1633	17,48
K1+408	K1+416	8,00	Cost Derecho	CUNETA			0,3525	2,82
K1+470	K1+558	88,00	Cost Derecho	CUNETA			0,4981	43,13
K1+664	K1+743	79,00	Cost Derecho	CUNETA			0,2136	16,79
K1+900	K2+134	234,00	Cost Derecho	CUNETA			0,3666	85,11
K2+166	K2+403	237,00	Cost Derecho	CUNETA			0,4129	99,32
K2+403	K2+720	270,00	Cost Derecho	CUNETA			0,4791	127,80
K2+730	K2+893	163,00	Cost Derecho	CUNETA			0,3339	60,07
K2+924	K3+048	128,00	Cost Derecho	CUNETA			0,3262	45,68
K3+120	K3+266	146,00	Cost Derecho	CUNETA			0,4094	59,77
K3+271	K3+314	40,00	Cost Derecho	CUNETA			0,0920	3,88
K3+350	K3+394	44,00	Cost Derecho	CUNETA			0,2056	11,14
K3+780	K3+880	100,00	Cost Derecho	CUNETA			0,4181	41,61
K4+028	K4+158	130,00	Cost Derecho	CUNETA			0,2938	30,94
K4+174	K4+217	45,00	Cost Derecho	CUNETA			0,2687	11,73
K4+201	K4+285	80,00	Cost Derecho	CUNETA			0,2647	15,40
K4+300	K4+460	160,00	Cost Derecho	CUNETA			0,1788	28,63
K4+645	K4+860	215,00	Cost Derecho	CUNETA			0,1724	37,07
K4+866	K4+991	125,00	Cost Derecho	CUNETA			0,3166	39,08
K5+300	K5+418	27,80	Cost Derecho	DEFENSA CON 25 X 40			0,6794	14,07
K5+510	K5+648	138,00	Cost Derecho	CUNETA			0,2870	39,61
K5+653	K5+780	127,00	Cost Derecho	CUNETA			0,2212	28,83
K6+500	K6+616	116,00	Cost Derecho	CUNETA			0,6476	60,02
K6+627	K6+750	124,00	Cost Derecho	CUNETA			0,2621	35,12
K6+917	K6+944	27,00	Cost Derecho	DEFENSA CON 25 X 40			0,1684	4,61
K6+957	K7+040	83,00	Cost Derecho	CUNETA			0,2825	24,33
K7+166	K7+202	36,00	Cost Derecho	CUNETA			0,1887	6,32
K0+000	K0+200	200,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2027	40,40
K0+300	K0+520	220,00	Cost Izquierdo	CUNETA EN MURO			0,2461	27,80
K0+328	K0+830	502,00	Cost Izquierdo	DEFENSA CON 25 X 40			0,3317	79,82
K0+843	K0+936	91,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,1986	18,08
K0+844	K1+087	213,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,4031	85,86
K1+199	K1+279	80,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,4308	34,47
K1+306	K1+358	52,00	Cost Izquierdo	DEFENSA CON 25 X 40			0,4552	23,72
K1+366	K1+377	11,00	Cost Izquierdo	DEFENSA CON 25 X 40			0,6375	7,01
K1+380	K1+580	200,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,3036	60,71
K1+672	K1+800	118,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,1718	15,16
K1+800	K2+278	469,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2272	106,57
K2+294	K2+430	136,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2606	35,74
K2+447	K2+527	80,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,1766	14,13
K2+558	K2+661	90,00	Cost Izquierdo	DEFENSA CON 25 X 40			0,2255	20,33
K2+733	K2+900	167,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2077	46,74
K2+900	K3+021	120,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2068	25,42
K3+130	K3+266	134,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2277	30,08
K3+391	K3+435	44,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,1988	8,74
K3+369	K3+913	544,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,3084	167,77
K4+068	K4+218	150,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2985	30,20
K4+208	K4+263	55,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2931	15,76
K4+317	K4+422	105,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2231	23,44
K4+735	K4+828	93,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2760	25,45
K5+440	K5+568	128,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,3640	46,07
K5+620	K5+706	86,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,3675	31,77
K6+504	K6+615	111,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,3521	38,72
K6+622	K6+741	120,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,1586	19,21
K6+873	K7+073	200,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2503	50,06
K7+088	K7+119	31,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,1866	5,78
K7+135	K7+202	67,00	Cost Izquierdo	CUNETA			0,2558	17,28
							Total ejecutado	2.631,75
							Acumulado Acta 6	-
OBSERVACIONES: Ver anexos, carteras topográficas							ACTA FINAL	2.631,75

REGISTRO FOTOGRAFICO









POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

152

CONSORCIO SAN DIEGO	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA FINAL DE OBRA	CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEBRANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
30	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	M2	1.561,58

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	Area (m2)	SUBTOTAL
TRAMO DE VIA EL ANCLAR						
K0+000	K7+200	7200.00	5.20		37440.00	37440.00
		7200.00				
BOCA CALLES						
	K0+850	6.50	3.00		19.50	19.50
	K2+780	8.00	5.20		41.60	41.60
	K3+300	5.00	2.50		12.50	12.50
	K3+730	4.20	2.40		10.08	10.08
	K5+210	8.00	3.30		26.40	26.40
	K6+270	5.00	2.30		11.50	11.50
				Total ejecutado		37.561,58
				Acumulado Acta 6		36.000,00
OBSERVACIONES:					ACTA FINAL	1.561,58

REGISTRO FOTOGRAFICO



POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO NARRUCO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
21	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	265,64

LOCALIZACION LINEAMIENTO		MEDIDA			Area (m2)	SUBTOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		
TRAMO EL ANCLAR						
K0+000	K7+200	7200,00	5,00	0,085		3060,00
		7200,00				
BOCA CALLES						
	K0+850	6,90	3,00	0,085		1,66
	K2+780	8,00	5,20	0,085		3,54
	K3+300	5,00	2,50	0,085		1,06
	K3+720	4,20	2,40	0,085		0,86
	K5+210	8,00	3,30	0,085		2,24
	K6+270	5,00	2,30	0,085		0,98
					Total ejecutado	3.070,33
					Acumulado Acta 6	2.804,79
OBSERVACIONES:					ACTA FINAL	265,54

REGISTRO FOTOGRAFICO



POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:

Nombre: [illegible]

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN VÍA ANSERMANO – LAS PASCUAS – CORREGIMIENTO EL ARCHIVO
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
3.0	Concreto clase D (21.0 kg/cm2 a 3000 PSI) - CUNETAS	M3	880,37

LOCALIZACION (ABSCISADO)		MEDIDA		Area (m2)	SUBTOTAL
		LARGO	OBSERVACION		
CARRIL DERECHO					
K0+000	K0+020	20,00	Cuneta con bordillo	0,160	3,20
K0+020	K0+031	11,00	Cuneta con bordillo	0,160	1,76
K0+031	K0+109	77,80	Cuneta con bordillo	0,160	12,45
K0+105	K0+125	120,00	Cuneta en Mixto	0,120	14,40
K0+348	K0+348	80,00	Cuneta en Mixto	0,120	9,60
K0+348	K0+425	77,00	Cuneta con bordillo	0,160	12,32
K0+425	K0+433	7,50	Cuneta con bordillo	0,160	1,20
K0+432	K0+419	36,00	Bordillo 20x40 cm	0,1125	4,50
K0+419	K0+508	13,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,08
K0+508	K0+588	73,00	Bordillo 20x40 cm	0,1125	8,21
K0+585	K0+745	165,00	Cuneta con bordillo	0,160	26,40
K0+745	K0+830	85,00	Cuneta con bordillo	0,160	13,60
K0+845	K0+936	91,00	Cuneta con bordillo	0,160	14,56
K0+944	K1+037	213,00	Cuneta con bordillo	0,160	34,08
K1+119	K1+079	80,00	Cuneta con bordillo	0,160	12,80
K1+026	K1+021	15,00	Bordillo 20x40 cm	0,1125	1,69
K1+021	K1+009	37,00	Bordillo 20x40 cm	0,1125	4,16
K1+064	K1+077	11,00	Bordillo 20x40 cm	0,1125	1,24
K1+081	K1+041	50,00	Cuneta con bordillo	0,160	8,00
K1+441	K1+424	13,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,08
K1+464	K1+672	118,00	Cuneta con bordillo	0,160	18,88
K1+672	K1+689	17,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,72
K1+690	K1+704	14,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,24
K1+704	K1+712	8,00	Cuneta con bordillo	0,160	1,28
K1+712	K1+717	5,00	Cuneta con bordillo	0,160	0,80
K1+717	K1+763	46,00	Cuneta con bordillo	0,160	7,36
K1+763	K1+768	5,00	Cuneta con bordillo	0,160	0,80
K1+795	K1+832	37,00	Cuneta con bordillo	0,160	5,92
K1+839	K1+933	94,00	Cuneta con bordillo	0,160	15,04
K1+933	K1+915	13,00	Cuneta con bordillo	0,160	1,92
K1+915	K2+080	165,00	Cuneta con bordillo	0,160	26,40
K2+080	K2+170	90,00	Cuneta con bordillo	0,160	14,40
K2+170	K2+206	36,00	Cuneta con bordillo	0,160	5,76
K2+206	K2+224	18,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,88
K2+224	K2+278	54,00	Cuneta con bordillo	0,160	8,64
K2+294	K2+344	50,00	Cuneta con bordillo	0,160	8,00
K2+344	K2+435	91,00	Cuneta con bordillo	0,160	13,16
K2+467	K2+527	60,00	Cuneta con bordillo	0,160	12,80
K2+548	K2+441	93,00	Bordillo 20x40 cm	0,1125	10,46
K2+720	K2+775	57,00	Cuneta con bordillo	0,160	9,12
K2+775	K2+779	5,00	Cuneta con bordillo	0,160	0,80
K2+779	K2+799	14,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,24
K2+799	K2+799	9,00	Cuneta con bordillo	0,160	1,44
K2+799	K2+811	13,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,08
K2+811	K2+829	17,00	Cuneta con bordillo	0,160	1,92
K2+829	K2+849	67,00	Cuneta con bordillo	0,160	10,72
K2+849	K2+813	36,00	Cuneta con bordillo	0,160	3,20
K2+713	K2+718	5,00	Cuneta con bordillo	0,160	0,80
K2+718	K2+722	4,00	Cuneta con bordillo	0,160	0,64
K2+722	K2+728	6,00	Cuneta con bordillo	0,160	0,96
K2+728	K2+807	79,00	Cuneta con bordillo	0,160	12,64
K2+807	K2+816	8,00	Cuneta con bordillo	0,160	1,28
K2+816	K2+832	16,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,56
K2+130	K2+184	54,00	Cuneta con bordillo	0,160	8,64
K2+184	K2+197	13,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,08
K2+197	K2+266	69,00	Cuneta con bordillo	0,160	11,04
K2+271	K2+284	13,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,08
K2+284	K2+306	22,00	Cuneta con bordillo	0,160	3,52
K2+306	K2+312	6,00	Cuneta con bordillo	0,1125	0,68
K2+312	K2+327	15,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,40
K2+327	K2+335	8,00	Cuneta con bordillo	0,160	1,28
K2+389	K2+468	109,00	Cuneta con bordillo	0,160	17,44
K2+468	K2+484	16,00	Cuneta con bordillo	0,160	2,56
K2+484	K2+503	19,00	Cuneta con bordillo	0,160	3,04
K2+503	K2+634	131,00	Cuneta con bordillo	0,160	20,96
K2+634	K2+672	37,00	Cuneta con bordillo	0,160	13,92
K2+721	K2+777	56,00	Cuneta con bordillo	0,160	9,00
K2+779	K2+806	27,00	Cuneta con bordillo	0,160	4,32
K2+806	K2+817	11,00	Cuneta con bordillo	0,160	1,76
K2+817	K2+953	86,00	Cuneta con bordillo	0,160	13,76
K2+958	K2+181	107,00	Cuneta con bordillo	0,160	17,20
K2+159	K2+216	29,00	Cuneta con bordillo	0,160	4,64
K2+259	K2+259	7,00	Cuneta con bordillo	0,160	1,12
K2+336	K2+343	39,00	Cuneta con bordillo	0,160	6,48
K2+817	K2+836	89,00	Cuneta con bordillo	0,160	14,24
K2+856	K2+875	19,00	Cuneta con bordillo	0,160	3,04

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO SAN DIEGO	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA FINAL DE OBRA	CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTERIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR	32	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	M3	880,57
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL				

LOCALIZACION ALINEAMIENTO 1		MEDIDA		Area (m2)	SUBTOTAL
		LARGO	OBSERVACION		
K4+735	K4+842	92,00	Cuneta con Bordillo	0,160	14,72
K5+447	K5+505	58,00	Cuneta con Bordillo	0,160	9,28
K5+505	K5+598	93,00	Cuneta con Bordillo	0,160	14,88
K5+630	K5+650	20,00	Cuneta con Bordillo	0,160	3,20
K5+636	K5+648	12,00	Cuneta con Bordillo	0,160	1,92
K5+652	K5+716	64,00	Cuneta con Bordillo	0,160	10,24
K5+716	K5+746	30,00	Cuneta con Bordillo	0,160	4,80
K6+504	K6+531	27,00	Cuneta con Bordillo	0,160	4,32
K6+531	K6+570	39,00	Cuneta con Bordillo	0,160	6,24
K6+570	K6+615	45,00	Cuneta con Bordillo	0,160	7,20
K6+623	K6+741	118,00	Cuneta con Bordillo	0,160	18,88
K6+875	K7+075	200,00	Cuneta con Bordillo	0,160	32,00
K7+088	K7+102	14,00	Cuneta con Bordillo	0,160	2,24
K7+102	K7+107	5,00	Cuneta con Bordillo	0,160	0,80
K7+107	K7+119	12,00	Cuneta con Bordillo	0,160	1,92
K7+123	K7+200	77,00	Cuneta con Bordillo	0,160	12,32
		1875,00			
CARRIL DERECHO					
K0+080	K0+085	5,00	Cuneta con Bordillo	0,160	0,80
K0+085	K0+187	102,00	Bordillo 25x45 cm	0,1125	11,48
K0+187	K0+248	61,00	Cuneta con Bordillo	0,160	9,76
K0+168	K0+172	4,00	Cuneta con Bordillo	0,160	0,64
K0+189	K0+230	41,00	Cuneta en Muro	0,120	4,92
K0+271	K0+345	74,00	Cuneta en Muro	0,120	8,88
K0+348	K0+384	36,00	Cuneta con Bordillo	0,160	5,76
K0+384	K0+490	106,00	Bordillo 25x45 cm	0,1125	11,93
K0+490	K0+503	13,00	Cuneta con Bordillo	0,160	2,08
K0+508	K0+550	42,00	Cuneta con Bordillo	0,160	6,72
K0+550	K0+800	250,00	Cuneta con Bordillo	0,160	40,00
K0+874	K0+941	67,00	Cuneta con Bordillo	0,160	10,72
K0+980	K1+074	94,00	Cuneta con Bordillo	0,160	15,04
K1+099	K1+178	79,00	Cuneta con Bordillo	0,160	12,64
K1+300	K1+407	107,00	Cuneta con Bordillo	0,160	17,12
K1+488	K1+496	8,00	Cuneta con Bordillo	0,160	1,28
K1+496	K1+562	66,00	Cuneta con Bordillo	0,160	10,56
K1+630	K1+654	24,00	Cuneta con Bordillo	0,160	3,84
K1+664	K1+740	76,00	Cuneta con Bordillo	0,160	12,16
K1+900	K2+154	254,00	Cuneta con Bordillo	0,160	40,64
K2+166	K2+403	237,00	Cuneta con Bordillo	0,160	37,92
K2+458	K2+475	17,00	Cuneta con Bordillo	0,160	2,72
K2+470	K2+521	51,00	Cuneta con Bordillo	0,160	8,16
K2+521	K2+533	12,00	Cuneta con Bordillo	0,160	1,92
K2+533	K2+568	35,00	Cuneta con Bordillo	0,160	5,60
K2+568	K2+693	125,00	Bordillo 25x45 cm	0,1125	14,06
K2+693	K2+723	30,00	Cuneta con Bordillo	0,160	4,80
K2+720	K2+748	28,00	Cuneta con Bordillo	0,160	4,48
K2+738	K2+748	10,00	Cuneta con Bordillo	0,160	1,60
K2+748	K2+762	14,00	Cuneta con Bordillo	0,160	2,24
K2+782	K2+815	33,00	Cuneta con Bordillo	0,160	5,28
K2+815	K2+837	24,00	Cuneta con Bordillo	0,160	3,84
K2+839	K2+844	5,00	Cuneta con Bordillo	0,160	0,80
K2+866	K2+915	49,00	Cuneta con Bordillo	0,160	7,84
K2+934	K2+959	25,00	Cuneta con Bordillo	0,160	4,00
K2+927	K2+933	6,00	Cuneta con Bordillo	0,160	0,96
K2+935	K2+956	21,00	Cuneta con Bordillo	0,160	3,36
K2+956	K2+961	5,00	Cuneta con Bordillo	0,160	0,80
K2+961	K2+980	21,00	Cuneta con Bordillo	0,160	3,36
K2+982	K2+987	5,00	Cuneta con Bordillo	0,160	0,80
K2+987	K3+026	39,00	Cuneta con Bordillo	0,160	6,24
K3+026	K3+032	6,00	Cuneta con Bordillo	0,160	0,96
K3+032	K3+041	9,00	Cuneta con Bordillo	0,160	1,44
K3+120	K3+148	30,00	Cuneta con Bordillo	0,160	4,80
K3+145	K3+175	30,00	Cuneta con Bordillo	0,160	4,80
K3+175	K3+245	70,00	Cuneta con Bordillo	0,160	11,20
K3+245	K3+251	6,00	Cuneta con Bordillo	0,160	0,96
K3+251	K3+266	15,00	Cuneta con Bordillo	0,160	2,40
K3+271	K3+293	22,00	Cuneta con Bordillo	0,160	3,52
K3+293	K3+300	7,00	Cuneta con Bordillo	0,160	1,12
K3+300	K3+314	14,00	Cuneta con Bordillo	0,160	2,24
K3+330	K3+338	8,00	Cuneta con Bordillo	0,160	1,28
K3+328	K3+358	30,00	Cuneta con Bordillo	0,160	4,80
K3+388	K3+394	6,00	Cuneta con Bordillo	0,160	0,96
K3+780	K3+880	100,00	Cuneta con Bordillo	0,160	16,00
K4+025	K4+034	9,00	Cuneta con Bordillo	0,160	1,44
K4+034	K4+091	57,00	Cuneta con Bordillo	0,160	9,12
K4+091	K4+106	15,00	Cuneta con Bordillo	0,160	2,40
K4+186	K4+230	44,00	Cuneta con Bordillo	0,160	7,04

REGISTRO FOTOGRAFICO





166

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSTRUCTORA VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MACHEGUANGO – LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ARCHILAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
30	Concreto clase D (210 kg/cm2 a 28dd mpa) CUNETAS	M3	686,37

UBICACIÓN UNIFORMES !		MEDIDA		Area (m2)	MEMORIA
		LARGO	OBSERVACION		
Km+126	Km+199	26,00	Cuneta con bordillo	0,140	9,68
Km+199	Km+219	20,00	Cuneta con bordillo	0,140	3,20
Km+221	Km+243	13,00	Cuneta con bordillo	0,140	1,92
Km+243	Km+291	48,00	Cuneta con bordillo	0,140	7,68
Km+300	Km+380	80,00	Cuneta con bordillo	0,140	13,12
Km+382	Km+447	65,00	Cuneta con bordillo	0,140	10,40
Km+447	Km+452	5,00	Cuneta con bordillo	0,140	1,20
Km+452	Km+467	5,00	Cuneta con bordillo	0,140	0,80
Km+498	Km+726	77,00	Cuneta con bordillo	0,140	17,64
Km+726	Km+735	9,00	Cuneta con bordillo	0,140	1,80
Km+735	Km+777	65,00	Cuneta con bordillo	0,140	5,20
Km+777	Km+843	67,00	Cuneta con bordillo	0,140	15,36
Km+846	Km+881	35,00	Cuneta con bordillo	0,140	4,00
Km+881	Km+920	41,00	Cuneta con bordillo	0,140	6,56
Km+920	Km+938	6,00	Cuneta con bordillo	0,140	0,96
Km+938	Km+991	53,00	Cuneta con bordillo	0,140	8,48
Km+991	Km+017	21,00	Cuneta con bordillo	0,140	2,24
Km+050	Km+071	9,00	Cuneta con bordillo	0,140	1,44
Km+079	Km+071	48,00	Cuneta con bordillo	0,140	9,60
Km+071	Km+091	20,00	Cuneta con bordillo	0,140	4,00
Km+106	Km+126	24,00	Cuneta con bordillo	0,140	3,84
Km+126	Km+146	20,00	Cuneta con bordillo	0,140	3,20
Km+166	Km+191	45,00	Cuneta con bordillo	0,140	7,20
Km+191	Km+221	26,00	Cuneta con bordillo	0,140	4,16
Km+726	Km+761	27,00	Cuneta con bordillo	0,140	4,32
Km+761	Km+781	20,00	Cuneta con bordillo	0,140	3,20
Km+809	Km+819	9,80	Cuneta con bordillo	0,140	1,41
Km+809	Km+836	27,00	Cuneta con bordillo	0,140	4,32
Km+836	Km+916	80,00	Cuneta con bordillo	0,140	12,80
Km+421	Km+558	136,00	Cuneta con bordillo	0,140	21,44
Km+917	Km+934	27,00	Cuneta con bordillo	0,140	3,04
Km+987	Km+048	61,00	Cuneta con bordillo	0,140	13,30
Km+146	Km+206	34,00	Cuneta con bordillo	0,140	3,44
		4917,00			
TOTAL LARGO CUNETAS		4600,00			

OBRAS DE PROTECCION

UBICACIÓN			LONG. (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
Cabezales de alcantarillas						
Box	Km+000	Cuneta Izquierda	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+000	Cuneta Derecha	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+744	Cuneta Izquierda	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+744	Cuneta Derecha	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+123	Cuneta Izquierda	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+128	Cuneta Derecha	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+275	Cuneta Izquierda	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+275	Cuneta Derecha	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+808	Cuneta Izquierda	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+808	Cuneta Derecha	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+916	Cuneta Izquierda	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+916	Cuneta Derecha	5,00	1,56	0,10	0,78
Box	Km+935	Cuneta Izquierda	5,00	1,56	0,00	0,78
Box	Km+935	Cuneta Derecha	5,00	1,56	0,00	0,78
Box	Km+945	Cuneta Izquierda	5,00	1,56	0,00	0,78
Box	Km+945	Cuneta Derecha	5,00	1,56	0,00	0,78
		Cuneta Izquierda				
Km+112	Km+142	Cuneta Izq.	30,00	1,80	0,10	5,40
Km+194	Km+176	Cuneta Izq.	35,00	2,10	0,10	6,72
Km+067	Km+080	Cuneta Izq.	13,00	2,20	0,10	2,86
Km+108	Km+136	Cuneta Izq.	30,00	1,10	0,10	3,30
Km+123	Km+132	Cuneta Izq.	8,00	1,10	0,10	0,88
		Cuneta Derecha				
Km+019	Km+048	Cuneta Izq.	48,00	2,90	0,10	13,97
Km+048	Km+076	Cuneta Izq.	32,00	2,00	0,10	6,40
					Total ejecutado	1.200,07
					Acumulado hasta el	691,30
					ACTA FINAL	680,07

OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA

Firma: Luis Mary et.

Nombre: LUIS ALEJANDRO MARROQUIN

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA


CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VÍA MONTELÍBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ARCHIAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
20	Acero de refuerzo de Fy = 4.200 kg/cm² (60.000 PSI)	KG	33.849,00

LOCALIZACION UNIDIMENSIONAL		MEDIDA LARGO	MEDIDA CANTIDAD	MEDIDA ALTO	PESO	SUBTOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
DESPIECE PARA UN (1) METRO LINEAL DE CUNETA							
ACERO PRINCIPAL HORIZONTAL		0,65	5,00		0,668	3,66	
ACERO TRANSVERSAL PLANO		0,93	5,00		0,568	1,96	
ACERO LONG. HORIZONTAL		1,03	5,00		0,5600	1,77	
ACERO LONG. PLACA		1,00	5,00		0,5600	1,68	
TOTAL ACERO PARA 1 METRO LINEAL DE CUNETA						6,98	
DESPIECE PARA UN (1) METRO LINEAL DE DENTELLON							
ACERO TRANSVERSAL		1,00	5,00		0,568	3,34	
ACERO LONG.		1,00	4,00		0,5600	3,24	
TOTAL ACERO PARA 1 METRO LINEAL DE CUNETA						6,60	
CUNETA EN CONCRETO							
K0+000	K0+012	20,00	Cuneta con Bordillo		6,44	141,68	
K0+012	K0+023	11,00	Cuneta con Bordillo		6,44	70,84	
K0+023	K0+110	73,00	Cuneta con Bordillo		6,44	463,48	
K0+110	K0+255	135,00	Cuneta en Muro		3,64	484,80	
K0+255	K0+340	68,00	Cuneta en Muro		3,64	241,72	
K0+340	K0+410	77,00	Cuneta con Bordillo		6,44	470,08	
K0+410	K0+422	7,00	Cuneta con Bordillo		6,44	45,08	
K0+422	K0+490	58,00	Dentellon 20x45 cm		5,60	324,80	
K0+490	K0+530	13,00	Cuneta con Bordillo		6,44	83,72	
K0+530	K0+680	72,00	Dentellon 20x45 cm		5,60	403,20	
K0+530	K0+700	169,00	Cuneta con Bordillo		6,44	1088,68	
K0+710	K0+760	65,00	Cuneta con Bordillo		6,44	417,48	
K0+760	K0+826	91,00	Cuneta con Bordillo		6,44	586,04	
K0+944	K1+157	213,00	Cuneta con Bordillo		6,44	1371,72	
K1+157	K1+279	80,00	Cuneta con Bordillo		6,44	515,20	
K1+306	K1+321	15,00	Dentellon 20x45 cm		5,60	84,00	
K1+321	K1+358	37,00	Dentellon 20x45 cm		5,60	207,20	
K1+344	K1+377	11,00	Dentellon 20x45 cm		5,60	61,60	
K1+381	K1+448	60,00	Cuneta con Bordillo		6,44	386,40	
K1+441	K1+454	13,00	Cuneta con Bordillo		6,44	83,72	
K1+454	K1+572	118,00	Cuneta con Bordillo		6,44	759,92	
K1+572	K1+589	17,00	Cuneta con Bordillo		6,44	109,48	
K1+590	K1+700	14,00	Cuneta con Bordillo		6,44	90,16	
K1+704	K1+712	8,00	Cuneta con Bordillo		6,44	51,52	
K1+712	K1+717	5,00	Cuneta con Bordillo		6,44	32,20	
K1+717	K1+761	44,00	Cuneta con Bordillo		6,44	283,44	
K1+761	K1+766	5,00	Cuneta con Bordillo		6,44	32,20	
K1+766	K1+803	37,00	Cuneta con Bordillo		6,44	238,28	
K1+809	K1+908	94,00	Cuneta con Bordillo		6,44	605,36	
K1+908	K1+920	12,00	Cuneta con Bordillo		6,44	77,28	
K1+920	K2+060	140,00	Cuneta con Bordillo		6,44	1343,40	
K2+060	K2+179	90,00	Cuneta con Bordillo		6,44	579,60	
K2+179	K2+206	31,00	Cuneta con Bordillo		6,44	201,84	
K2+206	K2+229	16,80	Cuneta con Bordillo		6,44	155,92	
K2+238	K2+258	16,80	Cuneta con Bordillo		6,44	147,26	
K2+259	K2+288	30,00	Cuneta con Bordillo		6,44	193,20	
K2+288	K2+329	26,00	Cuneta con Bordillo		6,44	167,44	
K2+447	K2+507	60,00	Cuneta con Bordillo		6,44	386,40	
K2+548	K2+661	10,00	Dentellon 20x45 cm		5,60	56,00	
K2+738	K2+776	37,00	Cuneta con Bordillo		6,44	238,28	
K2+776	K2+790	5,00	Cuneta con Bordillo		6,44	32,20	
K2+776	K2+791	14,00	Cuneta con Bordillo		6,44	90,16	
K2+789	K2+798	9,00	Cuneta con Bordillo		6,44	57,96	
K2+798	K2+811	13,00	Cuneta con Bordillo		6,44	83,72	
K2+811	K2+820	12,00	Cuneta con Bordillo		6,44	77,28	
K2+853	K2+898	47,00	Cuneta con Bordillo		6,44	401,48	
K2+893	K2+913	20,00	Cuneta con Bordillo		6,44	128,80	
K2+913	K2+918	5,00	Cuneta con Bordillo		6,44	32,20	
K2+918	K2+935	4,00	Cuneta con Bordillo		6,44	25,76	
K2+932	K2+938	6,00	Cuneta con Bordillo		6,44	38,64	
K2+938	K2+982	75,00	Cuneta con Bordillo		6,44	609,76	
K3+007	K3+013	6,00	Cuneta con Bordillo		6,44	51,92	
K3+013	K3+027	16,00	Cuneta con Bordillo		6,44	103,04	
K3+136	K3+186	50,00	Cuneta con Bordillo		6,44	322,00	
K3+157	K3+264	69,00	Cuneta con Bordillo		6,44	444,36	
K3+271	K3+284	13,00	Cuneta con Bordillo		6,44	83,72	
K3+284	K3+304	22,00	Cuneta con Bordillo		6,44	141,68	
K3+306	K3+313	6,00	Dentellon 20x45 cm		5,60	33,60	
K3+313	K3+327	15,00	Cuneta con Bordillo		6,44	96,60	
K3+327	K3+335	8,00	Cuneta con Bordillo		6,44	51,52	
K3+337	K3+448	109,00	Cuneta con Bordillo		6,44	701,96	
K3+448	K3+464	16,00	Cuneta con Bordillo		6,44	103,04	
K3+464	K3+503	19,00	Cuneta con Bordillo		6,44	122,36	
K3+503	K3+634	131,00	Cuneta con Bordillo		6,44	843,64	
K3+634	K3+711	87,00	Cuneta con Bordillo		6,44	560,28	

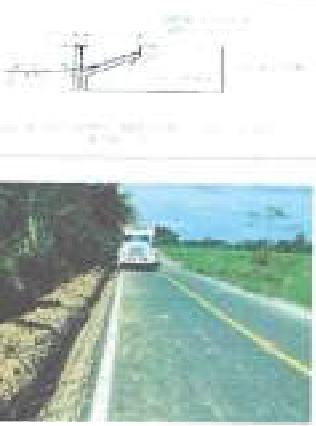

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL HACIENDA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VIA MONTEZUMAO – LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR				
CONTRATANTE:	CONSORCIO SAN DIEGO	13	Suministro e instalación de PT - 4.000 psi/cm² (60.000 PSI)	KG	10.000,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL HACIENDA				

LOCALIZACION (ABSCISADO)		MEDIDA			PESO	PARCIAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	CANTIDAD	ANCHO			
K3+731	K3+771	76,00		Cuneta con bordillo	6,44	373,23	
K3+771	K3+809	37,00		Cuneta con bordillo	6,44	173,68	
K3+809	K3+817	11,00		Cuneta con bordillo	6,44	70,84	
K3+817	K3+900	84,00		Cuneta con bordillo	6,44	503,81	
K3+900	K3+1001	121,00		Cuneta con bordillo	6,44	779,24	
K3+1001	K3+1031	29,00		Cuneta con bordillo	6,44	186,76	
K3+1200	K3+1205	7,00		Cuneta con bordillo	6,44	45,08	
K3+1205	K3+1233	28,00		Cuneta con bordillo	6,44	180,32	
K3+1317	K3+1406	97,00		Cuneta con bordillo	6,44	572,36	
K3+1406	K3+1426	19,00		Cuneta con bordillo	6,44	122,36	
K3+1700	K3+1842	72,00		Cuneta con bordillo	6,44	557,40	
K3+1407	K3+1604	98,00		Cuneta con bordillo	6,44	373,67	
K3+1605	K3+1619	33,00		Cuneta con bordillo	6,44	596,52	
K3+1888	K3+1933	33,00		Cuneta con bordillo	6,44	205,40	
K3+1933	K3+1945	12,00		Cuneta con bordillo	6,44	77,28	
K3+1951	K3+71a	44,00		Cuneta con bordillo	6,44	40,32	
K3+71L	K3+74a	30,00		Cuneta con bordillo	6,44	193,20	
K3+1504	K3+1531	27,00		Cuneta con bordillo	6,44	173,88	
K3+1531	K3+1539	39,00		Cuneta con bordillo	6,44	251,16	
K3+1870	K3+1915	45,00		Cuneta con bordillo	6,44	289,80	
K3+1933	K3+1743	136,00		Cuneta con bordillo	6,44	759,32	
K3+1870	K3+1933	200,00		Cuneta con bordillo	6,44	1288,00	
K3+088	K3+102	14,00		Cuneta con bordillo	6,44	90,16	
K3+102	K3+107	5,00		Cuneta con bordillo	6,44	32,20	
K3+107	K3+119	12,00		Cuneta con bordillo	6,44	77,28	
K3+133	K3+200	77,00		Cuneta con bordillo	6,44	495,88	
		4615,00					
CARA DERECHO							
K3+000	K3+065	5,00		Cuneta con bordillo	6,44	32,20	
K3+065	K3+197	132,00		Gaviotas plastico	0,60	57,20	
K3+197	K3+140	61,00		Cuneta con bordillo	6,44	392,84	
K3+140	K3+175	4,00		Cuneta con bordillo	6,44	25,76	
K3+181	K3+230	41,00		Cuneta en tierra	3,44	141,04	
K3+271	K3+345	74,00		Cuneta en tierra	3,44	254,56	
K3+345	K3+384	34,00		Cuneta con bordillo	6,44	291,84	
K3+384	K3+490	156,00		Gaviotas 20x45 cm	3,40	530,40	
K3+490	K3+502	12,00		Cuneta con bordillo	6,44	83,72	
K3+598	K3+600	40,00		Cuneta con bordillo	6,44	276,48	
K3+680	K3+820	220,00		Cuneta con bordillo	6,44	1417,00	
K3+901	K3+741	67,00		Cuneta con bordillo	6,44	431,48	
K3+960	K1+004	34,00		Cuneta con bordillo	6,44	405,36	
K1+077	K1+138	79,00		Cuneta con bordillo	6,44	508,76	
K1+181	K1+192	107,00		Cuneta con bordillo	6,44	689,08	
K1+485	K1+494	9,00		Cuneta con bordillo	6,44	57,72	
K1+496	K1+540	64,00		Cuneta con bordillo	6,44	412,16	
K1+630	K1+684	24,00		Cuneta con bordillo	6,44	154,56	
K1+664	K1+740	74,00		Cuneta con bordillo	6,44	481,44	
K1+720	K2+184	234,00		Cuneta con bordillo	6,44	1486,76	
K2+184	K2+489	297,00		Cuneta con bordillo	6,44	1550,28	
K2+853	K2+870	17,00		Cuneta con bordillo	6,44	109,48	
K2+870	K2+921	51,00		Cuneta con bordillo	6,44	328,44	
K2+921	K2+933	13,00		Cuneta con bordillo	6,44	77,28	
K2+933	K2+998	65,00		Cuneta con bordillo	6,44	395,48	
K2+998	K2+443	120,00		Gaviotas 20x45 cm	3,40	708,00	
K2+443	K2+723	28,00		Cuneta con bordillo	6,44	193,28	
K2+736	K2+758	28,00		Cuneta con bordillo	6,44	108,32	
K2+758	K2+768	18,00		Cuneta con bordillo	6,44	64,40	
K2+768	K2+782	14,00		Cuneta con bordillo	6,44	90,16	
K2+782	K2+815	33,00		Cuneta con bordillo	6,44	212,52	
K2+815	K2+839	24,00		Cuneta con bordillo	6,44	154,56	
K2+839	K2+844	5,00		Cuneta con bordillo	6,44	32,20	
K2+844	K2+889	49,00		Cuneta con bordillo	6,44	315,56	
K2+934	K2+129	29,00		Cuneta con bordillo	6,44	141,08	
K2+129	K2+138	4,00		Cuneta con bordillo	6,44	39,44	
K2+138	K2+154	31,00		Cuneta con bordillo	6,44	305,74	
K2+154	K2+161	3,00		Cuneta con bordillo	6,44	29,58	
K2+161	K2+182	21,00		Cuneta con bordillo	6,44	135,24	
K2+210	K2+187	3,00		Cuneta con bordillo	6,44	19,32	
K2+187	K2+184	39,00		Cuneta con bordillo	6,44	251,16	
K2+026	K2+032	6,00		Cuneta con bordillo	6,44	38,64	
K2+032	K2+041	9,00		Cuneta con bordillo	6,44	57,96	
K2+138	K2+148	35,00		Cuneta con bordillo	6,44	147,00	
K2+148	K2+179	30,00		Cuneta con bordillo	6,44	193,20	
K2+175	K2+245	70,00		Cuneta con bordillo	6,44	450,80	
K2+310	K2+321	6,00		Cuneta con bordillo	6,44	38,64	
K2+321	K2+366	13,00		Cuneta con bordillo	6,44	79,60	
K2+401	K2+429	22,00		Cuneta con bordillo	6,44	141,68	

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VIA MONTERRUBIO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO San DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
33	Pocito de inspeccion de PI = 4.200 (QEOT: 2.150.000 PSI)	KG	33.667,80

LOCALIZACION UNIDAMENTO 1		MEDIDA LARGO	CANTIDAD	ANCHO	PESO	PARCIAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
K0+000	K0+800	7,00		Cuneta con bordillo	5,44	45,38	
K0+800	K0+814	14,00		Cuneta con bordillo	5,44	76,14	
K0+850	K0+930	8,00		Cuneta con bordillo	5,44	43,52	
K0+900	K0+980	36,00		Cuneta con bordillo	5,44	195,84	
K1+000	K1+004	4,00		Cuneta con bordillo	5,44	21,76	
K1+780	K1+880	100,00		Cuneta con bordillo	5,44	544,00	
K1+000	K1+004	4,00		Cuneta con bordillo	5,44	21,76	
K1+004	K1+051	47,00		Cuneta con bordillo	5,44	255,68	
K1+051	K1+154	103,00		Cuneta con bordillo	5,44	560,32	
K1+126	K1+138	14,00		Cuneta con bordillo	5,44	76,16	
K1+174	K1+179	25,00		Cuneta con bordillo	5,44	136,00	
K1+179	K1+218	39,00		Cuneta con bordillo	5,44	212,16	
K1+233	K1+240	13,00		Cuneta con bordillo	5,44	70,72	
K1+245	K1+295	49,00		Cuneta con bordillo	5,44	266,56	
K1+360	K1+362	82,00		Cuneta con bordillo	5,44	446,08	
K1+400	K1+447	48,00		Cuneta con bordillo	5,44	261,12	
K1+447	K1+455	8,00		Cuneta con bordillo	5,44	43,52	
K1+458	K1+468	10,00		Cuneta con bordillo	5,44	54,40	
K1+725	K1+729	77,00		Cuneta con bordillo	5,44	418,88	
K1+754	K1+762	8,00		Cuneta con bordillo	5,44	43,52	
K1+723	K1+777	45,00		Cuneta con bordillo	5,44	244,80	
K1+777	K1+823	46,00		Cuneta con bordillo	5,44	250,24	
K1+956	K1+991	35,00		Cuneta con bordillo	5,44	190,40	
K1+951	K2+122	61,00		Cuneta con bordillo	5,44	331,84	
K2+122	K2+130	8,00		Cuneta con bordillo	5,44	43,52	
K2+130	K2+191	53,00		Cuneta con bordillo	5,44	288,32	
K2+218	K2+424	21,00		Cuneta con bordillo	5,44	114,24	
K2+518	K2+521	7,00		Cuneta con bordillo	5,44	38,08	
K2+519	K2+571	60,00		Cuneta con bordillo	5,44	326,40	
K2+575	K2+604	29,00		Cuneta con bordillo	5,44	157,76	
K2+604	K2+636	36,00		Cuneta con bordillo	5,44	195,84	
K2+638	K2+698	30,00		Cuneta con bordillo	5,44	163,20	
K2+698	K2+699	45,00		Cuneta con bordillo	5,44	244,80	
K2+699	K2+720	84,00		Cuneta con bordillo	5,44	457,00	
K2+720	K2+750	27,00		Cuneta con bordillo	5,44	146,88	
K2+750	K2+761	39,00		Cuneta con bordillo	5,44	212,16	
K2+900	K2+907	8,00		Cuneta con bordillo	5,44	43,52	
K2+907	K2+934	27,00		Cuneta con bordillo	5,44	146,88	
K2+936	K2+971	69,00		Cuneta con bordillo	5,44	375,36	
K2+971	K3+761	134,00		Cuneta con bordillo	5,44	729,00	
K3+917	K3+949	32,00		Derrellen 30x45 cm	5,44	174,08	
K3+957	K3+989	65,00		Cuneta con bordillo	5,44	353,60	
K3+168	K3+200	74,00		Cuneta con bordillo	5,44	402,56	
TOTAL AMBOS COSTADOS		4057,00					

MALLA ELECTROSOLDADA M188 / OBRAS DE PROTECCION

LOCALIZACION			LONG. (M)	ANCHO (M)	PESO (KG/M2)	
Cuneta Izquierda						
K0+712	K0+942	Cuneta Izq.	30,00	1,90	5,93	171,51
K0+956	K1+076	Cuneta Izq.	30,00	2,10	5,93	373,83
K7+947	K7+980	Cuneta Izq.	13,00	2,20	5,93	84,47
K7+100	K7+120	Cuneta Izq.	15,00	1,90	5,93	84,47
K7+122	K7+130	Cuneta Izq.	9,00	1,90	5,93	84,39
Cuneta Derecha						
K0+934	K0+943	Cuneta Izq.	10,00	1,90	5,93	108,34
K0+944	K0+973	Cuneta Izq.	32,00	2,90	5,93	288,32
					Total ejecutado	33.156,13
					Acumulado Acta 4	20.179,28
					diferencia cantidad contractual	
					ACTA FINAL	

OBSERVACIONES:
POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALFONSO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Firma:
Nombre:
Interventoria de consorcio vial

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEUBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
28	Sub-base Granular Clase C	M3	-

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	Area (m2)	SUBTOTAL
RAMO EL PINDO						
K0+000	K1+691	1690,71	5,50	0,15		1394,84
K1+971	K2+512	541,89	5,50	0,15		446,81
K2+425	K3+562	137,03	5,50	0,15		113,05
K3+938	K4+059	120,84	5,50	0,15		99,69
K4+363	K5+138	775,98	5,50	0,15		640,18
K5+282	K5+458	175,99	5,50	0,15		145,19
		3442,14				

REGISTRO FOTOGRAFICO

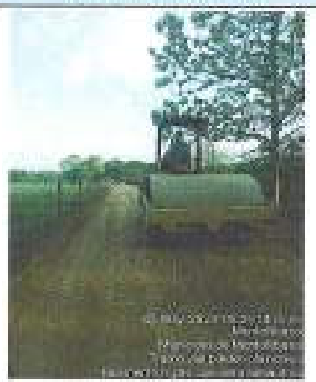

OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No.1

TOTAL	2.839,77
Acumulado Acta 6	2.839,77
ACTA FINAL	-

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO MUÑOZ ROJAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEBIANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
29	Afirmado (Material para mejoramiento)	M3	2.259,06

UBICACIÓN/ALINEAMIENTO			MEDIDA			(1) SUBTOTAL RELLENO FONDO (m2)	RELLENO LATERAL AREA m2	(2) SUBTOTAL RELLENO LATERAL (m3)	(1) + (2) TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
			LARGO	ANCHO	ALTO					
K0+000	K1+671	Cont Derecho	1671,00	0,70	0,10	116,97	0,26	423,91	599,88	
K1+671	K1+691	Cont Derecho	20,00	0,70	0,10	1,40			1,40	
K1+971	K2+512	Cont Derecho	541,00	0,70	0,10	37,87	0,28	151,41	189,28	
K2+425	K2+562	Cont Derecho	137,00	0,70	0,10	9,59			9,59	
K2+938	K4+059	Cont Derecho	121,00	0,70	0,10	8,47	0,27	33,27	41,74	
K4+353	K5+139	Cont Derecho	776,00	0,70	0,10	54,32	0,27	211,33	265,65	
K5+282	K5+285	Cont Derecho	3,00	0,70	0,10	0,21			0,21	
K5+285	K5+385	Cont Derecho	100,00	0,70	0,10	7,00			7,00	
K5+385	K5+458	Cont Derecho	73,00	0,70	0,10	5,11	0,29	28,63	33,74	
K0+000	K1+671	Cont Izquierdo	1671,00	0,70	0,10	116,97	0,29	478,77	595,74	
K1+671	K1+691	Cont Izquierdo	20,00	0,70	0,10	1,40			1,40	
K1+971	K2+512	Cont Izquierdo	541,00	0,70	0,10	37,87	0,27	147,35	185,22	
K2+425	K2+562	Cont Izquierdo	137,00	0,70	0,10	9,59			9,59	
K2+938	K4+059	Cont Izquierdo	121,00	0,70	0,10	8,47	0,29	35,57	44,04	
K4+353	K5+139	Cont Izquierdo	776,00	0,70	0,10	54,32	0,31	259,94	314,26	
K5+282	K5+285	Cont Izquierdo	3,00	0,70	0,10	0,21			0,21	
K5+285	K5+385	Cont Izquierdo	100,00	0,70	0,10	7,00			7,00	
K5+385	K5+458	Cont Izquierdo	73,00	0,70	0,10	5,11	0,40	29,11	34,22	
								Total ejecutado:	2.259,06	
								Acumulado Acta a:	-	

OBSERVACIONES: El volumen de afirmado corresponde a una capa de 10cm de espesor instalada debajo de la cuneta, así como a los rellenos localizados realizados en algunos puntos laterales, con el fin de garantizar el soporte y la estabilidad de la misma. Ver anexo, cartera topográfica.

ACTA FINAL 2.259,06





POR EL CONSULTOR:

Firma:

Nombre: LUIS ALEJANDRO ARBELO

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: GRANCERCE VILLADIEGO PEREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
30	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	1,14

LOCALIZACION LINEAMIENTO T		MEDIDA LARGO	ANCHO	ALTO	Area (m2)	SUBTOTAL
TRAMO EL PINDO c.i						
K0+000	K1+691	1690,71	2,50	0,19		803,09
K1+971	K2+512	541,59	2,50	0,19		257,26
K2+825	K2+963	137,03	2,50	0,19		65,09
K2+938	K4+069	120,84	2,50	0,19		57,40
K4+363	K5+139	775,98	2,50	0,19		368,59
K5+282	K5+458	175,99	2,50	0,19		83,60
		3442,14				
TRAMO EL PINDO c.d						
K0+000	K1+691	1690,71	2,50	0,19		803,09
K1+971	K2+512	541,59	2,50	0,19		257,26
K2+825	K2+963	137,03	2,50	0,19		65,09
K2+938	K4+069	120,84	2,50	0,19		57,40
K4+363	K5+139	775,98	2,50	0,19		368,59
K5+282	K5+458	175,99	2,50	0,19		83,60
		3442,14				
LOSAS ESQUINAS			CANTIDAD	ALTO	Area (m2)	
K0+000	K0+003		2	0,19	3,0	1,14
					Total ejecutado	3.271,17
					Acumulado Acta 6	3.270,03
					ACTA FINAL	1,14

REGISTRO FOTOGRAFICO

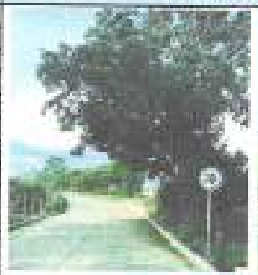

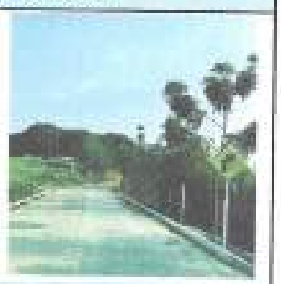



OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: JUAN ELBER VILLALOBOS PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
31	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	M3	51,36

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1			MEDIDA LARGO	OBSERVACIONES	AREA m2	SUBTOTAL
TRAMO EL PINDO cuneta izquierdo						
Tramo 1	K0+000	K1+671	1670,71	Con bordillo	0,160	267,31
	K1+671	K1+691	20,00	En Muro	0,120	2,40
Tramo 2	K1+971	K2+512	541,59	Con bordillo	0,160	86,65
Tramo 3	K2+425	K3+562	137,03	Con bordillo	0,160	21,92
Tramo 4	K3+938	K4+059	120,84	Con bordillo	0,160	19,33
Tramo 5	K4+365	K5+139	775,98	Con bordillo	0,160	124,16
Tramo 6	K5+282	K5+285	2,99	Con bordillo	0,160	0,48
	K5+285	K5+385	100,00	En Muro	0,120	12,00
	K5+385	K5+458	73,00	Con bordillo	0,160	11,68
Total acumulado cuneta izquierdo			3442,14			
TRAMO EL PINDO cuneta derecho						
Tramo 1	K0+000	K1+671	1670,71	Con bordillo	0,160	267,31
	K1+671	K1+691	20,00	En Muro	0,120	2,40
Tramo 2	K1+971	K2+512	541,59	Con bordillo	0,160	86,65
Tramo 3	K2+425	K3+562	137,03	Con bordillo	0,160	21,92
Tramo 4	K3+938	K4+059	120,84	Con bordillo	0,160	19,33
Tramo 5	K4+365	K5+139	775,98	Con bordillo	0,160	124,16
Tramo 6	K5+282	K5+285	2,99	Con bordillo	0,160	0,48
	K5+285	K5+385	100,00	En Muro	0,120	12,00
	K5+385	K5+458	73,00	Con bordillo	0,160	11,68
Total acumulado cuneta derecho			3442,14			
					Total ejecutado	1.091,88
					Acumulado Acta 6	1.040,52
					ACTA FINAL	51,36

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS VILLALOBOS PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEBLANCO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
32	Acero de refuerzo de Fl = 4.200 kg/cm 2 (60.000 PSI	KG	5.995,67

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1			MEDIDA LARGO	MEDIDA CANT.	MEDIDA ALTO	PESO	SUBTOTAL
TRAMO EL PINDO							
ACERO CANASTILLA			LARGO	CANT.		PESO (KG/UND)	SUBTOTAL
Tramo 1	K0+000	K1+691	1690,71	1.120,00		3,501	3919,20
Tramo 2	K1+971	K2+512	541,59	360,00		3,501	1267,80
Tramo 3	K3+425	K3+562	137,03	92,00		3,501	322,00
Tramo 4	K3+938	K4+059	120,84	80,00		3,501	280,00
Tramo 5	K4+363	K4+139	775,98	518,00		3,501	1814,00
Tramo 6	K5+282	K5+455	175,99	118,00		3,501	413,00
ACERO TRANSTERMICIA			LARGO	CANT.	LONG. DOVELA	PESO (KG/M)	SUBTOTAL
Tramo 1	K0+000	K1+691	1690,71	9.024,00	0,35	3,973	12549,25
Tramo 2	K1+971	K2+512	541,59	2.896,00	0,35	3,973	4027,00
Tramo 3	K3+425	K3+562	137,03	736,00	0,35	3,973	1023,00
Tramo 4	K3+938	K4+059	120,84	656,00	0,35	3,973	912,00
Tramo 5	K4+363	K5+139	775,98	4.144,00	0,35	3,973	5762,00
Tramo 6	K5+282	K5+455	175,99	944,00	0,35	3,973	1313,00
ACERO ANCLAJE			LARGO	CANT.	LONG. ANCLAJE	PESO (KG/M)	SUBTOTAL
Tramo 1	K0+000	K1+691	1690,71	1.908,20	0,85	0,994	1612,00
Tramo 2	K1+971	K2+512	541,59	612,28	0,85	0,994	517,00
Tramo 3	K3+425	K3+562	137,03	155,63	0,85	0,994	130,00
Tramo 4	K3+938	K4+059	120,84	138,72	0,85	0,994	117,00
Tramo 5	K4+363	K5+139	775,98	876,38	0,85	0,994	740,00
Tramo 6	K5+282	K5+456	173,99	199,62	0,85	0,994	169,00
LOSAS REFORZADAS / TRANSICION A PLACA HUELLA, INICIO Y FIN DE PAVIMENTO				CANT.	UBICACIÓN	PESO (KG/UND)	
Tramo 1	K0+000	K1+691		4	Refuerzo en doble parilla de 1/2" separado cada 30cm, en ambos sentidos (2) Losa al inicio y (2) Losas al final de cada tramo	150	600
Tramo 2	K1+971	K2+512		4		150	600
Tramo 3	K3+425	K3+562		4		150	600
Tramo 4	K3+938	K4+059		4		150	600
Tramo 5	K4+363	K5+139		4		150	600
Tramo 6	K5+282	K5+455		4		150	600

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEBLANCO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
32	Acero de refuerzo de Fr = 4.200 Kg/cm 2 60.000 PSI	KG	5.995,67

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1			MEDIDA LARGO	CANT.	ALTO	PESO	SUBTOTAL
TRAMO EL PINDO cuneta izquierdo			LONG. TRAMO	DETALLES		PESO (KG/M)	SUBTOTAL
Tramo 1	K0+000	K1+671	1670,71	Con bordillo		6,440	10759,37
	K1+671	K1+691	20,00	En Muro		3,640	72,80
Tramo 2	K1+971	K2+512	541,59	Con bordillo		6,440	3487,84
Tramo 3	K2+425	K2+562	137,03	Con bordillo		6,440	882,47
Tramo 4	K2+938	K4+059	120,84	Con bordillo		6,440	778,21
Tramo 5	K4+263	K5+139	775,98	Con bordillo		6,440	4997,31
Tramo 6	K5+282	K5+285	2,99	Con bordillo		6,440	19,26
	K5+285	K5+385	100,00	En Muro		3,640	364,00
	K5+385	K5+458	73,00	Con bordillo		6,440	470,12
Total acumulado cuneta izquierdo			3442,14				

TRAMO EL PINDO cuneta derecho			LONG. TRAMO	DETALLES		PESO (KG/M)	SUBTOTAL
Tramo 1	K0+000	K1+671	1670,71	Con bordillo		6,440	10759,37
	K1+671	K1+691	20,00	En Muro		3,640	72,80
Tramo 2	K1+971	K2+512	541,59	Con bordillo		6,440	3487,84
Tramo 3	K2+425	K2+562	137,03	Con bordillo		6,440	882,47
Tramo 4	K2+938	K4+059	120,84	Con bordillo		6,440	778,21
Tramo 5	K4+263	K5+139	775,98	Con bordillo		6,440	4997,31
Tramo 6	K5+282	K5+285	2,99	Con bordillo		6,440	19,26
	K5+285	K5+385	100,00	En Muro		3,640	364,00
	K5+385	K5+458	73,00	Con bordillo		6,440	470,12
Total acumulado cuneta derecho			3442,14				
						Total ejecutado	84.174,01
						Acumulado Acta 6	76.178,34
						ACTA FINAL	5.995,67

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: LUIS ALEJANDRO MUÑOZ

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:

Nombre: JOHN BERCIN VELOSCO PEREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEBIANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
55	Excavaciones varias en material conglomerado a mano.	M3	-

LOCALIZACION EJE/AMIENTO 1			MEDIDA			Area (m2)	SUBTOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
			LARGO	ANCHO	ALTO			
TRAMO EL PINDO								
K1+670	K1+690	LD	20,00	2,15	2,605		112,02	
K1+670	K1+690	LI	20,00	2,15	2,605		112,02	
K5+285	K5+385	LD	100,00	2,15	2,605		560,08	
K5+285	K5+385	LI	100,00	2,15	2,605		560,08	
			240,00					
TRAMO EL ANCLAR								
KD+105	KD+225	LI	120,00	2,15	2,605		672,09	
KD+189	KD+230	LD	41,00	2,15	2,605		229,63	
KD+268	KD+348	LI	80,00	2,15	2,605		448,06	
KD+268	KD+345	LD	76,50	2,15	2,605		428,46	
			317,50					
			557,50					
						TOTAL	3.122,42	
						Acumulado Acta 6	3.122,42	
						ACTA FINAL	-	



OBSERVACIONES:
Cubicado en acta parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEBLANCO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
34	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	-

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1			MEDIDA			Area (m2)	SUBTOTAL
			LARGO	ANCHO	ESPESOR		
TRAMO EL PINDO							
K1+670	K1+690	LD	20,00	2,15	0,08		3,44
K1+670	K1+690	LI	20,00	2,15	0,08		3,44
K5+385	K5+385	LD	100,00	2,15	0,08		17,20
K5+385	K5+385	LI	100,00	2,15	0,08		17,20
			240,00				41,28
TRAMO EL ANCLAR							
K0+100	K0+220	LI	120,00	2,15	0,08		20,64
K0+189	K0+230	LD	41,00	2,15	0,08		7,05
K0+268	K0+348	LI	80,00	2,15	0,08		13,76
K0+268	K0+345	LD	76,50	2,15	0,08		13,16
			317,50				54,61
			557,50				
						TOTAL	95,89
						Acumulado Acta 6	95,89
						ACTA FINAL	-

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No. 1

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MAYORGA RUGGI
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: FRANCISCO VILLALOBOS PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEBURRO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
55	Concreto clase D (210 kg/cm2) o 3000 PSI (MURO	M3	-

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1				MEDIDA			Area (m2)	SUBTOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO		
TRAMO EL PINO								
E1+670	E1+690	BASE	Lado Derecho	20.00	2.15	0.40		17.20
		PEDESTAL		20.00	0.35	0.35		2.45
		MURO		20.00	2.600	0.25		13.00
E1+670	E1+690	BASE	Lado Izquierdo	20.00	2.15	0.40		17.20
		PEDESTAL		20.00	0.35	0.35		2.45
		MURO		20.00	2.600	0.25		13.00
E2+265	E2+365	BASE	Lado Derecho	100.00	2.15	0.40		86.00
		PEDESTAL		100.00	0.35	0.35		12.25
		MURO		100.00	2.600	0.25		65.10
E2+265	E2+365	BASE	Lado Izquierdo	100.00	2.15	0.40		86.00
		PEDESTAL		100.00	0.35	0.35		12.25
		MURO		100.00	2.600	0.25		65.10
				140.00	metros lineales en el tramo			312.10
TRAMO EL ANCLAR								
E0+100	E0+220	BASE	Lado Izquierdo	120.00	2.15	0.40		103.20
		PEDESTAL		120.00	0.35	0.35		14.70
		MURO		120.00	2.600	0.25		78.15
E0+189	E0+230	BASE	Lado Derecho	41.00	2.15	0.40		35.26
		PEDESTAL		41.00	0.35	0.35		5.02
		MURO		41.00	2.600	0.25		26.70
E0+268	E0+348	BASE	Lado Izquierdo	80.00	2.15	0.40		68.80
		PEDESTAL		80.00	0.35	0.35		9.80
		MURO		80.00	2.600	0.25		52.00
E0+268	E0+348	BASE	Lado Derecho	76.50	2.15	0.40		65.79
		PEDESTAL		76.50	0.35	0.35		9.37
		MURO		76.50	2.600	0.25		49.80
				117.50	metros lineales en el tramo			210.75
				557.50	metros lineales totales			

TOTAL	910.60
Acumulado Acta 6	910.60
ACTA FINAL	-

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:
Colocado en acta parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL

Firma:
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCION VÍA MONTEBIANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANDIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
3A	Acero de Refuerzo Fy 420 MPA	KG	-

LOCALIZACION UNIDAMIDO 1			MEDIDA			PESO (kg/m)	SUBTOTAL
			LARGO	CANTIDAD	DIAMETRO		
Despiece acero metro lineal							
Longitudinal pedestal			1,20	6,00	5/8"	1,552	11,174
Transversal pedestal			2,40	7,00	5/8"	1,552	26,074
Longitudinal base			1,15	18,00	1/2"	0,994	20,645
Transversal base			2,65	8,00	5/8"	1,552	32,902
Longitudinal muro			1,15	22,00	1/2"	0,994	25,032
Transversal muro			3,36	8,00	5/8"	1,552	41,704
Transversal muro			3,36	4,00	1/2"	0,994	13,205
						Total acero para 1 metro lineal de muro	**171,0864**
TRAMO EL FINDO							
K1+670	K1+690	Lado derecho	20,00			171,0864	3421,73
K1+670	K1+690	Lado izquierdo	20,00			171,0864	3421,73
K5+388	K5+388	Lado derecho	100,00			171,0864	17108,64
K5+388	K5+388	Lado izquierdo	100,00			171,0864	17108,64
TOTAL MURO TRAMO FINDO			**240,00**				**41.060,74**
TRAMO EL ANCLAR							
K0+108	K0+225	Lado izquierdo	120,00			171,0864	20530,37
K0+189	K0+230	Lado derecho	41,00			171,0864	7014,54
K0+368	K0+348	Lado izquierdo	80,00			171,0864	13686,91
K0+268	K0+348	Lado derecho	76,50			171,0864	13088,11
TOTAL MURO TRAMO ANCLAR			**317,50**				**54.319,93**
						TOTAL	95.380,67
						Acumulado Acta 6	95.380,67
						ACTA FINAL	-

OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra no. 1

REGISTRO FOTOGRAFICO



POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Firma:
Nombre: [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

480

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTEBLANCO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
.37	Relleno para Estructuras con recebo	M3	-

LOCALIZACION UBICAMIENTO 1			MEDIDA			Area (m2)	SUBTOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTURA		
TRAMO EL PINDO							
RELLENOS LATERALES							
K1+670	K1+690	LD	20,00	1,90	2,61		98,99
K1+670	K1+690	LI	20,00	1,90	2,61		98,99
K3+285	K3+385	LD	100,00	1,90	2,61		494,75
K3+285	K3+385	LI	100,00	1,90	2,61		494,75
			240,00				**1.187,48**
TRAMO EL ANCLAR							
RELLENOS LATERALES							
K0+135	K0+255	LI	120,00	1,90	2,61		593,94
K0+189	K0+230	LD	41,00	1,90	2,61		202,93
K0+368	K0+348	LI	80,00	1,90	2,61		395,94
K0+368	K0+345	LD	76,50	1,90	2,61		378,64
			317,50				**1.571,47**
						TOTAL	2.759,35
						Acumulado Acta a	2.759,35
						ACTA FINAL	-

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:
Cobrado en acta parcial de obra No.1

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
38	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	M3/KM	-

LOCALIZACION LINEAMIENTO		MEDIDA LARGO	MEDIDA VOLUMEN	f.c Expansion	DISTANCIA	SUBTOTAL
TRAMO EL PINDO EXCAVACION						
K0+000	K1+671	1680,71	2585,47	1,30	7,55	24.591,19
K1+971	K2+512	541,59	1662,87	1,30	8,94	19.325,88
K2+425	K2+562	137,03	645,58	1,30	10,19	8.551,47
K2+938	K4+059	120,84	695,19	1,30	10,70	9.670,09
K4+363	K5+139	775,98	2112,40	1,30	11,45	31.443,07
K5+282	K5+458	175,99	1082,07	1,30	12,07	16.978,76
		3442,14				
TRAMO EL PINDO TERRAPLEN						
K0+000	K1+671	1680,71	733,45	1,2834	25,45	24.897,64
K1+971	K2+512	541,59	1540,47	1,2834	27,84	85.112,23
K2+425	K2+562	137,03	498,17	1,2834	29,09	18.598,73
K2+938	K4+059	120,84	999,67	1,2834	29,80	37.596,22
K4+363	K5+139	775,98	2128,95	1,2834	30,35	80.525,14
K5+282	K5+458	175,99	480,97	1,2834	30,97	19.266,12
		3442,14				
TRAMO EL ANCLAR EXCAVACION						
K0+000	K7+120	7120,00	21.731,86	1,30	48,38	1.366.834,88
		7120,00				
TRAMO EL ANCLAR TERRAPLEN						
K0+000	K7+120	7120,00	19.625,00	1,2834	76,84	1.931.486,30
		7120,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACION: (1). El factor de expansion de 28,34% aplicado al material de terraplen, que se aplica, corresponde al determinado mediante informe de laboratorio teniendo en cuenta lo establecido en la norma INVIAS.

Total ejecutado	3.641.347,72
Acumulado Acta 6	3.641.347,72

ACTA FINAL

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARMOL
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCanti IzquierdoÓN VIA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCanti IzquierdoCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCanti IzquierdoCIO [illegible]

ITEM	DESCRIPCanti IzquierdoÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
39	Señal Vertical de Trasito Tipo I con lamina retroreflectiva tipo III 75 x 75 I cm	UND	121,00

LOCALIZACanti IzquierdoÓN LINEAMIENTO I		CODIGO	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
TRAMO EL PINDO				
KD+010	Canti Izquierdo	SR-01	1	
KD+040	Canti Derecho	SR-30	1	
KD+090	Ambos Cantes	SR-26	2	
KD+120	Canti Derecho	SP-03	1	
KD+220	Canti Izquierdo	SP-04	1	
KD+220	Canti Derecho	SP-01	1	
KD+350	Canti Izquierdo	SP-02	1	
KD+450	Canti Derecho	SR-30	1	
KD+660	Canti Derecho	SP-04	1	
KD+790	Canti Izquierdo	SP-03	1	
KD+870	Canti Derecho	SP-04	1	
K1+120	Canti Izquierdo	SP-03	1	
K1+150	Canti Derecho	SP-09	1	
K1+350	Canti Izquierdo	SP-09	1	
K1+370	Canti Derecho	SP-03	1	
K1+640	Ambos Cantes	SR-26	2	
EL PINDO - PH 1-2				
K1+730	Canti Izquierdo	SP-04	1	
K1+760	Canti Derecho	SP-08	1	
K1+960	Canti Derecho	SR-30	1	
EL PINDO - TRAMO 2				
K2+090	Ambos Cantes	SR-026	2	
K2+160	Canti Izquierdo	SR-30	1	
K2+195	Canti Derecho	SP-03	1	
K2+310	Canti Izquierdo	SP-08	1	
K2+480	Canti Derecho	SP-04	1	
EL PINDO - PH 2-3				
K2+620	Canti Izquierdo	SP-03	1	
K2+760	Canti Derecho	SP-04	1	
K2+930	Canti Izquierdo	SP-03	1	
K3+045	Canti Derecho	SP-04	1	
K3+230	Canti Izquierdo	SP-03	1	
K3+275	Canti Derecho	SP-03	1	
EL PINDO - TRAMO 3				
K3+480	Canti Izquierdo	SR-30	1	
K3+550	Canti Derecho	SP-04	1	
EL PINDO - PH 3-4				
K3+740	Canti Izquierdo	SP-03	1	
K3+760	Canti Derecho	SP-10	1	
EL PINDO - TRAMO 4				
K3+980	Canti Derecho	SP-03	1	
K3+980	Canti Izquierdo	SP-01	1	
EL PINDO - PH 4-5				
K4+200	Canti Izquierdo	SP-04	1	
EL PINDO - TRAMO 5				
K4+415	Ambos Cantes	SR-26	2	
K4+490	Canti Derecho	SP-04	1	
K4+800	Canti Izquierdo	SP-03	1	
K4+900	Canti Derecho	SP-04	1	
K5+020	Canti Izquierdo	SP-03	1	
EL PINDO - PH 5-6				
K5+170	Canti Derecho	SP-08	1	
EL PINDO - TRAMO 6				
K5+320	Ambos Cantes	SR-26	2	
K5+370	Canti Izquierdo	SP-04	1	
K5+420	Canti Derecho	SR-01	1	
TOTAL TRAMO EL PINDO				51

REGISTRO FOTOGRAFICO









	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA FINAL DE OBRA	CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCanti IzquierdaCIÓN VIA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCanti IzquierdaO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCanti IzquierdaC VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCanti IzquierdaCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
39	Señal Vertical de Tránsito tipo I con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	121,00

LOCALIZACanti IzquierdaCIÓN LINEAMIENTO 1		CODIGO	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
TRAMO EL ANCLAR				
KD+010	Canti Derecha	SP-08	1	
KD+030	Canti Derecha	SR-30	1	
KD+110	Ambos Cantes	SR-26	2	
KD+210	Canti Derecha	SP-36	1	
KD+280	Canti Izquierda	SP-36	1	
KD+310	Canti Izquierda	SP-07	1	
KD+330	Canti Derecha	SP-03	1	
KD+400	Canti Derecha	PR6	1	
KD+480	Canti Derecha	SP-05	1	
KD+670	Canti Izquierda	SP-05	1	
KD+710	Canti Izquierda	SR-30	1	
KD+730	Canti Derecha	SP-06	1	
KD+760	Ambos Cantes	SR-26	2	
KD+810	Canti Derecha	SR-30	1	
KD+890	Canti Derecha	SP-01	1	
KD+910	Canti Izquierda	SP-06	1	
KD+990	Canti Izquierda	SP-03	1	
K1+030	Canti Derecha	SP-07	1	
K1+230	Canti Izquierda	SP-07	1	
K1+250	Canti Derecha	SP-36	1	
K1+310	Canti Derecha	SP-05	1	
K1+320	Canti Izquierda	SP-36	1	
K1+400	Canti Izquierda	PR7	1	
K1+460	Canti Izquierda	SR-30	1	
K1+490	Canti Izquierda	SP-07	1	
K1+530	Canti Derecha	SP-02	1	
K1+610	Canti Derecha	SP-09	1	
K1+970	Canti Derecha	SR-30	1	
K2+000	Canti Izquierda	SP-09	1	
K2+060	Canti Izquierda	SR-30	1	
K2+090	Canti Derecha	SP-04	1	
K2+100	Canti Derecha	SP-05	1	
K2+130	Canti Izquierda	SP-05	1	
K2+150	Ambos Cantes	SR-26	2	
K2+180	Canti Izquierda	SP-04	1	
K2+210	Canti Derecha	SP-02	1	
K2+310	Canti Izquierda	SP-01	1	
K2+320	Canti Derecha	SP-03	1	
K2+360	Canti Derecha	SP-07	1	
K2+390	Canti Izquierda	SP-04	1	
K2+400	Canti Derecha	PR8	1	
K2+405	Canti Derecha	SR-30	1	
K2+460	Canti Izquierda	SR-30	1	
K2+520	Canti Derecha	SR-30	1	
K2+610	Canti Derecha	SP-05	1	
K2+620	Canti Izquierda	SP-06	1	
K2+640	Canti Izquierda	SR-30	1	
K2+690	Canti Derecha	SP-01	1	
K2+700	Canti Izquierda	SP-04	1	
K2+790	Canti Derecha	SP-03	1	
K2+800	Canti Izquierda	SP-02	1	
K2+910	Ambos Cantes	SR-26	2	
K3+040	Canti Izquierda	SP-05	1	
K3+090	Canti Derecha	SP-08	1	
K3+120	Canti Derecha	SP-47A	1	
K3+150	Ambos Cantes	SR-30	2	
K3+260	Ambos Cantes	SR-26	2	
K3+320	Ambos Cantes	SP-47B	2	
K3+400	Canti Izquierda	PR9	1	
K3+420	Ambos Cantes	SR-26	2	
K3+460	Canti Derecha	SR-30	1	

REGISTRO FOTOGRAFICO





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCanti IzquierdoON VIA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCanti IzquierdoO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCanti IzquierdoO VIAL NACIONAL Izquierdo/ANCLAR

ITEM	DESCRIPCanti IzquierdoON	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
39	Señal Vertical de Tránsito tipo I con lámina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	121,00

LOCALIZACanti IzquierdoON LINEAMIENTO 1		CODIGO	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
K3+470	Canti Izquierdo	SR-30	1	
K3+520	Canti Izquierdo	SP-47A	1	
K3+610	Canti Izquierdo	SP-08	1	
K3+690	Canti Derecho	SP-01	1	
K3+830	Ambos Costados	SR-24	2	
K3+930	Canti Izquierdo	SP-05	1	
K3+930	Canti Derecho	SP-36	1	
K4+010	Canti Izquierdo	SP-36	1	
K4+040	Canti Izquierdo	SP-05	1	
K4+040	Canti Derecho	SP-04	1	
K4+200	Canti Derecho	SP-05	1	
K4+220	Canti Izquierdo	SP-02	1	
K4+400	Canti Derecho	PR10	1	
K4+550	Canti Derecho	SP-03	1	
K4+560	Canti Izquierdo	SP-08	1	
K4+600	Canti Izquierdo	SP-04	1	
K4+660	Canti Derecho	SP-07	1	
K4+690	Canti Derecho	SR-30	1	
K4+960	Canti Izquierdo	SP-07	1	
K4+980	Canti Derecho	SR-30	1	
K5+010	Canti Izquierdo	SR-30	1	
K5+070	Canti Derecho	SP-02	1	
K5+160	Canti Izquierdo	SP-01	1	
K5+190	Ambos Costados	SR-24	2	
K5+400	Canti Izquierdo	PR11	1	
K5+510	Canti Derecho	SP-05	1	
K5+720	Canti Izquierdo	SP-05	1	
K5+880	Canti Derecho	SP-01	1	
K5+910	Ambos Costados	SR-24	2	
K5+990	Canti Izquierdo	SP-02	1	
K6+030	Canti Derecho	SP-07	1	
K6+050	Canti Izquierdo	SR-30	1	
K6+060	Canti Derecho	SR-30	1	
K6+200	Canti Derecho	SP-03	1	
K6+350	Canti Izquierdo	SP-08	1	
K6+380	Canti Derecho	SP-07	1	
K6+500	Canti Izquierdo	SP-04	1	
K6+600	Canti Derecho	PR12	1	
K6+620	Canti Derecho	SP-06	1	
K6+650	Canti Izquierdo	SP-07	1	
K6+780	Canti Izquierdo	SP-01	1	
K6+780	Canti Derecho	SP-06	1	
K6+850	Canti Derecho	SP-05	1	
K6+870	Canti Izquierdo	SP-02	1	
K6+960	Canti Derecho	SP-05	1	
K6+980	Canti Izquierdo	SP-05	1	
K7+050	Canti Derecho	SP-08	1	
K7+090	Canti Izquierdo	SP-05	1	
K7+200	Canti Izquierdo	PR12	1	
TOTAL TRAMO EL ANCLAR 1				121
			Total ejecutado	172,00
			Acumulado Acta 6	51,00
OBSERVACanti IzquierdoONES:			ACTA FINAL	121,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: LUIS ALEJANDRO MARROQUIN

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS VILLALOBOS PEREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
40	Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	M	31.926,42

LOCALIZACION LINEAMIENTO		MEDIDA		CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	UBICACIÓN		
TRAMO EL ANCLAR					
K0+000	K7+200	7200,00	Línea Izquierda	1	7.200,00
K0+000	K7+200	7200,00	Línea Central	1	7.200,00
K0+000	K7+200	7200,00	Línea derecha	1	7.200,00
TRAMO EL PINDO					
K0+000	K1+691	1690,71		3	5.072,13
K1+971	K2+512	541,59		3	1.624,77
K3+425	K3+562	137,03		3	411,09
K3+938	K4+059	120,84		3	362,52
K4+363	K5+139	775,98		3	2.327,94
K5+282	K5+458	175,99		3	527,97
		3442,14			
				Total ejecutado	31.926,42
				Acumulado Acta 6	-
OBSERVACIONES:				ACTA FINAL	31.926,42

REGISTRO FOTOGRAFICO






POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
41	Tacha Reflectiva	UND	3.999,00

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA		CANTIDAD DE TACHA	SUBTOTAL
		LARGO	UBICACIÓN		
TRAMO EL ANCLAR				Cada 8 metros	
K0+000	K7+200	7200,00	Linea izquierda	900	900,00
K0+000	K7+200	7200,00	Linea Central	900	900,00
K0+000	K7+200	7200,00	Linea derecha	900	900,00
		7200,00			
TRAMO EL PINDO					
K0+000	K1+691	1690,71		636	636,00
K1+971	K2+512	541,59		204	204,00
K3+425	K3+562	137,03		54	54,00
K3+938	K4+059	120,84		48	48,00
K4+363	K5+139	775,98		291	291,00
K5+282	K5+458	175,99		66	66,00
		3442,14			
				Total ejecutado	3.999,00
				Acumulado Acta a	-
OBSERVACIONES:				ACTA FINAL	3.999,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO BARRIGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: JUAN HUBER VILLACOBOS PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

121

CONSORCIO SAN DIEGO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA FINAL DE OBRA

CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
NP1	Defensa Metalica	ML	150,00

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA		CANTIDAD	SUBTOTAL
		LARGO	UBICACIÓN		
TRAMO EL PINDO					
K1+392	K1+408	16,00	C. Izquierdo	1	16,00
TRAMO EL ANCLAR					
K1+277	K1+293	16,00	C. Izquierdo	1	16,00
K1+277	K1+293	16,00	C. Derecho	1	16,00
K1+808	K1+832	24,00	C. Derecho	1	24,00
K3+980	K4+000	20,00	C. Izquierdo	1	20,00
K3+980	K4+000	20,00	C. Derecho	1	20,00
K4+111	K4+149	38,00	C. Izquierdo	1	38,00
				Total ejecutado	150,00
				Acumulado Acta 6	-
OBSERVACIONES:				ACTA FINAL	150,00

REGISTRO FOTOGRAFICO






POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: JOAN FELIDER VILLALOBOS PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA FINAL DE OBRA	CONSORCIO VIAL NACIONAL

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELIBANO - LAS PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
42	Caracterización del corredor	KM	20,00

LOCALIZACION LINEAMIENTO 1		MEDIDA		CANTIDAD	SUBTOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
		LARGO	UBICACIÓN			
CORREDOR VIAL PINDO						NO APLICA
K0+000	K20+000	20,00		1	20,00	
			Total ejecutado		20,00	
			Acumulado Acta 6		-	
OBSERVACIONES: Radicado mediante comunicado OFIC-CSD-481				ACTA FINAL	20,00	

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: LUIS ALEJANDRO MARQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:

Nombre: JOHN ELISCER VALDELOIS PEREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN DIEGO

Acta de entrega y recibo definitivo de obra

Email: consoriciosandiego@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MET-MIN-04-15-ITI-I
		VERSIÓN	1
		VIGENCIA	

FECHA: 31/05/2025 (Día, Mes, Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIALES REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP IAM 008 2022 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO

PROYECTO: VIA EL PINDO- RIO SAN JORGE - LAS PARCELAS - EL ANCLAR

FECHA DE INICIO: 21/05/2023 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 5m 0d 0d 0h

VALOR INICIAL: $ 34.997.430.449,20

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/05/2025 (Incluir prórrogas y suspensiones)

VALOR ACUMULADO: $ 35.997.430.449,20 (Incluir adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IPA-0823 (Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL MADERAL

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA DEL CONTRATO	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
PRINCIPAL	21/05/2023	31/12/2023	$ 35.997.430.449,20	$ 35.997.430.449,20
PRORROGA 1	31/12/2023	31/12/2024	$ -	$ 35.997.430.449,20
PRORROGA 2	27/12/2023	30/06/2024	$ -	$ 35.997.430.449,20
PRORROGA 3	27/06/2024	15/12/2024	$ -	$ 35.997.430.449,20
PRORROGA 4	10/12/2024	31/12/2024	$ -	$ 35.997.430.449,20
PRORROGA 5	30/12/2024	30/06/2025	$ -	$ 35.997.430.449,20
PRORROGA 6	01/06/2025	15/06/2025	$ -	$ 35.997.430.449,20
PRORROGA 7	13/06/2025	20/06/2025	$ -	$ 35.997.430.449,20

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		30/05/2024	30/05/2024	11/06/2024	12/06/2024
	1	10/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	20/06/2024
2		17/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	21/06/2024
	2	19/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	01/07/2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

Tramo EL PINDO:
Presenta una meta física ejecutada de 3443 ml en Pavimento Rígido MR 40, desde el inicio del corredor vial en el Pindo hasta el Río San Jorge.
Se encuentra conformado por seis (6) alineamientos separados entre sí por placas huellas existentes construidas previo al inicio de las obras:

1.(I) Alineamiento 1: K0+000 hasta el K1+031
2.(I) Alineamiento 2: K1+071 hasta el K2+012
3.(I) Alineamiento 3: K2+420 hasta el K2+602
4.(I) Alineamiento 4: K2+698 hasta el K2+858
5.(I) Alineamiento 5: K2+890 hasta el K3+118
6.(I) Alineamiento 6: K3+203 hasta el K3+458

Tramo EL ANCLAR
Presenta una meta física ejecutada de 7240 ml en pavimento Rígido MR40+10, desde el Río San Jorge en dirección hasta el corregimiento El Anclar.

En total , la meta física ejecutada, incluyendo los dos tramos (El Pindo y El Anclar), es de 10842 ml.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir cuadro resumen, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte):

TRAMO EL PINDO
1. Longitud de la vía: Pavimento Rígido MR 40= 3443 ml
2. Clasificación: Corredor Vial Terciario
3. Velocidad de diseño: 80 Km/h
4. Ancho de carril: 3,5 m
5. Cantidad de carriles: 2
6. Cunetas longitudinales en concreto reforzado, dimensionadas con espesor de 15 cm y ancho de 0,7 m incluyendo el bordillo. Longitud= 6884,28 ml
7. Cantidad de cunetas: 2
8. Ancho total de calzada: 8,4 m
9. Bombeo: 2%
10. Losa pavimento Rígido MR 40, Espesor: 15 cm
11. Subbase Granular: 20 cm
12. Terraplen: 50 cm
13. Bolardos Verticales: 81 und
14. Box Culvert: 4 und
15. Señalización horizontal en pintura en Río 2 franja blancas continuas blancas y con líneas amarilla centrales amarilla: 10,06 ml
16. Tachas reflectivas: 1200 und
17. Mono de Concreto: 948 und
18. Alcantarillas de 36 pulg: 5 und
19. Defensa Metálica : 18 ml

191

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROYECTO VIAL DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE BANDA DE HERRAMIENTA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO: MEN-VIN-03-18-FR-2 VERSIÓN: 1 FECHA:

DIRECTRIZ TRAMO EL PINDO costilla izquierda

Tramo 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	385,00
	[illegible]	[illegible]	90,00
	[illegible]	[illegible]	170,00
	[illegible]	[illegible]	90,00
	[illegible]	[illegible]	3,80
	[illegible]	[illegible]	110,00
	[illegible]	[illegible]	1,71
	[illegible]	[illegible]	90,00
Tramo 2	[illegible]	[illegible]	144,40
	[illegible]	[illegible]	70,00
	[illegible]	[illegible]	30,00
	[illegible]	[illegible]	90,00
	[illegible]	[illegible]	2,80
	[illegible]	[illegible]	70,00
	[illegible]	[illegible]	185,00
	[illegible]	[illegible]	70,00
Tramo 3	[illegible]	[illegible]	185,71
Tramo 4	[illegible]	[illegible]	110,84
Tramo 5	[illegible]	[illegible]	175,08
Tramo 6	[illegible]	[illegible]	3,79
	[illegible]	[illegible]	100,00
	[illegible]	[illegible]	70,00
Total acumulado costilla izquierda			3440,16

TRAMO EL PINDO costilla derecha

Tramo 1	[illegible]	[illegible]	385,00
	[illegible]	[illegible]	0,00
	[illegible]	[illegible]	334,00
	[illegible]	[illegible]	0,00
	[illegible]	[illegible]	60,00
	[illegible]	[illegible]	50,00
	[illegible]	[illegible]	7,00
	[illegible]	[illegible]	90,00
	[illegible]	[illegible]	60,71
	[illegible]	[illegible]	30,00
Tramo 2	[illegible]	[illegible]	5,40
	[illegible]	[illegible]	21,00
	[illegible]	[illegible]	318,00
	[illegible]	[illegible]	137,19
Tramo 3	[illegible]	[illegible]	187,00
Tramo 4	[illegible]	[illegible]	110,84
Tramo 5	[illegible]	[illegible]	175,90
Tramo 6	[illegible]	[illegible]	3,99
	[illegible]	[illegible]	100,00
	[illegible]	[illegible]	70,00
Total acumulado costilla derecha			3440,16



PAVIMENTO RÍGIDO MR 40

TRAMO EL PINDO a LIRA			
Tramo 1	K0+000	K1+691	1691,71
Tramo 2	K1+573	K2+012	311,39
Tramo 3	K2+145	K2+262	117,00
Tramo 4	K2+730	K4+059	120,84
Tramo 5	K4+645	K5+136	770,50
Tramo 6	K5+302	K5+428	175,09
TOTAL RECORRIDO ACUMULADO			3466,14

TRAMO EL PINDO a LIRA			
Tramo 1	K0+000	K1+691	1691,71
Tramo 2	K1+691	K2+002	311,39
Tramo 3	K2+145	K2+262	117,00
Tramo 4	K2+730	K4+059	120,84
Tramo 5	K4+645	K5+136	770,50
Tramo 6	K5+302	K5+428	175,09
TOTAL RECORRIDO ACUMULADO			3466,14

Subbase granular (capa de [illegible])	15 cms	Módulo de Reacción Compuesto (K=135,7 PCI = 93,6 MPa)
	15 cms	

ALCANTARILLAS DE 36 PULGADAS

TRAMO EL PINDO		LARGO
1	K0+844	7,00
2	K1+349	7,00
3	K1+826	7,00
4	K4+950	7,00
5	K4+780	7,00

BOX CULVERT

TRAMO EL PINDO			LARGO
1	K0+878	(3X3)	6,50
2	K3+168	(3X3)	6,50
3	K3+478	(2X3)	6,50
4	K4+618	(1X3)	6,50

RELIEVES DE CONTENCION

TRAMO EL PINDO			LARGO
K1+670	K1+698	LD	28,00
K1+670	K1+698	LI	28,00
K4+385	K5+385	LD	100,00
K4+385	K5+385	LI	100,00
			340,00

SEÑALES VERTICALES

Tramo el PINDO		
ABSCISA	CARRIL	CODIGO
K0+030	IZQUIERDO	SP-01
K0+040	DERECHO	SP-26
K0+080	IZQUIERDO	SP-06
K0+080	DERECHO	SP-26
K0+120	DERECHO	SP-03
K0+220	DERECHO	SP-01
K0+220	IZQUIERDO	SP-04
K0+280	IZQUIERDO	SP-02
K0+420	DERECHO	SP-26
K0+560	DERECHO	SP-04
K0+790	IZQUIERDO	SP-02
K0+870	DERECHO	SP-04
K1+120	IZQUIERDO	SP-02
K1+140	DERECHO	SP-04
K1+360	IZQUIERDO	SP-28
K1+360	DERECHO	SP-02
K1+540	IZQUIERDO	SP-26
K1+540	DERECHO	SP-26
K1+740	IZQUIERDO	SP-04
K1+760	DERECHO	SP-04

K1+940	DERECHO	SP-26
K2+080	IZQUIERDO	SP-02
K2+090	DERECHO	SP-26
K2+160	IZQUIERDO	SP-30
K2+180	DERECHO	SP-03
K2+210	IZQUIERDO	SP-08
K2+480	DERECHO	SP-04
K2+625	IZQUIERDO	SP-03
K2+760	DERECHO	SP-04
K2+920	IZQUIERDO	SP-03
K3+040	DERECHO	SP-04
K3+200	IZQUIERDO	SP-03
K3+375	DERECHO	SP-03
K3+480	IZQUIERDO	SP-30
K3+550	DERECHO	SP-04
K3+740	IZQUIERDO	SP-03
K3+760	DERECHO	SP-10
K3+970	IZQUIERDO	SP-10
K3+970	DERECHO	SP-03
K4+200	IZQUIERDO	SP-04
K4+410	DERECHO	SP-26

K4+610	IZQUIERDO	SP-04
K4+690	DERECHO	SP-04
K4+800	IZQUIERDO	SP-03
K4+900	DERECHO	SP-04
K5+020	IZQUIERDO	SP-03
K5+170	DERECHO	SP-03
K5+310	IZQUIERDO	SP-30
K5+310	DERECHO	SP-26
K5+570	IZQUIERDO	SP-04
K5+620	DERECHO	SP-03


DEFENSA METALICA

TRAMO EL PINDO		LARGO
K1+400	C. Izquierdo	12,00

TRAMO EL ANILLAR

1. Longitud de la vía Pavimento Flexible MDC-19 = 7500 ml
2. Clasificación: Corredor vial terciario
3. Velocidad de diseño: 30 Km/h
4. Ancho de calzada: 6,0 m
5. Cunetas longitudinales en concreto reforzado, dimensiones con espesor de 15 cm y ancho de 0,7 m incluyendo el bordillo. Longitud= [illegible]
6. Cantidad de carriles: 2
7. Ancho total de calzada: 6,4 m
8. Bombeo: 2%
9. Carpeta Asfáltica MDC-19, espesor: 8,0 cm
10. Base Granular: 15 cm
11. Subbase Granular: 20 cm
12. Terraplén: 50 cm
13. Señales Verticales= 121 und
14. Box Culvert: 8 und
15. Señalización horizontal en pintura en frío 2 líneas blancas continuas laterales y una línea amarilla continua central : 21500 ml
16. Tachas reflectivas: 2700 und
17. Muros de Contención: 317,5 ml
18. Alcantarillas de 36 pulg: 9 und
19. Defensas Metálicas: 124 ml

CUNETAS:



LOCALIZACIÓN ALINEAMIENTO 1 CAPAS ESQUEMÁTICO		LARGO	OBSERVACIÓN
[illegible]	[illegible]	22.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	11.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	72.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	120.00	Cuneta en Muro
[illegible]	[illegible]	80.00	Cuneta en Muro
[illegible]	[illegible]	77.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	7.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	88.00	Bordillo 35x45 cm
[illegible]	[illegible]	13.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	72.00	Bordillo 35x45 cm
[illegible]	[illegible]	160.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	90.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	71.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	203.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	90.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	16.00	Bordillo 35x45 cm
[illegible]	[illegible]	10.00	Bordillo 35x45 cm
[illegible]	[illegible]	11.00	Bordillo 35x45 cm
[illegible]	[illegible]	48.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	13.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	116.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	17.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	14.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	8.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	5.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	46.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	5.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	37.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	96.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	11.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	105.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	90.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	36.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	18.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	24.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	30.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	74.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	80.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	91.00	Bordillo 35x45 cm
[illegible]	[illegible]	37.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	5.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	14.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	9.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	72.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	12.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	47.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	28.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	3.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	4.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	4.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	79.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	8.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	16.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	70.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	11.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	67.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	13.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	77.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	6.00	Bordillo 35x45 cm
[illegible]	[illegible]	15.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	5.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	159.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	13.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	19.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	131.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	97.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	58.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	77.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	11.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	50.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	131.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	30.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	7.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	38.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	99.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	17.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	92.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	38.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	95.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	30.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	13.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	64.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	30.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	27.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	39.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	43.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	119.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	203.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	14.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	5.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	12.00	Cuneta con Bordillo
[illegible]	[illegible]	77.00	Cuneta con Bordillo
		4474.00	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO ORIENTAL AMPLIACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CODIGO	[illegible]
VERSION	1
FECHA	


CARRIL DERECHO			
K0+000	K0+005	5,00	Cuneta con Bordillo
K0+005	K0+107	102,00	Derivation 30x15 cm
K0+107	K0+148	41,00	Cuneta con Bordillo
K0+148	K0+170	4,00	Cuneta con Bordillo
K0+170	K0+180	11,00	Cuneta en Muro
K0+271	K0+345	74,00	Cuneta en Muro
K0+345	K0+384	39,00	Cuneta con Bordillo
K0+384	K0+510	126,00	Derivation 30x15 cm
K0+510	K0+520	10,00	Cuneta con Bordillo
K0+520	K0+540	20,00	Cuneta con Bordillo
K0+540	K0+740	200,00	Cuneta con Bordillo
K0+741	K0+741	67,00	Cuneta con Bordillo
K0+741	K1+074	74,00	Cuneta con Bordillo
K1+074	K1+170	96,00	Cuneta con Bordillo
K1+170	K1+480	187,00	Cuneta con Bordillo
K1+480	K1+494	8,00	Cuneta con Bordillo
K1+494	K1+560	64,00	Cuneta con Bordillo
K1+560	K1+594	34,00	Cuneta con Bordillo
K1+594	K1+700	76,00	Cuneta con Bordillo
K1+700	K2+134	294,00	Cuneta con Bordillo
K2+134	K2+440	267,00	Cuneta con Bordillo
K2+440	K2+470	12,00	Cuneta con Bordillo
K2+470	K2+520	51,00	Cuneta con Bordillo
K2+520	K2+600	130,00	Cuneta con Bordillo
K2+600	K2+634	34,00	Cuneta con Bordillo
K2+634	K2+670	136,00	Derivation 30x15 cm
K2+670	K2+720	50,00	Cuneta con Bordillo
K2+720	K2+730	38,00	Cuneta con Bordillo
K2+730	K2+748	18,00	Cuneta con Bordillo
K2+748	K2+762	14,00	Cuneta con Bordillo
K2+762	K2+819	20,00	Cuneta con Bordillo
K2+819	K2+858	34,00	Cuneta con Bordillo
K2+858	K2+944	5,00	Cuneta con Bordillo
K2+944	K3+019	49,00	Cuneta con Bordillo
K3+019	K3+059	53,00	Cuneta con Bordillo
K3+059	K3+108	4,00	Cuneta con Bordillo
K3+108	K3+156	37,00	Cuneta con Bordillo
K3+156	K3+161	3,00	Cuneta con Bordillo
K3+161	K3+182	21,00	Cuneta con Bordillo
K3+182	K3+187	3,00	Cuneta con Bordillo
K3+187	K3+206	19,00	Cuneta con Bordillo
K3+206	K3+220	4,00	Cuneta con Bordillo
K3+220	K3+241	1,00	Cuneta con Bordillo
K3+241	K3+345	25,00	Cuneta con Bordillo
K3+345	K3+355	30,00	Cuneta con Bordillo
K3+355	K3+445	70,00	Cuneta con Bordillo
K3+445	K3+591	2,00	Cuneta con Bordillo

K3+591	K3+634	15,00	Cuneta con Bordillo
K3+717	K3+839	10,00	Cuneta con Bordillo
K3+839	K3+900	1,00	Cuneta con Bordillo
K3+900	K3+915	14,00	Cuneta con Bordillo
K3+920	K3+938	8,00	Cuneta con Bordillo
K3+938	K3+989	10,00	Cuneta con Bordillo
K3+989	K3+995	6,00	Cuneta con Bordillo
K3+780	K3+880	100,00	Cuneta con Bordillo
K4+017	K4+024	5,00	Cuneta con Bordillo
K4+024	K4+081	57,00	Cuneta con Bordillo
K4+081	K4+116	15,00	Cuneta con Bordillo
K4+116	K4+160	44,00	Cuneta con Bordillo
K4+174	K4+197	23,00	Cuneta con Bordillo
K4+197	K4+237	30,00	Cuneta con Bordillo
K4+237	K4+268	12,00	Cuneta con Bordillo
K4+268	K4+291	48,00	Cuneta con Bordillo
K4+300	K4+380	80,00	Cuneta con Bordillo
K4+380	K4+447	47,00	Cuneta con Bordillo
K4+447	K4+460	8,00	Cuneta con Bordillo
K4+460	K4+480	2,00	Cuneta con Bordillo
K4+480	K4+720	79,00	Cuneta con Bordillo
K4+720	K4+730	8,00	Cuneta con Bordillo
K4+730	K4+777	45,00	Cuneta con Bordillo
K4+777	K4+860	80,00	Cuneta con Bordillo
K4+864	K4+891	25,00	Cuneta con Bordillo
K4+897	K4+930	41,00	Cuneta con Bordillo
K4+930	K4+938	6,00	Cuneta con Bordillo
K4+938	K4+991	53,00	Cuneta con Bordillo
K5+248	K5+417	21,00	Derivation 30x15 cm
K5+535	K5+617	9,00	Cuneta con Bordillo
K5+619	K5+679	42,00	Cuneta con Bordillo
K5+679	K5+704	26,00	Cuneta con Bordillo
K5+704	K5+728	24,00	Cuneta con Bordillo
K5+728	K5+768	38,00	Cuneta con Bordillo
K5+784	K5+797	43,00	Cuneta con Bordillo
K5+797	K5+824	26,00	Cuneta con Bordillo
K5+824	K5+850	26,00	Cuneta con Bordillo
K5+850	K5+870	27,00	Cuneta con Bordillo
K5+870	K5+892	22,00	Cuneta con Bordillo
K5+892	K5+899	9,00	Cuneta con Bordillo
K5+899	K5+926	27,00	Cuneta con Bordillo
K5+926	K5+976	50,00	Cuneta con Bordillo
K5+976	K6+054	104,00	Cuneta con Bordillo
K6+737	K6+744	37,00	Derivation 30x15 cm
K6+787	K7+040	50,00	Cuneta con Bordillo
K7+144	K7+260	46,00	Cuneta con Bordillo
TOTAL LARGO DE CUNETAS		4452,00	

PAVIMENTO FLEXIBLE MDC-19

SECCION TIPICA DE DISEÑO

TRAMO EL ANCLAR		LARGO
K0+000	K7+300	7300,00
		7300,00



ALCANTARILLAS DE 36 PULGADAS

TRAMO EL ANCLAR		LARGO
1	K1+005	7,00
2	K1+148	7,00
3	K1+385	7,00
4	K2+085	7,00
5	K2+581	7,00
6	K4+290	7,00
7	K4+980	7,00
8	K5+446	7,00
9	K6+586	7,00

SOX CULVERT

	TRAMO EL ANCLAR		LARGO
1	K0+550	(2X1)	6,50
2	K0+944	(1X1)	6,50
3	K1+123	(2X1)	6,50
4	K2+470	(1X1)	6,50
5	K3+605	(2X1)	6,50
6	K3+410	(2X1)	6,50
7	K3+355	(2X1)	6,50
8	K3+965	(2X1)	6,50

MUROS DE CONTENCION

TRAMO EL ANCLAR			LARGO
K0+100	K0+230	LI	130,00
K0+189	K0+230	LD	41,00
K0+268	K0+348	LI	80,00
K0+268	K0+345	LD	77,32
			317,32

194

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE SUPERVISIÓN Y/O GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSPI-M01-01-10-FR-2
		VERSIÓN	1
		FECHA	

SEÑALES VERTICALES

TRAMO EL ANCLAR	
SP-01	4
SP-02	7
SP-03	7
SP-04	7
SP-05	10
SP-06	1
SP-07	10
SP-08	5
SP-09	7
SP-09A	4
SP-09A	2
SP-07B	5
SI-04	6
SR-30 (Vel. 30)	7
SR-30 (Vel. 30)	10
SR-06	10

DEFENSAS METÁLICAS

TRAMO EL ANCLAR		LONGITUD
K1+000	C. Izquierdo	14,00
K1+000	C. Derecho	14,00
K1+820	C. Derecho	24,00
K3+930	C. Izquierdo	20,00
K3+990	C. Derecho	20,00
K4+150	C. Izquierdo	26,00
	total	134,00

RELACIÓN DE ACTAS PARCIALES Y/O ADICIONALES (Indicar FPC):

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, cantidad y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor Inicial ejecutado del contrato: $ 29.651.308.812,00
Valor FPC: $ 12.648.490,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 30.534.849.402,00

AIU: (A) ____ % A: (I) ____ % I: ____ % U: ____ %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y diligenciar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica ajustada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
I	EXCAVACIONES				
1	Excavación en material común de la explanación y cauces	m3	34491,4	$ 12,129	$ 368.150.067
2	Terraplenes	m3	35691,80	$ 27.843	$ 705.699.192
	SUBTOTAL				$ 1.068.870.089
II	ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA LONGITUD SEGÚN DISEÑO				
	ALCANTARILLAS CONCILLA TUBERÍA CONCRETO REFORZADO (RCP)				
3	Excavación en material común en cualquier cantidad en seco o mojado.	m3	622,0000	$ 35.816,38	$ 22.120.095,09
4	Disposición de excavación	m3	15,0000	$ 344.216,38	$ 5.163.323,64
5	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	m	88,0000	$ 832.368,38	$ 78.834.224,68
6	Concreto clase F (140 kg/cm2 a 2800 PSI)	m3	15,0100	$ 622.121,38	$ 34.680.447,08
7	Concreto clase D (210 kg/cm2 a 3000 PSI)	m3	91,3800	$ 760.802,38	$ 83.834.804,09
8	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	4946,4000	$ 6.463,38	$ 30.830.804,09
9	Rellenos para Estructuras con recebo	m3	492,8100	$ 191.804,38	$ 95.442.317,08
	SUBTOTAL				$ 357.787.836,083
III	ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT LONGITUD 6M				
	BOX CULVERT 3,5X3,5				
10	Excavaciones varias en material común en seco o mojado.	m3	834,89	$ 35.816	$ 29.716.147
11	Demolición de estructuras	m3	0	$ 288.336	$ -
12	Concreto clase F (140 kg/cm2 a 2800 PSI)	m3	24,00	$ 622,121	$ 16.691.168
13	Concreto clase D (210 kg/cm2 a 3000 PSI)	m3	108,53	$ 767.483	$ 133.199.383
14	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	19091,74	$ 6.463	$ 126.468.854
15	Rellenos con Estructuras con recebo	m3	467,13	$ 191.804	$ 97.850.078
	SUBTOTAL				$ 406.749.606
IV	PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO ANCHO DE CALZADA 6M				
	METROS DE PAVIMENTO ASFALTICO				
16	Base Granular Clase C	m3	9868,54	$ 279.884	$ 1.668.336.331
17	Subbase Granular Clase B	m3	7644,23	$ 263.430	$ 2.003.319.894
18	Afirmado (Material para mejoramiento)	m3	3651,73	$ 179.960	$ 473.078.814
19	SUBRASANTE MEJORAMIENTO CON CAL (INCLUYE SUMINISTRO DE CAL)	m2	0	$ 123.004	$ -
20	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRS-2	m2	37641,08	$ 4.927	$ 183.778.290
21	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	3600,33	$ 1.266.827	$ 3.981.648.339
22	Concreto clase D (210 kg/cm2 a 3000 PSI) - CUNETAS	m3	1280,27	$ 767.483	$ 1.000.197.309
23	Acero de refuerzo de FY = 4200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	61648,1	$ 6.463	$ 398.390.603
	SUBTOTAL				$ 9.809.309.559,00
V	MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES				
	MURO EN GAVIONES				
24	Excavaciones varias en material común, en seco o mojado	m3	0	$ 35.816	$ -
25	Concreto clase F (140 kg/cm2 a 2800 PSI)	m3	0	$ 622.121	$ -
26	Gavión de Malla de Alambre de Acero Galvanizado Clase 4 recubierto de aleación Zn-Al-MM y PVC	m3	0	$ 263.883	$ -
27	Geotextil Tipo NT 3500 o similar no tejido	m2	0	$ 5.456	$ -
	SUBTOTAL				$ -

195

	INVERSO NACIONAL DE VIAS PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA			CODIGO		
				REVISIÓN		
				PAGINA		
VII	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO ANCHO EN CALZADA 6M					
	METROS DE PAVIMENTO HIDRAULICO					
26	Subbase Granular Clase C.	m3	8949,77	$ 203.436	$	744.097.000,00
26'	Afirmado (Material para mejoramiento)	m3	3259,04	$ 178.349	$	402.517.047,00
30	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	m3	3201,17	$ 626.218	$	2.004.660.992,00
31	Concreto clase D (210 kg/cm2 a 3000 PSI) - CUNETAS	m3	1991,49	$ 501.403	$	837.911.046,00
32	Acero de refuerzo de FY = 4.200 kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	841174,01	$ 6.883	$	738.189.416,00
	SUBTOTAL				$	8.788.972.826,00
VIII	MUROS EN CONCRETO REFORZADO					
	MURO EN CONCRETO REFORZADO MODELO DISEÑO					
33	Excavaciones varias en material comun en seco o humo.	m3	1132,42	$ 56.315	$	174.297.240,00
34	Concreto clase F (140 kg/cm2 A 2000 PSI)	m3	90,89	$ 620.121	$	56.791.072,00
35	Concreto clase D (210 kg/cm2 a 3000 PSI)(MURO)	m3	910,62	$ 826.236	$	724.619.832,00
36	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	202182,57	$ 6.803	$	826.282.704,00
37	Rellenos para Estructuras con recebo	m3	2758,35	$ 181.554	$	500.917.145,00
	SUBTOTAL				$	3.344.219.040,00
VIII	TRANSPORTE					
38	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidas a partir de dos metros (100 m).	m3/km	994124/7,12	$ 1.002	$	6.557.948.599,00
	SUBTOTAL				$	6.557.948.599,00
IX	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL					
	DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL					
39	Señal Vertical de Tránsito tipo I con lámina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	172	$ 583.166	$	96.859.563,00
40	Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	m	31026,42	$ 2.852	$	88.760.971,00
41	Tachas Reflectivas.	und	3856,00	$ 6.845	$	26.316.464,00
42(1)	Defensa Metálica	m	158	$ 327.456	$	76.119.408,00
	SUBTOTAL				$	279.867.404,00
X	CARACTERIZACION VIAL					
43	Caracterización del corredor	km	39	$ 765.385	$	14.606.865,00
	SUBTOTAL				$	14.606.865,00
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS				$	29.170.616.917,00
	COSTOS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIA				$	-
	REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS				$	71.792.972,00
	XIX - REVISION Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION ESTUDIOS Y DISEÑOS				$	13.649.489,00
	REVISION Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION ESTUDIOS Y DISEÑOS				$	85.442.461,00
	Ajuste al cien				$	1
	VALOR TOTAL EJECUTADO				$	29.084.949.462,00

* Todos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada pla modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ 15.794.979.576,00
Valor total amortizado: $ 15.794.979.576,00
Saldo por amortizar $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ 15.794.979.576,00
Valor total legalizado: $ 15.794.979.576,00
Saldo por legalizar $ -

CERTIFICACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ene-23	$ 10.690.914.814	$ 11.840.488	$ 10.838.555.694						
2	dic-23	$ 5.380.650.870	$ -	$ 5.236.619.992						
3	mar-24	$ 2.344.437.984	$ -	$ 2.344.437.984						
4	jul-24	$ 2.823.497.785	$ -	$ 2.823.497.785						
5	feb-25	$ 3.424.197.487	$ -	$ 3.424.197.487						
6	sep-25	$ 2.489.847.380	$ -	$ 2.489.847.380						
7	jun-26	$ 2.587.492.780	$ -	$ 2.587.492.780						
N... actas	7									
TOTALES		$ 36.691.385.613	$ 11.840.488	$ 36.934.646.692						
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: $ 36.691.385.613
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: $ 11.840.488
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 36.934.646.692

El interventor y el contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de Información Financiera SIF-ANSUR.

195

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPS-MIN1-IN-10-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La Interventoría deja constancia que las obras ejecutadas **cumplen con** los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones establecidos para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la Interventoría debe constatar que los ajustes y actualización de los planos record elaborados y entregados por el Constructor.

El contratista de obras CONSORCIO SAN DIEGO, no ha presentado a la Interventoría CONSORCIO VIAL NACIONAL, los planos record del proyecto para revisión y aprobación.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Los entregables del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son revisados y aprobados por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los lineamientos y formatos:

- MEPS-MIN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MEPS-MIN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MEPS-MIN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MEPS-MIN1-IN-9 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MEPS-MIN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MEPS-MIN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MEPS-MIN1-IN-3-FR-8 Pre-acta Mensual de Inversión Social – Seguimiento Físico a la Inversión Social del Proyecto.
- MEPS-MIN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MEPS-MIN1-IN-9-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

El contratista de obras no ha presentado los informes finales de la gestión socio-ambiental del proyecto para revisión y aprobación de la Interventoría.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe coordinar el cumplimiento por parte del Contratista de obra ambientales que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

La póliza contractual se encuentra debidamente actualizada y aprobada por el Municipio de Montelíbano

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la estabilidad de las valores registrados en los Registros escritos, así como, por las operaciones efectuadas en los mismos, para no eximirse el Contratista ni el Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato, en consecuencia el cierre del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, no previenen fallas imputables a la calidad de la obra, el mismo debe exigir al contratista, las reparaciones del caso y en un defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervinieron.

Firma
Nombre: Luis Alejandro Manrique Olivo
Representante legal
Contratista
CC No. 12.317.938 de Montelíbano

Firma
Nombre: Luis Alejandro Izquierdo Angel
Ingeniero Director
Contratista
Matrícula Profesional No. 220021788HD CORI

Firma
Nombre: Hernán Rodríguez Ruiz
Director del Interventoría
Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-66020 CPL

Firma
Nombre: Luis Eduardo Paz Silva
Ingeniero Auxiliar
Interventoría
Matrícula Profesional No. 68101-65607CB CORI

Firma
Nombre: Rodolfo Torres Ortiz
Supervisor Contrato de Obra
Municipio de Montelíbano
CC No 78.1191.156

Original: Archivo de Gestión del Proyecto.
Copia: Director Técnico, Contratista, Interventoría y Dirección Territorial

CONSORCIO SAN DIEGO

Certificado De Cumplimiento Interventoría

Email: consoriciosandiego@gmail.com

198

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-MM-006-202 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE LA VIA MONTELIBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR".

CERTIFICA QUE

Las obras ejecutadas por el CONSORCIO SAN DIEGO, identificado con NIT.901.603.485-5, representado legalmente por el señor LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO identificado con CC. 73.215.196 presenta un avance ejecutado en el **ACTA FINAL** del **100.00%**, con fecha de corte del 1 de junio 2025 al 30 de junio de 2025, bajo los parámetros técnicos de especificaciones y calidad, por lo que esta interventoria recibe a satisfacción la obra del porcentaje indicado al inicio.

Asi mismo, con la inclusión del ACTA FINAL, el contrato registra un avance financiero acumulado del 99,51%, liberando recursos por valor de $132.477.948,20, equivalentes al 0,4907% restante del valor total del contrato.

Para constancia se firma en Montelibano, a los treinta (30) días del mes de junio del año 2025.

JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoria
CONSORCIO VIAL NACIONAL

CONSORCIO SAN DIEGO

- Certificado Parafiscales
- Planilla Seguridad Social.
- Certificado de aportes – ICBF
- Certificado de aportes – SENA
- Certificado de aportes – CCF

200

Email: consorciosandiego@gmail.com

CONSORCIO SAN DIEGO

Montería, 01 de agosto de 2025

Ing.
CONSORCIO VIAL NACIONAL
INTERVENTORIA DE OBRA
Atn: Ing. Juan Eliecer Villalobos
Director de interventoría

Ref: LP-MM-006-2022 **Cuyo Objeto es:** "CONSTRUCCION VIA MONTELIBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR".

Estimados señores del Consorcio Vial Nacional,

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y la Ley 828 de 2003, bajo la gravedad de juramento:

Yo, LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.215.196, expedida en Cartagena, actuando en calidad de Representante Legal de CONSORCIO SAN DIEGO:

CERTIFICO:

Que, en el periodo de 01 de junio 2025 a 30 de junio de 2025, **CONSORCIO SAN DIEGO** identificado con el NIT 901.603.485-5 ha dado cumplimiento completo al pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social para el contrato en referencia, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar.

Cordialmente,

LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EL ANCLAR.

JAVIER CASTILLO CASTAÑO
Contador publico
C.C.: 10.930.589 de Montería.
T.P. No.: 131873-T
