Por favor relacionar este número al responder
Radicado GENSA SAESP No 2025-IE-00002452
Fecha: 20-11-2025

100

Manizales,

Ingeniero
MUNIR ALBERTO MONTEDEOCA ATENCIO
Supervisor del Contrato Interadministrativo 178-2025
IPSE
Calle 99 No 9A-54 Piso 14 Edificio 100 Street
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud de Prórroga Contrato Interadministrativo 178-2025

Cordial saludo

1. ANTECEDENTES

El IPSE y GENSA S.A. ESP., suscribieron el Contrato interadministrativo IPSE No. 178-2025 el 20 de mayo de 2025, cuyo objeto es "REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL".

ACTA DE INICIO: 29 de julio de 2025

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2025

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($36.514.588.147) M/CTE.

ENCARGO FIDUCIARIO: Se suscribió el contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos con la Fiduciaria Davivienda el 10 de julio de 2025.

ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Etapa 1 – Actividades previas a la contratación:

i. Suscripción del contrato de encargo fiduciario: Se suscribió el contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos con la Fiduciaria Davivienda el 10 de julio de 2025.
ii. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad: Se realizó el trámite presupuestal al interior de GENSA para la incorporación de los recursos.

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001

iii. Plan de trabajo que incluya objetivos, metas, actividades, responsables y cronograma: Remitido al IPSE el 06 de octubre de 2025.
iv. Revisión, aceptación y apropiación de diseños: Actividad cumplida.
v. Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato: Actividad cumplida.
vi. Elaboración de pliegos de condiciones, términos de referencia o equivalentes: Actividad cumplida.

Las actividades de la Etapa I se encuentran cumplidas por parte de GENSA al 100%.

Etapa 2 – Actividades de subcontratación:

i. Publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, según corresponda.
ii. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.
iii. Firma de contratos y suscripción de Actas de inicio.
iv. Validar, aprobar y presentar al IPSE el análisis de riesgos
v. Diagnóstico de las condiciones de base del proyecto en las dimensiones ambiental, social y predial.
vi. Deberá remitirse el cronograma de su contratista, donde además de los recursos y tiempo de ejecución se indique también los centros de acopio de obra, aprobado por la interventoría y avalado por GENSA S.A. E.S.P. a la supervisión del IPSE.

En desarrollo de la Etapa 2 – Actividades de Contratación, GENSA adelantó las siguientes convocatorias:

- El 06 de agosto de 2025 se publicó la solicitud privada de ofertas **SPO-124-GENSA-2025,** con el objeto de contratar la *"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA".*


124-2025
Fecha publicación:06-08-2025
Fecha inicio:06-08-2025
Plazo:10
Cuantia:$2.871.165.748
Número convocatoria:124-2025
Objeto:IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LA PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.
Clave de descarga:
Descargar pliego

- (06-08-2025) ANEXO 3
- (06-08-2025) ESPECIFICACIONES TECNICAS
- (13-08-2025) RESPUESTA OBSERVACIONES
- (28-08-2025) Declaratoria desierta

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001

Una vez finalizado el plazo para la recepción de ofertas se realizó el cierre del proceso dentro del cual se presentaron dos (2) ofertas. Durante el proceso de evaluación se descartaron ambas propuestas por no cumplir con los requerimientos jurídicos y financieros de la solicitud de ofertas, por lo tanto, se declaró desierto el proceso.

- El 06 de agosto de 2025 se publicó la solicitud privada de ofertas **SPO-130-GENSA-2025,** con el objeto de contratar la *"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTON DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, Y EL MUNICIPIO DE LA URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL META".*

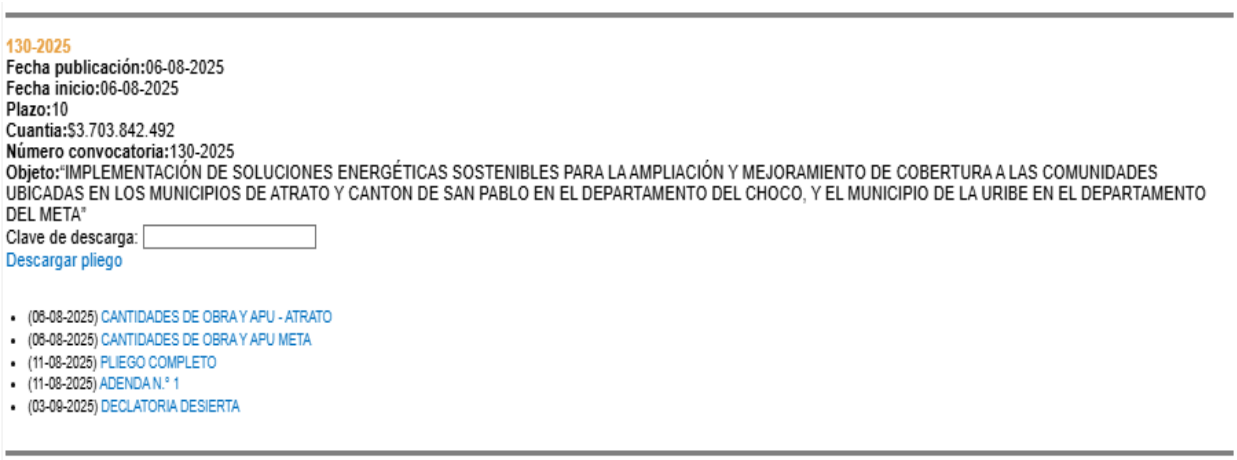

130-2025
Fecha publicación:06-08-2025
Fecha inicio:06-08-2025
Plazo:10
Cuantia:$3.703.842.492
Número convocatoria:130-2025
Objeto:"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTON DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, Y EL MUNICIPIO DE LA URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
Clave de descarga:
Descargar pliego

- (06-08-2025) CANTIDADES DE OBRA Y APU - ATRATO
- (06-08-2025) CANTIDADES DE OBRA Y APU META
- (11-08-2025) PLIEGO COMPLETO
- (11-08-2025) ADENDA N.° 1
- (03-09-2025) DECLATORIA DESIERTA

Una vez finalizado el plazo para la recepción de ofertas se realizó el cierre del proceso dentro del cual se presentaron dos (2) ofertas. Durante el proceso de evaluación se descartaron ambas propuestas por no cumplir con los requerimientos jurídicos y técnicos de la solicitud de ofertas, por lo tanto, se declaró desierto el proceso.

- El 04 de septiembre de 2025 se publicó la solicitud privada de ofertas **SPO-148-GENSA-2025,** con el objeto de *"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES - GUAVIARE, HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO - CASANARE".*

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001

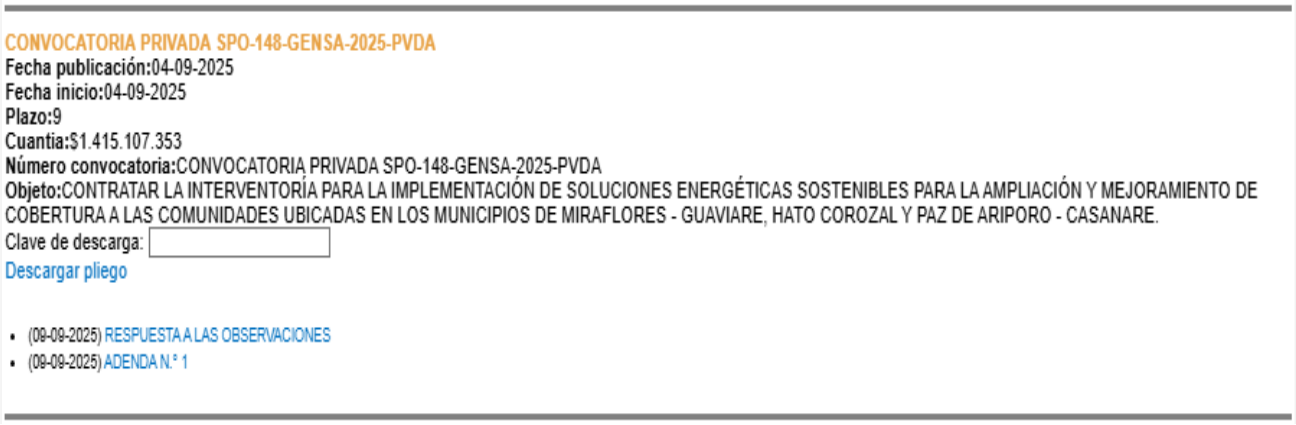


CONVOCATORIA PRIVADA SPO-148-GENSA-2025-PVDA
Fecha publicación:04-09-2025
Fecha inicio:04-09-2025
Plazo:9
Cuantia:$1.415.107.353
Número convocatoria:CONVOCATORIA PRIVADA SPO-148-GENSA-2025-PVDA
Objeto:CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES - GUAVIARE, HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO - CASANARE.
Clave de descarga:
Descargar pliego

- (09-09-2025) RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
- (09-09-2025) ADENDA N.° 1

Como resultado de este proceso, el 07 de octubre de 2025 se suscribió el Contrato 140-13.05-0177-2025 entre GENSA y la firma SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S. – SECOB S.A.S.

El Contrato cuenta con acta de inicio del 24 de octubre de 2025.

- El 05 de septiembre de 2025 se publicó la solicitud privada de ofertas **SPO-200-GENSA-2025,** con el objeto de *"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTÓN DE SAN PABLO EN CHOCÓ, Y, LA URIBE - META".*

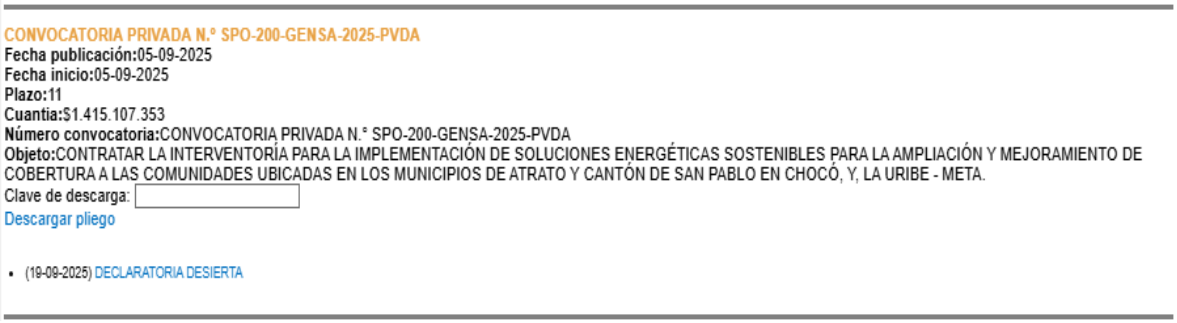


CONVOCATORIA PRIVADA N.° SPO-200-GENSA-2025-PVDA
Fecha publicación:05-09-2025
Fecha inicio:05-09-2025
Plazo:11
Cuantia:$1.415.107.353
Número convocatoria:CONVOCATORIA PRIVADA N.° SPO-200-GENSA-2025-PVDA
Objeto:CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTÓN DE SAN PABLO EN CHOCÓ, Y, LA URIBE - META.
Clave de descarga:
Descargar pliego

- (19-09-2025) DECLARATORIA DESIERTA

Una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas no se recibió ninguna propuesta por lo que este proceso fue declarado desierto.

- El 05 de septiembre de 2025 se publicó la solicitud privada de ofertas **SPO-219-GENSA-2025,** con el objeto de contratar la *"INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LA PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA".*


Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001

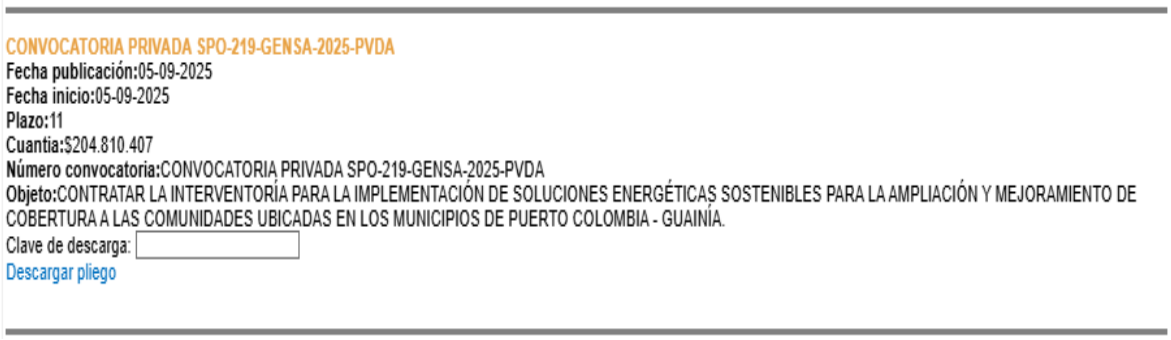
CONVOCATORIA PRIVADA SPO-219-GENSA-2025-PVDA
Fecha publicación:05-09-2025
Fecha inicio:05-09-2025
Plazo:11
Cuantia:$204.810.407
Número convocatoria:CONVOCATORIA PRIVADA SPO-219-GENSA-2025-PVDA
Objeto:CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA - GUAINÍA.
Clave de descarga:
Descargar pliego

Como resultado de este proceso, el 07 de octubre de 2025 se suscribió el Contrato 140-13.05-0178-2025 entre GENSA y la firma ORGANIZACIÓN ACREDITADORA DE PROYECTOS S.A.S. – OCAP S.A.S.

El Contrato cuenta con acta de inicio del 23 de octubre de 2025.

- El 16 de septiembre de 2025 se publicó la solicitud privada de ofertas **SPO-235-GENSA-2025,** con el objeto de contratar la *"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LA PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA".*

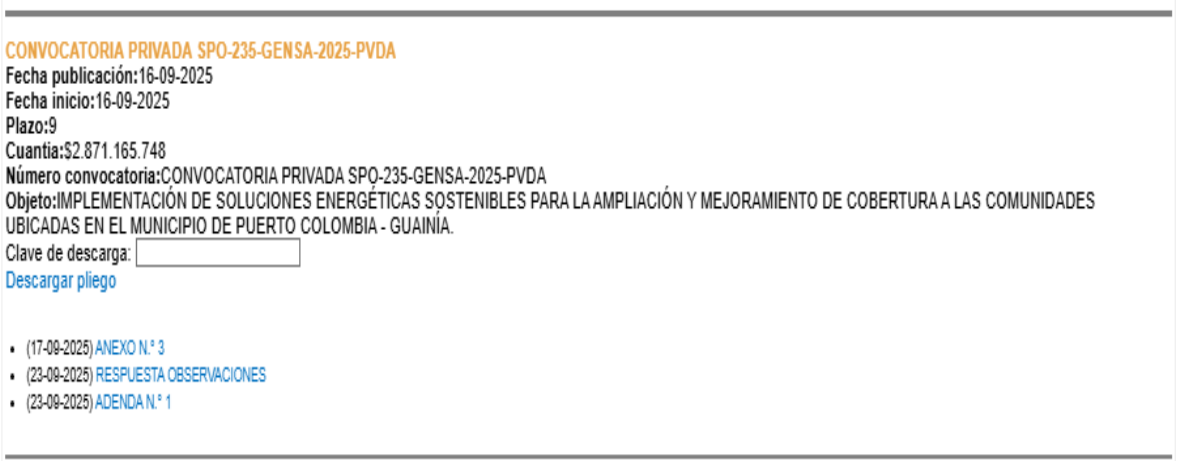
CONVOCATORIA PRIVADA SPO-235-GENSA-2025-PVDA
Fecha publicación:16-09-2025
Fecha inicio:16-09-2025
Plazo:9
Cuantia:$2.871.165.748
Número convocatoria:CONVOCATORIA PRIVADA SPO-235-GENSA-2025-PVDA
Objeto:IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - GUAINÍA.
Clave de descarga:
Descargar pliego

- (17-09-2025) ANEXO N.° 3
- (23-09-2025) RESPUESTA OBSERVACIONES
- (23-09-2025) ADENDA N.° 1

Como resultado de este proceso, el 06 de noviembre de 2025 se suscribió el Contrato 140-13.06-0139-2025 entre GENSA y la firma CONSORCIO GUAINÍA SOLAR AREEM & HILL.

- El 22 de septiembre de 2025 se publicó la solicitud pública de ofertas **SPO-141-GENSA-2025,** con el objeto de contratar la *"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES - GUAVIARE, HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO - CASANARE".*

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001

CONVOCATORIA PÚBLICA SPO-141-GENSA-2025
Fecha publicación:22-09-2025
Fecha inicio:22-09-2025
Plazo:24
Número convocatoria:CONVOCATORIA PÚBLICA SPO-141-GENSA-2025
Objeto:IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO Y HATO COROZAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE, Y EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.
Descargar pliego

- (22-09-2025) ANEXO N.° 3
- (02-10-2025) RESPUESTA OBSERVACIONES
- (02-10-2025) ADENDA N.° 1
- (02-10-2025) ANEXO N.° 3 FORMATO EDITABLE
- (16-10-2025) INFORME DE EVALUACION

Como resultado de este proceso, el 22 de octubre de 2025 se suscribió el Contrato 140-13.06-0209-2025 entre GENSA y la firma HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

- En razón a que la solicitud privada de ofertas SPO-130-GENSA-2025 se declaró desierta, el 25 de septiembre de 2025 GENSA remitió la solicitud única de oferta **SUO-261-GENSA-2025,** con el objeto de contratar la *"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTON DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, Y EL MUNICIPIO DE LA URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL META".*

Invitacion a ofertar SUO-261-GENSA-2025 External Recibidos x

Resumir este correo

IntraGensa <intragensa@gensa.com.co> jue, 25 sept, 15:51
para corp.ecoprojects, julio.arce, mi, manuela.pelaez, andrea.gomez

Parece que este mensaje está en inglés X
Traducir al español

Caution! This message was sent from outside your organization.

IntraGensa

Señores
CORPORACIÓN ECOPROJECTS
CALI
Tel: 3117003370
corp.ecoprojects@gmail.com

Asunto: Invitación a ofertar SUO-261-GENSA-2025

Respetuosamente se informa que GENSA S.A. E.S.P., ha considerado invitarlo a participar en la Solicitud Única de Ofertas, cuyo objeto es: la IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTÓN DE SAN PABLO (CHOCÓ), Y LA URIBE (META), y cuyo documento de CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN encontrará adjunto al presente correo electrónico.

Cualquier actuación en el marco de la convocatoria deberá ser realizada a la luz del cronograma establecido en el documento adjunto.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO MONTES HURTADO
Primer Suplente del Presidente
GENSA S.A. E.S.P.

Esta mensaje no contiene caracteres internacionales, simbolos ni acentos con el fin de evitar posibles problemas de visualizacion en distintas configuraciones de correo electronico.

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail




CONDICION ESPE...

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001

Como resultado de este proceso, el 24 de octubre de 2025 se suscribió el Contrato 140-13.06-0214-2025 entre GENSA y la firma CORPORACIÓN ECOPROJECTS.

- En razón a que la solicitud privada de ofertas SPO-200-GENSA-2025 se declaró desierta, el 02 de octubre de 2025 GENSA remitió la solicitud única de oferta **SUO-267-GENSA-2025,** con el objeto de contratar la *"LA INTERVENTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTON DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, Y EL MUNICIPIO DE LA URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL META".*

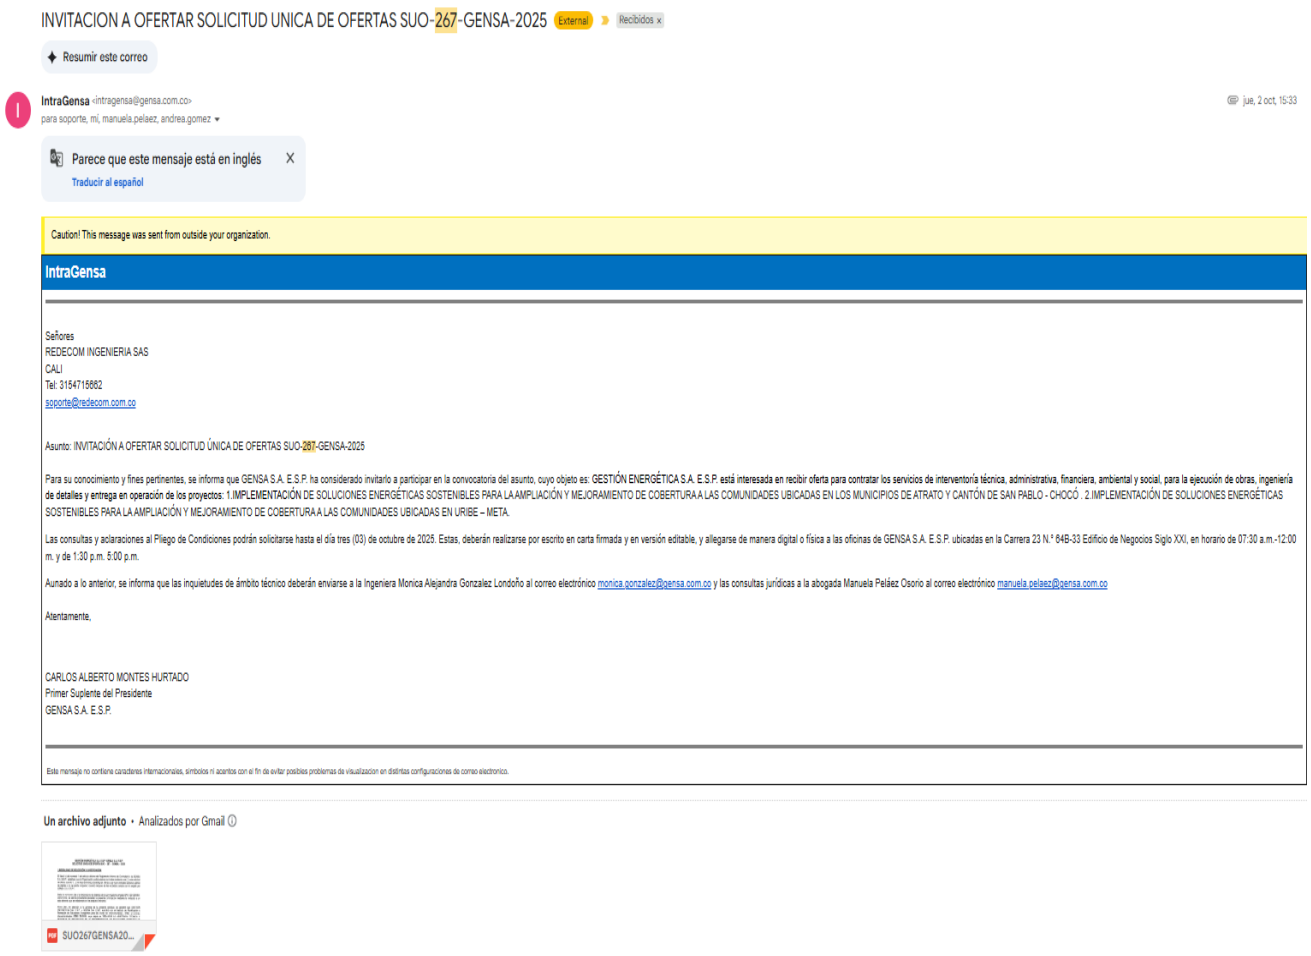

INVITACION A OFERTAR SOLICITUD UNICA DE OFERTAS SUO-267-GENSA-2025 External Recibidos x

Resumir este correo

IntraGensa <intragensa@gensa.com.co> jue, 2 oct, 15:33
para soporte, mi, manuela.pelaez, andrea.gomez

Parece que este mensaje está en inglés X
Traducir al español

Caution! This message was sent from outside your organization.

IntraGensa

Señores
REDECOM INGENIERIA SAS
CALI
Tel: 3154715662
soporte@redecom.com.co

Asunto: INVITACIÓN A OFERTAR SOLICITUD ÚNICA DE OFERTAS SUO-267-GENSA-2025

Para su conocimiento y fines pertinentes, se informa que GENSA S.A. E.S.P. ha considerado invitarlo a participar en la convocatoria del asunto, cuyo objeto es: GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. está interesada en recibir oferta para contratar los servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social, para la ejecución de obras, ingeniería de detalles y entrega en operación de los proyectos: 1.IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ . 2.IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN URIBE – META.

Las consultas y aclaraciones al Pliego de Condiciones podrán solicitarse hasta el día tres (03) de octubre de 2025. Estas, deberán realizarse por escrito en carta firmada y en versión editable, y allegarse de manera digital o física a las oficinas de GENSA S.A. E.S.P. ubicadas en la Carrera 23 N.° 64B-33 Edificio de Negocios Siglo XXI, en horario de 07:30 a.m.-12:00 m. y de 1:30 p.m. 5:00 p.m.

Aunado a lo anterior, se informa que las inquietudes de ámbito técnico deberán enviarse a la Ingeniera Monica Alejandra Gonzalez Londoño al correo electrónico monica.gonzalez@gensa.com.co y las consultas jurídicas a la abogada Manuela Peláez Osorio al correo electrónico manuela.pelaez@gensa.com.co

Atentamente,

CARLOS ALBERTO MONTES HURTADO
Primer Suplente del Presidente
GENSA S.A. E.S.P.

Este mensaje no contiene caracteres internacionales, símbolos ni acentos con el fin de evitar posibles problemas de visualizacion en distintas configuraciones de correo electronico.

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail

SUO267GENSA20...

Como resultado de este proceso, el 28 de octubre de 2025 se suscribió el Contrato 140-13.05-0220-2025 entre GENSA y la firma REDECOM INGENIERÍA S.A.S.

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001

RESUMEN DE CONTRATOS SUSCRITOS A LA FECHA:

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA
140-13.06-0214-2025	Contratar la "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTON DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, Y EL MUNICIPIO DE LA URIBE EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	CORPORACIÓN ECOPROJECTS
140-13.05-0220-2025	Servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social, para la ejecución de obras, ingeniería de detalles y entrega en operación de los siguientes proyectos: 1. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO Y CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ. 2. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN URIBE – META.	REDECOM INGENIERÍA S.A.S.
140-13.06-0209-2025	Contratar la "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES - GUAVIARE, HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO - CASANARE".	HG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
140-13.05-0177-2025	Contratar los servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social, para la ejecución de obras, ingeniería de detalles y entrega en operación de los siguientes proyectos: 1. Implementación de soluciones energéticas sostenibles para la ampliación y mejoramiento de cobertura a las comunidades ubicadas en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo – Casanare y, 2.Implementación de soluciones energéticas sostenibles para la ampliación y mejoramiento de cobertura a las comunidades ubicadas en Miraflores – Guaviare.	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S. SECOB S.A.S. NIT 900.115.339-0
140-13.06-0139-2025	Contratar la "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LA PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA	CONSORCIO GUAINÍA SOLAR AREEM&GIL.
140-13.05-0178-2025	Contratar la "INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LA PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA".	ORGANIZACIÓN ACREDITADORA DE PROYECTOS S.A.S. – OCAP S.A.S.

Novedades en desarrollo de la Etapa 2:

Es de anotar que, en desarrollo de la Etapa 2 del Contrato Interadministrativo 178-2025, GENSA tuvo dificultades para el inicio del proceso de contratación correspondiente a la *"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS*

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001

EN LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO - CASANARE", cuyo peso dentro del Contrato interadministrativo es del 83% , en razón a que el 04 de agosto de 2025 se recibió un oficio de parte del CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CAÑO MOCHUELO solicitando a GENSA abstenerse de realizar cualquier acción no concertada antes de surtir el conducto regular de concertación para la ejecución de las acciones a implementar con ocasión de la ejecución del proyecto, aludiendo que de ello dependería el éxito, la armonía, el respeto y permiso de ingreso al resguardo.

Adicionalmente, se citó por parte del Cabildo, a una reunión de concertación el 11 de agosto de 2025 a las 9:00 am en la ciudad de Yopal, Casanare. A dicho encuentro se citó puntualmente al representante legal de GENSA.

Al respecto, GENSA se pronunció indicando que, debido al poco tiempo entre la fecha de la citación y la fecha estipulada para llevar a cabo dicha reunión, no se logró implementar la logística requerida para la asistencia, sin embargo, se pusieron en conocimiento las generalidades del proyecto y se solicitó la reprogramación de ésta.

Finalmente, entre comunicaciones cruzadas entre el IPSE, GENSA y las autoridades del Cabildo se concretó una reunión presencial en las instalaciones de la de la organización regional del Casanare (ORIC) en Yopal, que se llevó a cabo el 27 de agosto de 2025.

De dicha reunión se levantó el acta correspondiente con los temas tratados y los compromisos de las partes.

Más adelante como conclusión de todo lo actuado frente a los requerimientos del Cabildo, el IPSE generó el oficio 202515200014641 fechado del 11 de septiembre de 2025, con lo cual, GENSA pudo avanzar en los trámites concernientes a la contratación de las obras e interventoría del proyecto.

Etapa 3 – Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de contratos y entrega de la infraestructura al operador de Administración, Operación y Mantenimiento

Una vez finalizados los trámites de la Etapa 2 se iniciarán las actividades correspondientes a la Etapa 3.

Es importante mencionar que mediante comunicación Rad. IPSE-202515200015401 fechada del 16 de septiembre de 2025, el IPSE solicitó a GENSA S.A. ESP. pronunciar manifestación de interés en la suscripción de una modificación al contrato interadministrativo 178 de 2025 con la finalidad de incorporar a su alcance contractual la implementación de soluciones energéticas sostenibles con fuentes no convencionales en las comunidades pertenecientes a los municipios de Solano - Caquetá y López de Micay – Cauca.

Al respecto GENSA se pronunció mediante oficio 2025-IE-00002006 fechado del 22 de septiembre de 2025, indicando la disposición y el interés en adicional Contrato.

De acuerdo con lo anterior, el 23 de octubre de 2025 quedó en firme la Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 178-2025.

De los proyectos adicionados, GENSA se encuentra adelantando los trámites presupuestales internos, se ha realizado la revisión de los proyectos y se avanza en la

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001

elaboración de los pliegos de condiciones para la contratación de las obras y la interventoría.

Paralelamente, mediante radicados 2025-IE-00002340 y 2025-IE-00002339, ambos del 07 de noviembre de 2025, se informó respecto de la ejecución de los proyectos a las alcaldías de Solano y López de Micay.

A la fecha, se está coordinando la realización de la socialización del proyecto de IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO – CASANARE, la cual se estima realizar en la última semana del mes de noviembre de 2025.

De otra parte, es importante tener en cuenta que la ruta crítica para la ejecución de los proyectos está en el tiempo de fabricación e importación de los elementos y equipos de las SISFV, para dicha actividad se estima un plazo de cuatro meses, sin embargo, el cronograma planteado esta actividad se ve altamente impactada por la celebración del Año Nuevo Chino, dado que dichas festividades se encuentran dentro del plazo estipulado.

SOLICITUD

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que:

1. Que el Contrato Interadministrativo 178-2025 se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

2. Que las actividades correspondientes a la Etapa 3 dependen de la terminación de la Etapa 2, respecto de la cual, se han tenido reprocesos por causa ajenas a GENSA, en la contratación de las obras e interventoría,

3. Que en ejecución de la Etapa 2 surgieron inconvenientes de carácter social con relación a las exigencias realizadas por las autoridades del Resguardo Indígena Caño Mochuelo, que impactaron negativamente el cronograma de contratación del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO – CASANARE, el cual representa el 83% del Contrato Interadministrativo.

   De acuerdo con lo anterior, GENSA debió pausar los procesos precontractuales y realizar las reuniones necesarias, en conjunto con el IPSE, para aclarar las dudas y pretensiones de las autoridades indígenas del Resguardo Indígena Caño Mochuelo con relación a la ejecución del proyecto.

4. Que de conformidad con la Modificación 01 del Contrato Interadministrativo 178-2025, mediante la cual se adicionaron los proyectos de López de Micay y Solano, se debe tener en cuenta el tiempo que GENSA requiere para realizar los trámites presupuestales internos y el tiempo para llevar a cabo los procesos de contratación para los proyectos nuevos.

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001

5. A la fecha, se está coordinando la realización de la socialización de los proyectos de Atrato y Cantón de San Pablo en Chocó y de Hato Corozal y Paz De Ariporo en Casanare, las cuales se estiman realizar en la última semana del mes de noviembre de 2025.

6. Actualmente, la ruta crítica para la ejecución del proyecto, está en el tiempo de fabricación e importación de los elementos y equipos de las SISFV.

GENSA ha analizado que el plazo de ejecución actual del contrato es insuficiente para cumplir con las actividades de la Etapa 3, máxime que, a la fecha, se deben adelantar los procesos precontractuales para los proyectos recientemente adicionados y que el ingreso a las zonas ha tomado más tiempo del estimado en razón a temas de orden público.

En ese sentido y de acuerdo con la actualización de los cronogramas de los proyectos, adjuntos a esta comunicación, estamos solicitando muy comedidamente la ampliación del Contrato Interadministrativo 178-2025 hasta el 30 de septiembre de 2026.

Cordialmente,

HENRY WILLIAM CRUZ CASAS
Presidente (E)

Anexos: Cronogramas actualizados

Elaborado: Ing. Julián Santiago Mejía Zuluaga – Profesional de Proyectos
Ing. Mónica Alejandra González Londoño – Profesional Especializado.

Revisado: Ing. Julio Mauricio Arce Posso – Líder de Proyectos de Infraestructura en el Sector Eléctrico.

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001
