ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**29-nov-25**	**SEMANA No.**	**33**	DEL	**22-nov-25**	AL	**28-nov-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

0
8
22

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/12/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	267
PLAZO TRANSCURRIDO:	234 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	234 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.605.070.568
SUPERVISOR:	ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

- SE TERMINÓ EL LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS Y SE CONTINÚAN ENTREGANDO LOS PRODUCTOS TOPOGRÁFICOS A LA INTERVENTORÍA

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE MEDINA:

PARATEBUENO (BUENAVISTA ALTORREDONDO - ENGAÑO)

REVISION DE INFORMES DE CARACTERIZACIÓN GEOTECNICA

PROVINCIA DEL GUAVIO:

JUNÍN (SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CARACTERIZACIÓN

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

- SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE CARACTERIZACIÓN

2.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALÁ (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

- SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE ENCOLE Y DESCOLE
- DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE ALCANTARILLAS DE DESCOLE POR NO CONFORMIDAD

JUNÍN (SUEVA - SAN GFRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA

GAMA (CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO)

- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO DE 36" PARA ALCANTARILLAS

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	29-nov-25	234	0	-144
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	29-nov-25	234	7	-101
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-dic-25	176	1-sep-25	29-nov-25	90	-54	32

Plazo del proyecto: 266 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	16,03%	11,47%	-4,56%
Durante el periodo	3,67%	0,45%	-3,22%
Acumulado Actual	18,75%	11,92%	-6,83%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	234,00	33	-18,22

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

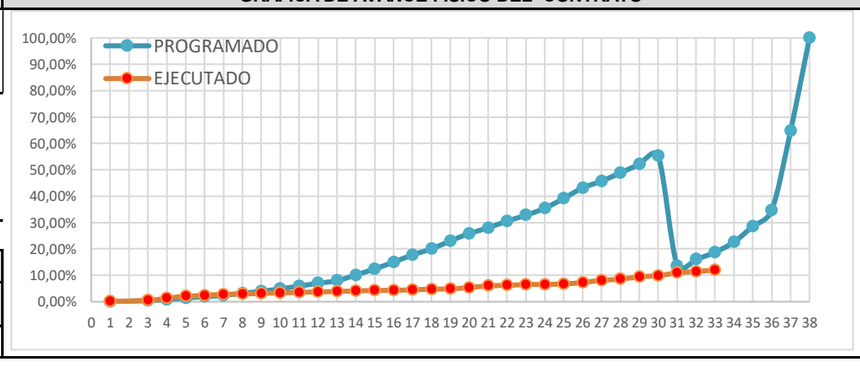

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 5.666.039.903	$ 4.053.511.384	72%
Durante el periodo	$ 1.297.148.102	$ 160.435.560	12%
Acumulado Actual	$ 6.626.874.644	$ 4.213.946.944	64%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	2.412.927.700

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	29-nov-25	SEMANA No.	33	DEL	22-nov-25	AL	28-nov-25


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-6,83%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

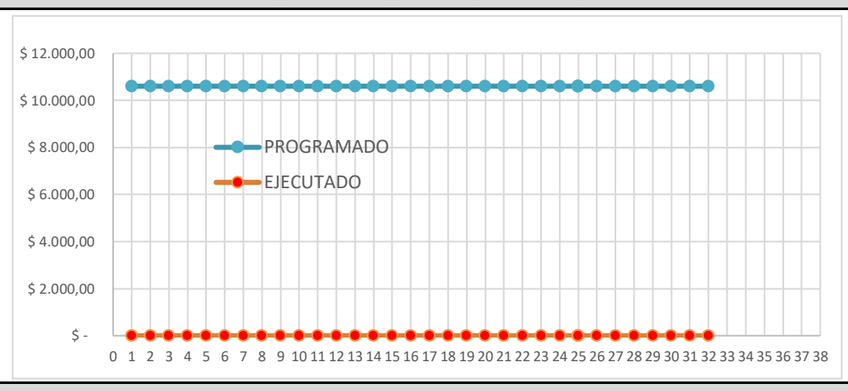

4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

GENERALES

Se participó en la audiencia de decisión de fondo del proceso sancionatorio 016 de 2025 por el posible incumplimiento del contrato de obra ICCU-138-2025, el cual fue archivado mediante la resolución 1490 de 2025

Se realizó el comité de seguimiento N° 28 el día 26 de noviembre del 2025, donde se hizo un nuevo llamado de atención al contratista de obra por la ejecución de actividades de replanteo topográfico necesario para el levantamiento de las secciones transversales en el municipio de Choachí, se debe realizar el replanteo cada 10 ml en recta y cada 5 ml en curva. En relación a la ejecuciones de estabilización de la rasante, se observó el rendimiento actual de ejecución dado las constantes interrupciones por fallas mecánicas del kit de maquinas utilizada en Choachí y Junín. Hasta la fecha en promedio se han realizado en promedio 120 ml de intervención versus 250 ml contemplados en la redistribución de actividades de actividades viabilizadas.

Adicionalmente, se solicitó visita técnica de especialistas de pavimentos para la revisión de las no conformidades actualmente presente en el tramo del municipio de Junín, entre los PR 2800-3200 ; PR1300-1600 Y PR2200-2600 por posibles hundimientos, ahuellamientos, fisuración superficial tipo piel de cocodrilo,etc

Mediante oficio 766-435 con asunto Solicitud de ajustes y correcciones a los estudios y diseños aprobados – Aplicación de observaciones del comunicado ICCU-I-2025-0016450 del 21 de noviembre del 2025, la interventoría mediante este oficio solicita la subsanación de los estudios y diseños relacionados con correcciones específicas del informe, la inclusión de la calidad del agua y vida útil de la intervención entre otros.

Mediante oficio 766-436 con asunto Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-446 APROBACIÓN GIRO 5 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025, la interventoría da visto bueno a la aprobación del giro 5 del anticipo, y como única observación u aclaración especifica que debe entregarse el informe mensual de inversión y buen manejo del anticipo.

Mediante oficio 766-441 con asunto REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 32 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-219-2025, hace entrega a la entidad del informe semanal N°32 cumpliendo con las condiciones establecidas.

Mediante oficio 766-445 con asunto Aprobación informe de buen manejo del anticipo N° 2- Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-433-Respuesta a Observaciones Oficio 766-410 – Informe de Anticipo No. 2 y Observaciones informe N° 3-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-445 del 26 de noviembre del 2025, la interventoría da aprobación del informe de anticipo, pero señala algunas observaciones del informe de numero 3 el cual no es aprobado hasta tanto no se subsane en su totalidad.

Mediante oficio 766-447 con asunto Certificación de cumplimiento - Aprobación de actas N°2 y N° 3 de fase de la caracterización por el segundo y tercer 25%- respuesta oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-435 y SOFAN- FOR-CO-03- ICCU031-443 del 28 de noviembre del 2025, la interventoría certifica el cumplimiento de los entregables de las fases 1 y 2 del contrato de obra.

Mediante oficio 766-448 con asunto Subsanación informe mensual N° 5 Mes de Agosto Interventoría V3. Se realizo entrega de las subsanaciones al informe de interventoría #3 a fin de que se tenga aprobación por parte de la supervisión del contrato.

Mediante oficio 766-452 con asunto Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-462 ORDEN DE GIRO No. 6 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025, del 26 de noviembre del 2025, la interventoría realizo diferentes observaciones en relación a lo presentado a fin de que se subsanen en el menor tiempo posible y se pueda seguir gestionando el trámite del anticipo #6.

Mediante oficio 455 con asunto Solicitud de remisión de certificados de calibración de equipos de topografía en actividades en las Provincias Oriente y Guavio, a fin de que se subsane por parte del contratista la certificación de algunos equipos que tienen vencidas las certificaciones de calibración de los equipos que se encuentran en campo.

Mediante oficio 766-457 con asunto Entrega del Informe mensual N° 6 de Interventoría-septiembre de 2025 Contrato ICCU-219-2025, se realizo la entrega formal del informe de interventoría mensual del mes de septiembre a fin que se de su aprobación.

PROVINCIA GUAVIO

Mediante oficio 766-437 con asunto Respuesta a oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-269-Respuesta Oficio No. 766-224-ICCU – Presupuesto Preliminar Ubalá del 24 de noviembre del 2025 se da respuesta positiva al presupuesto preliminar para el municipio de Ubalá alternativa 2 y a la espera de la reunión con los proveedores del geotextil.

Mediante oficio 766-438 con asunto Notificación Viabilidad Presupuesto condicionado Municipio-Ubalá-Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-426 – Presupuesto Preliminar Ubalá del 24 de noviembre del 2025, se emitió aprobación de las 3 alternativas presentadas para el municipio de Ubalá dejando como la mas posible la opción N°2.

Mediante oficio 766-440 con asunto Remisión de tramos por vereda y solicitud de definición de secciones a intervenir-Municipio de Ubalá del 25 de noviembre del 2025, mediante este oficio la Interventoría reitera su plena disposición para instalar la mesa técnica requerida una vez la Supervisión defina los tramos oficiales, o en su defecto se realice nuevamente en conjunto con la comunidad dicha definición y luego ajustar la programación conforme a la determinación institucional.

Mediante oficio 766-456 con asunto Observaciones último tramo intervenido sueva – Junín, provincia del Guavio, se realizo la observación del mal estado en que quedo el ultimo tramo intervenido a fin de que el contratista realice las respectivas subsanaciones en campo y presente una respuesta formal frente a lo sucedido.

PROVINCIA ORIENTE

Mediante comunicado 766-443 se envía respuesta al comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-451 -Radicación – Puesta en conocimiento por afectación a capa estabilizada por mal manejo de aguas de la comunidad en el cual se valida la información presentada y se solicita que se radique un oficio informando la situación presentada ante La Empresa de Servicios Públicos del Acueducto de Choachí, para que realicen la reparación de dichas tuberías a la mayor brevedad posible y así evitar que se continúe afectando la estabilización realizada al afirmado de la vía en estos sectores.

Mediante comunicado 766-450 se solicita al contratista la remisión de los certificados de calibración faltantes de los equipos de topografía utilizados en las actividades en las Provincias Oriente y Guavio.

Mediante comunicado 766-455 se envía al contratista la observación sobre bajos rendimientos en estabilización de capa de afirmado por fallas en maquinaria, falta de materiales y operarios en los municipios de Choachí y Junín.

Para esta semana comprendida del sábado 22 al viernes 28 de noviembre se continúa la estabilización del afirmado de la vía correspondiente al segundo tramo de Choachí desde la abscisa K3+020 hasta la abscisa K3+320 para un total de 300,00m intervenidos.

PROVINCIA MEDINA

no se realizaron oficios en la semana para esta provincia

PROVINCIA SOACHA

Mediante comunicado 766-446 se envía respuesta al comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-460 en el cual una vez revisadas cada una de las alternativas planteadas en el documento PRESUPUESTO SIBATE – V4 se realizaron las consideraciones del caso.

Mediante oficio 766-451 con asunto Notificación viabilidad Presupuesto definitivo municipio de Sibaté- RTA oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-460 del 26 de noviembre del 2025, se realiza notificación de aprobación por parte de interventoría del presupuesto para el municipio de Sibaté señalando que la alternativa 1 es la mas opcional.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

INFORME AMBIENTAL - SEMANAL
DEL 22 al 28 de Noviembre del 2025

1.El día 28 de noviembre del 2025, el contratista participó en el comité interno del Consorcio Sofán.
2.Se asiste a comité integral el día 26 de noviembre del 2025. Allí se describe la gestión ambiental y ejecución de los PAGA de la provincias de Guavio y Oriente.
3.El día 24 de noviembre, el contratista remite el informe semanal vía correo electrónico.
4.Durante la semana se realiza acompañamiento a la supervisión en las diferentes actividades constructivas.
5.Durante la semana, se realizó verificación del cumplimiento del PAGA de las provincias del Guavio y Oriente donde se realizan las siguientes actividades:
•Verificación de delimitación y señalización.
•Inspección de campamento.
•Supervisión y acompañamiento en obra.
•Inspección baterías sanitarias campamento.
•Capacitación ambiental.
•Alistamiento de bolsas de cemento para la recolección y disposición final.
6.Durante la semana, se realizaron actividades de orden y aseo en los frentes de obra habilitados, como lo es en el municipio de Junín y Choachí.
7.Se realiza inspección a las baterías sanitarias alquiladas en los frentes habilitados.
8.No se realizaron charlas durante la semana, ya que durante el mes se dio cumplimiento al cronograma de capacitaciones presentado en el PAGA de cada una de las provincias.
9.Se realiza retiro de bolsas de Cemento el día 25 de noviembre de 2025 del Municipio de Junín.

10.Comunicados de la semana:
Comunicados remitidos por Interventoría:
•766-417, Tercera revisión, observaciones informe mensual N°6 correspondiente al mes de septiembre. 24 de noviembre del 2025.
Comunicados remitidos por el contratista:
•SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-455, Atención a observaciones Informe mensual Ambiental N°6 Septiembre 2025 Provincia Guavio- oficio 766-417. 24 de noviembre del 2025.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**29-nov-25**	**SEMANA No.**	**33**	DEL	**22-nov-25**	AL	**28-nov-25**

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Provincia del Guavio

El 24 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el volante No. 19. Invitación al comité de participación No. 2, dirigido a la comunidad del municipio de Junín, para revisión de la Interventoría.

El 24 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acuso enterado de la radicación virtual del volante No. 17 a la Secretaría de Planeación del municipio de Ubalá, invitándolos a participar de la segunda parte de la reunión de inicio No. 5.

El 24 de noviembre, el señor Luis Acosta manifestó a través del grupo de WhatsApp del municipio de Junín su inconformidad porque, presuntamente, el Contratista estaría incumpliendo las zonas priorizadas en el recorrido realizado el 10 de octubre con la comunidad, realizando la estabilización en otros puntos.

El 25 de noviembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el volante No. 19. Invitación al comité de participación No. 2, dirigido a la comunidad del municipio de Junín, con Visto Bueno, para revisión de la Entidad.

El 25 de noviembre, el Contratista remitió respuesta a través del grupo del WhatsApp del municipio de Junín al señor Luis Acosta, explicando los cambios que se han realizado en los puntos de referencias escogidos, demostrando y soportando el cumplimiento a lo acordado en el acta realizada el 10 de octubre, durante el recorrido No. 2.

El 25 de noviembre, el Contratista realizó la revisión de los buzones satelitales ubicados en el tramo de Junín, instalados en el campamento y en la alcaldía.

El 26 de noviembre, la Supervisión Social de la Entidad refirió mediante correo electrónico no tener observaciones frente al volante No. 19. Invitación al comité de participación No. 2, dirigido a la comunidad del municipio de Junín. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el aval para la distribución del volante No. 19, por medio del cual se invita al comité de participación No. 2 a la comunidad del municipio de Junín; teniendo en cuenta que, la Entidad no presentó observaciones al respecto.

El 26 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el folleto No. 5. Inicio de actividades hidráulicas de Gama, actualizado para revisión de la Interventoría. Cabe aclara que esta pieza ya había sido aprobada el 6 de noviembre, sin embargo, por cambios en la programación del área técnica del Contratista no se realizó su distribución y por esa razón se ajustó de acuerdo a las nueva fecha de inicio de dichas actividades. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el aval para la distribución de la pieza mencionada.

El 26 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la carta personalizada No. 35. Inicio de actividades hidráulicas en el municipio de Gama dirigida a la alcaldía municipal, para revisión de la Interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió la pieza con mínimas observaciones para atención del Contratista, indicando que, en caso de haber empresas, instituciones educativas u otra entidad en el Área de Influencia Directa del proyecto, se debían proyectar cartas dirigidas a ellos. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la carta subsanada. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió la carta con su Visto Bueno, para revisión de la Entidad.

El 26 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta del recorrido No. 1. Municipio de Ubalá ajustada, para revisión de la Interventoría.

El 27 de noviembre, la Entidad manifestó a través de correo electrónico no tener observaciones de la carta personalizada No. 35. Inicio de actividades hidráulicas en el municipio de Gama dirigida a la alcaldía municipal. A través del mismo medio y en las misma fecha, la Interventoría remitió el aval ara la radicación de la carta No. 35. mediante la cual se notifica a la alcaldía del municipio de Gama el inicio de actividades hidráulicas el 29 de noviembre, teniendo en cuenta que no se presentaron observaciones por parte de la Entidad, reiterando y retomando la directriz de la Entidad, se requiere que esta sea radicada de manera presencial.

El 27 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico los soportes del envío de las actas de la reunión extraordinaria No. 2 realizada en el municipio de Ubalá, a los asistentes que brindaron sus datos, a través de WhatsApp.

El 27 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico los soportes de envío de la copia del acta de la reunión preliminar No. 1. Provincia del Guavio, a los asistentes que bridaron sus datos a través de correo electrónico.

El 27 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el aval al Contratista para realizar el envío de la copia del acta del recorrido No. 1 realizado en el municipio de Ubalá a la administración municipal, lideres comunitarios y comunidad interesada.

El 27 de noviembre, el Contratista realizó la revisión del buzón satelital ubicado en el tramo del municipio de Gama.

El 27 de noviembre, el Contratista remitió mediante el grupo de WhatsApp del municipio de Gama, el folleto No. 5. Inicio de actividades hidráulicas y PMT.

El 27 de noviembre, el Contratista realizó la revisión de los buzones satelitales del municipio de Ubalá, ubicados en Casa Rosada, Laguna Azul y en la tienda Donde Lucho.

El 28 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión de inicio No. 2 dirigida al municipio de Junín, para revisión de la Interventoría.

El 28 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión de inicio No. 3 dirigida al municipio de Gama, para revisión de la Interventoría.

El 28 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico los soportes de envío de la copia del acta del recorrido No.1. Municipio de Ubalá, a los asistentes que bridaron sus datos a través de correo electrónico.

El 28 de noviembre, el Contratista brindó atención presencial en el Punto SAU de la provincia de Guavio – municipio de Gachetá, en el horario establecido y aprobado por las partes.

El 28 de noviembre, el Contratista realizó el levantamiento de un (1) acta de vecindad de un predio aledaño a una alcantarilla en el municipio de Junín.

Provincia de Oriente

El 24 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico el acta de reunión de inicio No. 1 del municipio de Choachí subsanada para revisión de la Interventoría.

El 24 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la presentación diseñada para el comité de participación No.1, dirigida al municipio de Choachí, para revisión de la Interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió observaciones de la presentación para atención por parte del Contratista. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la presentación subsanada, para revisión de la Interventoría.

El 24 de noviembre, el Contratista remitió mediante el grupo de WhatsApp de Choachí el volante No. 18. Invitación al comité de participación No. 1.

El 25 de noviembre, desde la Interventoría se radicó al Contratista el comunidad 766-443, como respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO-03-452, requiriendo los soportes de gestión frente al mal manejo inadecuado de aguas identificada en el municipio de Choachí.

El 25 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico la presentación diseñada para el comité de participación No. 1, dirigido a la comunidad del municipio de Choachí con nuevas observaciones para atención del Contratista.

El 25 de noviembre, la interventoría remitió a través de correo electrónico el Visto Bueno y Aval para la difusión de la copia del acta de la reunión de inicio No. 1. Municipio de Choachí.

El 25 de noviembre, el Contratista realizó la revisión del buzón satelital del municipio de Choachí ubicado en el tramo de obra.

El 26 de noviembre, la Entidad remitió a través de correo electrónico las vallas de los municipios de Chipaque, Quetame, Fosca y Fómeque al Contratista; información que, a su vez, estos últimos remitieron de manera informativa a la Interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió acuso enterado del envío de los diseños de las vallas de los municipios de Oriente faltantes por parte de la Entidad, quedando atentos a las gestiones para la instalación de las mismas en el menor tiempo posible.

El 26 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico la presentación proyectada para el comité de participación No. 1, dirigido a la comunidad del municipio de Choachí subsanada, para revisión de la Interventoría.

El 26 de noviembre, el Contratista brindó atención presencial en el Punto SAU de la provincia de Oriente – municipio de Choachí, en el horario establecido.

El 27 de noviembre, la Interventoría remitió mediante correo electrónico la presentación proyectada para el comité de participación No. 1, dirigido a la comunidad del municipio de Choachí con el visto bueno, para revisión de la Entidad. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Supervisión Social del ICCU manifestó no tener observaciones frente al insumo compartido. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el aval para la proyección de las diapositivas adjuntas en el comité de participación No. 1, del municipio de Choachí, considerando que la Entidad manifestó no tener observaciones.

El 27 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico los soportes de envío de la copia del acta de la reunión preliminar No. 5. Municipio de Choachí, a los asistentes que bridaron sus datos a través de correo electrónico.

El 28 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico los soportes de envío de la copia del acta de la reunión inicio No. 1. Municipio de Choachí, a la administración municipal mediante correo electrónico.

El 28 de noviembre, se realizó el comité de participación No. 1, dirigido al municipio de Choachí. En este espacio de diálogo se realizó la socialización de los avances de técnicos y sociales en dicho tramo de obra y se respondieron las inquietudes de la comunidad.

Provincia de Medina

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**29-nov-25**	**SEMANA No.**	**33**	DEL	**22-nov-25**	AL	**28-nov-25**

El 27 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico los soportes de envío de la copia del acta de la reunión preliminar No. 2. Municipio de Paratebueno, a los asistentes que bridaron sus datos a través de correo electrónico y WhatsApp.

El 27 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico los soportes de envío de la copia del acta de la reunión preliminar No. 3. Municipio de Medina, a los asistentes que bridaron sus datos a través de correo electrónico.

Provincia de Soacha

El 26 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico la carta personalizada No. 36. Inicio de actividades de obra en el municipio de Sibaté dirigida a la alcaldía, para revisión de la Interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió la pieza con mínimas observaciones para atención del Contratista, indicando que, en caso de haber empresas, instituciones educativas u otra entidad en el Área de Influencia Directa del proyecto, se debían proyectar cartas dirigidas a ellos. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la carta No. 36, subsanada. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió la pieza a revisión de la Entidad con el Visto Bueno respectivo.

El 26 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico el folleto No. 6. Inicio de actividades de obra en el municipio de Sibaté, para revisión de la Interventoría. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el folleto No. 6 con el Visto Bueno, para revisión de la Entidad. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Entidad indicó no tener observaciones sobre la pieza de divulgación mencionada. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el aval para la distribución de la pieza, considerando que la Entidad no manifestó tener observaciones.

El 27 de noviembre, el Contratista remitió a través de correo electrónico los soportes de envío de la copia del acta de la reunión preliminar No. 4. Municipio de Sibaté, a los asistentes que bridaron sus datos a través de correo electrónico.

El 27 de noviembre, el Contratista recibió mediante correo electrónico una solicitud del señor Lenin pescador, de la vereda Alto Charco en el municipio de Sibaté, requiriendo información contractual y técnica del proyecto. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió la presentación de la reunión de inicio No. 4 de Sibaté dando respuesta a la solicitud ciudadana.

El 27 de noviembre, el Contratista remitió mediante el grupo de WhatsApp del municipio de Sibaté, el folleto No. 6. Inicio de actividades hidráulicas y PMT.

El 28 de noviembre, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión de inicio No. 4 dirigida al municipio de Sibaté, para revisión de la Interventoría.

Generales - componente social.

El 23 de noviembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-453 como respuesta a los oficios 766-325-ICCU y 766-363-ICCU relacionados con el cumplimiento el Plan de Gestión Social y compromisos sociales pendientes.

El 24 de noviembre, el Contratista radicó el comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-454 a la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca con copia a la Interventoría, a través del cual se solicitó la publicación de las vacantes vigentes del proyecto en los canales de información de dicha Entidad.

El 24 de noviembre, la Interventoría radicó al Contratista el comunicado 766-417 a través del cual se remitió la aprobación del informe mensual No. 6 del componente social.

El 24 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 30 debidamente firmada por parte del Contratista y la Entidad.

El 24 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico acuso recibido del acta de la mesa de trabajo No. 31 debidamente firmada por parte del Contratista y la Entidad.

El 24 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico acuso recibido del informe semanal No. 20 del Contratista subsanado.

El 24 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico acuso recibido del informe semanal No. 21 del Contratista subsanado.

El 24 de noviembre, se realizó la mesa de trabajo No. 33 con el componente social del Contratista con el fin de revisar las actas de vecindad del municipio de Gama entregadas a la Interventoría, ya que en su revisión se identificaron varias inconsistencias.

El 25 de noviembre, desde la Interventoría se radicó al Contratista el comunicado 766-442-ICCU a través del cual se emitió el concepto de las actas de vecindad de la entrega 6, radicadas con el oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-452 (municipios de Junín, Gama, Sibaté y Choachí).

El 26 de noviembre, el componente social del Contratista y la Interventoría participaron en el comité de seguimiento semanal No. 28.

El 28 de noviembre, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 32, para revisión y firma del Contratista. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió el acta mencionada debidamente firmada.

El 28 de noviembre, se realizó la mesa de trabajo No. 34 del componente social, mediante la cual se realizó el seguimiento de los compromisos, cumplimiento al Plan de Gestión Social y se adquirieron nuevos compromisos; a este encuentro asistieron los profesionales sociales del Contratista, la Interventoría y el ICCU.

Entre el 22 y 28 de noviembre el Contratista recibió tres (3) hojas de vida a través del correo electrónico del Punto SAU.

4.4 GESTIÓN SST DEL PROYECTO

INFORME SST - SEMANAL DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

1.Comités: Interno el día 25 de nov-25, con la participación de todos los componentes de la interventoría, Consorcio Sofán y ICCU.
Actividades desarrolladas en los municipios de: Choachí y Junín:

Punto de Choachí:
- Verificación, delimitación y señalización en sitio de obra.
- Supervisión y acompañamiento en obra.
- Inspección de maquinaria.
- Instalación de PMT.
- Jornada de orden y aseo.
- Entrega de EPP según necesidad de cada colaborador y verificación de estos.
- Inspección de Kit de emergencia.
- Se brinda charla de 5 minutos.

Charlas de seguridad en el punto de Choachí:
- 24/11/2025: Exposición a gases tóxicos monóxido de carbono.
- 25/11/2025: Distracciones Generales
- 26/11/2025: Movimiento repetitivo y malas posturas.
- 27/11/2025: Eres responsable de tu seguridad.
- 28/11/2025: Higiene Personal.
- 29/11/2025: Estilos de vida saludable.

1.Gestión y apoyo administrativo de punto Choachí:
- Recepción de carpetas personal del punto en mención.
- Inducción de personal de ingreso.
- Informe semanal.
- Implementación formatos SST y Ambiental.

Punto de Sueva- Junín:
- Verificación e instalación de señalización en sitio de obra.
- Supervisión y acompañamiento en obra.
- Verificación de puntos ecológicos y kit de emergencia en obra.
- Inspección con interventoría en campo.
- Aseguramiento documental en campo (ATS- Preoperacionales- Charlas-Inspecciones).
- Se brinda charla de 5 minutos.

Charlas de seguridad en el punto de Sueva- Junín:
- 24/11/2025: Socialización de procedimientos operativo normalizado "Amenazas Naturales".
- 25/11/2025: Diligenciamiento documental en campo (ATS - Según aplique).
- 26/11/2025: Reporte oportuno de incidentes y accidentes.
- 2711/2025: Posturas correctas al trabajar sentado o de pie.
- 28/11/2025: Cumplimiento de las instalaciones del PMT.

1.Gestión y apoyo administrativo de punto Junín:
- Se presenta la novedad de retiro del señor: Julián Vargas con el cargo de: Inspector Social, con fecha 24/11/2025.
- Inducción personal nuevo.
- Informe semanal.
- Implementación formatos SST y ambiental.

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Se emitieron observaciones al rendimiento físico de la estabilización de la rasante con la adición de químicos no tradicionales debido a fallas mecánicas del kit de maquinaria, y particularmente, en el municipio de Junín se realizó la solicitud de visita técnica con especialistas de pavimentos por las evidencias de secciones con problemas de hundimientos, ahuellamientos, entre otros, como se registró en el oficio 766-450 Observación sobre bajos rendimientos en estabilización de capa de afirmado por fallas en maquinaria y falta de materiales y operarios; 766-456 Observaciones mejoramiento de rasante y llamado de atención N°3 Actividades fase 3 Junín. Se realizó el requerimiento de calibración de equipos topográficos usados en el municipio de Junín mediante oficio 766-455 SOLICITUD CERTIFICADOS CALIBRACIÓN EQUIPOS GUAVIO Y ORIENTE

4.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se realizó la aprobación de informe del buen manejo del anticipo del contrato de obra ICCU-138 del 2025 correspondiente al mes de agosto del 2025, y se presentaron observaciones al informe del mes de septiembre a través del oficio 766-445 Aprobación y Observaciones informe No. 2 y No. 3 respectivamente del buen manejo de anticipo de obra. Se dio la aprobación definitiva a los presupuestos definitivos del municipio de Sibaté con el oficio 766-446 Presupuesto definitivo municipio de Sibaté- RTA oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-460; y al municipio de Ubalá aprobación condicionada con el comunicado 766-437 Presupuesto condicionado Municipio-Ubalá-Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-426. Finalmente, se remitió a la entidad la información requerida de presupuesto, esquema de intervención para la definición institucional de las secciones a intervenir dentro del tramo del municipio de Ubalá con el oficio 766-440 Remisión de tramos por vereda y solicitud de definición de secciones a intervenir-Municipio de Ubalá

5. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**29-nov-25**	**SEMANA No.**	**33**	DEL	**22-nov-25**	AL	**28-nov-25**

Se reporta un atraso del -6,83%, ya que de acuerdo con la nueva programación aprobada el avance programado era del 18,75% y solo se ha ejecutado el 11,92%. El incumplimiento de los entregables correspondientes a la Fase I y II del contrato de obra ICCU-138-2025 ha repercutido en el avance de las actividades de obra de intervención sobre la rasante de los tramos a intervenir, generándose así un aumento el porcentaje de atraso del avance físico y financiero del contrato. Se reitera que el retraso en el cronograma de actividades según la redistribución recientemente viabilizada por la interventoría, es atribuible al contratista toda vez que este es el responsable de garantizar la disponibilidad del kit de maquinaria en optimas condiciones y planificar adecuadamente el plan de trabajo para garantizar los 250 ml de intervención diaria por municipio.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se realizó la aprobación de las actas N° 2 y N° 3 del segundo y tercer 25% de la fase de caracterización del contrato ICCU-138-2025 mediante oficio 766-447 Certificación cumplimiento Aprobación pago actas N°2 y N° 3 de fase de la caracterización por el segundo y tercer 25% (1). Por otro lado, se emitió la aprobación del giro 5 del contrato mediante oficio 766-436 Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-477 Aprobación Giro 5 Anticipo obra; mientras que para la solicitud del giro 6 del anticipo se observó mediante el comunicado 766-452 Ruta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-462 Observaciones Giro 6 de Anticipo

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Así las cosas, a corte del 28 de noviembre del 2025, esta interventoría ha tramitado y aprobado la solicitud de pago del 75% de fase de caracterización, resultando en un acumulado de $ 2.084.166.072,00. Por otro lado, en relación, al desembolso del anticipo de obra, se ha tramitado y viabilizado por parte de la Interventoría hasta la solicitud N° 5 de este, presentándose a la fecha un valor acumulado aprobado de $6.305.738.407,04

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se mantiene en observación las secciones entre los PR 2800-3200 ; PR1300-1600 Y PR2200-2600 por posibles hundimientos, ahuellamientos, fisuración superficial tipo piel de cocodrilo,etc el municipio de Junín. Para el municipio de Choachí, se mantiene en observación las secciones transversales levantadas sin el correcto replanteo topográfico como se informó en el oficio 766-455 SOLICITUD CERTIFICADOS CALIBRACIÓN EQUIPOS GUAVIO Y ORIENTE

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se evidencia en el periodo de reporte que, el contratista realizó visitas a los municipios de Junín y Choachí con el fin de solicitar suministro de agua en bloque para utilizar en los frentes de obra de los municipios mencionados anteriormente. Adicionalmente, el día 26 de septiembre se realizo mesa de trabajo para revisión del cálculo de la sensibilidad ambiental y nivel de complejidad del proyecto, se solicitó al contratista cronograma de posibles visitas para identificación de permisos ambientales a solicitar ante las Autoridades Ambientales Competentes.

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

El subcontratista no presenta las planillas de seguridad social a tiempo.

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

En este aspecto no se presentan situaciones problemáticas.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Se evidencian varias situaciones problemáticas relacionadas principalmente con retrasos y reprocesos en la gestión social, originados por la necesidad de múltiples ajustes a piezas comunicativas, actas y presentaciones remitidas por el Contratista; así como requerimientos recurrentes de la Interventoría para complementar soportes, aclarar información o subsanar documentación. Estos hechos reflejan causas asociadas a debilidades en la planificación, control documental, coordinación interinstitucional y articulación comunitaria dentro del componente social del proyecto.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Radicación documentación de maquinaria para el municipio de Sibaté	Consorcio Sofán C-031	1/12/2025
Subsanación informes de topografía de la provincia Medina	Consorcio Sofán C-031	27/11/2025
Entrega de certificados de calibración de equipos topográficos del municipio de Junín	Consorcio Sofán C-031	28/11/2025
Replanteo topográfico para intervención de rasantes en el municipio de Sibaté	Consorcio Sofán C-031	1/12/2025
Visita especialistas de pavimento al tramo del municipio de Junín	Consorcio Sofán C-031	Pendiente
Ensayos de control municipio de Choachí	Consorcio Sofán C-031	Pendiente

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra en las fases de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado las posibles soluciones para el mejoramiento del estado de las vías y/o actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se continúa la intervención de la rasante de la vía en el tramo desde el K3100 al K3+200 Y DEL TRAMO K3+580 AL K3+890 del municipio de Junín en la provincia del Guavio; y se continúa la intervención de la rasante de la vía en el tramo desde el K3+020 a la K3+320 en el municipio de Choachí en la provincia de Oriente.
A corte del 28 de noviembre de 2025, se reporta un atraso del -6,83% en el avance físico y financiero del contrato ICCU-138-2025, debido al incumplimiento de entregables de las Fases I y II y problemas en la disponibilidad y funcionamiento del kit de maquinaria. Se han aprobado pagos correspondientes al 75% de la fase de caracterización, acumulando $2.084.166.072,00, y se ha viabilizado el desembolso del anticipo de obra hasta la solicitud N° 5, con un acumulado de $6.305.738.407,04. Persisten observaciones en los municipios de Junín y Choachí por problemas técnicos y de ejecución, incluyendo hundimientos, fisuras y falta de replanteo topográfico adecuado. Se reitera la responsabilidad del contratista en garantizar el cumplimiento del cronograma y la calidad de las actividades.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

- TERMINADAS LAS ACTIVIDADES DE GEOPOSICIONAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

- TERMINADOS LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y SUELOS ESTABILIZANTES A LAS MUESTRAS TOMADAS EN LOS APIQUES

9.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN EN EL TRAMO: SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN

ACOPIO DE CEMENTO





LLEGADA Y DESCARGUE DE ADITIVO PROES





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**29-nov-25**	**SEMANA No.**	**33**	DEL	**22-nov-25**	AL	**28-nov-25**





SUPERVISIÓN DE PMT





SUPERVISIÓN DE TOPOGRAFÍA





LIMPIEZA DE CUNETAS





ESCARIFICACIÓN CON RETROCARGADOR





ESCARIFICACIÓN CON MOTONIVELADORA





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**29-nov-25**	**SEMANA No.**	**33**	DEL	**22-nov-25**	AL	**28-nov-25**





EXTENDIDA DE CEMENTO





HOMOGENIZACIÓN CON FAE





VERIFICACIÓN DE PROFUNDIDAD ESTABILIZADA






TOMA DE HUMEDADES





RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO Y DOSIFICACIÓN DE ADITIVO





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**29-nov-25**	**SEMANA No.**	**33**	DEL	**22-nov-25**	AL	**28-nov-25**





RIEGO DE ADITIVO CON AGUA





CEREO





COMPACTACIÓN





SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE GAMA TRAMO: CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO

SUPERVISIÓN DE PMT Y DESCARGUE DE TUBERÍAS DE CONCRETO DE 36"









REPLANTEO PARA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO DE 36" PARA ALCANTARILLA





SUPERVISIÓN DE DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS, AGUA Y CEMENTO Y FUNDICIÓN DE SOLADO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO DE 36" PARA ALCANTARILLAS





VERIFICACIÓN DE ESPESOR DEL SOLADO FUNDIDO





PROVINCIA DE ORIENTE:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ TRAMO: EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO


SUPERVISIÓN DE PMT





SUPERVISIÓN DE TOPOGRAFÍA



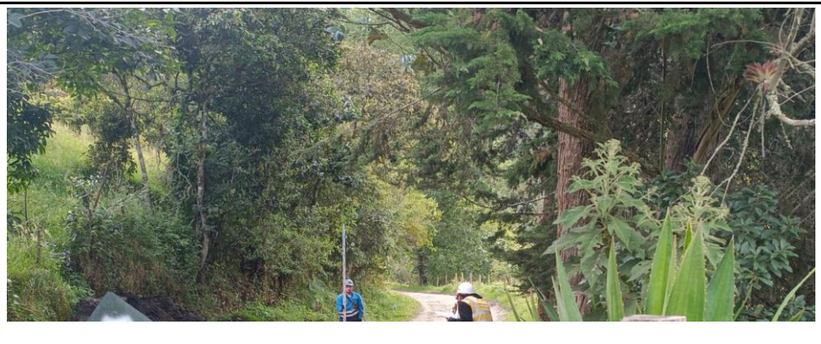





LIMPIEZA DE CUNETAS Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL





LIMPIEZA DE CUNETAS Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL





LIMPIEZA DE CUNETAS Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL






ESCARIFICADO Y RETIRO DE SOBRETAMAÑOS





EXTENDIDO DE CEMENTO Y HOMOGENIZACIÓN CON RECICLADORA





ICCU	**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0	
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023	
PERIODO DE INFORME SEMANAL										
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**29-nov-25**	**SEMANA No.**	**33**	DEL	**22-nov-25**	AL	**28-nov-25**	





HOMOGENIZACIÓN CON RECICLADORA Y RETIRO DE SOBRETAMAÑOS





VERIFICACIÓN DE DOSIFICACIÓN Y RIEGO DE ADITIVO PROES CON AGUA






CEREO Y COMPACTACIÓN CON VIBRO





COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 28- 26 DE NOVIEMBRE

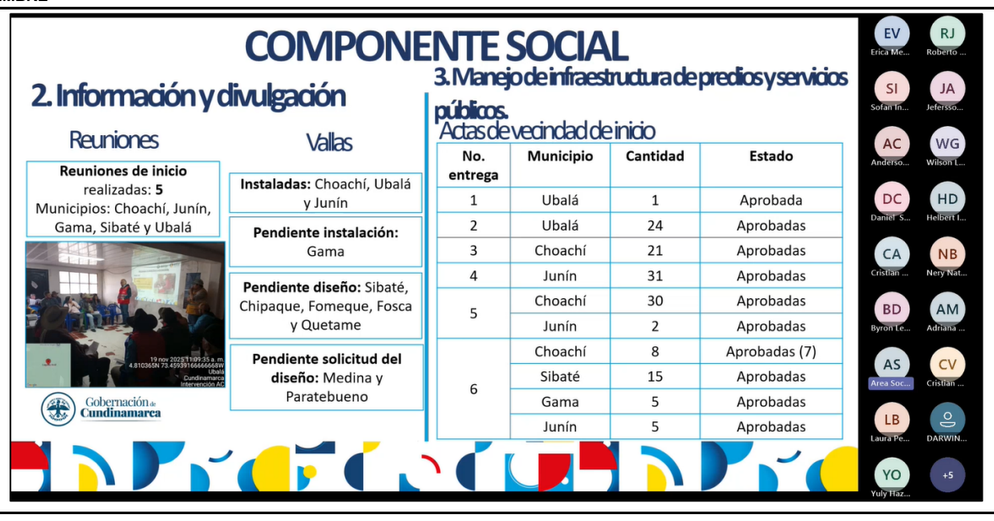

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**							**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							**FECHA**	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**29-nov-25**	**SEMANA No.**	**33**	DEL	**22-nov-25**	AL	**28-nov-25**


REVISIÓN DE BUZONES SATELITALES - MUNICIPIOS DE JUNÍN Y GAMA






BUZONES SATELITALES UBALÁ Y CHOACHÍ



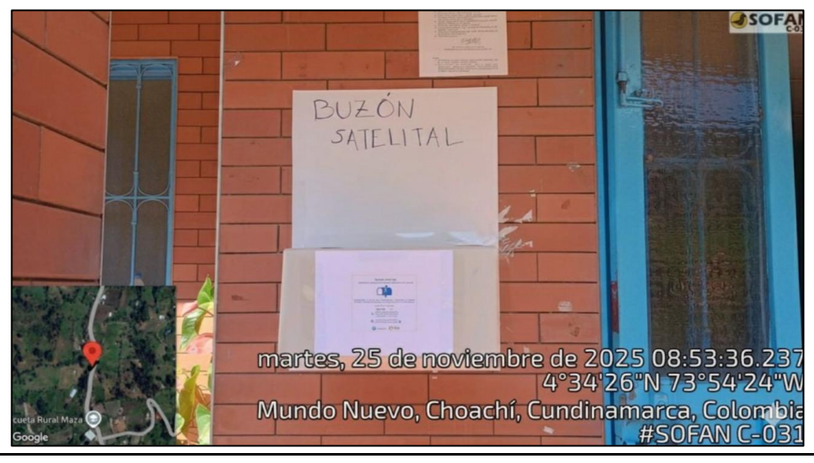

MESA DE TRABAJO No. 34 - COMPONENTE SOCIAL

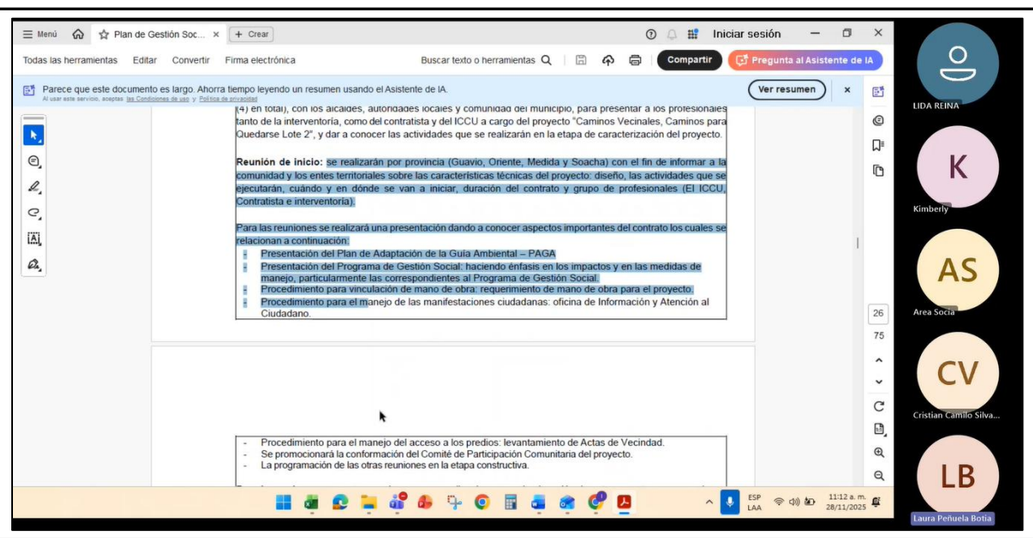

ATENCIÓN PUNTO SAU - PROVINCIAS DEL GUAVIO Y ORIENTE





COMITÉ DE PARTICIPACIÓN No. 1 - MUNICIPIO DE CHOACHÍ



Roberto López

Firmado digitalmente por Roberto López
Fecha: 2025.12.02 10:20:23 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA FASE III

Nombre: Roberto Carlos López Julio
