ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 01

CONTRATO DE OBRA __x__ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NÚMERO:	**CO1.PCCNTR.8041643**							
OBJETO:	**CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL NUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER**							
VALOR INICIAL:	**CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($125'605.720)**							
VALOR ADICIONAL:	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($59.953.882)**							
VALOR TOTAL:	**CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 185.559.602,00)**							
PLAZO INICIAL:	**DOS (02) MESES**							
PLAZO ADICIONAL:	**UN (01) MES**							
PLAZO TOTAL:	**TRES (03) MESES**							
CONTRATISTA:	**CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** **Nit.901.292.202-1** **R/L: ALFONSO VEGA ALBINO** **C.C: No. 91.497.873**							
SUPERVISOR:	**Ing. JUAN PABLO VERA MOGOLLON** **Secretario de infraestructura**							
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**Ing. WILSON ALVAREZ GOMEZ**							
INTERVENTOR CONTRATO:	**N/A**							
ANTICIPO (XXX%):	**N/A**							
FECHA DE INICIACIÓN:	**28 DE JULIO DE 2025**							
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°1**	**08/10/2025**	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°1**	**24/11/2025**	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 de diciembre de 2025**							
MUNICIPIO:	**Piedecuesta**							
OFICINA GESTORA:	**Secretaria de infraestructura**							

En Piedecuesta, a los **veinticuatro (_24_)** días del mes de **septiembre** de **2025**, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura se reunieron, el **Ing. JUAN PABLO VERA MOGOLLON**, en calidad de Supervisor del Municipio, **_____N/A_____** como Interventor, el señor **ALFONSO VEGA ALBINO** presentante legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S**, como Contratista y el Ing. **WILSON ALVAREZ GOMEZ**, como apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente Acta de modificación de cantidades y precios no previstos No.1.

CONSIDERANDO:

- Que: La UAE INDERPIEDECUESTA, en representación del Municipio de Piedecuesta, es responsable de garantizar el cumplimiento de las políticas, planes y programas del sector deporte y recreación. Su objetivo es incentivar la práctica deportiva y recreativa mediante una oferta inclusiva, con el objetivo de generar espacios deportivos, de recreación, sana convivencia y paz, fomentando la conformación de lazos de cohesión social, e incrementando las condiciones de vida de la población en general.

Como agente de formación, transformación y participación social, líder en el desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación la UAE INDERPIEDECUESTA está comprometida con la protección y atención integral de todos los Piedecuestanos: estudiantes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, promoviendo y estimulando su práctica mediante la consolidación de políticas, estrategia, pero sobre todo a través del Plan de Desarrollo “HAGAMOS EQUIPO POR PIEDECUESTA 2024-2027”. Sector Deporte y Recreación Línea Estratégica No 1: Derecho Humano E Inclusión Social.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se hace necesario complementar y darle un mayor alcance y aprovechar al máximo el área a intervenir, vemos la necesidad de ampliar en plazo y valor el contrato de la referencia, con el fin de dar mayor diversidad de juegos en el lote a intervenir en los sectores de CERROS DEL MEDITERRANEO, PALERMO II, EL PARAISO.

Lo que se busca con este adicional en tiempo y valor es mejorar el espacio disponible para un mejor esparcimiento saludable para los habitantes del sector, con el fin de evitar focos de inseguridad y ampliar los espacios para realizar actividades deportivas.

El mayor valor se soporta en un área mayor a intervenir a la inicial, que permita incluir diferentes equipos que permitan un mejor desarrollo de actividades biosaludables.

De acuerdo con lo anterior se buscar intervenir:

Un área de 122.28 m2, comparado con los 69.75m2 iniciales
Suministrar e instalar césped artificial sobre 122.28m2
Suministrar e instalar equipos adicionales tales como; Paralela Doble Básica (3), Jinete Doble Básica (3), Abdomen inclinada básica (3)

ITEMS QUE AUMENTARON:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MAYOR CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		CANTIDAD
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	52,53
1,3	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE PROFUNDIDAD 0 A0,5M	M3	5,24
1,4	EXTENSION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	5,23
3	**ELEMENTOS EN CONCRETO**		
3,1	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,1M, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA - CONTEMPLA ACABADOS DEL CONCRETO COMO ESCOBEADO	M2	52,53

ITEMS QUE DISMINUYERON:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MENOR CANTIDAD
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIO BIOSALUDABLES PARA ADULTOS Y/O NIÑOS (TWISTER)	UND	1
2,2	FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	UND	
2,3	SKY BASICO	UND	1
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
4,1	LAMINA CAUCHO NEOPRENO FINO 1/8 3MM X 1,2X1	M2	68,95

ÍTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MAYOR CANTIDAD
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**		
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL COLOR VERDE	M2	122,28
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARALELA DOBLE BASICA	UND	3
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JINETE BASICO	UND	3
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABDOMEN INCLINADA BASICA	UND	3

RESUELVE:

Modificar las cantidades iniciales del Contrato de obra No. CO1. PCCNTR. 8041643 y pactar los precios para los nuevos ítems, sin que ello modifique el valor inicial del contrato, tal y como se consigna en el anexo Nº1 el cual hace parte integral de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Secretario de Infraestructura

WILSON ALVAREZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

ALFONSO VEGA ALBINO
RL/. CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S

Proyectó: Ing. Wilson Álvarez Gómez - Aspectos técnicos.
Revisó: Ludwing Oswaldo Osorio Gómez- Aspectos Jurídicos

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

ANEXO No.1 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.1

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1				CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD		CANTIDAD	VALOR TOTAL
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
1	**PRELIMINARES**										
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	69,75	$ 4.538,00	$ 316.526,00		$ -	52,53	$ 238.381,00	122,28	$ 554.907,00
1,2	DESMONTE DE GIMNASIO Y/O JUEGOS INFANTILES (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	UND	3	$ 165.701,00	$ 497.103,00		$ -		$ -	3	$ 497.103,00
1,3	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE PROFUNDIDAD 0 A0,5M	M3	6,98	$ 75.867,00	$ 529.552,00		$ -	5,24	$ 397.543,00	12,22	$ 927.095,00
1,4	EXTENSION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	6,98	$ 42.323,00	$ 295.415,00		$ -	5,23	$ 221.349,00	12,21	$ 516.764,00
				SUBTOTAL	$ 1.638.596,00	**SUBTOTAL**	$ -	**SUBTOTAL**	$ 857.273,00	**SUBTOTAL**	$ 2.495.869,00
2	**ELEMENTOS BIOSALUDDABLES**										
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIO BIOSALUDABLES PARA ADULTOS Y/O NIÑOS (TWISTER)	UND	4	$ 4.908.580,00	$ 19.634.320,00	1	$ 4.908.580,00	0	$ -	3	$ 14.725.740,00
2,2	FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	UND	3	$ 4.363.045,00	$ 13.089.135,00		$ -	0	$ -	3	$ 13.089.135,00
2,3	SKY BASICO	UND	4	$ 7.042.225,00	$ 28.168.900,00	1	$ 7.042.225,00	0	$ -	3	$ 21.126.675,00
2,4	BICICLETA RECUNBENT	UND	3	$ 11.815.245,00	$ 35.445.735,00		$ -		$ -	3	$ 35.445.735,00
				SUBTOTAL	$ 96.338.090,00	**SUBTOTAL**	$ 11.950.805,00	**SUBTOTAL**	$ -	**SUBTOTAL**	$ 84.387.285,00
3	**ELEMENTOS EN CONCRETO**										
3,1	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,1M, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA - CONTEMPLA ACABADOS DEL CONCRETO COMO ESCOBEADO	M2	69,75	$ 239.700,00	$ 16.719.075,00		$ -	52,53	$ 12.591.441,00	122,28	$ 29.310.516,00
				SUBTOTAL	$ 16.719.075,00	**SUBTOTAL**	$ -	**SUBTOTAL**	$ 12.591.441,00	**SUBTOTAL**	$ 29.310.516,00
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**										
4,1	LAMINA CAUCHO NEOPRENO FINO 1/8 3MM X 1,2X1	M2	68,95	$ 158.230,00	$ 10.909.959,00	68,95	$ 10.909.959,00		$ -	0	$ -
				SUBTOTAL	$ 10.909.959,00	**SUBTOTAL**	$ 10.909.959,00	**SUBTOTAL**	$ -	**SUBTOTAL**	$ -
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL COLOR VERDE	M2		$ 120.853,00	$ -		$ -	122,28	$ 14.777.905,00	122,28	$ 14.777.905,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARALELA DOBLE BASICA	UND		$ 6.384.313,00				3	$ 19.152.939,00	3	$ 19.152.939,00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JINETE BASICO	UND		$ 6.734.181,00				3	$ 20.202.543,00	3	$ 20.202.543,00
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABDOMEN INCLINADA BASICA	UND		$ 5.077.515,00				3	$ 15.232.545,00	3	$ 15.232.545,00
		UND			$ -				$ -		
						SUBTOTAL	$ -	**SUBTOTAL**	$ 69.365.932,00	**SUBTOTAL**	$ 69.365.932,00
				TOTAL PROYECTO	$ 125.605.720,00	MENOR VALOR	$ 22.860.764,00	MAYOR VALOR	$ 82.814.646,00	COSTO TOTAL	$ 185.559.602,00

ADMINISTRACION	A	29%
IMPREVISTOS	I	1%
UTILIDAD	U	5%
	TOTAL AIU	35%

ING. ALFONSO VEGA ALBINO
R/L CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S

JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Secretario de Infraestructura

WILSON ALVAREZ GOMEZ
Apoyo a la Supervisión

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **PRELIMINARES**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	**Localización y replanteo**	M2	122,28

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Gym tipo twistter	1,80	2,50	1,00		4,50
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	3,60	1,50	1,00		5,40
Gym tipo SKY BASICO	3,60	2,00	1,00		7,20
Gym BICICLETA RECUMBENT	3,60	3,30	1,00		11,88
GYM BANCA DE ABDOMEN	3,60	1,50	1,00		5,40
GYM JINETE BASICO	1,80	2,50	1,00		4,50
GYM PARALELA DOBLE	3,60	1,80	1,00		6,48
PALERMO II					
Gym tipo twistter	1,80	1,80	1,00		3,24
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	2,50	1,80	1,00		4,50
Gym tipo SKY BASICO	4,30	2,00	1,00		8,60
Gym BICICLETA RECUMBENT	4,30	2,50	1,00		10,75
GYM BANCA DE ABDOMEN	4,30	1,50	1,00		6,45
GYM JINETE BASICO	2,50	2,50	1,00		6,25
GYM PARALELA DOBLE	2,50	1,80	1,00		4,50
EL PARAISO					
Gym tipo twistter	1,80	1,80	1,00		3,24
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	2,50	1,60	1,00		4,00
Gym tipo SKY BASICO	2,50	2,00	1,00		5,00
Gym BICICLETA RECUMBENT	3,30	2,50	1,00		8,25
GYM BANCA DE ABDOMEN	2,50	1,50	1,00		3,75
GYM JINETE BASICO	2,50	1,20	1,00		3,00
GYM PARALELA DOBLE	3,00	1,80	1,00		5,40
				TOTAL	**122,28**

CONTRATADO INICIAL	**69,75**
MAYOR VALOR	**52,53**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES







Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **PRELIMINARES**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	**Desmonte de gimnasios y/o juegos infantiles (Incluye retiro y disposición final)**	UND	3,00

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
Palermo II					0,00
Desmonte de elementos metalicos existentes			2,00		2,00
El paraiso					
Desmonte de elementos metalicos existentes			1,00		1,00
				TOTAL	3,00

CONTRATADO INICIAL	3,00
IGUAL VALOR	0,00

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES



Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:	**PRELIMINARES**


DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	**Excavación en material común de profundidad 0.0 a 0.50m**	M3	12,22

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Gym tipo twistter	1,80	2,50	1,00	0,10	0,45
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	3,60	1,50	1,00	0,10	0,54
Gym tipo SKY BASICO	3,60	2,00	1,00	0,10	0,72
Gym BICICLETA RECUMBENT	3,60	3,30	1,00	0,10	1,19
GYM BANCA DE ABDOMEN	3,60	1,50	1,00	0,10	0,54
GYM JINETE BASICO	1,80	2,50	1,00	0,10	0,45
GYM PARALELA DOBLE	3,60	1,80	1,00	0,10	0,65
PALERMO II					
Gym tipo twistter	1,80	1,80	1,00	0,10	0,32
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	2,50	1,80	1,00	0,10	0,45
Gym tipo SKY BASICO	4,30	2,00	1,00	0,10	0,86
Gym BICICLETA RECUMBENT	4,30	2,50	1,00	0,10	1,08
GYM BANCA DE ABDOMEN	4,30	1,50	1,00	0,10	0,65
GYM JINETE BASICO	2,50	2,50	1,00	0,10	0,63
GYM PARALELA DOBLE	2,50	1,80	1,00	0,10	0,45
EL PARAISO					
Gym tipo twistter	1,80	1,80	1,00	0,10	0,32
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	2,50	1,60	1,00	0,10	0,40
Gym tipo SKY BASICO	2,50	2,00	1,00	0,10	0,50
Gym BICICLETA RECUMBENT	3,30	2,50	1,00	0,10	0,83
GYM BANCA DE ABDOMEN	2,50	1,50	1,00	0,10	0,38
GYM JINETE BASICO	2,50	1,20	1,00	0,10	0,30
GYM PARALELA DOBLE	3,00	1,80	1,00	0,10	0,54
				TOTAL	**12,22**

CONTRATADO INICIAL	**6,98**
MAYOR VALOR	**5,24**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

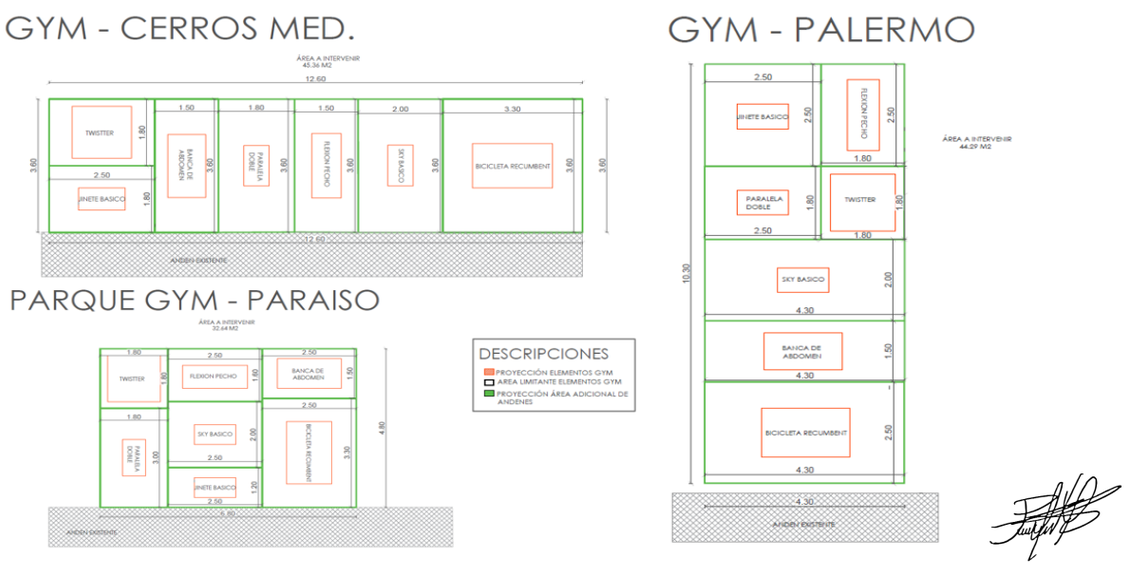

Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **PRELIMINARES**

DATOS ESPECIFICOS


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,4	**Extensión y compactación de material de excavación**	M3	12,21

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Gym tipo twistter	1,80	2,50	1,00	0,10	0,45
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	3,60	1,50	1,00	0,10	0,54
Gym tipo SKY BASICO	3,60	2,00	1,00	0,10	0,72
Gym BICICLETA RECUMBENT	3,60	3,30	1,00	0,10	1,19
GYM BANCA DE ABDOMEN	3,60	1,50	1,00	0,10	0,54
GYM JINETE BASICO	1,80	2,50	1,00	0,10	0,45
GYM PARALELA DOBLE	3,60	1,80	1,00	0,10	0,65
PALERMO II					
Gym tipo twistter	1,80	1,80	1,00	0,10	0,32
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	2,50	1,80	1,00	0,10	0,45
Gym tipo SKY BASICO	4,30	2,00	1,00	0,10	0,86
Gym BICICLETA RECUMBENT	4,30	2,50	1,00	0,10	1,08
GYM BANCA DE ABDOMEN	4,30	1,50	1,00	0,10	0,65
GYM JINETE BASICO	2,50	2,50	1,00	0,10	0,63
GYM PARALELA DOBLE	2,50	1,80	1,00	0,10	0,45
EL PARAISO					
Gym tipo twistter	1,80	1,80	1,00	0,10	0,32
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	2,50	1,60	1,00	0,10	0,40
Gym tipo SKY BASICO	2,50	2,00	1,00	0,10	0,50
Gym BICICLETA RECUMBENT	3,30	2,50	1,00	0,10	0,83
GYM BANCA DE ABDOMEN	2,50	1,50	1,00	0,10	0,38
GYM JINETE BASICO	2,50	1,20	1,00	0,10	0,30
GYM PARALELA DOBLE	3,00	1,80	1,00	0,10	0,54
				TOTAL	**12,21**


CONTRATADO INICIAL	**6,98**
MAYOR VALOR	**5,23**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES


GYM - CERROS MED.



GYM - PALERMO

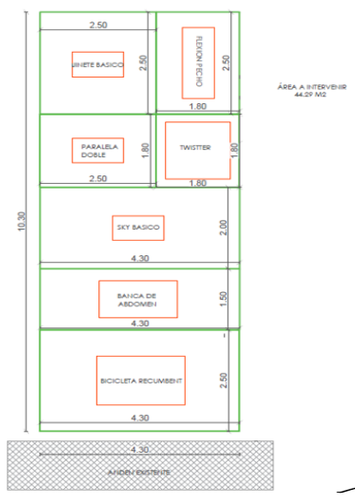

PARQUE GYM - PARAISO





Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **ELEMENTOS BIOSALUDABLES**

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,10	**Suministro e instalación de gimnasios biosaludables para adultos y/o niños (Tipo twistter)**	UND	3,00


DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
PALERMO II					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
EL PARAISO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
				TOTAL	**3,00**


CONTRATADO INICIAL	**4,00**
MENOR VALOR	**1,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

Dimensiones: 1,4 x 1,4 mt
Altura: 160 cm
Peso: 75 Kg

Zona de Seguridad



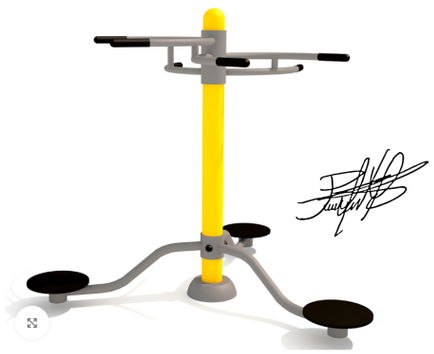

Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **ELEMENTOS BIOSALUDABLES**

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,20	**Suministro, transporte e instalación de gimnasio bisaludable tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO L:1,28 A:0,63 H:1,00M**	UND	3,00

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
PALERMO II					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
EL PARAISO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
				TOTAL	**3,00**

CONTRATADO INICIAL	**3,00**
IGUAL VALOR	**0,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES



FLEXIÓN PECHO TRICEPS
SENCILLO

Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **ELEMENTOS BIOSALUDABLES**

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,30	**Suministro, transporte e instalación de gimnasio biosaludable tipo SKY BASICO, dimensiones L:1,10 M, A:0,60 H:1,10M**	UND	3,00

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
PALERMO II					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
EL PARAÍSO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
				TOTAL	**3,00**

CONTRATADO INICIAL	**4,00**
MENOR VALOR	**1,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES



Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **ELEMENTOS BIOSALUDABLES**

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,40	**Suministro, transporte e instalación de gimnasio biosaludable tipo BICICLETA RECUMBENT L:1,75 A:0,97 H:1,17M**	UND	3,00

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
PALERMO II					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
EL PARAÍSO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
				TOTAL	**3,00**

CONTRATADO INICIAL	**3,00**
IGUAL VALOR	**0,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES



Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **ELEMENTOS EN CONCRETO**


DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3,10	**Placa maciza en concreto de 3.000 PSI e=0,10m. Incluye malla eléctrosoldada- contempla acabados del concreto como escobeado y ratoneado**	M2	**122,28**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Gym tipo twistter	1,80	2,50	1,00		4,50
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	3,60	1,50	1,00		5,40
Gym tipo SKY BASICO	3,60	2,00	1,00		7,20
Gym BICICLETA RECUMBENT	3,60	3,30	1,00		11,88
GYM BANCA DE ABDOMEN	3,60	1,50	1,00		5,40
GYM JINETE BASICO	1,80	2,50	1,00		4,50
GYM PARALELA DOBLE	3,60	1,80	1,00		6,48
PALERMO II					
Gym tipo twistter	1,80	1,80	1,00		3,24
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	2,50	1,80	1,00		4,50
Gym tipo SKY BASICO	4,30	2,00	1,00		8,60
Gym BICICLETA RECUMBENT	4,30	2,50	1,00		10,75
GYM BANCA DE ABDOMEN	4,30	1,50	1,00		6,45
GYM JINETE BASICO	2,50	2,50	1,00		6,25
GYM PARALELA DOBLE	2,50	1,80	1,00		4,50
EL PARAISO					
Gym tipo twistter	1,80	1,80	1,00		3,24
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	2,50	1,60	1,00		4,00
Gym tipo SKY BASICO	2,50	2,00	1,00		5,00
Gym BICICLETA RECUMBENT	3,30	2,50	1,00		8,25
GYM BANCA DE ABDOMEN	2,50	1,50	1,00		3,75
GYM JINETE BASICO	2,50	1,20	1,00		3,00
GYM PARALELA DOBLE	3,00	1,80	1,00		5,40
				TOTAL	**122,28**

CONTRATADO INICIAL	**69,75**
MAYOR VALOR	**52,53**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

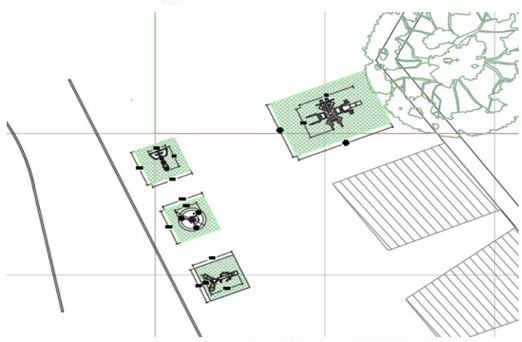

Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA: Agosto 2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: OBRAS COMPLEMENTARIAS


DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4,10	**Suministro e instalación de Lamina Caucho Neopreno Fino 1/8 3mm X 1.20m X 1m Original**	M2	**0,00**

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Gym tipo twistter	0,00	2,00	1,00		0,00
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	0,00	1,50	1,00		0,00
Gym tipo SKY BASICO	0,00	2,00	1,00		0,00
Gym BICICLETA RECUMBENT	0,00	2,50	1,00		0,00
PALERMO II					
Gym tipo twistter	0,00	2,00	1,00		0,00
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	0,00	1,50	1,00		0,00
Gym tipo SKY BASICO	0,00	2,00	1,00		0,00
Gym BICICLETA RECUMBENT	0,00	2,50	1,00		0,00
EL PARAISO					
Gym tipo twistter	0,00	2,00	1,00		0,00
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	0,00	1,50	1,00		0,00
Gym tipo SKY BASICO	0,00	2,00	1,00		0,00
Gym BICICLETA RECUMBENT	0,00	2,50	1,00		0,00
				TOTAL	**0,00**

CONTRATADO INICIAL	**68,95**
MENOR VALOR	**68,95**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

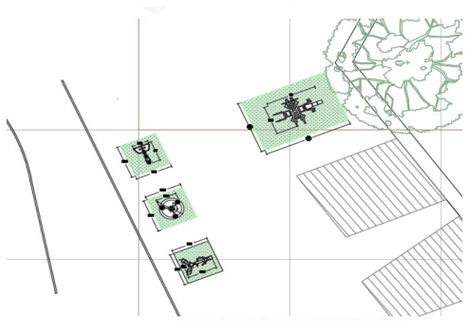

Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **ELEMENTOS BIOSALUDABLES**

DATOS ESPECIFICOS


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL COLOR VERDE	M2	122,28

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Gym tipo twistter	1,80	2,50	1,00		4,50
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	3,60	1,50	1,00		5,40
Gym tipo SKY BASICO	3,60	2,00	1,00		7,20
Gym BICICLETA RECUMBENT	3,60	3,30	1,00		11,88
GYM BANCA DE ABDOMEN	3,60	1,50	1,00		5,40
GYM JINETE BASICO	1,80	2,50	1,00		4,50
GYM PARALELA DOBLE	3,60	1,80	1,00		6,48
PALERMO II					
Gym tipo twistter	1,80	1,80	1,00		3,24
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	2,50	1,80	1,00		4,50
Gym tipo SKY BASICO	4,30	2,00	1,00		8,60
Gym BICICLETA RECUMBENT	4,30	2,50	1,00		10,75
GYM BANCA DE ABDOMEN	4,30	1,50	1,00		6,45
GYM JINETE BASICO	2,50	2,50	1,00		6,25
GYM PARALELA DOBLE	2,50	1,80	1,00		4,50
EL PARAISO					
Gym tipo twistter	1,80	1,80	1,00		3,24
Gym tipo FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO	2,50	1,60	1,00		4,00
Gym tipo SKY BASICO	2,50	2,00	1,00		5,00
Gym BICICLETA RECUMBENT	3,30	2,50	1,00		8,25
GYM BANCA DE ABDOMEN	2,50	1,50	1,00		3,75
GYM JINETE BASICO	2,50	1,20	1,00		3,00
GYM PARALELA DOBLE	3,00	1,80	1,00		5,40
				TOTAL	**122,28**


CONTRATADO INICIAL	**0,00**
MAYOR VALOR	**122,28**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES


GYM - CERROS MED.



GYM - PALERMO

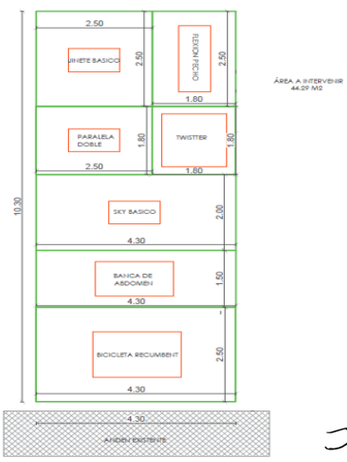

PARQUE GYM - PARAISO





Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **ELEMENTOS BIOSALUDABLES**


DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARALELA DOBLE BASICA	UND	3,00

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
PALERMO II					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
EL PARAÍSO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
				TOTAL	**3,00**

CONTRATADO INICIAL	**0,00**
MAYOR VALOR	**3,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES



Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **ELEMENTOS BIOSALUDABLES**

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JINETE BASICO	UND	3,00

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
PALERMO II					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
EL PARAISO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
				TOTAL	**3,00**

CONTRATADO INICIAL	**0,00**
MAYOR VALOR	**3,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES



Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	

	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DURANTE LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	**FECHA: Agosto 2025**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO: **ELEMENTOS BIOSALUDABLES**


DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABDOMEN INCLINADA BASICA	UND	3,00

DESCRIPCION	Ancho (m)	Largo (m)	Cantidad (und)	Espesor (m)	Subtotal
CERROS DEL MEDITERRANEO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
PALERMO II					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
EL PARAISO					
Elementos de gimnasios aire libre biosaludable			1,00		1,00
				TOTAL	**3,00**

CONTRATADO INICIAL	**0,00**
MAYOR VALOR	**3,00**

OBSERVACIONES O DETALLES GENERALES

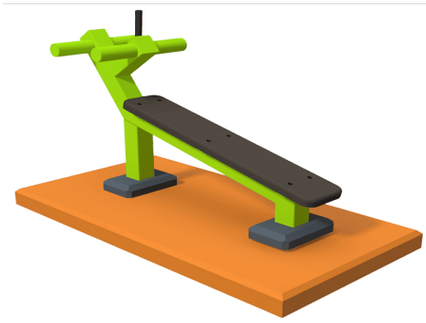

Elaboró:	Ing. Pablo Mendez	Cargo:		Firma:	
