ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

PROYECTO

"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
2025

SECTOR: Agricultura y desarrollo rural					
"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"					
Item	**DOCUMENTO**	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Portada y subportada				
CARTAS Y CERTIFICACIONES					
2	Carta de solicitud de recursos para el proyecto por parte del secretario de la dependencia				
3	Certificado de inclusión y concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal				Puerto Asís: la gran empresa que soñamos (2024 – 2027)
4	Certificado de registro del proyecto en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP)				
5	Certificado de revisión metodológica de condiciones y requisitos mínimos del banco de proyectos municipal				
6	Certificado de no financiación con otras fuentes firmado por la secretaria correspondiente				
7	Certificado donde indique que los precios unitarios corresponden al promedio de la región				
8	Certificado cumplimiento características técnicas apropiadas vigentes para formulación y ejecución.				
9	Certificado de Sostenibilidad y operación del proyecto.				
10	Certificado de Viabilidad del proyecto				
11	Certificado en el cual conste que el plan de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con el plan de desarrollo de las entidades territoriales				Para proyectos de inversión localizados en resguardos indígenas o territorios colectivos. Suscrito por el secretario de Planeación
12	Acta de socialización con los beneficiarios.				
13	Concepto Técnico Sectorial				
CERTIFICACIONES ADICIONALES PARA PROYECTOS CON COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA					
14	Certificado del funcionario competente de la entidad territorial donde se ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) según lo señalado en la normativa vigente.				Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del suelo.
15	Certificado en el cual conste que se cumplen las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida				
16	Certificado suscrito por los prestadores de servicios públicos domiciliarios o la constancia del representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto en el cual conste que los predios por intervenir cuentan con dicha disponibilidad.				Para los proyectos de inversión que requieran para su funcionamiento y operación la prestación de servicios públicos
17	Análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, según la escala de diseño del proyecto.				
MARCO LÓGICO					
18	Perfil del proyecto que contenga: objeto; descripción de la necesidad; identificación y descripción del problema y sus objetivos; descripción y caracterización de la población afectada y objetivo; especificaciones técnicas del servicio a contratar; alcance del proyecto con metas e indicadores; valor y plan de inversión; cronograma de actividades indicando fecha estimada de inicio de actividades; fuente de financiación				
19	Documento de especificaciones técnicas				
20	Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, el análisis de participantes, los objetivos —tanto general como específicos—, los análisis de alternativas y el cronograma de actividades físicas y financieras.				
21	Proyecto de inversión formulado en la Metodología General Ajustada (MGA).				

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

PROYECTO

"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

JORGE HERLINTO GARCÍA LÓPEZ
ALCALDE 2024-2027

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
2025

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

22	Árbol de Problemas - Objetivos **"Incluidos en el SOPORTE MGA"**				
23	Proyección de Beneficios Sociales				
24	Presupuesto GENERAL- debidamente firmado				
25	Presupuesto UNITARIOS discriminado en materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y otros. Incluir pie de página datos del secretario, nombre, tarjeta profesional firmado				
26	Análisis de precios unitarios – A.P.U.				
27	Cronograma de Actividades debidamente firmado				
	ANEXOS				
28	Cotizaciones				
29	Estudios técnicos (diseños, planos, topografía, hidrológicos, eléctrico, etc.) legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional competente con su respectiva matrícula profesional				
30	Permisos y/o licencias				
31	Memorial de responsabilidad				
32	Documento de Donación de Estudios Técnicos en favor de la alcaldía				
33	Registro fotográfico				
34	Censo DANE, SISBEN o cualquier fuente de información de donde hayan obtenido la población afectada y objetivo				

	REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCLUYAN LA COMPRA DE PREDIOS COMO UNO DE SUS COMPONENTES				
35	Plano de localización				
36	Estudio de alternativas de los predios, en el cual se identifique y sustente técnica, jurídica y financieramente la selección de los predios por comprar.				
37	Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del suelo, se requiere el certificado del funcionario competente de la entidad territorial donde se ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) según lo señalado en la normativa vigente. También debe especificar los usos, el tratamiento, los índices de ocupación y la construcción aplicable a los predios seleccionados.				
38	Avalúo comercial de los predios seleccionados, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por persona natural o jurídica competente				
39	Estudio de títulos donde se demuestre que el predio está libre de cualquier tipo de gravamen o limitación a la propiedad para llevar a cabo la compra. El estudio de títulos cuando se trate de proyectos de inversión de infraestructura de transporte, cuya adquisición de inmuebles se prevea mediante saneamiento automático por los motivos de utilidad pública e interés social en el marco de la Ley 1682 de 2013.				

Los documentos deben radicarse escaneados en PDF en Banco de Proyectos, de manera individual y organizado de acuerdo al orden en que se presenta esta lista de chequeo.

NOMBRE: JENNIFER ANDREA QUINTERO GUTIÉRREZ **CARGO:** JEFE DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		Firma:	
Fecha de Revisión 1:		**Fecha de Revisión 2:**	
Fecha de Devolución 1:		**Fecha de Devolución 2:**	

CARTAS Y CERTIFICACIONES

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Puerto Asis, 16 de octubre de 2025

Doctor
JORGE HERLINTO GARCÍA LÓPEZ
Alcalde Municipal
Puerto Asís

Asunto: Presentación y solicitud de recursos.

Reciba un cordial saludo.

Presento a usted el proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."**, con el propósito de ser analizado para su viabilización, priorización y aprobación.

Año	FUENTES DE FINANCIACIÓN			
	Estampilla Pro Desarrollo fronterizo	Otros	SGP - Libre Inversión	TOTAL
2025	$29.500.000		$10.300.000	$39.800.000
TOTAL	**$29.500.000**		**$10.300.000**	**$39.800.000**

Valor solicitado para el proyecto: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. **($39.800.000)**

Entidad ejecutora propuesta: Alcaldía Municipal de Puerto Asís

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO VARGAS VELÁSQUEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Carlos Eduardo Vargas Velásquez	Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Elaboró	Nini Johana Gaviria	Profesional de apoyo Secretaría de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."**, se encuentra incluido y en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal "Puerto Asís la gran empresa que soñamos" (2024-2027)

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:	"Puerto Asís la gran empresa que soñamos" (2024-2027)
SECTOR:	Agricultura y desarrollo rural
PROGRAMA:	Inclusión productiva de productores rurales.
SUBPROGRAMA:	Apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina familiar y comunitaria
PROYECTO POAI:	Fortalecimiento a asociaciones de pequeños productores agropecuarios
FUENTE:	SGP Libre inversión, Estampilla pro desarrollo fronterizo

Para constancia se firma en Puerto Asis, a los 17 días del mes de octubre de 2025.

CARLOS EDUARDO VARGAS VELÁSQUEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Carlos Eduardo Vargas Velásquez	Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Elaboró	Nini Johanna Gaviria	Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

LA JEFE DEL BANCO DE PROYECTOS
DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA

Que en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) se encuentra registrado el proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."**

FINANCIACION DEL PROYECTO		FUENTE FINANCIERA
RECURSOS PROPIOS	$10.300.000	SGP Libre inversión
OTROS RECURSOS	$29.500.000	Estampilla pro desarrollo fronterizo
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$39.800.000**	

ID 1519978

Para constancia se firma en Puerto Asis, a los 17 días del mes de octubre de 2025.

JENNIFER ANDREA QUINTERO GUTIERREZ
Jefe del Banco de Proyectos

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

LA JEFE DEL BANCO DE PROYECTOS
DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA

Que el proyecto denominado: **"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."** con registro **ID 1519978** de creación de la fecha 16 de julio de 2025, ha sido sometido a revisión metodológica, certificación de inclusión dentro del Plan de Desarrollo Municipal "Puerto Asis la gran empresa que soñamos" Puerto Asis 2024 – 2027; por lo tanto, cumple con las condiciones y requisitos mínimos derivados del Banco de Proyectos y definidos por este

Para constancia se firma en Puerto Asis, a los 17 dias del mes de octubre de 2025.

JENNIFER ANDREA QUINTERO GUTIERREZ
Jefe del Banco de Proyectos

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto **"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."**, a la fecha no le ha asignado recursos para su financiación total o parcial de otros recursos del departamento, así mismo certifico que dicha fase de este proyecto no se ha ejecutado, ni se encuentran en ejecución.

Para constancia se firma en Puerto Asis, a los 17 días del mes de octubre de 2025.

CARLOS EDUARDO VARGAS VELÁSQUEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Carlos Eduardo Vargas Velásquez	Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Elaboró	Nini Johanna Gaviria Garces	Profesional de apoyo a la Gestión Administrativa	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que los precios unitarios de las actividades a realizar para el proyecto **"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."**, corresponden al promedio de la región y son utilizados para este tipo de acciones.

Para constancia se firma en Puerto Asis, a los 17 días del mes de octubre de 2025.

CARLOS EDUARDO VARGAS VELÁSQUEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Carlos Eduardo Vargas Velásquez	Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Elaboró	Nini Johanna Gaviria Garces	Profesional de apoyo a la Gestión Administrativa	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."**, cumple con las características técnicas apropiadas vigentes para la formulación y ejecución de este tipo de proyectos.

Para constancia se firma en Puerto Asis, a los 17 días del mes de octubre de 2025.

CARLOS EDUARDO VARGAS VELASQUEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Carlos Eduardo Vargas Velásquez	Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Elaboró	Nini Johanna Gaviria Garces	Profesional de apoyo a la Gestión Administrativa	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."**, con ID **1519978** cumple con las características técnicas y financieras apropiadas para la ejecución del mismo, y está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Municipal "Puerto Asis la gran empresa que soñamos" Puerto Asis 2024 – 2027

Dadas las condiciones anteriores, la administración municipal se compromete a realizar el acompañamiento requerido durante el desarrollo de este.

FINANCIACION DEL PROYECTO		FUENTE FINANCIERA
RECURSOS PROPIOS	$10.300.000	SGP Libre inversión
OTROS RECURSOS	$29.500.000	Estampilla pro desarrollo fronterizo
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$39.800.000**	

El tema de **SOSTENIBILIDAD Y OPERACIÓN DEL PROYECTO** en cuanto a *FUNCIONAMIENTO Y OPERABILIDAD* del mismo una vez este sea ejecutado estará a cargo de la **Corporación Centro Provincial De Gestión Agroempresarial de los Puertos.**

Para constancia se firma en Puerto Asis, a los 17 dias del mes de octubre de 2025.

JORGE HERLINTO GARCÍA LÓPEZ
Alcalde Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Carlos Eduardo Vargas Velásquez	Sec. de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Elaboró	Nini Johana Gaviria	Profesional de apoyo Secretaria de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y/disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."** con **ID 1519978 cumple** con las características técnicas y financieras apropiadas para la ejecución del mismo, y está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Municipal "Puerto Asis la gran empresa que soñamos" Puerto Asís 2024 – 2027, y cuenta con **VIABILIDAD.**

FINANCIACION DEL PROYECTO		FUENTE FINANCIERA
RECURSOS PROPIOS	$10.300.000	SGP Libre inversión
OTROS RECURSOS	$29.500.000	Estampilla pro desarrollo fronterizo
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$39.800.000**	

Para constancia se firma en Puerto Asís, a los 17 días del mes de octubre de 2025.

JORGE HERLINTO GARCÍA LÓPEZ
Alcalde Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Carlos Eduardo Vargas Velásquez	Sec. de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Elaboró	Nini Johana Gaviria	Profesional de apoyo Secretaría de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

EL SUSCRITO GERENTE DE LA CORPORACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE LOS PUERTOS

CERTIFICA QUE:

La Asociación Ecoturística Agropecuaria Casaldi con NIT 901006949 -1 de la vereda la Estación del municipio de Puerto Asís, Putumayo cuenta con cincuenta (50) pequeños productores los cuales tienen 24.500 plántulas en vivero las cuales serán injertadas con la variedad de CACAO CLON CCN 51, dichos productores cuentan con terreno, tiempo y disponibilidad para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."

Para constancia se firma en el municipio de Puerto Asís - Putumayo, a los dieciséis (16) días del mes de octubre del 2025.

HENRY ALBERTO SOLARTE ACOSTA
TP522091[illegible]
Gerente Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de Los Puertos.
Celular:3144073681
Correo: c.provincial@puertoasis-putumayo.gov.co

CONCEPTO TÉCNICO SECTORIAL

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

CONCEPTO TÉCNICO SECTORIAL

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

CERTIFICA

Que el municipio de Puerto Asís, ubicado en el departamento de Putumayo, de la región Centro Sur de Colombia, realizó la formulación, estructuración y registro en el Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIP) del proyecto de inversión denominado: **"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."** con **ID 1519978**, el cual fue viabilizado bajo los siguientes criterios:

ASPECTOS LEGALES Y/O JURÍDICOS

Articulación con los planes y la política pública

Este aspecto se establece de acuerdo con lo determinado en la Ley orgánica 152 de 1994, que permite analizar el impacto, el cual se define como la contribución efectiva que produce el proyecto en el cumplimiento de los objetivos, los fines y las metas locales, sectoriales y regionales de los planes de desarrollo municipal, departamental y Nacional. Esta dimensión posibilita identificar el aporte del proyecto al avance de los indicadores de resultado y, en particular, a los que contribuyen a disminuir necesidades básicas insatisfechas (NBI), por lo que debe responder las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están articulados a las líneas estratégicas del plan de desarrollo o a los instrumentos propios de planeación de grupos étnicos?	Si
¿El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s) de los indicadores de resultado del programa en el cual se clasifica?	Si

Dado lo anterior, y una vez realizado el análisis de la problemática presentada dentro de la jurisdicción del municipio, la Secretaria de Planeación, desarrollo y medio ambiente realizó la verificación de concordancia del proyecto con las políticas nacionales, departamentales y municipales, así:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
PROGRAMA	Putumayo un gobierno en serio 2025-2027
TRANSFORMACION	Agricultura y desarrollo rural
PILAR	Económica
CATALIZADOR	Inclusión productiva de pequeños productores rurales
COMPONENTE	Putumayo un gobierno en serio 2025-2027

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	Putumayo un gobierno en serio 2025-2027
DIMENSIÓN	Agricultura y desarrollo rural
COMPONENTE	Económica
PROGRAMA	Inclusión productiva de pequeños productores rurales

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	"Puerto Asís la gran empresa que soñamos" (2024-2027)
ESTRATEGIA	Agricultura y desarrollo rural
SECTOR	Inclusión productiva de productores rurales.
PROGRAMA	Apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina familiar y comunitaria
SUBPROGRAMA	Fortalecimiento a asociaciones de pequeños productores agropecuarios
PROYECTO EN POAI	SGP Libre inversión, Estampilla pro desarrollo fronterizo

Una vez realizado el análisis de la anterior información se determina que el proyecto es **VIABLE** jurídicamente.

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE FORMULACIÓN

Este aspecto de la viabilidad para el proyecto se establece de acuerdo con lo determinado en la coherencia en la secuencia de análisis, compuesta por el problema central, el objetivo general, los objetivos específicos, los productos, las actividades e indicadores; así como su consistencia entre la magnitud del problema, las metas del indicador del objetivo general, la población objetivo, el estudio de necesidades y las metas de los indicadores principales, por lo que debe responder las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿Al contrastar la alternativa de solución seleccionada con el problema identificado y con los objetivos propuestos, se encuentra articulación y coherencia entre todos los elementos analizados?	Si
¿La magnitud del problema mide de manera adecuada el problema central planteado?	Si
¿El(los) indicador(es) del objetivo general puede(n) ser comparado(s) con la magnitud del problema para establecer el resultado del proyecto?	Si
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Si
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Si
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Si
¿La alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización, cuantificación y caracterización de la población objetivo?	Si

Una vez realizado el análisis de la anterior información se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos metodológicos de formulación

ASPECTOS TÉCNICOS DE ESTRUCTURACIÓN

Este aspecto de la viabilidad para el proyecto se establece de acuerdo con lo determinado con la interrelación de la información desde el punto de vista tecnológico —es decir, de la combinación entre características del entorno, las técnicas y los materiales por utilizar, los estándares de calidad y los efectos negativos producidos—, que permite establecer la magnitud de la intervención traducida en las metas de producto, el costeo de sus productos y actividades y el horizonte de tiempo para la intervención, por lo que debe responder las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico y los soportes correspondientes según la intervención que se adelantará?	Si
¿El costo unitario de los productos está dentro de los precios de mercado según la región considerada y los estándares de calidad que lo determinan?	Si
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Si
¿Las metas de los indicadores de producto son consistentes con sus costos y actividades?	Si
¿Los recursos asignados en las actividades para cada producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas?	Si

Una vez realizado el análisis de la anterior información se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos técnicos de estructuración

ASPECTOS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Este aspecto de la viabilidad para el proyecto permite mediante indicadores de evaluación económica, contrastar la información contenida relacionada con costos, ingresos y beneficios, dentro de un horizonte de tiempo definido. A la vez, en este contexto, se deben analizar los recursos disponibles y las posibles fuentes de financiación.

A continuación se relacionan las posibles fuentes de financiación del proyecto:

Ítem	Código de la Fuente	Nombre de la Fuente	Valor
Fuente 1	16.003.2.3.2.02.02.009.102.1.2.4.3.03	SGP Libre inversión	$10.300.000
Fuente 2	16.003.2.3.2.02.02.009.101.1.2.3.1.19	Estampilla pro desarrollo fronterizo	$29.500.000
Fuente 3			
VALOR TOTAL			**$39.800.000**

Lo anterior está fundamentado en el Decreto No. 294 del 17 diciembre de 2024, por medio del cual se liquidó el presupuesto general de rentas, ingresos y gastos del municipio de Puerto Asís, Putumayo, para la vigencia fiscal de 2025, y del cual se proyectaron los recursos necesarios para cumplir con el Plan de Acción de la dependencia, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto aprobado mediante Acuerdo No. 12 del 28 de noviembre de 2024, por medio del cual se expidió el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del municipio de Puerto Asís, Putumayo, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Respecto al componente financiero, el Municipio de Puerto Asís, realizó un ejercicio de formulación del proyecto atendiendo los precios de mercado para cada una de las actividades señaladas en el presupuesto, que asciende a **TREINTA Y NUEVA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($39.800.000) M/CTE**, garantizando que los procesos posteriores a la aprobación del proyecto continúen bajo la contratación pública con presentación de oferentes que manifiesten el interés de participar y cumplir el objeto contractual derivado del Proyecto de inversión, financiado de la siguiente manera:

ID Proyecto	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor total
1519978	"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."	Agricultura y desarrollo rural	Factibilidad – Fase 3	$39.800.000
Entidad	**Tipo de recurso**		**Cronograma MGA**	**Valor**
Municipio de Puerto Asis	SGP Libre inversión		2025	$10.300.000
Municipio de Puerto Asis	Estampilla pro desarrollo fronterizo		2025	$29.500.000

Además del componente financiero, el análisis del proyecto debe responder a las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿Los recursos asignados en las actividades para cada producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas?	Si
¿La tasa interna de retorno económica (TIRe) es superior o igual a la tasa social de descuento (TSD)?	Si
¿La relación beneficio costo económico (RBCe) es igual o mayor a uno?	Si
¿El valor presente neto económico (VPNe) es igual o mayor a cero?	Si
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	Si

Una vez realizado el análisis de la evaluación económica del proyecto en la MGA y resumido en la anterior información, se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos de Rentabilidad económica y financiera

ASPECTOS SOCIALES

La iniciativa del proyecto, nace a partir de la necesidad de 50) cincuenta productores rurales de economía rural agrícola (cacao) asociados, por fortalecer.
El presente proyecto pretende fortalecer a un grupo de 50 pequeños productores rurales de cacao asociados de la zona rural del municipio de Puerto Asís, los cuales fueron seleccionados para continuar con el proceso de injertación de plántulas de cacao y mejorar la variedad de cacao en el municipio.

En conclusión, desde el componente social, los 50 pequeños productores se verán beneficiadas del proyecto podrán contar con apoyo la injertación de plántulas, convirtiéndose este particular en un insumo fundamental para determinar el proyecto **VIABLE** en los aspectos sociales.

ASPECTOS AMBIENTALES

Al tratarse de una iniciativa para fortalecer a un grupo de pequeños productores rurales de cacao, el proyecto no produce deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introduce modificaciones considerables o notorias al paisaje, además las actividades incluidas en el presupuesto corresponden a actividades autorizadas en la normativa ambiental y que permita minimizar cualquier afectación ambiental y maximizar los beneficios generados por el proyecto en sus diferentes etapas.

Así mismo se establece que para la ejecución de las actividades del proyecto no se afecta recursos naturales renovables y por ende no se requiere el trámite de permisos o licencias de carácter ambiental que deben ser tramitadas ante la autoridad ambiental CORPOAMAZONIA para su desarrollo.

Con base en lo anterior, se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos ambientales.

SOSTENIBILIDAD

Este aspecto de la viabilidad posibilita determinar si la alternativa de solución se puede mantener en el tiempo bajo todos los aspectos analizados — financieros, sociales, ambientales, técnicos y jurídicos, de acuerdo con la siguiente pregunta:

Pregunta	Respuesta
¿El proyecto contempla la evaluación de la operación del proyecto y se cuenta con el certificado de sostenibilidad financiera?	Si

Dado el análisis del presente documento de viabilidad se puede determinar que el proyecto es sostenible en el tiempo para su ejecución y operación dado que cuenta con la viabilidad jurídica y/o legal, metodológica, técnica, económica y financiera, social y ambiental de acuerdo a la siguiente tabla.

Aspecto	Otorga viabilidad
Aspectos legales y/o jurídicos	Si
Aspectos metodológicos de formulación	Si
Aspectos técnicos de estructuración	Si
Aspectos de rentabilidad económica y fuentes de financiación	Si
Aspectos sociales	Si
Aspectos ambientales	Si

Dado lo anterior **SI** se otorga la **VIABILIDAD** al proyecto de inversión denominado **FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."** con **ID 1519978**
Para constancia se firma en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2025.

CARLOS EDUARDO VARGAS VELÁSQUEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Nini Johanna Gaviria	Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

La administración municipal desde el año 2005 ha velado por el desarrollo y fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio de Puerto Asís, apoyando a los pequeños productores a crecer sus unidades productivas.

Dentro del presente proyecto se pretende apoyar a 50 pequeños productores rurales agrícolas en cacao de la Asociación Agropecuaria Ecoturística CANSALDI de la zona rural veredas La Estación y El Silencio del municipio de Puerto Asís, los cuales fueron seleccionados para continuar con el proceso de injertación de plántulas de cacao y mejorar la variedad de cacao en la asociación CANSALDIL con 50 productores.

Para tal propósito se realizarán las siguientes actividades según presupuesto general:

A1 REALIZAR PROCESO DE ENTREGA DE VARETA DE PARA INJERTACIÓN EN PLÁNTULAS DE CACAO

Objetivo de la actividad

Fortalecer las unidades productivas de los pequeños productores rurales de la Asociación Agropecuaria Ecoturística CANSALDI mediante la entrega de material vegetal (varetas de cacao variedad CCN-51) para la injertación en plántulas, contribuyendo a mejorar la calidad genética, la productividad y la sostenibilidad del cultivo de cacao en las veredas La Estación y El Silencio del municipio de Puerto Asís.

Justificación

El éxito de un vivero y de una plantación de cacao depende en gran medida de la calidad genética y sanitaria del material vegetal utilizado. El uso de varetas certificadas y provenientes de plantas madre seleccionadas garantiza la homogeneidad del cultivo, una mejor adaptación al entorno, y una mayor resistencia a plagas y enfermedades.
La entrega de este material vegetal permitirá a los productores beneficiarios realizar el proceso de injertación con la variedad **CCN-51**, reconocida por su **alta productividad**, **resistencia parcial a enfermedades** como la escoba de bruja y la moniliasis, y su **rápido retorno económico** debido a la precocidad en la producción de frutos.
Esta actividad se enmarca dentro del objetivo municipal de fomentar el desarrollo del sector agropecuario y mejorar las condiciones productivas de los pequeños agricultores del municipio de Puerto Asís.

Descripción técnica de la actividad

La actividad consiste en la entrega de material vegetal (varetas de cacao CCN-51) a 50 productores rurales beneficiarios del proyecto. Las varetas serán recolectadas de plantas madre sanas y con alto potencial genético, asegurando su calidad y pureza varietal.
Cada productor recibirá la cantidad correspondiente de varetas necesarias para el proceso de injertación en sus plántulas de cacao en vivero. Previamente se realizará la verificación del estado sanitario y fisiológico del material vegetal para evitar la propagación de enfermedades.

Especificaciones técnicas del material vegetal (varetas de cacao CCN-51)

- **Variedad:** CCN-51 (Colección Castro Naranjal)
- **Procedencia:** Plantas madre seleccionadas y certificadas, libres de enfermedades.

- **Edad de la planta madre:** Entre 18 meses y 3 años.
- **Longitud de la vareta:** Entre 10 y 15 cm.
- **Número de yemas por vareta:** Mínimo 2 yemas axilares activas.
- **Diámetro promedio:** Entre 0.8 y 1.2 cm.
- **Estado fitosanitario:** Material libre de plagas, hongos y síntomas de enfermedades.
- **Humedad del material:** Mantenerse en condiciones frescas y húmedas hasta el momento del injerto.
- **Empaque:** En bolsas plásticas perforadas o material similar, identificadas y rotuladas por lote.

Procedimiento general de entrega

1. **Selección del material vegetal:** Recolección de varetas de árboles madre seleccionados por vigor, sanidad y productividad.
2. **Corte y preparación:** Las varetas se cortarán con herramientas limpias y desinfectadas, evitando daños en las yemas.
3. **Conservación y transporte:** Se mantendrán en ambiente fresco y húmedo, envueltas en papel húmedo y en bolsas plásticas perforadas para evitar la deshidratación durante el transporte.
4. **Entrega a productores:** Se realizará la entrega formal del material vegetal en sitio previamente acordado con la Asociación CANSALDI, registrando los beneficiarios y las cantidades entregadas.
5. **Asistencia técnica:** Durante la entrega, se brindará orientación básica sobre el manejo y conservación de las varetas hasta su injertación en vivero.

Resultados esperados

- 50 productores rurales beneficiados con material vegetal de alta calidad genética.
- Material vegetal sano y entregado oportunamente para injertación.
- Incremento en la tasa de éxito de injertación en viveros de cacao.
- Fortalecimiento de las capacidades productivas y tecnológicas de la Asociación CANSALDI.
- Mejoramiento de la productividad y sostenibilidad del cultivo de cacao en la zona rural del municipio de Puerto Asís.

Importancia técnica

El uso de varetas de cacao CCN-51 contribuye al mejoramiento del material genético disponible en los viveros locales, favoreciendo la expansión de cultivos más productivos, resistentes y rentables. Esta acción representa un paso fundamental dentro del proceso de modernización y fortalecimiento del sector cacaotero del municipio, garantizando la calidad del material vegetal base para futuras plantaciones.

A2 REALIZAR CAPACITACION SONBRE EL MANEJO AGRONOMICO DE VIVEROS DE CACAO INJERTADO

Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de los pequeños productores pertenecientes a la Asociación Agropecuaria Ecoturística CANSALDI de las veredas La Estación y El Silencio del municipio de Puerto Asís, se desarrollará un proceso de capacitación orientado al manejo agronómico de viveros de cacao injertado. Esta actividad busca promover la adopción de buenas prácticas agrícolas que contribuyan a mejorar la calidad, productividad y sostenibilidad de las unidades productivas de cacao en la región.

Objetivo de la capacitación

Brindar conocimientos teóricos y prácticos a los 50 productores beneficiarios sobre las técnicas adecuadas para el establecimiento, manejo y mantenimiento de viveros de cacao injertado, garantizando la obtención de plántulas de alta calidad genética y fitosanitaria, que aseguren el éxito en la etapa de campo.

Justificación

El manejo adecuado de los viveros constituye una fase fundamental en la cadena productiva del cacao, ya que determina la calidad del material vegetal que será trasplantado a campo definitivo. Muchos productores carecen de formación técnica en aspectos como la selección de patrones, injertación, nutrición vegetal, control de plagas y enfermedades, y manejo de sombra y humedad. Por lo tanto, esta capacitación permitirá mejorar las competencias productivas de los agricultores, optimizar los procesos de injertación y asegurar la sostenibilidad de las plantaciones de cacao CCN-51, contribuyendo al incremento de la productividad y la rentabilidad del cultivo.

Temas a desarrollar

Durante la capacitación se abordarán los siguientes contenidos:

- Importancia del vivero en el sistema productivo de cacao.
- Selección del sitio y preparación del sustrato.
- Tipos de envases y manejo de plántulas.
- Selección de patrones y varetas para injertación.
- Técnicas de injertación (injerto lateral y en púa).
- Manejo agronómico del vivero: riego, fertilización, control de malezas, plagas y enfermedades.
- Condiciones óptimas de sombra y humedad.
- Criterios de selección de plántulas injertadas aptas para trasplante.
- Buenas prácticas agrícolas y medidas fitosanitarias.
- Registros y trazabilidad en el manejo del vivero.

Metodología

La capacitación se desarrollará mediante sesiones teórico-prácticas, con la participación activa de los productores en el manejo directo del material vegetal. Se utilizarán herramientas audiovisuales, demostraciones de campo y guías técnicas impresas.
El evento contará con la orientación de un ingeniero agrónomo o técnico especializado en cacao, quien acompañará a los productores en todo el proceso formativo.

Duración y lugar

La jornada de capacitación tendrá una duración aproximada de **8 horas** distribuidas en una sesión teórica y una práctica de campo, y se realizará en un sitio estratégico de las veredas La Estación y El Silencio, donde los productores puedan observar y aplicar las técnicas aprendidas.

Resultados esperados

- Productores capacitados en el manejo agronómico de viveros de cacao injertado.
- Adopción de prácticas técnicas para la producción de plántulas de alta calidad.
- Incremento en la tasa de éxito de injertación.
- Reducción de pérdidas por manejo inadecuado en vivero.
- Fortalecimiento de las capacidades locales y del proceso organizativo de la Asociación CANSALDI.

Importancia técnica

El fortalecimiento del conocimiento técnico en el manejo de viveros de cacao injertado permitirá a los productores asegurar la sostenibilidad del cultivo, mejorar la calidad del material vegetal y contribuir al desarrollo agropecuario del municipio de Puerto Asis, en concordancia con las políticas de apoyo al sector rural impulsadas por la administración municipal desde el año 2005.

CARLOS EDUARDO VARGAS VELÁSQUEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Nini Johana Gaviria	Profesional de apoyo a la Gestión Administrativa	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

PERFIL DE PROYECTO

I. NOMBRE DEL PROYECTO:

"FORTALECIMIENTO A ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."

II. DESCRIPCCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE ESTABLECER

Los pequeños productores rurales del municipio de Puerto Asis, por muchos años se han dedicado a trabajar en el sector agropecuario, cultivando productos de la región como plátano, yuca, maíz, arroz, asai, cacao, frutos amazónicos y otros cultivos de pan coger, de igual forma se han dedicado a la producción pecuaria con sus unidades productivas Porcícolas, avícolas como pollos de engorde y gallinas ponedoras, ganadería, caprinos, y la piscicultura; siendo estas actividades la principal fuente de ingreso y de seguridad alimentaria para los productores y sus familias. Sin embargo, los productores se enfrentan a diversos factores adversos como cambios climáticos, sociales, disputa de grupos armados, infraestructura vial, y problemas económicos que afectan directa o indirectamente su producción de sus unidades productivas agrícolas y pecuarias, donde dentro de sus necesidades esta mejorar su producción en volumen y calidad del producto final para ser competitivos en el mercado local y regional.

Por lo anterior se trabajará en la línea agrícola con los productores rurales asociados de cacao de la zona rural del municipio de Puerto Asis, donde una de sus principales necesidades es falta de adquisición material vegetal de cacao, y control fitosanitario que les permita ofrecer al mercado un producto de calidad con un buen tamaño, color, textura, además de un mayor rendimiento para una mejor rentabilidad y variedad. Partiendo de esta necesidad se plantea entregar varetas de cacao clon ccn 51, y realizar acompañamiento técnico y talleres. Otra de sus necesidades es la adquisición de conocimiento en temas de siembra tecnificada y procesos adecuados de transformación de la materia prima por lo que es menester de la administración brindar seguimiento, capacitación y visitas para el fortalecimiento del sector.

Mediante la ejecución del presente proyecto se pretende generar un impacto positivo en 50 pequeños productores rurales de cacao de la Asociación Agropecuaria Ecoturística Cansaldi de las veredas La Estación y El Silencio del municipio de Puerto Asis, Putumayo.

III. IDENTIFICACION Y DESCRIPCCION DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

A. PROBLEMA CENTRAL

Limitadas condiciones de producción agrícola en el municipio de Puerto Asis, Putumayo.

B. OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de producción agrícola en el municipio de Puerto Asis, Putumayo.

C. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mejorar prácticas agrícolas por parte del pequeño productor
- Incrementar los servicios de capacitación agrícola
- Fortalecer la innovación tecnológica en el manejo de producción agrícola.
- Dotar de insumos, material vegetal para desarrollar actividades agrícolas de forma adecuada.

IV. POLITICAS TRANSVERSALES

4.1. CARACTERIZACION DE LA POBLACION

CLASIFICACIÓN	DETALLE	NÚMERO DE PERSONAS
Etaria (Edad)	0 a 14 años	
	14 a 26 años	11
	27 a 59 años	30
	Mayor de 60 años	13
Género	Masculino	28
	Femenino	22
Población Vulnerable	Personas en Reincorporación (Acuerdos de Paz)	
	Personas en Reintegración excintegrantes de Grupos Armados Organizados y otros en transito a la vida civil	
	Desplazados	
	Personas con discapacidad	
	Victimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	11

4.2. LOCALIZACIÓN

El proyecto se llevará a cabo en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, con una extensión total de 2.610 Km2, de los cuales 12 Km2 es área urbana y 2.598 Km2 rural, con una altitud promedio de 200 msnm, temperaturas que oscilan entre 24°C y 28°C. Se trabajará con la población rural con 50 productores rurales agrícolas de cacao de la Asociación Agropecuaria Ecoturística Cansaldi de la vereda la Estación y la vereda El Silencio del Municipio De Puerto Asís, Putumayo"

4.3. FOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS

Política Transversal 1	Construcción de Paz
Categoría	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa
Financiador	alcaldía municipio Puerto Asis, Putumayo
Recurso	SGP LIBRE INVERSIÓN - ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO
Total, recursos focalizados en esta fuente de financiación	TREINTA Y NUEVA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($39.800.000) M/CTE
Vigencia	2025

V. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR Y ALCANCE DEL PROYECTO

5.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

La administración municipal desde el año 2005 ha velado por el desarrollo y fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio de Puerto Asís, apoyando a los pequeños productores a crecer sus unidades productivas.

Dentro del presente proyecto se pretende apoyar a 50 pequeños productores rurales agrícolas en cacao de la Asociación Agropecuaria Ecoturística CANSALDI de la zona rural veredas La Estación y El Silencio del municipio de Puerto Asís, los cuales fueron seleccionados para continuar con el proceso de injertación de plántulas de cacao y mejorar la variedad de cacao en la asociación CANSALDIL con 50 productores.

Para tal propósito se realizarán las siguientes actividades según presupuesto general:

A1 REALIZAR ENTREGAR VARETAS DE CACAO CLON CCN 51 PARA INJERTACIÓN A LOS PRODUCTORES CACAOTEROS ASOCIADOS DE LA ZONA RURAL

Objetivo de la actividad

Fortalecer las unidades productivas de los pequeños productores rurales de la Asociación Agropecuaria Ecoturística CANSALDI mediante la entrega de material vegetal (varetas de cacao variedad CCN-51) para la injertación en plántulas, contribuyendo a mejorar la calidad genética, la productividad y la sostenibilidad del cultivo de cacao en las veredas La Estación y El Silencio del municipio de Puerto Asís.

Justificación

El éxito de un vivero y de una plantación de cacao depende en gran medida de la calidad genética y sanitaria del material vegetal utilizado. El uso de varetas certificadas y provenientes de plantas madre seleccionadas garantiza la homogeneidad del cultivo, una mejor adaptación al entorno, y una mayor resistencia a plagas y enfermedades. La entrega de este material vegetal permitirá a los productores beneficiarios realizar el proceso de injertación con la variedad **CCN-51**, reconocida por su **alta productividad**, **resistencia parcial a enfermedades** como la escoba de bruja y la moniliasis, y su **rápido retorno económico** debido a la precocidad en la producción de frutos. Esta actividad se enmarca dentro del objetivo municipal de fomentar el desarrollo del sector agropecuario y mejorar las condiciones productivas de los pequeños agricultores del municipio de Puerto Asís.

Descripción técnica de la actividad

La actividad consiste en la entrega de material vegetal (varetas de cacao CCN-51) a 50 productores rurales beneficiarios del proyecto. Las varetas serán recolectadas de plantas madre sanas y con alto potencial genético, asegurando su calidad y pureza varietal.
Cada productor recibirá la cantidad correspondiente de varetas necesarias para el proceso de injertación en sus plántulas de cacao en vivero. Previamente se realizará la verificación del estado sanitario y fisiológico del material vegetal para evitar la propagación de enfermedades.

Especificaciones técnicas del material vegetal (varetas de cacao CCN-51)

- **Variedad:** CCN-51 (Colección Castro Naranjal)
- **Procedencia:** Plantas madre seleccionadas y certificadas, libres de enfermedades.
- **Edad de la planta madre:** Entre 18 meses y 3 años.
- **Longitud de la vareta:** Entre 10 y 15 cm.
- **Número de yemas por vareta:** Mínimo 2 yemas axilares activas.

- **Diámetro promedio:** Entre 0.8 y 1.2 cm.
- **Estado fitosanitario:** Material libre de plagas, hongos y síntomas de enfermedades.
- **Humedad del material:** Mantenerse en condiciones frescas y húmedas hasta el momento del injerto.
- **Empaque:** En bolsas plásticas perforadas o material similar, identificadas y rotuladas por lote.

Procedimiento general de entrega

1. **Selección del material vegetal:** Recolección de varetas de árboles madre seleccionados por vigor, sanidad y productividad.
2. **Corte y preparación:** Las varetas se cortarán con herramientas limpias y desinfectadas, evitando daños en las yemas.
3. **Conservación y transporte:** Se mantendrán en ambiente fresco y húmedo, envueltas en papel húmedo y en bolsas plásticas perforadas para evitar la deshidratación durante el transporte.
4. **Entrega a productores:** Se realizará la entrega formal del material vegetal en sitio previamente acordado con la Asociación CANSALDI, registrando los beneficiarios y las cantidades entregadas.
5. **Asistencia técnica:** Durante la entrega, se brindará orientación básica sobre el manejo y conservación de las varetas hasta su injertación en vivero.

Resultados esperados

- 50 productores rurales beneficiados con material vegetal de alta calidad genética.
- Material vegetal sano y entregado oportunamente para injertación.
- Incremento en la tasa de éxito de injertación en viveros de cacao.
- Fortalecimiento de las capacidades productivas y tecnológicas de la Asociación CANSALDI.
- Mejoramiento de la productividad y sostenibilidad del cultivo de cacao en la zona rural del municipio de Puerto Asis.

Importancia técnica

El uso de varetas de cacao CCN-51 contribuye al mejoramiento del material genético disponible en los viveros locales, favoreciendo la expansión de cultivos más productivos, resistentes y rentables. Esta acción representa un paso fundamental dentro del proceso de modernización y fortalecimiento del sector cacaotero del municipio, garantizando la calidad del material vegetal base para futuras plantaciones.

A2 REALIZAR CAPACITACION SONBRE EL MANEJO AGRONOMICO DE VIVEROS DE CACAO INJERTADO

Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de los pequeños productores pertenecientes a la Asociación Agropecuaria Ecoturística CANSALDI de las veredas La Estación y El Silencio del municipio de Puerto Asis, se desarrollará un proceso de capacitación orientado al manejo agronómico de viveros de cacao injertado. Esta actividad busca promover la adopción de buenas prácticas agrícolas que contribuyan a mejorar la calidad, productividad y sostenibilidad de las unidades productivas de cacao en la región.

Objetivo de la capacitación

Brindar conocimientos teóricos y prácticos a los 50 productores beneficiarios sobre las técnicas adecuadas para el establecimiento, manejo y mantenimiento de viveros de cacao injertado, garantizando la obtención de plántulas de alta calidad genética y fitosanitaria, que aseguren el éxito en la etapa de campo.

Justificación

El manejo adecuado de los viveros constituye una fase fundamental en la cadena productiva del cacao, ya que determina la calidad del material vegetal que será trasplantado a campo definitivo. Muchos productores carecen de formación técnica en aspectos como la selección de patrones, injertación, nutrición vegetal, control de plagas y enfermedades, y manejo de sombra y humedad.
Por lo tanto, esta capacitación permitirá mejorar las competencias productivas de los agricultores, optimizar los procesos de injertación y asegurar la sostenibilidad de las plantaciones de cacao CCN-51, contribuyendo al incremento de la productividad y la rentabilidad del cultivo.

Temas a desarrollar

Durante la capacitación se abordarán los siguientes contenidos:

- Importancia del vivero en el sistema productivo de cacao.
- Selección del sitio y preparación del sustrato.
- Tipos de envases y manejo de plántulas.
- Selección de patrones y varetas para injertación.
- Técnicas de injertación (injerto lateral y en púa).
- Manejo agronómico del vivero: riego, fertilización, control de malezas, plagas y enfermedades.
- Condiciones óptimas de sombra y humedad.
- Criterios de selección de plántulas injertadas aptas para trasplante.
- Buenas prácticas agrícolas y medidas fitosanitarias.
- Registros y trazabilidad en el manejo del vivero.

Metodología

La capacitación se desarrollará mediante sesiones teórico-prácticas, con la participación activa de los productores en el manejo directo del material vegetal. Se utilizarán herramientas audiovisuales, demostraciones de campo y guías técnicas impresas.
El evento contará con la orientación de un ingeniero agrónomo o técnico especializado en cacao, quien acompañará a los productores en todo el proceso formativo.

Duración y lugar

La jornada de capacitación tendrá una duración aproximada de **8 horas** distribuidas en una sesión teórica y una práctica de campo, y se realizará en un sitio estratégico de las veredas La Estación y El Silencio, donde los productores puedan observar y aplicar las técnicas aprendidas.

Resultados esperados

- Productores capacitados en el manejo agronómico de viveros de cacao injertado.
- Adopción de prácticas técnicas para la producción de plántulas de alta calidad.
- Incremento en la tasa de éxito de injertación.
- Reducción de pérdidas por manejo inadecuado en vivero.
- Fortalecimiento de las capacidades locales y del proceso organizativo de la Asociación CANSALDI.

Importancia técnica

El fortalecimiento del conocimiento técnico en el manejo de viveros de cacao injertado permitirá a los productores asegurar la sostenibilidad del cultivo, mejorar la calidad del material vegetal y contribuir al desarrollo agropecuario del municipio de Puerto Asís, en concordancia con las políticas de apoyo al sector rural impulsadas por la administración municipal desde el año 2005.

5.2. ALCANCE DEL PROYECTO

Fortalecer los procesos de producción agrícola de pequeños productores rurales asociados del municipio de Puerto Asís, Putumayo, mediante entrega de material vegetal y control fitosanitario a 50 pequeños productores rurales agrícolas de cacao, de las veredas La Estación y el Silencio orientándolos hacia una actividad productiva con sistema eficiente, competitivo, rentable y sostenible, garantizando comercialización de sus productos

VI. VALOR Y PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO

A. VALOR.

El valor requerido para ejecutar el objeto del proyecto es de TREINTA Y NUEVA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($39.800.000) M/CTE

B. PLAN DE INVERSION

La ejecución del proyecto requiere de los siguientes items que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1.00	ENTREGAR VARETAS DE CACAO CLON CCN 51 PARA INJERTACIÓN A LOS PRODUCTORES CACAOTEROS ASOCIADOS DE LA ZONA RURAL	Und	1	$ 39.168.000	$ 39.168.000
2.00	REALIZAR CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO AGRONÓMICO DE VIVEROS DE CACAO INJERTADO	Taller	2	$ 316.000	$ 632.000
TOTAL COSTOS					$39.800.000

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR TOTAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN
				MES I
1,00	Entregar varetas de cacao clon CCN 51 para injertación a los productores cacaoteros asociados de la zona rural	1	$ 39.168.000	
2,00	Realizar capacitación sobre manejo agronómico de viveros de cacao injertado	2	$ 632.000	

A. Fecha estimada de inicio de actividades: 26 noviembre de 2025

VIII. FUENTES DE FINANCIACIÓN (cifras en pesos)

Aportante	Valor Aporte	En efectivo	En Bienes y Servicios
Recursos propios			
SGP Libre inversión	$10.300.000		
Estampillas pro desarrollo fronterizo	$29.500.000		
Otros			

CARLOS EDUARDO VARGAS VELÁSQUEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Nini Johana Gaviria	Profesional de apoyo a la Gestion Administrativa	

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

DOCUMENTO SOPORTE A MGA

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

DOCUMENTO SOPORTE

PROYECTO

"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO"

2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS 5
1.1 CARACTERIZACIÓN MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS 5
1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 5
1.1.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 7
1.1.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 8
1.1.4 SUELO URBANO 9
2. ANTECEDENTES 13
3. JUSTIFICACIÓN 14
4. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 15
4.1 CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 15
4.2 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 15
4.3 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 15
5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 16
5.1 PROBLEMA CENTRAL 16
5.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA 16
5.3 MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA (INDICADORES DE REFERENCIA) 16
5.4 CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA 16
5.4.1 CAUSA DIRECTA 16
5.4.2 CAUSAS INDIRECTAS 16
5.5 EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA 17
5.5.1 EFECTOS DIRECTOS 17
5.5.2 EFECTOS INDIRECTOS 17
5.5.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 17
6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 18
6.1 IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 18
6.2 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 18
7.1 POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA 18
7.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA 19
7.2 POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN 20
7.2.1 LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 20

7.2.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 20
8. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 21
8.1 OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO) 21
8.2 INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL 21
8.3 RELACIONES ENTRE LAS CAUSAS Y OBJETIVOS 21
8.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS 21
9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 22
10. ESTUDIO DE NECESIDADES 22
11. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA 22
12. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 23
13. PRESUPUESTO 23
14. CRONOGRAMA 23
15. ANÁLISIS DE RIESGOS 24
16. INGRESOS Y BENEFICIOS 24
16.1 BENEFICIOS 24
17. INDICADORES DE PRODUCTO 25
18. FUENTES DE FINANCIACIÓN 25
19. FOCALIZACIÓN 25

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

INTRODUCCIÓN

El fortalecimiento a las asociaciones de pequeños productores agropecuarios del municipio de Puerto Asís, Putumayo, constituye una estrategia fundamental para impulsar el desarrollo rural sostenible, la productividad y la competitividad del sector agrícola local. Estas asociaciones desempeñan un papel esencial en la generación de empleo, la seguridad alimentaria y la dinamización económica del territorio, sin embargo, enfrentan limitaciones en aspectos técnicos, organizativos, comerciales y de acceso a recursos que restringen su crecimiento y sostenibilidad.

A través de este proyecto se busca promover el fortalecimiento de los productores mediante la injertación de cacao y control fitosanitario. Estas acciones están orientadas al mejoramiento de los procesos productivos y contribuir al bienestar de las familias campesinas del municipio, potenciando el desarrollo económico local con un enfoque de inclusión, sostenibilidad y equidad.

La administración municipal está orientada a contribuir y participar en el desarrollo productivo, empresarial y social de la región, mediante el ofrecimiento de servicios estratégicos y procesos que apuntan a promover el desarrollo de las comunidades rurales, prestando el servicio de Asistencia Técnica Agrícola y Pecuaria. La Ley 607 de 2000 la define como "el apoyo permanente que se le brinda a productores, habitantes del sector rural, organizaciones y entidades territoriales para la concreción de proyectos que optimicen el rendimiento económico y la calidad de sus actividades productivas, garanticen la sostenibilidad del medio ambiente y mejoren las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias de estos mismos proyectos"

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

1.1 CARACTERIZACIÓN MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA



Figura 1. Monumento al Centenario

La población de Puerto Asís se fundó como puesto de avanzada de Colombia en la posesión del Putumayo, como centro misional para la evangelización de las tribus indígenas que moraban en esta región y para extender la colonización del territorio. Dicha colonización se aceleró, debido a la construcción de la carretera. Con el transcurso de los años Puerto Asís llegó a convertirse en la despensa agropecuaria del departamento del Putumayo y Nariño. En la década de los 70, comenzaron a llegar personas de Cali y Medellín, interesadas en el cultivo de la coca, que poco a poco fue tomando auge. En la década de los 80 y 90, la producción de la coca fue tan rentable que comenzaron a disputarse el territorio grupos armados, que buscaban la producción, industrialización y comercialización a gran escala debido a las grandes ganancias que ofrecía este producto a nivel local, regional, nacional y sobre todo a nivel internacional.

Según Kuan, M. (2020), "se definió la fundación de Puerto Asís que se constituía en la colonia más al oriente del río Putumayo, justamente en donde las economías extractivas habían contado con puerto seguro para los intercambios y era un punto estratégico para el control de la entrada de barcos peruanos que navegaban río abajo" (...)

"Fray Estanislao de Las Corts, de forma más protagónica, y fray Ildefonso de Tulcán fueron los encargados de la fundación de Puerto Asís" (...) "La colonia, llamada Puerto Asís en honor al patrono de los misioneros capuchinos, fue fundada oficialmente el 3 de mayo de 1912 con la celebración de una misa solemne con la presencia de los dos religiosos, los trabajadores contratados y algunos indígenas de la región" (p. 25, 30 y 31).

Los límites de Puerto Asís fueron inicialmente establecidos por el Decreto 1752 del 27 de julio de 1944, por medio del cual se creó, entre otros, el Corregimiento de Puerto Asis. En 1958 a través de la Resolución 132 se creó la Inspección de Policía Puerto Asís perteneciente al Municipio de Mocoa. El Decreto 38 de 1959 la convirtió en Corregimiento, el cual fue aprobado con modificaciones a través del Decreto 110 de 1961. El Decreto 1951 de 1967 lo elevó a la categoría de Municipio y estableció sus límites, los cuales fueron modificados posteriormente por los Decretos: 2891 de 1978 con el cual se creó el Municipio de Orito; 3293 de 1985 con el cual se creó el Municipio de Valle del Guamuez; y por la Ordenanza 012 de 1992 con la cual se creó el Municipio de Villagarzón. Corpoamazonia (2008, p. 55).

El Municipio de Puerto Asís, perteneciente a la Subregión del Bajo Putumayo limita al sur con la República del Ecuador, al norte con los Municipios Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, al occidente con los municipios de Orito, Valle de Guamuez y San Miguel y al oriente con el municipio de Puerto Leguizamo. Los límites del municipio se encuentran determinados por las siguientes normas:

Decreto 1951 de 1967:

"Desde la desembocadura de la quebrada "Teteyé" en el río San Miguel, aguas abajo hasta encontrar el mojón que señala los límites de la República de Colombia con la República del Ecuador; de este sitio en línea recta Sur-Norte, siguiendo el límite internacional, hasta encontrar la desembocadura del río Cuembí sobre el río Putumayo; río Putumayo aguas abajo hasta encontrar la desembocadura del río "Piñuña- Blanco", de este sitio en línea recta hasta encontrar la desembocadura del río Curilla" en el río "Mecayá"; río Mecayá aguas arriba hasta encontrar la confluencia del río "Picudo Grande" con el río" [Caimán].

Ordenanza 012 de 1992:

"Desde la confluencia del río Caimán con el río Picudo Grande, línea recta con dirección SW hasta encontrar la desembocadura del río Orito en el río Putumayo. Desde la desembocadura del río Orito en el río Putumayo, río Orito aguas arriba hasta encontrar la intersección de la línea limítrofe del Municipio de Orito".

Decreto 2891 de 1978:

"Desde la confluencia de la quebrada Sardinas con el río San Juan (sic), en línea recta y con rumbo sur 47° 00 W., se sigue a encontrar el kilómetro 32 de la carretera Orito, Santa Ana, de aquí en línea recta y con rumbo s. 38°00 W., a encontrar la confluencia del río Luzón con el Río Guamuez".

Decreto 3293 de 1985:

"Por el mismo Río Guamuez aguas abajo hasta un punto situado dos (2) kilómetros antes de llegar a la Vereda La Paila. Por el Oriente: desde el punto anterior en línea recta Sureste hasta un punto también imaginario ubicado dos (2) kilómetros arriba del pozo Azul Grande número 1 y desde éste prolongación de la misma línea hasta encontrar el río San Miguel en los límites con la República del Ecuador".

Decreto 1951 de 1967:

"este río [San Miguel] aguas abajo hasta la desembocadura de la quebrada "Teteyé" punto de partida".

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley 617 de 2000, respecto a la categorización de los distritos y municipios y con la última clasificación realizada para el año 2020, Puerto Asís se ubica en sexta categoría y según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se encuentra en un entorno de desarrollo intermedio. Este tipo de municipios tiene relevancia en la economía departamental por su centralidad regional, indicadores de calidad de vida moderados y una institucionalidad que requiere mejorar su capacidad de generación de recursos propios y de inversiones (DNP 2015).

1.1.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

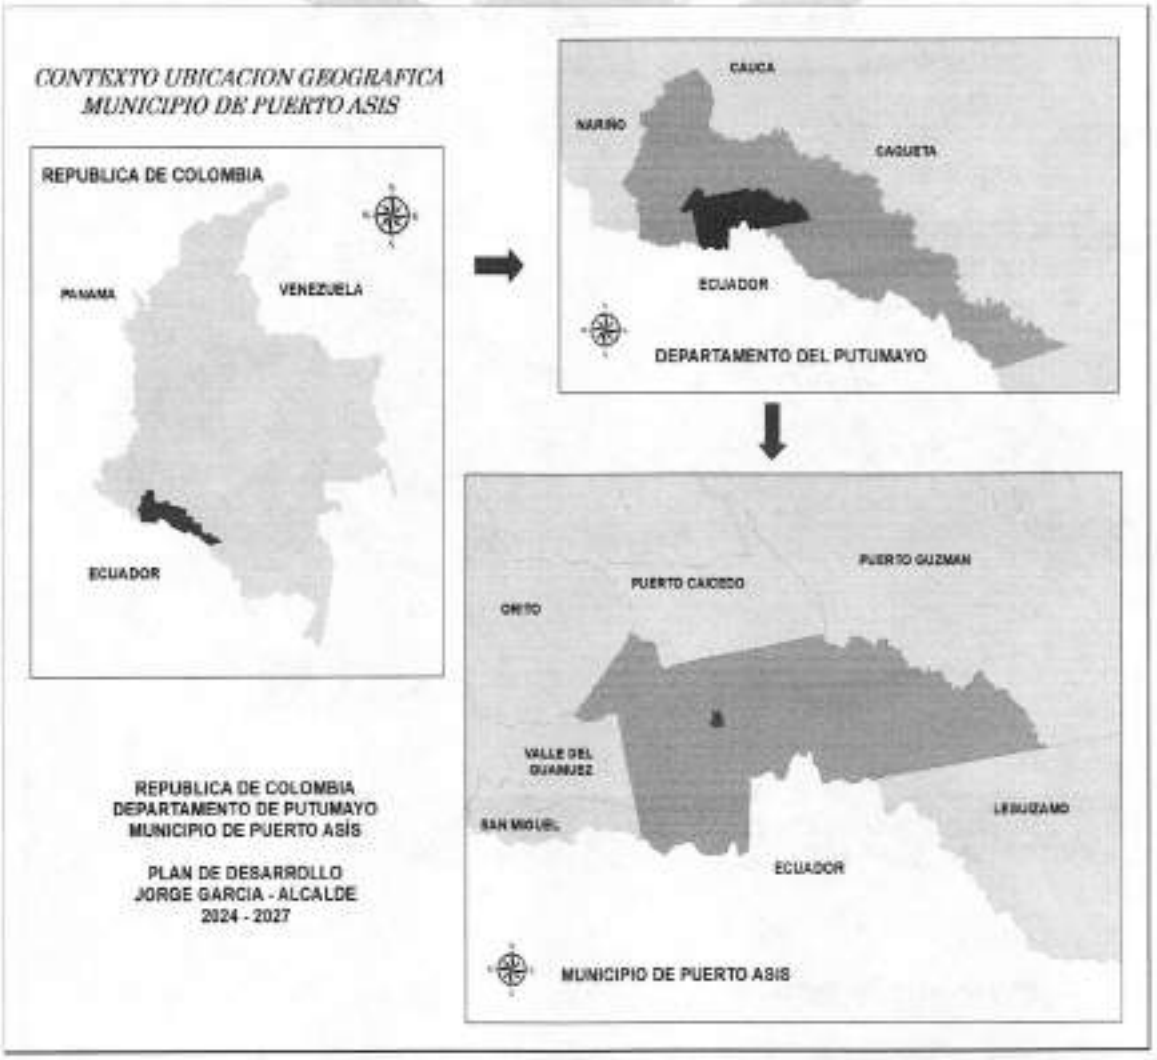


Figura 2. Contexto ubicación geográfica Municipio de Puerto Asís
Fuente: GEOSIG, 2023 - PBOT 2002.

1.1.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Puerto Asis cuenta con una población de 73.141 habitantes: 36,826 mujeres (50.3%) y 36,315 hombres (49.7%). Los habitantes de Puerto Asis representan el 18.8% de la población total de Putumayo en 2024. Puerto Asis es el municipio más poblado del departamento de Putumayo. La figura 3 muestra el comportamiento demográfico de Puerto Asis en los periodos 2024 y 2035.

La población del municipio se encuentra distribuida así: un 61% en la zona urbana y el 39% restante en la zona rural. De esta forma, un número importante de la población del municipio se enfrenta a condiciones de vulnerabilidad en la zona rural debido a los altos niveles de pobreza multidimensional, fenómenos de informalidad rural de la tierra y baja participación del sector primario en la economía del municipio.

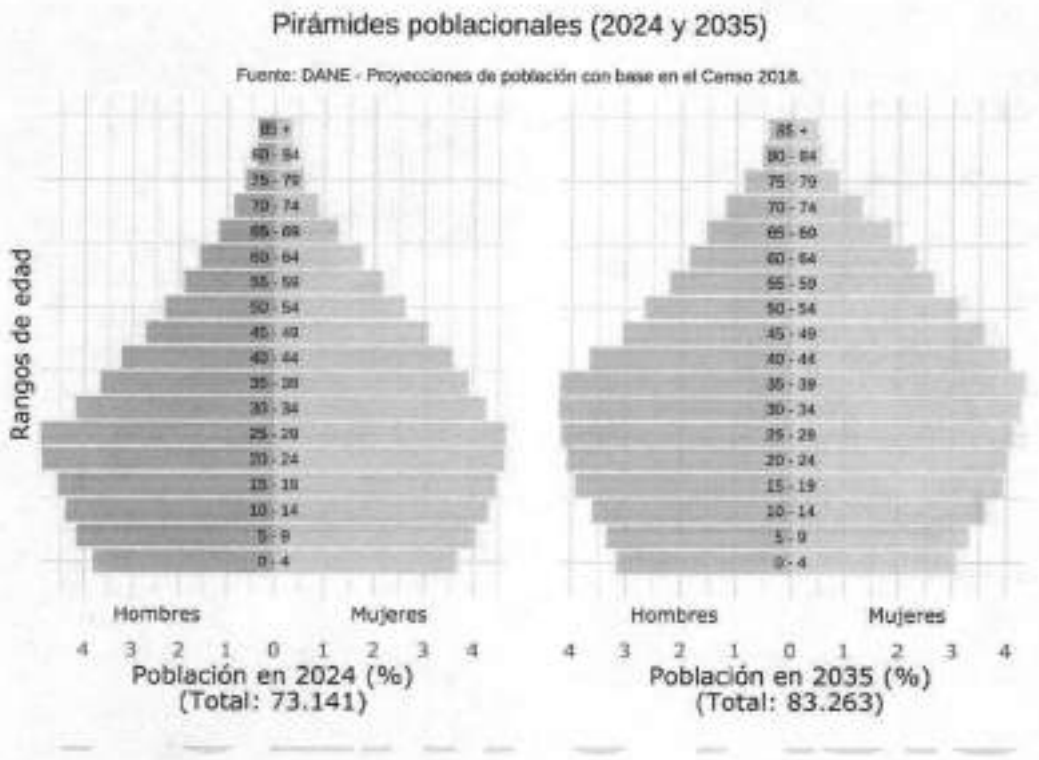


Figura 3. Pirámide poblacional (2024 y 2035) Municipio de Puerto Asis
Fuente: DANE – Proyecciones de población con base en el Censo 2018.

Organización y División Territorial

La división administrativa rural establecida en el Acuerdo No 16 del 2000 es:

Tabla 1. Conformación corregimientos Municipio de Puerto Asis

CORREGIMIENTO	TOTAL, VEREDAS	VEREDAS
Santana	18	Agua Negra Uno, Agua Negra Dos, Barrio 20 de Marzo, Caribe Uno, Caribe Dos, El Espinal, El Paujil, El Silencio, La Bretaña, La Carmela, La Esperanza, La Planada, La Sabaleta, Las Vegas de Santana, Santa Elena, Unión Cocayá, Acael, y las Bocanas.
Teteyé	10	Buenos Aires, Caucasia, El Azul, El Progreso, La Florida, Montañita Nueva Floresta, Nueva Granada, Puerto Colombia, Teteyé.
La Carmelita	15	Alto Lorenzo, Bello Horizonte, Brasilia, Carmelita, El Cristal, El Naranjal, La Cabaña, La Cordialidad, La Cumbre, La Pradera, Las Delicias, México, Nuevo Porvenir, Rivera Uno y Rivera Dos.
Piñuña Blanco	13	Alto Piñuña, Bajo Santa Elena, Buena Vista, Canacas, Chorro Largo, Lisberia, Montebello, Peneya, Piñuña Blanco, Puerto Bello, Puerto Silencio, Remolino-Santa Elena y San Ignacio
Villa Victoria	11	Argentina, La Ardilla, La Estación, La Pala, La Palmera, La Paz, Las Bocanas, Monserrate, Villa del Sol, Villa Victoria y Germania.

Tabla 2. Conformación inspecciones de Policía del Municipio de Puerto Asis

INSPECCIÓN DE POLICÍA	TOTAL, VEREDAS	VEREDAS
Puerto Asís	17	El Águila, Ancura, San José Bajo la Danta, Brisas de Hong Kong, Carmen de Piñuña, Cocaya, Jerusalén, La Danta, Las Acacias, Mansoya, Nariño-Nariño, Peñazora, Salónica, Santa Isabel, Santa Lucía, Sinaí y Uribe-Uribe.
Alto Danubio	8	El Danubio, El Paraíso, Kilili III, La Danta, Las Minas, Marmato, Nuevo Diamante y Sardinas del Mansoya
Bajo Cuembí	22	Agualongo, Bajo Lorenzo, Bocanas de Cuembí, El Toayá, Guadalupe Juvenil, La Española, La Frontera, La Pedregosa, La Piña, Puerto Playa, San Salvador, La Alea, Angostura, Bajo Mansoya, Belén, Chufiya, Comandante, La Rosa, Sevilla, Zamora y Los Cerritos.
Caña Brava	6	Caña Brava, El Bosque, Primavera, Puerto Gallo, San Luis y Cartagena.
Puerto Vega	15	Alto Santa María, Canambel, Comuna Uno, Comuna Dos, La Cocha, La Guajira, Medellín, Nuevo Amarón, El Palmar, Playa Rica, Puerto Vega, Remolino, Puerto Nuevo, Santa María y Santa María de las Misiones
Alto Cuembí	17	Agua Blanca, Agua Negrita, Campo Alegre, Campo Quemado, La Esmeralda, La Libertad, La Manuela, Los Álamos, Samaria, Villa de Leiva Villa Marquesa, La Italia, Las Malvinas, La Herradura, La Y, La Cumbre y El Diamante.

1.1.4 SUELO URBANO

El suelo urbano o Ciudad de Puerto Asis, tiene una extensión de 854,67 hectáreas declaradas como suelo urbano, su estructura urbana la componen en la actualidad se encuentra dividida entre 4 zonas, en las cuales se localizan 64 barrios distribuidos de la siguiente manera:

No	Zona	No Barrios
1	Centro	5
2	Norte	14
3	Occidente	8
4	Oriente	37
Total		64

En la siguiente tabla se enumeran los barrios registrados en la Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente.

Tabla 3. Barrios del municipio de Puerto Asis 2024 registrados en Secretaría de Planeación

No	BARRIO	ZONA	No	BARRIO	ZONA
1	Acevedo	Norte	33	La Marina	Norte
2	Altos de Comfamiliar	Oriente	34	La Montañita	Norte
3	Altos del Cedral	Oriente	35	La Pista	Norte
4	Altos del Paraíso	Norte	36	Las Américas	Centro
5	Alvernia	Oriente	37	Las Ceibas	Oriente
6	Buenos Aires	Oriente	38	Las Heliconias	Oriente
7	Camilo Torres	Oriente	39	Londres	Norte
8	Caracolí	Oriente	40	Los Cristales	Oriente
9	Centenario	Occidente	41	Los Lagos	Oriente
10	Chiparos	Oriente	42	Los Olivos	Oriente
11	Ciudad Leguizamo	Oriente	43	Los Pinos	Occidente
12	Ciudadela Amazónica	Norte	44	Luis Carlos Galán I	Oriente
13	Colina Campestre	Oriente	45	Luis Carlos Galán II	Oriente
14	Colinas	Oriente	46	Luis Carlos Galán III	Oriente
15	Comfamiliar	Oriente	47	Metropolitano	Occidente.
16	Construyendo Hogares	Oriente	48	Modelo	Oriente
17	Corralito de Piedra	Oriente	49	Obrero I	Oriente
18	El Carmen	Oriente	50	Obrero II	Oriente
19	El Centro	Centro	51	Salvador Allende	Oriente
20	El Jardín	Norte	52	San Fernando	Oriente
21	El Paraiso	Occidente	53	San Francisco	Centro
22	El Poblado	Norte	54	San Martin	Occidente
23	El Prado	Oriente	55	San Miguel	Norte
24	El Puerto	Centro	56	San Nicolas	Oriente
25	El Recreo	Oriente	57	Simón Bolivar	Norte
26	El Trébol	Norte	58	Sinai	Occidente
27	El Triunfo	Occidente	59	Tequendama	Norte
28	Fonalcsis	Oriente	60	Tres de Mayo	Occidente
29	Jorge Eliecer Gaitán	Occidente	61	Veinte de Julio	Oriente
30	Sector Cocaya	Oriente	62	Villa Docente	Centro
31	Kennedy	Oriente	63	Villa Paz	Oriente
32	La Floresta	Oriente	64	Villa Rosa	Oriente

En relación a lo anterior a continuación se relaciona los barrios y urbanizaciones en proceso de legalización o de densificación.

No	Nombre Barrio o Urbanización	Estado.
1	La Marina	Legalizado en proceso de densificación
2	San Miguel	Legalizado en proceso de densificación.
3	Altos de Comfamiliar	Aclaración de Limites.
4	Altos del Cedral	Aclaración de Limites.
5	Altos del Paraiso	En Proceso de Legalización.
6	Las Heliconias	Aclaración de Limites.
7	Centenario	En Proceso de Legalización.
8	Colina Campestre	Aclaración de Limites.
9	Comfamiliar	Aclaración de Limites.
10	El Poblado	Con Medida Cautelar.
11	Sinai	En Proceso de Legalización
12	El Triunfo	En Proceso de Legalización
13	Tres de Mayo.	Aclaración de Limites

Por otra parte, y de acuerdo con el Ministerio del Interior (2024), en el Municipio de Puerto Asís, se encuentran reglamentados seis (6) Resguardos Indígenas y tres (3) Consejos Comunitarios.

Resguardos Indígenas del Municipio de Puerto Asís

NOMBRE	PUEBLO	TIPO ACTO AD.	NUMERO ACTO AD.	FECHA ACTO AD.
NASA CHAMB	PAÉZ	ACUERDO	263	1/01/2011
AGUA BLANCA	AWÁ	ACUERDO	250	19/07/2011
BOCANAS DE LUZON	COFAN	ACUERDO	213	16/07/2010
LA ITALIA	EMBERA CHAMI	RESOLUCIÓN	16	22/07/2003
ALTO LORENZO	PAÉZ	RESOLUCIÓN	18	22/07/2003
SANTA CRUZ DE PIÑUÑA BLANCO	SIONA	RESOLUCIÓN	59	29/09/1992
BUENAVISTA	SIONA	RESOLUCIÓN	45	21/07/1983
VEGAS DE SANTANA	SIONA	RESOLUCIÓN	17	22/07/2003

Fuente: Ministerio del Interior 2024.

Consejos comunitarios del municipio de Puerto Asís.

Nombre del Consejo	Estado
Consejo Comunitario Afro Primavera.	Inscrito
Consejo Comunitario Alto Piñuña La Chirpa.	Inscrito
Consejo Comunitario Negra Wilauralilia	Inscrito

Fuente: Ministerio del Interior 2024

Posición Fronteriza Estratégica

Sea lo primero señalar que para efectos de la aplicación de la Ley 191 del 23 de junio de 1995: "Por la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera.", en virtud del literal b), artículo 4, se entiende por Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo (UEDF): "Aquellos municipios, corregimientos especiales y áreas metropolitanas pertenecientes a las Zonas de Frontera, en los que se hace indispensable crear condiciones especiales para el desarrollo económico y social mediante la facilitación de la integración con las comunidades fronterizas de los países vecinos, el establecimiento de las actividades productivas, el intercambio de bienes y servicios, y la libre circulación de personas y vehículos". Que mediante el artículo segundo del Decreto 1814 del 26 de octubre de 1995: "Por el cual se determinan las Zonas de Frontera y las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo", modificado por el artículo tercero del Decreto 150 del 19 de enero de 1996, se determinaron como Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, las siguientes: En el Departamento del Putumayo: los Municipios de Puerto Asís, Puerto Leguizamo, La Dorada -San Miguel, La Hormiga o Valle del Guamuez.[1]

El departamento del Putumayo tiene una posición geopolitica estratégica al encontrarse localizado en una extensa zona fronteriza de 460 kilómetros, que conecta este departamento con Ecuador y Perú. Esta zona con alta conectividad permite el tránsito y abastecimiento de diferentes productos, tanto lícitos como ilícitos, infortunadamente la ausencia de vigilancia permanente de parte de las autoridades nacionales es un factor que desencadena el repliegue de diferentes grupos al margen de la ley (PNUD, 2016, p. 39).[2]

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

[1] https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/pdf/decreto_1814_1995.pdf
[2] https://www.puertoasis-putumayo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/DIAGNOSTICO%20V4%20ENE272021.pdf

2. ANTECEDENTES

El municipio de Puerto Asis afronta el desplazamiento de campesinos hacia la zona urbana que por muchos años han dedicado gran parte de su vida al sector agricola, debido a la ausencia de entidades estatales, que brinden apoyo al fortalecimiento de las unidades productivas de la región, evidenciándose un total abandono de sus predios y por ende una disminución área agricola, dejando al municipio depender del abastecimiento de productos agricolas de nuestros departamentos vecinos, sumado a esto nuestras familias campesinas no cuentan con ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, dejando como única opción el desplazamiento o la implementación de cultivos ilicitos, los cuales son menos costosos y traen consigo la emergencia de grupos armados generando problemas de orden público.

Con la implementación de este proyecto se mejorara la calidad de vida de los pequeños productores rurales y de sus hogares, generando empleo para habitantes del sector, evitando notoriamente el desplazamiento al casco urbano y la deserción de la actividad agropecuaria , ya que al fortalecerlos con la entrega de material vegetal e insumos, acompañados con capacitaciones , talleres teórico prácticos en el manejo agronómico del cultivos agricolas bajo sistemas agroforestales, de la misma manera se prestara el servicio de acompañamiento técnico, con lo cual se garantizara una buena producción, mejorando sus ingresos y su calidad de vida.

Con la elaboración de este proyecto se propone, fortalecer a 50 productores rurales de cacao asociados de la zona rural, orientándolos hacia una actividad productiva con sistema eficiente, competitivo, rentable y sostenible, garantizando comercialización de sus productos.

A saber, el año anterior en este sentido se formuló y ejecutó entre otros:

- "FORTALECIMIENTO DE LÍNEAS AGROPECUARIAS, AMAZÓNICAS Y NATIVAS, MEDIANTE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO." Con registro BPIN 2023-86-568-0027

- "FORTALECIMIENTO DE LÍNEAS AGROPECUARIAS, AMAZÓNICAS Y NATIVAS, MEDIANTE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". Con registro BPIN 2024-86-568-0070

3. JUSTIFICACIÓN

Los campesinos y pequeños productores del municipio de Puerto Asís -Putumayo, por muchos años se ha dedicado actividades agropecuarias como siembra de plátano, yuca, cacao, maíz y otros cultivos de pan coger, ganadería vacuna, ovinos, porcinos, pollos, gallinas, entre otras, esta fue la mayor fuente de ingresos para el sustento de ellos mismos y de su familia. Debido al conflicto armado entre el estado y los grupos al margen de la ley se inició una fuerte lucha por parte del gobierno a través de estrategias para la erradicación, fumigación de cultivos ilícitos, siendo tan fuerte esta lucha que llego a afectar directamente pequeño productor; causando desplazamientos masivos y un duro golpe a la economía regional.

Debido a toda esta problemática y a la necesidad de generar una nueva economía estable para las personas del sector rural del municipio, las nuevas alternativas de trabajo para obtener beneficios económicos se han volcado a las actividades agropecuarias en sus predios, como la piscicultura, la ganadería bovina, porcina, la cría de gallinas y pollos, plátano, yuca, chiro, arazá, asaí, entre otros productos agrícolas, aunque de manera artesanal o rudimentaria, puesto que se presenta poca adopción técnica y tecnológica de la implementación de sistemas productivos sostenibles y competitivos, donde es preciso resaltar que las condiciones económicas de estas familias son bajas y no les permiten adquirir con facilidad el material vegetal, los insumos, las herramientas y materiales, capacitación y asistencia técnica necesarios para obtener una óptima producción agropecuaria.

En este contexto se hace necesario implementar este proyecto mediante el cual solicitan apoyo para reactivar el proceso productivo de estas actividades agrícolas con el fin de que se adopten las diversas técnicas de producción de calidad y asegurar que esta sea óptima. Para la disminución del impacto ambiental y lograr una producción más sostenible en el municipio.

El presente proyecto pretende fortalecer a un grupo de 50 pequeños productores rurales de cacao asociados de la zona rural del municipio de Puerto Asis, los cuales fueron seleccionados para continuar con el proceso de injertación de plántulas de cacao y mejorar la variedad de cacao en el municipio.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

4. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

4.1 CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
PROGRAMA	1702 – Inclusión productiva de pequeños productores rurales
TRANSFORMACION	3. Derecho humano a la alimentación
PILAR	01. Disponibilidad de Alimentos
CATALIZADOR	1. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos
COMPONENTE	a. Ordenar la producción agropecuaria

4.2 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	Putumayo un gobierno en serio 2025-2027
SECTOR	Agricultura y desarrollo rural
DIMENSIÓN	Económica
PROGRAMA	Inclusión productiva de pequeños productores rurales

4.3 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	Puerto Asis la gran empresa que soñamos 2024-2027
SECTOR	Agricultura y desarrollo rural
ESTRATEGIA	Desarrollo Económico Sostenible y Sustentable
PROGRAMA	Inclusión productiva de productores rurales
SUB PROGRAMA	Apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina familiar y comunitaria
PROYECTO POAI	Fortalecimiento a asociaciones de pequeños productores agropecuarios
FUENTE DE RECURSOS	SGP Libre inversión, Estampilla pro desarrollo fronterizo

5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

5.1 PROBLEMA CENTRAL

LIMITADAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA

Los pequeños productores agropecuarios han manifestado preocupación debido a las pocas alternativas de desarrollo económico que les permita incrementar sus ingresos y de tal manera garantizar unas buenas condiciones de calidad de vida a sus familias, desde años atrás se han caracterizado por el desarrollo de la actividad agrícola, (cacao) sin embargo, se han visto muy afectados por el bajo rendimiento en sus unidades productivas, las cuales no se han mejorado por el desconocimiento del manejo técnico, el cual le permita minimizar los costos y aumentar la calidad la variedad y la producción, por consiguiente causando un deterioro en sus sistemas de producción y dejando en abandono la actividad agrícola que han desempeñado durante varios años. Los pequeños productores del municipio de Puerto Asis, desde años atrás se han dedicado a trabajar por el campo y el desarrollo de las actividades agrícolas como cultivos de arroz, plátano, yuca, asai, cacao, maíz y demás cultivos agrícolas, sin embargo, se requiere de un fortalecimiento en los procesos productivos, encaminándolos a la diversificación de productos con valor agregado, y lograr un posicionamiento en el mercado local y regional.

5.3 MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA (INDICADORES DE REFERENCIA)

Línea base: (50) cincuenta productores rurales de economía rural agrícola (cacao) asociados, por fortalecer

5.4 CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

5.4.1 CAUSA DIRECTA

Causa Directa 1	Inadecuadas prácticas agrícola por parte del pequeño productor

5.4.2 CAUSAS INDIRECTAS

Causa Directa 1.1	Acceso limitado a servicios de capacitación agrícola
Causa Directa 1.2	Limitadas prácticas conservadoras de producción agrícola

5.5 EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA

5.5.1 EFECTOS DIRECTOS

Efecto Directo 1	Sistemas productivos poco eficientes

5.5.2 EFECTOS INDIRECTOS

Efecto Indirecto 1.1	Disminución de los ingresos económicos
Efecto Indirecto 1.2	Perdidas de oportunidades de mercados para producción agrícola

5.5.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS



6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

6.1 IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES

Actor	Entidad	Posición	Interés - Expectativas	Contribución / Gestión de conflictos
Municipal	Alcaldía de Puerto Asís	Cooperante	Contribuir en favor de los productores rurales para su producción de sus productos agrícolas	Formulación, Estructuración, financiación y Seguimiento de la ejecución del Proyecto
Otro	Productores rurales asociados	Beneficiario	Recibir apoyo para mejorar la producción de sus unidades agrícolas	Veeduría ciudadana en ejecución del proyecto

6.2 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

La alcaldía municipal como cooperante contribuye en favor de los productores rurales para su producción de sus productos agrícolas, mediante la Formulación, Estructuración, financiación y Seguimiento de la ejecución del Proyecto, los Productores rurales asociados, como beneficiarios, reciben apoyo para mejorar la producción de sus unidades agrícolas, haciendo veeduría a la ejecución de los recursos.


7. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

7.1 POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA

La población afectada corresponde a las familias de los pequeños productores agropecuarios del municipio de Puerto Asís, que al momento de la formulación del proyecto asciende a 6.102 personas.

Fuente: Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente - CPGA

7.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

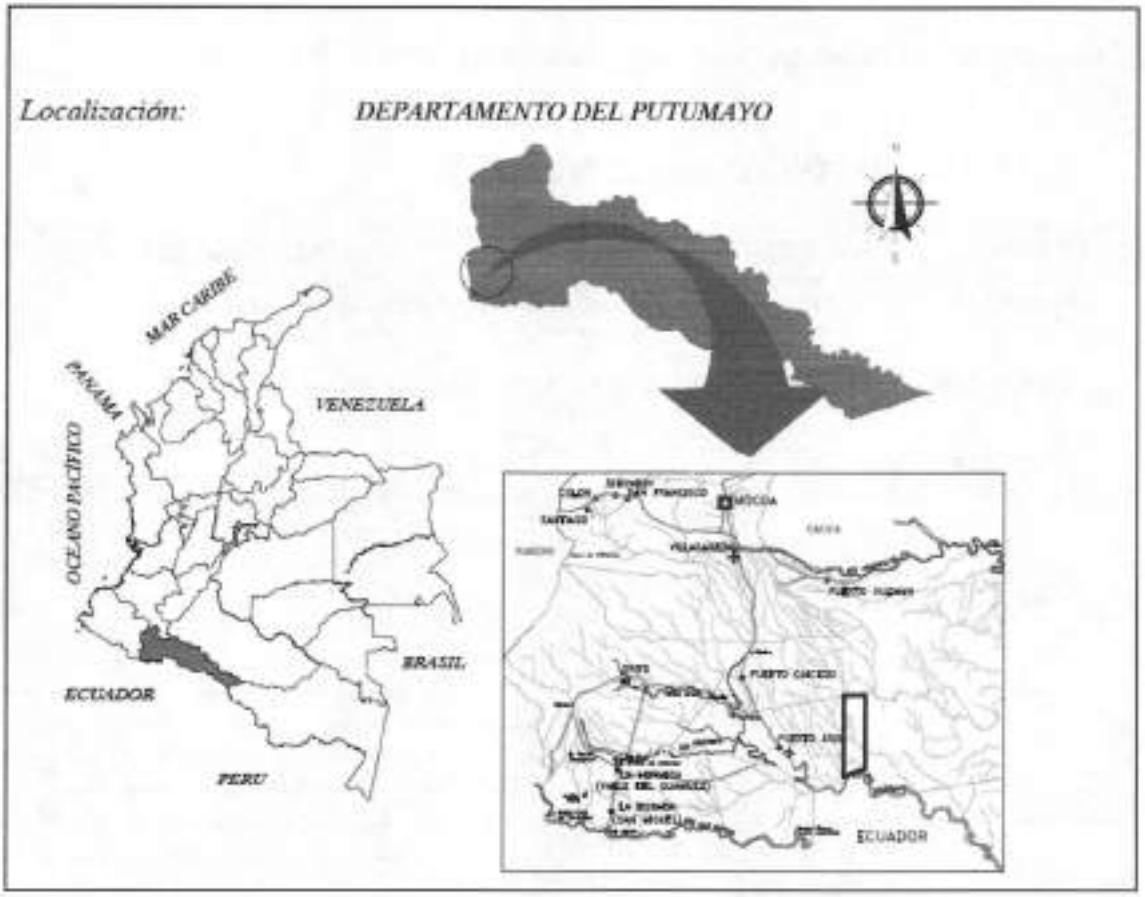

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA
Amazonia	Putumayo	Puerto Asis	Zona Rural

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

7.2 POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

La población beneficiada corresponde a 50 productores agrícolas asociados a fortalecer mediante el presente proyecto.

Fuente: Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente - CPGA

7.2.1 LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA
Amazonia	Putumayo	Puerto Asís	Zona Rural, Veredas La Estación – El Silencio.

7.2.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

CLASIFICACIÓN	DETALLE	NÚMERO DE PERSONAS
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	
	Infancia 6 – 11 años	
	Adolescencia 12- 18 años	
	Juventud 14 – 26 años	
	Adultez 27 – 59 años	
	Vejez 60 años y más	
Etaria (Edad)	0 a 14 años	
	14 a 26 años	7
	27 a 59 años	30
	Mayor de 60 años	13
Grupos étnicos	Pueblos Indígenas	
	Comunidades Afrocolombianas	
	Comunidades Raizales	
	Pueblos Rrom	
	Población Mestiza	
	Comunidades Negras	
	Comunidades Palenqueras	
Género	Masculino	28
	Femenino	22
Población Vulnerable	Personas en Reincorporación (Acuerdos de Paz)	
	Personas en Reintegración exintegrantes de Grupos Armados Organizados y otros en tránsito a la vida civil	
	Desplazados	
	Personas con discapacidad	
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	11

8. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

8.1 OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO)

MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.

8.2 INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL

INDICADOR DEL OBJETIVO	MEDIDO A TRAVÉS DE	META	TIPO DE FUENTE	FUENTE DE VERIFICACIÓN
Productores rurales asociados fortalecidos	Número	50	Informe	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

8.3 RELACIONES ENTRE LAS CAUSAS Y OBJETIVOS

TIPO DE CAUSA	CAUSAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Causa directa 1	inadecuadas prácticas agrícola por parte del pequeño productor	Mejorar prácticas agrícolas por parte del pequeño productor
Causa indirecta 1.1	acceso limitado a servicios de capacitación agrícola	Incrementar los servicios de capacitación agrícola
Causa indirecta 1.2	limitadas prácticas conservadoras de producción agrícola	Fortalecer la innovación tecnológica en el manejo de producción agrícola.

8.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS



9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Clasificación	Detalle
Alternativa 1	Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante injertación y capacitación técnica a productores

10. ESTUDIO DE NECESIDADES

Bien o servicio 1:	Fortalecimiento técnico y dotación de material vegetal para la mejora de viveros de cacao injertado.
Medido a través de:	Numero
Descripción:	Consiste en el fortalecimiento técnico y dotación de material vegetal para la mejora de viveros de cacao injertado a productores rurales.
Descripción de la oferta	Corresponde a la cantidad de productores beneficiados con el proyecto.
Descripción de la demanda	Corresponde a los productores rurales de cacao que necesitan fortalecimiento en el municipio.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0	50	-50
2025	0	50	-50

11. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

Alternativa – Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante injertación y capacitación técnica a productores.

La alternativa seleccionada consiste en fortalecer las capacidades técnicas de los productores cacaoteros del municipio mediante la realización de dos (2) talleres prácticos sobre el manejo agronómico de viveros de cacao injertado, y la entrega de material vegetal (varetas de cacao) de la variedad Clon CCN 51, reconocido por su alta productividad, resistencia a enfermedades y adaptabilidad a las condiciones del territorio.

Los talleres estarán enfocados en dos componentes fundamentales:

a) Control de plagas y enfermedades en viveros de cacao, promoviendo el manejo integrado de plagas y el uso racional de insumos agrícolas.

b) Fertilización integrada del cultivo de cacao, orientada a la aplicación eficiente de nutrientes para optimizar el crecimiento y la sanidad de las plantas injertadas.

En complemento, se entregarán 19.425 varetas de cacao Clon CCN 51 a los productores participantes, destinadas a la injertación en viveros locales, con el fin de mejorar la calidad genética del material vegetal, aumentar la productividad y garantizar la sostenibilidad del sistema productivo cacaotero.

La ejecución de las actividades estará bajo acompañamiento técnico de un profesional agrónomo o técnico agropecuario, asegurando la correcta implementación de las prácticas aprendidas y el aprovechamiento del material entregado.

Con esta alternativa se espera fortalecer la capacidad técnica y productiva de los viveros de cacao, reducir pérdidas por enfermedades y mejorar el rendimiento de los futuros cultivos.

12. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA
Amazonia	Putumayo	Puerto Asis	Zona Rural, Veredas La Estación – El Silencio.

13. PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1,00	Entregar varetas de cacao clon CCN 51 para injertación a los productores cacaoteros asociados de la zona rural	Und	1	$ 39.168.000	$ 39.168.000
2,00	Realizar capacitación sobre manejo agronómico de viveros de cacao injertado	Taller	2	$ 316.000	$ 632.000
TOTAL COSTOS					$ 39.800.000

Ver anexo: presupuesto y análisis de precio unitario

14. CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR TOTAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN
				MES I
1,00	Entregar varetas de cacao clon CCN 51 para injertación a los productores cacaoteros asociados de la zona rural	1	$ 39.168.000	
2,00	Realizar capacitación sobre manejo agronómico de viveros de cacao injertado	2	$ 632.000	

Ver anexo: cronograma

15. ANÁLISIS DE RIESGOS

Nivel	Propósito (Objetivo General)	Componente (Productos)	Actividad
Tipo de Riesgo	**Administrativos**	**Operacionales**	**De Costos**
Descripción del riesgo	Demora en los procesos precontractuales del proyecto	Injertos de baja calidad genética o fitosanitaria	Incremento de los costos de insumos
Probabilidad	Probable	Probable	Probable
Impacto	Moderado	Moderado	Moderado
Efectos	Incumplimiento del plan de trabajo con los productores rurales	Inconformidad entre productores por la asignación de injertos	Retraso en la contratación de insumos
Medidas de Mitigación	Revisión de los procesos precontractuales.	Entregar material vegetal certificado y adaptado a la región.	Realizar el presupuesto basado en cotizaciones vigentes

16. INGRESOS Y BENEFICIOS

16.1 BENEFICIOS

Beneficio 1:
Ahorro en costos por parte de los productores en el momento de adquirir sus insumos para control fitosanitario, plántulas e injertos, capacitaciones en BPA para implementar y / o fortalecer sus cultivos agrícolas de cacao.

Descripción de la cantidad
La cantidad es igual al número de productores beneficiados con el proyecto en insumos para control fitosanitario y material vegetal.

Descripción del valor unitario
El valor unitario corresponde al costo promedio de los elementos que necesitan los pequeños productores para lograr producir sus productos agrícolas.

Se calcula beneficios anuales de la siguiente manera:
Número de productores rurales asociados beneficiados = 50
Valor promedio por costos = $ 1.000.000

TABLA DE CALCULO BENEFICIO 1			
Periodo	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor total**
0			
1	50	$ 1.000.000	$ 50.000.000

17. INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo 1	Mejorar prácticas agrícolas por parte del pequeño productor
Producto	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores
Indicador 1	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente
Medido a través de:	Numero
Meta total	50

18. FUENTES DE FINANCIACIÓN

ETAPA	ENTIDAD	TIPO DE ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	VALOR
Inversión	Puerto Asis	Municipios	SGP Libre inversión	$10.300.000
Inversión	Puerto Asis	Municipios	Estampilla Pro Desarrollo fronterizo.	$29.500.000
Total, inversión				**$39.800.000**

19. FOCALIZACIÓN

Política transversal	Categoria	Valor
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa.	$39.800.000

CARLOS EDUARDO VARGAS VELÁSQUEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Nini Johana Gaviria	Profesional de apoyo Secretaría de Planeación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

MGA

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, Putumayo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000041693

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/07/2025 15:45:34

Identificador: 1519978

Formulador Ciudadano: jose pablo diaz montilla

Formulador Oficial : Jennifer Andrea Quintero Gutiérrez

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Putumayo un gobierno en serio 2025-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Dimensión: Económica

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Inclusión productiva de pequeños productores rurales

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Puerto Asís la gran empresa que soñamos 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo Económico Sostenible y Sustentable

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Inclusión productiva de productores rurales

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

LIMITADAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los pequeños productores agropecuarios han manifestado preocupación debido a las pocas alternativas de desarrollo económico que les permita incrementar sus ingresos y de tal manera garantizar unas buenas condiciones de calidad de vida a sus familias. desde años atrás se han caracterizado por el desarrollo de la actividad agrícola, (cacao) sin embargo, se han visto muy afectados por el bajo rendimiento en sus unidades productivas. las cuales no se han mejorado por el desconocimiento del manejo técnico, el cual le permita minimizar los costos y aumentar la calidad la variedad y la producción, por consiguiente causando un deterioro en sus sistemas de producción y dejando en abandono la actividad agrícola que han desempeñado durante varios años. Los pequeños productores del municipio de Puerto Asís, desde años atrás se han dedicado a trabajar por el campo y el desarrollo de las actividades agrícolas como cultivos de arroz, plátano, yuca, asai, cacao, maíz y demás cultivos agrícolas, sin embargo, se requiere de un fortalecimiento en los procesos productivos, encaminándolos a la diversificación de productos con valor agregado, y lograr un posicionamiento en el mercado local y regional.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Linea base: (50) cincuenta productores rurales de economía rural agrícola (cacao) asociados, por fortalecer

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas prácticas agrícola por parte del pequeño productor	1.1 Acceso limitado a servicios de capacitación agrícola
	1.2 Limitadas prácticas conservadoras de producción agrícola

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Sistemas productivos poco eficientee	1.1 Disminución de los ingresos económicos
	1.2 Perdidas de oportunidades de mercados para producción agrícola

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** PUERTO ASÍS - PUTUMAYO **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir en favor de los productores rurales para su producción, de sus productos agrícolas	Formulación, Estructuración, financiación y Seguimiento de la ejecución del Proyecto
Actor: Otro **Entidad:** Productores rurales asociados **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir apoyo para mejorar la producción de sus unidades agrícolas	Veeduría ciudadana en ejecución del proyecto

02 - Análisis de los participantes

La alcaldía municipal como cooperante contribuye en favor de los productores rurales para su producción de sus productos agrícolas, mediante la Formulación, Estructuración, financiación y Seguimiento de la ejecución del Proyecto, los Productores rurales asociados, como beneficiarios, reciben apoyo para mejorar la producción de sus unidades agrícolas, haciendo veeduría a la ejecución de los recursos.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

6.102

Fuente de la información

Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente - CPGA

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Putumayo **Municipio:** Puerto Asís **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

50

Fuente de la información

Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente - CPGA

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Putumayo **Municipio:** Puerto Asís **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona Rural, Vereda La Estación – vereda El Silencio	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

LIMITADAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de producción agrícola en el municipio de Puerto Asís, Putumayo.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Productores rurales asociados fortalecidos	**Medido a través de:** Número **Meta:** 50 **Tipo de fuente:** Informe	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas prácticas agrícola por parte del pequeño productor	mejorar prácticas agrícolas por parte del pequeño productor
Causa indirecta 1.1 Acceso limitado a servicios de capacitación agrícola	incrementar los servicios de capacitación agrícola
Causa indirecta 1.2 Limitadas prácticas conservadoras de producción agrícola	fortalecer la innovación tecnológica en el manejo de producción agrícola.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante injertación y capacitación técnica a productores	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante injertación y capacitación técnica a productores

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento técnico y dotación de material vegetal para la mejora de viveros de cacao injertado.

Medido a través de

Número

Descripción

Consiste en el fortalecimiento técnico y dotación de material vegetal para la mejora de viveros de cacao injertado.a productores rurales.

Descripción de la Demanda

Corresponde a los productores rurales de cacao que necesitan fortalecimiento en el municipio.

Descripción de la Oferta

Corresponde a la cantidad de productores beneficiados con el proyecto.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	50,00	-50,00
2025	0,00	50,00	-50,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en fortalecer las capacidades técnicas de los productores cacaoteros del municipio mediante la realización de dos (2) talleres prácticos sobre el manejo agronómico de viveros de cacao injertado, y la entrega de material vegetal (varetas de cacao) de la variedad Clon CCN 51, reconocido por su alta productividad, resistencia a enfermedades y adaptabilidad a las condiciones del territorio.

Los talleres estarán enfocados en dos componentes fundamentales:

a) Control de plagas y enfermedades en viveros de cacao, promoviendo el manejo integrado de plagas y el uso racional de insumos agrícolas.

b) Fertilización integrada del cultivo de cacao, orientada a la aplicación eficiente de nutrientes para optimizar el crecimiento y la sanidad de las plantas injertadas.

En complemento, se entregarán 19.425 varetas de cacao Clon CCN 51 a los productores participantes, destinadas a la injertación en viveros locales, con el fin de mejorar la calidad genética del material vegetal, aumentar la productividad y garantizar la sostenibilidad del sistema productivo cacaotero.

La ejecución de las actividades estará bajo acompañamiento técnico de un profesional agrónomo o técnico agropecuario, asegurando la correcta implementación de las prácticas aprendidas y el aprovechamiento del material entregado.

Con esta alternativa se espera fortalecer la capacidad técnica y productiva de los viveros de cacao, reducir pérdidas por enfermedades y mejorar el rendimiento de los futuros cultivos.

Alternativa: Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante injertación y capacitación técnica a productores

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación especifica
Región: Amazonas	Zona Rural, Veredas La Estación – El Silencio.
Departamento: Putumayo	
Municipio: Puerto Asís	
Tipo de Agrupacion:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Otros

Alternativa: Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante injertación y capacitación técnica a productores

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 39.800.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 39.800.000,00

mejorar prácticas agrícolas por parte del pequeño productor

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Apoyo a productores rurales **Medido a través de:** Número de pequeños productores rurales **Cantidad:** 50,0000 **Costo:** $ 39.800.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 50 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 50	1.1.1 Entregar varetas de cacao clon CCN 51 para injertación a los productores cacaoteros asociados de la zona rural **Costo:** $ 39.168.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Realizar capacitación sobre manejo agronómico de viveros de cacao injertado **Costo:** $ 632.000,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 Entregar varetas de cacao clon CCN 51 para injertación a los productores cacaoteros asociados de la zona rural

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$1.760.000,00	$33.408.000,00
Total	$1.760.000,00	$33.408.000,00

Periodo	Total
0	$35.168.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar capacitación sobre manejo agronómico de viveros de cacao injertado

Periodo	Mano de obra calificada
0	$832.000,00
Total	$832.000,00

Periodo	Total
0	$832.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante injertación y capacitación técnica a productores

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Demora en los procesos precontractuales del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento del plan de trabajo con los productores rurales	Revisión de los procesos precontractuales.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Injertos de baja calidad genética o fitosanitaria	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Inconformidad entre productores por la asignación de injertos	Entregar material vegetal certificado y adaptado a la región.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Entregar varetas de cacao clon CCN 51 para injertación a los productores cacaoteros asociados de la zona rural Riesgo: Incremento de los costos de insumos	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la contratación de insumos	Realizar el presupuesto basado en cotizaciones vigentes

Alternativa: Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante injertación y capacitación técnica a productores

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos por parte de los productores en el momento de adquirir sus insumos para control fitosanitario, plántulas e injertos, capacitaciones en BPA para implementar y / o fortalecer sus cultivos agrícolas de cacao.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad es igual al número de productores beneficiados con el proyecto en insumos para control fitosanitario y material vegetal.

Descripción Valor Unitario: El valor unitario corresponde al costo promedio de los elementos que necesitan los pequeños productores para lograr producir sus productos agrícolas.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	50,00	$1.000.000,00	$50.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$50.000.000,00	$50.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios o ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0.0	$0.0	$0.0	$32.784.320.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$-32.784.320.0
1	$40.000.000.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$40.000.000.0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante injertación y capacitación técnica a productores					
$3.912.927,71	22,01 %	$1,12	$655.686,40	$32.784.320,00	$2.224.377,71

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)	$655.686,40

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante injertación y capacitación técnica a productores

04 - Alcance

Mejorar la producción agrícola del municipio de Puerto Asís, Putumayo, a través de entrega de material vegetal e insumos para control fitosanitario a 50 productores rurales debidamente asociados, con el fin de mejorar las condiciones de producción agrícola y la calidad de vida de los campesinos de la zona rural y sus familias.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. mejorar prácticas agrícolas por parte del pequeño productor

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de pequeños productores rurales

Meta total: 50,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio ambiente

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Putumayo	Puerto Asis			
Proyecto	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	39.800.000,00	39.800.000,00	50,0000	50,0000	50

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa		$39.800.000,00
		Total Categoría	$39.800.000,00
	Total Categoría		
TOTAL POLITICA TRANSVERSAL			$39.800.000,00

PROYECCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."

BENEFICIOS

Beneficio 1:
Ahorro en costos por parte de los productores en el momento de adquirir sus insumos para control fitosanitario, plántulas e injertos, capacitaciones en BPA para implementar y / o fortalecer sus cultivos agrícolas de cacao.

Descripción de la cantidad
La cantidad es igual al número de productores beneficiados con el proyecto en insumos para control fitosanitario y material vegetal.

Descripción del valor unitario
El valor unitario corresponde al costo promedio de los elementos que necesitan los pequeños productores para lograr producir sus productos agrícolas.

Se calcula beneficios anuales de la siguiente manera:
Número de productores rurales asociados beneficiados = 50
Valor promedio por costos = $ 1.000.000

PERIODO	CANTIDAD	VALOR	Total Año 1
1	50	$ 1.000.000,00	$ 50.000.000
TOTAL		$ -39.799.500	**$ 50.000.000**

PRESUPUESTO

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1,00	Entregar varetas de cacao clon CCN 51 para injertación a los productores cacaoteros asociados de la zona rural	Und	1	$ 39.168.000	$ 39.168.000
2,00	Realizar capacitación sobre manejo agronómico de viveros de cacao injertado	Taller	2	$ 316.000	$ 632.000
TOTAL COSTOS					**$ 39.800.000**

ING. Carlos Eduardo Vargas Velásquez
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO PUERTO ASÍS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Nombre del proyecto	**"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."**
ítem	***Entregar varetas de cacao clon CCN 51 para injertación a los productores cacaoteros asociados de la zona rural***

I. MATERIALES

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Valor total*
VARETAS DE CACAO CLON CCN 51	Unidad	19200	1740	$ 33.408.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub- Total	**$ 33.408.000,00**

II. GASTOS LOGISTICOS

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Valor total*
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub- Total	**$ -**

III. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Valor total*
			Sub- Total	

IV. TRANSPORTE

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Valor total*

				$ -
			Sub- Total	**$ -**
V. MANO DE OBRA				
Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Valor total*
Técnico agrícola para la injertación de las varetas de cacao	Unidad	19200	$ 300,00	$ 5.760.000,00
			Sub- Total	**$ 5.760.000,00**
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 39.168.000,00**

item	***Realizar capacitación sobre manejo agronómico de viveros de cacao injertado***			
I. MATERIALES				
Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Valor total*
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub- Total	**$ -**
II. GASTOS LOGISTICOS				
Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Valor total*
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Sub- Total	**$ -**
III. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Valor total*

			Sub- Total	

IV. TRANSPORTE

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Valor total*
				$ -
			Sub- Total	**$ -**

V. MANO DE OBRA

Descripción	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Valor total*
Técnico agrícola para realizar talleres de: a) Control de plagas y enfermedades en viveros de cacao, promoviendo el manejo integrado de plagas y el uso racional de insumos agrícolas y b) Fertilización integrada del cultivo de cacao, orientada a la aplicación eficiente de nutrientes para optimizar el crecimiento y la sanidad de las plantas injertadas.a los 50 productores rurales	Taller	2	$ 316.000,00	$ 632.000,00
			Sub- Total	**$ 632.000,00**
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD	**$ 632.000,00**

ING. Carlos Eduardo Vargas Velásquez
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

"FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO."

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR TOTAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN
				MES I
1,00	Entregar varetas de cacao clon CCN 51 para injertación a los productores cacaoteros asociados de la zona rural	1	$ 39.168.000	
2,00	Realizar capacitación sobre manejo agronómico de viveros de cacao injertado	2	$ 632.000	
			$ 39.800.000	

ING. Carlos Eduardo Vargas Velásquez
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente

COTIZACIONES

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



NIT 18.189.780- 4

Puerto Asís Putumayo 8 de octubre 2025

COTIZACION

Señores: CPGA PUERTO ASÍS

DIRECCIÒN: Calle 10 - Cra 19 esquina Barrio El Carmen

DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VARETAS DE CACAO CLON CCN 51	unidad	19.200	$ 1.739	$ 33.388.800
TOTAL				**$ 33.388.800**

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 90 DIAS
MONEDA DE PAGO: PESOS COLOMBIANOS
FORMA DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
GARANTIA: ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL DE BUENA CALIDAD

NOTA. LA PRESENTE COTIZACION ESTA CONTEMPLADA A TODO COSTO MAS LOS IMPUESTOS DE LEY

Atentamente,

ALVARO ENRIQUE ROJAS
AGRO INVERSIONES ROJAS

Dirección : calle 10 – enseguida de la virgen- Municipio de Puerto Asís.
Correo: acuimetalenrojas@hotmail.com – Agroinversionesrojas@hotmail.com
CEL: 3507239077

VIVERO AGROFORESTAL AMAZONICO E.U.
RESOLUCIÒN ICA 86568-15-2022
NIT: 900278587-1

Puerto Asís, putumayo. 6 octubre 2025

Señores
Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de los Puertos
Puerto Asís – Putumayo.

Referencia: Cotización

Me permito presentar la siguiente cotización a todo costo más impuestos de ley, de 19.200 varetas de cacao CCN 51, requeridas por la Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de los Puertos, en el municipio de Puerto Asís departamento del Putumayo.

Descripción	especie	Nombre científico	cantidad	Vr unitario	Vr total
a todo costo varetas de cacao CCN 51	Cacao	Theobroma cacao	19.200	$2.280	$43.776.000
Total			**19.200**		**$43.776.000**

La propuesta a todo costo más impuestos de ley (14 %)
Forma de Pago: 50% inicial y 50% a la entrega formal.
Tiempo de entrega: 30 días
Valides de la oferta: 90 días

El vivero Agroforestal Amazónico EU cumple con todos los requisitos para contratar con empresas públicas y privadas

Atentamente,

FELIX MARIA CADENA MARTINEZ
Representante Legal

Dirección: km 1 vía Kanacas, Puerto Asís – Putumayo
Celular: 3214519263
Correo Electrónico: fcadenam@yahoo.com - viveroagrofoama@hotmail.com

OASIS AMAZONICO - CENTRO DE DESARROLLO AGROECOLOGICO SAS ZOMAC BIC. NIT: 901374589-9
RESOLUCIÓN ICA No. 76776

Puerto Asís Putumayo. 2 octubre 2025

Ingeniero:
Henry Albeyro Solarte Acosta.
Gerente corporación centro provincial de gestión agroempresarial de los puertos
Puerto Asís, Putumayo.

REFERENCIA: Cotización

Somos vivero OASIS AMAZONICO – CENTRO DE DESARROLLO AGROCOLOGICO SAS ZOMAC BIC, ubicado en la vereda Agua Negra Uno, del municipio de Puerto Asís kilómetro 6 vía a Mocoa, empresa dedicada a la propagación y comercialización de material vegetal de especies forestales, maderables y no maderables, contamos con una amplia experiencia en manejo de semillas, propagación de material vegetal, silvicultura de bosque entre otros. Estamos legalmente registrados ante el ente de control Instituto Colombiano Agropecuario ICA con resolución No 76776 y resolución No. 00013713.

La presente tiene como finalidad establecer una línea de comunicación a través de la cual se pueda dar a conocer nuestro producto, contado con una muy buena relación calidad + precio.

A continuación, se presenta la información correspondiente a la solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos para su conocimiento y fin pertinente.

Ítem	Producto	cantidad	Valor unidad
1	VARETAS DE CACAO CLON CCN 51	19.200	$ 1.200

La propuesta a todo costo más impuestos de ley.

Cordialmente,

LEIDY VALLEJO PANTOJA
Representante Legal
OASIS AMAZONICO S.A.S ZOMAC

Correo electrónico: oasisamazonico@gmail.com
Tel: 3214097710 – 3112923135 Vereda Agua Negra Uno – Puerto Asís – Putumayo.

CENSO

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

No	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
1	RONAL	FERNANDO	CANENCIO	
2	OMAR	AUGUSTO	CANENCIO	
3	JULIA		SALAZAR	
4	ELVIS		IMBAJOA	
5	IVAN		CANENCIO	LOPEZ
6	LUIS		HERMOSA	
7	YISELA	HERMOSA	CANENCIO	
8	EDUAR	YULIAN	CASTRO	HERMOSA
9	YELITZA0	HERMOSA	CANENCIO	
10	HILDA	EMMA	PETEVI	
11	REMBERTO	ARBEY	PETVI	GOMEZ
12	STEHINER		HERMOSA	CANENCIO
13	GILSON	ALDAIR	CANENCIO	
14	JAICE	BYRON	CANENCIO	SALAZAR
15	ANDRES	FELIPE	CANENCIO	SALAZAR
16	FLORICELDA		DIAZ	QUINTERO
17	EDWUIN	ALEXANDER	ESPANA	CANENCIO
18	HILDA	ALEIDA	CANENCIO	PETEVI
19	MIGUEL	WBEIMAR	CANENCIO	PETEVI
20	ASTRID	YOLIMA	CANENCIO	SALAZAR
21	NELCY	EDILMA	CANENCIO	SALAZAR
22	INGRID	TATIANA	CANENCIO	SALAZAR
23	MARGIE	STHEPHANNY	CANENCIO	
24	LEIDY	LUCELLY	CANENCIO	PETEVI
25	JORGE	IVAN	CANENCIO	PETEVI
26	AURA		RIVERA	
27	BEAKER	STIVEN	SALAZAR	CANENCIO
28	YESICA	JHOANA	PEINADO	
29	JEIMY	STELLY	CANENCIO	SALAZAR
30	MAURA	CANENCIO	PETEVI	
31	CAROLINE	DAYANA	CUASAPUD	ZAMBRANO
32	EDWUIN	DARIO	CUASTUMAL	
33	LUIS	CARLOS	DIAZ	CANENCIO
34	NATALIA	PETEVI	CARDENAS	
35	MIGUEL	ANGEL	CHAMORRO	
36	ILDEFONSO	ENRIQUE	MENDOZA	MARQUEZ
37	FABIAN	GABRIEL	CALDERON	MORELO
38	MARIO	GIRALDO	GETIAL	GETIAL
39	JUAN	ANGEL	PARRA	MACHOA
40	MONICA	FERNANDA	FERNANDEZ	IPIALES
41	DIDIER		CABRERA	MURCIA

42	JESUS	JUSTINIANO	CORTES	CAICEDO
43	MAGNOLIA	CABRERA		
44	PAOLA	ANDREA	FERNANDEZ	IPIALES
45	DAINER	JAVIER	CALDERON	MORELO
46	DORIS	YOLIMA	IPIALES	MENESES
47	OMAR	JOSE	LOPEZ	ARFROYO
48	YEFERSON		BEJARANO	TRUJILO
49	MANUEL	MESIAS	CUARAN	CUELTAN
50	IDALBA	FRANCENI	ERASO	ALVARADO

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fecha de Impresión: ***12/Nov/2025 04:02 PM***

DEFINITIVA

Documento mediante el cual se aprueban la(s) fuente(s) y los recursos para la financiación de los proyectos de inversión pública registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública, que han sido priorizados por la entidad o actor competente. Para efectos de la aprobación de recursos para la financiación de un determinado proyecto de inversión y su programación en la PIIP se deberá cumplir con los procedimientos presupuestales propios de la fuente respectiva, conforme a la normativa aplicable. (Artículo 2.2.6.3.2. Decreto 1082 de 2015, actualizado por el Decreto 2104 de 2023)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, Putumayo				
CÓDIGO BPIN	202500000041693	***HORIZONTE***	2025 - 2025	***ESTADO***	Viable con recursos solicitados
ENTIDAD RESPONSABLE	86568-PUERTO ASÍS	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	***SECTOR***	Agricultura y desarrollo rural
PROGRAMA	1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales		***VALOR TOTAL DEL PROYECTO***	$	$ 39.800.000,00
ALCANCE	Mejorar la producción agrícola del municipio de Puerto Asís, Putumayo, a través de entrega de material vegetal e insumos para control fitosanitario a 50 productores rurales debidamente asociados, con el fin de mejorar las condiciones de producción agrícola y la calidad de vida de los campesinos de la zona rural y sus familias.				

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Total fuente	
Inversión	Municipios	Territorial - PUERTO ASÍS - Propios	Propios	$	$ 29.500.000,00
Vigencia			**Valor solicitado**		
2025			$		29.500.000,00
Etapa	**Tipo financiador**	**Financiador**	**Recurso**	**Total fuente**	
Inversión	Municipios	Territorial - PUERTO ASÍS - SGP - Propósito General Libre Inversión	SGP - Propósito General Libre Inversión	$	$ 10.300.000,00
Vigencia			**Valor solicitado**		
2025			$		10.300.000,00
Total recursos solicitados por fuente de financiación				$	$ 39.800.000,00

REGIONALIZACIÓN

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

FOCALIZACIÓN

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados identificando el detalle por política transversal, para financiar cada uno de los productos focalización y ubicación del producto

Producto	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto) - Apoyo a productores rurales				
Política transversal	Construcción de Paz	**Categoría**	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	**Subcategoría**	
Etapa	**Tipo financiador**	**Financiador**	**Recurso**	**Total recursos focalizados en esta fuente de financiación**	$ 29.500.000,00
Inversión	Municipios	Territorial - PUERTO ASÍS - Propios	Propios		
Localización	Amazonas - Putumayo - Puerto Asís -		**Vigencia**	**Valor solicitado**	
			2025	$ 29.500.000,00	

Producto	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto) - Apoyo a productores rurales				
Política transversal	Construcción de Paz	**Categoría**	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	**Subcategoría**	
Etapa	**Tipo financiador**	**Financiador**	**Recurso**	**Total recursos focalizados en esta fuente de financiación**	$ 10.300.000,00
Inversión	Municipios	Territorial - PUERTO ASÍS - SGP - Propósito General Libre Inversión	SGP - Propósito General Libre Inversión		
Localización	Amazonas - Putumayo - Puerto Asís -		**Vigencia**	**Valor solicitado**	
			2025	$ 10.300.000,00	

Total Construcción de Paz	$ 39.800.000,00

OBSERVACIONES DE VIABILIDAD
Se relacionan los usuarios involucrados correctamente. Se ingresa justificación para la aprobación correctamente.

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

¿Conforme al análisis de los recursos solicitados se da visto bueno para continuar con el proceso de programación presupuestal por vigencia conforme a las fuentes de financiación e información asociada al horizonte del proyecto?	Si

Funcionarios que emiten concepto		**Área/dependencia**	**Firma**
Elaboró	Jennifer Andrea Quintero Gutiérrez	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Emitió	carlos eduardo vargas velasquez	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
