ALCALDIA MUNICIPAL DE
BRICEÑO BOYACÁ

Informe general de seguimiento

“TODOS POR BRICEÑO 2024-2027"

AVANCE VIGENCIA GUBERNAMENTAL

01/12/2025

PEDRONEL VILLAMIL CASTRO

Alcalde Municipal

2024-2027

PRESENTACIÓN

Por medio del presente informe se presenta un balance integral sobre el estado actual del Plan de Desarrollo Territorial **""TODOS POR BRICEÑO 2024-2027""**, detallando los avances logrados en los principales aspectos de implementación en lo corrido del periodo gubernamental **2024-2027,** específicamente para la vigencia **2,025**. A través de los indicadores de **AVANCE FÍSICO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE DE GESTIÓN Y AVANCE DE GESTIÓN PONDERADA**, este documento ofrece una visión clara del progreso alcanzado hasta la fecha, destacando los logros obtenidos y las áreas donde se requiere fortalecer los esfuerzos.

En términos de avance físico, se ha logrado un **29.59 %**, en relación con las cantidades ejecutadas de cada meta programada en el plan. Este indicador muestra el porcentaje de acciones concretadas sobre el total de las metas establecidas, considerando elementos de infraestructura, servicios, programas sociales, acciones adminnistrativas y mejoras específicas para el territorio. Este nivel de avance refleja que, aunque se ha logrado un progreso considerable en la ejecución de proyectos, es fundamental continuar avanzando para cumplir con los objetivos en su totalidad.

El avance financiero se sitúa en un **11.69 %**, lo que representa la proporción de los recursos económicos asignados que han sido utilizados hasta la fecha. Este valor evidencia un uso controlado y eficiente del presupuesto, permitiendo asegurar la sostenibilidad financiera para las próximas fases del plan. Es vital que los recursos disponibles sigan siendo gestionados de manera estratégica para garantizar el desarrollo continuo de los proyectos en curso.

En el aspecto de gestión, el avance calculado en promedio simple alcanza un **25 %**, lo que refleja la implementación de acciones administrativas, logísticas y de coordinación necesarias para la ejecución del plan. Este porcentaje evidencia el esfuerzo dedicado a planificar y organizar las actividades de cada área, asegurando que todas las acciones se mantengan alineadas con los objetivos propuestos. De igual forma el avance ponderado en la ejecución del plan de acción, es decir por el peso de cada acción en la ejecución de cada meta es del **25 %.**

Este informe constituye una herramienta de análisis y transparencia que permite evaluar el impacto de las acciones emprendidas y ajustar las estrategias para maximizar los resultados en beneficio de la comunidad. Agradecemos a todos los involucrados por su compromiso en esta misión y los invitamos a revisar los detalles de este documento para contribuir con ideas y esfuerzos a la continuación de nuestro plan de desarrollo.

PEDRONEL VILLAMIL CASTRO
Alcalde Municipal
2024-2027

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Oscar Fernando Pineda Poveda	**Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos** **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**
Wilmer Efren Benítez Martínez	**Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano** **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**
Gisseth Karina Pinilla Alvarado	**Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas** **Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas**
PEDRONEL VILLAMIL CASTRO	**DESPACHO DEL ALCALDE** **Alcalde Municipal**
Viviana Marcela Poveda Bohórquez	**Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos** **Contratista MIPG**

DEFINICIONES

PLAN DE ACCIÓN: Un plan de acción es un conjunto de pasos y estrategias organizadas de manera secuencial y coherente para alcanzar un objetivo específico. Generalmente incluye actividades claras, plazos de ejecución, recursos necesarios y responsables de llevar a cabo las acciones. Es una herramienta clave para guiar la implementación de proyectos o metas dentro de un marco estructurado, en nuestro caso el Plan de Desarrollo Territorial (PDT)

AVANCE FÍSICO: El avance físico se refiere al porcentaje de cumplimiento de las actividades o metas programadas en un plan, meta o proyecto en términos de ejecución tangible. Este indicador se calcula tomando como base las cantidades físicas realizadas (por ejemplo, kilómetros de carretera construidos, número de viviendas edificadas, etc.) frente a las cantidades totales que se esperan realizar. El avance físico permite evaluar qué tan cerca está el plan o proyecto de completar todo lo que se ha previsto.

AVANCE FINANCIERO: El avance financiero mide el grado de ejecución de los recursos económicos asignados a un proyecto o plan, comparando lo gastado hasta el momento con lo presupuestado inicialmente. Este indicador es esencial para monitorear la correcta administración del presupuesto, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y eficiente para las distintas actividades programadas.

AVANCE DE GESTIÓN: El avance de gestión se refiere al progreso logrado en la implementación de las acciones definidas en el plan de acción, y se calcula tomando en cuenta el grado de cumplimiento de cada acción programada. Este indicador evalúa qué tan cerca se está de alcanzar las metas previstas en términos de actividades administrativas, operativas y de coordinación, considerando tanto la cantidad de acciones completadas como su alineación con los plazos y objetivos establecidos. El avance de gestión permite medir la eficiencia en la ejecución de los procesos que respaldan la implementación del plan.

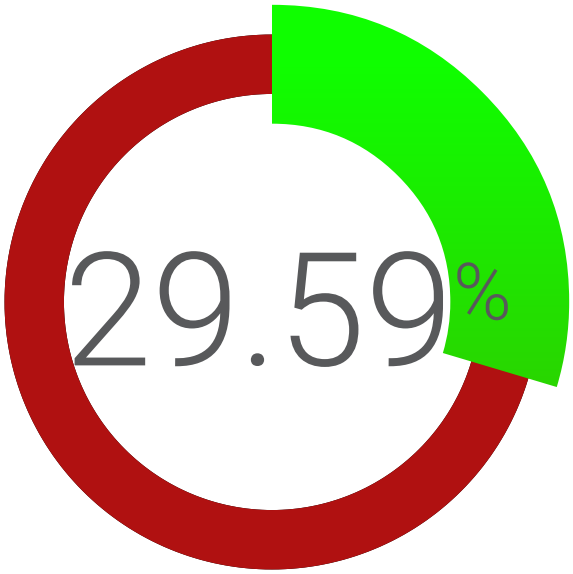
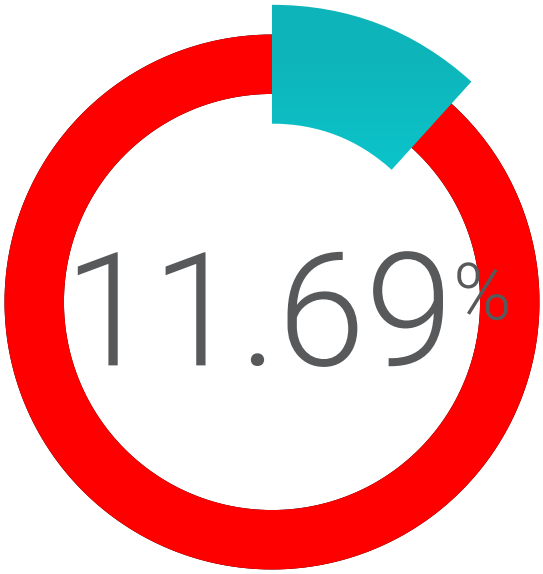
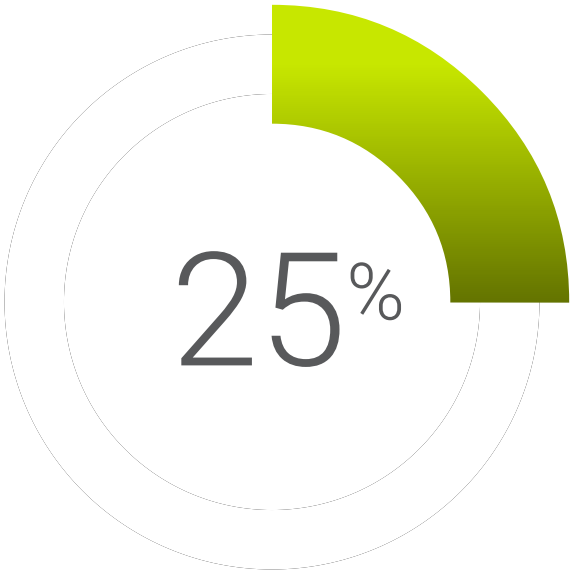
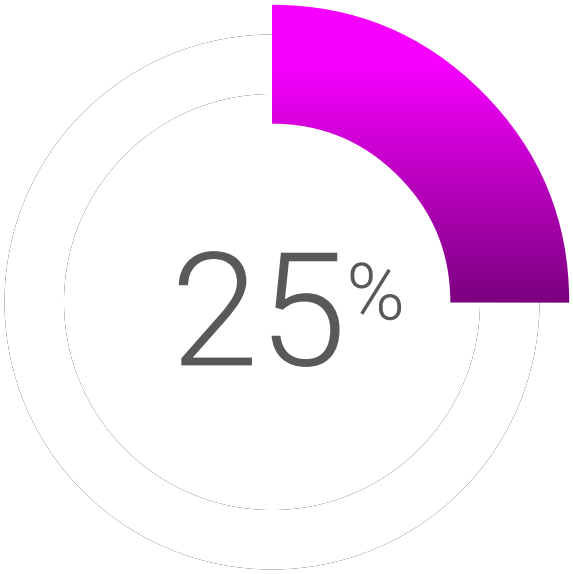
PONDERACIÓN: La ponderación es el proceso mediante el cual se asigna un valor relativo o un peso a distintos elementos o variables dentro de un conjunto, en función de su importancia o relevancia.

AVANCE DE GESTIÓN PONDERADA: El avance de gestión ponderada es un indicador que refleja el progreso general del plan o proyecto, tomando en cuenta no solo el avance simple de las acciones ejecutadas, sino también su importancia relativa en el contexto global del plan. Se calcula multiplicando el avance porcentual de cada acción o actividad por un ponderador que representa su peso o relevancia dentro de los objetivos generales del proyecto. El resultado de esta multiplicación se suma para obtener un porcentaje global de avance ponderado, lo que proporciona una evaluación más equilibrada y ajustada a la prioridad de cada actividad.

$$Avance\ de\ Gestión\ Ponderada\ =\ \Sigma(Avance\ Simple\ Acción\ X\ Ponderador\ de\ la\ acción)$$

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACÁ	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

AVANCE VIGENCIA GUBERNAMENTAL 2024-2027




Avance fisico del PDT	Avance financiero del PDT
29.59 %	**11.69 %**
	
En lo corrido del cuatrienio, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta una ejecución física del **29.59 %**, esto es el avance de ejecución de las cantidades programadas para cada una de las metas de dicho Plan.	En lo corrido del cuatrienio, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta una ejecución financiera del **11.69 %**, esto es el gasto de inversión ejecutado, respecto al valor programado en el POAI.
Avance de gestión promedio simple del Plan de Acción	**Avance de gestión promedio ponderado del Plan de Acción**
25 %	**25 %**
	

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT




En lo corrido del cuatrienio, la gestión para la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta un avance simple del **25 %**. Este avance se calcula de acuerdo al Plan de Acción proyectado por cada uno de los responsables de ejecución del Plan.

En lo corrido del cuatrienio, la gestión para la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), presenta un avance ponderado del **25 %**. Este avance se calcula de acuerdo al avance simple del Plan de Acción proyectado por cada uno de los responsables de ejecución del Plan multiplicado por el ponderador o peso de cada acción.

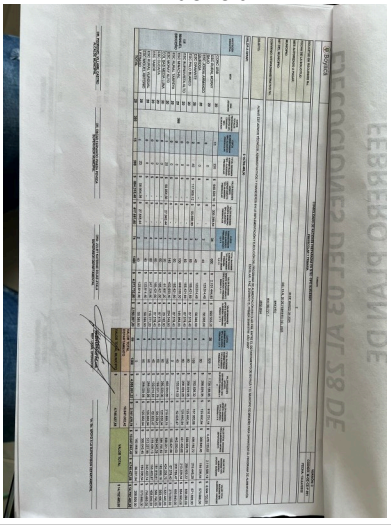
AVANCE VIGENCIA 2.025

Respecto a lo programado para la vigencia 2.025 la **ejecución física** del Plan de Desarrollo Territorial presenta un avance del **46 %**, según lo reportado por cada uno de los responsables de meta.		Respecto a lo programado para la vigencia 2.025 la **ejecución financiera** del Plan de Desarrollo Territorial presenta un avance del **38,06 %,** segun información de la ejecución del POAI y los certificados de viabilidad emitidos	
En cuanto a la gestión realizada para el cumplimiento de las metas por cada uno de los responsables, de acuerdo al **Plan de Acción** proyectado, el avance para la vigencia 2.025 es de **44 %**, en promedio simple, según lo reportado por cada uno de los responsables de meta.		En términos de promedio ponderado este avance para la vigencia 2.025 se calcula en **44 %**, según lo reportado y programado por cada uno de los responsables de meta.	

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 001 - Aopoyo a la eduacion y disminucion de la desercion escolar brindando Alimentación escolar-2201028. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **83.40 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Disminución de la deserción escolar brindando Alimentación escolar	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON LOS TÉRMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN CONVENIO 4632-2024: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	

Resumen de ejecución del PA

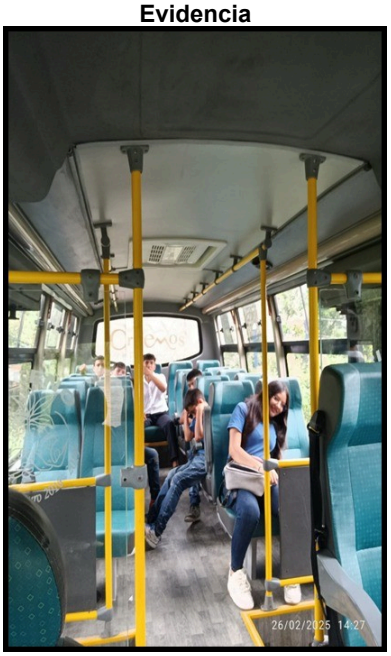
Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Disminución de la deserción escolar brindando Alimentación escolar	350.00	175.00	50.00 %	100.00 %	50 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 002 - Aopoyo a la eduacion y disminucion de la desercion escolar Transporte escolar-2201029. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **55.91 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Aopoyo a la eduacion y disminucion de la desercion escolar Transporte escolar	Se realizo contrato para la prestación del servicio de transporte escolar	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Aopoyo a la eduacion y disminucion de la desercion escolar Transporte escolar	120.00	120.00	100.00 %	100.00 %	100 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 003 - Paquetes escolares como apoyo a mejoramiento de la calidad educativa-2201069. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **97.33 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Paquetes escolares como apoyo a mejoramiento de la calidad educativa	Se realizo contrato cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE AYUDAS EDUCATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL AREA RURAL Y URBANA, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACÁ, ORIENTADOS A GARANTIZAR HERRAMIENTAS IDONEAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, QUE GARANTICE EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO A NIVEL LOCAL PARA LA VIGENCIA 2025	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Paquetes escolares como apoyo a mejoramiento de la calidad educativa	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 004 - Mjoramiento de la calidad educativa mediante capacitaciónes en pruebas SABER-2201080. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **94.26 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mjoramiento de la calidad educativa mediante capacitaciones en pruebas SABER	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PREPARACION DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE(11) EN EL PRE-ICFES PRUEBAS SABER DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MANUEL BRICEÑO-BOYACA"	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mjoramiento de la calidad educativa mediante capacitaciones en pruebas SABER	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 005 - Mejorar la calidad educativa mediante el Mantenimiento infraestructura educativa y restaurantes escolares-2201070. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Realizar el proceso de contratación para el mantenimiento de las diferentes sedes educativas	Se realizo Contrato de Obra para realizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACI0N DE LA INFRAESTRUCTURA FisICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS TABOR Y BETANIA PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MANUEL BRICENO, VIGENCIA 2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACÁ

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Realizar el proceso de contratación para el mantenimiento de las diferentes sedes educativas	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 006 - Mjoramiento de la calidad educativa mediante mediante la construcción infraestructura educativa-2201051. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **10.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Construcción de infraestructura educativa	Se reliza ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ESCUELA OBJETO: CUCAITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MANUEL BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Construcción de infraestructura educativa	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 007 - Dotación restaurantes escolares como apoyo a la desercion escolar-2201069. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **10.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Dotación restaurantes escolares como apoyo a la deserción escolar	Se realiza contrato para la dotación de menaje para las instituciones	SECRETARÍA DE GOBIERNO

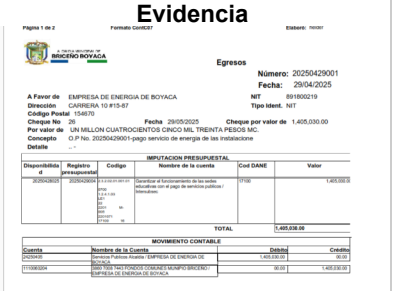
Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Dotación restaurantes escolares como apoyo a la deserción escolar	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 008 - Garantizar el funcionamiento de las sedes educativas mediante el pago de servicios públicos-2201071. Responsable de la meta: **Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas**	El Avance físico de la meta es de **66.67 %,** Avance financiero de la meta: **36.03 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **75 %** y en promedio ponderado es de **75 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media del municipio de Briceño	Garantizar el funcionamiento de las sedes educativas con el pago de servicios publicos	

Egresos

Número: 20250429001
Fecha: 29/04/2025

A Favor de EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA
Dirección CARRERA 10 #15-57
Código Postal 154670
Cheque No 26
Por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL TREINTA PESOS MC.
Concepto O.P No. 20250429001-pago servicio de energia de las instalacione
Detalle

NIT 891800219
Tipo Ident. NIT
Fecha 29/05/2025
Cheque por valor de 1,405,030.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
20250428025	20250428004	A-2-0-03-001-01 SPGI 2 2 1 0 0 0

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 009 - Mejorar la calidad educativa mediante la realizacion de Ferias de educación superior, tecnologica y/o tecnica presenciales y/o virtuales-2202067. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mejorar la calidad educativa mediante la realización de Ferias de educación superior		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mejorar la calidad educativa mediante la realización de Ferias de educación superior	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 010 - Transferencia de recursos de gratuidad - SGP al sector educativo para garantizar el servicio con inclusión de la población NNAJ-2201071. Responsable de la meta: **Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas**	El Avance físico de la meta es de **73.33 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **73 %** y en promedio ponderado es de **73 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Realizar la transferencia de recursos por el criterio de calidad - gratuidad educativa del Sistema General de Participaciones (SGP) - Educación, sin situación de fondos a la institución educativa técnica Manuel Briceño.	Realizar la transferencia de recursos por el criterio de calidad - gratuidad educativa del Sistema General de Participaciones (SGP) - Educación, sin situación de fondos a la institución educativa técnica Manuel Briceño.	 EGRESO SIN SIT. DE FONDOS Número: 2025032701 Fecha: 27/03/2025 A Favor de INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MANUEL BRICEÑO NIT 820001699 Dirección CARRERA 4 # 4-39 BRICEÑO Tipo ident. NIT Código Postal 154670 Cheque No 49 Fecha 27/03/2025 Cheque por valor de 32,864,033.00 Por valor de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS MC. Concepto O.P No. 2025032701-TRSNFERENCIA POR GRATUIDA ENN EDUCACION Detalle - IMPUTACION PRESUPUESTAL Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor TOTAL 32,864,033.00


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Realizar la transferencia de recursos por el criterio de calidad - gratuidad educativa del Sistema General de Participaciones (SGP) - Educación, sin situación de fondos a la institución educativa técnica Manuel Briceño.	15.00	11.00	73.33 %	100.00 %	73 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 011 - Atención integral al adulto mayor en el Centro de protección-4104008. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **66.64 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Atención integral al adulto mayor en el Centro de protección	DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN “NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO”, EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ	

ACTA DE INICIO.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO No. MB-RE-ESAL-002-2025.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ).
NIT No.	800099721-1
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá.
CONTRATISTA:	FUNDACION LA VIDA COMIENZA HOY "FUNVIDAHOY".
NIT No.	901.079.319 – 2.
REPRESENTANTE LEGAL:	WILLIAN ANTONIO VILLAMIL.
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	4.229.422, Expedida en Sahoya – Boyacá.
OBJETO:	**DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN "NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO", EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ.**
VALOR:	**CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE, ($ 58,600,000.00)**, incluido estampillas, impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES.
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Briceño (Boyacá), pagará el valor del presente contrato y/o convenio de la siguiente manera: por **ACTAS PARCIALES**, cada uno previa presentación del respectivo informe relacionando las actividades efectuadas en dicho tiempo, a entera satisfacción por parte del superior del contrato, los pagos se efectuarán previa presentación por parte del contratista del recibo de pago de los aportes a la E.P.S., A.R.L. y Recibo de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
FECHA CONVENIO:	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025.

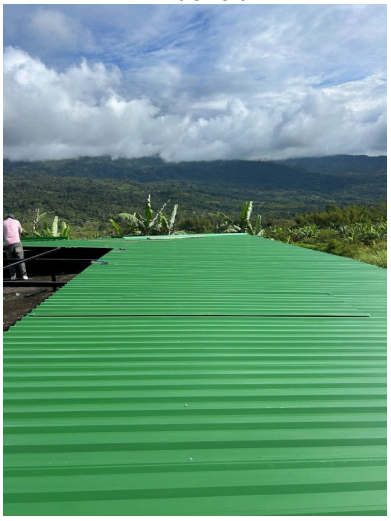
Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Atención integral al adulto mayor en el Centro de protección	10.00	1.00	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 012 - Mantenimiento de Centro de protección del adulto mayor-4104002. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **99.99 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	99.99%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mantenimiento de Centro de protección del adulto mayor	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE PROTECCION NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO DE BRICEÑO BOYACÁ, VIGENCIA 2025".	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mantenimiento de Centro de protección del adulto mayor	0.50	0.50	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 013 - Apoyo integral al adulto mayor mediante laa dotación Centro de protección-4104007. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo integral al adulto mayor mediante la dotación Centro de protección		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo integral al adulto mayor mediante la dotación Centro de protección	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 014 - Brindar atencion integral a adultos mayores en el Centro vida-4104008. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Brindar atencion integral a adultos mayores en el Centro vida		


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Brindar atencion integral a adultos mayores en el Centro vida	180.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 015 - Plan de acción politica pública y comité gerontologico-4103070. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ejecutar el plan de acción política pública y comité gerontológico	Acta de comite gerontologico	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ejecutar el plan de acción política pública y comité gerontológico	1.00	0.50	50.00 %	100.00 %	50 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 017 - Proteccion integral a adultos mayore con servicio de apoyo funerario-4104008. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **60.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Brindar protección integral a adultos mayores con servicio de apoyo funerario	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXEQUIALES FOCALIZADO A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, VIGENCIA 2025	

ACTA DE INICIO.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MB-INV-009-2025.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ).
NIT:	800.099.721 – 1.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO.
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá.
CONTRATISTA:	RUBEN DARIO GARCIA VEGA.
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	86.002.249, Expedida en Granada – Meta.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXEQUIALES FOCALIZADO A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, VIGENCIA 2025
VALOR:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 10.500.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE LO QUE OCURRA PRIMERO.
FECHA CONTRATO:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025.
FECHA DE INICIO:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025.

En el Municipio de Briceño (Boyacá), a los Doce (12) días del mes de Febrero del año 2025, se reunieron el Doctor, **OSCAR FERNANDO PINEDA POVEDA**, en calidad de Secretario de Gobierno, Jurídico y Asuntos Administrativos, actuando como Supervisor designado, de una parte; y de la otra, **RUBEN DARIO GARCIA VEGA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.002.249, Expedida en Granada – Meta, en calidad de contratista con el fin suscribir la presente acta de inicio al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MB-INV-009-2025**, para lo cual,

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Brindar protección integral a adultos mayores con servicio de apoyo funerario	4.00	2.00	50.00 %	100.00 %	50 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 018 - Apoyo a NNAJ mediante la ejecusion del Plan de acción politica pública Primera infancia, infancia y adolescencia-4102041. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **98.01 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a NNAJ mediante la ejecución del Plan de acción política pública Primera infancia, infancia y adolescencia		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a NNAJ mediante la ejecución del Plan de acción política pública Primera infancia, infancia y adolescencia	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 019 - Apoyo a la familia mediante la ejecucion del Plan de acción politica pública Fortalecimiento familiar-4102041. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **40.00 %,** Avance financiero de la meta: **76.91 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **40 %** y en promedio ponderado es de **40 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a la familia mediante la ejecución del Plan de acción política pública Fortalecimiento familiar	Diseñar e implementar una estrategia de prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes Diseñar e implementar campañas comunicativas y pedagógicas de prevención de la vulneración de derechos contra niñas, niños y adolescentes en entornos de violencia familiar Diseñar una estrategia que fortalezca y dinamice la Mesa de participación y Mesa de Infancia y adolescencia Instalación y puesta en marcha Comité interinstitucional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección integral del adolescente trabajador Realizar campañas de promoción de la erradicación del trabajo infantil Formalización del Comité Municipal de Prevención y Control de SPA ante el COMPOS Promover acciones de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños y adolescentes Realizar articulación interinstitucional para el abordaje de la prevención del consumo de SPA en el municipio, mejorando la capacidad de respuesta Implementar la ruta nacional de prevención de embarazo adolescente y adecuarla al contexto municipal Implementación de la mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes Celebración Mes de Niñez Mediante la estrategia de Brújula – 2025	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a la familia mediante la ejecución del Plan de acción política pública Fortalecimiento familiar	1.00	0.40	40.00 %	100.00 %	40 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 020 - Apoyo a la primera infancia mediante la dotacion de material didactico para el hogar agrupado-4103031. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a la primera infancia mediante la dotación de material didáctico para el hogar agrupado		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a la primera infancia mediante la dotación de material didáctico para el hogar agrupado	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 021 - Apoyo a NNAJ mediante la celebración día del niño con enfoque del derecho al juego, segun artículo 31 de la Convención sobre los derechos del Niño-4102042. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **67.78 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a NNAJ mediante la celebración día del niño con enfoque del derecho al juego	Se realizo PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION, ORGANIZACIÓN, LOGISTICA Y ENTREGA DE INCENTIVOS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ, VIGENCIA 2025.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a NNAJ mediante la celebración día del niño con enfoque del derecho al juego	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 022 - Seguimiento y acciones al plan de mejoramiento de la rendición de cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 2020 - 2023-4103070. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Seguimiento y acciones al plan de mejoramiento de la rendición de cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Seguimiento y acciones al plan de mejoramiento de la rendición de cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 024 - Apoyo a adolescentes mediante el Convenio marco fidel suarez ley 1098-4103067. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a adolescentes mediante el Convenio Marco Fidel Suarez	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Y LA CASA DEL (A) MENOR, MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVISIÓN Y PREVENCIÓN DE LA INFRACCIÓN A LA LEY PENAL ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO EN EL MUNICIPIO	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DIMENSIÓN 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA

ACTA DE INICIO



ACTA DE INICIO
CONT CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. MB-CI-001-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ)
NIT:	800.099.721 -1
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.317.008 Expedida en Chiquinquirá - Boyacá
CONTRATISTA:	LA CASA DEL (A) MENOR MARCO FIDEL SUAREZ
NIT No.	891801333 - 8
REPRESENTANTE LEGAL:	NUR STEFANIE ESCOBAR JIMENEZ.
CEDULA DE CIUDADANÍA:	40.048.528, Expedida en Tunja - Boyacá.
OBJETO:	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Y LA CASA DEL (A) MENOR, MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVISIÓN Y PREVENCIÓN DE LA INFRACCIÓN A LA LEY PENAL ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO EN EL MUNICIPIO
VALOR:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL ($4.660.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, desde la suscripción del Acta de inicio.
FECHA CONTRATO:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a adolescentes mediante el Convenio Marco Fidel Suarez	1.00	0.50	50.00 %	100.00 %	50 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 025 - Apoyo a adolescentes y sus familas mediante el Convenio interadministrativo CESPA, ley 1098-4103067. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a adolescentes y sus familias mediante el Convenio interadministrativo CESPA,	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Y EL MUNICIPIO DE CHIQUNQUIRA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES (CESPA) Y ASI GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1098 DE 2006	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DIMENSIÓN 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
ACTA DE INICIO

ACTA DE INICIO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. MB-CI-003-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACA)
NIT:	800.096.721 -1
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO
CEDULA DE CIUDADANÍA:	7.317.006 Expedida en Chiquinquirá - Boyacá
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
NIT No.	891800475-0
REPRESENTANTE DELEGADA:	LINNA NATALY CABRA COY
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.214.213.207 DE CHIQUINQUIRA
OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BRICEÑO Y EL MUNICIPIO DE CHIQUNQUIRA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES (CESPA) Y ASI GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1098 DE 2006
VALOR:	SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025, desde la suscripción del Acta de inicio.
FECHA CONTRATO:	DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO:	DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2025

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a adolescentes y sus familias mediante el Convenio interadministrativo CESPA,	1.00	0.50	50.00 %	100.00 %	50 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 026 - Apoyo a juventudes mediante el fortalecimiento de la Plataforma de juventudes directiva 005 de 2023-4103069. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a juventudes mediante el fortalecimiento de la Plataforma de juventudes		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a juventudes mediante el fortalecimiento de la Plataforma de juventudes	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 028 - Ejecutar el plan de acción del comité de mujer y equidad de genero, Ley 1257 DE 2008 “Garantizar el Derecho de las mujeres a vivir una vida libre sin Violencia”-4103070. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ejecutar el plan de acción del comité de mujer y equidad de genero		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ejecutar el plan de acción del comité de mujer y equidad de genero	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 029 - Exaltación de dia de la mujer en el marco de la politica de mujer y equidad de genero-4102046. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **37.92 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Exaltación de dia de la mujer en el marco de la politica de mujer y equidad de genero	ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y ENTREGA DE REFRIGERIOS PARA EXALTAR A LA MUJER BRICEÑENSE MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACA, VIGENCIA 2025	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Exaltación de dia de la mujer en el marco de la politica de mujer y equidad de genero	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 030 - Campañas de lucha contra la violencia a la mujer Ley 1257 DE 2008-4102046. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Campañas de lucha contra la violencia a la mujer		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Campañas de lucha contra la violencia a la mujer	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 031 - Atención a la población con discapacidad en el marco de Ley 361 de 1997 (Ley de Discapacidad)-4104020. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Atención a la población con discapacidad en el marco de Ley 361 de 1997 (Ley de Discapacidad		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Atención a la población con discapacidad en el marco de Ley 361 de 1997 (Ley de Discapacidad	50.00		0.00 %	100.00 %	0 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 032 - Caracterización de la población con discapacidad Ley 361 de 1997, como apoyo al proceso de certifiacion-4103070. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Realizar la caracterización de la población con discapacidad	Se brinda apoyo y se realiza la certificacion de personas con discapacidad	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Realizar la caracterización de la población con discapacidad	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 033 - Ejecutar el plan de acción de la politica de discapacidad y el comité de discapacidad, Ley 361 de 1997-4104020. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ejecutar el plan de acción de la política de discapacidad		
Ejecutar el comité de discapacidad		


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ejecutar el plan de acción de la política de discapacidad	0.50		0.00 %	50.00 %	0 %
Ejecutar el comité de discapacidad	0.50		0.00 %	50.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 035 - Apoyo la la poblacion discapacitada con Servicio funerarios-4102042. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo la la población discapacitada con Servicio funerarios	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXEQUIALES FOCALIZADO A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, VIGENCIA 2025	

ACTA DE INICIO.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MB-INV-009-2025.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ).
NIT:	800.099.721 – 1.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO.
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá.
CONTRATISTA:	RUBEN DARIO GARCIA VEGA.
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	86.002.249, Expedida en Granada – Meta.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXEQUIALES FOCALIZADO A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, VIGENCIA 2025
VALOR:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 10.500.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE LO QUE OCURRA PRIMERO.
FECHA CONTRATO:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025.
FECHA DE INICIO:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025.

En el Municipio de Briceño (Boyacá), a los Doce (12) días del mes de Febrero del año 2025, se reunieron el Doctor, **OSCAR FERNANDO PINEDA POVEDA**, en calidad de Secretario de Gobierno, Jurídico y Asuntos Administrativos, actuando como Supervisor designado, de una parte; y de la otra, **RUBEN DARIO GARCIA VEGA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.002.249, Expedida en Granada – Meta, en calidad de contratista con el fin suscribir la presente acta de inicio al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MB-INV-009-2025**, para lo cual,

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo la la población discapacitada con Servicio funerarios	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 036 - Ejecutar el PAT (plan de acción territorial) según Ley 1448 de 2011-4101092. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ejecutar el PAT (plan de acción territorial)		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ejecutar el PAT (plan de acción territorial)	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 040 - Garantizar la Ayuda Humanitaria Inmediata a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento según Ley 1448 de 2011-4101098. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **78.29 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Garantizar la Ayuda Humanitaria Inmediata a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento	Se garantiza la ayuda humanitaria por medio de la RESOLUCIÓN No. 080 (11 de junio de 2025) "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UN PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA DERIVADA DE HECHO VICTIMIZANTE DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y AMENAZAS, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011, MODIFICADA POR LA LEY 2421 DE 2024 Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS".	 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DIMENSIÓN 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACÁ RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN No. 080 (11 de junio de 2025) "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UN PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA DERIVADA DE HECHO VICTIMIZANTE DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y AMENAZAS, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011, MODIFICADA POR LA LEY 2421 DE 2024 Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS".

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Garantizar la Ayuda Humanitaria Inmediata a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 041 - Garantizar la Atención Humanitaria Inmediata a víctimas de desplazamiento según Ley 1448 de 2011-4101025. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **54.55 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Garantizar la Atención Humanitaria Inmediata a víctimas de desplazamiento	Resolución No. 041, 080 y 060	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DIMENSIÓN 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACÁ
PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS
FIN- P(GCBS)
Página 1 de 7
Versión 05
02-07-2024
NIT. 800 099 721-1
RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN No. 060
(8 de mayo de 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UN PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA DERIVADA DE HECHO VICTIMIZANTE DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y AMENAZAS, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011, MODIFICADA POR LA LEY 2421 DE 2024 Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS".

El ALCALDE MUNICIPAL DE BRICEÑO - BOYACÁ, en uso de sus atribuciones constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1448 de 2011, Ley 2421 de 2024 y sus Decretos Reglamentarios y,

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Garantizar la Atención Humanitaria Inmediata a víctimas de desplazamiento	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 042 - Proyectos Productivos para poblacion victima y vulnerable-4101073. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Proyectos Productivos para poblacion victima y vulnerable		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Proyectos Productivos para poblacion victima y vulnerable	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 043 - Garantizar la Asistencia Funeraria apoblacion victima y vulnerable-4101027. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Garantizar la Asistencia Funeraria población victima y vulnerable		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Garantizar la Asistencia Funeraria población victima y vulnerable	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 044 - Conmemoración día de las victimas del conflicto armado según lLey 1448 de 2011-4101068. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Conmemoración día de las victimas del conflicto armado	Se realizo actividad conmemorativa con las victimas del conflicto armado	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Conmemoración día de las victimas del conflicto armado	3.00	3.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 045 - Apoyo para las elecciones periódicas de las mesas de participación, Ley 1448 de 2011-4101068. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo para las elecciones periódicas de las mesas de participación		


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo para las elecciones periódicas de las mesas de participación	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 046 - Apoyo para el funcionamiento de la mesa de participación, Ley 1448 de 2011-4101038. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **48.73 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo para el funcionamiento de la mesa de participación	Se realiza el pago para el funcionamiento de la mesa de victimas	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo para el funcionamiento de la mesa de participación	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 047 - Programa para fomentar el respeto y tolerancia a la población LGTBIQ+ decreto 1314 de 2016-4102042. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Programa para fomentar el respeto y tolerancia a la población LGTBIQ+		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Programa para fomentar el respeto y tolerancia a la población LGTBIQ+	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 048 - Programa de promocion y atencion para la poblacion Migrante y vulnerable , ley 2136 de 2021 y otras-4102042. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%




Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Programa de promoción y atención para la población Migrante y vulnerable		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Programa de promoción y atención para la población Migrante y vulnerable	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 049 - Garantizar la organización y funcionamiento de biblioteca municipal y salas de lectura-3301085. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **80.00 %,** Avance financiero de la meta: **71.43 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **80 %** y en promedio ponderado es de **80 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Garantizar la organización y funcionamiento de oficina de cultura y salas de lectura	Se realiza contrato para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DEL PUNTO VIVE DIGITAL Y REALIZAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA JAIRO ANIBAL NIÑO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACA	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Garantizar la organización y funcionamiento de oficina de cultura y salas de lectura	50.00	40.00	80.00 %	100.00 %	80 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 050 - Apoyo a NNAJ mediante Dotación de la biblioteca Municipal-3301127. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **70.73 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a NNAJ mediante Dotación de la biblioteca Municipal	Se realizo la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “JAIRO ANIBAL NIÑO” DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ	  

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a NNAJ mediante Dotación de la biblioteca Municipal	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 051 - Apoyo a NNAJ mediante espacios adecuados de lectura con el Mantenimiento biblioteca-3301003. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	100%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a NNAJ mediante espacios adecuados de lectura con el Mantenimiento biblioteca	Informe de actividades	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a NNAJ mediante espacios adecuados de lectura con el Mantenimiento biblioteca	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 052 - Apoyo a NNAJ mediante el programa Instructores escuelas culturales y artisticas-3301126. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **66.87 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a NNAJ mediante el programa Instructores escuelas culturales y artísticas	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y BANDA MUSICO MARCIAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACA y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO, LA PROMOCION Y DIFUSION DE EXPRESIONES CULTURALES Y FOLCLORICAS COMO INSTRUCTOR DE DANZAS Y OTRAS EXPRESIONES ARTISTICAS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACA	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a NNAJ mediante el programa Instructores escuelas culturales y artísticas	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 053 - Formular y ejecutar Plan de cultura Muncipal con enfoque sostenible, para fortalecer los espacios culturales-3302002. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Formular y ejecutar Plan de cultura Muncipal con enfoque sostenible, para fortalecer los espacios culturales		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Formular y ejecutar Plan de cultura Muncipal con enfoque sostenible, para fortalecer los espacios culturales	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 054 - Programa de desarrollo de Eventos culturales y artisticos sostenibles, con enfoque de NNAJ-3301053. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **12.51 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				




Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Programa de desarrollo de Eventos culturales y artisticos sostenibles, con enfoque de NNAJ	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION, ORGANIZACIÓN, LOGISTICA Y ENTREGA DE INCENTIVOS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ, VIGENCIA 2025.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Programa de desarrollo de Eventos culturales y artisticos sostenibles, con enfoque de NNAJ	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 055 - Apoyo a NNAJ mediante ejecucion de actividades de formación artistica y cultura (Ministerio de Cultura)-3301053. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **80.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **80 %** y en promedio ponderado es de **80 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a NNAJ mediante ejecucion de actividades de formación artistica y cultura	Se realizo contrato para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL CONVENIO 1062-2025 DEL PROYECTO APOYADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES DENOMINADO “LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD UN VIAJE POR EL CAMPO BOYACENSE” A EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACÁ.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a NNAJ mediante ejecucion de actividades de formación artistica y cultura	1.00	0.80	80.00 %	100.00 %	80 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 056 - Dotación escuelas de formación artistica y cultura, para apoyar a NNAJ-3301126. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				




Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Dotación escuelas de formación artistica y cultura, para apoyar a NNAJ		

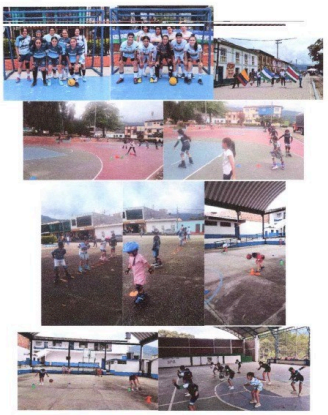
Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Dotación escuelas de formación artistica y cultura, para apoyar a NNAJ	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 057 - Instructores escuelas deportivas diferentes disciplinas, para todos los cursos de vida NNAJ-4301007. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **60.00 %,** Avance financiero de la meta: **86.98 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **60 %** y en promedio ponderado es de **60 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Instructores escuelas deportivas diferentes disciplinas, para todos los cursos de vida	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALCIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS DE FUTBOL Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACA. y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALCIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS DE BALONCESTO, PATINAJE Y VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Instructores escuelas deportivas diferentes disciplinas, para todos los cursos de vida	50.00	30.00	60.00 %	100.00 %	60 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 058 - Mantenimiento de infraestructura deportiva-4301004. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	100%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mantenimiento de infraestructura deportiva	Se realizo contrato para realizar Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación del parque principal y escenarios deportivos	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mantenimiento de infraestructura deportiva	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 059 - Dotación escuelas deportivas, como apoyo a NNAJ y poblacion en general-4301001. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **40.60 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Dotación escuelas deportivas, como apoyo a NNAJ y poblacion en general	LOGISTICA, ORGANIZACIÓN, JUZGAMIENTO Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL DE SALON SENIOR MASTER, FUTBOL DE SALON FEMENINO, TEJO Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO	  

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Dotación escuelas deportivas, como apoyo a NNAJ y poblacion en general	50.00	50.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 060 - Apoyo juegos intercolegiados, como inclusion de Poblacion NNAJ-4301037. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **19.38 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo juegos intercolegiados, como inclusion de Poblacion	Se realizo entrega de uniformes a los estudiantes que aprticiparon en los juegos intercolegiados a traves del contrato "LOGISTICA, ORGANIZACIÓN, JUZGAMIENTO Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS DE FUTBOL DE SALON, PATINAJE Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DE LA PAZ VIGENCIA 2025", se apoyo con el transporte y arbitraje. Se realiza entrega de elementos deportivos a la institución educativa	

Resumen de ejecución del PA

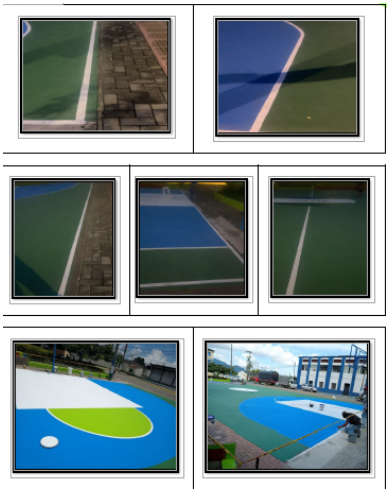
Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo juegos intercolegiados, como inclusion de Poblacion	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 061 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura deportiva-4301025. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **99.76 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Construcción infraestructura deportiva	Se realizo contrato para realizar Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación del parque principal y escenarios deportivos	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Construcción infraestructura deportiva	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 062 - Eventos deportivos (campeonatos, juegos campesinos)-4301038. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **56.78 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Eventos deportivos (campeonatos, juegos campesinos)	LOGISTICA, ORGANIZACIÓN, JUZGAMIENTO Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL DE SALON SENIOR MASTER, FUTBOL DE SALON FEMENINO, TEJO Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO	 

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Eventos deportivos (campeonatos, juegos campesinos)	150.00	150.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 063 - Apoyo a la paractica del deporte y aprovechamiento del tiempo libre mediante la Creación de escuelas deportivas-4301006. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				




Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a la para practica del deporte y aprovechamiento del tiempo libre mediante la Creación de escuelas deportivas-		


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a la para practica del deporte y aprovechamiento del tiempo libre mediante la Creación de escuelas deportivas-	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 064 - Formular e implementar el plan de salud territorial, como soporte y apoyo en el mejoramiento del servicio de salud-1905015. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **80.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **80 %** y en promedio ponderado es de **80 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Formular e implementar el plan de salud territorial, como soporte y apoyo en el mejoramiento del servicio de salud	Se realizo Contrato para la PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS- PIC 2025, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD -PAS COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES-COA! 2025, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOY ACÁ, VIGENCIA 2025 y el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DE LAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO SEGÚN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 518 DE 2015 Y LA CIRCULAR 058 DE 2020 PREFERIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PARA LA SALUD PARA LA VIGENCIA 2025	 

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Formular e implementar el plan de salud territorial, como soporte y apoyo en el mejoramiento del servicio de salud	1.00	0.80	80.00 %	100.00 %	80 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 065 - Campañas de prevencion para deteccion, limpieza y desinfeccion de areas de riesgo-1903024. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				





Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Campañas de prevencion para deteccion, limpieza y desinfeccion de areas de riesgo		


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Campañas de prevencion para deteccion, limpieza y desinfeccion de areas de riesgo	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 066 - Ejecutar el PIC Plan de intervenciones colectivas, como fortalecimiento a la prestacion del servicio de salud-1905015. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **80.00 %,** Avance financiero de la meta: **82.40 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **80 %** y en promedio ponderado es de **80 %.**				




Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ejecutar el PIC Plan de intervenciones colectivas, como fortalecimiento a la prestacion del servicio de salud	Se realizo proceso contractual para ejecutar el PIC “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC 2025, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD – PAS Y COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – COAI 2025, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ, VIGENCIA 2025”.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ejecutar el PIC Plan de intervenciones colectivas, como fortalecimiento a la prestacion del servicio de salud	1.00	0.80	80.00 %	100.00 %	80 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 067 - Llevar a cabo las actividades de gestión de salud pública GSP, como fortalecimiento a la prestacion del servicio de salud-1905054. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **80.00 %,** Avance financiero de la meta: **70.38 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **80 %** y en promedio ponderado es de **80 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Llevar a cabo las actividades de gestión de salud pública GSP, como fortalecimiento a la prestacion del servicio de salud	Se realizo proceso contractual con el objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO SEGÚN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 518 DE 2015 Y LA CIRCULAR 058 DEL 2020 PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2025” y “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA EN SALUD MENTAL Y SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO SEGÚN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 518 DE 2015 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2025”	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Llevar a cabo las actividades de gestión de salud pública GSP, como fortalecimiento a la prestacion del servicio de salud	1.00	0.80	80.00 %	100.00 %	80 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 068 - Garantizar la Afiliación a regimen subsidiado-1906044. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **61.25 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				





Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Garantizar la Afiliación a redimen subsidiado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO QUE DEBE REALIZAR A LAS EPS-S, DENTRO DE LA AUDITORÍA INTERNA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Garantizar la Afiliación a redimen subsidiado	1,500.00	1,500.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 069 - Auditoria al regimen subsidiado-1903016. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **80.00 %,** Avance financiero de la meta: **70.20 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **80 %** y en promedio ponderado es de **80 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Auditoria al regimen subsidiado	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO QUE DEBE REALIZAR A LAS EPS-S, DENTRO DE LA AUDITORIA INTERNA EN SALUD, EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ"	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Auditoria al regimen subsidiado	1.00	0.80	80.00 %	100.00 %	80 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 070 - Apoyo a la proteccion animal mediante la formulacion e implemetacion de la politica publica de proteccion animal y jornadas de esterilizacion-1905024. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a la protección animal mediante la adopción e implementación de la política publica de protección animal y jornadas de esterilización		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a la protección animal mediante la adopción e implementación de la política publica de protección animal y jornadas de esterilización	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 071 - Formular e implementar la Politica de salud mental (actualizar, elaborar y/o implementar) Servicio de apoyo para la habilitación y/o la rehabilitación funcional-1905015. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Formular e implementar la Politica de salud mental (actualizar, elaborar y/o implementar) Servicio de apoyo para la habilitación y/o la rehabilitación funcional		

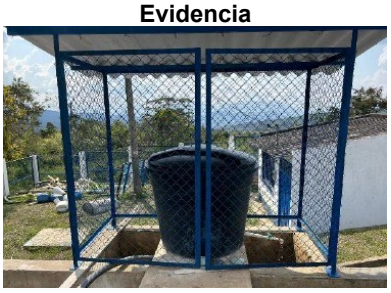
Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Formular e implementar la Politica de salud mental (actualizar, elaborar y/o implementar) Servicio de apoyo para la habilitación y/o la rehabilitación funcional	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 072 - Ampliación o adecuacion de plantas de tratamiento de agua potable-4003016. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **22.61 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ampliación o adecuacion de plantas de tratamiento de agua potable	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACA, VIGENCIA 2024"	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ampliación o adecuacion de plantas de tratamiento de agua potable	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 073 - Mantenimiento de acueductos rurales y urbanos-4003017. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **4.77 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mantenimiento de acueductos rurales y urbanos	A traves del CONTRATO DE MINIMA CUANTIA PROCESO N° MB-INV-040-2025 se realizo "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PERÍMETRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACA, VIGENCIA 2024"	 

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mantenimiento de acueductos rurales y urbanos	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 074 - Mantenimiento de alcantarillado - metros lineales-4003020. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **2.50 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **3 %** y en promedio ponderado es de **3 %.**	2.5%	0%	3%	3%



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mantenimiento de alcantarillado - metros lineales	La Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Briceño, a través de la Unidad de Servicios Públicos, gestionó ante la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá (UDGRD) el préstamo de maquinaria tipo Vactor, con el propósito de adelantar labores de limpieza y mantenimiento preventivo en las redes de alcantarillado y pozos de inspección ubicados en diferentes sectores del municipio. Esta intervención tiene como objetivo principal garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales, previniendo con ello situaciones que puedan comprometer la salubridad pública y la integridad de la infraestructura urbana. Entre los riesgos mitigados se destacan: inundaciones en temporada de lluvias, malos olores, proliferación de vectores, taponamientos de redes y afectaciones sanitarias en áreas residenciales y comerciales. Las labores técnicas fueron priorizadas en puntos críticos identificados mediante reportes ciudadanos, inspecciones previas y estudios de la Secretaría, en articulación con el equipo técnico de la UDGRD. De esta manera, se optimiza el uso de los recursos y se mejora la capacidad de respuesta institucional frente a posibles emergencias asociadas a eventos climáticos extremos. Este esfuerzo hace parte de una estrategia integral de gestión del riesgo y saneamiento básico liderada por la administración municipal, en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Territorial, el Plan de Gestión del Riesgo y el componente de servicios públicos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). La Administración Municipal de Briceño reafirma así su compromiso con la protección del entorno, la prevención de desastres y la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, en beneficio de la salud y el bienestar de toda la comunidad.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mantenimiento de alcantarillado - metros lineales	40.00	1.00	2.50 %	100.00 %	3 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 075 - Mejorara la calidad del agua mediante el Análisis fisico quimico y microbiologico-4003052. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **60.00 %,** Avance financiero de la meta: **92.67 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **60 %** y en promedio ponderado es de **60 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mejorar la calidad del agua mediante el Análisis físico químico y microbiológico	Se realizo contrato para realizar la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LABORATORIO CERTIFICADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UMSPD EN EL ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA CRUDA Y TRATADA, DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, Y MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ”.“PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LABORATORIO CERTIFICADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UMSPD EN EL ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA CRUDA Y TRATADA, DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007 DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, Y MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ”.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mejorar la calidad del agua mediante el Análisis físico químico y microbiológico	1.00	0.60	60.00 %	100.00 %	60 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 076 - Mejoraramientod de la calidad del agua mediante Adquisición de quimicos para tratamiento de agua-4003053. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	100%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)




Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mejoraramiento de la calidad del agua mediante Adquisición de quimicos para tratamiento de agua	Se realizo contrato para el SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE INSUMOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, BOYACÁ	 

Resumen de ejecución del PA


Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mejoraramiento de la calidad del agua mediante Adquisición de quimicos para tratamiento de agua	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 077 - Mejoramiento del ornato municipal y ejecusion del PGIRS, mediante el personal de aporo Apoyo-4003052. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **75.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **75 %** y en promedio ponderado es de **75 %.**				



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mejoramiento del ornato municipal y ejecución del PGIRS, mediante el personal de apoyo	Se realizo contrato para realizar el mejoramiento del ornato municipal y ejecución de las actividades del PGIRS	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mejoramiento del ornato municipal y ejecución del PGIRS, mediante el personal de apoyo	2.00	1.50	75.00 %	100.00 %	75 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 078 - Mejoramiento del acueducto munciipal, mediante bienes y servicios-4003052. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **60.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **60 %** y en promedio ponderado es de **60 %.**				



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mejoramiento del acueducto municipal, mediante bienes y servicios	Se realizo CONTRATO DE SUMINISTRO No. MB-INV-021-2025 cuyo objeto es “SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE INSUMOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, BOYACÁ”.	 

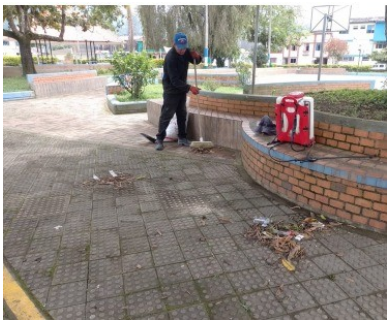
Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mejoramiento del acueducto municipal, mediante bienes y servicios	1.00	0.60	60.00 %	100.00 %	60 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 079 - Actualización y/o ejecución Plan Gestón Integral de Residuos Solidos - PGIRS-4003022. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **60 %** y en promedio ponderado es de **60 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Actualización y/o ejecución Plan Gestón Integral de Residuos Solidos - PGIRS	Se realizaron contratos de profesionales para la ejecución de actividades del PGIRS	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Actualización y/o ejecución Plan Gestón Integral de Residuos Solidos - PGIRS	1.00	0.60	60.00 %	100.00 %	60 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 080 - Ejecutar el plan de acción del PSMV-4003018. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Actualización y/o ejecución Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Actualización y/o ejecución Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 081 - Actualización y/o ejecución del Plan Maestro de Acueducto Aseo y Alcantarillado-PMAAA-4003006. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **10.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Actualización y/o ejecución del Plan Maestro de Acueducto Aseo y Alcantarillado	Se realizo contrato para los "ESTUDIOS Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE ANTE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DESCARGAS PLUVIALES Y UNA DESCARGA SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".	 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DIMENSIÓN 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN COMUNICADO DE ACEPTACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MB-INV-029-2025 CONTRATO DE CONSULTORÍA. Briceño – Boyacá, 10 de Julio del año 2025. Señores: STOA INGENIERIA DE AVANZADA LTDA Nit. 900.050.857-3 R/L ANA LUISA GRIMALDOS SANCHEZ Cedula de Ciudadanía No. 1.026.662.142 de Yopal Dirección: Cra. 1 F N° 40-149 Of. 614 Bogotá. E-mail: gerencia@stoalimitada.com Tel. 3137085773 Referencia: COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MB-INV-029-2025. OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE ANTE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DESCARGAS PLUVIALES Y UNA DESCARGA SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Actualización y/o ejecución del Plan Maestro de Acueducto Aseo y Alcantarillado	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 082 - Actualización del Estudio tarifario para garantizar la prestación de los servicios públicos-4003006. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **10.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estudio tarifario para garantizar la prestación de los servicios públicos	Se realizo contrati para realizar "ESTUDIOS Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE ANTE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DESCARGAS PLUVIALES Y UNA DESCARGA SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estudio tarifario para garantizar la prestación de los servicios públicos	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 083 - Estudios y diseños preinversion AAA-4003042. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **11.44 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estudios y diseños preinversion AAA		

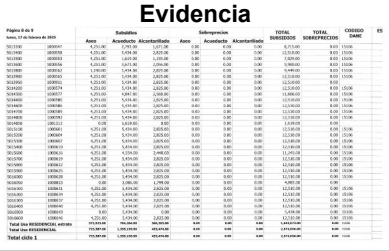
Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estudios y diseños preinversion AAA	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 084 - Subsidios Acueducto-4003047. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **66.67 %,** Avance financiero de la meta: **20.37 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Subsidios Acueducto	Transferencia de los Subsidios Acueducto	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Subsidios Acueducto	150.00	296.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 085 - Subsidios Alcantarillado-4003047. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **66.67 %,** Avance financiero de la meta: **13.25 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Subsidios Alcantarillado	Transferencia de los Subsidios de alcantarilldo	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Subsidios Alcantarillado	150.00	174.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 086 - Subsidios Aseo-4003047. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **66.67 %,** Avance financiero de la meta: **20.54 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Subsidios Aseo	Transferencia de los subsidios de aseo	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Subsidios Aseo	150.00	174.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 087 - Mejoramiento de vivienda mediante proyectos que buscan la disminucion de la pobreza-4001032. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.45 %,** Avance financiero de la meta: **91.22 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mejoramiento de vivienda mediante proyectos que buscan la disminucion de la pobreza	Reinicio del contrato de CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN ELÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, BOYACÁ	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mejoramiento de vivienda mediante proyectos que buscan la disminucion de la pobreza	22.00	0.10	0.45 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 090 - Construcción y/o optimización de acueductos rurales y urbanos-4003015. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Construcción y/o optimización de acueductos rurales y urbanos		

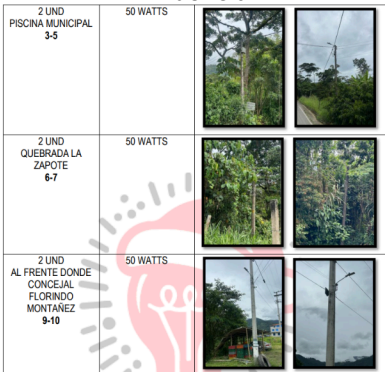
Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Construcción y/o optimización de acueductos rurales y urbanos	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 091 - Garantizar la prestacion del servico publico de alumbrado, para zonas seguras de vehiculos y peatones-2106022. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Garantizar la prestación del servicio publico de alumbrado, para zonas seguras de vehículos y peatones	Se realizo contrato para realizar el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ, VIGENCIA 2025"	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Garantizar la prestación del servicio publico de alumbrado, para zonas seguras de vehículos y peatones	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 092 - Garantizar la prestación del servicio público de alumbrado público, mediante el Mantenimiento, mejoramiento o ampliación-2102011. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **99.42 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Garantizar la prestación del servicio publico de alumbrado, mediante el Mantenimiento de alumbrado público	Se realizo contrato para realizar el Se realizo "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ, VIGENCIA 2025"	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MB-INV-019-2025.
CONTRATO DE OBRA.

Briceño-Boyacá, 26 de Marzo del año 2025.

Señores (as):
NAVIELECTRIC S.A.S.
NIT No. 901811510 – 3.
R/L. ISAI RODRIGUEZ LOPEZ.
Cédula de Ciudadanía No. 79.918.921. Expedida en Bogotá D.C.
Dirección: Carrera 3A No.1 – 42, Briceño – Boyacá.
E-mail: navielectricsas@gmail.com
Tel. 3132417145 – 3207682860

Referencia: COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. MB-INV-019-2025.

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ, VIGENCIA 2025".

CONTRATO DE OBRA No. MB-INV-019-2025.

PEDRONEL VILLAMIL CASTRO, mayor de edad, vecino y domiciliado en Briceño (Boyacá), identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.317.008 expedida en Chiquinquirá (Boyacá), en su calidad de Alcalde Municipal, cargo al cual fue elegido por voto popular, actuando en nombre y representación del municipio de BRICEÑO, según consta en el acta de Posesión No. 02 del veintiséis (26) del mes de Diciembre de 2023 de la Notaria Única de Pauna (Boyacá), debidamente facultado para la suscripción del presente contrato por el artículo 11 numerales 1 y 3 literal b) de la Ley 80 de 1993, las normas civiles y comerciales que regulan sobre la materia, en atención a lo consagrado en la ley 1474 de julio del año 2011, Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, y Manual de la modalidad de Selección de Mínima Cuantía expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente escrito le comunico que una vez revisada su oferta, esta cumplió con todos los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos, de experiencia y de precio conforme a lo requerido en la invitación de mínima cuantía No. MB-INV-019-2025, cuyo objeto es la **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ, VIGENCIA 2025"** por tal motivo de manera expresa e incondicional le comunico que:

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Garantizar la prestación del servicio publico de alumbrado, mediante el Mantenimiento de alumbrado público	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 094 - Construcción de placa huellas, para el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos-2402042. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Construcción de placa huellas, para el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Construcción de placa huellas, para el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos	0.20		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 095 - Ampliación y mantenimiento de la red vial terciaria-2402112. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **79.34 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ampliación y mantenimiento de la red vial terciaria	Se realizo contrato para el "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ, VIGENCIA 2025.	


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MB-SAMC-004-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ Y CONSTRURIVERA S.A.S.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ).
NIT No.	800099721 – 1.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO.
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.317.008, Expedida en Chiquinquirá (Boyacá).
CONTRATISTA:	CONSTRURIVERA S.A.S.
NIT No.	900.168.985 – 6.
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON RIVERA PÁEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	4.064.023, Expedida en Briceño – Boyacá
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ, VIGENCIA 2025."
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 193.073.835,00) M/CTE incluido IVA, impuestos, retenciones, tasas y contribuciones.
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio.
FECHA CONTRATO:	VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2025.

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ampliación y mantenimiento de la red vial terciaria	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 096 - Estudios diseños y construccion de obras para el mejoramiento de la red vial-2402006. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **40.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estudios diseños y construccion de obras para el mejoramiento de la red vial	Se realiza consultoria para realizar los estudios y diseños para el mejoramiento de vias terciarias, mediante la construccion de placa huellas en las veredas Minachal y Tarpeya dle municipio de Briceño, departamento de Boyacá	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estudios diseños y construccion de obras para el mejoramiento de la red vial	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 097 - Consultoria del plan estrategico de seguridad vial-2408017. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Consultoria del plan estrategico de seguridad vial		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Consultoria del plan estrategico de seguridad vial	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 098 - Extension agropecuaria sostenibles a productores e institucion educativa-1708041. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **10.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Extension agropecuaria sostenibles a productores e institucion educativa	Se realizo contrato con el fin de prestar el servicio de extensión rural agropecuaria a los pequeños y medianos productores del municipio de Briceño-Boyacá para la vigencia 2025	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MB-SAMC-007-2025.
(12 DE AGOSTO DE 2025).

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ).
NIT No.	800099721 – 1.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO.
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.317.008, Expedida en Chiquinquirá (Boyacá).
CONTRATISTA:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO BIENESTAR SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL - MADRE TIERRA ONG.
NIT No.	900.819.247 – 3.
REPRESENTANTE LEGAL:	NÉSTOR MAURICIO FRESNO PIRABAGUEN
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.049.604.586 de Tunja Boyacá.
OBJETO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE EXTENSION RURAL AGROPECUARIA A LOS PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025".
VALOR:	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($69.998.000,00) incluido IVA, impuestos, retenciones, tasas y contribuciones.
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA CONTRATO:	Doce (12) de agosto de 2025.


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Extension agropecuaria sostenibles a productores e institucion educativa	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 099 - Apoyo a pequeños pruductores mediante la entrega de Insumos agropecuarios-1702009. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **1 %** y en promedio ponderado es de **1 %.**	0%	0%	1%	1%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a pequeños pruductores mediante la entrega de Insumos agropecuarios	SE ADELANTO EL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MB-INV-044-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS AGRÍCOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ACCIÓN COMUNAL (JAC), ASOCIACIONES Y DEMÁS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ PARA LA VIGENCIA 2025".	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DIMENSIÓN 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
COMUNICADO DE ACEPTACIÓN

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MB-INV-038-2025
CONTRATO DE SUMINISTRO

Briceño – Boyacá, 10 de Septiembre del año 2025.

Señor:
GONZAGA MONSALVE ROJAS.
Cedula de Ciudadanía No. 4.064.182, Expedida en Briceño – Boyacá
Dirección: Carrera 5 No. 13 – 14, Briceño – Boyacá.
E-mail: gonzagamonsalve1@gmail.com esteban.monsalve778@gmail.com
Tel. 310 2270169

Referencia: COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. **MB-INV-038-2025**

OBJETO: "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS AGRÍCOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ACCIÓN COMUNAL (JAC), ASOCIACIONES Y DEMÁS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ PARA LA VIGENCIA 2025".

CONTRATO DE SUMINISTRO No. MB-INV-038-2025

PEDRONEL VILLAMIL CASTRO, mayor de edad, vecino y domiciliado en Briceño (Boyacá), identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.317.008 expedida en Chiquinquirá (Boyacá), en su calidad de Alcalde Municipal, cargo al cual fue elegido por voto popular, actuando en nombre y representación del municipio de BRICEÑO, según consta en el acta de Posesión No. 02 del veintiseis (26) del mes de Diciembre de 2023 de la Notaria Única de Paunia (Boyacá), debidamente facultado para la suscripción del presente contrato por el artículo 11 numerales 1 y 3 literal b) de la Ley 80 de 1993, las normas civiles y comerciales que legislan sobre la materia, en atención a lo consagrado en la ley 1474 de julio del año 2011, Articulo 94 de la ley 1474 de 2011, y Manual de la modalidad de Selección de Mínima Cuantía expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente escrito le comunico que una vez revisada su oferta, esta cumplió con todos los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos, de experiencia y de precio conforme a lo requerido en la invitación de mínima cuantía No. MB-INV-038-2025, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS AGRÍCOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ACCIÓN COMUNAL (JAC), ASOCIACIONES Y DEMÁS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACÁ PARA LA VIGENCIA 2025"**, por tal motivo de manera expresa e incondicional le comunico que:

1.- Su propuesta presentada dentro del proceso de selección de Mínima Cuantía No. MB-INV-038-2025, ha sido aceptada en todas sus partes y contenido, motivo por el cual esta comunicación de aceptación junto con su propuesta constituye contrato celebrado.

2.- Para los efectos de la ejecución del contrato los datos de la entidad contratante y del supervisor designado para verificar la ejecución de las obligaciones contractuales son:

DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

a) **NOMBRE DEL SUPERVISOR**: Ing. WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ.
b) **CARGO DEL SUPERVISOR**: Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
c) **DIRECCIÓN**: Palacio Municipal Carrera 4 No. 4 – 53, Briceño – Boyacá.
d) **CORREO ELECTRÓNICO**: secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co.

DATOS DEL CONTRATISTA:

GONZAGA MONSALVE ROJAS.
Cedula de Ciudadanía No. 4.064.182, Expedida en Briceño – Boyacá
Dirección: Carrera 5 No. 13 – 14, Briceño – Boyacá.



Proyectó: Erika Peraza S./Prof. Apoyo Sec. Planeación — Revisó: Oscar Pineda / Sec. Gobierno — Aprobó: Pedronel Villamil / Alcalde

Palacio Municipal Carrera 4 No. 4 – 53 320850448 – 3204472599.
7340179 alcaldia@briceno-boyaca.gov.co.
www.briceno-boyaca.gov.co

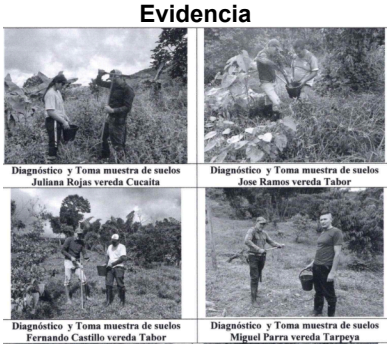
Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a pequeños pruductores mediante la entrega de Insumos agropecuarios	30.00	0.20	0.67 %	100.00 %	1 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 100 - Proyectos productivos en areas pecuarias sostenible (Lechera especilizada, lechera tradicional y doble proposito), Agricola (caña miel,café, Mora guayaba agucate y guanabana, citricos y otras lineas de producción)-1702007. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **1.66 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Proyectos productivos en areas pecuarias sostenible (Lechera especilizada, lechera tradicional y doble proposito), Agricola (caña miel,café, Mora guayaba agucate y guanabana, citricos y otras lineas de producción)	Se realizo contrato para la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, EN EL DIAGNOSTICO, FORMULACION EN METODOLOGIA MGA, SOCIALIZACION, Y AJUSTES AL PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA PARA NUEVOS PRODUCTORES DE GUAYABA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACA, VIGENCIA 2025".	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Proyectos productivos en areas pecuarias sostenible (Lechera especilizada, lechera tradicional y doble proposito), Agricola (caña miel,café, Mora guayaba agucate y guanabana, citricos y otras lineas de producción)	2.00	1.00	50.00 %	100.00 %	50 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 101 - Adquisición de maquinaria agricola, para el mejoramiento del campo-1709114. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adquisición de maquinaria agricola, para el mejoramiento del campo		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adquisición de maquinaria agricola, para el mejoramiento del campo	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 102 - Adquisicionon de equipos y accesorios para maquinaria agricola-1709114. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adquisición de equipos y accesorios para maquinaria agricola		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adquisición de equipos y accesorios para maquinaria agricola	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 103 - Mercados campesinos, para incentivar la produccion agricola-1702038. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mercados campesinos, para incentivar la produccion agricola	El día 22 de Junio de 2025 en las instalaciones del Parque Principal se llevo a cabo el Primer Mercado Campesino Briceñense que tuvo como nombre LAS BENDICIONES DE NUESTRAS TIERRAS A TUS MANOS, se conto la asistencia de mas de 20 familias productoras, las cuales ofrecieron productos de la región entre estos Guanabana, Guayaba, Platano, Yuca, Papá, Mandarina, Piña, Sandía entre otros, asimismo se conto con la venta de productos preparados como sabajon, yogourt, tortas, mantecada, queso, masato, mermeladas y demás. Dicho mercado conto con la participación de la comunidad en general, turistas y visitantes quienes realizaron la compra directa de la mayoría de los productos.	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mercados campesinos, para incentivar la produccion agricola	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 104 - Garanrizar la aistencia tecnica agropecuaria-1708041. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **2.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Garantizar la asistencia técnica agropecuaria mediante Profesionales de apoyo	“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y FORMULACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, A SU VEZ BRINDAR ASESORÍA A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE BRICEÑO EN LA ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DE LOS MISMOS” y “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, EN EL DIAGNOSTICO, FORMULACION EN METODOLOGIA MGA, SOCIALIZACION, Y AJUSTES AL PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA PARA NUEVOS PRODUCTORES DE GUAYABA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO BOYACA, VIGENCIA 2025”.	

JOSÉ ABELARDO BECERRA PUERTO
Administrador de Empresas

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2025.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MB-CD-022-2025.			
NUMERO:	MB-CD-022-2025	DEL AÑO:	2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ)		
NIT:	800.099.721 – 1.		
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO.		
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá.		
CONTRATISTA:	JOSÉ ABELARDO BECERRA PUERTO		
IDENTIFICACIÓN	7.318.073, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá		
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y FORMULACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, A SU VEZ BRINDAR ASESORÍA A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOCIACIONES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE BRICEÑO EN LA ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DE LOS MISMOS.		
VALOR:	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 10.920.000,00). IVA INCLUIDO.		
VALOR A COBRAR	DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 2´730.000,00) M/CTE		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES		
FECHA DEL CONTRATO	Veintidós (22) de enero del 2025.		
FECHA DE INICIO:	Veintidós (22) de enero del 2025.		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Garantizar la asistencia técnica agropecuaria mediante Profesionales de apoyo	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 105 - Asistencia técnica para legalización de tierras y predios-1704010. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Convenio de legalización de tierras y predios		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Convenio de legalización de tierras y predios	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 106 - Mantenimiento o mejoramiento de infraestructura agropecuaria-1709034. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **5.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **5 %** y en promedio ponderado es de **5 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mantenimiento o mejoramiento de infraestructura agropecuaria	Contrato de Obra publica MB-SAMC-006-2025 PARA REALZIAR ELMantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de la infraestructura física del centro de acopio y mercader del municipio de Briceño Boyacá, vigencia 2025	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mantenimiento o mejoramiento de infraestructura agropecuaria	2.00	0.10	5.00 %	100.00 %	5 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 107 - Mantenimiento y/o mejoramiento y/o remodelación de la plaza de mercado-1709078. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **10.00 %,** Avance financiero de la meta: **99.82 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Remodelación de infraestructura agropecuaria y plazas	Contrato de Obra publica MB-SAMC-006-2025 para realizar el Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de la infraestructura física del centro de acopio y mercader del municipio de Briceño Boyacá, vigencia 2025	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Remodelación de infraestructura agropecuaria y plazas	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 109 - Construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento del equipamiento Municipal-4599016. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adecuación y mejoramiento del equipamiento municipal		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adecuación y mejoramiento del equipamiento municipal	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 110 - Alumbrado navideño sostenible, como apoyo a la conservacion de las tradiciones-3502046. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Alumbrado navideño sostenible, como apoyo a la conservacion de las tradiciones		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Alumbrado navideño sostenible, como apoyo a la conservacion de las tradiciones	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 111 - Acciones de promocion y fortalecimiento del turistimo realizadas-3502046. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Implementación del plan municipal de turismo		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Implementación del plan municipal de turismo	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 112 - Ferias artesanales, gastronomicas sostenibles para inventivar a la poblacion en emprendimientos-3502094. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ferias artesanales, gastronomicas sostenibles para inventivar a la poblacion en emprendimientos		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ferias artesanales, gastronomicas sostenibles para inventivar a la poblacion en emprendimientos	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 113 - Paseos ecologicos como incentivo al turismo local sostenible-3502046. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Paseos ecologicos como incentivo al turismo local sostenible	Se realizo caminata ecologica con la comunidad en general desde el parque principal hasta Vereda Tabor y retorno	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Paseos ecologicos como incentivo al turismo local sostenible	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 114 - Ferias de empleo, como incentivo a la reactivacion economica-3502046. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	100%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ferias de empleo, como incentivo a la reactivacion economica		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ferias de empleo, como incentivo a la reactivacion economica	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 116 - Convenio para la atencion y prevencion de desastres con organismos de socorro-4503031. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Convenio para la atencion y prevencion de desastres con organismos de socorro		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Convenio para la atencion y prevencion de desastres con organismos de socorro	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 117 - Convenios y/o proyectos con JAC-4599008. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **51.42 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Convenios y/o proyectos con JAC		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Convenios y/o proyectos con JAC	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 118 - Fortalecimiento a las JAC-4599031. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **60.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **60 %** y en promedio ponderado es de **60 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Fortalecimiento a las JAC	Se realizo contrato para la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO Y FORMULACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, ASESORÍA A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE BRICEÑO EN LA ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DE ESTOS Y APOYO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO VIGENCIA 2025".	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Fortalecimiento a las JAC	1.00	0.60	60.00 %	100.00 %	60 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 119 - Construccion y/o Mantenimiento infraestructura-2301024. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **99.96 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Construccion y/o Mantenimiento infraestructura	La Administración Municipal de Briceño, a través de la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, realizó el mantenimiento integral del Punto Vive Digital, con el objetivo de garantizar su funcionamiento óptimo y asegurar el acceso continuo a los servicios tecnológicos y de conectividad para la comunidad. El Punto Vive Digital es un espacio estratégico cuya función principal es brindar acceso libre al conocimiento, la información, la investigación y la creatividad, promoviendo la alfabetización digital, el aprendizaje permanente, el fomento de hábitos de lectura, y el adecuado uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Estas instalaciones permiten a niños, jóvenes, adultos y personas mayores acceder a recursos tecnológicos como computadores, conexión a internet, herramientas de aprendizaje virtual y programas de formación en competencias digitales, convirtiéndose en un eje fundamental para el cierre de brechas tecnológicas y educativas en el municipio. El mantenimiento realizado contempló acciones preventivas y correctivas sobre los equipos, redes de conectividad, mobiliario, sistemas eléctricos y estructura física, con el fin de ofrecer un entorno seguro, funcional y acorde a las necesidades de los usuarios. Con esta intervención, el gobierno municipal reitera su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades digitales de la ciudadanía y la promoción de entornos de innovación, educación y participación, contribuyendo al desarrollo social, cultural y económico del territorio.	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Construccion y/o Mantenimiento infraestructura	2.00	1.00	50.00 %	100.00 %	50 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 120 - Apoyo e implementación MIPG-4599023. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **68.18 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **20 %** y en promedio ponderado es de **20 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo e implementación MIPG	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG, CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMAS SIGEP, SUIT, DATOS ABIERTOS, ITA Y FURAG, PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, JURIDICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo e implementación MIPG	1.00	0.20	20.00 %	100.00 %	20 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 121 - Fortalecimiento y actualizacion de las tecnologias y la informacion y las comunicaciones TICS-4599005. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Fortalecimiento y actualizacion de las tecnologias y la informacion y las comunicaciones TICS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN SISTEMAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, RED DE DATOS, VOZ Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁREA DE SISTEMAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BRICEÑO – BOYACÁ	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Fortalecimiento y actualizacion de las tecnologias y la informacion y las comunicaciones TICS	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 123 - Implemetacion de MIPG, por medio de TICS para el area financiera-4599025. Responsable de la meta: **Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas**	El Avance físico de la meta es de **45.00 %,** Avance financiero de la meta: **97.16 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **45 %** y en promedio ponderado es de **45 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)





Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adquisición y/o actualización y soporte técnico del software financiero (presupuestal y contantable) de la administración municipal y la unidad de servicios públicos domiciliarios - USPD.	Se realizo contrato para la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE SYSMAN PARA LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD, TESORERÍA, CONTROL PRESUPUESTAL, FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, ALMACÉN, INVENTARIOS Y DEVOLUTIVOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, BOYACÁ	Evidencia
Adquirir el servicio de actualización, mantenimiento y soporte técnico del software para la administración y control del recaudo del impuesto de predial unificado del Municipio de Briceño, Boyacá.	Informe de actividades	Evidencia
Adquirir los servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para garantizar el funcionamiento adecuado de los equipos de cómputo al servicio de los funcionarios de la administración municipal, realizando los correspondientes mantenimientos preventivos y correctivos a que haya lugar.	Se realizo contrato para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y REDES DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACÁ	Evidencia

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adquisición y/o actualización y soporte técnico del software financiero (presupuestal y contantable) de la administración municipal y la unidad de servicios públicos domiciliarios - USPD.	0.33	0.15	45.45 %	33.00 %	15 %
Adquirir el servicio de actualización, mantenimiento y soporte técnico del software para la administración y control del recaudo del impuesto de predial unificado del Municipio de Briceño, Boyacá.	0.33	0.15	45.45 %	33.00 %	15 %
Adquirir los servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para garantizar el funcionamiento adecuado de los equipos de cómputo al servicio de los funcionarios de la administración municipal, realizando los correspondientes mantenimientos preventivos y correctivos a que haya lugar.	0.34	0.15	44.12 %	34.00 %	15 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 124 - Implemetacion de MIPG, por medio de TICS para la administracion del sistema predial-4599025. Responsable de la meta: **Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas**	El Avance físico de la meta es de **66.00 %,** Avance financiero de la meta: **87.50 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **67 %** y en promedio ponderado es de **66 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA Adquirir los servicios de un contador público para fortalecer la gestión financira del Municipio de Briceño, asegurando y verificando la correcta aplicación de las normas contables y tributarias vigentes en el registro de las transacciones contables diarias, y apoye con la elaboración y reporte de informes financieros, contables y tributarios de la entidad.	**Informe de ejecución** Informe de actividades	**Evidencia**
Actividad del PA Adquirir la prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de los procesos de gestión administrativa propios de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Briceño, Boyacá.	**Informe de ejecución** Informe de actividades	**Evidencia**
Actividad del PA Contar con el apoyo profesional para la elaboración del presupuesto de la vigencia fiscal 2026, y la proyección del marco fiscal de mediano plazo - MFMP, con sus respectivos anexos.	**Informe de ejecución**	**Evidencia**

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adquirir los servicios de un contador público para fortalecer la gestión financira del Municipio de Briceño, asegurando y verificando la correcta aplicación de las normas contables y tributarias vigentes en el registro de las transacciones contables diarias, y apoye con la elaboración y reporte de informes financieros, contables y tributarios de la entidad.	0.33	0.33	100.00 %	33.00 %	33 %
Adquirir la prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de los procesos de gestión administrativa propios de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Briceño, Boyacá.	0.33	0.33	100.00 %	33.00 %	33 %
Contar con el apoyo profesional para la elaboración del presupuesto de la vigencia fiscal 2026, y la proyección del marco fiscal de mediano plazo - MFMP, con sus respectivos anexos.	0.34	0.00	0.00 %	34.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 126 - Apoyo a damnificados de emergencias según lineamiento del CMGRD-4503028. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **21.07 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyo a damnificados de emergencias según lineamiento del CMGRD	Se realizo contrato para un suministro de materiales de construcción para la atención y apoyo a familia damnificada, por afectación en incendio total de su vivienda, en la vereda Tabor del municipio de Briceño, Boyacá	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyo a damnificados de emergencias según lineamiento del CMGRD	3.00	3.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 127 - Actualización y ejecución del plan municipal de gestión del riesgo de desastres-4503023. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Actualización y ejecución del plan municipal de gestión del riesgo de desastres		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Actualización y ejecución del plan municipal de gestión del riesgo de desastres	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 128 - Convenio INPEC-1206011. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Convenio INPEC		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Convenio INPEC	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 130 - Implementación PISCC y su plan estrategico-1202019. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.05 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.**	50%	0.05%	50%	50%



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Implementación PISCC y su plan estrategico	Informes de seguimiento del PISCC semestral	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Implementación PISCC y su plan estrategico	1.00	0.50	50.00 %	100.00 %	50 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 132 - Implementacion de PISCC, por medio Combustible vehiculos de la polícia-1202023. Responsable de la meta: **Secretaria de Gobierno, Jurídica y Asuntos Administrativos**	El Avance físico de la meta es de **60.00 %,** Avance financiero de la meta: **57.14 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **60 %** y en promedio ponderado es de **60 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Implementacion de PISCC, por medio Combustible vehiculos de la polícia	SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECER LA MOVILIDAD PARA EL SERVICIO DE POLICIA EN EL AMBITO RURAL PARA LA ATENCION DE CASOS DE POLICIA Y EL AUMENTO DE DESPLAZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO”, VIGENCIA 2025	 EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO, JURIDICO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO-BOYACA CERTIFICA Que el municipio de Briceño Boyacá, tiene suscrito el contrato de SUMINISTRO No. MB-INV-010-2025, cuyo objeto es " **SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECER LA MOVILIDAD PARA EL SERVICIO DE POLICIA EN EL AMBITO RURAL PARA LA ATENCION DE CASOS DE POLICIA Y EL AUMENTO DE DESPLAZAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO", VIGENCIA 2025**" el consumo que se generó durante el mes de Junio de 2025 correspondió a Cero (0) galones de A.C.P.M y un consumo de 58 galones de gasolina corriente, 11 galones de gasolina corriente por valor de $ 17.848 en galón y 45 galones de gasolina corriente por valor de $ 17.886 en galón, para un total de **UN MILLÓN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.001.198)** La presente certificación se expide en la Secretaría De Gobierno, Jurídica Y Asuntos Administrativos, al primer (01) día del mes de julio de 2025. **OSCAR FERNANDO PINEDA POVEDA** Secretario de Gobierno, Jurídico y Asuntos Administrativos Supervisor Designado.

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Implementacion de PISCC, por medio Combustible vehiculos de la polícia	1.00	0.60	60.00 %	100.00 %	60 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 134 - Compra de predios con destino a la protección de recursos ambientales-3203050. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **71.85 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Compra de predios con destino a la protección de recursos ambientales		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Compra de predios con destino a la protección de recursos ambientales	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 135 - Conservación de los ecosistemas estratégicos mediante la reforestación con especies nativas e implementación de buenas prácticas ambiental-3202060. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**	0%	0%	0%	0%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Conservación de los ecosistemas estratégicos mediante la reforestación con especies nativas e implementación de buenas prácticas ambientales (negocios verdes)		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Conservación de los ecosistemas estratégicos mediante la reforestación con especies nativas e implementación de buenas prácticas ambientales (negocios verdes)	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 136 - Realizar Capacitaciones sobre clasificacion de residuos solidos-3208008. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	100%	100%	100%


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Realizar Capacitaciones sobre clasificación de residuos solidos	Prestación De Servicios Profesionales Para Ejecutar Actividades De Apoyo En Temas De Educación Y Sensibilización Ambiental Del Municipio De Briceño	  

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Realizar Capacitaciones sobre clasificación de residuos solidos	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 137 - Realizar Capacitaciones sobre la reutilizacion de los residuos organicos y aprovechables-3208008. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Realizar Capacitaciones sobre la reutilizacion de los residuos organicos y aprovechables	Prestación De Servicios Profesionales Para Ejecutar Actividades De Apoyo En Temas De Educación Y Sensibilización Ambiental Del Municipio De Briceño	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Realizar Capacitaciones sobre la reutilizacion de los residuos organicos y aprovechables	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 138 - Realizar capacitaciónes o sensibilizaciónes a las comunidades acerca del valor socio-económico de los Recurso Naturales-3208008. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Realizar capacitaciones o sensibilizaciones a las comunidades acerca del valor socio-económico de los Recurso Naturales	En el mes de junio se realizaron diferentes actividades lúdicas y teórico prácticas con relación a la educación ambiental resaltando la importancia de los recursos naturales, la clasificación de residuos sólidos, la protección y conservación de la biodiversidad que tenemos en nuestro municipio y occidente de Boyacá, se da cumplimiento de igual forma, a diferentes actividades contempladas en el PGIRS y CIDEA como instrumentos del municipio de Briceño, de igual forma, se realizaron diferentes campañas de siembra de plántulas en las escuelas rurales de la vereda de Tabor Y Betania	En el mes de junio se realizaron diferentes actividades lúdicas y teórico prácticas con relación a la educación ambiental resaltando la importancia de los recursos naturales, la clasificación de residuos sólidos, la protección y conservación de la biodiversidad que tenemos en nuestro municipio y occidente de Boyacá, se da cumplimiento de igual forma, a diferentes actividades contempladas en el PGIRS y CIDEA como instrumentos del municipio de Briceño, de igual forma, se realizaron diferentes campañas de siembra de plántulas en las escuelas rurales de la vereda de Tabor Y Betania, como se evidencia a continuación : ***Figura 7 .*** *Campañas de sensibilización ambiental – vereda Tabor*  ***Fuente:*** *Elaboración propia 2025*

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Realizar capacitaciones o sensibilizaciones a las comunidades acerca del valor socio-económico de los Recurso Naturales	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 139 - Realizar mesas de diálogos que permita ser integrada la comunidad sobre la divulgación y su proceso de desarrollo del POMCA en La Cuenca.-3208008. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Realizar mesas de diálogos que permita ser integrada la comunidad sobre la divulgación y su proceso de desarrollo del POMCA en La Cuenca		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Realizar mesas de diálogos que permita ser integrada la comunidad sobre la divulgación y su proceso de desarrollo del POMCA en La Cuenca	2.00		0.00 %	100.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 140 - Suministrar Huertas Caseras a madres cabezas de hogar o instituciones educativas y poblacion vulnerable-1702021. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **3.33 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **3 %** y en promedio ponderado es de **3 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Suministrar Huertas Caseras a madres cabezas de hogar o instituciones educativas y poblacion vulnerable	Se realizo contrato para prestar el servicio de extensión rural agropecuaria a los pequeños y medianos productores del municipio de Briceño Boyacá	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Suministrar Huertas Caseras a madres cabezas de hogar o instituciones educativas y poblacion vulnerable	3.00	0.10	3.33 %	100.00 %	3 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 141 - Realizar capacitaciones sobre la conservacion, cuidado y uso del recurso hidrico.-3208008. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Realizar capacitaciones sobre la conservacion, cuidado y uso del recurso hidrico	Capacitación a niños y niñas en el área rural	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Realizar capacitaciones sobre la conservacion, cuidado y uso del recurso hidrico	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 142 - Apoyar la implementación programas de uso eficiente de ahorro del agua para el sector agropecuario y/o Domestico.-3208008. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **47.37 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Apoyar la implementación programas de uso eficiente de ahorro del agua para el sector agropecuario y/o Domestico	Se realizo contrato de prestacion de servicios para ejecutar actividades de apoyo en temas de educación y sensibilizacion ambiental en el municipio de Briceño	 


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Apoyar la implementación programas de uso eficiente de ahorro del agua para el sector agropecuario y/o Domestico	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 144 - Realizar capacitaciones de educacion ambiental sobre la conservacion de ecosistemas estrategicos.-3208008. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Realizar capacitaciones de educacion ambiental sobre la conservacion de ecosistemas estrategicos	Informe De Actividades No. 004 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. MB-CD-033-2025	 3. Realizar campañas de sensibilización ambiental a la comunidad educativa y comunidad en general del Municipio de Briceño Boyacá, en temas de conservación del recurso hídrico, reutilización de residuos orgánicos, clasificación de residuos sólidos y conservación de ecosistemas En el mes de junio se realizaron diferentes actividades lúdicas y teórico prácticas con relación a la educación ambiental resaltando la importancia de los recursos naturales, la clasificación de residuos sólidos, la protección y conservación de la biodiversidad que tenemos en nuestro municipio y occidente de Boyacá, se da cumplimiento de igual forma, a diferentes actividades contempladas en el PGIRS y CIDEA como instrumentos del municipio de Briceño, de igual forma, se realizaron diferentes campañas de siembra de plántulas en las escuelas rurales de la vereda de Tabor Y Betania, como se evidencia a continuación : *Figura 7 . Campañas de sensibilización ambiental – vereda Tabor* *Fuente: Elaboración propia 2025*

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Realizar capacitaciones de educacion ambiental sobre la conservacion de ecosistemas estrategicos	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 145 - Articular en el proceso a entidades y/o organizaciones para la correcta armonizacion del POMCA.-3208008. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **0 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Articular en el proceso a entidades y/o organizaciones para la correcta armonizacion del POMCA		

Resumen de ejecución del PA

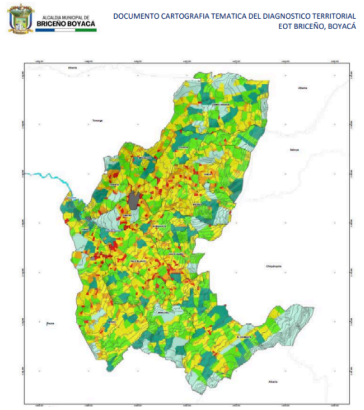
Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Articular en el proceso a entidades y/o organizaciones para la correcta armonizacion del POMCA	1.00		0.00 %	100.00 %	0 %

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA	**Alcaldía Municipal de Briceño** 800099721 12 (Seguimiento PDT Vigencia) del 01/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 146 - Realizar Capacitaciones sobre la importancia de gestion del riesgo en el la formulacion y/o Actializacion del EOT-3208008. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.**				



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Realizar Capacitaciones sobre la importancia de gestion del riesgo en el la formulacion y/o Actializacion del EOT	REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE BRICEÑO-BOYACÁ CARTOGRAFIA TEMATICA DEL DIAGNOSTICO TERRITORIAL	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Realizar Capacitaciones sobre la importancia de gestion del riesgo en el la formulacion y/o Actializacion del EOT	2.00	1.00	50.00 %	100.00 %	50 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 147 - Implementar alternativas de tratamiento de residuos Organicos en el area Rural.-3204012. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.**				



Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Implementar alternativas de tratamiento de residuos Organicos en el area Rural	En el marco de la estrategia de gestión ambiental sostenible y en cumplimiento de las políticas nacionales sobre el manejo integral de residuos sólidos, el Municipio de Briceño ha implementado una alternativa innovadora orientada al aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante la técnica del compostaje. Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente generación de residuos sólidos y la necesidad de reducir la presión sobre el relleno sanitario, promoviendo prácticas responsables con el ambiente y alineadas con los principios de economía circular. El programa de compostaje se ha desarrollado como un modelo piloto en zonas urbanas y rurales del municipio, involucrando activamente a la comunidad, instituciones educativas, organizaciones sociales y personal de servicios públicos. El compostaje permite transformar los residuos orgánicos —principalmente restos de alimentos y material vegetal— en abono natural de alta calidad, el cual puede ser utilizado en huertas comunitarias, zonas verdes, proyectos agrícolas y procesos de reforestación local. Esta práctica no solo reduce significativamente la cantidad de residuos enviados a disposición final, sino que también fortalece la soberanía alimentaria y el uso eficiente de recursos naturales. La implementación de esta alternativa contempla componentes de capacitación comunitaria, entrega de insumos básicos, monitoreo técnico y sensibilización ciudadana, garantizando así su sostenibilidad en el tiempo. Además, se articula con los lineamientos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio, y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en lo relacionado con la producción y el consumo responsables, la acción por el clima y la vida en la tierra. Este esfuerzo reafirma el compromiso del gobierno municipal de Briceño con la protección del medio ambiente, la educación ambiental y la implementación de soluciones locales a desafíos globales, consolidando un modelo replicable de manejo de residuos sólidos a nivel regional.	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Implementar alternativas de tratamiento de residuos Organicos en el area Rural	2.00	1.00	50.00 %	100.00 %	50 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 149 - Ejecutar el plan de acción del Comité Institucional de Educación Ambiental - CIDEA-3202057. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ejecutar el plan de acción del Comité Institucional de Educación Ambiental - CIDEA	Acta de comite CIDEA	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DIMENSIÓN 7. CONTROL INTERNO
PROCESO GESTIÓN DECONTROL INTERNO
ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACTA No.001 - 2025




Fecha:	Abril 01 de 2025	Hora:	09:30 a.m.
Lugar:	Vive Digital – Briceño Boyacá		
Interno: ☑		Externo: ☐	

1	Saludo y bienvenida al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental a cargo del Alcalde Municipal Pedronel Villamil Castro.
2	Llamado a asistencia a los participantes del comité y verificación del Quórum
3	Socialización del Decreto No. 048 del 10 de Diciembre de 2019
4	Socialización y aprobación del Plan de Acción del CIDEA para la vigencia 2025
5.	Observaciones y varios
6.	Marcha final

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ejecutar el plan de acción del Comité Institucional de Educación Ambiental - CIDEA	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 150 - Ejecutar el plan de acción del PRAES (Proyectos Ambientales educativos rurales)-3202057. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				




Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ejecutar el plan de acción del PRAES	Se adelanto contrato para ejecutar actividades de apoyo en temas de educación y sensibilizacion ambiental en el municipio de Briceño para la vigencia 2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ejecutar el plan de acción del PRAES	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 151 - Ejecutar el plan de acción del PROCEDAS (Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental)-3202057. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **50.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **50 %** y en promedio ponderado es de **50 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ejecutar el plan de acción del PROCEDAS	INFORME FINAL CONTRATO 033 DE 2025	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ejecutar el plan de acción del PROCEDAS	1.00	0.50	50.00 %	100.00 %	50 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 158 - Ampliación Ampliación y/o mejoramiento de la red de gas en el municipio-2101016. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **10.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **3 %** y en promedio ponderado es de **0 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ampliación Ampliación y/o mejoramiento de la red de gas en el municipio	Se realizo convenio con TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP - TGI para el fortalecimiento al servicio de gas domiciliario en el municipio de BRICEÑO del departamento de Boyacá	

GESTIÓN CONTRACTUAL COMERCIAL Y DE ABASTECIMIENTO
Convenio

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

Número del Convenio	551007400
Objeto	: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la **TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP. – TGI S.A. ESP** y el **MUNICIPIO DE BRICEÑO**, para el fortalecimiento al servicio de gas domiciliario en el municipio de BRICEÑO del departamento de Boyacá
Plazo de ejecución del Convenio	: Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
Valor aporte de **LA EMPRESA**	: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($186.270.725)

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social	: **TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP.**
Identificación Tributaria	NIT. 900.134.459-7
Autorizado para Contratar	: **JORGE ANDRÉS HENAO ZAMBRANO**
Identificación	: C.C. No. 79.734.763


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ampliación Ampliación y/o mejoramiento de la red de gas en el municipio	4.00	0.10	2.50 %	0.00 %	0 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP - 156 - Estudios y Diseños-2201039. Responsable de la meta: **Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano**	El Avance físico de la meta es de **10.00 %,** Avance financiero de la meta: **100.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **10 %** y en promedio ponderado es de **10 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Realizar estudios y diseños de infraestructura educativa	Se adelanto la contratacion de "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ESCUELA OBJETO: CUCAITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MANUEL BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DIMENSIÓN 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO	FIRA- PGDC- AI	Pagina 1 de 2
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS	Version 02	22-07-2024

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACÁ — NIT. 800.099.721-1

ACTA DE INICIO

ACTA DE INICIO.
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-032-2025.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ).
NIT:	800099721 – 1
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRONEL VILLAMIL CASTRO.
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá.
CONTRATISTA	CONSTRUAVANCE JM SAS
NIT.	901.021.201-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER YESID VARGAS GOMEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	7.186.228 de Tunja Boyacá
OBJETO:	**"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ESCUELA CUCAITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MANUEL BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**
VALOR:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE, ($ 39.858.000.00)**, incluido estampillas, impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Realizar estudios y diseños de infraestructura educativa	1.00	0.10	10.00 %	100.00 %	10 %
