DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
NIT 901.489.956-3

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
35f70b87c452352bde454727fa74020c81eb7c978a04fce3e42bee73330f662565d13cf40de0d6a2270f6b9fda419a4c

**Número de Factura:** JVM-319
**Fecha de Emisión:** 05/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 04/01/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
**Nombre Comercial:** JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
**Nit del Emisor:** 901489956
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4112

**País:** Colombia
**Departamento:** Córdoba
**Municipio / Ciudad:** Montería
**Dirección:** CL 52 A 14 17 BARRIO MONTEVERDE
**Teléfono / Móvil:** 3106541925
**Correo:** jvmsas2021@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999007
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** Calle 26 13 49INT 201
**Teléfono / Móvil:** 6010328212
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 81101500 | Servicio de consultoría e interventoría para la construcción de obras de ingeniería civil | 94 | 1,00 | $ 6.966.194,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.323.576,92 | 19.00 | | | $ 6.966.194,34 |

### Notas Finales

#$12-04-00-000;2366;eliana.bastidas@supernotariado.gov.co#$
ACTA DE COBRO No. 3 CORRESPONDIENTE AL AVANCE DEL 30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2366-2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA
SEDE CARIBE, MUNICIPIO DE SINCELEJO
Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
05/12/2025 17:01:41
**Documento validado por la DIAN:**
05/12/2025 17:01:42
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 6966194.34 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 6966194.34 |
| IVA | 1323576.92 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 1323576.92 |
| **Total neto factura (=)** | 8289771.26 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 8289771.26 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 6.966.194,34 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 6.966.194,34 |
| IVA | 1.323.576,92 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 1.323.576,92 |
| **Total neto factura (=)** | 8.289.771,26 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 8.289.771,26 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764096722516 Rango desde: 270 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-08-06

# ACTA DE RECIBO PARCIAL

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 09 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: ACTA DE RECIBO | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 3**

**ORIP SINCELEJO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 2344 de 2024 | VALOR | $ 58.230.119,70 |
| | | ADICION | N/A |
| | | VALOR TOTAL | $ 58.230.119,70 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PROINVERSIONES | OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). | |
| INTERVENTORIA/SUPERVISION | JVM INGENIERIA SAS BIC | | |

**A LOS 23 DIAS DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: ING OSCAR RAMOS RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y TOMAS INOSTROSA, SUPERVISOR Y JUAN VERGARA, INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.**

| CONTRACTUAL | | | | | | RESUMEN | | VALOR TOTAL CAPITULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA | VALOR TOTAL | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | | **$ 6.157.659,00** |
| 1,02 | DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS | m | 80,00 | $ 4.745,00 | $ 379.600,00 | | $ - | |
| 1,03 | DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS | un | 20,00 | $ 14.233,00 | $ 284.660,00 | - 5,00 | -$ 71.165,00 | |
| 1,04 | DESMONTE DE CIELORRASO | m² | 200,00 | $ 8.585,00 | $ 1.717.000,00 | | $ - | |
| 1,07 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | un | 8,00 | $ 21.463,00 | $ 171.704,00 | | $ - | |
| 1,10 | DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 30,00 | $ 19.518,00 | $ 585.540,00 | 56,00 | $ 1.093.008,00 | |
| 1,20 | DESMONTE DE PUERTA METÁLICA | un | 4,00 | $ 18.569,00 | $ 74.276,00 | 4,00 | $ 74.276,00 | |
| 1,21 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA | un | 20,00 | $ 14.520,00 | $ 290.400,00 | 20,00 | $ 290.400,00 | |
| 1,33 | DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO | un | 16,00 | $ 52.226,00 | $ 835.616,00 | | $ - | |
| 1,35 | DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE | un | 8,00 | $ 46.423,00 | $ 371.384,00 | | $ - | |
| 1,40 | DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM) | m | 2,00 | $ 24.326,00 | $ 48.652,00 | 2,00 | $ 48.652,00 | |
| 1,44 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM) | m² | 4,00 | $ 14.683,00 | $ 58.732,00 | 4,00 | $ 58.732,00 | |
| 1,46 | DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM) | m² | 2,00 | $ 24.326,00 | $ 48.652,00 | 2,00 | $ 48.652,00 | |
| 1,51 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | un | 8,00 | $ 23.395,00 | $ 187.160,00 | | $ - | |
| 1,55 | INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 30,00 | $ 21.888,00 | $ 656.640,00 | 56,00 | $ 1.225.728,00 | |
| 1,56 | INSTALACIÓN DE MÖDULO DE ARCHIVO RODANTE | un | 8,00 | $ 62.730,00 | $ 501.840,00 | | $ - | |
| 1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | m² | 100,00 | $ 3.922,00 | $ 392.200,00 | | $ - | |
| 1,66 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO | m² | 16,00 | $ 11.174,00 | $ 178.784,00 | 4,00 | $ 44.696,00 | |
| 1.72 | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN | m³ | 30,00 | $ 90.681,00 | $ 2.720.430,00 | 30,00 | $ 2.720.430,00 | |
| 1,73 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M | m² | 50,00 | $ 12.485,00 | $ 624.250,00 | 50,00 | $ 624.250,00 | |
| **2** | **CARPINTERÍA EN MADERA** | | | | | | | **$ 5.370.829,00** |
| 2,09 | MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM | un | 1,00 | $ 557.412,00 | $ 557.412,00 | 1,00 | $ 557.412,00 | |
| 2,10 | MUEBLE BAJO MESÓN COCINA | m | 2,00 | $ 594.095,00 | $ 1.188.190,00 | 2,00 | $ 1.188.190,00 | |
| 2,17 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA | m² | 32,00 | $ 82.653,00 | $ 2.644.896,00 | 9,00 | $ 743.877,00 | |
| 2,18 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA | un | 20,00 | $ 124.494,00 | $ 2.489.880,00 | 20,00 | $ 2.489.880,00 | |
| 2,19 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA | un | 3,00 | $ 130.490,00 | $ 391.470,00 | 3,00 | $ 391.470,00 | |
| **3** | **CARPINTERÍA METÁLICA** | | | | | | | **$ 3.173.818,08** |
| 3,16 | REJA TIPO BANCO | m² | 16,00 | $ 181.154,00 | $ 2.898.464,00 | 17,52 | $ 3.173.818,08 | |
| **4** | **CIELORRASOS** | | | | | | | **$ -** |
| 4,03 | CIELORRASO EN VINIL Y FOIL DE ALUMINIO 61CMX61CM | m² | 200,00 | $ 177.825,00 | $ 35.565.000,00 | | $ - | |
| **5** | **CONCRETOS Y MORTEROS** | | | | | | | **$ 1.150.620,56** |
| 5,03 | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones | m² | 48,00 | $ 36.770,00 | $ 1.764.960,00 | 31,29 | $ 1.150.620,56 | |
| **7** | **ENCHAPES MUROS** | | | | | | | **$ 1.922.711,54** |
| 7,02 | ESTUCO PLASTICO INTERIOR | m² | 80,00 | $ 12.609,00 | $ 1.008.720,00 | 76,14 | $ 959.998,82 | |
| 7,03 | RESANE | m² | 80,00 | $ 8.917,00 | $ 713.360,00 | 76,14 | $ 678.904,71 | |
| 7,04 | BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM | m² | 4,00 | $ 2.579,00 | $ 10.316,00 | 4,00 | $ 10.316,00 | |
| 7,06 | CERÁMICA FORMATO 20X20CM | m² | 16,00 | $ 68.373,00 | $ 1.093.968,00 | 4,00 | $ 273.492,00 | |
| **10** | **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS** | | | | | | | **$ 9.688.200,00** |
| 10,03 | PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS] | m² | 200,00 | $ 30.329,00 | $ 6.065.800,00 | 200,00 | $ 6.065.800,00 | |
| 10,06 | LAVADO FACHADA | m² | 200,00 | $ 18.112,00 | $ 3.622.400,00 | 200,00 | $ 3.622.400,00 | |
| **13** | **PINTURAS** | | | | | | | **$ 16.219.672,42** |
| 13,10 | VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad | m² | 1.698,60 | $ 24.689,00 | $ 41.936.735,40 | 656,96 | $ 16.219.672,42 | |
| **14** | **PISOS** | | | | | | | **$ -** |
| 14,04 | PISO CERÁMICA 20X20CM | m² | 4,00 | $ 63.761,00 | $ 255.044,00 | | $ - | |
| 14,15 | ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO | m² | 4,00 | $ 41.329,00 | $ 165.316,00 | | $ - | |
| **15** | **RED ELÉCTRICA** | | | | | | | **$ -** |
| 15,10 | LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR | un | 30,00 | $ 166.376,00 | $ 4.991.280,00 | | $ - | |
| 15,13 | LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER | un | 10,00 | $ 66.686,00 | $ 666.860,00 | | $ - | |
| 15,16 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A | un | 8,00 | $ 22.738,00 | $ 181.904,00 | | $ - | |
| 15,17 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X15A | un | 8,00 | $ 52.101,00 | $ 416.808,00 | | $ - | |
| 15,18 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A | un | 8,00 | $ 61.242,00 | $ 489.936,00 | | $ - | |
| 15,20 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE3X15A | un | 8,00 | $ 43.296,00 | $ 346.368,00 | | $ - | |

| CONTRACTUAL | | | | | | RESUMEN | | VALOR TOTAL CAPITULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA | VALOR TOTAL | |
| 15,44 | CANALETA PLASTICA 100X45MM | ml | 40,00 | $ 33.016,00 | $ 1.320.640,00 | | $ - | |
| 15,45 | TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE | un | 10,00 | $ 10.855,00 | $ 108.550,00 | | $ - | |
| 15,46 | BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO | un | 1,00 | $ 237.222,00 | $ 237.222,00 | | $ - | |
| 15,50 | PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada. | un | 10,00 | $ 507.290,00 | $ 5.072.900,00 | | $ - | |
| **16** | **RED HIDRÁULICA** | | | | | | | **$ -** |
| 16,18 | JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO | un | 4,00 | $ 97.288,00 | $ 389.152,00 | | $ - | |
| 16,19 | LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería | un | 7,00 | $ 207.620,00 | $ 1.453.340,00 | | $ - | |
| 16,21 | LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS. Incluye Grifería | un | 1,00 | $ 910.029,00 | $ 910.029,00 | | $ - | |
| 16,22 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | un | 1,00 | $ 404.066,00 | $ 404.066,00 | | $ - | |
| 16,23 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE | un | 1,00 | $ 144.854,00 | $ 144.854,00 | | $ - | |
| 16,31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL CREMA MARFIL | m | 2,00 | $ 2.266.293,00 | $ 4.532.586,00 | | $ - | |
| **17** | **RED SANITARIA** | | | | | | | **$ -** |
| 17,19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | m | 10,00 | $ 27.346,00 | $ 273.460,00 | | $ - | |
| 17,20 | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA | m | 20,00 | $ 39.851,00 | $ 797.020,00 | | $ - | |
| 17,27 | SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. | un | 1,00 | $ 816.542,00 | $ 816.542,00 | | $ - | |
| 17,28 | SANITARIO TIPO AHORRADOR | un | 7,00 | $ 391.644,00 | $ 2.741.508,00 | | $ - | |
| 17,29 | ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE. | un | 4,00 | $ 1.328.537,00 | $ 5.314.148,00 | | $ - | |
| **19** | **ASEO-SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | **$ -** |
| 19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | m² | 100,00 | $ 2.793,00 | $ 279.300,00 | | $ - | |
| 19,02 | SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO | m² | 2,00 | $ 387.954,00 | $ 775.908,00 | | $ - | |
| 19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación. | un | 10,00 | $ 44.787,00 | $ 447.870,00 | | $ - | |
| **20** | **ADICIONALES** | | | | | | | **$ -** |
| | | | | | $ - | | $ - | |
| | | | | | $ - | | $ - | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 145.611.702,40** | | | **$ 43.683.510,60** |
| | **ADMINISTRACIÓN** | | 26,35% | | $ 38.368.683,81 | | | $ 11.510.605,11 |
| | **IMPREVISTOS** | | 1,00% | | $ 1.456.117,02 | | | $ 436.835,11 |
| | **UTILIDAD** | | 5,00% | | $ 7.280.585,12 | | | $ 2.184.175,53 |
| | **IVA SOBRE UTILIDAD** | | 19,00% | | $ 1.383.311,17 | | | $ 414.993,35 |
| **COSTO TOTAL OBRA** | | | | | $ 194.100.399,53 | | | **$ 58.230.119,70** |
| **VALOR TOTAL OBRA** | | | | | **$ 194.100.399,53** | | | **$ 58.230.119,70** |
| **SALDO POR AJUSTAR** | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | **$ 194.100.399,00** |
| **ADICION** | **$ 0,00** |
| **VALOR ACTUAL CONTRATO** | **$ 194.100.399,00** |

| | |
|---|---|
| **VALOR ANTICIPO** | **$ 0,00** |
| **PORCENTAJE DE ANTICIPO** | **$ 0,00** |

| ACTA No | VALOR DEL ACTA | % EJECUTADO DEL CONTRATO | % A PAGAR | VALOR ACTA A PAGAR | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO | VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO | SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | $58.230.119,70 | 30,00% | 30,00% | $ 58.230.119,70 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $ 135.870.279,30 |
| 2,00 | $58.230.119,70 | 65,00% | 30,00% | $ 58.230.119,70 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $ 77.640.159,60 |
| 3,00 | $58.230.119,70 | 90,00% | 30,00% | $ 58.230.119,70 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $ 19.410.039,90 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **90,00%** | **90,00%** | **$174.690.359,10** | **SALDO POR PAGAR DEL VALOR INICIAL** | | | **$ 19.410.039,90** |

**PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:**

**Arq. VANESSA TAMAYO BERNAL**
Directora de obra
**CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES**

**Ing. CARLOS VERGARA NEGRETE**
Representante Legal
**INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC**

**ELIANA BASTIDAS MADURO**
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
**Superintendencia de Notariado y Registro**

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

| Superintendencia de Notariado y Registro | PROCESO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES | Código: GA-DMIF-PR-01-FR-08 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES | Versión: 04 |
| | | Fecha: 10/10/2018 |
| | | Hoja 1 de 1 |

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº | 2344 de 2024 | CONTRATISTA | CONSORCIO PROINVERSIONES | | | NIT / C.C. | 901,878,739 - 0 |
| PLAZO | 2 MESES Y 3 DIAS | FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA | 29/10/2024 | | FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA | | 31/12/2024 |
| CRP | 582524 DEL | 29/10/2024 | | | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 776.926.815,00 | TOTAL ADICIONES | $ - | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | $ | 776.926.815,00 |
| VALOR ORIP | $ 194.100.399,00 | TOTAL ADICIONES | $ - | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | $ | 194.100.399,00 |
| CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)." AGRUPACION 3 | | | | | | | |

| EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FACTURA / CUENTA DE COBRO** | | | | | | % TOTAL DE EJECUCION |
| **FECHA DD-MM-AA** | **FACTURA** | **CONCEPTO** | **VALOR** | **AMORTIZACIÓN ANTICIPO** | **NETO A PAGAR** | |
| 30-ene-25 | CPI 23 | ACTA PARCIAL No. 3 SINCELEJO 30% | $ 58.230.119,70 | NA | $ 58.230.119,70 | 30,00% |
| | | | | | $ - | 0,00% |
| | | | | | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | 0,00% |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | | $ 58.230.119,70 | | $58.230.119,70 | 30,00% |

| | |
|---|---|
| CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | EN CALIDAD DE INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 2344 DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA -FORMA DE PAGO |
| DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN | **1. Factura, Acta de recibo parcial** 3 **del 30% ORIP** SINCELEJO**, Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría, RUT, Contrato de obra, acta de inicio, Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, planillas de seguridad social, Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario.** |

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS DÍAS (30) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2024

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Representante Legal
**JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC**

SRPG

# RUT DE INTERVENTORIA

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14920917081

(415)7707212489984(8020) 000001492091708 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 8 9 9 5 6 | 3 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | JVM S.A.S. BIC |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 52 A 14 17 BARRIO MONTEVERDE

42. Correo electrónico jvmsas2021@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 6 5 4 1 9 2 5 | 6 0 4 7 8 4 6 5 8 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 4 1 1 2 | 2 0 2 1 0 5 2 8 | 4 2 2 0 | 2 0 2 1 0 5 2 8 | | 4 2 9 0 | 4 3 3 0 |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 17 / 15 : 17: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920917081

(415)7707212489984(8020) **000001492091708 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 8 9 9 5 6 | 3 | Impuestos y Aduanas de Montería | 1 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 1 0 5 2 5 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 1 0 5 2 8 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 1 8 8 4 6 2 | |
| 78. Departamento | 2 3 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 2 2 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 1 0 5 2 5 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 2 1 0 6 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920917081

(415)7707212489984(8020) **000001492091708 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 4 8 9 9 5 6 | 3 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 1 0 5 2 5 | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 9 5 0 8 5 5 8 | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| VERGARA | NEGRETE | CARLOS | ARTURO |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# CONTRATO DE INTERVENTORIA

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

Entre los suscritos, **WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **16.656.408**, en su calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** de la SNR, nombrado mediante Resolución No. **10881** del 12 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante Acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución No. **10989** del 14 de septiembre de 2022, con la cual se le delegó la Ordenación del Gasto, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y de la otra parte, **JVM INGENIERÍA S.A.S BIC,** identificada con **901.489.956-3,** representada legalmente por **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE,** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.508.558,** de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de comercio de Montería**,** quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE INTERVENTORÍA núm. 2366-2024**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes atinentes a la materia, contrato que se tramita por la Plataforma Transaccional del **SECOP II** y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en consideración a lo siguiente:

**1)** Que la Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

**2)** Que la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

**3)** Que previamente se realizó el Concurso Público de Méritos 009 de 2024 para **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**


**4)** Que en el mencionado proceso se recibieron tres propuestas por parte de los siguientes interesados:

| NÚM. | PROPONENTE |
|---|---|
| 1 | JVM INGENIERÍA S.A.S BIC |
| 2 | CONSORCIO INTERJUJ 2024 |
| 3 | CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

**5)** Que de acuerdo con lo anterior y de conformidad con los parámetros previstos en el pliego de condiciones, se llevó a cabo la verificación de los requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, soportados en los puntajes, dando el siguiente orden de elegibilidad:

**ORDEN DE ELEGIBILIDAD – AGRUPACIÓN No. 3**

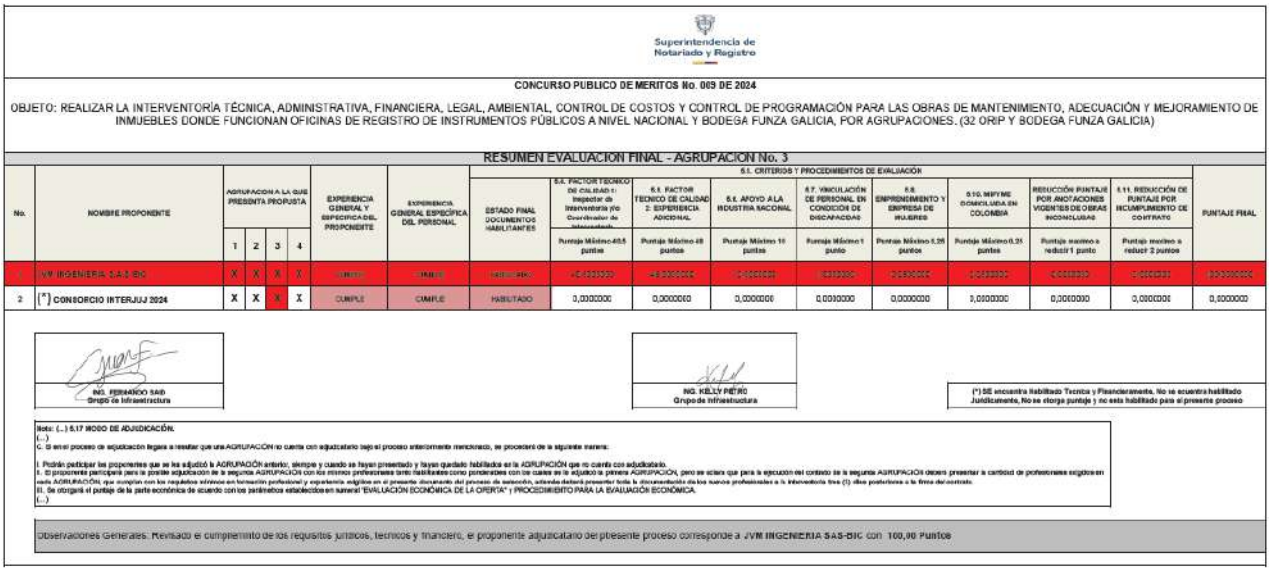

Superintendencia de Notariado y Registro

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. 069 DE 2024

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)

RESUMEN EVALUACION FINAL - AGRUPACION No. 3

| No. | NOMBRE PROPONENTE | AGRUPACION A LA QUE PRESENTA PROPUESTA | | | | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE | EXPERIENCIA GENERAL ESPECÍFICA DEL PERSONAL | 5.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN | | | | | | | | PUNTAJE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ESTADO FINAL DOCUMENTOS HABILITANTES | 5.6. FACTOR TECNICO DE CALIDAD 1: Inspector de Interventoria y/o Coordinador de Interventoria. Puntaje Máximo 40,5 puntos | 5.6. FACTOR TECNICO DE CALIDAD 2: EXPERIENCIA ADICIONAL. Puntaje Máximo 49 puntos | 5.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. Puntaje Máximo 10 puntos | 5.7. VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD. Puntaje Máximo 1 punto | 5.8. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES. Puntaje Máximo 0,25 puntos | 5.10. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA. Puntaje Máximo 0,25 puntos | REDUCCIÓN PUNTAJE POR ANOTACIONES VIGENTES DE OBRAS INCONCLUSAS. Puntaje maximo a reducir 1 punto | 5.11. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Puntaje maximo a reducir 2 puntos | |
| 1 | JVM INGENIERIA S.A.S BIC | X | X | X | X | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 40,5000000 | 49,0000000 | 10,0000000 | 1,0000000 | 0,2500000 | 0,2500000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 100,0000000 |
| 2 | (*) CONSORCIO INTERJJJ 2024 | X | X | X | X | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

ING. FERNANDO SAID
Grupo de Infraestructura

ING. KELLY PEÑA
Grupo de Infraestructura

(*) SE encuentra Habilitado Tecnica y Financieramente, No se ocuentra habilitado Juridicamente, No se otorga puntaje y no esta habilitado para el presente proceso

Nota: (...) 5.17 MODO DE ADJUDICACIÓN.
(...)
c. Si en el proceso de adjudicacion llegara a resultar que una AGRUPACIÓN no cuenta con adjudicatario bajo el proceso anteriormente mencionado, se procederá de la siguiente manera:

I. Podrán participar los proponentes que se les adjudicó la AGRUPACIÓN anterior, siempre y cuando se hayan presentado y hayan quedado habilitados en la AGRUPACIÓN que no cuenta con adjudicatario.
II. El proponente participará para la posible adjudicación de la segunda AGRUPACIÓN con los mismos profesionales bien habilitados como ponderables con los cuales se le adjudicó la primera AGRUPACIÓN, pero se aclara que para la ejecución del contrato de la segunda AGRUPACIÓN deberá presentar la cantidad de profesionales exigidos en cada AGRUPACIÓN, que cumplan con los requisitos mínimos en formación profesional y experiencia exigidos en el presente documento del proceso de selección, además deberá presentar ante la documentación de los nuevos profesionales a la Interventoría tres (3) días posteriores a la firma del contrato.
III. Se otorgará el puntaje de la parte económica de acuerdo con los parámetros establecidos en numeral "EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA OFERTA" y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.
(...)

Observaciones Generales: Revisado el cumplimiento de los requisitos juridicos, tecnicos y financiero, el proponente adjudicatario del presente proceso corresponde a JVM INGENIERIA SAS-BIC con 100,00 Puntos

**6)** Que conforme a lo anterior resultó ganador de la **AGRUPACIÓN No. 3** el proponente **JVM INGENIERÍA S.A.S BIC** con **100 puntos** y quien oferto un precio de **CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($110.605.055,00) M/CTE,** incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido lVA.

**7)** Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demás normas que lo reglamenten o modifiquen y las siguientes clausulas.

**CLÁUSULA PRIMERA: - OBJETO:** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA) – AGRUPACIÓN 3.

**CLÁUSULA SEGUNDA: - DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la

actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un Interventor, según corresponda.

La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo contable, jurídico y financiero que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.

El objetivo de la Interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del Contratista, previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, sociales, presupuéstales, contables y financieros en el desarrollo del contrato.

La Interventoría debe asumir una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.

Los objetivos específicos de la Interventoría serán entre otros:

**- Absolver:** En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la Interventoría es la encargada de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo de los contratos, y mantener un canal permanente de comunicación entre las partes.

**- Colaborar:** Teniendo en cuenta que la Interventoría y el Contratista conforman un equipo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo, ambiental y social, el Interventor debe desarrollar su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al Contratista.

**- Controlar:** Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, control, verificación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra hasta obtener su liquidación.

**- Exigir:** La Interventora tiene la obligación de exigir al Contratista de obra el cumplimiento de todas las obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

**- Prevenir:** El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras.

**- Solicitar:** Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que oportunamente subsane fallas presentas durante la ejecución del contrato. Ninguna solicitud al Contratista por parte de la Interventoría podrá implicar la modificación del contrato. Esta acción también se ejerce cuando el Interventor solicita al municipio imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

**- Verificar:** Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas.

**CLÁUSULA TERCERA: - VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: A) VALOR:** El valor del presente contrato de interventoría es hasta por la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($110.605.055,00) M/CTE.** incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido IVA**. B) PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución será de **tres (3) meses y quince (15) días.**

El tiempo será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II y sin exceder el 31 de diciembre de 2024.

El plazo de ejecución del contrato de INTERVENTORÍA y los tiempos serán contados a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá con la interventoría y la entidad, previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II.

**PARÁGRAFO 1:** La ejecución del presente contrato queda supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato, la cual debe ser firmada en compañía de la supervisión del contrato.

**PARÁGRAFO 2:** El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecución y recibo de obras, deben estar contemplados en los costos de la oferta económica del oferente.

**PARÁGRAFO 3:** La INTERVENTORÍA a las obras se realizará en una (1) etapa de acuerdo con las especificaciones del MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO y el presupuesto publicado por la entidad

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

**CLÁUSULA CUARTA: - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Esta contratación será financiada con recursos provenientes del presupuesto rubro C-1209-0800-17-53105B-1209004-02-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA – RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL, para la vigencia 2024, los cuales se encuentran soportados bajo el CDP 102024 del 15 de agosto de 2024, expedido por el responsable de presupuesto.

**CLÁUSULA QUINTA: - FORMA DE PAGO**: El valor de la INTERVENTORÍA DE LA OFERTA ECONÓMICA MÁS IVA, se pagará mediante pago de actas parciales, conforme a las siguientes condiciones:

**PAGOS DIRECTOS**

Se pagará hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la INTERVENTORÍA, mediante actas parciales presentadas mensualmente y distribuidas uniformemente durante el plazo de ejecución del contrato. En caso de prorrogarse el contrato de interventoría sin adición de recursos, el valor pendiente por ejecutar se deberá redistribuir en los meses siguientes hasta la terminación del contrato.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Informe del avance y las labores ejecutadas por la interventoría
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por el supervisor.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Registro fotográfico del avance de las ejecuciones y actividades desarrolladas por el contratista a la fecha y revisadas por la interventoría.
11. Copia de Bitácora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a cobrar.

Nota: Las cuentas de cobro deberán presentarse a más tardar los días quince (15) de cada mes.

**PAGOS AVANCE DE OBRA**

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

Hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor de la INTERVENTORÍA, se pagará mediante actas parciales presentadas mensualmente de manera proporcional al avance de ejecución financiero del contrato de obra, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor.

**PAGOS – ACTA PARCIAL 1.**

Se efectuará el primer pago del 20% de valor cuando se haya realizado como mínimo el 30% de avance o ejecución de obra, con la presentación de las actas parciales avance correspondientes y debidamente firmadas por el contratista de obra, interventoría y visto bueno de la supervisión.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 1 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría (En caso de requerirse).
11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
13. Registro fotográfico del avance de las obras de cada uno de los frentes.
14. Copia de Bitácora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a cobrar.

Nota: Las cuentas de cobro deberán presentarse a más tardar los días quince (15) de cada mes.

**SEGUNDO PAGO –ACTA PARCIAL 2**

Se efectuará un segundo pago del 20% de valor cuando se haya realizado como mínimo el 60% de avance o ejecución de obra, con la presentación de las actas parciales avance

correspondientes y debidamente firmadas por el contratista de obra, interventoría y visto bueno de la supervisión.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
13. Registro fotográfico del avance de obras de cada uno de los frentes.
14. Copia de Bitácora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a cobrar.

Nota: Las cuentas de cobro deberán presentarse a más tardar los días quince (15) de cada mes.

**TERCER PAGO –ACTA PARCIAL 3.**

Se efectuará un tercer pago del 30% de valor cuando se haya realizado como mínimo el 90% de avance o ejecución de obra, con la presentación de las actas parciales avance correspondientes y debidamente firmadas por el contratista de obra, interventoría y visto bueno de la supervisión.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos**:**

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales
2. Copia del Acta de recibo parcial 3 firmada por el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
13. Registro fotográfico del avance de obras de cada uno de los frentes.
14. Copia de Bitácora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a cobrar.

Nota: Las cuentas de cobro deberán presentarse a más tardar los días quince (15) de cada mes

**PAGO FINAL**

Se efectuará el pago final del 10% del valor final correspondiente al 100% de la ejecución del contrato, con la presentación del informe final del contratista, aprobado por el supervisor, la póliza de la garantía única actualizada y la proyección del acta de liquidación del contrato.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo final firmada por el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Entregar Informe de obra en medio magnético con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio hasta la terminación de la obra.
13. Entregar Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificación).
14. Entregar Bitácora de obra escaneada en medio magnético.
15. Entregar Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la ejecución de la obra con la información de los resultados obtenidos.
16. Entregar Informe del listado del personal que laboró en la obra y copia de la seguridad social.
17. Entregar Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra.
18. Entregar planos record en medio magnético y físicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.
19. Entregar memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
20. Entregar el Manual de operación y funcionamiento con los respectivos catálogos.
21. Entregar el Manual de mantenimiento
22. Entregar el soporte de pago de las facturas de los servicios públicos.
23. Entregar el Paz y salvo de pago a proveedores y personal que hicieron parte de la ejecución de las obras.
24. Entregar el Compilado de las certificaciones de calidad de materiales solicitados y utilizados en la obra y que fueron requeridos para el desarrollo de la misma y certificación de calibración de los equipos utilizados.
25. Registro fotográfico del avance de obras de cada uno de los frentes.

Nota: Las cuentas de cobro deberán presentarse a más tardar los días quince (15) de cada mes.

**LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación del contrato se efectuará dentro de los CUATRO (4) meses siguientes al recibo a satisfacción de las obras contempladas dentro del objeto contractual y su alcance.

**PARÁGRAFO 1:** El valor del contrato se pagará conforme a las actividades ejecutadas, para lo cual será necesario la certificación y aprobación por parte del supervisor (o quien haga sus veces) donde certifique la realización de las actividades objeto de contratación por la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**.

**PARÁGRAFO 2:** La **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** no reconocerá ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

**PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA** deberá presentar la factura correspondiente a la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO,** de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes en lo concerniente al manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable, y allegarla a través de la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.

**PARÁGRAFO 4:** Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del **CONTRATISTA** y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

**PARÁGRAFO 5:** Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que **EL CONTRATISTA** declara conocer y aceptar.

**PARÁGRAFO 6:** Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga **EL CONTRATISTA** acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por **EL CONTRATISTA.**

**PARÁGRAFO 7: LA SUPERINTENDENCIA** no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.**

**NOTA 1:** La entidad no realizara adición en dinero, teniendo en cuenta que la interventoría contratada tiene un fin específico el cual es controlar obras desde el inicio hasta su culminación. En caso de ser necesario solo se adicionará en valor el contrato de interventoría proporcionalmente al valor adicionado en el contrato de obra y siempre y cuando haya disponibilidad de recursos y esté debidamente justificado.

**NOTA 2:** Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

**CLÁUSULA SEXTA: - LUGAR DE EJECUCIÓN:** Las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la interventoría a las obras son las siguientes:

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

**AGRUPACIÓN No. 3**

| N° | REGIONAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | DIRECCION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARIBE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | Carrera D1 No. 80A-136 |
| 2 | | BOLÍVAR | CARMEN DE BOLIVAR | Calle 25 No. 47-48 |
| 3 | | SUCRE | SINCELEJO | Calle 24 No. 16-34 |
| 4 | | | SAN MARCOS | Carrera 24 No. 18A-24 |
| 5 | | | COROZAL | Calle 30 No. 29-05 |
| 6 | | MAGDALENA | CIENAGA | Calle 10 No. 15-36 |
| 7 | | GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | Calle 7 No. 2-43 |

**CLÁUSULA SÉPTIMA: - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista hace las siguientes declaraciones: **1)** Conoce y acepta los documentos del proceso. **2)** Está debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **3)** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **4)** Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

**CLÁUSULA OCTAVA: - RESPONSABILIDAD:** El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato.

**CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:

**A. OBLIGACIONES GENERALES**

**EL CONTRATISTA** adquiere para con **LA SUPERINTENDENCIA**, las siguientes obligaciones generales:

a. Aportar y cargar en la Plataforma Transaccional del **SECOP II,** para conocimiento de la **SUPERINTENDENCIA** y en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para el inicio del contrato.
b. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y la SNR.
c. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

d. Respetar la política medioambiental de la SNR, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.
e. Constituir la garantía a favor de **LA SUPERINTENDENCIA** por los valores y con los amparos previstos en el contrato y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días calendario siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de la **SUPERINTENDENCIA,** cuando a ello hubiere lugar.
f. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del contrato.
g. Suscribir, conjuntamente con la supervisión del contrato (o quien haga sus veces), el acta de inicio correspondiente una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
h. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor del contrato.
i. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la SNR.
j. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de quien sea designado como supervisor del contrato.
k. Suscribir con el contratista de obra el respectivo cronograma de actividades a desarrollarse dentro de los tiempos contractuales.
l. Presentar los informes que le indique el supervisor.
m. Obrar con la diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que se le asignen a través del Supervisor del contrato.
n. Atender los lineamientos dados por **LA SUPERINTENDENCIA** en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG.
o. Informar oportunamente al supervisor del contrato o quien haga sus veces, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.
p. Acatar las instrucciones que, dentro del marco del objeto y obligaciones del presente contrato, se le impartan por parte de LA SUPERINTENDENCIA, a través del Supervisor, durante el desarrollo del contrato de consultoría.
q. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.
r. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por **EL CONSULTOR** durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
s. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato
t. Garantizar que el manejo de la imagen institucional por parte del contratista de obra, esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen a la **SUPERINTENDENCIA**.
u. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

v. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Supervisor del contrato y/o de la entidad.
w. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
x. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega a **LA SUPERINTENDENCIA** de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar.
y. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.
z. Estar a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
aa. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.
bb. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
cc. Cargar en la plataforma SECOP II los informes de avance de obra, que den cuenta de la ejecución del contrato una vez aprobados y firmados por el Supervisor, adjunta la factura correspondiente y demás documentos a que hubiere lugar (en caso que se requiera) dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación y firma por parte del Supervisor.
dd. Verificar que el contratista de obra desarrolle las obras de manera que no se afecten a los vecinos o terceros de las obras, y en caso de algún inconveniente, se debe verificar la responsabilidad del contratista y proceder a solucionarlo.
ee. Todos los empleados a cargo del Consultor al momento del desarrollo del objeto contractual deben contar con todo el equipo de seguridad durante todo el tiempo que se encuentren en el inmueble de la SNR ejecutando el objeto contractual.
ff. Verificar cada vez que, entre un nuevo trabajador por parte del contratista de obra, que el mismo cuente con todas las afiliaciones de Ley.
gg. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

hh. Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término establecido en el presente documento.
ii. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por **LA SUPERINTENDENCIA** relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
jj. La Interventoría debe verificar que el contratista implemente un plan de contingencia que minimice el riesgo de retraso de la ejecución de las obras por motivo de lluvias (Si es del caso), así como llevar el registro diario en bitácora del estado del clima.
kk. Verificar que el contratista lleve un registro diario en Bitácora del ingreso o retiro de los trabajadores que ejecutaran las actividades, previo cumplimiento de los documentos necesarios para el ingreso e inicio de actividades por cada empleado.
ll. Solicitar al contratista las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra y así verificar que cuenten con las certificaciones necesarias que acrediten su calidad y estén conformes a las especificaciones técnicas y necesidades del presente proceso.
mm. Cumplir con las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, de la invitación pública y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato

**B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS. El CONTRATISTA,** adquiere para con **LA SUPERINTENDENCIA** las siguientes obligaciones específicas:

- **DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**

EL EQUIPO DISPONIBLE DEL CONSULTOR, tiene la obligación de suministrar oportunamente todos los medios necesarios para cumplir con el objeto del contrato con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, so pena de la aplicación de las sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento, deben ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar.

a. Solicitar al contratista de obra y entregar para aprobación de la supervisión o quien haga sus veces con plazo máximo de TRES (3) días calendario luego de la firma del respectivo contrato, un cronograma en el que se establezcan los plazos ciertos en los que entregará las adecuaciones. El incumplimiento de los plazos señalados en el cronograma dará lugar al inicio de las actuaciones sancionatorias a que haya lugar.
b. Cumplir con el objeto, el alcance del mismo y obligaciones contractuales en los términos y con las especificaciones descritas en el contrato y los documentos que lo integran.
c. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPOS: Estará a cargo del CONSULTOR la respectiva revisión al CONTRATISTA al momento de la adquisición, transporte, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos, herramientas,

repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual; así como el recurso humano que requiera para cumplir con el objeto y obligaciones contractuales. Las obras de adecuación serán responsabilidad del contratista hasta tanto no sean recibidos a satisfacción por la interventoría y La Entidad.

d. PAGO DE SALARIOS: El CONSULTOR DE INTERVENTORÍA debe asumir el pago oportuno de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato.
e. CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES: Durante la ejecución del objeto del contrato, el CONSULTOR DE INTERVENTORÍA tendrá la obligación de exigirle al CONTRATISTA DE OBRA poner en práctica procedimientos adecuados de montaje, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados. Así mismo, vigilara que el CONTRATISTA DE OBRA tenga las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado las estructuras e instalaciones existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA cualquier daño que pudiere ocasionar al inmueble, y sus respectivas estructuras, instalaciones o redes.
f. Verificar y aprobar las zonas que serán intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto del contrato por parte del CONTRATISTA DE OBRA.
g. Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato y las que se establezcan conjuntamente con la visita adelantada previo al inicio de la ejecución de las obras y presentar un informe a la SUPERINTENDENCIA sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones al mismo.
h. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA ejecute los ítem y cantidades a los precios y condiciones señalados en la propuesta que hace parte del Contrato, ciñéndose a las especificaciones solicitadas por la Entidad y a las normas técnicas nacionales, así como a rehacer a sus expensas cualquier obra que resultaré mal ejecutada a juicio del Interventor y/o entidad, así mismo el Contratista se deberá ajustar a los horarios señalados para la ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta que se deberá efectuar el trabajo 24 horas del día de domingo a domingo, incluyendo festivos.
i. Cumplir con el personal mínimo solicitado en la presente convocatoria.
j. Poner en práctica como Interventoría los procedimientos adecuados de construcción, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados en el inmueble a intervenir.
k. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA conserve en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA cualquier daño que pudiere ocasionar a

tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. De igual forma, responderá por la disponibilidad de volquetas para el retiro oportuno de los escombros, de acuerdo a las normas y entregar las obras en perfecto estado de limpieza.

l. La INTERVENTORÍA verificara que el CONTRATISTA DE OBRA repare las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al presente Contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas (En caso de requerirse).
m. Realizar la actualización de la vigencia de las garantías constituidas a la fecha de suscripción del acta de inicio y cuando se requiera.
n. Elaborar con el contratista de la obra las actas de iniciación y las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, las cuales no deberán sobrepasar el valor de la obra, debidamente justificadas, cambio de especificaciones, entregas parciales, liquidación y todas aquellas a que hubiere lugar, en coordinación con el contratista. Las actas de suspensión, reiniciación y liquidación deberán ser aprobadas por la Secretaria General.
o. Legalizar las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, mensualmente ante la Supervisión, cuando se requiera, de acuerdo con el avance del contrato.
p. Mantener actualizada la documentación de los contratos.
q. Estudiar y autorizar las cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad contratante para la aprobación respectiva antes de la ejecución de esas obras.
r. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la SUPERINTENDENCIA.
s. Programar y coordinar con el contratista y con la SUPERINTENDENCIA las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.
t. Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor deberá llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones, así mismo verificará la calidad de los materiales utilizados por el contratista.
u. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos.
v. Revisar y dar el visto bueno en caso de haber cambios en la ejecución del contrato, previo visto bueno del Supervisor del contrato.
w. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar

oportunamente a la SUPERINTENDENCIA y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

x. El Consultor acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su Oferta económica autónoma.

y. Verificar que toda actividad cuente con la previa autorización del director y/o residente de interventoría y dicho inicio y lugar de la actividad deberán quedar consignados en la respectiva bitácora de obra, un error en la ejecución de un ítem sin el previo consentimiento de la Interventoría y/o la supervisión, correrá por cuenta de Contratista y no será imputable a las cantidades contractuales.

z. Presentar al Supervisor del contrato un informe mensual de ejecución, manifestando el avance en la programación, de acuerdo con lo establecido en el contrato y las dificultades en la ejecución del mismo.

aa. Realizar seguimiento detallado de la información contenida en los documentos aportados por el CONTRATISTA DE OBRA, presentando un informe semanal a la Superintendencia de Notariado y Registro sobre el cumplimiento del cuadro de rendimientos, programaciones y todo lo relacionado en la correcta ejecución y avance del contrato, en caso de incumplimiento por parte del contratista deberá informarlo por escrito a la entidad y en caso de que afecte la normal ejecución del contrato sugerir los procedimientos sancionatorios que correspondan.

bb. Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revisión efectuada a los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobación de ítems y precios no previstos y los respectivos análisis de precios unitarios. En caso de que la SUPERINTENDENCIA presente observaciones a los APU de ítems no previstos, el Interventor deberá efectuar las correcciones del caso.

cc. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en las licencias y/o permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.

dd. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

ee. Suscribir el acta de inicio según lo señalado.

ff. Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.

gg. Asistir a los comités de obra y seguimiento técnico, los cuales deberán ser semanal o quincenal y se realizarán presencial en el sitio de las obras, apoyados con videoconferencias para la asistencia de los delegados por parte de la entidad.

hh. Las videoconferencias se realizarán a través del aplicativo que para este fin posee la Entidad. Los costos de los medios para la comunicación por vía internet y los equipos necesarios para la videoconferencia, serán asumidos por el Contratista de obra.

ii. El CONSULTOR se compromete a llevar una bitácora, en donde consten las órdenes y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución, la

cual será administrada por la interventoría y entregada en el informe final, la omisión de alguna información en la bitácora, no exime al contratista o interventor de su responsabilidad.

jj. El Contratista se compromete a presentar los informes, reportes, bitácoras y demás documentos ante la Entidad, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y los formatos definidos por La Entidad.

kk. Presentar a La Entidad, el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la Normatividad vigente, para realizar las actividades de la presente contratación, revisado y aprobado por la Interventoría para su implementación en obra.

ll. El transporte, custodia y almacenamiento de los bienes requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del CONSULTOR. Todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal del CONSULTOR, correrán por su cuenta.

mm. Adoptar e implementar los protocolos de bioseguridad (PAPSO) y SST de acuerdo a la normatividad vigente en cada obra y los costos serán asumidos por el Contratista.

nn. El CONSULTOR se verá obligado a contratar personal idóneo, capacitado y especializado en lo requerido dentro del presente proceso.

oo. El CONSULTOR debe exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega de los planos record en medio magnético y físico al finalizar la ejecución del objeto contractual.

pp. Cumplir con los componentes internos de la administración que fueron calculados por la Entidad.

qq. Suscribir las actas de vecindad con el respectivo registro fotográfico antes del inicio de las obras y al finalizar para verificar que se encuentren en el mismo estado cuando se iniciaron los mantenimientos objeto del presente proceso contractual.

rr. El CONSULTOR y el equipo del CONSTRAISTA DE OBRA deberán cumplir lo estipulado en la resolución 4272 de 2021 donde se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

ss. Llevar un archivo fotográfico de cada una de LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO de la Agrupación No. 1, No. 2, No. 3 y No.4, desde el inicio hasta su terminación, el cual debe ser entregado al Supervisor al momento del recibo final o liquidación del mismo.

tt. El Interventor y contratista de obra se compromete con la entidad en cumplir con lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, Articulo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), donde señala: PARÁGRAFO 2. Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas y/o subcontratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Decreto 171 de 2016, Resolución 0312 de 2019.

uu. Presentar catálogos, manuales y/o fichas técnicas de los elementos ofertadas en idioma español y que serán enviadas a la interventoría por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

vv. Mantener la vigencia del precio unitario propuesto durante toda la vigencia del contrato.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

ww. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA Cumpla con la entrega de las adecuaciones dentro del plazo contractual establecido en el presente documento, es decir a los tres (3) meses y quince (15) días siguientes de la suscripción del acta de inicio.

xx. Realizar el cobro de la facturación generada en el marco del contrato, para lo cual deberá cumplir con los procedimientos y requisitos internos establecidos al interior de la Superintendencia de Notariado y Registro.

yy. Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.

zz. El Interventor Debe verificar que el contratista realice la entrega y socialización del **Manual de Mantenimiento** de las obras ejecutadas.

aaa. Autorizar la contratación de la mano de obra de los diferentes capítulos del presupuesto y supervisará la administración de los subcontratos.

bbb. La Interventoría estará pendiente que todos los trabajadores contratos cuenten con la capacitación y experiencia en acabados de obra, esto con el fin de desempeñar las labores que conlleva este tipo de intervenciones.

ccc. Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, trabajadores o proveedores, según las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene la ley.

ddd. Verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los presupuestos, especificaciones y contrato de obra.

eee. Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato.

fff. Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.

ggg. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto a la SUPERINTEDENCIA para la resolución final de las mismas.

hhh. Suspender si es necesario el contrato de ejecución, o si se establece posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión.

iii. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto. Además, elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes a la SUPERINTEDENCIA para su aprobación con una antelación mínima de DIEZ (10) días calendario a la fecha requerida para su implementación, las cuales deben estar suficientemente justificadas técnica, jurídica y económicamente.

jjj. Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato

kkk. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.

lll. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor

deberá informar al supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.

mmm. El Interventor deberá en compañía del CONTRATISTA DE OBRA, verificar las zonas donde se van a iniciar los trabajos y en qué estado se encuentran los equipos o elementos existentes en la misma, en caso de daño o que los mimos no funcione de manera adecuada una vez se finalice la ejecución, es responsabilidad del Contratista de obra dejar los elementos en el estado que fueron entregados.

nnn. Enviar en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato al supervisor, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante, el requerimiento (el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación), si el Contratista lo incumple, el interventor deberá informar de inmediato al supervisor con el fin de informar a la Dirección de Contratación, para que se dé aviso del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el interventor deberá enviar al supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados y este remitirlos a la Secretaría General. Si el incumplimiento conlleva, además, a un indebido manejo de recursos, el interventor deberá informar al supervisor para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

ooo. Elaborar el acta de terminación del contrato y el proyecto de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un tiempo máximo de QUINCE (15) días contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la SUPERINTENDENCIA para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.

ppp. Realizar la respectiva acta y hacer respetar los acuerdos o actividades acordados en la vista inicial de reconocimiento en compañía de la interventoría y la supervisión.

qqq. Verificar que el contratista de inicio a las actividades a ejecutar producto del proceso, a más tardar tres (3) días calendario, posterior a la aprobación del cronograma de actividades presentado por el contratista de obra.

rrr. Verificar que el contratista presente los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.

sss. Realizar la interventoría de acuerdo con la Resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021 ANEXO – MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA y las que la modifiquen, adicionen o deroguen, de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se adopta el manual interno de Supervisión e interventoría de los Contratos que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro.

ttt. Realizar los cobros respectivos una vez se cumpla con los porcentajes establecidos en el aparte forma de pago y realizar el continuo acompañamiento para que el contratista de obra también realice sus cobros una vez se cumpla con el avance estipulado.

uuu. Cuando se requiera del desmonte, traslado o manipulación de cualquier aparato o equipo de la SNR, el INTERVENTOR en compañía del contratista de Obra deben dejar constancia median acta, bitácora, fotografías y videos, del estado de funcionamiento del elemento a manipular, y el mismo una vez se culmine la actividad debe quedar conforme

se reportó al inicio de la actividad, en caso que no se diligencie la evidencia o el contratista inicie actividades sin autorización de la interventoría, el contratista es responsable del arreglo o cambio de elemento en caso que presente fallas.

vvv. El interventor debe verificar antes del inicio de cualquier actividad, que el contratista cuente con todos los materiales y el personal técnico de cada actividad para evitar problemas al momento de su ejecución, actividades como cambio de cubierta, cambio de estructura de cubierta, cielorrasos, pisos, entre otros deben contar con todos los elementos necesarios para evitar problemas en el funcionamiento de la oficina.

www. El Interventor en compañía del contratista deben realizar las respectivas memorias de cantidades de obra, donde se debe plantear de forma clara las cantidades ejecutadas y el sitio de su ejecución.

xxx. Cumplimiento de toda la regulación que aplica en materia ambiental para el presente proceso

yyy. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

- **INTERVENTORÍA FINANCIERA**

Realizar el seguimiento a la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por invertir, con el fin de tener herramientas para realizar las recomendaciones y ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de las obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo de ejecución del contrato.

La interventoría deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios para realizar los pagos y realizar la revisión de los mismos, realizando y suscribiendo las certificaciones que correspondan, además debe vigilar que el contratista de obra realice los respectivos cobros una vez se cumpla con los avances de obra estipulados para tal fin, se debe evitar que el contratista acumule pagos.

- **INTERVENTORÍA LEGAL**

Revisión de los documentos del contratista de obra, tales como, Contrato de obra, Pliegos de condiciones y en general de los documentos que hacen parte del contrato. Lo anterior, con el objeto de que sean conocidas las condiciones y obligaciones del contratista de obra y el personal vinculado y responsable de la ejecución del contrato.

Se debe mantener un estricto control y seguimiento a las garantías suscritas por el contratista, haciendo énfasis en la vigencia de las mismas, en concordancia con lo establecido en el contrato de obra. Se revisará e informará a la Entidad oportunamente de las condiciones y vencimiento de las mismas.

Así mismo realizar la verificación del pago de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que utilice el contratista en la ejecución de las obras.

De igual manera, realizar el seguimiento legal a la ejecución del contrato y asegurarse de que el contrato se cumpla en todos sus términos y condiciones. Esto incluye la revisión de los plazos de ejecución, la calidad de los materiales utilizados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requisitos legales.

Debe además realizar los informes, reportes y conceptos jurídicos y/o Legales que La Entidad solicite al Interventor, en relación con la ejecución del contrato. También debe informar a las partes sobre cualquier problema o incumplimiento detectado y proponer soluciones para corregirlos.

- **INTERVENTORÍA AMBIENTAL**

La interventoría deberá efectuar el seguimiento del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por ellos mismos, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio ambiente.

Para ello se deberá atender la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley 99 de 1993 y la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construcción, entre otras.

Atender la normatividad legal vigente sobre sanidad ambiental y fumigación (Ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y demás normas que amplíen o modifiquen la materia).

- **CONTROL DE COSTOS**

Con base en el presupuesto de la obra y mediante la continua confrontación de este con las cantidades de obra, los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de mano de obra, análisis de los demás factores que inciden en los costos se procura mantener una información más real y actualizada que permita a la entidad contratante tener una visualización oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados, una idea de las razones y de las medidas correctivas que se puedan tomar.

En caso de que antes del inicio de las labores de mantenimiento y a juicio de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la SNR la cual será conformada por un funcionario o funcionarios del Grupo de Infraestructura, sea necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previo visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, teniendo en cuenta los precios

vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta original del contratista.

Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica, económica, ambiental, social y jurídica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos - del respectivo manual de Interventoría, todo lo anterior previo visto bueno de la INTERVENTORÍA y la ENTIDAD.

En caso que, entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información al Supervisor designado por la SNR, quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista y la interventora del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prórrogas por retrasos en el cronograma.

- **CONTROL DE PROGRAMACIÓN**

Consiste en controlar la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de los de las actividades contratadas. Establece un marco de referencia con base en la metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecución de las obras.

Indica las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las metas preestablecidas.

Las visitas serán programadas conjuntamente, con el contratista de obra, interventoría y la entidad. Hacer seguimiento constante a la programación de la obra.

Llevar a cabo lo establecido en la resolución 682 de 24 de abril de 2020 con relación al (PAPSO).

- **RECOMENDACIONES**

**Liquidación del contrato de interventoría**

El Supervisor procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la interventoría, la cual se suscribirá máximo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al

vencimiento del plazo de ejecución del contrato La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por Estabilidad de Obra al Contratista.

**Inspección final de la obra**

El Interventor, el supervisor y el Contratista, efectuarán una inspección final a la obra, DIEZ (10) días antes del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista se dará por parte de la Interventoría y supervisión, máximo tres (3) días calendario para su atención, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra.

**Manual de Mantenimiento de obras ejecutadas.**

El Interventor deberá solicitar al contratista la entrega y socialización de un manual de mantenimiento de las obras ejecutadas, así cada oficina será responsable del cuidado de las obras ejecutadas.

- **CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO**

La Interventoría designará Ingenieros y/o Arquitectos, quienes serán sus representantes en la obra, y quienes deberán tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre.

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a más tardar en TRES (3) días calendario, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas, según el ANEXO – MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SNR.

La interventoría levantará los registros de calidad, de estado y puesta a punto los equipos y maquinaria del contratista.

El Interventor deberá vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 842 de 2003 y demás normas vigentes, respecto al ejercicio de la profesión en el territorio nacional. El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo de trabajo y el respectivo personal, en las condiciones ofrecidas durante el proceso y así lograr una adecuada interventoría.

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo tendrá las siguientes funciones:

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

Controlar, exigir, colaborar, resolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993) y los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones, los estudios y diseños del proyecto, la normatividad vigente y demás obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoría que garanticen la correcta ejecución del proyecto, así como:

- Inspeccionar las actividades de los procesos constructivos, de acuerdo con lo establecido en los pliegos.
- Tomar medidas y verificar cantidades ejecutadas en cada uno de los frentes de trabajo en compañía del contratista de obra.
- Verificar el cumplimento de las especificaciones técnicas del material requerido para el desarrollo de la obra.
- Verificar que todo el personal del contratista cumpla con las prácticas y elementos de seguridad en el trabajo.
- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
- Suscribir el acta de replanteo (Mayores y Menores) o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas en cada uno de los frentes. Será responsable de la veracidad y exactitud del certificado final de obra que haya firmado.
- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la Bitácora de obra ejecutada), aportando los resultados del control realizado.

**Insumos.**

La SNR entregará al **Interventor,** copia del Contrato de obra suscrito con el Contratista, así como los estudios y los documentos previos que lo soportan, sin embrago cualquier documento contractual puede ser verificado en el SECOP II.

**Productos.**

El interventor deberá solicitar al contratista:

- Hojas de vida del personal profesional.
- Relación del equipo mínimo obligatorio.
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.
- Programa de Obra y flujo de inversiones
- Plan de manejo de tránsito- PMT (Si se requiere).

- Permisos Ambientales de las canteras, plantas de concreto, plantas de asfalto y escombreras que utilizará durante la Etapa de Construcción, así como también los permisos que sean necesarios utilizar.
- Plan de manejo ambiental
- Plan de calidad y cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.

Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

- **CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS**

**Objetivo:** Comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el **Contratista,** corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el **Contrato de Obra.**

**Materiales: El Interventor** realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, además de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que la obra ejecutada por el Contratista cumple con los requerimientos contenidos en el **Contrato de Obra.**

Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concretos, acero de refuerzo, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice **el Contratista**. En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el **Contratista e Interventoría**, primaran para efectos de la comprobación de las **Metas Físicas** y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta última**.**

Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de Construcción. Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados (de existir) y demás implementos. En caso de no ser posible la verificación directa de los procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área del **Proyecto** por parte del **Interventor**, éste deberá solicitar al **Contratista** los protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el **Contrato de Obra**, o que tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican.

**Insumos:** Para adelantar dicha labor el **Interventor** deberá contar, entre otros y como mínimo, con los siguientes insumos:

- Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

- Realización y/o Revisión de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra.
- Visita de inspección a sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos fabricados fuera del área del proyecto.

**Productos:**

Los productos resultantes de este proceso corresponderán a:

- Entregar informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual exigido en el Contrato de Interventoría.
- Presentar y analizar los resultados de laboratorio aplicados a los materiales.
- Efectuar los requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad, cuando sea necesario.
- Presentar informes de inspección a las instalaciones de fabricación
- Notificar al Contratista y a la entidad respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos realizados.
- Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra.
- Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.

**CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA.**

**Objetivo:** Verificar los procesos constructivos empleados por el **Contratista,** la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la **Programación de Obra y flujo de inversiones** y **Cronograma de Metas Físicas** entregados por el Contratista.

**Insumos:**

- Reuniones semanales entre contratista e interventoría, las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría interno de la SNR según resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021.
- Informes de Interventoría, los cuales deberán ser elaborados diariamente por el personal contratado y debe estar consignado en la respectiva Bitácora de Obra.
- Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra.
- Registro fotográfico y fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción del proyecto (antes - durante y final), estos registros deben hacer parte de os informes semanales y mensuales de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

**CLÁUSULA DÉCIMA: - OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA:** La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

**A. OBLIGACIONES GENERALES:**

**a.** Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.
**b.** Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda de tal manera que facilite su labor.
**c.** Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quién los vulnere.
**d.** Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
**e.** Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación.
**f.** Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato.
**g.** Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
**h.** Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar.
**i.** Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar.
**j.** Las demás inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolución interna que regula la actividad de Supervisión.

Además de las obligaciones contenidas en el presente documento, el contratante se obliga para con el contratista a cumplir las siguientes obligaciones:

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

**a.** Aprobar la Garantía única del Contrato.
**b.** Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.
**c.** Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.
**d.** Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto por la Secretaría General, exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
**e.** Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a

cargo del contratista, el cual se verá reflejado en el informe final de supervisión final, el cual deberá ser cargado en la plataforma SECOP II.

**f.** Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.

**g.** Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.

**h.** Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro del plazo y las condiciones establecidas para tal fin. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II.

**i.** Verificar, como requisito de pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

**j.** Impartir aprobación de la facturación cargada a través de la plataforma SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y demás relacionados.

**k.** Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar.

**l.** Pagar el valor del contrato en la forma pactada.

**m.** Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: - ÍTEMS NO PREVISTOS:** Si como resultado de la ejecución del contrato surgen ítems no previstos en algunos de los frentes y la entidad no cuenta en su base de datos con los precios actualizados de obra, se debe seguir el siguiente procedimiento:

**a.** El interventor debe verificar si el ítem NO PREVISTO se encuentra establecido en el ANEXO-ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, publicado por la entidad y con vigencia 2024, en caso de no encontrarse deberá proceder según lo establecido en los siguientes literales.

**b.** El contratista deberá presentar solicitud formal al interventor donde se justifique la necesidad de incluir ítems no previstos en la oferta económica.

**c.** El interventor deberá analizar la procedencia de la solicitud y si la autoriza, deberá solicitar al contratista la elaboración de los APU'S y las cotizaciones (mínimo 3) para determinar el valor del ítem y así mismo, notificar a la entidad mediante una comunicación sobre la necesidad de estos nuevos ítems.

**d.** El contratista presentará los APU'S de los ítems no previstos para la revisión y aprobación del interventor del contrato, siempre y cuando se cuente con presupuesto para la ejecución de las actividades. Para la autorización de estos APU'S, se deberá elaborar un acta de fijación de precios no previstos que deberá ser suscrita por el contratista de obra, y con el visto bueno y aprobación de la interventoría.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

**e.** En caso de requerirse el acta suscrita de mayores y menores cantidades, la misma debe estar debidamente justificada por el contratista y aprobada por la interventoría.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - INFORMES:** El contratista deberá presentar al Supervisor del Contrato los siguientes informes en original y copia o vía correo electrónico y cargarlos en la plataforma SECOP II:

**A. INFORME SEMANAL DE AVANCE DE LOS TRABAJOS**

El informe debe ser presentado conforme al formato que para tal fin suministre la SUPERINTENDENCIA, el Supervisor del Contrato o la Interventoría, previa consulta entre las partes.

**B. INFORME MENSUAL Y FINAL**

El contratista de interventoría deberá validar el informe entregado por el contratista de obra y enviarlo al supervisor en original y copia o vía correo electrónico y verificar que el contratista de obra los cargue en la plataforma SECOP II, conforme lo requerido a continuación:

**CONTENIDO MÍNIMO INFORMES MENSUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

- **INFORMACIÓN GENERAL E INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

- No de Informe
- Periodo al que corresponde el informe
- Nombre del Contratante
- Nombre de Contratista
- Valor del contrato
- Plazo del contrato
- Fecha de inicio del contrato
- Fecha de vencimiento del contrato
- Fechas de prorrogas
- Valor de adiciones
- Fechas de suspensiones

- **ASPECTOS TÉCNICOS:**

- Descripción del Avance general del contrato programado vs ejecutado, incluye plan de contingencia
- Gráfico resumen de la Programación de Obra
- Relación de Informes semanales
- Control y manejo de equipos y/o maquinaria
- Relación de la Información climática

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

- Relación de Certificados de calidad de materiales
- Revisión de especificaciones técnicas contractuales
- Control de personal
- Control de ensayos
- Relación de comités de obra y/o visitas de obra

- **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:**

- Relación de solicitudes de prorroga
- Relación de solicitudes de adiciones
- Relación de solicitudes de suspensiones
- Porcentaje de tiempo transcurrido del contrato
- Relación de correspondencia enviada y recibida

- **ASPECTOS FINANCIEROS CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN**

- Programación financiera, Programado vs ejecutado
- Relación de pagos realizados
- Equilibrio económico o financiero del contrato de obra
- Relación de Actas de mayores y menores cantidades
- Relación de actas de recibo parcial y/o final

- **ASPECTOS LEGALES**

- Actualización del estado de las pólizas
- Informe detallado de incumplimiento del contratista de obra en caso de que se aplique
- Acciones por incumplimiento parcial o total del contrato de obra

- **ASPECTOS AMBIENTALES**

- Impactos generados
- Tratamiento y manejo de RCD
- Fichas ambientales
- Almacenamiento y manejo de materiales de construcción
- Manejo de campamentos
- Manejo de maquinaria y equipos 32
- Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas
- Manejo de gestión integral de residuos sólidos

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

- Control conservación materiales Orden y aseo
- Otras actividades realizadas
- Seguridad y salud en el trabajo
- Relación de actividades de alto riesgo
- Programa de capacitaciones, inducción y reinducción
- Reunión copasst
- Reunión comité de convivencia
- Personal del contrato y verificación de aportes SST
- Resumen detallado de los accidentes e incidentes presentados desde la ejecución del contrato
- Registro de entrega epp y dotación

- **ANEXO**

- Informes semanales
- Registro fotográfico
- Bitácora de obra
- Registro climático
- Registro climático
- Certificado de calidad de materiales
- Actas de comités de obra y/o visitas
- APUS y actas de justificación de ítems no previstos
- Actas de justificación contractual
- Memoria de cantidades de obra
- Prorrogas
- Adiciones
- Suspensiones
- Correspondencia enviada
- Correspondencia recibida
- Programación de obra
- Flujo de caja
- Actas de mayores y menores cantidades
- Actas de recibo parcial o final
- Constancia de cumplimiento y acreditación de pagos de seguridad social integral y pagos parafiscales del contratista de obra.
- Paz y salvos por concepto de pago a proveedores
- Control de equipos
- Control de personal

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

- Memorias de cantidades de Obra

- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

**NOTA:** Si la entidad la requiere solicitara el informe adicional que se necesite.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - PRODUCTOS A ENTREGAR:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, control de costos y control de programación y recibir a satisfacción LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).de igual forma entregar a la supervisión designada para tal fin por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Los inmuebles para intervenir cuentan con sus respectivas cantidades de obra que fueron producto de las visitas realizada por el Grupo de Infraestructura de la SNR y los cuales se adjuntan como anexo al presente Estudio Previo.

**El Interventor debe exigir al contratista la entrega de un Manual de Mantenimiento el cual debe ser socializado con el personal una vez se termine la adecuación y debe ser entregado en físico a la supervisión del presente proceso. De la socialización con el personal de cada oficina se deberá suscribir la respectiva acta.**

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN:** La **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** ejercerá la vigilancia y control de la correcta ejecución del contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la cual será ejercida por el Director de la Regional Caribe o por quien designe por escrito el ordenador del gasto, así mismo brindaran apoyo a la supervisión los siguientes funcionarios y/o contratistas: Ingeniera Jacqueline Guzmán, Ingeniera Rosa Santa María y Arquitecto Tomas Inostroza del Grupo de Infraestructura o quien designe por escrito el ordenador del gasto.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA**: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitución en mora.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN:** Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: - CESIÓN:** Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podrán ser cedidos ni transferidos por el Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Superintendencia**,** al tenor del artículo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

**CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** La solución de las controversias contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedarán en libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

**PARÁGRAFO. -** Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo.

**CLÁUSULA DECIMA NOVENA: - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos del presente contrato se considera como domicilio contractual el lugar de ejecución del contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** El contrato resultante de este proceso de selección no genera vínculo laboral alguno entre la Superintendencia y el personal que designe **EL CONTRATISTA** para el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, serán por cuenta del **CONTRATISTA** todos los salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás pagos a que haya lugar, así como el.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA:** El Contratista mantendrá indemne a la Superintendencia contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones de este contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la Superintendencia por asuntos, que según este contrato sean de responsabilidad del Contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Superintendencia y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: **A)** Estudios y documentos previos. **B)** Documento soportes del contrato. **C)** Certificado de disponibilidad presupuestal. **D)** Registro Presupuestal. **E)** Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. **F)** Actas, informes y demás documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. **G)** Pliegos de condiciones, sus anexos y Adendas. **H).** Modificaciones transaccionales que se tramiten y aprueben por la PLATAFORMA SECOP II. **I).** Propuesta del oferente**.**

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación.

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato, de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de común acuerdo procederán, dentro de los CUATRO (4) meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la liquidación por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante acta en la cual constarán las sumas de dinero recibidas por EL CONTRATISTA y la contraprestación de éste.

En el acta se hará constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidación llevará la firma de las partes y en vigencia de la garantía única de cumplimiento.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido de la misma, la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los dos (2) meses siguientes, liquidará en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, La Superintendencia de Notariado y Registro podrá unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes.

**PARÁGRAFO:** En el evento en que el tipo de contratación o la naturaleza de las prestaciones impliquen la existencia de obligaciones exigibles con posterioridad al plazo de ejecución acordado, se deberá realizar una liquidación parcial de aquellas que hayan cesado con el vencimiento del plazo contractual.

Para las obligaciones que subsistan, se deberá realizar una liquidación final en la cual se verifique su cumplimiento, teniendo en cuenta que para ésta también se aplicarán los términos y condiciones establecidos en la presente cláusula. El acta de la liquidación final deberá ser suscrita por las partes previo visto bueno del supervisor y en vigencia de la garantía única de cumplimiento.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA:- GARANTÍAS:** Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la Superintendencia de Notariado y Registro requiere que el futuro contratista constituya:

| AMPARO | VALOR DEL AMPARO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| **Cumplimiento** | 20% del Valor del Contrato | La cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (Numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015).<br>**En todo caso la vigencia de los amparos debe iniciar en la misma fecha de expedición de la póliza y no con fecha retroactiva.** |

**CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2366 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3**

| | | |
|---|---|---|
| **De amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales** | 5% del Valor del Contrato | Por el término de éste y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (Numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015).**En todo caso la vigencia de los amparos debe iniciar en la misma fecha de expedición de la póliza y no con fecha retroactiva** |
| **De calidad del servicio** | veinte por ciento (20%) del valor del contrato | Por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición del acta de recibo de la obra (numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015) |
| **De Responsabilidad Civil Extracontractual** | 200 SMLMV | Por el término de ejecución del contrato y si la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado el contratista de su patrimonio deberá responder ante el tercer afectado, por el término de ejecución de la obra contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 y Artículo 2.2.1.2.3.1.18, del decreto 1082 de 2015). |

**PARÁGRAFO 1:** En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valores pactados.

**PARÁGRAFO 2:** El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.

Conforme a lo anterior, en caso de ser necesario se deberá solicitar la adición en tiempo a los amparos establecidos en la Garantía Única de Cumplimiento para que los plazos exigidos sean consecuentes a los solicitados, contados a partir del Inicio de la ejecución contractual. Así mismo, de acuerdo con lo anterior será obligación del Contratista efectuar los ajustes a que haya lugar.

**CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: - PENAL PECUNIARIA: a)** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar a **LA SUPERINTENDENCIA** a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. **b)** Igualmente, frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: - MULTAS: a)** Con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por un valor

equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan. **b)** La imposición de las multas se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. **c)** La imposición de multas no impedirá la imposición de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. **d)** El contratista autoriza a **la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar.

**CLAUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA SÉPTIMA: - CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Se tendrán como causales de terminación, además de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya **l**a póliza de garantía dentro del término establecido en la Plataforma Transaccional del **SECOP II** por la **SUPERINTENDENCIA.**

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.** El presente contrato se considera perfeccionado con su suscripción en la Plataforma Transaccional del **SECOP II.** Para su ejecución requerirá: **1).** Expedición del Registro presupuestal; **2).** Constitución de la garantía por parte de el contratista y su aprobación por parte de la Superintendencia en la PLATAFORMA SECOP II**. 3).** Acreditación de estar al día en los aportes a Salud, Pensión y a Riesgos Laborales en los términos de ley. Para su legalización requerirá: 4**).** Suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes señalados.

***Proyectó:*** *Laura Milena Arroyo Lozano - Dirección de Contratación.*
***Revisó:*** *Héctor Iván Suárez Betancur – Dirección de Contratación.*
***Revisó y validó:*** *Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Director de Contratación.*
***Aprobó Transaccionalmente:*** *William Pérez Castañeda – Secretario General y Ordenador del Gasto SNR.*

# ACTA DE INICIO

## ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA

**CONTRATO No. 2366 DE 2024 de 2024**
**NOMBRE DEL CONTRATISTA: JVM INGENIERÍA S.A.S BIC**
**NIT: 901.489.956-3**

**FECHA DE INICIO:** 29 de octubre de 2024
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de diciembre 2024
**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 2 meses y 3 días
**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Barranquilla - Atlántico, Carmen de Bolívar – Bolívar, Sincelejo – Sucre, San Marcos – Sucre, Corozal – Sucre, Ciénaga – Magdalena, San Juan del Cesar – Guajira.
**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** $ 110.605.055,00
**FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA:** 29 de octubre de 2024.
**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:** 583324 del 29 de octubre de 2024

El día 29 de octubre de 2024 en la ciudad de Bogotá, se reunieron ELIANA PATRICIA BASTIDAS MADURO en su calidad de supervisor del contrato y CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE en su calidad de contratista, con el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en el objeto del **Contrato No. 2366 de 2024.**

**Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). AGRUP 3.**

Se firma en Bogotá para los fines pertinentes el día 29 de octubre de 2024.

Supervisor: Eliana Bastidas Maduro
Directora Regional Caribe

Contratista: Carlos Arturo Vergara
C.C.79.508.558 Rep. Legal: JVM INGENIERÍA SAS BIC

# PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

JVM
INGENIERÍA S.A.S. BIC
NIT 901.489.956-3

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA**

Bogotá D.C. 06 de diciembre de 2024

Señores,
**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO**
Bogotá D.C.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO

**CERTIFICAN QUE:**

La Empresa **JVM INGENIERIA S.A.S. BIC** identificada con NIT 901.489.956-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de la ciudad de Montería, ha cumplido y se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones (AFP), Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Caja de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

**Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva.**

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
**JAIRO ARGEL MARTINEZ**
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 246221-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOC. IDENTIDAD No**. 79.508.558**

Dirección: Calle 52ª No. 14 - 17, Montería – Córdoba
Teléfono: (4) 7846589, Celular: 310 654 1925
E – mail: jvmsas2021@gmail.com

# PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1067404725
# DESDE NOVIEMBRE 2024 HASTA ENERO 2025

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901489956 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JVM INGENIERIA S.A.S. BIC |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 52A NO.14-17 | TELÉFONO: | 7846589 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1067404725 |
| APELLLIDOS: | CARDENAS BENITEZ | NOMBRES: | INDIRA SCARLETH |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| TIPO COTIZANTE: | DEPEND | SUBTIPO COTIZANTE: | |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | NO | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO DE SALARIO: | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| PLANILLA No: | 7958233315 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | diciembre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | enero - 2025 | FECHA DE PAGO: | 29/01/2025 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 002 - PROYECTOS DE OBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 402.500 |
|---|---|

| PLANILLA No: | 7953258808 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | noviembre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | diciembre - 2024 | FECHA DE PAGO: | 16/12/2024 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 005 - PROFESIONALES SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 402.500 |
|---|---|

| PLANILLA No: | 7948596861 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | octubre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | noviembre - 2024 | FECHA DE PAGO: | 28/11/2024 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 002 - PROYECTOS DE OBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 402.500 |
|---|---|

Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 5107680
# DESDE NOVIEMBRE 2024 HASTA ENERO 2025

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79508558 | | |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS ARTURO | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA | | |
| DIRECCIÓN: | KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE | TELÉFONO: | 7846589 | | |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE | | |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI | | |

| DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 5107680 |
| APELLLIDOS: | PADILLA DE LA PENA | NOMBRES: | JOSE SEBASTIAN |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BARRANQUILLA | DEPARTAMENTO: | ATLANTICO |
| TIPO COTIZANTE: | DEPEND | SUBTIPO COTIZANTE: | NO OBLIG COT PENS EDAD |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | NO | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO DE SALARIO: | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| PLANILLA No: | 7957709219 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | diciembre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | enero - 2025 | FECHA DE PAGO: | 29/01/2025 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 005 - OBRAS FFIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | 79508558 | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF06-COMBARRANQUILLA | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 194.500 |
|---|---|

| PLANILLA No: | 7952970873 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | noviembre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | diciembre - 2024 | FECHA DE PAGO: | 22/01/2025 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 005 - OBRAS FFIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | 79508558 | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF06-COMBARRANQUILLA | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 194.500 |
|---|---|

| PLANILLA No: | 7946734629 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | octubre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | noviembre - 2024 | FECHA DE PAGO: | 11/12/2024 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 005 - OBRAS FFIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | 79508558 | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF06-COMBARRANQUILLA | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 194.500 |
|---|---|

Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1005753750
# DESDE NOVIEMBRE 2024 HASTA ENERO 2025

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901791022 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO CONSTRUIR |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 52A N 14-17 | TELÉFONO: | 7846589 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1005753750 |
| APELLLIDOS: | BALLEN VERGARA | NOMBRES: | ANA MARIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| TIPO COTIZANTE: | DEPEND | SUBTIPO COTIZANTE: | |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | NO | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO DE SALARIO: | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| PLANILLA No: | 7953801651 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | noviembre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | diciembre - 2024 | FECHA DE PAGO: | 02/01/2025 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 001 - OBRAS CORDOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | MUTUAL SER EPS-S | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 6.800 | 30 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 318.800 |
|---|---|

| PLANILLA No: | 7952937620 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | octubre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | noviembre - 2024 | FECHA DE PAGO: | 11/12/2024 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 006 - PROFESIONALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | MUTUAL SER EPS-S | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 6.800 | 30 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 318.800 |
|---|---|

Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1032416452
# DESDE NOVIEMBRE 2024 HASTA ENERO 2025

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79508558 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS ARTURO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE | TELÉFONO: | 7846589 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1032416452 |
| APELLLIDOS: | NAVARRETE ACUNA | NOMBRES: | FABIAN IGNACIO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| TIPO COTIZANTE: | DEPEND | SUBTIPO COTIZANTE: | |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | NO | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO DE SALARIO: | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| PLANILLA No: | 7958221406 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | diciembre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | enero - 2025 | FECHA DE PAGO: | 29/01/2025 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 006 - SEDE BOGOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.900.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.900.000 | $ 304.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 304.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.900.000 | $ 76.000 | $ 0 | $ 76.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.900.000 | 79508558 | $ 132.300 | 30 | $ 1.900.000 | CCF21-CAFAM | $ 76.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 588.300 |
|---|---|

| PLANILLA No: | 7953257658 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | noviembre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | diciembre - 2024 | FECHA DE PAGO: | 16/12/2024 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 008 - PROFESIONALES SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.900.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.900.000 | $ 304.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 304.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.900.000 | $ 76.000 | $ 0 | $ 76.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.900.000 | 79508558 | $ 132.300 | 30 | $ 1.900.000 | CCF21-CAFAM | $ 76.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 588.300 |
|---|---|

| PLANILLA No: | 7946716515 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | octubre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | noviembre - 2024 | FECHA DE PAGO: | 28/11/2024 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 006 - SEDE BOGOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | | | | |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.900.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.900.000 | $ 304.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 304.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.900.000 | $ 76.000 | $ 0 | $ 76.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.900.000 | 79508558 | $ 132.300 | 30 | $ 1.900.000 | CCF21-CAFAM | $ 76.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 588.300 |
|---|---|

Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

# CERTIFICADO BANCARIO

# Certificado
# Bancario

Miércoles, 12 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JVM INGENIERIA SAS BIC identificado(a) con NIT 901489956, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 56900003358 | 2022/06/30 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

# ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA FINAL**

**ORIP SINCELEJO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 2344 de 2024 | VALOR: | $ 194.100.399,00 |
| | | ADICION | N/A |
| | | VALOR TOTAL | $ 194.100.399,00 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PROINVERSIONES | OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). | |
| INTERVENTORIA/SUPERVISION | JBM INGENIERIA SAS BIC | | |

**A LOS 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FABIO CASTRO, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y TOMAS INOSTROSA, SUPERVISOR Y JUAN VERGARA, INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.**

| CONTRACTUAL | | | | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | RESUMEN | | VALOR TOTAL CAPITULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | MAYORES | MENORES | NO PREVISTAS | MAYORES | MENORES | NO PREVISTAS | CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA | VALOR TOTAL | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | **$ 11.860.480,11** |
| 1,02 | DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS | m | 80,00 | $ 4.745,00 | $ 379.600,00 | - | - **80,00** | | $ - | -$ 379.600,00 | | - | $ - | |
| 1,03 | DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS | un | 20,00 | $ 14.233,00 | $ 284.660,00 | - | - **5,00** | | $ - | -$ 71.165,00 | | 15,00 | $ 213.495,00 | |
| 1,04 | DESMONTE DE CIELORRASO | m2 | 200,00 | $ 8.585,00 | $ 1.717.000,00 | - | - **0,11** | | $ - | -$ 922,89 | | 199,89 | $ 1.716.077,11 | |
| 1,07 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | un | 8,00 | $ 21.463,00 | $ 171.704,00 | - | - | | $ - | $ - | | 8,00 | $ 171.704,00 | |
| 1,10 | DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 30,00 | $ 19.518,00 | $ 585.540,00 | **56,00** | - | | $ 1.093.008,00 | $ - | | 86,00 | $ 1.678.548,00 | |
| 1,20 | DESMONTE DE PUERTA METÁLICA | un | 4,00 | $ 18.569,00 | $ 74.276,00 | - | - | | $ - | $ - | | 4,00 | $ 74.276,00 | |
| 1,21 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA | un | 20,00 | $ 14.520,00 | $ 290.400,00 | - | - | | $ - | $ - | | 20,00 | $ 290.400,00 | |
| 1,33 | DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO | un | 16,00 | $ 52.226,00 | $ 835.616,00 | - | - | | $ - | $ - | | 16,00 | $ 835.616,00 | |
| 1,35 | DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE | un | 8,00 | $ 46.423,00 | $ 371.384,00 | - | - | | $ - | $ - | | 8,00 | $ 371.384,00 | |
| 1,40 | DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM) | m | 2,00 | $ 24.326,00 | $ 48.652,00 | - | - | | $ - | $ - | | 2,00 | $ 48.652,00 | |
| 1,44 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM) | m2 | 4,00 | $ 14.683,00 | $ 58.732,00 | - | - | | $ - | $ - | | 4,00 | $ 58.732,00 | |
| 1,46 | DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM) | m2 | 2,00 | $ 24.326,00 | $ 48.652,00 | - | - | | $ - | $ - | | 2,00 | $ 48.652,00 | |
| 1,51 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | un | 8,00 | $ 23.395,00 | $ 187.160,00 | - | - | | $ - | $ - | | 8,00 | $ 187.160,00 | |
| 1,55 | INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 30,00 | $ 21.888,00 | $ 656.640,00 | **56,00** | - | | $ 1.225.728,00 | $ - | | 86,00 | $ 1.882.368,00 | |
| 1,56 | INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE | un | 8,00 | $ 62.730,00 | $ 501.840,00 | - | - | | $ - | $ - | | 8,00 | $ 501.840,00 | |
| 1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | m2 | 100,00 | $ 3.922,00 | $ 392.200,00 | - | - | | $ - | $ - | | 100,00 | $ 392.200,00 | |
| 1,66 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO | m2 | 16,00 | $ 11.174,00 | $ 178.784,00 | - | - **12,00** | | $ - | -$ 134.088,00 | | 4,00 | $ 44.696,00 | |
| 1.72 | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN | m3 | 30,00 | $ 90.681,00 | $ 2.720.430,00 | - | - | | $ - | $ - | | 30,00 | $ 2.720.430,00 | |
| 1,73 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M | m2 | 50,00 | $ 12.485,00 | $ 624.250,00 | - | - | | $ - | $ - | | 50,00 | $ 624.250,00 | |
| **2** | **CARPINTERÍA EN MADERA** | | | | | | | | | | | | | **$ 5.370.829,00** |
| 2,09 | MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM | un | 1,00 | $ 557.412,00 | $ 557.412,00 | - | - | | $ - | $ - | | 1,00 | $ 557.412,00 | |
| 2,10 | MUEBLE BAJO MESÓN COCINA | m | 2,00 | $ 594.095,00 | $ 1.188.190,00 | - | - | | $ - | $ - | | 2,00 | $ 1.188.190,00 | |
| 2,17 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA | m2 | 32,00 | $ 82.653,00 | $ 2.644.896,00 | - | - **23,00** | | $ - | -$ 1.901.019,00 | | 9,00 | $ 743.877,00 | |
| 2,18 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA | un | 20,00 | $ 124.494,00 | $ 2.489.880,00 | - | - | | $ - | $ - | | 20,00 | $ 2.489.880,00 | |
| 2,19 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA | un | 3,00 | $ 130.490,00 | $ 391.470,00 | - | - | | $ - | $ - | | 3,00 | $ 391.470,00 | |
| **3** | **CARPINTERÍA METÁLICA** | | | | | | | | | | | | | **$ 3.173.818,08** |
| 3,16 | REJA TIPO BANCO | m2 | 16,00 | $ 181.154,00 | $ 2.898.464,00 | **1,52** | - | | $ 275.354,08 | $ - | | 17,52 | $ 3.173.818,08 | |
| **4** | **CIELORRASOS** | | | | | | | | | | | | | **$ 35.545.883,81** |
| 4,03 | CIELORRASO EN VINIL Y FOIL DE ALUMINIO 61CMX61CM | m2 | 200,00 | $ 177.825,00 | $ 35.565.000,00 | - | - **0,11** | | $ - | -$ 19.116,19 | | 199,89 | $ 35.545.883,81 | |
| **5** | **CONCRETOS Y MORTEROS** | | | | | | | | | | | | | **$ 1.150.620,56** |

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA FINAL**

**ORIP SINCELEJO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 2344 de 2024 | VALOR: | $ 194.100.399,00 |
| | | ADICION | N/A |
| | | VALOR TOTAL | $ 194.100.399,00 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PROINVERSIONES | OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). | |
| INTERVENTORIA/SUPERVISION | JBM INGENIERIA SAS BIC | | |

**A LOS 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FABIO CASTRO, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y TOMAS INOSTROSA, SUPERVISOR Y JUAN VERGARA, INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.**

| CONTRACTUAL | | | | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | RESUMEN | | VALOR TOTAL CAPITULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | MAYORES | MENORES | NO PREVISTAS | MAYORES | MENORES | NO PREVISTAS | CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA | VALOR TOTAL | |
| 5,03 | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones | m2 | 48,00 | $ 36.770,00 | $ 1.764.960,00 | - | - 16,71 | | $ - | -$ 614.339,44 | | 31,29 | $ 1.150.620,56 | |
| **7** | **ENCHAPES MUROS** | | | | | | | | | | | | | **$ 2.866.928,00** |
| 7,02 | ESTUCO PLASTICO INTERIOR | m2 | 80,00 | $ 12.609,00 | $ 1.008.720,00 | **40,00** | - | | $ 504.360,00 | $ - | | 120,00 | $ 1.513.080,00 | |
| 7,03 | RESANE | m2 | 80,00 | $ 8.917,00 | $ 713.360,00 | **40,00** | - | | $ 356.680,00 | $ - | | 120,00 | $ 1.070.040,00 | |
| 7,04 | BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM | m2 | 4,00 | $ 2.579,00 | $ 10.316,00 | - | - | | $ - | $ - | | 4,00 | $ 10.316,00 | |
| 7,06 | CERÁMICA FORMATO 20X20CM | m2 | 16,00 | $ 68.373,00 | $ 1.093.968,00 | - | - 12,00 | | $ - | -$ 820.476,00 | | 4,00 | $ 273.492,00 | |
| **10** | **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS** | | | | | | | | | | | | | **$ 9.688.200,00** |
| 10,03 | PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS] | m2 | 200,00 | $ 30.329,00 | $ 6.065.800,00 | - | - | | $ - | $ - | | 200,00 | $ 6.065.800,00 | |
| 10,06 | LAVADO FACHADA | m2 | 200,00 | $ 18.112,00 | $ 3.622.400,00 | - | - | | $ - | $ - | | 200,00 | $ 3.622.400,00 | |
| **13** | **PINTURAS** | | | | | | | | | | | | | **$ 38.261.651,84** |
| 13,10 | VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad | m2 | 1.698,60 | $ 24.689,00 | $ 41.936.735,40 | - | - 148,86 | | $ - | -$ 3.675.083,56 | | 1.549,74 | $ 38.261.651,84 | |
| **14** | **PISOS** | | | | | | | | | | | | | **$ 210.180,00** |
| 14,04 | PISO CERÁMICA 20X20CM | m2 | 4,00 | $ 63.761,00 | $ 255.044,00 | - | - 2,00 | | $ - | -$ 127.522,00 | | 2,00 | $ 127.522,00 | |
| 14,15 | ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO | m2 | 4,00 | $ 41.329,00 | $ 165.316,00 | - | - 2,00 | | $ - | -$ 82.658,00 | | 2,00 | $ 82.658,00 | |
| **15** | **RED ELÉCTRICA** | | | | | | | | | | | | | **$ 21.266.558,00** |
| 15,10 | LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR | un | 30,00 | $ 166.376,00 | $ 4.991.280,00 | **46,00** | - | | $ 7.653.296,00 | $ - | | 76,00 | $ 12.644.576,00 | |
| 15,13 | LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER | un | 10,00 | $ 66.686,00 | $ 666.860,00 | - | - | | $ - | $ - | | 10,00 | $ 666.860,00 | |
| 15,16 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A | un | 8,00 | $ 22.738,00 | $ 181.904,00 | - | - 8,00 | | $ - | -$ 181.904,00 | | - | $ - | |
| 15,17 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X15A | un | 8,00 | $ 52.101,00 | $ 416.808,00 | - | - 8,00 | | $ - | -$ 416.808,00 | | - | $ - | |
| 15,18 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A | un | 8,00 | $ 61.242,00 | $ 489.936,00 | - | - 8,00 | | $ - | -$ 489.936,00 | | - | $ - | |
| 15,20 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE3X15A | un | 8,00 | $ 43.296,00 | $ 346.368,00 | - | - 8,00 | | $ - | -$ 346.368,00 | | - | $ - | |
| 15,44 | CANALETA PLASTICA 100X45MM | ml | 40,00 | $ 33.016,00 | $ 1.320.640,00 | - | - 40,00 | | $ - | -$ 1.320.640,00 | | - | $ - | |
| 15,45 | TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE | un | 10,00 | $ 10.855,00 | $ 108.550,00 | - | - | | $ - | $ - | | 10,00 | $ 108.550,00 | |
| 15,46 | BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO | un | 1,00 | $ 237.222,00 | $ 237.222,00 | - | - | | $ - | $ - | | 1,00 | $ 237.222,00 | |
| 15,50 | PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada. | un | 10,00 | $ 507.290,00 | $ 5.072.900,00 | **5,00** | - | | $ 2.536.450,00 | $ - | | 15,00 | $ 7.609.350,00 | |
| **16** | **RED HIDRÁULICA** | | | | | | | | | | | | | **$ 7.834.027,00** |
| 16,18 | JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO | un | 4,00 | $ 97.288,00 | $ 389.152,00 | - | - | | $ - | $ - | | 4,00 | $ 389.152,00 | |
| 16,19 | LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería | un | 7,00 | $ 207.620,00 | $ 1.453.340,00 | - | - | | $ - | $ - | | 7,00 | $ 1.453.340,00 | |
| 16,21 | LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS. Incluye Grifería | un | 1,00 | $ 910.029,00 | $ 910.029,00 | - | - | | $ - | $ - | | 1,00 | $ 910.029,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA FINAL**

**ORIP SINCELEJO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 2344 de 2024 | VALOR: | $ 194.100.399,00 |
| | | ADICION | N/A |
| | | VALOR TOTAL | $ 194.100.399,00 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PROINVERSIONES | OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). | |
| INTERVENTORIA/SUPERVISION | JBM INGENIERIA SAS BIC | | |

**A LOS 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FABIO CASTRO, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y TOMAS INOSTROSA, SUPERVISOR Y JUAN VERGARA, INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.**

| CONTRACTUAL | | | | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | RESUMEN | | VALOR TOTAL CAPITULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | MAYORES | MENORES | NO PREVISTAS | MAYORES | MENORES | NO PREVISTAS | CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA | VALOR TOTAL | |
| 16,22 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | un | 1,00 | $ 404.066,00 | $ 404.066,00 | - | - | | $ - | $ - | | 1,00 | $ 404.066,00 | |
| 16,23 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE | un | 1,00 | $ 144.854,00 | $ 144.854,00 | - | - | | $ - | $ - | | 1,00 | $ 144.854,00 | |
| 16,31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL CREMA MARFIL | m | 2,00 | $ 2.266.293,00 | $ 4.532.586,00 | - | - | | $ - | $ - | | 2,00 | $ 4.532.586,00 | |
| **17** | **RED SANITARIA** | | | | | | | | | | | | | **$ 5.957.067,00** |
| 17,19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | m | 10,00 | $ 27.346,00 | $ 273.460,00 | - | - | | $ - | $ - | | 10,00 | $ 273.460,00 | |
| 17,20 | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA | m | 20,00 | $ 39.851,00 | $ 797.020,00 | - | - | | $ - | $ - | | 20,00 | $ 797.020,00 | |
| 17,27 | SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. | un | 1,00 | $ 816.542,00 | $ 816.542,00 | - | - | | $ - | $ - | | 1,00 | $ 816.542,00 | |
| 17,28 | SANITARIO TIPO AHORRADOR | un | 7,00 | $ 391.644,00 | $ 2.741.508,00 | - | - | | $ - | $ - | | 7,00 | $ 2.741.508,00 | |
| 17,29 | ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE. | un | 4,00 | $ 1.328.537,00 | $ 5.314.148,00 | - | - 3,00 | | $ - | -$ 3.985.611,00 | | 1,00 | $ 1.328.537,00 | |
| **19** | **ASEO-SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | | **$ 1.503.078,00** |
| 19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | m2 | 100,00 | $ 2.793,00 | $ 279.300,00 | - | - | | $ - | $ - | | 100,00 | $ 279.300,00 | |
| 19,02 | SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO | m2 | 2,00 | $ 387.954,00 | $ 775.908,00 | - | - | | $ - | $ - | | 2,00 | $ 775.908,00 | |
| 19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación. | un | 10,00 | $ 44.787,00 | $ 447.870,00 | - | - | | $ - | $ - | | 10,00 | $ 447.870,00 | |
| **20** | **ADICIONALES** | | | | | | | | | | | | | **$ 922.381,00** |
| 15,15 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A | un | - | $ 23.434,00 | $ - | 5,00 | - | | $ 117.170,00 | $ - | | 5,00 | $ 117.170,00 | |
| 15,19 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A | un | - | $ 63.447,00 | $ - | 5,00 | - | | $ 317.235,00 | $ - | | 5,00 | $ 317.235,00 | |
| 15,11 | LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER / DESCOLGADA | un | - | $ 60.997,00 | $ - | 8,00 | - | | $ 487.976,00 | $ - | | 8,00 | $ 487.976,00 | |
| | | | | | $ - | - | - | | $ - | $ - | | - | $ - | |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 145.611.702,00** | | | | | | | | | **$ 145.611.702,00** |
| | **ADMINISTRACIÓN** | | 26,35% | | $ 38.368.684,00 | | | | | | | | | $ 38.368.684,00 |
| | **IMPREVISTOS** | | 1,00% | | $ 1.456.117,00 | | | | | | | | | $ 1.456.117,00 |
| | **UTILIDAD** | | 5,00% | | $ 7.280.585,00 | | | | | | | | | $ 7.280.585,00 |
| | **IVA SOBRE UTILIDAD** | | 19,00% | | $ 1.383.311,00 | | | | | | | | | $ 1.383.311,00 |
| **COSTO TOTAL OBRA** | | | | | $ 194.100.399,00 | | | | | | | | | **$ 194.100.399,00** |
| **VALOR TOTAL OBRA** | | | | | **$ 194.100.399,00** | | | | | | | | | **$ 194.100.399,00** |
| **SALDO POR AJUSTAR** | | | | | | | | | | | | | | |

**PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:**



| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA FINAL**

**ORIP SINCELEJO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 2344 de 2024 | VALOR: | $ 194.100.399,00 |
| | | ADICION | N/A |
| | | VALOR TOTAL | $ 194.100.399,00 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PROINVERSIONES | OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). | |
| INTERVENTORIA/SUPERVISION | JBM INGENIERIA SAS BIC | | |

A LOS 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FABIO CASTRO, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y TOMAS INOSTROSA, SUPERVISOR Y JUAN VERGARA, INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

| CONTRACTUAL | | | | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | RESUMEN | | VALOR TOTAL CAPITULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | MAYORES | MENORES | NO PREVISTAS | MAYORES | MENORES | NO PREVISTAS | CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA | VALOR TOTAL | |

VANESSA TAMAYO BERNAL
DIRECTORA DE OBRA

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA

ELIANA BASTIDAS MADURO
Vo. Bo. SUPERVISION/ FUNCIONARIO

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA

# ACTA DE JUSTIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**ACTA DE JUSTIFICACION DE OBRA ACTA NO. 3**

**ORIP SINCELEJO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA N°** | **2344 de 2024** | **VALOR:** | **$ 194.100.399,00** |
| | | **ADICION** | **N/A** |
| | | **VALOR TOTAL** | **$ 194.100.399,00** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO PROINVERSIONES** | **OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA** | |
| **INTERVENTORIA/SUPERVISION** | **JBM INGENIERIA SAS BIC** | | |

**A LOS 12 DIAS DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: FABIO CASTRO, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y TOMAS INOSTROSA, SUPERVISOR Y JUAN VERGARA, INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.**

| CONTRACTUAL | | | | CANTIDAD TOTAL | % VARIACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UN** | **CANT** | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | |
| 1,02 | DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS | m | 80,00 | 0,00 | 100% | No se hace necesaria la actividad |
| 1,03 | DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS | un | 20,00 | 15,00 | 75% | Se ajusta cantidad en obra |
| 1,04 | DESMONTE DE CIELORRASO | m² | 200,00 | 199,89 | 100% | Se ajusta cantidad en obra |
| 1,07 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | un | 8,00 | 8,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,10 | DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 30,00 | 86,00 | 287% | Se ajusta cantidad en obra |
| 1,20 | DESMONTE DE PUERTA METÁLICA | un | 4,00 | 4,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,21 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA | un | 20,00 | 20,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,33 | DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO | un | 16,00 | 16,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,35 | DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE | un | 8,00 | 8,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,40 | DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM) | m | 2,00 | 2,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,44 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM) | m² | 4,00 | 4,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,46 | DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM) | m² | 2,00 | 2,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,51 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | un | 8,00 | 8,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,55 | INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | un | 30,00 | 86,00 | 287% | Se ajusta cantidad en obra |
| 1,56 | INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE | un | 8,00 | 8,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | m² | 100,00 | 100,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,66 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO | m² | 16,00 | 4,00 | 25% | Se ajusta cantidad en obra |
| 1.72 | GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN | m³ | 30,00 | 30,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 1,73 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M | m² | 50,00 | 50,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| **2** | **CARPINTERÍA EN MADERA** | | | | | |
| 2,09 | MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM | un | 1,00 | 1,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 2,10 | MUEBLE BAJO MESÓN COCINA | m | 2,00 | 2,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 2,17 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA | m² | 32,00 | 9,00 | 28% | Se ajusta cantidad en obra |
| 2,18 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA | un | 20,00 | 20,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 2,19 | CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA | un | 3,00 | 3,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| **3** | **CARPINTERÍA METÁLICA** | | | | | |
| 3,16 | REJA TIPO BANCO | m² | 16,00 | 17,52 | 110% | Se ajusta cantidad en obra |
| **4** | **CIELORRASOS** | | | | | |
| 4,03 | CIELORRASO EN VINIL Y FOIL DE ALUMINIO 61CMX61CM | m² | 200,00 | 199,89 | 100% | No se hace necesaria la actividad |
| **5** | **CONCRETOS Y MORTEROS** | | | | | |
| 5,03 | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones | m² | 48,00 | 31,29 | 65% | Se ajusta cantidad en obra |
| **7** | **ENCHAPES MUROS** | | | | | |
| 7,02 | ESTUCO PLASTICO INTERIOR | m² | 80,00 | 120,00 | 150% | Se ajusta cantidad en obra |
| 7,03 | RESANE | m² | 80,00 | 120,00 | 150% | Se ajusta cantidad en obra |
| 7,04 | BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM | m² | 4,00 | 4,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 7,06 | CERÁMICA FORMATO 20X20CM | m² | 16,00 | 4,00 | 25% | Se ajusta cantidad en obra |
| **10** | **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS** | | | | | |
| 10,03 | PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS] | m² | 200,00 | 200,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 10,06 | LAVADO FACHADA | m² | 200,00 | 200,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| **13** | **PINTURAS** | | | | | |
| 13,10 | VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad | m² | 1760,90 | 1549,74 | 88% | Se ajusta cantidad en obra |
| **14** | **PISOS** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,04 | PISO CERÁMICA 20X20CM | m² | 4,00 | 2,00 | 50% | Se ajusta cantidad en obra |
| 14,15 | ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO | m² | 4,00 | 2,00 | 50% | Se ajusta cantidad en obra |
| **15** | **RED ELÉCTRICA** | | | | | |
| 15,10 | LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR | un | 30,00 | 76,00 | 253% | Se ajusta cantidad en obra |
| 15,13 | LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER | un | 10,00 | 10,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 15,16 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A | un | 8,00 | 0,00 | 100% | No se hace necesaria la actividad |
| 15,17 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X15A | un | 8,00 | 0,00 | 100% | No se hace necesaria la actividad |
| 15,18 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A | un | 8,00 | 0,00 | 100% | No se hace necesaria la actividad |
| 15,20 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE3X15A | un | 8,00 | 0,00 | 100% | No se hace necesaria la actividad |
| 15,44 | CANALETA PLASTICA 100X45MM | ml | 40,00 | 0,00 | 100% | No se hace necesaria la actividad |
| 15,45 | TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE | un | 10,00 | 10,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 15,46 | BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO | un | 1,00 | 1,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 15,50 | PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada. | un | 5,00 | 15,00 | 300% | Se ajusta cantidad en obra |
| **16** | **RED HIDRÁULICA** | | | | | |
| 16,18 | JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO | un | 4,00 | 4,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 16,19 | LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería | un | 7,00 | 7,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 16,21 | LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS. Incluye Grifería | un | 1,00 | 1,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 16,22 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | un | 1,00 | 1,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 16,23 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE | un | 1,00 | 1,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 16,31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL CREMA MARFIL | m | 2,00 | 2,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| **17** | **RED SANITARIA** | | | | | |
| 17,19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | m | 10,00 | 10,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 17,20 | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA | m | 20,00 | 20,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 17,27 | SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. | un | 1,00 | 1,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 17,28 | SANITARIO TIPO AHORRADOR | un | 7,00 | 7,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 17,29 | ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE. | un | 4,00 | 1,00 | 25% | Se ajusta cantidad en obra |
| **19** | **ASEO-SEÑALIZACIÓN** | | | | | |
| 19,01 | ASEO GENERAL DE OBRA | m² | 100,00 | 100,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 19,02 | SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO | m² | 2,00 | 2,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| 19,04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación. | un | 10,00 | 10,00 | 0% | Se mantiene cantidad |
| **20** | **ADICIONALES** | | | | | |
| 15,15 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A | UN | 0,00 | 5,00 | 100% | Se hace necesario incluir actividad nueva |
| 15,19 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A | UN | 0,00 | 5,00 | 100% | Se hace necesario incluir actividad nueva |
| 15,11 | LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER / DESCOLGADA | UN | 0,00 | 8,00 | 100% | Se hace necesario incluir actividad nueva |

**PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:**

**Arq. VANESSA TAMAYO BERNAL**
Directora de obra
**CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES**

**Ing. CARLOS VERGARA NEGRETE**
Representante Legal
**INTERVENTORIA JBM INGENIERIA SAS BIC**

**ELIANA BASTIDAS MADURO**
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
**Superintendencia de Notariado y Registro**

# MEMORIAS DE CANTIDADES

| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** — FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

CONTRATO No. 2344 de 2024 — CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).


INTERVENTORIA: JVM INGENIERIA SAS BIC — SUPERVISOR SNR: ELIANA BASTIDAS MADURO

ITEM: 1,03 — DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS — UNIDAD: un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Piso 1** | | | | | | | | | | - |
| Área de caja | | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| **Piso 2** | | | | | | | | | | - |
| Juridica y oficina Registradora | | 4,00 | | | | | | | | 4,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| **Piso 3** | | | | | | | | | | - |
| Juridica y Administrativa | | 6,00 | | | | | | | | 6,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| **Piso 4** | | | | | | | | | | - |
| Auditorio | | 3,00 | | | | | | | | 3,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *20,00* |

(ELEMENTOS LLENOS: CANT, LONGITUD, ANCHO, ALTO; VANOS: L, a, h)

CROQUIS

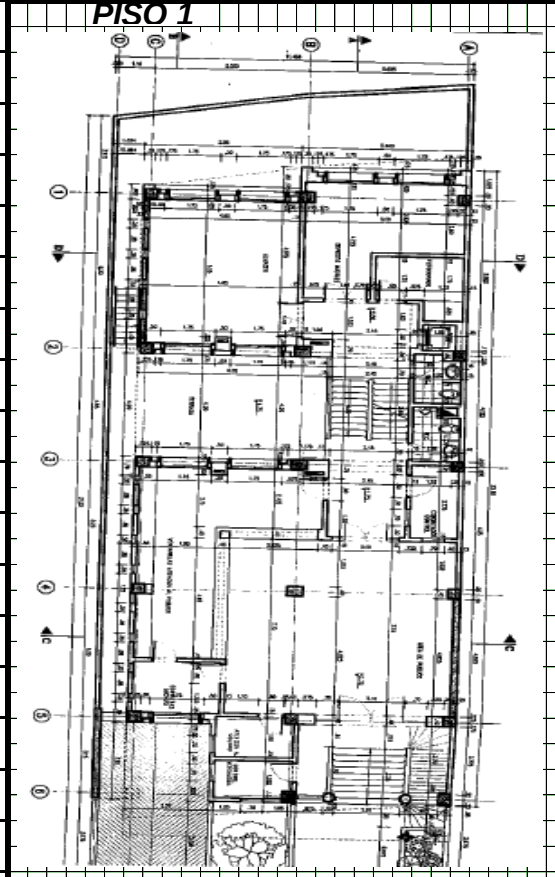


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** | FECHA | DIA | | MES | | AÑO | | HOJA No | | DE |

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 **CONTRATISTA**


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 1,10 DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS **UNIDAD** un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Atencion al ciudadano | | 9,00 | | | | | | | | 9,00 |
| Pasillo acceso P1 a P2 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Caja | | 4,00 | | | | | | | | 4,00 |
| Baño p1 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Juridica P2 | | 9,00 | | | | | | | | 9,00 |
| Oficina P3 | | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| Baño P2 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 30,00 |

**CROQUIS**

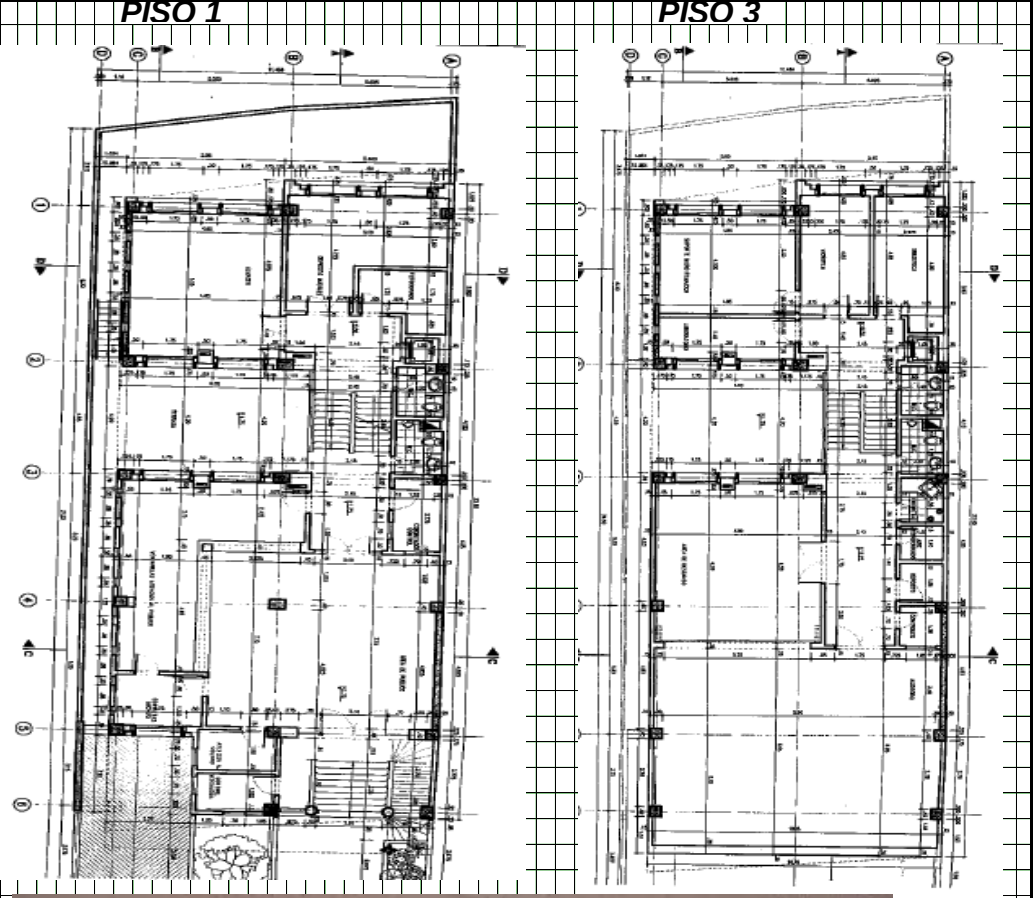





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|
| PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** — FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 — **CONTRATISTA**

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC — **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO


**ITEM:** 1,04 DESMONTE DE CIELORRASO — **UNIDAD** m²

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Piso 1** | | | | | | | | | | - |
| Caja | | | 6,00 | 1,80 | | | | | | 10,80 |
| | | | 2,50 | 3,00 | | | | | | 7,50 |
| Archivo | | | 1,80 | 1,90 | | | | | | 3,42 |
| Pasillo a piso 2 | | | 2,45 | 1,90 | | | | | | 4,66 |
| Control | | | 2,80 | 1,75 | | | | | | 4,90 |
| Baños | | 2,00 | 1,50 | 1,75 | | | | | | 5,25 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| Almacén P3 | | | 4,70 | 4,20 | | | | | | 19,74 |
| | | | 2,40 | 4,20 | | | | | | 10,08 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *66,35* |

**CROQUIS**

PISO 1 — PISO 3



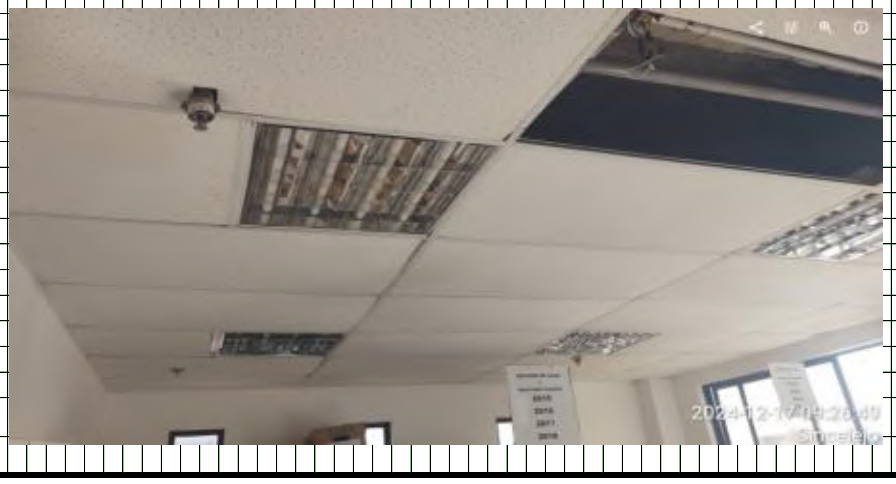

**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 **CONTRATISTA**

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**


**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 1,33 **DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO** **UNIDAD** un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juridica P2 | | 9,00 | | | | | | | | 9,00 |
| Caja | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| Oficina P3 | | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 16,00 |

**CROQUIS**

*PISO 1* *PISO 3*

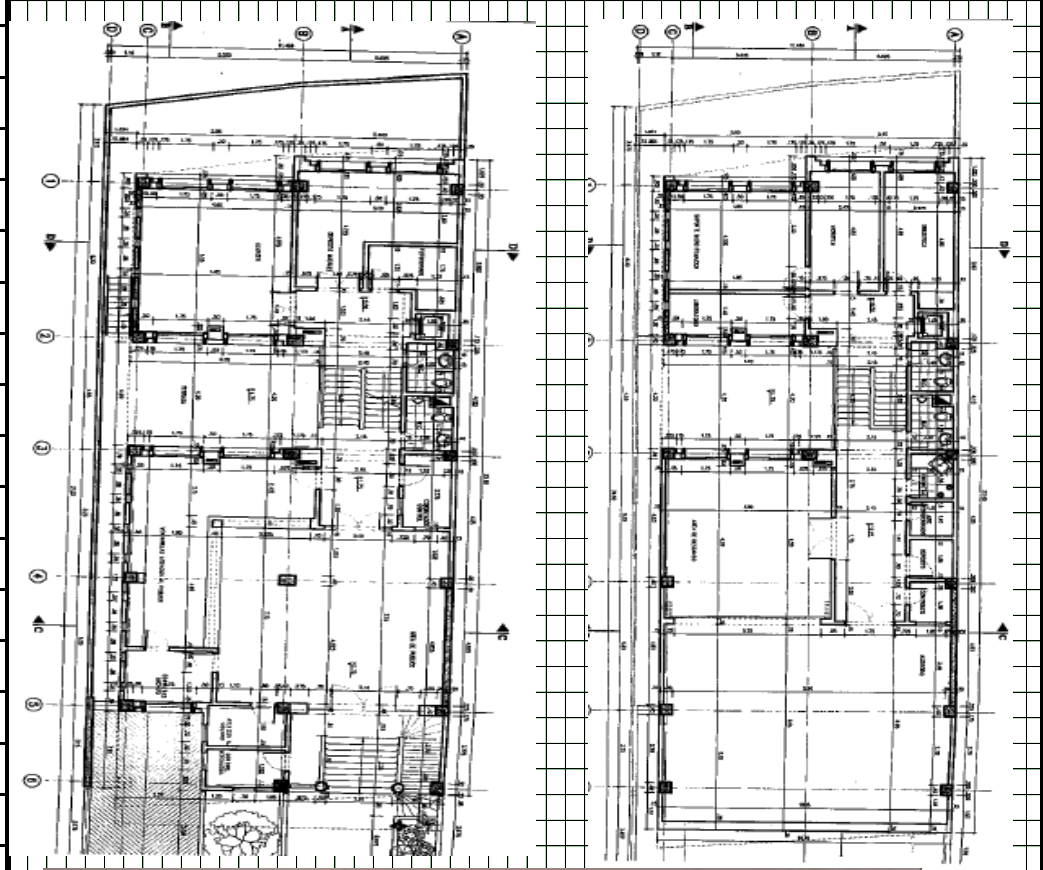




**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| **VANESSA TAMAYO BERNAL** <br> **CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES** | **CARLOS VERGARA NEGRETE** <br> **INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC** |

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** FECHA DIA MES AÑO HOJA No DE

CONTRATO No. 2344 de 2024 CONTRATISTA


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA: JVM INGENIERIA SAS BIC — SUPERVISOR SNR: ELIANA BASTIDAS MADURO

ITEM: 1,35 DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE — UNIDAD: un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Archivo P2 | | 3,00 | | | | | | | | 3,00 |
| Oficina P3 | | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 8,00 |

CROQUIS

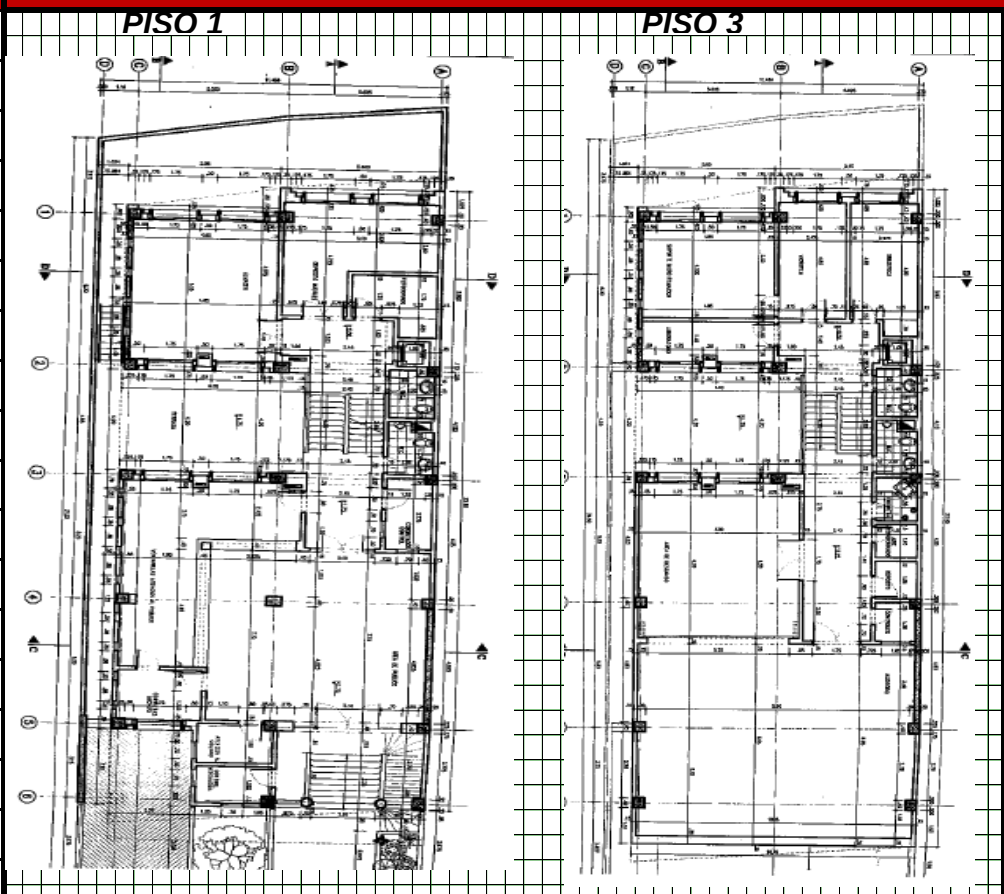


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** — FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 — **CONTRATISTA**


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC — **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 1,35 — DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE — **UNIDAD** un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Archivo P2 | | 4,00 | | | | | | | | 4,00 |
| Oficina P3 | | 4,00 | | | | | | | | 4,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 8,00 |

**CROQUIS**

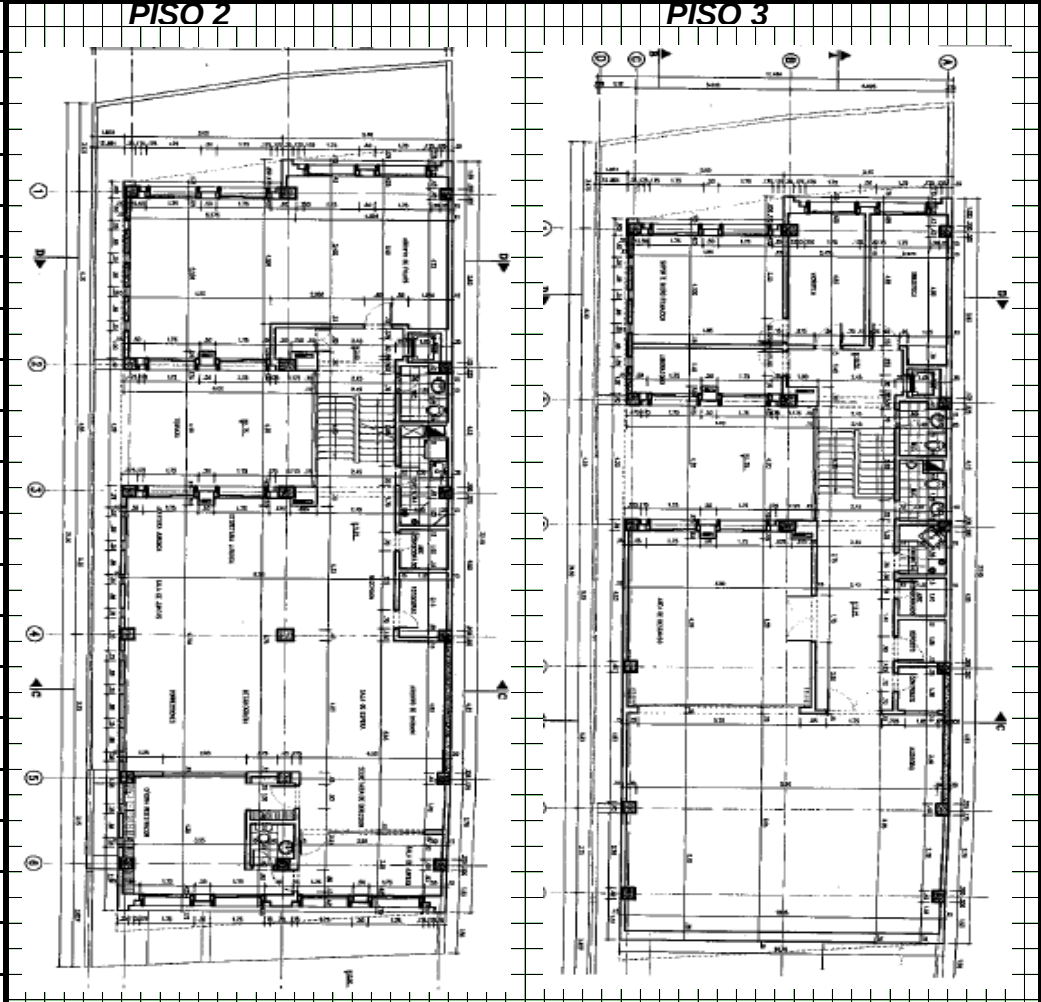


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 **CONTRATISTA**


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 1,55 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS **UNIDAD** un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Atencion al ciudadano | | 9,00 | | | | | | | | 9,00 |
| Pasillo acceso P1 a P2 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Caja | | 4,00 | | | | | | | | 4,00 |
| Baño p1 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Juridica P2 | | 9,00 | | | | | | | | 9,00 |
| Oficina P3 | | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| Baño P2 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 30,00 |

**CROQUIS**

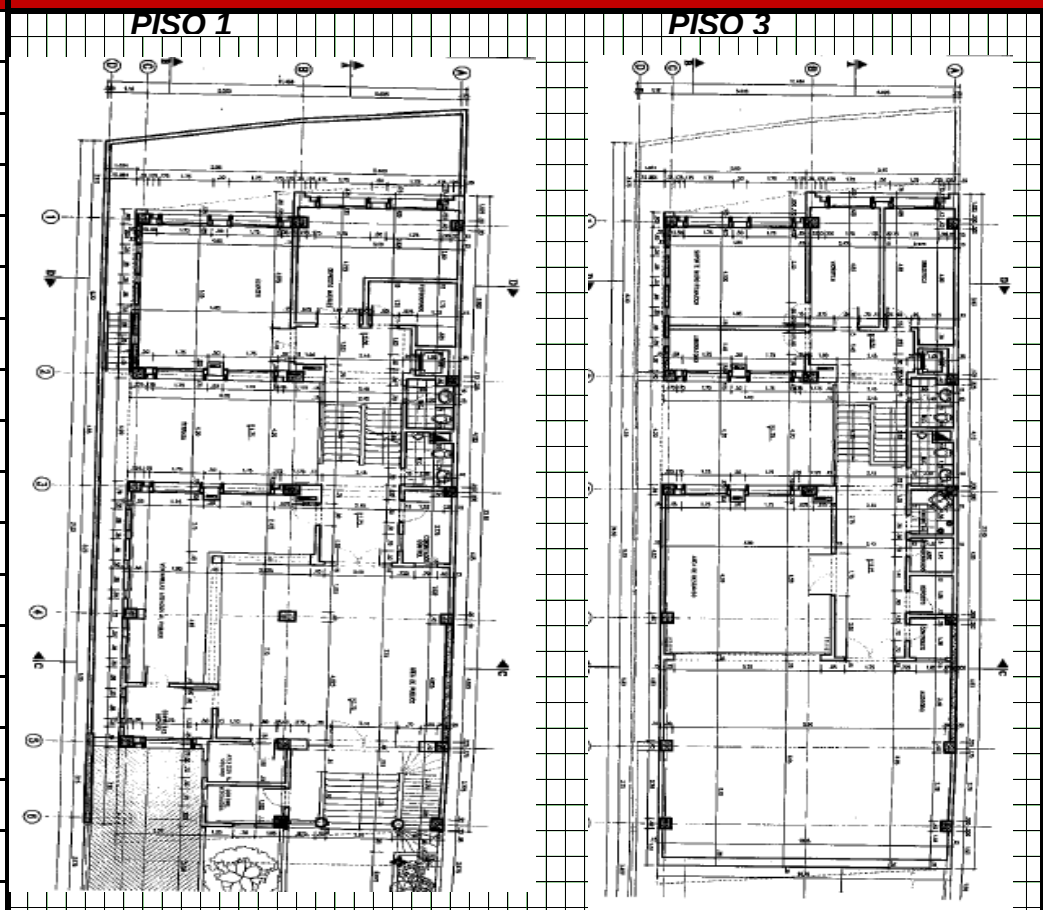


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** — FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 — **CONTRATISTA**


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC — **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 1,56 INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE — **UNIDAD** un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo P2 | | 3,00 | | | | | | | | 3,00 |
| Oficina P3 | | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 8,00 |

**CROQUIS**

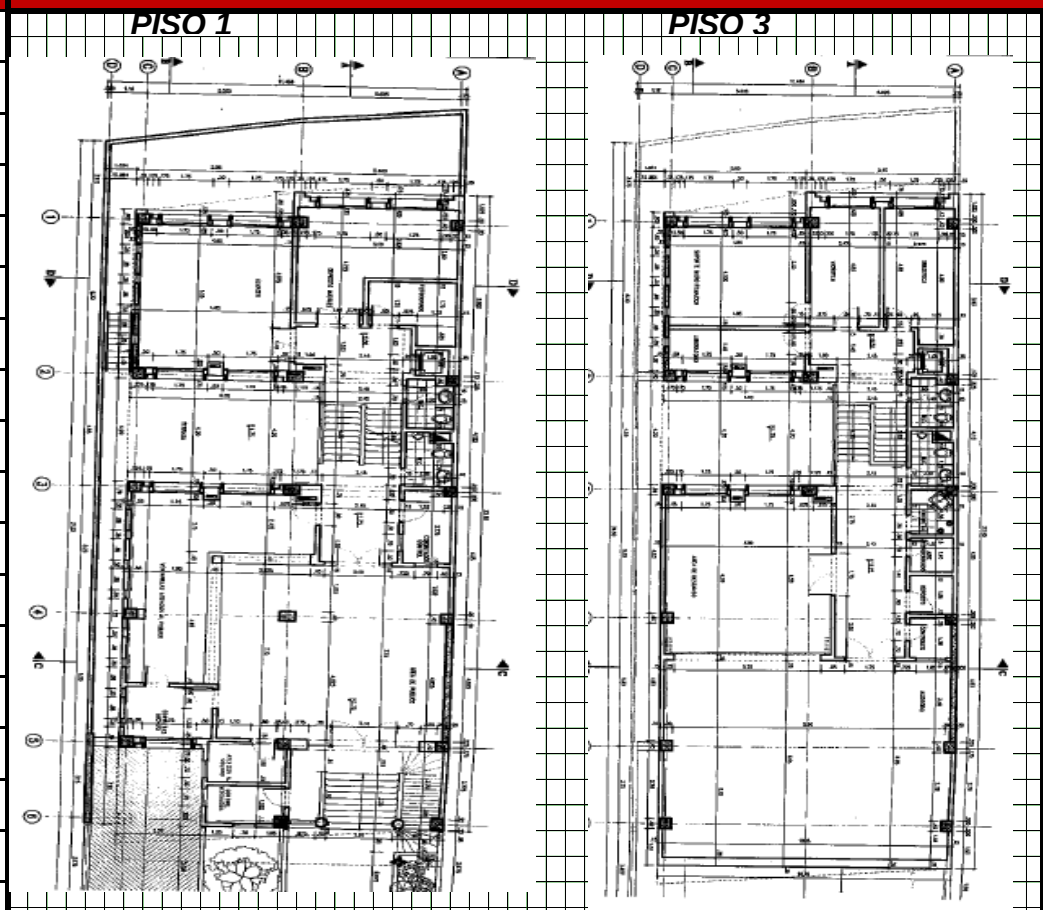


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** | FECHA | DIA | | MES | | AÑO | | HOJA No | | DE |


| CONTRATO No. | 2344 de 2024 | CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

| INTERVENTORIA | JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR | ELIANA BASTIDAS MADURO |
|---|---|---|---|
| ITEM: 1,57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | UNIDAD | m² |

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Atencion al ciudadano | | | 6,50 | 2,40 | | | | | | 15,60 |
| Pasillo acceso P1 a P2 | | | 1,30 | 2,00 | | | | | | 2,60 |
| Caja | | | 1,40 | 2,50 | | | | | | 3,50 |
| | | | | | | | | | | - |
| Juridica P2 | | | 3,50 | 8,40 | | | | | | 29,40 |
| Oficina P3 | | | 3,30 | 8,40 | | | | | | 27,72 |
| Almace´n P3 | | | 4,70 | 4,20 | | | | | | 19,74 |
| | | | 2,40 | 0,60 | | | | | | 1,44 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 100,00 |

**CROQUIS**

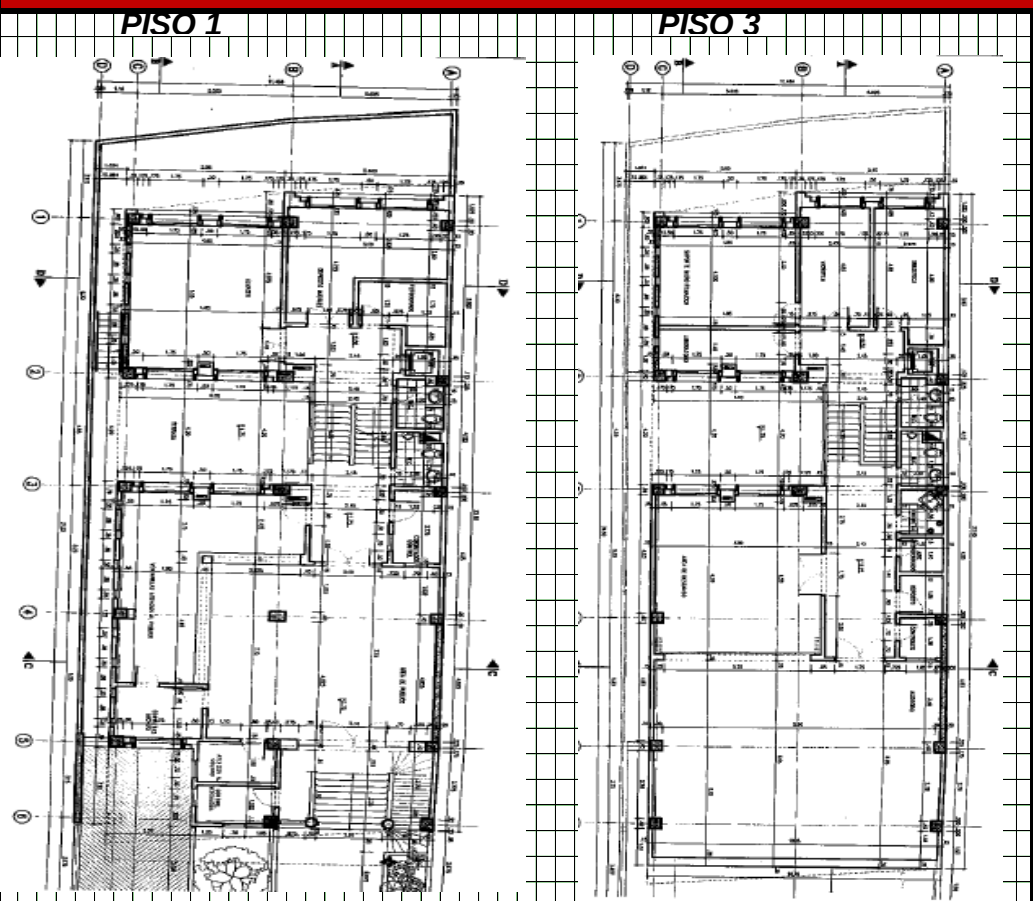




**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** — FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 — **CONTRATISTA**


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC — **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 4,03 — CIELORRASO EN VINIL Y FOIL DE ALUMINIO 61CMX61CM — **UNIDAD** m²

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| **Piso 1** | | | | | | | | | | - |
| Caja | | | 6,00 | 1,80 | | | | | | 10,80 |
| | | | 2,50 | 3,00 | | | | | | 7,50 |
| Archivo | | | 1,80 | 1,90 | | | | | | 3,42 |
| Pasillo a piso 2 | | | 2,45 | 1,90 | | | | | | 4,66 |
| Control | | | 2,80 | 1,75 | | | | | | 4,90 |
| Baños | | 2,00 | 1,50 | 1,75 | | | | | | 5,25 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| Almacén P3 | | | 4,70 | 4,20 | | | | | | 19,74 |
| | | | 2,40 | 4,20 | | | | | | 10,08 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *66,35* |

**CROQUIS**

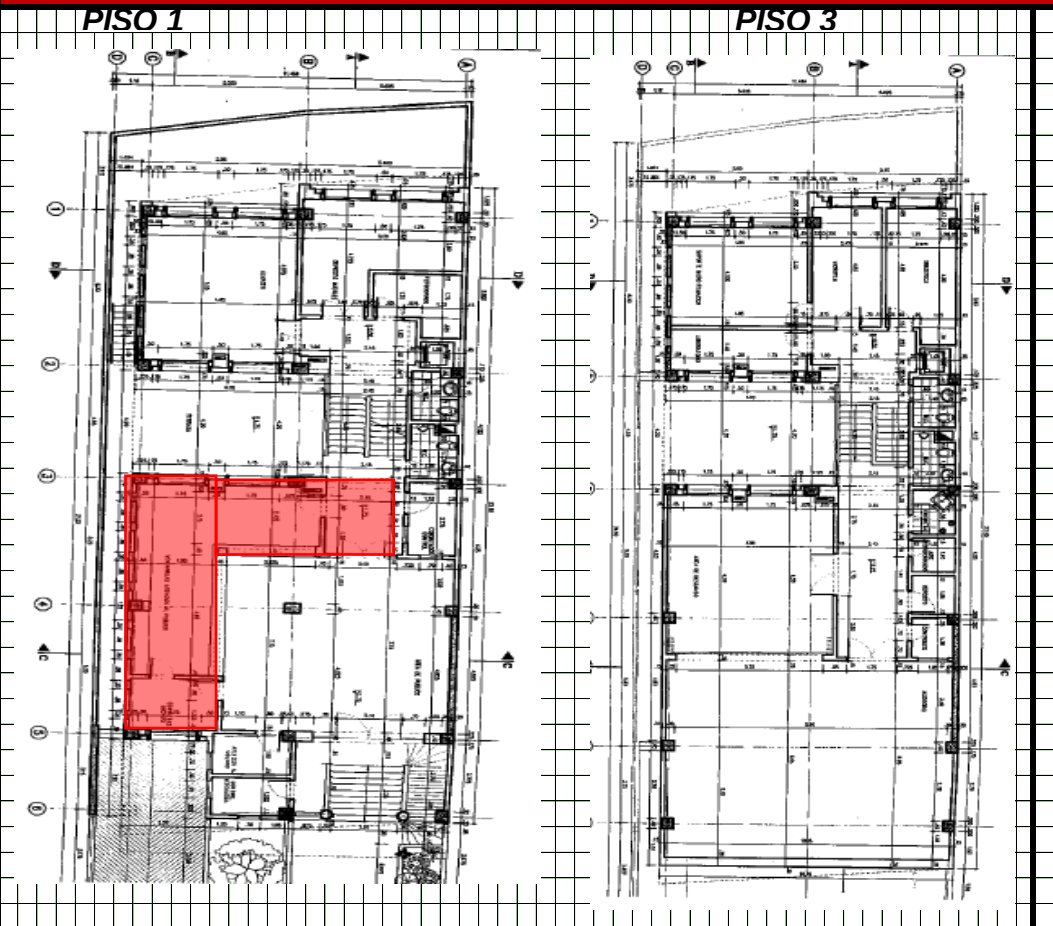


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

CONTRATO No. 2344 de 2024 | CONTRATISTA


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA: JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR: ELIANA BASTIDAS MADURO

ITEM: 7,02 ESTUCO PLASTICO INTERIOR | UNIDAD: m²

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| **Piso 1** | | | | | | | | | | - |
| Atención al ciudadano | | | 1,28 | 1,80 | | | | | | 2,30 |
| | | | 7,15 | 1,60 | | | | | | 11,44 |
| | | | 2,70 | 1,40 | | | | | | 3,78 |
| Tramo escaleras P1 a P2 | | 2,00 | 0,35 | 2,50 | | | | | | 1,75 |
| | | | 0,20 | 2,50 | | | | | | 0,50 |
| | | | 2,30 | 1,70 | | | | | | 3,91 |
| | | | 1,20 | 2,40 | | | | | | 2,88 |
| | | | | | | | | | | - |
| Tramo escaleras P2 a P3 | | 2,00 | 0,35 | 2,50 | | | | | | 1,75 |
| | | | 0,20 | 2,50 | | | | | | 0,50 |
| | | | 1,20 | 2,40 | | | | | | 2,88 |
| | | | | | | | | | | - |
| Tramo escaleras P3 a P4 | | 2,00 | 0,35 | 2,50 | | | | | | 1,75 |
| | | | 0,20 | 2,50 | | | | | | 0,50 |
| | | | 1,20 | 2,40 | | | | | | 2,88 |
| | | | | | | | | | | - |
| Salida de escaleras P1, p2 y P3 | | | 1,75 | 1,60 | | | | | | 2,80 |
| | | | 2,65 | 1,60 | | | | | | 4,24 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | TOTAL | | | | *43,86* |

CROQUIS

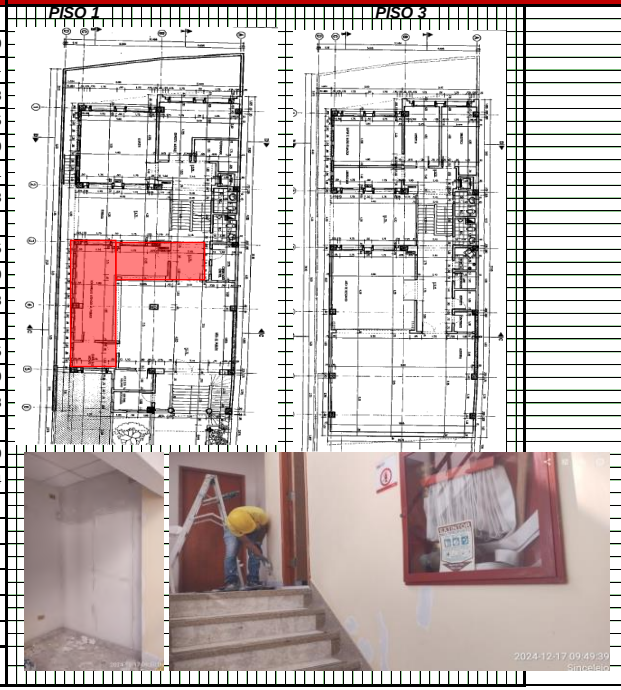


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**VANESSA TAMAYO BERNAL**
**CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES**

**CARLOS VERGARA NEGRETE**
**INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC**

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | | MES | | AÑO | | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2344 de 2024 | CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

| INTERVENTORIA | JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR | ELIANA BASTIDAS MADURO |
|---|---|---|---|

| ITEM: | 7,03 | RESANE | UNIDAD | m² |
|---|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| **Piso 1** | | | | | | | | | | - |
| Atención al ciudadano | | | 1,28 | 1,80 | | | | | | 2,30 |
| | | | 7,15 | 1,60 | | | | | | 11,44 |
| | | | 2,70 | 1,40 | | | | | | 3,78 |
| Tramo escaleras P1 a P2 | | 2,00 | 0,35 | 2,50 | | | | | | 1,75 |
| | | | 0,20 | 2,50 | | | | | | 0,50 |
| | | | 2,30 | 1,70 | | | | | | 3,91 |
| | | | 1,20 | 2,40 | | | | | | 2,88 |
| | | | | | | | | | | - |
| Tramo escaleras P2 a P3 | | 2,00 | 0,35 | 2,50 | | | | | | 1,75 |
| | | | 0,20 | 2,50 | | | | | | 0,50 |
| | | | 1,20 | 2,40 | | | | | | 2,88 |
| | | | | | | | | | | - |
| Tramo escaleras P3 a P4 | | 2,00 | 0,35 | 2,50 | | | | | | 1,75 |
| | | | 0,20 | 2,50 | | | | | | 0,50 |
| | | | 1,20 | 2,40 | | | | | | 2,88 |
| | | | | | | | | | | - |
| Salida de escaleras P1, p2 y P3 | | | 1,75 | 1,60 | | | | | | 2,80 |
| | | | 2,65 | 1,60 | | | | | | 4,24 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | *43,86* |

CROQUIS

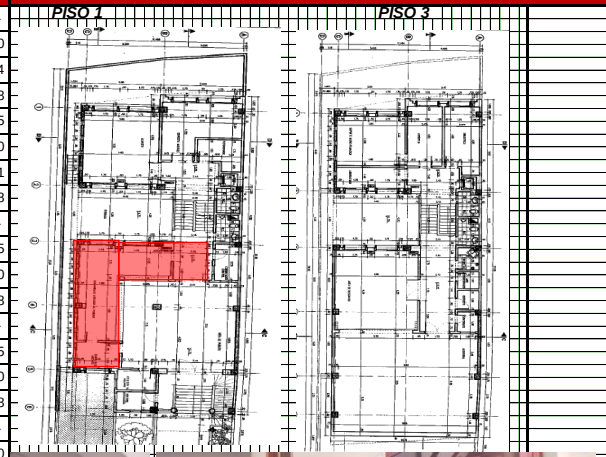




**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**VANESSA TAMAYO BERNAL**
**CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES**

**CARLOS VERGARA NEGRETE**
**INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC**

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | | MES | | AÑO | | HOJA No | | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2344 de 2024 | CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

| INTERVENTORIA | JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR | ELIANA BASTIDAS MADURO |
|---|---|---|---|

| ITEM: | 15,10 | LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR | UNIDAD | un |
|---|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Atencion al ciudadano | | 9,00 | | | | | | | | 9,00 |
| Pasillo acceso P1 a P2 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Caja | | 4,00 | | | | | | | | 4,00 |
| Baño p1 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Juridica P2 | | 9,00 | | | | | | | | 9,00 |
| Oficina P3 | | 5,00 | | | | | | | | 5,00 |
| Baño P2 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 30,00 |

CROQUIS

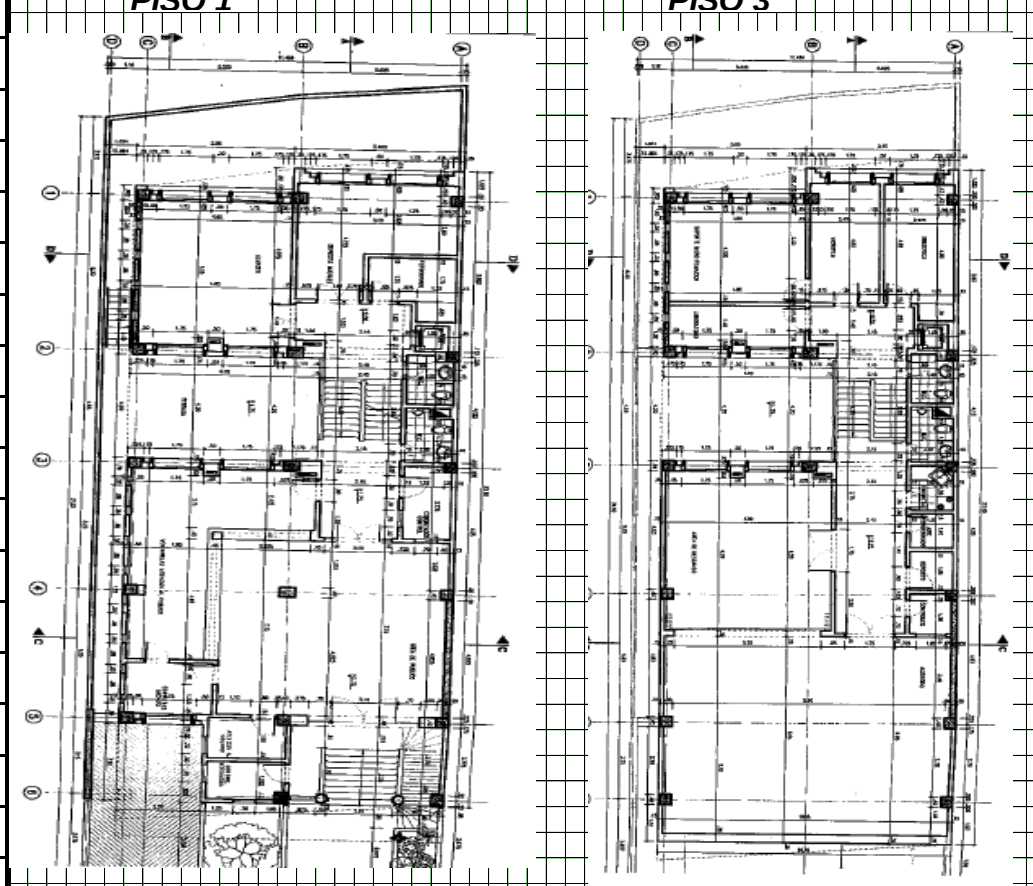


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|
| PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE


| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 2344 de 2024 | CONTRATISTA | |

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR | ELIANA BASTIDAS MADURO |
| ITEM: 15,46 | BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO | UNIDAD | un |

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Tablero general | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 1,00 |

CROQUIS

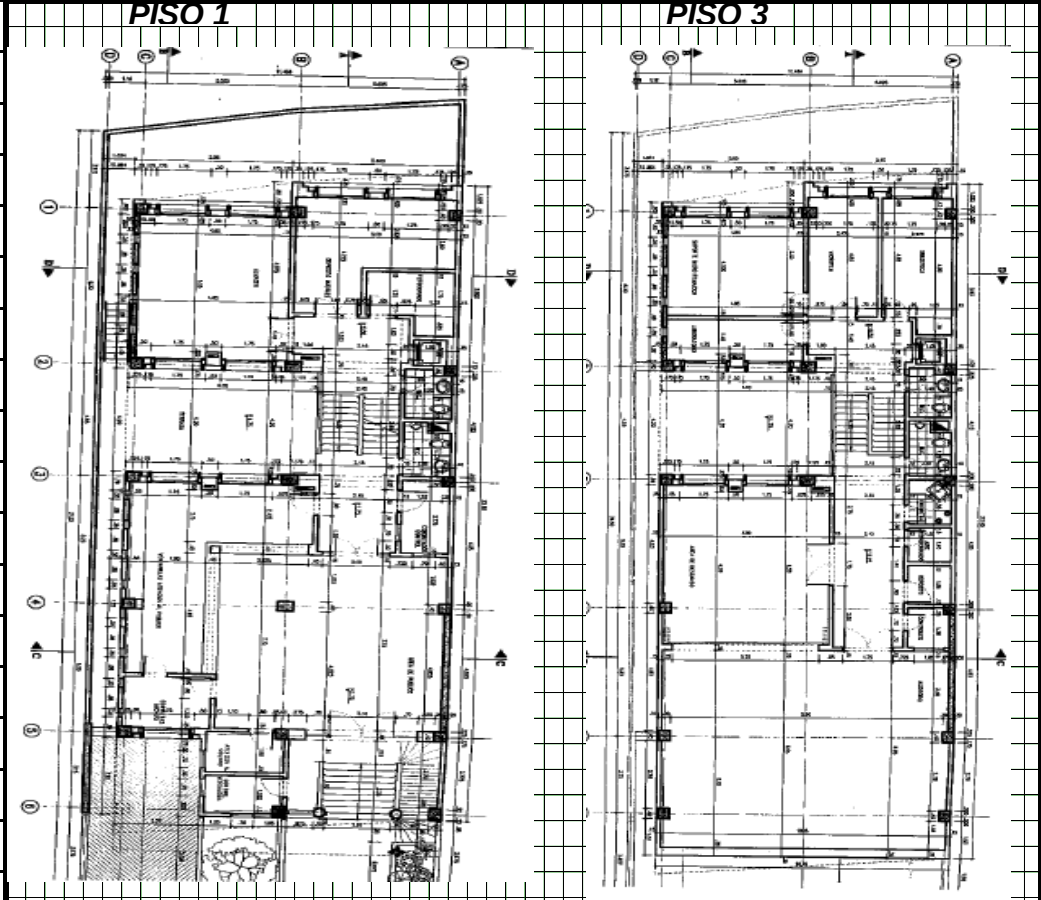


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** — FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 — **CONTRATISTA**


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC — **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 15,50 — **PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.** — **UNIDAD** un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| **Piso 1** | | | | | | | | | | - |
| Área de caja | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| **Piso 2** | | | | | | | | | | - |
| Juridica y oficina Registradora | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| **Piso 3** | | | | | | | | | | - |
| Juridica y Administrativa | | 4,00 | | | | | | | | 4,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| **Piso 4** | | | | | | | | | | - |
| Auditorio | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *10,00* |

**CROQUIS**

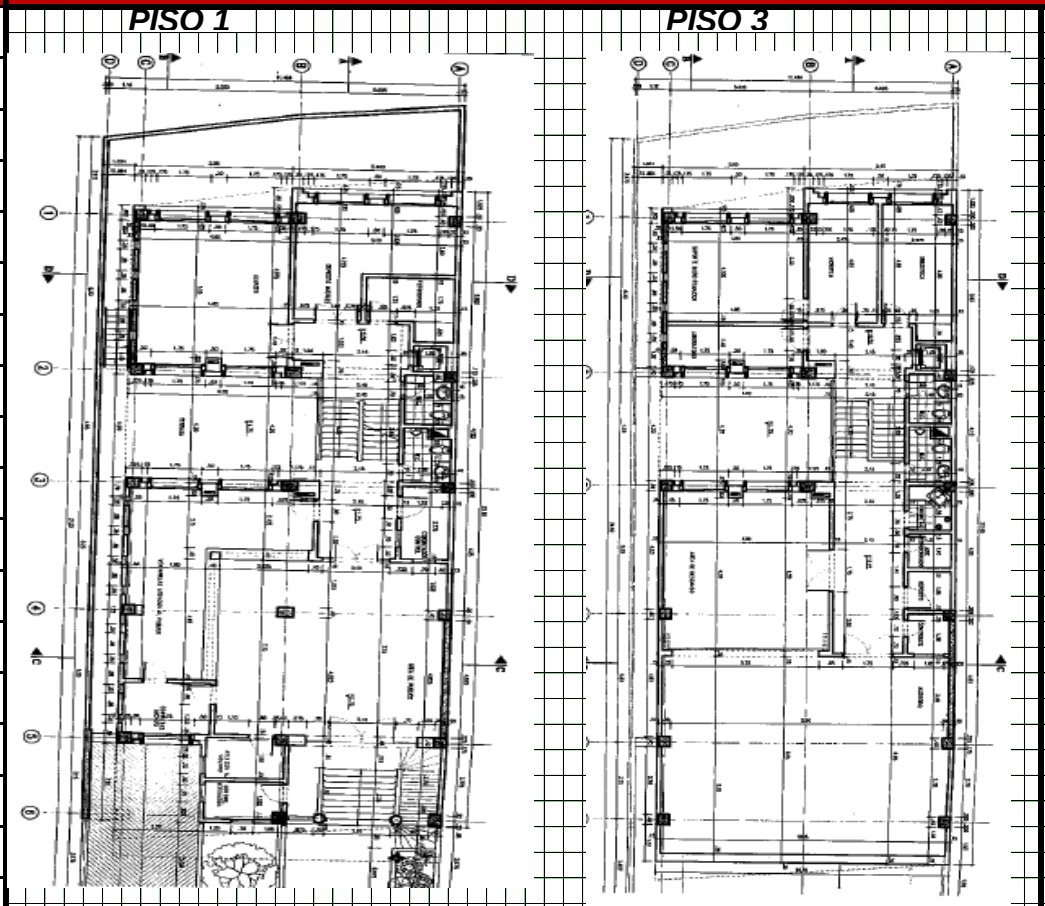


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** | FECHA | DIA | | MES | | AÑO | | HOJA No | | DE |

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 **CONTRATISTA**


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 16,19 **LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería** **UNIDAD** un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Baño P1 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Baño P2 | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| Baño P3 | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| Baño P4 | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *7,00* |

**CROQUIS**

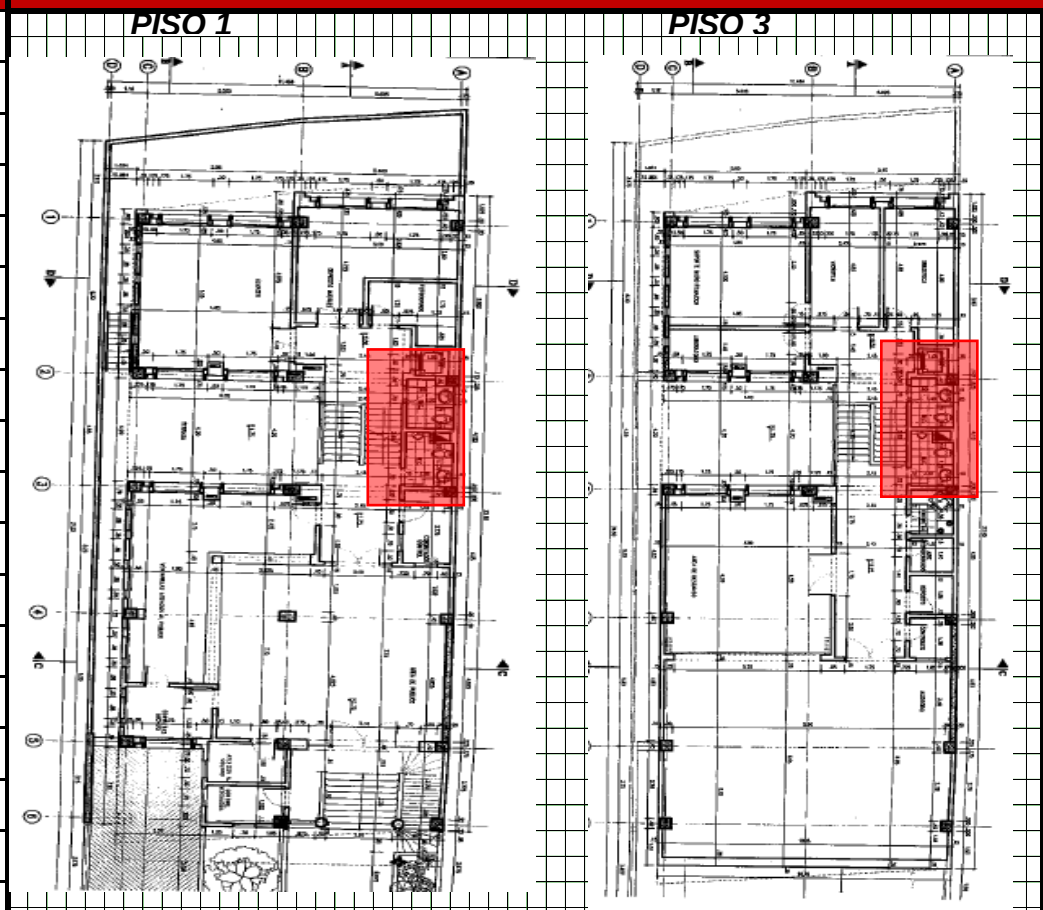


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 **CONTRATISTA**


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 16,21 LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS. Incluye Grifería **UNIDAD** un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Baño P1 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 1,00 |

**CROQUIS**

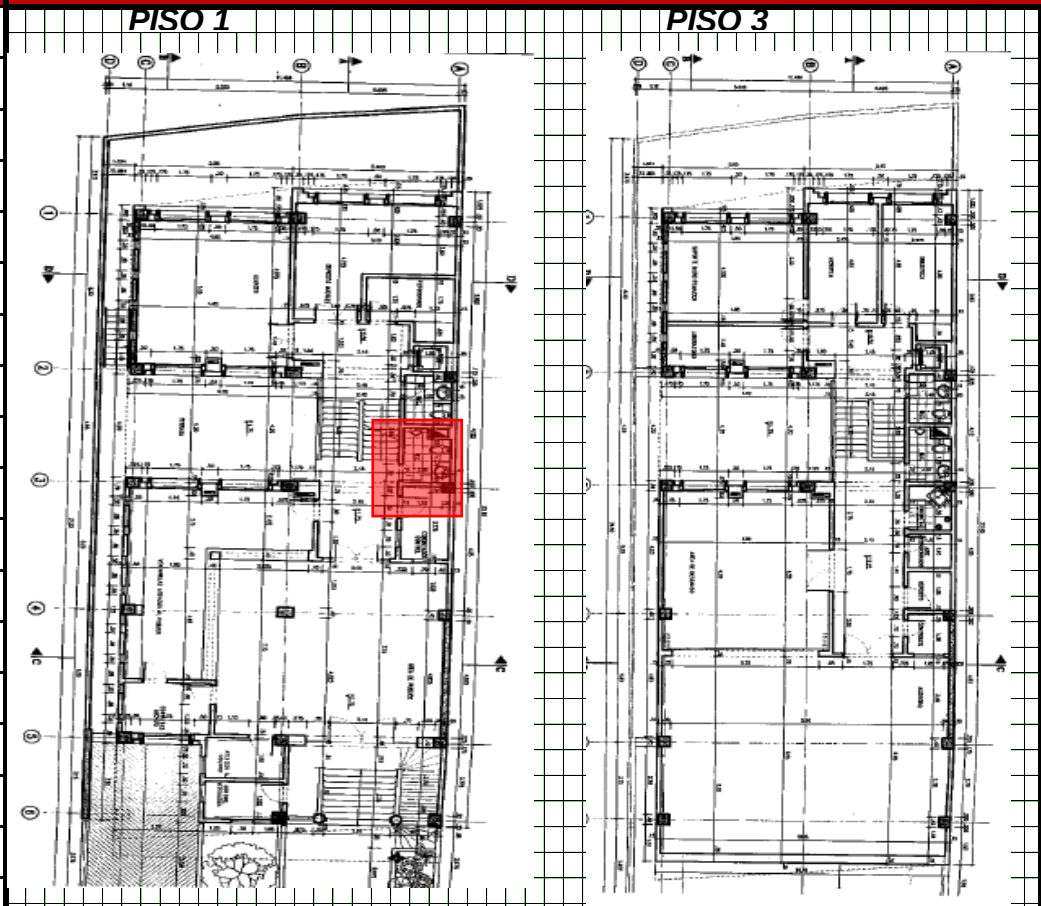


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| **VANESSA TAMAYO BERNAL**<br>**CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES** | **CARLOS VERGARA NEGRETE**<br>**INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC** |

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 **CONTRATISTA**


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 16,31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL CREMA MARFIL **UNIDAD** m

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Cocina P2 | | | 2,00 | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 2,00 |

**CROQUIS**

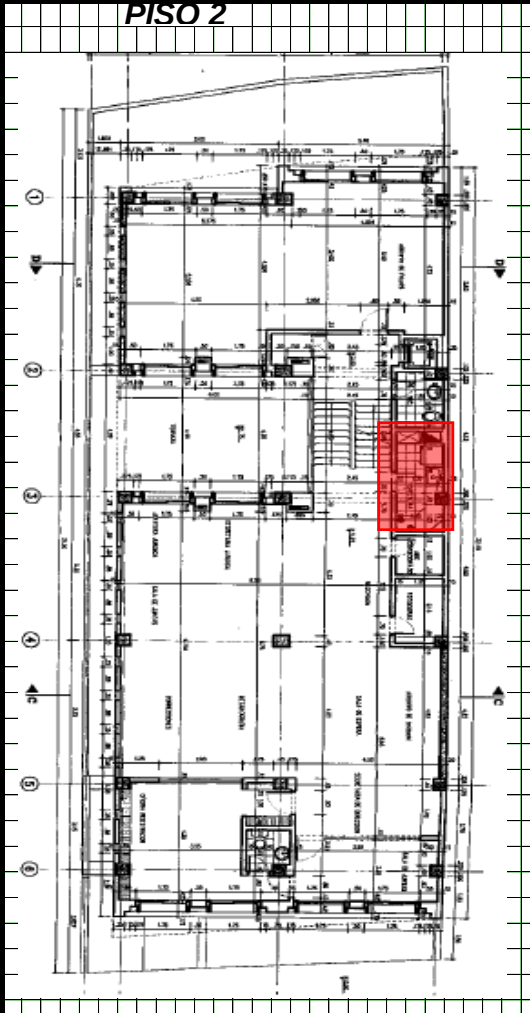


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |
|---|---|

**SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO** La guarda de la fe pública

**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**

**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**

**Versión: 01**

**Fecha: 11 - 08 - 2021**

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | | MES | | AÑO | | HOJA No | | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 **CONTRATISTA**


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 17,20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA **UNIDAD** m

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Baño P1 | | | 5,00 | | | | | | | 5,00 |
| Baño P2 | | | 5,00 | | | | | | | 5,00 |
| Baño P3 | | | 5,00 | | | | | | | 5,00 |
| Baño P4 | | | 5,00 | | | | | | | 5,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *20,00* |

**CROQUIS**

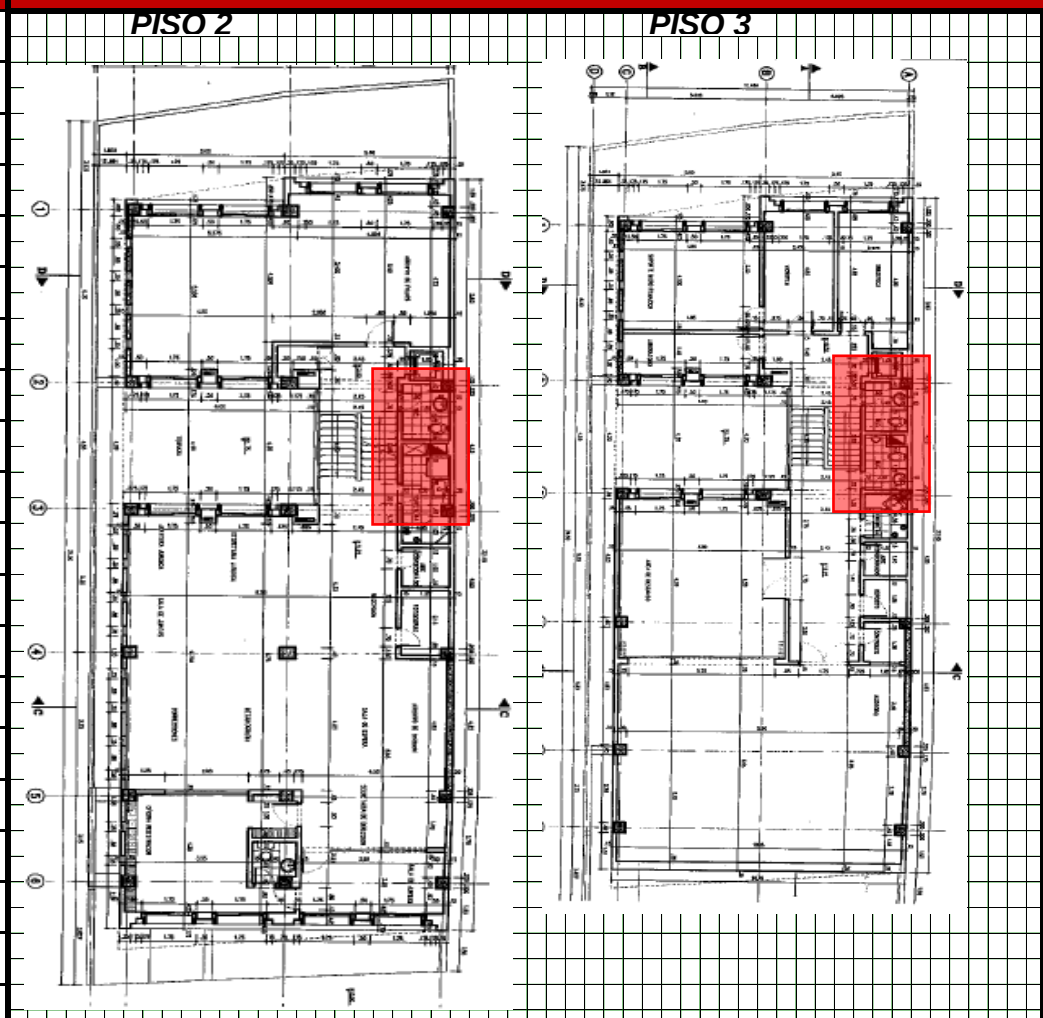


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

CONTRATO No. 2344 de 2024 | CONTRATISTA


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA: JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR: ELIANA BASTIDAS MADURO

ITEM: 17,19 SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | UNIDAD: m

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Bajantes fachada interna | | 2,00 | 5,00 | | | | | | | 10,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 10,00 |

CROQUIS

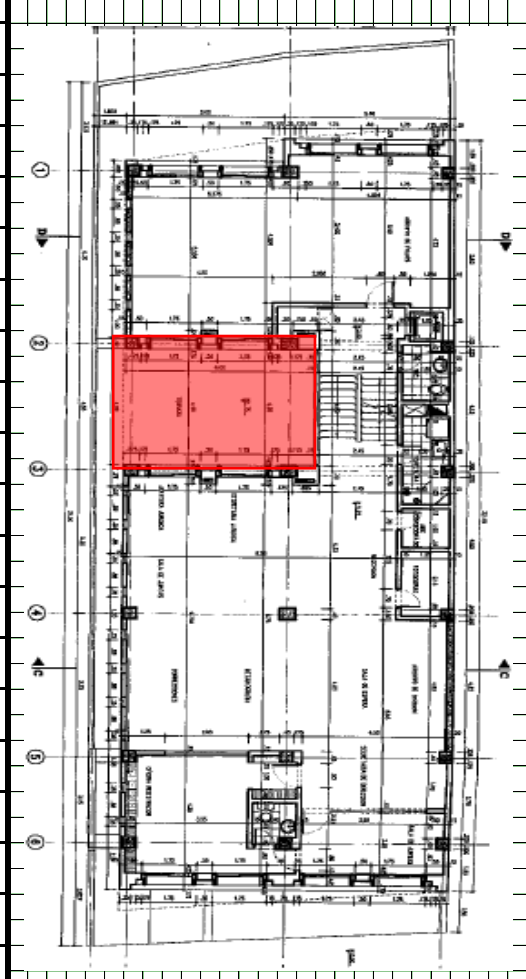


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC

| **SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO** La guarda de la fe pública | **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | **Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** |
|---|---|---|
| | **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | **Versión: 01** |
| | **FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** | **Fecha: 11 - 08 - 2021** |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

**FECHA** | **DIA** | | **MES** | | **AÑO** | | **HOJA No** | | **DE** |

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 **CONTRATISTA**

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**


**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 17,27 **SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.** **UNIDAD** un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Baño P1 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | ***1,00*** |

**CROQUIS**

*PISO 1* *PISO 3*

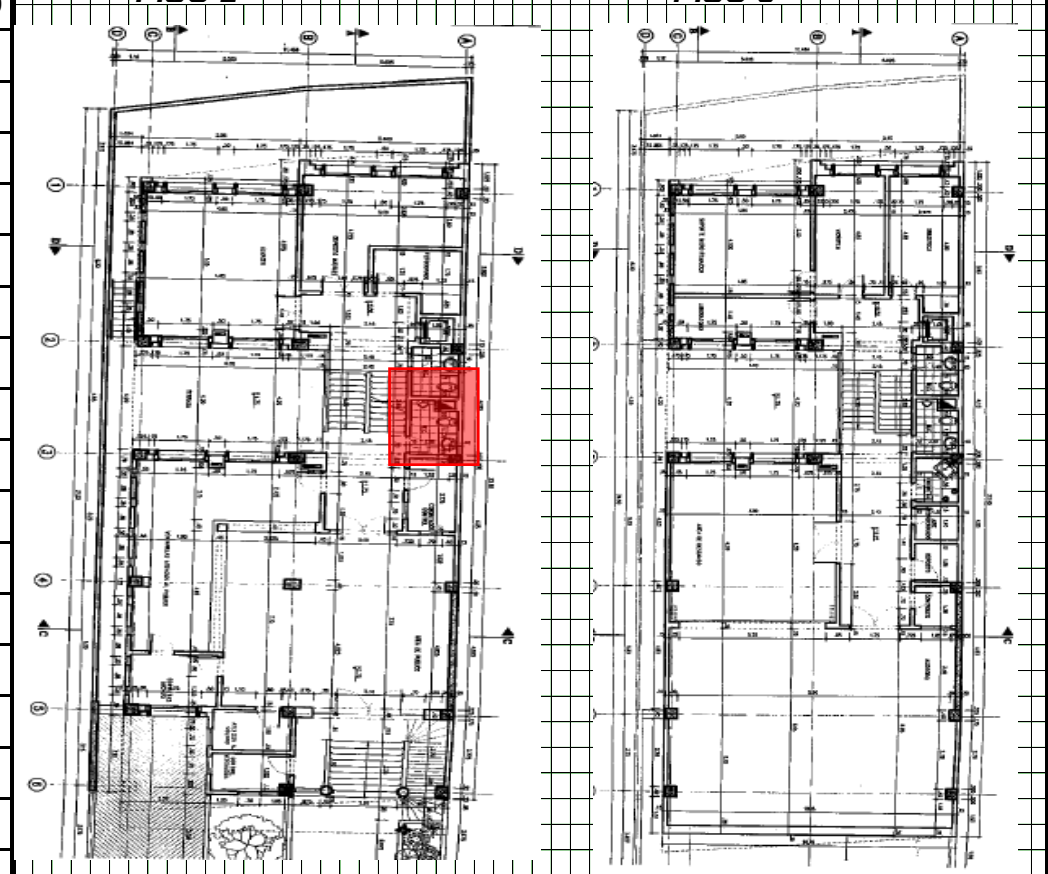

**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| [firma] **VANESSA TAMAYO BERNAL** **CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES** | [firma] **CARLOS VERGARA NEGRETE** **INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC** |

| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
|---|---|---|
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** | FECHA | DIA | | MES | | AÑO | | HOJA No | | DE |

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 **CONTRATISTA**


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 17,28 SANITARIO TIPO AHORRADOR **UNIDAD** un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS: CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS: L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baño P1 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Baño P2 | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| Baño P3 | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| Baño P4 | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 7,00 |

**CROQUIS**

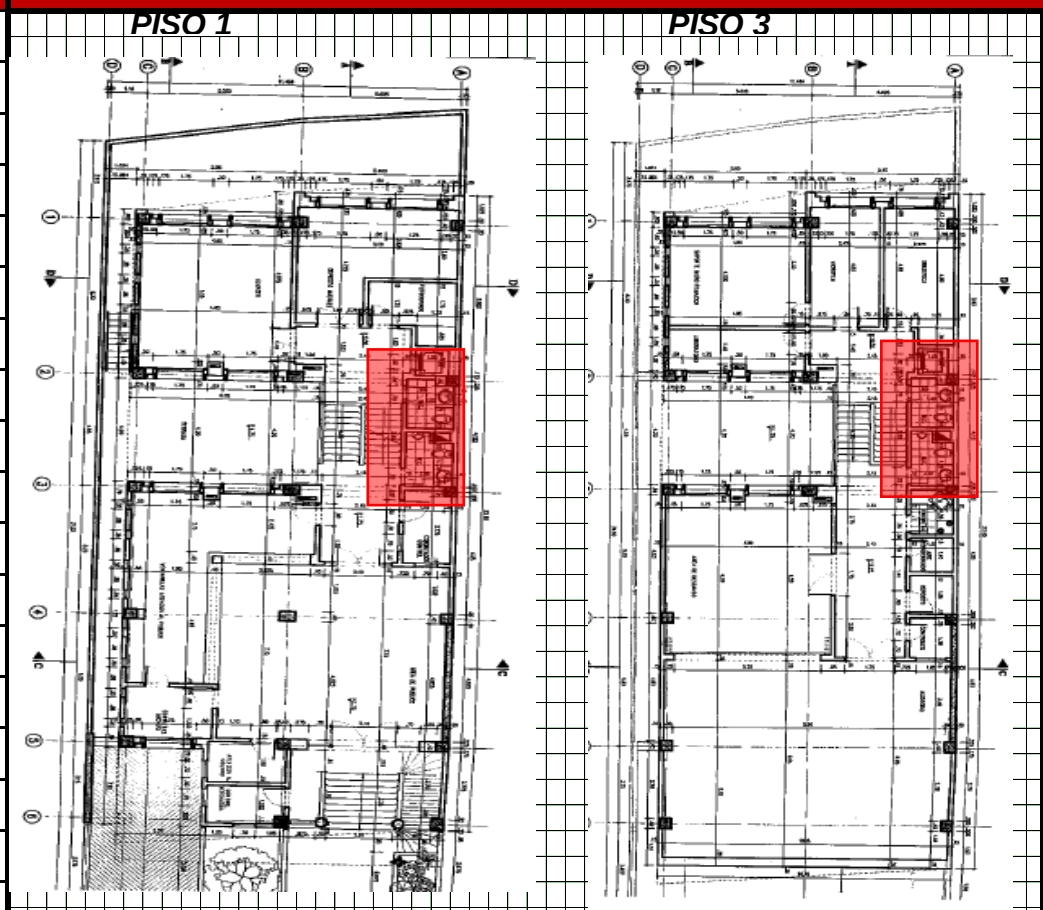


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA** — FECHA | DIA | MES | AÑO | HOJA No | DE

**CONTRATO No.** 2344 de 2024 — **CONTRATISTA**


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

**INTERVENTORIA** JVM INGENIERIA SAS BIC — **SUPERVISOR SNR** ELIANA BASTIDAS MADURO

**ITEM:** 17,28 SANITARIO TIPO AHORRADOR — **UNIDAD** un

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| Baño P1 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Baño P2 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Baño P3 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Baño P4 | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 4,00 |

**CROQUIS**

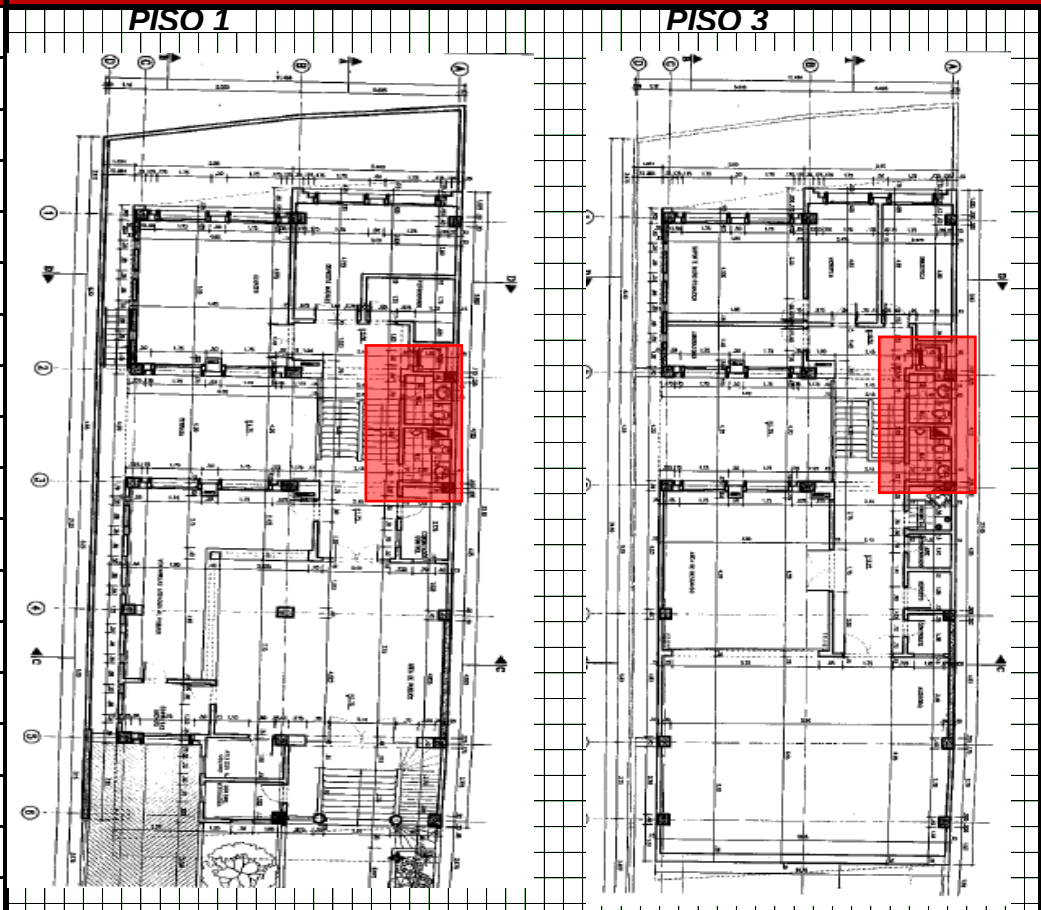


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| | |
|---|---|
| VANESSA TAMAYO BERNAL<br>CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES | CARLOS VERGARA NEGRETE<br>INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC |

# REGISTRO FOTOGRAFICO

| | | |
|---|---|---|
| | **INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC** | |


# REGISTRO FOTOGRÁFICO 90%
# SINCELEJO - SUCRE

| | | |
|---|---|---|
| | **INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC** | |

**REGISTRO FOTOGRAFICO SINCELEJO, SUCRE**
**CONTRATO DE INTERVENTORIA**

**Lugar:** Sincelejo, Sucre

**ORIP – SINCELEJO**

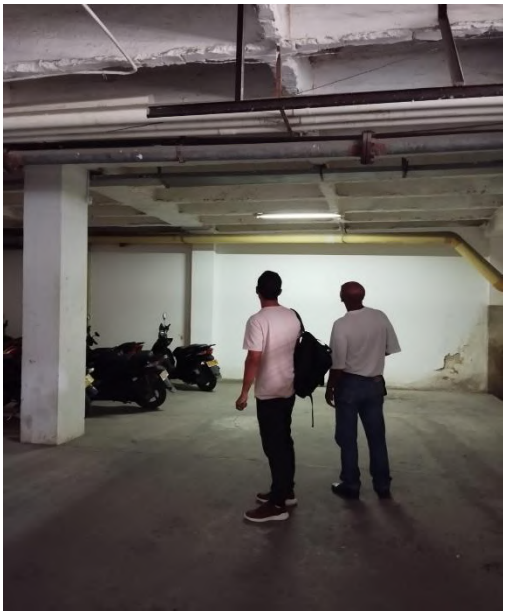




Descripción: Visita diagnostica en ORIP

Descripción: Visita diagnostica en ORIP






| | | |
|---|---|---|
| | **INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC** | |

| | |
|---|---|
| Descripción: Visita diagnostica en ORIP | Descripción: Visita diagnostica en ORIP |
|   |  |
| Descripción: Resanes y estuco. | Descripción: Resanes y estuco. |
|  |  |
| Descripción: Resanes y estuco. | Descripción: Resanes y estuco.. |


| | | |
|---|---|---|
| | **INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC**<br>JVM<br>INGENIERÍA S.A.S. BIC<br>NIT 901.489.956-3 | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Descripción: Proteccion de mobiliario | Descripción: Proteccion de mobiliario |
|  |  |
| Descripción: : Aplicación de pintura en muro. | Descripción: Aplicación de pintura en muro. |

| | | |
|---|---|---|
| | **INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC** | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Comentario: Aplicación de pintura en muro. | Comentario: Aplicación de pintura en muro. |
|  |  |
| Comentario: Aplicación de pintura en muro. | Comentario: Protección de mobiliario. |
|   |  |

| | | |
|---|---|---|
| | **INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC** | |
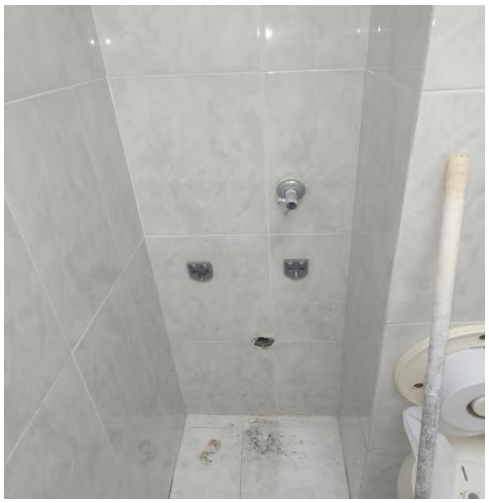
| | |
|---|---|
| Comentario: Suministro e instalacion de luminarias. | Comentario: Desmonote, suministro e instalacion de cielo raso. |
|  |  |
| Comentario: Desmonte de orinal en ORIP. | Comentario: Instalacion de orinal en ORIP. |
|  |  |
| Comentario: Desmonte de lavamanos en ORIP. | Comentario: Desmonte de lavamanos en ORIP. |

# BITACORA

• 09 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 12:00 p.m.
Sincelejo, Sucre
Clima: Nublado

Se realiza inspección de obra por parte de contratista e interventoria para arrancar obra.

• 10 Diciembre 2024.
Jornada laboral.: 8:00 a.m - 6:00 p.m.
Sincelejo, Sucre.
Clima: Parcialmente Nublado

Actividades de obra:
Desmonte de modulo de archivo Rodante
Protección de mobiliario.
Resanes en Auditorio 4to piso y zonas comunes Escaleras estuco interior en zonas antes mencionadas.

Herramientas: htas menores.
Personal de obra.: Oficial (1), Ayudante (1)

Observación: No aplica

Firmas:

Residente de obra  Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

11 Diciembre 2024
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:30 p.m.
Sincelejo, Sucre
Clima: Soleado.

Actividades de obra
Resanes y estuco interior en oficina administrativa 3er piso y zona comun de escaleras
Aplicación de vinilo tipo I en las zonas antes mencionadas

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: OFICIAL (1), Ayudante (2), profesional seguridad (1)

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra  Residente de interventoría.

12 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:30 p.m.
Sincelejo, Sucre.
Clima: Nublado

Actividad de obra:
Resanes y estuco interior en oficina administrativa 2do piso y zona comun de escaleras
Aplicación de vinilo tipo I en zonas antes mencionadas

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: OFICIAL (1), Ayudantes (1).

Observación: No aplica.

Powered by CamScanner

Firmas:

Residente de obra  Residente de interventoria.

- 13 Diciembre 2024.

Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:30 p.m.
Sincelejo, Sucre
Clima: Nublado.

Actividades de obra:
Resanes y estuco en zona de recepción, acceso a zonas comunes y zonas de escalera, de igual manera aplicación de vinilo tipo I, en muros de las áreas mencionadas.

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: oficial (1), Ayudante (1), P. seguridad (1).

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra  Residente de interventoria

- 14 Diciembre 2024

No se realizan labores por ausencia de vigilancia en ORIP.

- 15 Diciembre 2024.

No se realizan labores por ausencia de vigilancia en ORIP.

Powered by CamScanner

• 16 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:30 p.m.
Sincelejo. Sucre.
Clima: Soleado.

Actividades de obra:
Resanes y estuco interior en sotano y zonas comunes de escaleras, ademas de aplicación de vinilo tipo I en muros de las zonas mencionadas.

Herramientas: htas menores
Personal de obra: Oficial (1), Ayudante (1), P. seguridad (1)

Observación: no aplica.

firmas:

Residente de obra  Residente interventoria.

• 17 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:30 p.m.
Sincelejo, Sucre.
clima: Nublado.

Actividades de obra:
Desmonte de cielo raso
Suministro e instalación de cielo raso en areas de escales, archivo, y zona de aseo entre 4to y 3er piso.

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: Oficial (1), Ayudante (1), P. seguridad (1)

Observación: No aplica.

Powered by CamScanner

Firmas

Residente de obra  Residente interventoria.

- 18 Diciembre 2024

Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:30 p.m.
Sincelejo, Sucre
Clima: Nublado

Actividad de obra:
Desmonte de cielo raso en baños y zonas comunes entre 3er y 2do piso, ademas de oficinas de recepción. y Suministro e instalación en las zonas antes mencionadas

Herramientas: htas menores
Personal de obra: oficial (1), Ayudante (1), P. seguridad (1)

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra  Residente interventoria.

- 19 Diciembre 2024

Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:30 p.m.
Sincelejo, Sucre
Clima: Nublado.

Actividad de obra:
Desmonte e instalación de cielo raso en recepcion
Resane y estuco, aplicación de pintura en o. produccion
Desmonte de luminarias led y lamparas.
Suministro e instalación de luminarias led y led tipo tortuga, led redondas

Powered by CamScanner

Tapas de toma corriente
Suministro e instalación de interruptores enchufables 1x20A, 2x30A y Balanceo de tablero electrico.

Herramientas: htas menores
Personal de obra: OFICIAL (1), Ayudante (1), P. seguridad (1). electricos (2).

Observación: No aplica.

firmas:

Residente de obra Residente interventoría.

• 20 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 4:30 p.m.
Sincelejo, Sucre.
clima: Nublado

Actividad de obra:
Demolición de mueble en cocina (mesón)
Aseo general en ORFP
Desmonte, instalación de puntos de voz y datos

Herramientas: htas menores
Personal de obra: OFICIAL (1), Ayudante (1), electrico (2) P. seguridad (1).

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente interventoría.

Powered by CamScanner

• 21 Diciembre 2024
Jornada laboral: No se labora Pou motivos de Ausencia vigilancia en ORIP.

• 22 Diciembre 2024.

No se labora pou Ausencia vigilancia en ORIP.

• 23 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:00 p.m.
Sincelejo, Sucre.
Clima: Soleado.

Actividad de obra:
Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos.
Suministro e instalación de sanitarios y lavamanos.
Juego de incrustaciones, Orinal tipo gotta.

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: Oficial (1), Ayudante (4), P. seguridad (1).

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra  Residente interventoria.

Powered by CamScanner

24 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 3:00 P.M.
Sincelejo, Sucre
Clima: Soleado.

Actividad de obra.
Desmonte de puerta metalica
Desmonte de puerta en madera
Instación de soportes para Reja metalica
Suministro e instalación de Mesan en granito.

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: OFicial (1), Ayudante (1), P seguridad (1)

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra  Residente interventoria.

25 Diciembre 2024.

No se realizan Actividades.

Powered by CamScanner

• 26 Diciembre 2024
Jornada laboral: 8:00 a.m - 4:30 p.m.
Sincelejo, Sucre.
clima: Soleado.

Actividades de obra:
Suministro e instalación de Reja en parte exterior de ORFP.
Suministro e instalación de Lavaplatos en acero inoxidable.
Limpieza de tanque de tanque de agua
Sondeo y limpieza de bajante aguas lluvias, Red sanitaria.

Herramientas: htas menores.
Personal de obra: Carpintero (2). OFICIAL (1), Ayudante (1).
P. seguridad (1).

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra  Residente interventoría.

• 27 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:30 p.m.
Sincelejo: Sucre
Clima: Soleado.

Actividades de obra:
Demolición de enchape muro.
Demolición de pañete
Alistado de piso
Pañete muro
Suministro e instación mueble superior y Bajo meson en cafeteria.

Powered by CamScanner

Mantenimiento puerta en madera
Cerradura pomo en oficinas.
Cerradura de seguridad en oficina.

Herramientas: htas menores
Personal de obra: Carpintero (2), oficial (1). Ayudante (1)
P. seguridad (1).

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente interventoria.

- 28 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 5:00 p.m.
Sincelejo, Sucre.
clima: Soleado.

Actividades de obra:
Suministro e instalación de piso ceramico 20x20 cem
Suministro e instalación de ceramica 20x20 en muros
Boquilla para ceramica.
Aseo general de obra.

Herramientas: htas menores
Personal de obra: oficial (1), Ayudante (1), P. seguridad (1).

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente obra Residente interventoria.

Powered by CamScanner

• 29 Diciembre 2024.
jornada laboral: 8:00 a.m - 4:30 p.m.
Sincelejo. Sucre.
Clima: Nublado.

Actividades de obra.
Fachada lavado
Suministro e instalación de pintura premium maxima resistencia (2 manos)

Personal: Oficial (1), Ayudante (1), P. seguridad (1).
Herramientas: htas menores, Kit de protección en alturas.

Observación: No aplica.

Firmas:

Residente de obra Residente interventoria

• 30 Diciembre 2024.
jornada laboral: 8:00 a.m - 4:30 p.m.
Sincelejo. Sucre
Clima: Nublado

Actividades de obra
Suministro y aplicación de pintura premium maxima resistencia (3 manos).

Herramientas: htas menores, EPP para altura.
Personal de obra: Oficial (1), Ayudante (1). P. seguridad (1).

Observación: No aplica.

Powered by CamScanner

Firmas:

Residente de obra  Residente de ointerventoria

• 31 Diciembre 2024.
Jornada laboral: 8:00 a.m - 4:30 p.m.
Sincelejo, Sucre
Clima: Soleado.

Actividades de obra:
Aseo general en toda el area interna y externa de la ORIP.
Gestion y Disposición Final de escombros.

Personal de obra: oficial (1), Ayudante (2), P. seguridad (1)
Ing. Residente, Ing. residente interventoria.
Herramientas: htas menores

Observacion: Se culminan las actividades de obra en esta sede

Firmas:

Residente de obra  Residente interventoria.

Powered by CamScanner
