CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MIN-SS-003-2025

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL SECTOR LA SELVA Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA OVEJAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE EL COCUY

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Víctor Manuel Valbuena Padilla

PERIODO: 04 AGOSTO 2025 - 31 OCTUBRE DE 2025

CC 13927881

VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
Representante. Legal

CONTENIDO

INTRODUCCION 4

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 5

2. GENERALIDADES 5

2.1 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5

2.2 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 6

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 7

3.1 RELACION DE ACTAS DE OBRA E INTERVENTORIA 7

4. COMPONENTE TECNICO 7

4.1 AVANCE DEL PROYECTO 7

4.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 8

4.2.1 FRENTE DE OBRA SECTOR LA SELVA 8

4.2.1 FRENTE DE OBRA SECTOR OVEJAS NEGRAS 18

4.3 PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN 24

4.4 CALIDAD DE MATERIALES UTILIZADOS 26

5. COMPONENTE FINANCIERO 28

5.1 ACTA PARCIAL N°1 y N° 2 CONTRATISTA DE OBRA 28

5.2 ACTA PARCIAL N°1 CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 29

6. RELACIÓN DE PERSONAL 29

6.1 PERSONAL DE OBRA 29

6.1.1 PERSONAL TECNICO 29

6.1.2 PERSONAL OPERATIVO 30
6.1 PERSONAL DE INTERVENTORIA 30
6.1.1 PERSONAL TÉCNICO 30
7. RELACIÓN DE PÓLIZAS 31
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 31

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Tramos del proyecto 5
Ilustración 2. Avance de la ejecución 24
Ilustración 3. Avance en % programado y ejecutado. 25
Ilustración 4. Avance en $ programado y ejecutado 25

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación de actas suscritas obra e interventoría 7
Tabla 2. Relación de avances mensuales 26
Tabla 3. Relación resultados de laboratorios. 26
Tabla 4. Relación de pólizas de Obra. 31
Tabla 5. Relación de pólizas de interventoría 31

INTRODUCCION

En el marco del contrato de interventoría No. MIN-SS-003-2025, se presenta el Informe de cobro parcial de interventoría No. 1 correspondiente a las actividades ejecutadas durante el seguimiento al Contrato de obra No. CP-O-001-2025, cuyo objeto es "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL SECTOR LA SELVA Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA OVEJAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Este seguimiento corresponde al periodo comprendido desde el 04 de agosto del 2025 hasta el 31 de octubre del 2025. Se evidenciaron trabajos en: frente de obra SECTOR LA SELVA.

En el transcurso de este tiempo, el contratista de obra ejecutó en el frente de obra LA SELVA actividades de: desmonte y limpieza en zona no boscosa, localización y replanteo topográfico, excavaciones manuales en material común y conglomerado con entibados de madera, y rellenos compactados con material seleccionado. Incluyen el suministro e instalación de redes de alcantarillado en tubería PVC de distintos diámetros (4", 6", 8" y 24"), conexiones domiciliarias, cajas y pozos de inspección en varias dimensiones, con sus respectivas placas de fondo, tapas y accesorios. Se contemplan obras en concreto simple, reforzado e impermeabilizado (21 y 28 MPa), concreto ciclópeo, bases en concreto pobre, además del suministro y figurado de acero de refuerzo, y la ejecución de actividades asociadas a filtro francés.

En el frente de obra QUEBRDA OVEJAS NEGRAS se ejecutaron actividades tales como: desmonte y limpieza en zona no boscosa, localización y replanteo topográfico, excavaciones manuales en material común y conglomerado, y rellenos compactados con material seleccionado. Incluyen el suministro e instalación de redes de alcantarillado en tubería PVC de distintos diámetros (8" y 24"), pozos de inspección en varias dimensiones, con sus respectivas placas de fondo, tapas y accesorios. Se contemplan obras en concreto simple, reforzado e impermeabilizado (21 y 28 MPa), bases en concreto pobre, además del suministro y figurado de acero de refuerzo.

Adicionalmente se realizó el seguimiento a las actividades de obra, verificando se cumpla con la adecuada ejecución en cumplimiento de las especificaciones técnicas y calidad, se supervisó el cumplimiento de las normas de (SST) garantizando un entorno seguro para los trabajadores.

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO


El proyecto consiste en la intervención de dos tramos de alcantarillado en el casco urbano del municipio de El Cocuy

Los tramos a intervenir corresponden:

1. Sector La Selva
2. Sector Quebrada Ovejas Negras

En la Ilustración 1 se muestran los sectores objeto de intervención.

Ilustración 1. Tramos del proyecto

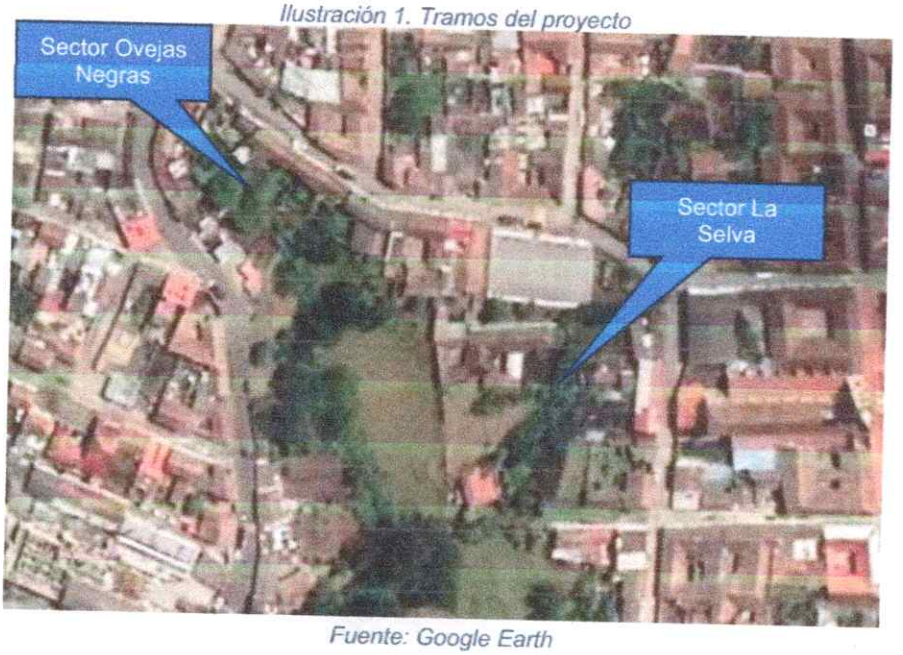

Fuente: Google Earth

2. GENERALIDADES

2.1 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	No. MIN-SS-003-2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL SECTOR LA SELVA Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO PARALELO A LA

	QUEBRADA OVEJAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA	VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA Rep. Legal VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
NIT	13927881
VALOR DEL CONTRATO	$ 23.090.760,00
VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS	VEINTITRÉS MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	04 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	4 MESES
PRORROGA NO. 1	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	03 DE DICIEMBRE DE 2025

2.2 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°	CP-O-001-2025
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL SECTOR LA SELVA Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA OVEJAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA	CONSORCIO ALCANTARILLADO EL COCUY – 2025 Rep. Legal LUIS ALEJANDRO MURCIA SALAMANCA
NIT	901.961.903-7
VALOR DEL CONTRATO	$395.903.673,86
VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	04 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	4 MESES

PRORROGA NO. 1	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	03 DE DICIEMBRE DE 2025

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1 RELACION DE ACTAS DE OBRA E INTERVENTORIA

A continuación, se relacionan las actas de obra e interventoría suscritas durante el periodo del presente informe.

Tabla 1. Relación de actas suscritas obra e interventoría

ACTAS INTERVENTORIA		
Tipo	**Descripción**	**Fecha**
General	Acta de inicio de Interventoría	04-08-2025
ACTAS OBRA		
Tipo	**Descripción**	**Fecha**
Financiero	Acta de legalización de anticipo	04-08-2025
General	Acta de inicio de Obra	04-08-2025
Técnico y financiero	Acta de fijación de ítems no previstos y de modificación de cantidades No. 1	20-08-2025
Técnico y financiero	Acta de recibo parcial No. 1	30-09-2025
Técnico y financiero	Acta de fijación de ítems no previstos y de modificación de cantidades No. 2	15-10-2025

Fuente: Interventoría, 2025

4. COMPONENTE TECNICO

4.1 AVANCE DEL PROYECTO

Este informe de interventoría hace referencia a la ejecución de las actividades de obra correspondientes al proyecto "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL SECTOR LA SELVA Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA OVEJAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ." en el periodo comprendido desde el 04 de agosto del 2025 hasta el 31 de octubre del 2025.

4.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS


A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe:

4.2.1 FRENTE DE OBRA SECTOR LA SELVA

a. Desmonte y limpieza en zona no boscosa (norma invias)



b. Localización y replanteo topográfico

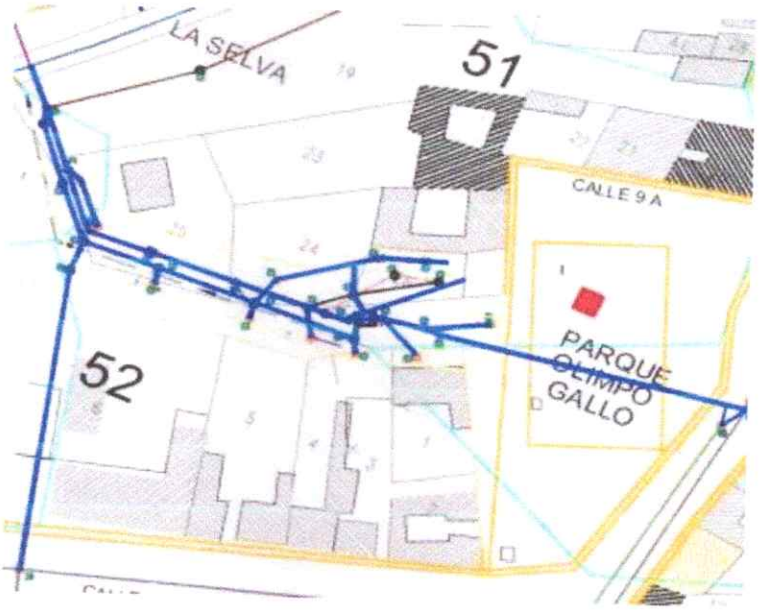

c. Excavación manual en material común




d. Entibados en madera para excavaciones 1 a 7 usos



e. Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC NOVALOC D= 24"




f. Cajas de inspección en ladrillo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m (no incluye tapa)

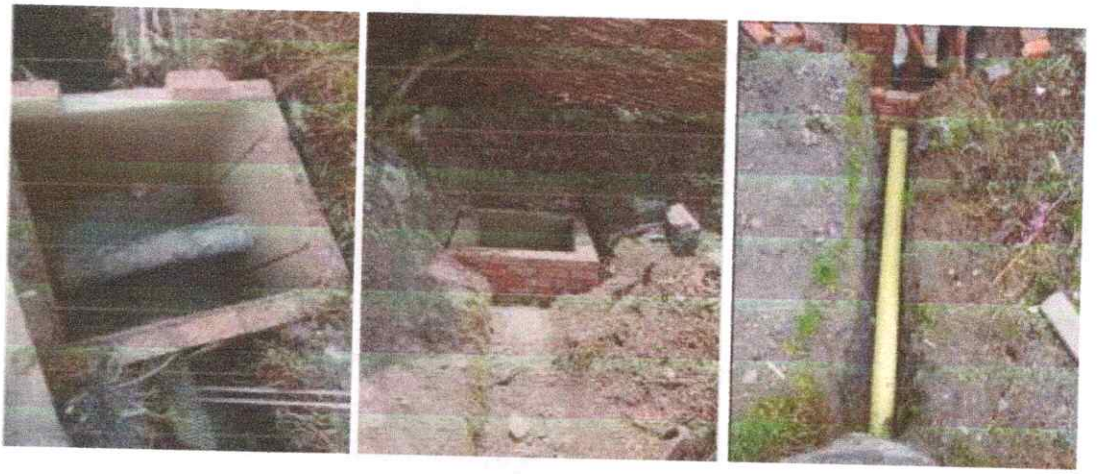



g. Concreto simple de 21 mpA - (3000 psi) impermeabilizado para tapas

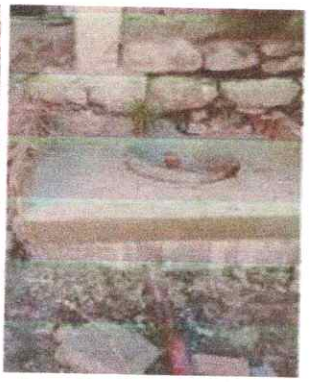h. Relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado con plancha vibradora






i. Pozo de inspección. diámetro interior 1.2 m (2.00 m < h < 2.50 m) (no incluye aro y tapa)



j. Suministro e instalación de aro y tapa en concreto prefabricado para pozo de inspección (d = 1.00 m)

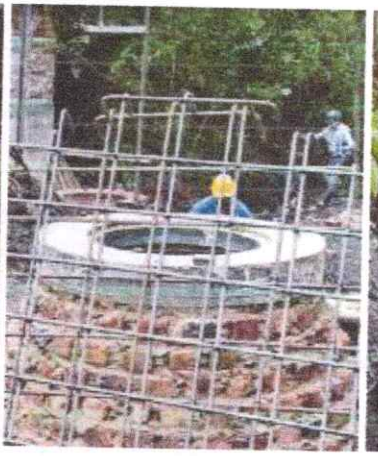




k. Placa de fondo o base en concreto de 28 mPA (4000 psi) para pozo de inspección d = 1.70 m



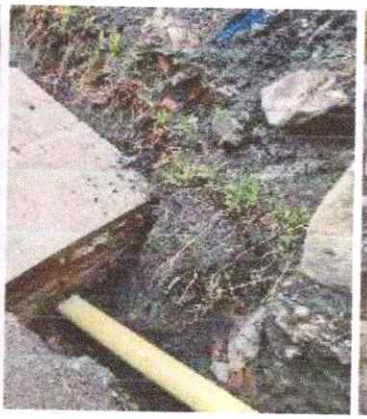

l. Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d= 6"



m. Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=8"



n. Base en concreto pobre de e = 0.05 m. 14 mpA - (2000 psi)




o. Demolición de muros en mampostería de ladrillo e = 0.25 m. (incluye retiro y acarreo libre hasta 5 km.)

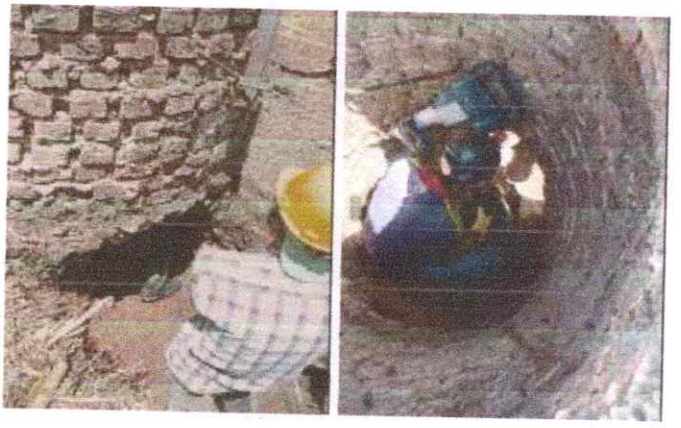

p. Pozo de inspección, diámetro interior 1.2 m. (1.00 m. < h < 1.50 m.). (no incluye aro y tapa).



q. Pozo de inspección, diámetro interior 1.2 m. (1.50 m. < h < 2.00 m.). (no incluye aro y tapa).

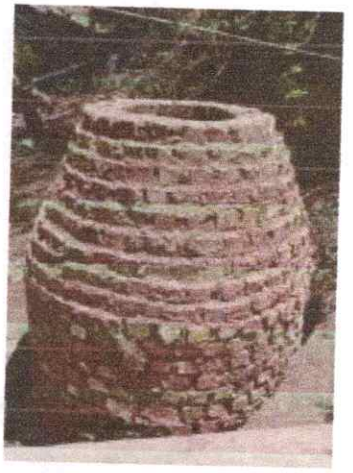

r. Pozo de inspección, diámetro interior 1.5 m. (2.50 m. < h < 3.50 m.). (no incluye aro y tapa).




s. Corte árbol (incluye detoconamiento de raices). h > 3.0 m. (incluye retiro y acarreo libre hasta 5 km.)



t. Excavación manual en material conglomerado.



u. Concreto ciclópeo de 21 mpA (3000 psi) relación 60c/40p

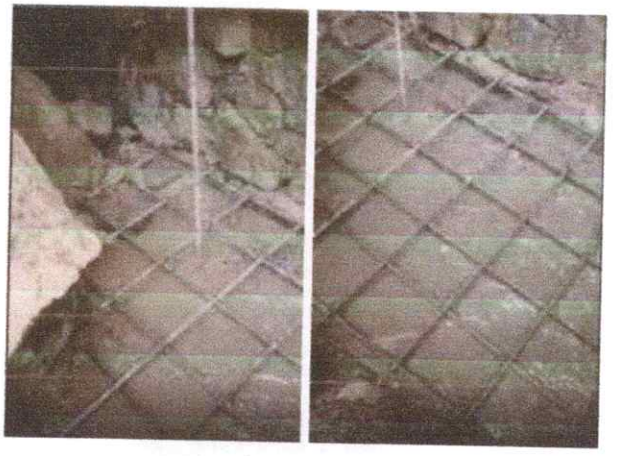


v. Tapa en concreto reforzado de 21 mPA. (3000 psi) impermeabilizado para tapa de 0.80*0.80



w. Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=4"




x. Suministro e instalación de aro-tapa en hf – tipo liviano

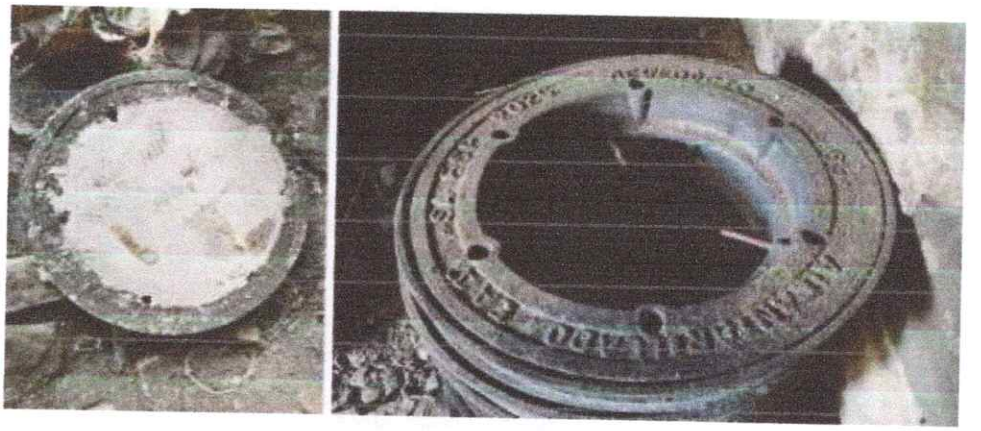

y. Concreto simple de 28 mpA - (4000 psi) impermeabilizado para muros




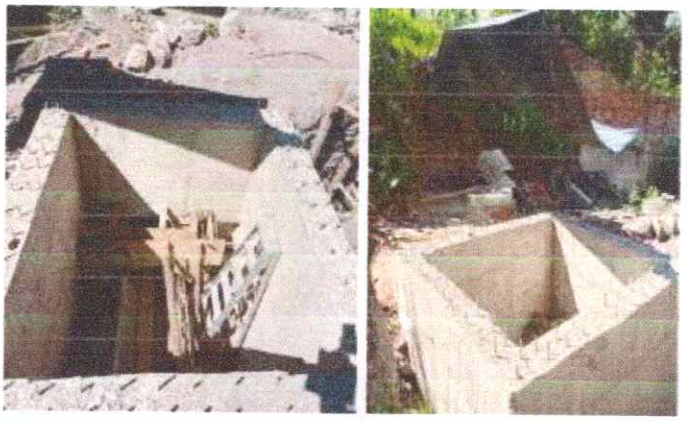

z. concreto simple de 28 mpA - (4000 psi) impermeabilizado para placas pisos




aa. suministro. figurada y amarre de acero de 420 mpA (60000 psi)

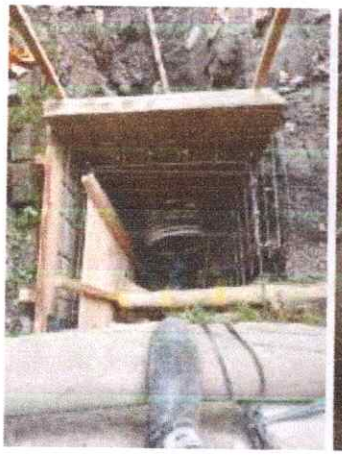





4.2.1 FRENTE DE OBRA SECTOR OVEJAS NEGRAS

a. Desmonte y limpieza en zona no boscosa (norma invias)

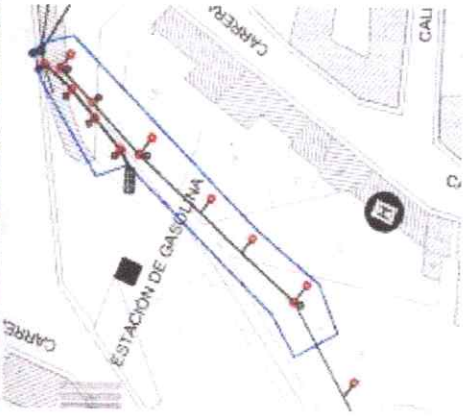b. Localización y replanteo topográfico

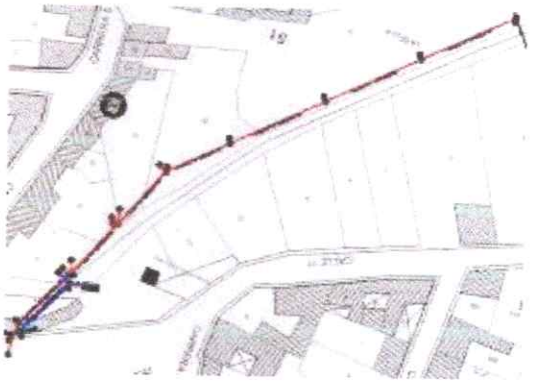

c. Excavación manual en material común



d. Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC NOVALOC D= 24"



e. Relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado con plancha vibradora



f. Concreto simple de 28 mpA - (4000 psi) impermeabilizado para muros



g. concreto simple de 28 mpA - (4000 psi) impermeabilizado para placas pisos



h. suministro. figurada y amarre de acero de 420 mpA (60000 psi)



i. Pozo de inspección. diámetro interior 1.2 m (1.50 m < h < 2.00 m) (no incluye aro y tapa)



j. Placa de fondo o base en concreto de 28 mPA (4000 psi) para pozo de inspección d = 1.70 m



k. Suministro e instalación tubería de alcantarillado pvc d=8"




l. Base en concreto pobre de e = 0.05 m. 14 mpA - (2000 psi)




m. Pozo de inspección, diámetro interior 1.2 m. (1.00 m. < h < 1.50 m.). (no incluye aro y tapa).



n. Pozo de inspección, diámetro interior 1.5 m. (2.50 m. < h < 3.50 m.). (no incluye aro y tapa).



o. Corte árbol (incluye detoconamiento de raices). h > 3.0 m. (incluye retiro y acarreo libre hasta 5 km.)



p. Excavación manual en material conglomerado.



q. Pozo de inspección, diámetro interior 1.2 m. (2.00 m. < h < 2.50 m.). (no incluye aro y tapa).




4.3 PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN

A la fecha de corte del presente informe se presenta un avance ejecutado acumulado del 84.52%, frente a un avance programado del 64.52%, lo que representa un adelanto en los trabajos del 20%. Este análisis se realiza teniendo en cuenta ajuste de programación de obra realizado por el contratista tras acta de fijación de ítems no previstos y modificación de cantidades.


A continuación, se visualiza el avance porcentual correspondiente:

Ilustración 2. Avance de la ejecución

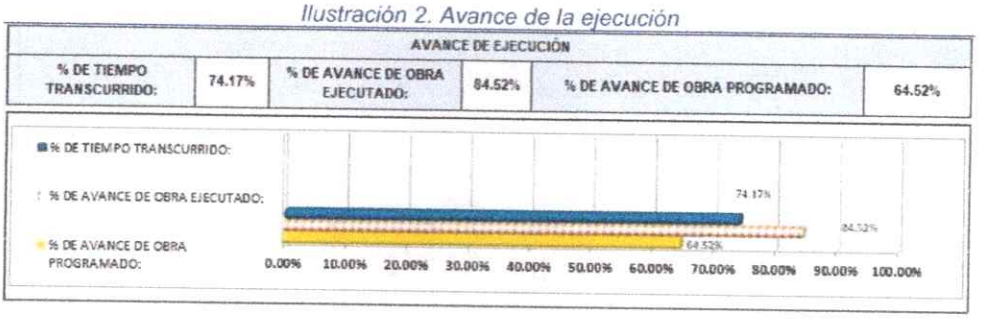


Fuente. Interventoría 2025

Ilustración 3. Avance en % programado y ejecutado.

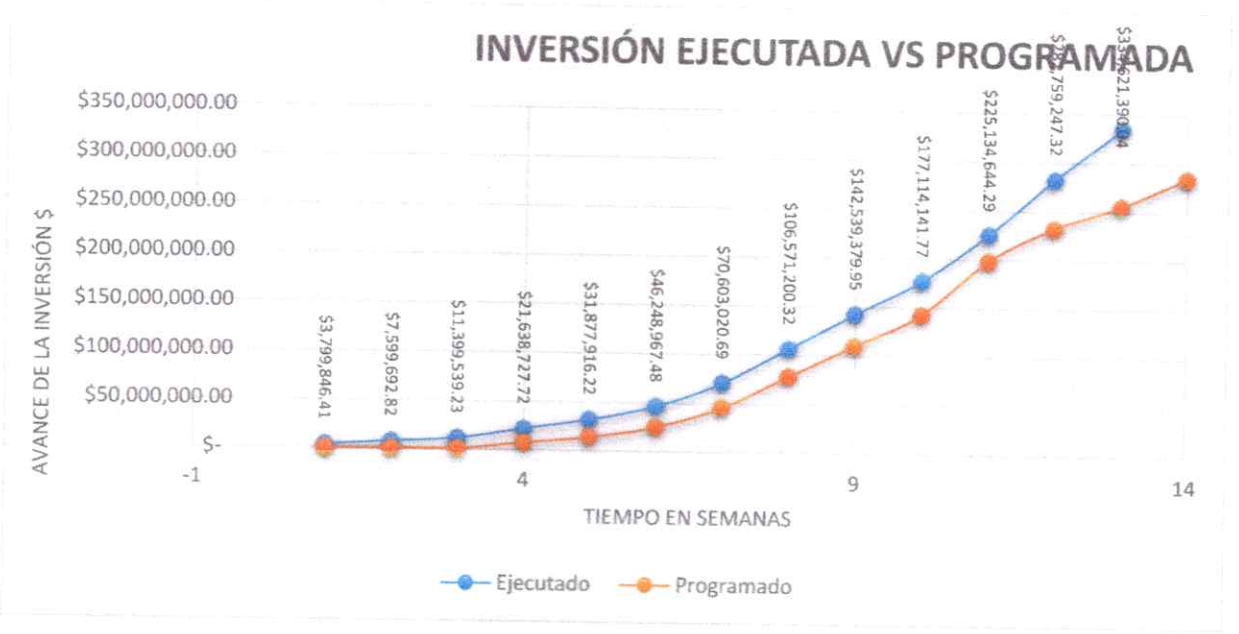

Fuente. Interventoría 2025

Ilustración 4. Avance en $ programado y ejecutado.

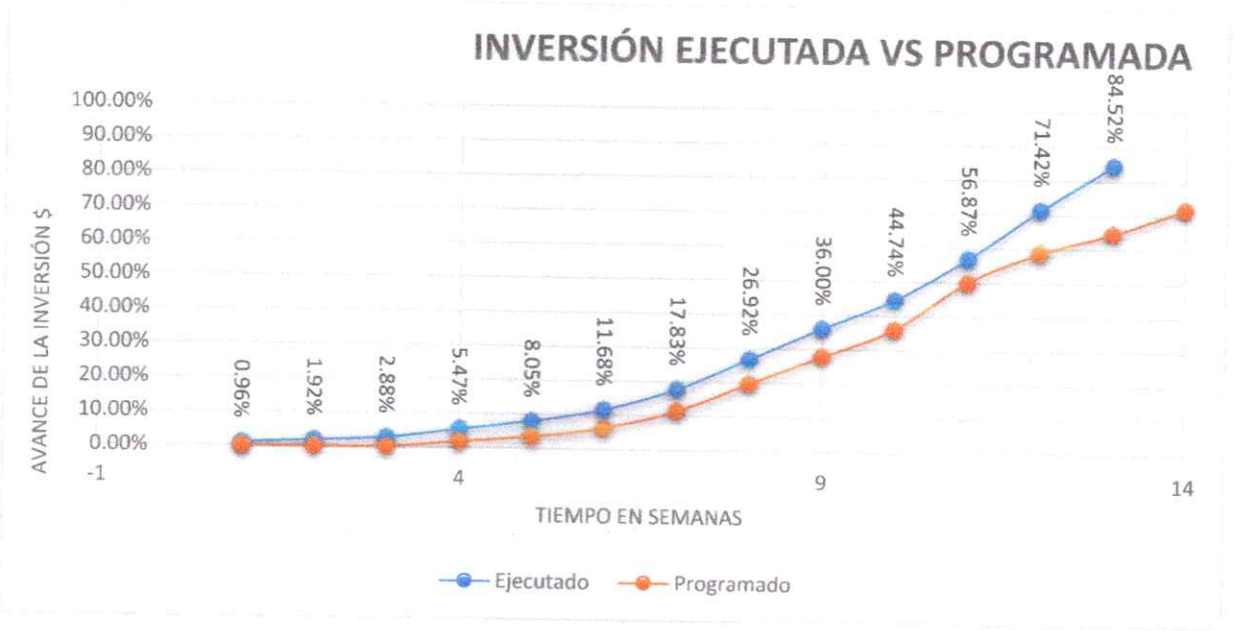

Fuente. Interventoría 2025

Tabla 2. Relación de avances mensuales

	EJECUTADO		PROGRAMADO	
MES	**% AVANCE**	**$ AVANCE**	**% AVANCE**	**$ AVANCE**
Agosto	5.47%	$ 21,638,727.72	1.83%	$ 7,251,455.87
Septiembre	30.54%	$ 120,900,652.23	27.83%	$ 102,916,562.42
Octubre (PARCIAL 2)	48.52%	$ 192,082,010.09	34.87%	$ 145,287,382.63
Acumulado	84.52%	$ 334,621,390.04	64.52%	$ 255,455,400.91

Fuente. Interventoría 2025

4.4 CALIDAD DE MATERIALES UTILIZADOS

Para el frente de obra objeto de cobro se realizó el suministro e instalación de tubería de alcantarillado de 24" – 8". Se verifica por parte de esta interventoría que las tuberías se encontraran contramarcadas con información de lote y cumplimiento de NTC aplicable.

a. *Verificación de lote y NTC aplicable en tuberías*

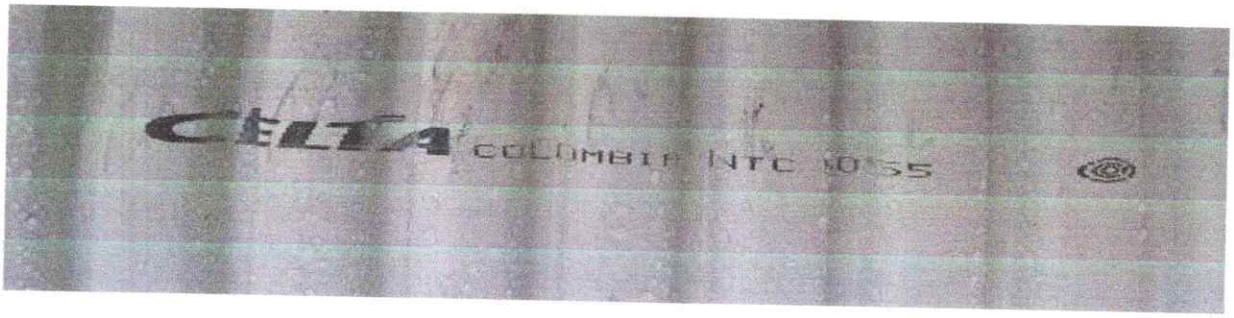


Tabla 3. Relación resultados de laboratorios.

MATERIAL Y DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS	REGISTRO FOTOGRAFICO	LABORATORIO
CONCRETOS Elaboración de especímenes de concreto (cilindros de concreto) Evaluación de resistencia a la compresión de concreto de senderos y rampas.		Pendiente fallo e informe de resultados.

Fuente. Interventoría, 2025.

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA DURAFORT ALCANTARILLADO

Fabricado por **CELTA S.A.S.** en la **Carrera 24 No. 30-500, Soledad, Atlántico, COLOMBIA**, identificada con **número de NIT 800.164.590-1**

Manufactured by **CELTA S.A.S.** in the **Carrera 24 No. 30-500, Soledad, Atlántico, COLOMBIA**, identificada con **número de NIT 800.164.590-1**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 5055 (2018)

Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) perfilados para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno

Poly(vinyl chloride) (PVC) profile gravity sewer pipe and fittings based on controlled inside diameter

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC - CER395916
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-17
Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2024-04-19
Last Expiration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2030-04-18
Next Expiration Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2024-10-11
Restoration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado.
ICONTEC, Calle 26 # 69-76, Torre 4 "Agpal" Centro Empresarial Delmonte, Bogotá D.C., Colombia

5. COMPONENTE FINANCIERO

El contrato de obra conto con anticipo. La inversión de este anticipo programada vs ejecutada se presenta a continuación:

CATEGORÍA	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN	DIFERENCIA
Personal Operativo	$ 19,974,320	$ 20,779,650	13.12%	$ 805,330
Personal Profesional	$ 11,085,303	$ 55,414,650	34.99%	$ 44,329,347
Materiales	$ 114,632,930	$ 70,980,271	44.82%	-$ 43,652,659
Equipos	$ 6,334,459	$ 6,490,215	4.10%	$ 155,756
Dotación y Gastos	$ 6,334,458	$ 4,696,684	2.97%	-$ 1,637,774
TOTAL	**$ 158,361,470**	**$ 158,361,470**	**100.00%**	$ 0

Si bien se evidencia un desfase entre lo ejecutado y lo programado, se ha verificado que la inversión de los recursos provenientes del anticipo se ha destinado a cubrir costos tanto directos como indirectos vinculados a la ejecución de la obra.

Esta asignación incluye gastos relacionados con actividades constructivas, adquisición de materiales, contratación de personal, así como costos administrativos, logísticos y de soporte técnico necesarios para el desarrollo del proyecto.

A la fecha se registra pago por conceptos de a un acta de avance, no obstante, durante el mes de octubre, el contratista radico documentación para el cobro de un acta parcial No. 2.

5.1 ACTA PARCIAL N°1 y N° 2 CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se representa la relación de cobro por el contratista de obra mediante acta parcial N°2 de acuerdo al valor del contrato y en el periodo de corte del presente informe:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 395,903,673.86
ANTICIPO	$ 158,361,469.54
ACTA PARCIAL NO 1 FACTURA	$ 142,539,379.95
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO PARCIAL 1	$ 57,015,751.98
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL 1	$ 85,523,627.97
ACTA PARCIAL NO 2 FACTURA	$ 192,082,010.09
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO PARCIAL 2	$ 76,832,804.04

VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL 2	$ 115,249,206.05
VALOR POR COBRAR	$ 61,282,283.82
VALOR POR COBRAR CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	$ 36,769,370.30
ACTA PARCIAL NO 1 FACTURA	36.00%
ACTA PARCIAL NO 2 FACTURA	48.52%
% POR COBRAR	15.48%
ANTICIPO	40.00%
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	33.81%

5.2 ACTA PARCIAL N°1 CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

A continuación, se representa la relación de cobro por el contratista de interventoría mediante acta parcial N°1 equivalente al 80% del valor del contrato y en el periodo de corte del presente informe:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 23,090,760.00
ACTA PARCIAL NO 1 FACTURA	$ 18,472,608.00
VALOR POR COBRAR	$ 4,618,152.00
ACTA PARCIAL NO 1 FACTURA	80%
% POR COBRAR	20%

6. RELACIÓN DE PERSONAL

6.1 PERSONAL DE OBRA

6.1.1 PERSONAL TECNICO

Nombre Completo	Cargo/Función en el Proyecto	Profesión/Título	T.P. N° / Licencia N°	% de Dedicación
LUIS ALEJANDRO MURCIA SALAMANCA	Ingeniero director de Obra	Ingeniero Civil - Esp. en Sistemas Hídricos Urbanos	**2520281260 CND**	**30%**
OSCAR JAVIER GARCÍA JÁCOME	Ingeniero Residente de Obra	Ingeniero Civil - Esp. en Aguas y Saneamiento Ambiental	**25202119039 CND**	**100%**
ISABEL TERESA CHAVES SAAVEDRA	Ingeniera Ambiental	Ingeniera Ambiental y Sanitaria - Esp. en Gerencia de Proyectos	**25260179089 CND**	**25%**
JOAQUIN ALONSO PALACIO CARO	Topógrafo	Topógrafo - Esp. en Sistemas de Información Topográfica	**01-1318 (Licencia Profesional)**	**50%**

Nombre Completo	Cargo/Función en el Proyecto	Profesión/Título	T.P. N° / Licencia N°	% de Dedicación
PAULA ANDREA MEDINA OJEDA	SISOMA (Seguridad, Salud y Ambiente)	Ing. Ambiental - Esp. en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo	**25238-363408 CND (Ing. Ambiental) / Licencia SST 9392**	**50%**

6.1.2 PERSONAL OPERATIVO

Nombre Completo	C.C. N°	Cargo/Clasificación
PABLO LEONEL MURCIA	**79.138.945**	Maestro de Obra
CARLOS NAVARRETE	**4.113.332**	Oficial de Construcción
LUIS JESÚS SALCEDO	79.785.501	Oficial de Construcción
JULIAN ANDRES LOZANO RICO	1.002.300.446	Ayudante de Obra
INDALECIO CAMACHO DAZA	4.113.283	Ayudante de Obra
DAIR YOANY BAUTISTA CÓRDOBA	1.055.988.371	Ayudante de Obra

6.1 PERSONAL DE INTERVENTORIA

6.1.1 PERSONAL TÉCNICO

Nombre Completo	Cargo/Función en el Proyecto	Profesión/Título	T.P. N° / Licencia N°	% de Dedicación
JAIRO ANTONIO GARAVITO	Ingeniero director de Interventoría	Ingeniero Civil - Esp. en Gerencia de obras	**25202085581 CND**	**10%**
EDWAR MESIAS CASAS	Ingeniero Residente de Interventoría	Ingeniero Sanitario - Esp. en Recursos Hídricos	**15237232397 BYC**	**40%**
LUIS ALEJANDRO MORENO	Ingeniero Residente auxiliar	Ingeniero Civil	**15238-352467BYC**	**NA**

Se realiza la verificación de planillas de seguridad social del personal propuesto (técnico) y operativo. También se verifica en campo el uso apropiado de EPPs.



7. RELACIÓN DE PÓLIZAS

Las pólizas se encuentran debidamente actualizadas de acuerdo a el acta de inicio:

Tabla 4. Relación de pólizas de Obra.

OBRA				
CONCEPTO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	NO. DE PÓLIZA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/08/2025	05/07/2026	$ 39.590.368,00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. BY-11-44-101260829 Anexo 3
PRESTACIONES SOCIALES	04/08/2025	05/12/2028	$ 39.590.368,00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/06/2025	03/06/2030	$ 79.180.735,00	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	04/08/2025	05/07/2026	$ 158.361.470,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	04/08/2025	05/12/2025	$ 284.700.000,00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 11-40-101080974 Anexo 2

Tabla 5. Relación de pólizas de interventoria

OBRA				
CONCEPTO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	NO. DE PÓLIZA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/08/2025	04/04/2026	$ 4.618.152,00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 39-44-101174261 Anexo 2
CALIDAD DEL SERVICIO	04/08/2025	05/12/2030	$ 2.309.076,00	

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El porcentaje de avance ejecutado (84.52%) supera el avance programado (64.52%), lo que indica una ejecución por encima de lo previsto.

El contratista acato la recomendación descrita respecto al inicio y avance de actividades de obra en el frente de quebrada Ovejas Negras. Lo cual permitió reducir la brecha de

tiempo transcurrido (74.17%) y avance físico (84.52%). Esto contribuyó a mejorar el ritmo de ejecución general, optimizando el uso del tiempo contractual restante y reduciendo el riesgo de acumulación de retrasos en etapas posteriores.

El porcentaje de cobro de interventoría corresponde al 80% de ejecución, esto de acuerdo a las clausulas contractuales.

Las obras se han ejecutado de acuerdo a buenas prácticas constructivas y se han implementado materiales con calidad certificada.

El personal de obra se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social y cuenta con dotación acorde a la actividad.

cc 13927881

VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
EL COCUY - BOYACÁ
OCTUBRE - 2025

Espacio para
Logo Corporativo

VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
NIT 13.927.881-9
CR 41 2 C 189 BRR VILLA MARIA
Tel: (031) 3112616811
Pacho - Colombia
victor.valbuena@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FEV 455

Señores	MUNICIPIO DE EL COCUY		
NIT	891.857.844-0	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	El Cocuy - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2025, 11:43
Expedición	18/11/2025, 11:44
Vencimiento	18/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL SECTOR LA SELVA Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA OVEJAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. CONTRATO N° MIN-SS-003- 2025	1.00	18,472,608.00

Total items: 1

Valor en Letras: Dieciocho millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos ocho pesos m/cte

Total Bruto	15,993,600.00
IVA 19%	3,038,784.00
Retefuente 3.5%	559,776.00
Total a Pagar	18,472,608.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 18,472,608.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764070655337 aprobado en 20240514 prefijo FEV desde el número 451 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 25%
CUFE: 279f1a19e6e962409125a2804888462fa6c8979024a5f3aea4fb9f0921b47281648cd7597528bc5f9b0b87b408501987

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

69

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA identificado(a) con CC 13927881 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494241552	1920569941	Y	2025-11-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9	X																
9494241552	1920569941	Y	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9	X																
9494241552	1920569941	Y	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9	X																
9494241552	1920569941	Y	2025-11-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9	X																

Este certificado se expide el día 2025-11-13 a las 14:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EDWARD MESIAS CASAS GARCIA identificado(a) con CC 1049615941 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9491255414	1743391632	E	2025-09-01	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9491255414	1743391632	E	2025-09-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491255414	1743391632	E	2025-09-01	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491255414	1743391632	E	2025-09-01	CCF	CCF10	COMFABOY	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	

Este certificado se expide el día 2025-11-10 a las 09:11.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927681
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 41 2C 189 BARRIO VILLA MARIA	TELÉFONO:	7400002
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de apoyo a la agricultura.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICC		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7982166254		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	agosto	AÑO 2025
DIAS DE MORA:		35					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/23		NUMERO AUTORIZACIÓN:			1872099435

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 15.200	$ 400	$ 15.600
SUBTOTALES:										**$ 15.200**	**$ 400**	**$ 15.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.900	$ 0	$ 300	$ 0	$ 11.900	$ 300	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES:													**$ 11.900**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 12.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.400	$ 2.400	$ 100	$ 0	$ 2.500
SUBTOTALES:									**$ 2.400**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 2.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927881
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCION:	CARRERA 41 2C 189 BARRIO VILLA MARIA	TELEFONO:	7400002
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la agricultura.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7992159590	TIPO DE PLANILLA:			E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	septiembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaammdd):			2025/10/23	NUMERO AUTORIZACIÓN:			1872126542

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227.800	$ 500	$ 228.300
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 500**	**$ 228.300**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 178.000	$ 400	$ 0	$ 178.400
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 178.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 100	$ 0	$ 34.800
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 34.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	NOVEDADES: RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 13927881	VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	01																

SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	13927881	$ 34.700

PARAFISCALES DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 441.500

Planilla Pagada

13

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19375125
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRO ANTONIO GARAVITO TELLEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL50SUR #36-65	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7992907074**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1889326025	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 185.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 185.500**

Planilla Pagada

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **JAIRO ANTONIO GARAVITO TELLEZ** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **19375125** y número de Afiliación **919375125100**, esta Administradora mediante resolución No. **104856** de **2024** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03 Vitalicia** registrando fecha de ingreso a nómina **Abril** de **2024.**

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 02 de octubre de 2024.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

TUNJA, 14 de noviembre de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL COCUY

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
CC N° 13.927.881

Ha efectuado en forma oportuna y completa los aportes y demás obligaciones legales correspondientes al sistema de seguridad social integral, conforme a la normatividad vigente.

Para constancia, se firma la presente certificación.

CONTADOR PÚBLICO
YULY YANETH LOPEZ VEGA
1.118.533.029 DE YOPAL
T.P. No. 307754-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3B412E2803888E9ED

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YULY YANETH LOPEZ VEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118533029 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 307754-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

307754-T

YULY YANETH
LOPEZ VEGA
C.C. 1118533029
RES. INSCRIPCION 131 DEL 18/04/2023
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

357102 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 357187

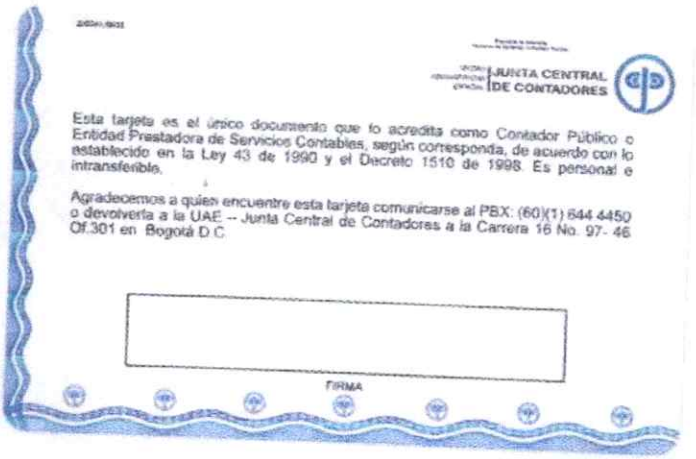


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE -- Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

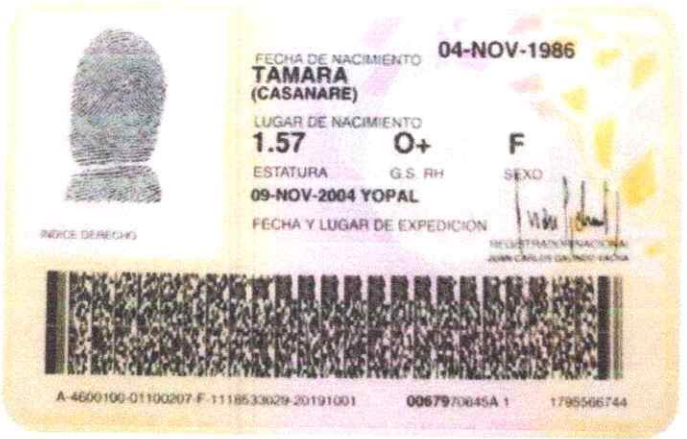

FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1986
TAMARA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-NOV-2004 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

A-4600100-01100207-F-1118533029-20191001 00679 70045A 1 1795566744



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.118.533.029
LOPEZ VEGA
APELLIDOS
YULY YANETH
NOMBRES
Yuly Yaneth Lopez Vega
FIRMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927881
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 41 2C 189 BARRIO VILLA MARIA	TELÉFONO:	7400002
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la agricultura,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7996322356	TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		69			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/25	NUMERO AUTORIZACIÓN:		1953848853
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		7982166254	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2025/10/23

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS							TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200	$ 0	$ 189.800	$ 8.200		$ 198.000
SUBTOTALES:										**$ 189.800**	**$ 8.200**		**$ 198.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.300	$ 0	$ 6.400	$ 0	$ 148.300	$ 6.400	$ 0	$ 154.700
SUBTOTALES:													**$ 148.300**	**$ 6.400**	**$ 0**	**$ 154.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.900	$ 28.900	$ 1.300	$ 0	$ 30.200
SUBTOTALES:									**$ 28.900**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 30.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																								PENSIÓN						SALUD							ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DAP	DAN	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13927881	VALBUENA PADILLA VICTOR MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO		02				A												25-14 COLPENSIONES	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 94.900	$ 11.900	$ 0	$ 11.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 94.900	513	$ 2.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 13927881	VALBUENA PADILLA VICTOR MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO	04	30				C												25-14 COLPENSIONES	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.281.150	$ 160.200	$ 0	$ 160.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.281.150	513	$ 31.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 13927881	VALBUENA PADILLA VICTOR MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO	04	30				R												25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.186.250	$ 148.300	$ 0	$ 148.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.186.250	513	$ 28.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 382.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 41 2C 189 BARRIO VILLA MARIA	TELÉFONO:	7400002
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la agricultura,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7982166254	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			36				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1872099435

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 15.200	$ 400		$ 15.600
SUBTOTALES:										**$ 15.200**	**$ 400**		**$ 15.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.900	$ 0	$ 300	$ 0	$ 11.900	$ 300	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES:													**$ 11.900**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 12.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.400	$ 2.400	$ 100	$ 0		$ 2.500
SUBTOTALES:									**$ 2.400**	**$ 100**	**$ 0**		**$ 2.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13927881	VALBUENA PADILLA VICTOR MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	02																25-14 COLPENSIONES	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 94.900	$ 11.900	$ 0	$ 11.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 94.900	513	$ 2.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 30.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927881
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 41 2C 169 BARRIO VILLA MARIA	TELÉFONO:	7400002
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la agricultura,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7992159957	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			4		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	195360218

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 227.800	$ 600		$ 228.400
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 600**		**$ 228.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 178.000	$ 500	$ 0	$ 178.500
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 178.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 100	$ 0		$ 34.800
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 100**	**$ 0**		**$ 34.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD					ARP					PARAFISCALES						
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13927881	VALBUENA PADILLA VICTOR MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 13927681	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 441.700

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13927881
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 41 2C 189 BARRIO VILLA MARIA	TELÉFONO:	7400002
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la agricultura,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7992159590	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/23	NUMERO AUTORIZACIÓN:			1872125542

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227.800	$ 500	$ 228.300
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 500**	**$ 228.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 178.000	$ 400	$ 0	$ 178.400
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 178.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 100	$ 0	$ 34.800
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 34.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13927881	VALBUENA PADILLA VICTOR MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 13927881	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 441.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118548789
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALEJANDRO MORENO NUMPAQUE MORENO NUMPAQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	TRAV 16D 32A 64	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7996345471	TIPO DE PLANILLA	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1953934716

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118548789	MORENO NUMPAQUE LUIS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO	01	31															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	111854878	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada

ALEJANDRO

Tunja 27 de noviembre de 2025

ENV.004 27-11-25

Ingeniero
JUAN CARLOS URREA CUADROS
Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Carrera 3 # 8-36, Segundo Piso
Municipio de El Cocuy – Boyacá

Referencia: Contrato N° MIN-SS-003-2025. REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL SECTOR LA SELVA Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA OVEJAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Asunto: Respuesta a oficio – Pago de seguridad social

Respetado ingeniero,

En atención a la solicitud presentada respecto al ajuste de las planillas integradas de aportes a la seguridad social, me permito exponer el marco normativo aplicable y la metodología correcta para la determinación del Ingreso Base de Cotización (IBC), teniendo en cuenta que mi vinculación corresponde a un contrato diferente a la prestación de servicios personales.

El artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 establece expresamente que:

> *"Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales con* ***ingresos netos*** *iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente* ***efectuarán su cotización mes vencido, sobre una base mínima de cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos****, sin incluir el valor del IVA."* (Negrita y cursiva fuera de texto).

Asimismo, la UGPP expidió la Resolución 209 de 2020, mediante la cual fijó los porcentajes de presunción de costos aplicables de acuerdo con la actividad económica del contratista. Estos porcentajes permiten determinar el **ingreso neto**, entendido como el valor mensualizado del contrato menos los costos presuntos definidos por la UGPP cuando corresponda.

Una vez determinado el ingreso neto, el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 obliga a calcular el IBC sobre el 40% de dicho ingreso neto. En aplicación de lo anterior, el cálculo es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	23,090,760.00
VALOR INGRESOS BRUTOS DEL CONTRATO (SIN IVA)	$	19,404,000.00

Dirección: Diag. 63 B N 3-47
Teléfono: 3125343871
Email: lamn.moreno@gmail.com

VALOR INGRESOS BRUTOS MENSUALIZADOS	$	4,851,000.00
PRESUNCION DE COSTOS (RES 209/2020 UGPP)		61.90%
COSTOS PRESUNTOS DEL CONTRATO	$	12,011,076.00
VALOR COSTOS PRESUNTOS MENSUALIZADOS	$	3,002,769.00
VALOR INGRESOS NETOS DEL CONTRATO	$	7,392,924.00
PLAZO MESES		4
VALOR INGRESO NETO MENSUALIZADO	$	1,848,231.00
% A COTIZAR		40%
INGRESO BASE DE COTIZACION MENSUAL CALCULADO	$	739,292.40
INGRESO BASE DE COTIZACION MENSUAL APLICADO	$	1,423,500.00


No obstante, el sistema de seguridad social establece que el IBC no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, por lo cual, pese a que el cálculo técnico arroja un valor inferior, la base aplicable debe ajustarse al mínimo legal permitido.

En consecuencia, el IBC definitivo corresponde al salario mínimo legal mensual vigente, garantizando el cumplimiento estricto de la normatividad.

CALCULADORA PARA INGRESO BASE DE COTIZACIÓN IBC

Adicionalmente, en la página oficial de la Unidad de Gestion Pensional y Parafiscales, se encuentra disponible una calculadora para Ingreso Base de Cotización IBC y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social – SGSS (enlace: https://www.ugpp.gov.co/calculadora-ibc).


En dicha calculadora, seleccionando la pestaña "Contrato diferente de prestación de servicios personales" se tiene la siguiente interfaz:

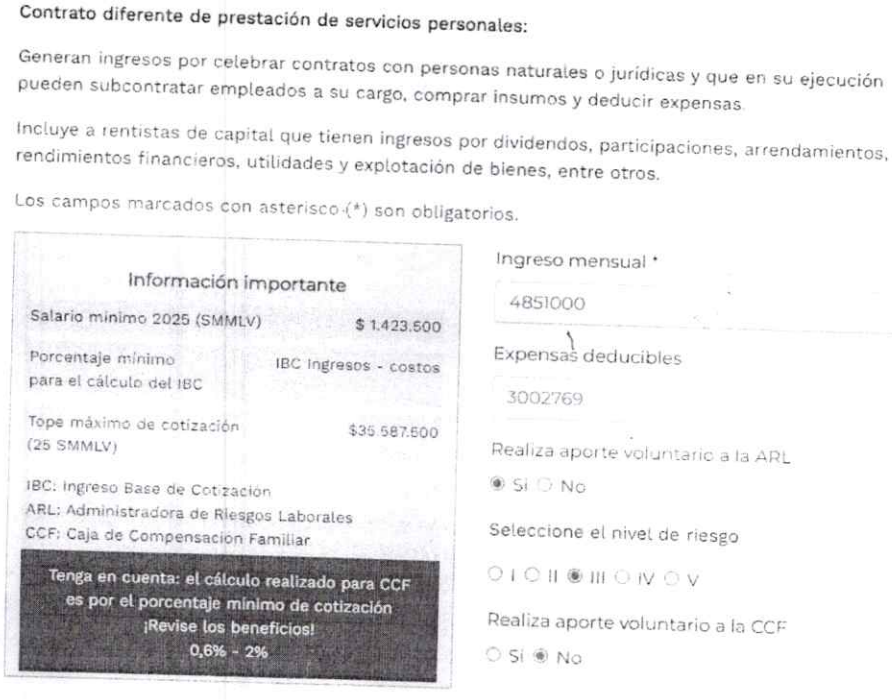

Dirección: Diag. 63 B N 3-47
Teléfono: 3125343871
Email: lamn.moreno@gmail.com

En esta interfaz se diligencian los ingresos brutos mensualizados y costos mensualizados. Calculando automáticamente el IBC y el total a pagar en el SGSS.

Los resultados de la calculadora se presentan a continuación:

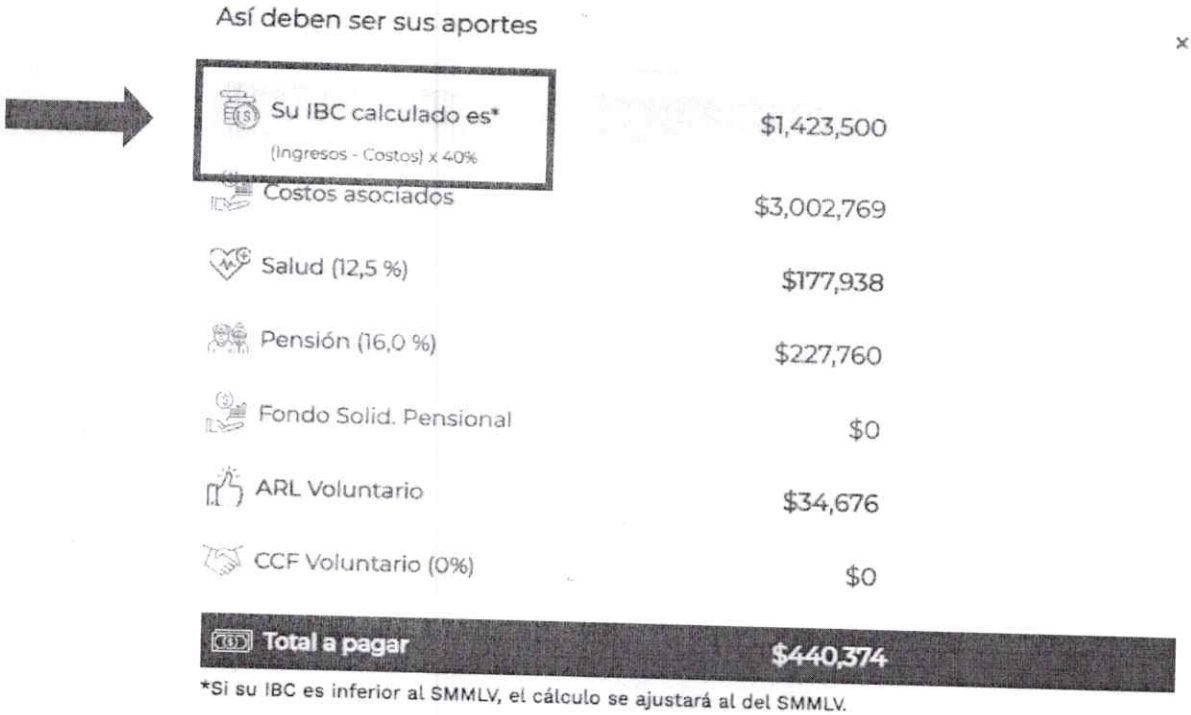

Al realizar el proceso en dicha herramienta, se verifica que el ingreso debe ser afectado por el 40%, conforme a los lineamientos vigentes para trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios.

En consecuencia, el IBC reportado se encuentra debidamente calculado siguiendo los parámetros establecidos por la normatividad y confirmados mediante la calculadora oficial de la UGPP.

ABC TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Asimismo, en el documento "ABC del trabajador independiente" elaborado por la UGPP, específicamente entre las páginas 2 y 4, se expone de manera clara y detallada la metodología para la determinación del Ingreso Base de Cotización (IBC) aplicable a los trabajadores independientes con contratos diferentes a la prestación de servicios personales, coincidiendo plenamente con el planteamiento desarrollado por esta Interventoría.

El documento puede ser consultado en el enlace:

https://www.ugpp.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/ABC_omiso_2025.pdf

Dirección: Diag. 63 B N 3-47
Teléfono: 3125343871
Email: lamn.moreno@gmail.com

Igualmente, se adjunta copia del mismo en formato PDF para su conocimiento y análisis, solicitando que su contenido sea tenido en cuenta y aplicado conforme a las directrices allí establecidas por la UGPP.

En consecuencia, el cálculo del Ingreso Base de Cotización (IBC) para este tipo de trabajadores independientes debe efectuarse a partir de la correcta depuración de los ingresos netos y la aplicación del porcentaje mínimo del cuarenta por ciento (40%), asegurando así el cumplimiento adecuado y coherente con los lineamientos interpretativos emitidos por la UGPP.

Agradezco la atención y quedo atento a cualquier ampliación o aclaración que estimen pertinente.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA
INTERVENTOR
Correo: lamn.moreno@gmail.com
Celular: 3124062181/3125343871

YULY YANETH LÓPEZ VEGA Contadora
C.C. No. 1.118.533.029 de Yopal
Contador público T.P. No. 307754-T
