Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2025

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Teniente Juan Fernando Astaiza Collazos
Supervisor Administrativo Contrato 006-00-A-COFAC-DILOA-2025

Asunto: Justificación técnica, administrativa y operativa para la entrega posterior al 26 de diciembre de 2025 de equipos asociados a la vigencia presupuestal del año en curso.

En atención a los requerimientos efectuados por la Supervisión Administrativa del Contrato No. 006-00-A-COFAC-DILOA-2025, y dando cumplimiento a lo solicitado respecto a la justificación individual de los equipos cuya entrega no se realizará antes del 26 de diciembre de 2025, la UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO se permite presentar el presente oficio, en el cual se exponen de manera estructurada, detallada y soportada las razones técnicas, logísticas y operativas que afectan los tiempos de entrega de determinados equipos.

Es preciso aclarar que, si bien el contrato mantiene vigencia hasta el 27 de junio de 2026, la necesidad de efectuar la entrega de la totalidad de los equipos asociados a la vigencia presupuestal 2025 antes del 26 de diciembre del presente año obedece exclusivamente a disposiciones de carácter presupuestal y administrativo. Dicha condición, aunque plenamente atendida en la planeación contractual, se ve impactada por factores técnicos que no dependen de la voluntad del contratista y que resultan inherentes a la naturaleza especializada de los equipos objeto del contrato.

En particular, los equipos cuya entrega se proyecta para el primer trimestre del año 2026 corresponden, en su mayoría, a equipos patrón, bancos especializados y equipos de alta exactitud metrológica, los cuales requieren obligatoriamente procesos de calibración, mantenimiento correctivo, actualización de software y validaciones finales directamente en casas fabricantes o laboratorios acreditados en el exterior, principalmente en Estados Unidos y Europa, conforme a los requisitos técnicos del anexo contractual y a las buenas prácticas metrológicas internacionales.

A continuación, se incorporan las justificaciones individuales por equipo:

1. **KIT BALANCER P/N 7BAL152 y S/N 20226**

De acuerdo con la información proporcionada por el fabricante Marvel Manufacturing Inc. El equipo requiere un cambio de piezas internas, reparación que, pese a no estar incluida dentro del contrato, el Grupo Metrológico Colombiano está dispuesto a ofrecer este mantenimiento correctivo como valor agregado, sin embargo, Marvel nos informa que este proceso no estará listo antes del 30 de enero de 2026.

CIMA S.A.S

Compañia Internacional de Mantenimiento <produccion@cima-co.com>

Request for quotation

Jeff Rutz 11 de diciembre de 2025 a las 9:37 a.m.
Para: Andrés Almanza Rodríguez <produccion@cima-co.com>

Good morning Andres,

It will require all brand new internal parts including a new rod. Price would be

Unfortunately with the work already on schedule and our holiday break coming up, we wouldn't be able to complete it until approx end of January, the 30th.

Let me know how you would like to proceed and send a PO when you are ready!

2. **CAPACITANCE MEASUREMENT, STANDARD RESISTOR SR1010-100 KOHM, STANDARD RESISTOR SR1010-100 OHM, STANDARD RESISTOR SR1030-1 OHM, STANDARD RESISTOR SR1030-10 KOHM, STANDARD RESISTOR SR1030-10 OHM Y TRANSFER STANDARD P/N 1621-9701, SR1010-100 KOHM, SR1010-100 OHM, SR1030-1 OHM, SR1030-10 KOHM, SR1030-10 OHM Y SR-1050, Y S/N E1-15491028, F1-1144176, F1-1144173, F1-1144171, F1-1144175, F1-1144172, E1-1144137, respectivamente:**

Luego de recibir los equipos el Grupo Metrológico Colombiano inició una búsqueda exhaustiva de un proveedor acreditado para estos servicios de calibración, encontrando que, su fabricante IET LABS es quien ofrece las mejores relaciones de TAR y TUR, indispensables para poder utilizar los equipos como patrón, función principal de estos dentro de la FAC, sin embargo, el fabricante no ofrece tiempos de entrega de entre 12 y 15 semanas, por lo que, teniendo en cuenta que los tiempos en las aduanas de Estados Unidos y Colombia, estimamos que los equipos se encuentren nuevamente en el país para el mes de febrero.

IET LABS, INC

RMA Number:

Date: November 26, 2025

P: 516-334-5959
F: 516-334-5988
Sales@ietlabs.com
www.ietlabs.com

For Sales Related Questions Contact
Steve Segin 516-334-5959 ext 202
sales@ietlabs.com

For Technical Questions Contact
Benjamin Sheena 516-334-5959 ext 205
benjamin.sheena@ietlabs.com

Quoted To:
CIMA LTDA
Andres Almanza Rodriguez
(561) 306-6043
produccion@cima-co.com

Part No.	Description	Lead Time*	Qty	Price Each Unit	Total Price	Calibration Options
1621-9701-c	CALIBRATE PREC CAP MEAS SYS	13-15 weeks	1			NIST Traceable Calibration Cert Included ISO-17025 Accredited (A2LA) Calibration with Before and After Test Data: $450 additional, if required
SR1030-1K-c	Calibrate: SR1030-1K	12-13 weeks	1			ISO-17025 Accredited (A2LA) Calibration with Uncertainties & Before and After Test Data: Included MUST REMOVE OIL BEFORE SENDING OR YOU WILL POTENTIALLY DAMAGE UNIT. IF UNIT IS RECEIVED WITH OIL WE WILL CHARGE A $150 PREMIUM
SR1010-100K-c	Calibrate: SR1010-100K	13 Weeks	1			ISO-17025 Accredited (A2LA) Calibration with Uncertainties & Before and After Test Data: Included
SR1010-100-c	Calibrate: SR1010-100	13 Weeks	1			ISO-17025 Accredited (A2LA) Calibration with Uncertainties & Before and After Test Data: Included
SR1030-1-c	Calibrate: SR1030-1	12-13 weeks	1			ISO-17025 Accredited (A2LA) Calibration with Uncertainties & Before and After Test Data: Included MUST REMOVE OIL BEFORE SENDING OR YOU WILL POTENTIALLY DAMAGE UNIT. IF UNIT IS RECEIVED WITH OIL WE WILL CHARGE A $150 PREMIUM
SR1030-10K-c	Calibrate: SR1030-10K	12-13 weeks	1			ISO-17025 Accredited (A2LA) Calibration with Uncertainties & Before and After Test Data: Included MUST REMOVE OIL BEFORE SENDING OR YOU WILL POTENTIALLY DAMAGE UNIT. IF UNIT IS RECEIVED WITH OIL WE WILL CHARGE A $150 PREMIUM
SR1030-10-c	Calibrate: SR1030-10	12-13 weeks	1			ISO-17025 Accredited (A2LA) Calibration with Uncertainties & Before and After Test Data: Included MUST REMOVE OIL BEFORE SENDING OR YOU WILL POTENTIALLY DAMAGE UNIT. IF UNIT IS RECEIVED WITH OIL WE WILL CHARGE A $150 PREMIUM
SR1050-1M-c	Calibrate: SR1050-1M	13 Weeks	1			ISO-17025 Accredited (A2LA) Calibration with Uncertainties & Before and After Test Data: Included

3. **SHEAR ACELEROMETER, ACELEROMETER, SHEAR ACELEROMETER, SHOCK ACELEROMETER, SHEAR ACELEROMETER, SHEAR ACELEROMETER, SHEAR ACELEROMETER, SHOCK ACELEROMETER, PLUG PCB 98 - ACELEROMETRO, PLUG PCB 98 - ACELEROMETRO, PLUG PCB 101 - ACELEROMETRO, PLUG PCB 101 - ACELEROMETRO, PLUG PCB 98 - ACELEROMETRO, PLUG IMI - ACELEROMETRO, PLUG IMI 101 - ACELEROMETRO, P/N 352A10, 3711B1130G, 352B68, 350C02, 352C03, 352C03, 352C03, 3713B1110G, 328C04, 328C04, 328D04, 328C04, 328D04, 603C01, 621B51, y S/N 8064, LW9556, 8041, 28105, LW145241, LW144593, LW144523, LW7101, 13427, 11780, 17701, 13422, 19561, LW274888, 7542, respectivamente.**

Luego de recibidos los equipos iniciamos un proceso de búsqueda de proveedor con nuestros aliados nacionales e internacionales, sin embargo, hasta la fecha no hemos encontrado proveedor que cuente con la capacidad para realizar estas calibraciones acreditadas, no obstante, esta semana pudimos hablar telefónicamente con un proveedor que nos ofreció el servicio pero aún nos encontramos a la espera de la RMA para poder enviarlo al exterior, teniendo en cuenta esto, estimamos que los equipos estén en nuestras instalaciones nuevamente a finales de febrero.



CIMA S.A.S Compañía Internacional de Mantenimiento

Compañía Internacional de Mantenimiento <produccion@cima-co.com>


Request for quotation

Julie Lofria 6 de noviembre de 2025 a las 3:39 p.m.
Para: Andrés Almanza Rodríguez <produccion@cima-co.com>

We are unable to calibrate PCB Accelerometers.

essco CALIBRATION LABORATORY

Julie Lofria
Sr. Customer Service Representative
Key Account Lead
Essco Calibration Laboratory | ISO/IEC 17025 Accredited
P: 800-325-2201 x135
W: www.esscolab.com

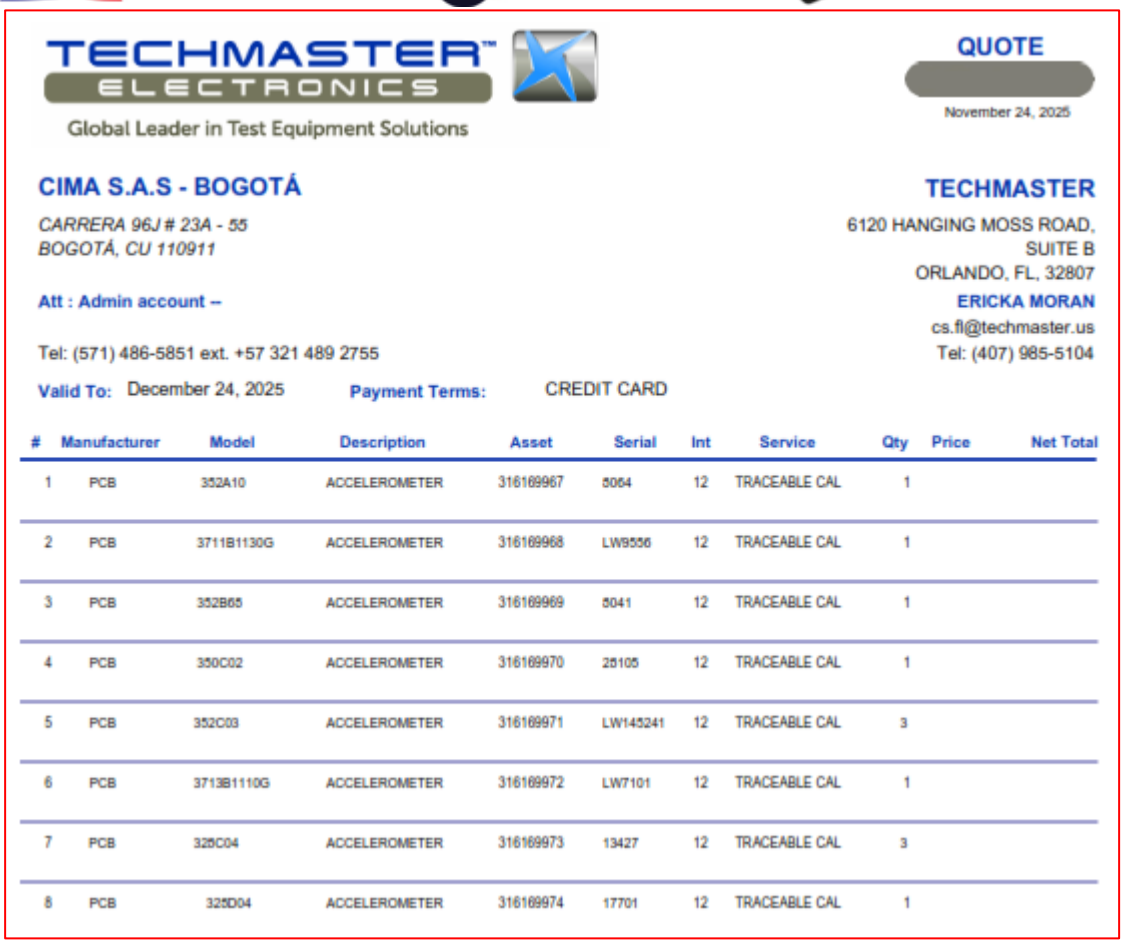

TECHMASTER ELECTRONICS
Global Leader in Test Equipment Solutions

QUOTE
[redacted]
November 24, 2025

CIMA S.A.S - BOGOTÁ
CARRERA 96J # 23A - 55
BOGOTÁ, CU 110911

Att : Admin account –

Tel: (571) 486-5851 ext. +57 321 489 2755


TECHMASTER
6120 HANGING MOSS ROAD,
SUITE B
ORLANDO, FL, 32807
ERICKA MORAN
cs.fl@techmaster.us
Tel: (407) 985-5104

Valid To: December 24, 2025 **Payment Terms:** CREDIT CARD

#	Manufacturer	Model	Description	Asset	Serial	Int	Service	Qty	Price	Net Total
1	PCB	352A10	ACCELEROMETER	316169967	5064	12	TRACEABLE CAL	1		
2	PCB	3711B1130G	ACCELEROMETER	316169968	LW9556	12	TRACEABLE CAL	1		
3	PCB	352B65	ACCELEROMETER	316169969	5041	12	TRACEABLE CAL	1		
4	PCB	350C02	ACCELEROMETER	316169970	28105	12	TRACEABLE CAL	1		
5	PCB	352C03	ACCELEROMETER	316169971	LW145241	12	TRACEABLE CAL	3		
6	PCB	3713B1110G	ACCELEROMETER	316169972	LW7101	12	TRACEABLE CAL	1		
7	PCB	326C04	ACCELEROMETER	316169973	13427	12	TRACEABLE CAL	3		
8	PCB	325D04	ACCELEROMETER	316169974	17701	12	TRACEABLE CAL	1		

4. MULTIPRODUCT CALIBRATOR P/N 5502A y S/N 2567808, Y STANDARD RESISTOR P/N SR1030-1 KOHM Y S/N F1-1144174

Los equipos ya fueron calibrados y enviados por el laboratorio de calibración de Fox Valley en Estados Unidos, de acuerdo con el tracking número 485768564180 los equipos se recibirán el lunes 15 de diciembre en nuestra bodega de Miami para iniciar su proceso de reimportación a Colombia, es estima que estén en nuestras instalaciones los primeros días de enero, teniendo en cuenta el alto flujo de importaciones que se realizan en el país por cuenta de la época decembrina.

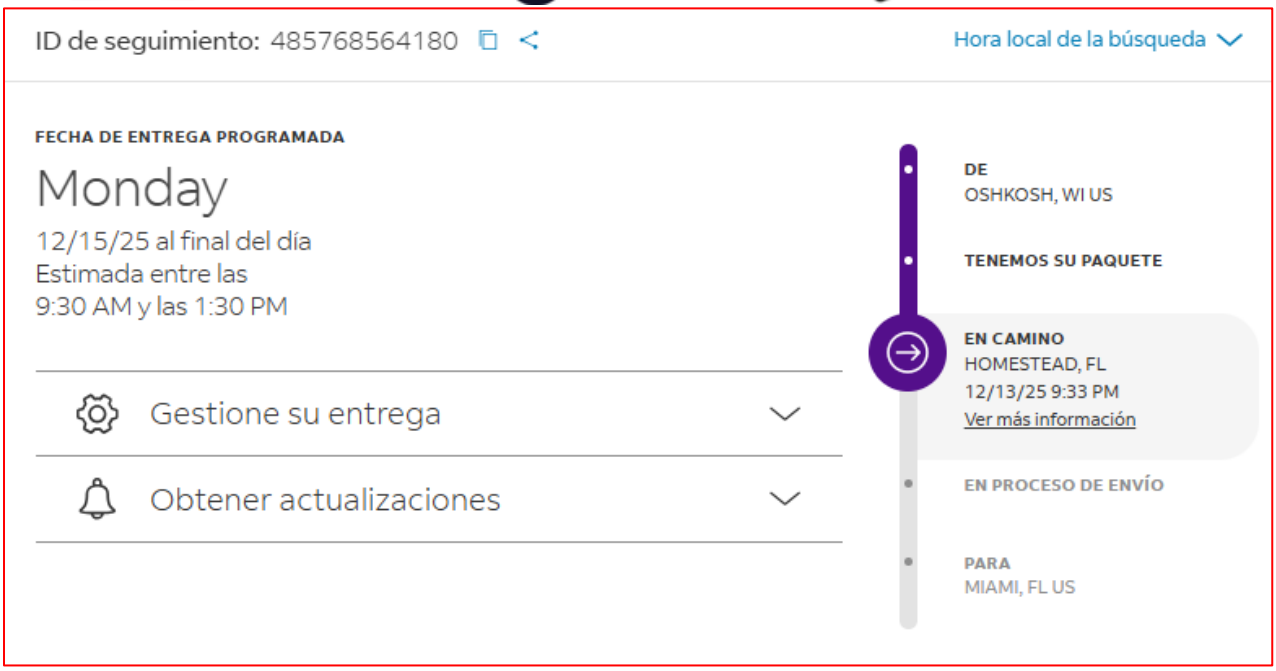

5. **DIRECTIONAL POWER SENSOR, DIRECTIONAL POWER SENSOR, DIRECTIONAL POWER SENSOR, RF POWER METER, P/N 4021, 4022, 4025, 4421, y S/N 153400834, 153301427, 153500578, 153500592, respectivamente:**

Luego de recibir los equipos el Grupo Metrológico Colombiano inició una búsqueda exhaustiva de un proveedor acreditado para estos servicios de calibración, encontrando que, su fabricante Bird Technologies es quien ofrece las mejores relaciones de TAR y TUR, indispensables para poder utilizar los equipos como patrón, función principal de estos dentro de la FAC, sin embargo, el día 8 de diciembre de 2025 recibimos una solicitud de diligenciamiento de un formato, el cual, al parecer obedece a los problemas políticos internacionales, pues nos requieren una declaración de que estos equipos no van a ser enviados a países como China, Rusia, Cuba, Venezuela, etc. Así como, tampoco serán utilizados para trabajos para estos países, le manifestamos nuestro inconformismo por recibir este formato apenas en esta fecha, pero no obtuvimos ninguna respuesta al respecto, estimamos que los equipos estén en nuestras instalaciones en el mes de enero.

CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

SERVICIO AERONÁUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.

SUMINCOL
Suministros Industriales de Colombia S.A.S.

CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

Compañía Internacional de Mantenimiento <produccion@cima-co.com>

RMA Service Request #03-411659

Laura Blevins 8 de diciembre de 2025 a las 1:47 p.m.
Para: Linda McGee, Andrés Almanza Rodríguez

Hello Andres,

I am getting ready to process this order now, but we never received filled out EUS. Can you please provide this so we can continue working on your equipment.

Respectfully,

Laura Blevins

Customer Service Rep - BSC

CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

Compañía Internacional de Mantenimiento <produccion@cima-co.com>

RMA Service Request #03-411659

Andrés Almanza Rodríguez <produccion@cima-co.com> 9 de diciembre de 2025 a las 11:41 a.m.
Para: Laura Blevins <lablevins@bird-technologies.com>
CC: Linda McGee <lmcgee@bird-technologies.com>

Dear Laura,

Thank you for your follow-up regarding RMA #03-411659.

Please note that this is the first time we have been required to submit the End Use Statement (EUS) for a service request. Moving forward, we kindly request that you include this necessary form from the initial communication to avoid any delays in processing.

We are concerned that this requirement, introduced at a later stage, may affect the estimated delivery time for our equipment. I attached the required information.

Best regards,

CIMA S.A.S
Compañía Internacional de Mantenimiento

Andrés Almanza Rodríguez
Coordinador de producción
CIMA SAS

(601) 266-4386
produccion@cima-co.com
www.cima-co.com
Carrera 96J No. 23A-55 Fontibón - Bogotá, Colombia



CIMA S.A.S — Compañía Internacional de Mantenimiento <produccion@cima-co.com>

RMA Service Request #03-411659

Laura Blevins 11 de diciembre de 2025 a las 8:15 a.m.
Para: Andrés Almanza Rodríguez <produccion@cima-co.com>

Thank you so much.

Confirming receipt of EUS.

Have a great day 😊

6. TIME & FRECUENCY SYSTEM P/N 1510-602 Y S/N 1519T84401

Luego de recibir el equipo el Grupo Metrológico Colombiano inició una búsqueda de cotización para el servicio de calibración con el Instituto Nacional de Metrología, desafortunadamente, pese a diligenciar el formato a través de la página web de ellos (requisito principal para obtener una cotización), no fue sino hasta el 26 de noviembre que obtuvimos una respuesta, pese a esta tardanza, enviamos el equipo porque dentro de la oferta manifestaban una calibración en el mes de diciembre, sin embargo, al llamar a preguntar por el estado del equipo nos notificaron que la fecha de calibración fue modificada para el 4 de enero de 2026.



Instituto Nacional de Metrología de Colombia

COTIZACION DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN METROLÓGICA

Señor (a)
JESUS CARIELES GONZALEZ
SERVICIO AERONÃ□UTICO ESPECIALIZADO S.A..S

Remitimos la cotización en la cual se determinan las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación de los Servicios de Calibración y Medición Metrológica.
El pago de los servicios aquí cotizados, convierte este documento en ORDEN DE SERVICIOS e indica que entiende y acepta los términos y condiciones del mismo

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA

Rad No:	2 25 3861		
Fecha:	2025-11-26	**Folios:**	1
Trámite:	SOLICITUDES DE CALIBRACION	**Actuación:**	COTIZACION
Origen:	INM	**Destino:**	SERVICIO AERONÃ□UTIC

SOLICITANTE: SERVICIO AERONÃ□UTICO ESPECIALIZADO S.A..S	**NIT O CC:** 9004100881
CONTACTO: JESUS CARIELES GONZALEZ	**CARGO:** NO DEFINIDO
DIRECCION: CALLE 18 No.12 - 71	**CIUDAD:** FUNZA CUNDINAMARCA
EMAIL: comercial01@sae-sas.com.co	


No.	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL
1	GPS TIME AND FRECUENCY SYSTEM	MICROSEMI	1510-602	1519T84401

SERVICIOS SOLICITADOS	COTIZACION		
SERVICIO	**TASA**	**CANT**	**TOTAL**
Calibración de contadores y medidores de frecuencia por medición de la frecuencia de la base de tiempo. (1 MHz a 10 MHz), 18.2 horas con datos cada segundo.		1	

Observaciones: Se ofrece el servicio de medición por el método de lectura de la frecuencia de la base de tiempo (sin conexión de la antena GPS), el cual cuenta con una incertidumbre expandida mínima ofertada en la CMC es de 1.0E-10 Hz/Hz.
El servicio de calibración se presta para la salida de la base de tiempo del instrumento. La fecha estimada de prestación del servicio es en diciembre de 2025. Esta fecha se establece según el orden en que nuestros usuarios realizan el pago.

7. ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER P/N 3322392 Y S/N 2477


El equipo ya fue reparado, calibrado y enviado por el laboratorio y fabricante Fluke en Estados Unidos, de acuerdo con el tracking número 1Z9425851252229460 el equipo fue recibido el viernes 12 de diciembre en nuestra bodega de Miami para iniciar su proceso de reimportación a Colombia, es estima que esté en nuestras instalaciones los primeros días de enero, teniendo en cuenta el alto flujo de importaciones que se realizan en el país por cuenta de la época decembrina.

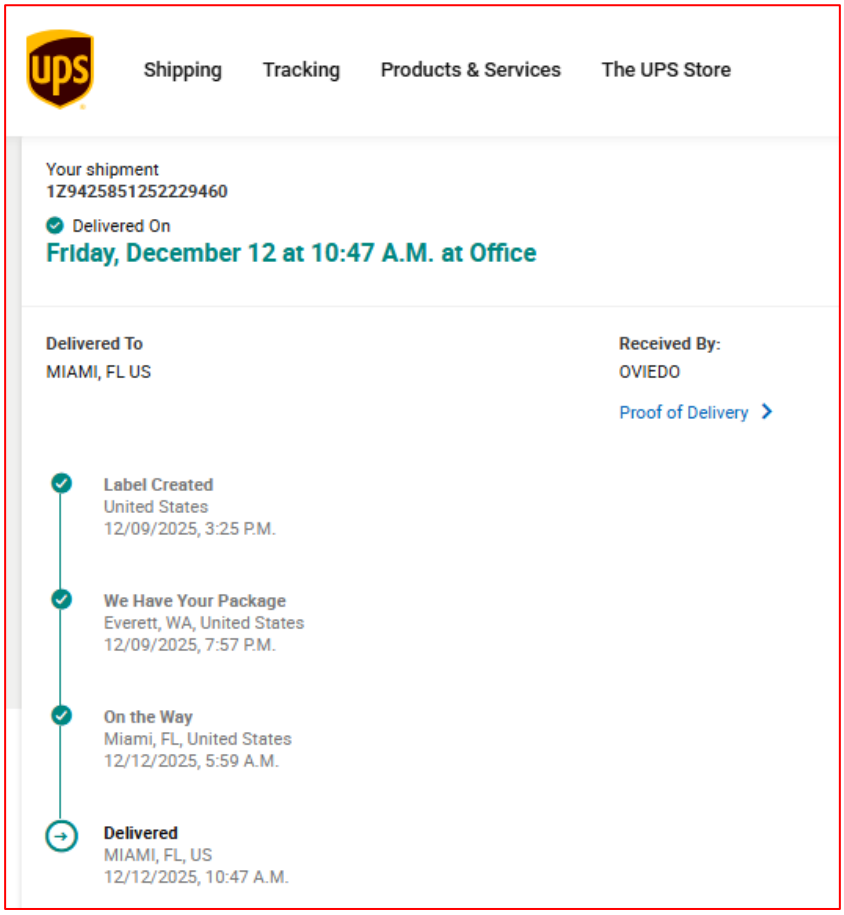

8. REFENCE PRESSURE MONITOR P/N RPM4-AD A160Ka/A160Ka Y S/N 2483

El equipo ya fue reparado, calibrado y enviado por el laboratorio y fabricante Fluke en Estados Unidos, de acuerdo con el tracking número 1Z9425851252977116 el equipo se recibirá el lunes 15 de diciembre en nuestra bodega de Miami para iniciar su proceso de reimportación a Colombia, es estima que esté en nuestras instalaciones los primeros días


de enero, teniendo en cuenta el alto flujo de importaciones que se realizan en el país por cuenta de la época decembrina.

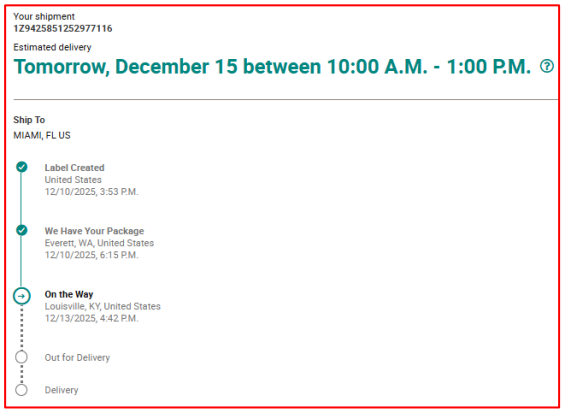

9. REFERENCE PRESSURE MONITOR, AMPLIFIER, POWER PACK, MULTIPRODUCT CALIBRATOR, P/N RPM4 A70MS/A20MS, 5725A/AR, 792A, 5720A, y S/N 2472, 3179001, 3183001, 1789207, respectivamente:


Luego de que el fabricante Fluke recibiera los equipos nos proporcionó una fecha de entrega inicial del 03 de diciembre, sin embargo, el 9 de diciembre nos proporcionó un cambio de fecha para el 23 de diciembre, y el 12 de este mismo mes nos informó que debido a una falta de patrones nos actualizan la fecha de entrega para el 23 de febrero del 2026, les escribimos que se requería urgentemente estos equipos pero a la fecha no tenemos respuesta por parte de ellos, es por esto que estimamos que los equipos estén en nuestras instalaciones nuevamente en el mes de marzo.



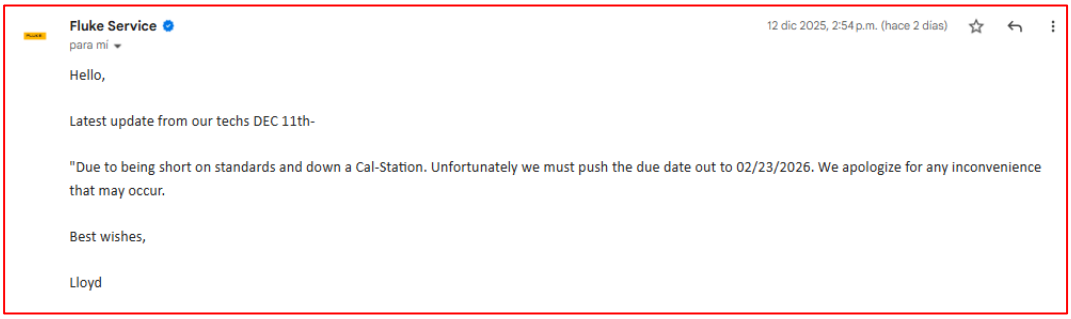

10. **PSA ESPETRUM ANALYZER, POWER SENSOR, POWER METER Y MULTIMETRO DE 8.5 DIGITO P/N E4440A, N8481A, N1912A Y 3458A y S/N MY54370058, MY55300004, MY55326020 Y MY45051202 respectivamente.**

Luego de recibir los equipos el Grupo Metrológico Colombiano se contacto con el fabricante de los equipos Keysight, sin embargo, la respuesta brindada por ellos es que los equipos se encuentran obsoletos, razón por la cual, no pueden ofrecer el servicio de reparación ya que no cuentan con los repuestos necesarios. Por esta razón, y con el fin de que la FAC pueda contar con estos equipos completamente serviciables y no pierdan ninguna de sus capacidades, el Grupo Metrológico Colombiano está en proceso de compra de unos equipos serviciables para realizar un Exchange que permita obtener unos equipos completamente funcionales, de los cuales ya hemos recibido dos en nuestra bodega de Miami y están listos para ser enviados a calibración, estimamos que estén en nuestras instalaciones en el mes de febrero.

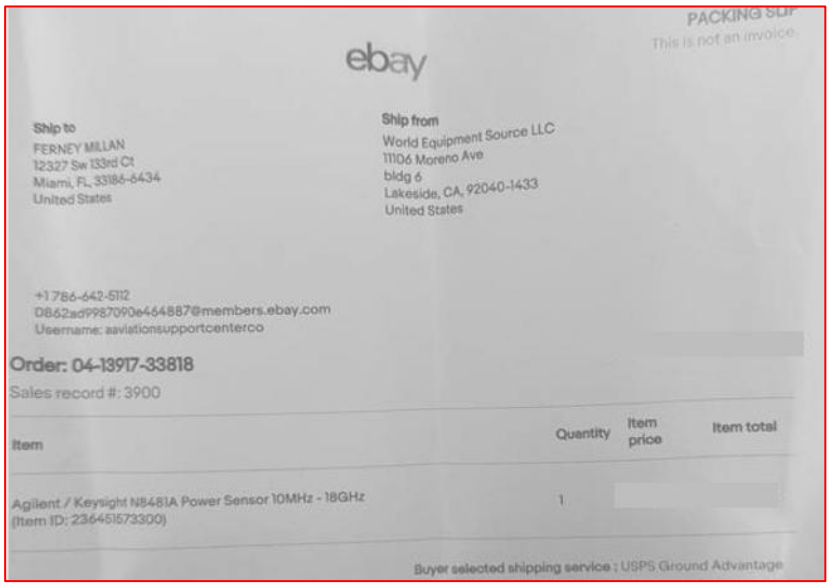

PACKING SLIP
This is not an invoice

ebay

Ship to
FERNEY MILLAN
12327 Sw 133rd Ct
Miami, FL, 33186-6434
United States

Ship from
World Equipment Source LLC
11106 Moreno Ave
bldg 6
Lakeside, CA, 92040-1433
United States

+1 786-642-5112
D862ad9987090e464887@members.ebay.com
Username: aaviationsupportcenterco

Order: 04-13917-33818
Sales record #: 3900

Item	Quantity	Item price	Item total
Agilent / Keysight N8481A Power Sensor 10MHz - 18GHz (Item ID: 236451573300)	1		

Buyer selected shipping service : USPS Ground Advantage

11. **MULTIPRODUCT CALIBRATOR Y TEST SET NAV/COM, P/N 9100 E IFR4000, y S/N, 865248452 Y 103001329, respectivamente.**

Luego de recibidos los equipos el Grupo Metrológico Colombiano inició un proceso de caza fallas, actualmente nos esperamos a la espera de que la aduana libere los repuestos para poder reemplazarlos y realizar las respectivas pruebas, se estima que estos equipos estén reparados y calibrados en el mes de febrero, es necesario resaltar que estos


equipos, se recibieron con más fallas de las reportadas inicialmente, sin embargo, el Grupo Metrológico Colombiano realizará la reparación total como valor agregado.

12. **DC CURRENT SHUNT, DC CURRENT SHUNT, BANCO PARA CALIBRACION EN MARMOL DE GRAN, MESA MARMOL 35"X60" Y MILLIOHMMETER, P/N 9230A-100, 9230A-300, 517-167, 80720 Y 4338B, Y S/N, 71896, 71930, 136012, 103370, MY41100573, respectivamente.**

Luego de recibir los equipos el Grupo Metrológico Colombiano inició una búsqueda exhaustiva de un proveedor acreditado para estos servicios de calibración, analizando relaciones de TAR y TUR, indispensables para poder utilizar los equipos como patrón, función principal de estos dentro de la FAC, actualmente nos encontramos a la espera de la recepción de las cotizaciones por cada uno de los laboratorios, se estima que estos equipos estén listos para entregar en el mes de febrero de 2026.

13. **BANCO PROGRAMACIÓN Y PRUEBA RADIO BALIZA P/N 02N65740-J Y S/N 12,0057**

Luego de recibido el equipo se inició contacto con Exail Aerospace fabricante del equipo para que nos compartiera la respectiva cotización y RMA para poder enviarlo a actualización de software y calibración, de acuerdo con el tracking 886772634950 el equipo fue entregado en Francia el 10 de diciembre, estimamos que el equipo retorne a nuestras instalaciones en marzo de 2026.

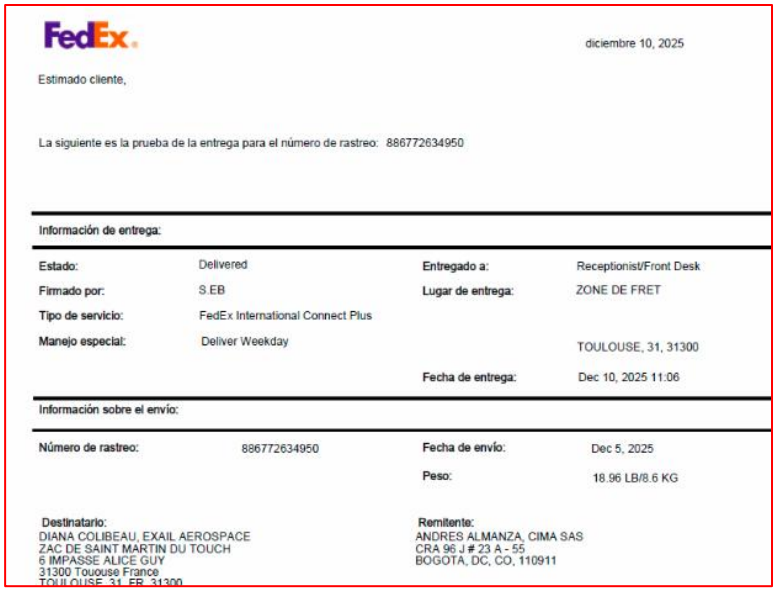

FedEx

diciembre 10, 2025

Estimado cliente,

La siguiente es la prueba de la entrega para el número de rastreo: 886772634950

Información de entrega:

Estado:	Delivered	**Entregado a:**	Receptionist/Front Desk
Firmado por:	S.EB	**Lugar de entrega:**	ZONE DE FRET
Tipo de servicio:	FedEx International Connect Plus		
Manejo especial:	Deliver Weekday		TOULOUSE, 31, 31300
		Fecha de entrega:	Dec 10, 2025 11:06

Información sobre el envío:

Número de rastreo:	886772634950	**Fecha de envío:**	Dec 5, 2025
		Peso:	18.96 LB/8.6 KG

Destinatario:
DIANA COLIBEAU, EXAIL AEROSPACE
ZAC DE SAINT MARTIN DU TOUCH
6 IMPASSE ALICE GUY
31300 Toulouse France
TOULOUSE, 31, FR, 31300

Remitente:
ANDRES ALMANZA, CIMA SAS
CRA 96 J # 23 A - 55
BOGOTA, DC, CO, 110911

De manera general, las causales expuestas responden a condiciones técnicas y operativas que no pueden ser abreviadas ni omitidas sin comprometer la confiabilidad, seguridad operacional y trazabilidad metrológica de los equipos, lo cual resultaría contrario a los intereses institucionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y a los estándares exigidos por los organismos de acreditación nacionales e internacionales.

Es importante dejar constancia de que la UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO mantiene seguimiento permanente a cada uno de los equipos relacionados, garantizando su retorno dentro de los primeros meses del año 2026, debidamente reparados (cuando aplique) y calibrados, quedando completamente serviciables para su reincorporación a las unidades de la FAC.

En consecuencia, la entrega posterior al 26 de diciembre de 2025 de los equipos aquí relacionados no obedece a incumplimiento contractual, sino a la aplicación responsable y técnica de los procedimientos exigidos para este tipo de instrumentación especializada, dentro del marco de la vigencia contractual vigente.

Agradecemos de manera atenta la comprensión de la Supervisión Administrativa frente a cada una de las situaciones técnicas y operativas expuestas en el presente oficio, y respetuosamente esperamos una respuesta favorable que permita adelantar las gestiones correspondientes para la reserva presupuestal de los recursos asociados, garantizando así la continuidad del servicio y la correcta culminación de las actividades contractuales.

Cordialmente,

CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE
C.C.: 65.769.984 de Ibagué Tolima
Representante Legal
Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
