	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/12/2025 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1914 DE 2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERVENTORIA CONCEP SAS

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2.932.226.232,00 **50% EN SMMLV:** $ 2.059,87
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.932.226.232,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

FECHA: 18/12/2025 (Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

1.OBJETO DE LA SOLICITUD

Solicitud de prórroga No. 1 al contrato 1914 de 2025.

2.JUSTIFICACIÓN

2.1 Justificación Técnica

•Teniendo que en cuenta que las actividades programadas y el plazo dado para su ejecución es superior al 31 de diciembre de 2025, se requiere reprogramar el Contrato No. 1914 de 2025 para garantizar la ejecución de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

•Los estudios contemplan identificación, mejoramiento y estudios y diseños deben garantizar una infraestructura fluvial funcional, segura, accesible y adaptable a las condiciones ambientales y sociales del entorno. Deberá considerar soluciones arquitectónicas y técnicas que respondan a las necesidades de operación portuaria y a la dinámica del río, incluyendo medidas para enfrentar la variabilidad hídrica mediante estructuras flotantes o mecanismos de adaptación morfológica. Así mismo, debe prever zonas de atención a pasajeros diseñadas bajo principios de accesibilidad universal, que faciliten la circulación de personas con discapacidad, adultos mayores.

•El alcance del proyecto está compuesto por componentes importantes, los cuales deberán desarrollarse de acuerdo con los plazos y actividades descritas a continuación para los hitos I, II, III, IV Y V, el cual se desglosa de la siguiente manera:

HITO	Tipo de intervención
HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARÓN	Mejoramiento muelle
HITO II - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA	Mejoramiento muelle
HITO III - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PACOA	Construcción Muelle Nuevo
HITO IV - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ	Construcción Muelle Nuevo
HITO V - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA VICTORIA	Construcción Muelle Nuevo

Los volúmenes que conforman el LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL infraestructura ligada, a los cuales se requiere llevar a cabo las actividades necesarias para la elaboración de los estudios y diseños son los siguientes:

-VOLUMEN I ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL).
-VOLUMEN II ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO
-VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA
-VOLUMEN IV ESTUDIO DE GEOTECNIA.
-VOLUMEN V ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL
VOLUMEN VI ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO.
-VOLUMEN VII ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO.
-VOLUMEN VIII ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
-VOLUMEN IX DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE.
-VOLUMEN X GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD.
-VOLUMEN XI GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL.
-VOLUMEN XII ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
-VOLUMEN XIII ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO.
-VOLUMEN XIV INFORME FINAL EJECUTIVO.

Se deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el “Anexo Técnico” y en los Requerimientos Técnicos definidos por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

•El proyecto Lote 1 contempla la elaboración de estudios y diseños de Fase II para mejorar la infraestructura fluvial en Pucaron, Taraira y Pacoa (Vaupés) y Miriti-Parana, La Victoria (Amazonas), territorios de baja ruralidad, difícil acceso y con predominancia de Autoridades Tradicionales Indígenas como principales estructuras de gobernanza.

Estas comunidades constituyen el núcleo de la movilidad, abastecimiento y conectividad regional, por lo que la viabilidad de los diseños depende de la concertación directa con Líderes de Zona y organizaciones indígenas.

•Durante la ejecución del componente social, se identificaron condiciones extraordinarias e imprevisibles asociadas a los protocolos internos de las Autoridades Tradicionales Indígenas en aras de dar cumplimiento al Convenio 169 – Ley 21 de 1991 y la sentencia T-039 del 19 de febrero de 2024, entre ellos:

•Tiempos propios de convocatoria, deliberación y toma de decisiones colectivas.
•Requerimiento de mínimo tres reuniones por hito, cuya programación está sujeta a disponibilidad de autoridades y acuerdos internos.

Estos factores han impedido el desarrollo completo de las actividades de concertación dentro de la vigencia, afectando el cronograma técnico sin responsabilidad del contratista ni de la entidad.

2.2 Justificación para la Constitución de Reserva Presupuestal

De acuerdo con el artículo 2.8.1.7.3.1 del Decreto 1068 de 2015, la constitución de reserva presupuestal procede cuando existen compromisos derivados de obligaciones contractuales que no pudieron ejecutarse dentro de la vigencia fiscal por causas no atribuibles a la entidad.

A la luz de este marco normativo, se expone lo siguiente:

La ejecución del componente social del proyecto se vio afectada por la aparición de circunstancias socio-organizativas no previsibles, entre ellas:

•La necesidad de ajustarse a los protocolos autónomos de gobernanza indígena, los cuales establecen tiempos y mecanismos propios para avalar proyectos de infraestructura.
•La obligatoriedad de concertar con múltiples Autoridades Tradicionales por tratarse de territorios no municipalizados.
•Las restricciones logísticas derivadas de condiciones climáticas en la Amazonía que afectan la navegabilidad y acceso a las comunidades.

Estos procesos, autónomos y ajenos al control de la entidad y del contratista, no podían anticiparse en la etapa precontractual y resultan inevitables, configurando una causal de caso fortuito que impidió realizar en tiempo las socializaciones requeridas por el objeto contractual.

De igual manera se aclara que, el contratista ha adelantado las actividades conforme al cronograma y ha efectuado los desplazamientos requeridos, los retrasos provienen estrictamente de los tiempos internos de decisión de las comunidades indígenas, los cuales no pueden ser modificados ni acelerados por terceros.

Como consecuencia de que no se han podido adelantar las socializaciones obligatorias para avanzar en etapas de la elaboración de los estudios y diseños, no fue posible ejecutar la totalidad de actividades previstas para la vigencia, certificar el avance del componente social, requisito previo para otras disciplinas técnicas y comprometer los recursos asociados a productos que dependen de la validación comunitaria.

Por tanto, parte del presupuesto del contrato no se encuentra ejecutado ni comprometido, y se requiere su traslado al siguiente periodo fiscal mediante la constitución de reserva presupuestal, garantizando la continuidad técnica del proyecto.

En conclusión, debido a las condiciones propias de los territorios indígenas, la complejidad de los protocolos de concertación y la imposibilidad material de realizar las socializaciones dentro de la vigencia:

FECHA: 18/12/2025 (Día / Mes / Año)

Se solicita prórroga del plazo contractual, con el fin de culminar de manera adecuada las actividades de campo y concertación.

La prórroga requerida no implica adición de recursos y se limita a permitir la continuidad de las actividades contractuales pendientes, cuyo cumplimiento es necesario para finalizar las obligaciones pactadas, evitar retrasos en el cronograma técnico y garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual. Esta continuidad se enmarca en los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad fiscal, dado que no se generan nuevos compromisos presupuestales para la vigencia siguiente.

En cuanto a los aspectos presupuestales, el contrato cuenta con compromisos válidamente adquiridos durante la vigencia fiscal 2025, respaldados en el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y en el Registro Presupuestal (RP). A la fecha de cierre de la vigencia, subsisten obligaciones pendientes de ejecución derivadas de compromisos jurídicamente perfeccionados durante 2025. En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 del mismo Estatuto, resulta procedente y obligatorio constituir Reserva Presupuestal 2025 para garantizar la continuidad de la ejecución contractual durante la vigencia 2026:

(…) “Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.” (…)

La reserva se solicita en estricto cumplimiento del principio de anualidad, y se limita a cubrir obligaciones previamente contraídas, sin generar modificaciones al valor contractual ni nuevos compromisos fiscales.

La constitución de esta reserva cumple plenamente con los criterios de control fiscal y presupuestal, debido a que las apropiaciones comprometidas en 2025 cuentan con sustento documental suficiente, el contrato se encuentra en ejecución y las obligaciones a cumplir en 2026 derivan directamente de compromisos adquiridos dentro de la vigencia fiscal que se cierra. De esta manera se garantiza la trazabilidad presupuestal y la correcta administración de los recursos públicos, respetando los lineamientos de cierre establecidos por el Ministerio de Hacienda y ajustándose a los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en la ejecución del gasto.

En virtud de lo anterior, se considera plenamente justificada la solicitud de prórroga sin adición de recursos y la constitución de la Reserva Presupuestal de la vigencia 2025, como mecanismos necesarios y ajustados a la normatividad vigente para asegurar la continuidad, culminación y adecuada ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del Instituto.

3.SOLICITUD

•Por lo expresado en el numeral 3 del presente documento y que el plazo de ejecución vence el 31 de diciembre del 2025, se solicita considerar prorrogar el Contrato No. 1914 de 2025, hasta el 30 de junio de 2026, así un tiempo adicional de Seis (6) meses.

Quedamos atentos a su pronta y positiva respuesta, para que, una vez sea aprobada la presente solicitud de Prorroga, se realice el control de avance del proyecto enmarcándolo dentro de la condición actualizada.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.1 Fecha: 18/12/2025	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO				
Director de Consultoría	$ 10.770.000,00	$ 13.462.500,00		**$ 24.232.500,00**
Ingeniero Residente de Estudios y Campo	$ 24.600.000,00	$ 30.750.000,00		**$ 55.350.000,00**
Ingeniero Auxiliar	$ 24.540.000,00	$ 30.675.000,00		**$ 55.215.000,00**
Dibujante	$ 5.260.000,00	$ 6.575.000,00		**$ 11.835.000,00**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A)	$ 65.170.000,00	$ 81.462.500,00		**$ 146.632.500,00**
FACTOR MULTIPLICADOR = (B)	2,40	$ 2,40		**$ 2,40**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (c)	**$ 156.408.000,00**	**$ 195.510.000,00**		**$ 351.918.000,00**
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES				
HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARÓN				
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES,RECOPILACIÓN Y ANÁLISISDEANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)	$ 17.000.000,00			**$ 17.000.000,00**
ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	$ 6.000.000,00			**$ 6.000.000,00**
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	$ 10.000.000,00			**$ 10.000.000,00**
ESTUDIO DE GEOTECNIA	$ 10.000.000,00			**$ 10.000.000,00**
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL	$ 10.000.000,00			**$ 10.000.000,00**
ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO	$ 15.000.000,00			**$ 15.000.000,00**
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO	$ 27.000.000,00			**$ 27.000.000,00**
ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 16.000.000,00			**$ 16.000.000,00**
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE	$ 13.000.000,00			**$ 13.000.000,00**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 53.000.000,00			**$ 53.000.000,00**
GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL	$ 6.000.000,00			**$ 6.000.000,00**
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	$ 4.000.000,00			**$ 4.000.000,00**
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO	$ 6.000.000,00			**$ 6.000.000,00**
INFORME FINAL EJECUTIVO	$ -			**$ -**
SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 1	**$ 193.000.000,00**			**$ 193.000.000,00**
HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA				

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES,RECOPILACIÓN Y ANÁLISISDEANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)	$ 17.000.000,00			**$ 17.000.000,00**
ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	$ 6.000.000,00			**$ 6.000.000,00**
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	$ 10.000.000,00			**$ 10.000.000,00**
ESTUDIO DE GEOTECNIA	$ 10.000.000,00			**$ 10.000.000,00**
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL	$ 10.000.000,00			**$ 10.000.000,00**
ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO	$ 15.000.000,00			**$ 15.000.000,00**
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO	$ 27.000.000,00			**$ 27.000.000,00**
ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 16.000.000,00			**$ 16.000.000,00**
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE	$ 13.000.000,00			**$ 13.000.000,00**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 53.000.000,00			**$ 53.000.000,00**
GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL	$ 6.000.000,00			**$ 6.000.000,00**
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	$ 4.000.000,00			**$ 4.000.000,00**
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO	$ 6.000.000,00			**$ 6.000.000,00**
INFORME FINAL EJECUTIVO	$ -			**$ -**
SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 2	**$ 193.000.000,00**			**$ 193.000.000,00**
HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PACOA				
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES,RECOPILACIÓN Y ANÁLISISDEANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)	$ 19.000.000,00			**$ 19.000.000,00**
ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	$ 6.000.000,00			**$ 6.000.000,00**
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	$ 10.000.000,00			**$ 10.000.000,00**
ESTUDIO DE GEOTECNIA	$ 11.000.000,00			**$ 11.000.000,00**
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL	$ 11.000.000,00			**$ 11.000.000,00**
ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO	$ 18.000.000,00			**$ 18.000.000,00**
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO	$ 28.000.000,00			**$ 28.000.000,00**
ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 19.000.000,00			**$ 19.000.000,00**
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE	$ 14.000.000,00			**$ 14.000.000,00**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 53.000.000,00			**$ 53.000.000,00**
GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL	$ 7.000.000,00			**$ 7.000.000,00**
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	$ 4.000.000,00			**$ 4.000.000,00**
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO	$ 8.000.000,00			**$ 8.000.000,00**
INFORME FINAL EJECUTIVO	$ -			**$ -**
SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 3	**$ 208.000.000,00**			**$ 208.000.000,00**
HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ				
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES,RECOPILACIÓN Y ANÁLISISDEANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)	$ 19.000.000,00			**$ 19.000.000,00**
ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	$ 6.000.000,00			**$ 6.000.000,00**
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	$ 10.000.000,00			**$ 10.000.000,00**
ESTUDIO DE GEOTECNIA	$ 11.000.000,00			**$ 11.000.000,00**
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL	$ 11.000.000,00			**$ 11.000.000,00**
ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO	$ 18.000.000,00			**$ 18.000.000,00**
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO	$ 28.000.000,00			**$ 28.000.000,00**
ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 19.000.000,00			**$ 19.000.000,00**
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE	$ 14.000.000,00			**$ 14.000.000,00**

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 53.000.000,00			**$ 53.000.000,00**
GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL	$ 7.000.000,00			**$ 7.000.000,00**
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	$ 4.000.000,00			**$ 4.000.000,00**
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO	$ 8.000.000,00			**$ 8.000.000,00**
INFORME FINAL EJECUTIVO	$ -			**$ -**
SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 4	**$ 208.000.000,00**			**$ 208.000.000,00**

HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA VICTORIA				
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES,RECOPILACIÓN Y ANÁLISISDEANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)	$ 19.000.000,00			**$ 19.000.000,00**
ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	$ 6.000.000,00			**$ 6.000.000,00**
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	$ 10.000.000,00			**$ 10.000.000,00**
ESTUDIO DE GEOTECNIA	$ 11.000.000,00			**$ 11.000.000,00**
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL	$ 11.000.000,00			**$ 11.000.000,00**
ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO	$ 18.000.000,00			**$ 18.000.000,00**
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO	$ 28.000.000,00			**$ 28.000.000,00**
ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 19.000.000,00			**$ 19.000.000,00**
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE	$ 14.000.000,00			**$ 14.000.000,00**
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD	$ 53.000.000,00			**$ 53.000.000,00**
GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL	$ 7.000.000,00			**$ 7.000.000,00**
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	$ 4.000.000,00			**$ 4.000.000,00**
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO	$ 8.000.000,00			**$ 8.000.000,00**
INFORME FINAL EJECUTIVO	$ -			**$ -**
SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 5	**$ 208.000.000,00**			**$ 208.000.000,00**
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)	**$ 1.010.000.000,00**			**$ 1.010.000.000,00**
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS				
Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 100.750.000,00			**$ 100.750.000,00**
Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	$ 15.000.000,00			**$ 15.000.000,00**
Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 42.000.000,00			**$ 42.000.000,00**
Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	$ 2.000.000,00	$ 20.000.000,00		**$ 22.000.000,00**
Levantamiento topobatimétrico detallado (S/comprobante) (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	$ 24.000.000,00	$ 12.000.000,00		**$ 36.000.000,00**
Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 6.100.000,00			**$ 6.100.000,00**
Otros transportes especiales (s/comprobante) (vehículo/día, vehículo/mes (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros).	$ 125.000.000,00			**$ 125.000.000,00**
Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	$ 1.000.000,00			**$ 1.000.000,00**
EdicióndeInformesFinalesdetodoslosvolúmenesMuelleAlternoPucarón(S/comprobante(Incluyeimpresión,ploteodeplanchasoriginalenpapeldeseguridad,unacopiaenpapelbondycuatrocopiasen archivos magnéticos)	$ 5.000.000,00			**$ 5.000.000,00**
EdicióndeInformesFinalesdetodoslosvolúmenesMuelleTaraira(S/comprobante(Incluyeimpresión,ploteodeplanchasoriginalenpapeldeseguridad,unacopiaenpapelbondycuatrocopiasen archivos magnéticos)	$ 5.000.000,00			**$ 5.000.000,00**
EdicióndeInformesFinalesdetodoslosvolúmenesMuellePacoa(S/comprobante(Incluyeimpresión,ploteodeplanchasoriginalenpapeldeseguridad,unacopiaenpapelbondycuatrocopiasenarchivos magnéticos)	$ 5.000.000,00			**$ 5.000.000,00**
EdicióndeInformesFinalesdetodoslosvolúmenesMuelleMiriti-Paraná(S/comprobante(Incluyeimpresión,ploteodeplanchasoriginalenpapeldeseguridad,unacopiaenpapelbondycuatrocopiasen archivos magnéticos)	$ 5.000.000,00			**$ 5.000.000,00**
EdicióndeInformesFinalesdetodoslosvolúmenesMuelleLaVictoria(S/comprobante(Incluyeimpresión,ploteodeplanchasoriginalenpapeldeseguridad,unacopiaenpapelbondycuatrocopiasen archivos magnéticos)	$ 5.000.000,00			**$ 5.000.000,00**
Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	$ 20.000.000,00			**$ 20.000.000,00**
Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	$ 3.600.000,00			**$ 3.600.000,00**
Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (viáticos))	$ 152.000.000,00			**$ 152.000.000,00**
Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viáticos))	$ 75.000.000,00			**$ 75.000.000,00**
Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, batimetrías, monitoreo según requerimientos ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros)	$ 208.050.625,00			**$ 208.050.625,00**

Ensayos de Batimetría y socavación (S/comprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría, edición de planos, entre otros)	$ 119.200.000,00			**$ 119.200.000,00**
Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	$ 83.000.000,00			**$ 83.000.000,00**
Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	$ 295.947.032,00	$ (227.510.000,00)		**$ 68.437.032,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS (E)	**$ 1.297.647.657,00**	**$ (195.510.000)**		**$ 1.102.137.657,00**
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (C) + (D) + (E) = (F)	**$ 2.464.055.657,00**	**$ -**		**$ 2.464.055.657,00**
IVA = 19% * (F) = (G)	**$ 468.170.575,00**	**$ -**		**$ 468.170.575,00**
COSTO TOTAL = (F) + (G)	**$ 2.932.226.232,00**	**$ -**		**$ 2.932.226.232,00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Diciembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 0% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del __1____%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/12/2025 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ -
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ 1.232.027.828,57 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud) de _____ (año) $ -

Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 2.932.226.232,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Por medio de la presente la interventoría conceptúa que está de acuerdo con la solicitud de prórroga del contrato de la referencia, realizada mediante oficio CIF-OP-2025-1914-009, por un término de seis meses (6.0 meses), para cumplir con el alcance contractual, en los términos establecidos en los documentos del contrato 1914-2025.

Lo anterior debido a que durante la ejecución de las actividades la zona del proyecto, se presentaron circunstancias extraordinarias y no previsibles vinculadas a los procesos de interacción comunitaria y socialización con las comunidades ribereñas e indígenas presentes en el área de influencia del proyecto, ha dificultado realizar las socializaciones dentro de la vigencia fiscal 2025, se solicita la prórroga del plazo contractual por un término de seis meses (6,0) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de junio de 2026, con el fin de culminar adecuadamente las actividades de campo y concertación.

El contrato No. 1914 de 2025, cuyo objeto es ““ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1”, fue adjudicado el 11 de noviembre de 2025 en el marco del proceso de selección CMA-DTE-SPI-044-2025 en la plataforma SECOP II, e inició su ejecución el 16 de diciembre de 2025.

Es pertinente señalar que las fechas de adjudicación, suscripción e inicio del contrato se encuentran muy próximas al cierre presupuestal de la vigencia 2025. En este contexto, la identificación de la necesidad de extensión del plazo se produjo en un momento en el cual no era técnica ni materialmente viable adelantar el trámite de solicitud de vigencias futuras. La Circular Externa 036 del 21 de noviembre de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció el 16 de diciembre de 2025 como fecha límite para la radicación de dichas solicitudes, las cuales requieren el cumplimiento previo de etapas internas y revisiones interinstitucionales obligatorias. En consecuencia, no resultaba jurídicamente procedente radicar una solicitud de vigencias futuras para el presente contrato.

La prórroga solicitada no implica adición de recursos y se limita a permitir la continuidad de las actividades contractuales pendientes, necesarias para el cumplimiento integral del objeto contractual, evitando retrasos adicionales y garantizando la adecuada ejecución del proyecto, en concordancia con los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad fiscal.

Desde el punto de vista presupuestal, el contrato cuenta con compromisos válidamente adquiridos durante la vigencia fiscal 2025, respaldados por el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el Registro Presupuestal (RP). A la fecha de cierre de la vigencia subsisten obligaciones pendientes de ejecución derivadas de compromisos jurídicamente perfeccionados durante 2025, lo que hace procedente y obligatorio constituir la Reserva Presupuestal 2025, conforme a lo previsto en el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

La constitución de dicha reserva se realiza en estricto cumplimiento del principio de anualidad y se limita a cubrir obligaciones previamente contraídas, sin generar modificaciones al valor contractual ni nuevos compromisos fiscales. De esta manera, se garantiza la trazabilidad presupuestal, la correcta administración de los recursos públicos y el cumplimiento de los lineamientos de cierre establecidos por el Ministerio de Hacienda.

En virtud de lo anterior, se considera técnicamente justificada la solicitud de prórroga sin adición de recursos y la constitución de la Reserva Presupuestal correspondiente a la vigencia 2025, como mecanismos necesarios y ajustados a la normatividad vigente para asegurar la continuidad, culminación y adecuada ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del Instituto.

JURÍDICA:

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, define de manera clara y taxativa los fines de la contratación estatal, deberes, derechos, atribuciones y límites de las Entidades Estatales, así como de los Contratistas, estipulando dentro de sus disposiciones, entre otras, las que a continuación señalamos;

ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (Negrilla Fuera de Texto original)
ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:
1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. (Negrilla Fuera de Texto original)
ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.
En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.
De la lectura del texto anteriormente referido se deduce que:
1. Las Entidades Estatales tienen a su cargo la implementación de medidas necesarias para el cabal cumplimiento de los fines del Estado, dentro de lo cual se encuentra la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.
2. Bajo la autonomía de las partes, se podrán introducir modificaciones al Contrato inicial, no obstante, ello no podrá superar los límites existentes sobre el particular.
3. Así también, la Ley otorga la facultad a las entidades de celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. No obstante, se reitera que, dichos acuerdos y contratos no podrán en ningún momento superar los límites existentes sobre el particular.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/12/2025 (Día / Mes / Año)

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

La prórroga solicitada no afecta el valor total del contrato ni la asignación presupuestal.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

NO APLICA.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

NO APLICA.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 01113-10656 CPITVC

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: Paola Andrea Mahecha Quintero
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Vo.Bo.Firma
Nombre: JULIAN ANDRES MANJARRES
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por MERCHAN CARREÑO SIRLEY DABEIBA
Firma
Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 01113-10666 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CIF-OP-2025-1914-009

Cajicá, 16 de diciembre de 2025

Ingeniero
RICARDO COGOLLO PONCE
Representante Legal
Interventoría CONCEP SAS
internavegabilidad2025@gmail.com
Carrera 49 No.75-58 - Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO 1914 DE 2025 **CON OBJETO:** CONTRATO 1914 DE 2025 **CON OBJETO:** "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1".

ASUNTO: Solicitud de Prorroga No.1 Contrato 1914 de 2025 – Lote 1.

Respetado Ingeniero Cogollo,

En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL**, quien ejecuta actualmente el Contrato citado en la referencia, por medio de la presente nos permitimos solicitar a la interventoría se estudie y apruebe la viabilidad de gestionar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS el siguiente tramite.

1. OBJETO DE LA SOLICITUD

Solicitud de prórroga No. 1 al contrato 1914 de 2025.

2. ANTECEDENTES

- Que el 24 de noviembre del 2025 el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS y el CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL, suscribieron el contrato No. 1914 de 2025, cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1".

- Conforme a las disposiciones contractuales, se impartió orden de inicio el día 16 de diciembre de 2025, precisando que, el plazo contractual esta defino hasta el día 31 de diciembre de 2025.

- Que de acuerdo con la CLAUSULA OCTAVA del contrato, el plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre del 2025, a partir de la fecha de la Orden de inicio.

- Que el valor total del Contrato incluido IVA es **DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS** M/CTE ($2.932.226.232)

Una vez revisados los antecedentes del presente contrato, nos permitimos exponer las circunstancias que llevan al presente Consorcio Consultor a solicitar la presente prórroga:

3. JUSTIFICACIÓN

3.1 Justificación Técnica

- Teniendo que en cuenta que las actividades programadas y el plazo dado para su ejecución es superior al 31 de diciembre de 2025, se requiere reprogramar el Contrato No. 1914 de 2025 para garantizar la ejecución de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

- Los estudios contemplan identificación, mejoramiento y estudios y diseños deben garantizar una infraestructura fluvial funcional, segura, accesible y adaptable a las condiciones ambientales y sociales del entorno. Deberá considerar soluciones arquitectónicas y técnicas que respondan a las necesidades de operación portuaria y a la dinámica del río, incluyendo medidas para enfrentar la variabilidad hídrica mediante estructuras flotantes o mecanismos de adaptación morfológica. Así mismo, debe prever zonas de atención a pasajeros diseñadas bajo principios de accesibilidad universal, que faciliten la circulación de personas con discapacidad, adultos mayores.

- El alcance del proyecto está compuesto por componentes importantes, los cuales deberán desarrollarse de acuerdo con los plazos y actividades descritas a continuación para los hitos I, II, III, IV Y V, el cual se desglosa de la siguiente manera:

HITO	Tipo de intervención
HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARÓN	Mejoramiento muelle
HITO II - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA	Mejoramiento muelle
HITO III - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PACOA	Construcción Muelle Nuevo
HITO IV - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ	Construcción Muelle Nuevo
HITO V - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA VICTORIA	Construcción Muelle Nuevo

Los volúmenes que conforman el LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL infraestructura ligada, a los cuales se requiere llevar a cabo las actividades necesarias para la elaboración de los estudios y diseños son los siguientes:

- VOLUMEN I ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL).
- VOLUMEN II ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO
- VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA
- VOLUMEN IV ESTUDIO DE GEOTECNIA.
- VOLUMEN V ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL
  VOLUMEN VI ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO.
- VOLUMEN VII ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO.
- VOLUMEN VIII ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
- VOLUMEN IX DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE.
- VOLUMEN X GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN XI GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL.
- VOLUMEN XII ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
- VOLUMEN XIII ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO.
- VOLUMEN XIV INFORME FINAL EJECUTIVO.

Se deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el "Anexo Técnico" y en los Requerimientos Técnicos definidos por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.

- El proyecto Lote 1 contempla la elaboración de estudios y diseños de Fase II para mejorar la infraestructura fluvial en Pucaron, Taraira y Pacoa (Vaupés) y Miriti-Parana, La Victoria (Amazonas), territorios de baja ruralidad, difícil acceso y con predominancia de Autoridades Tradicionales Indígenas como principales estructuras de gobernanza.

  Estas comunidades constituyen el núcleo de la movilidad, abastecimiento y conectividad regional, por lo que la viabilidad de los diseños depende de la concertación directa con Líderes de Zona y organizaciones indígenas.

- Durante la ejecución del componente social, se identificaron condiciones extraordinarias e imprevisibles asociadas a los protocolos internos de las Autoridades Tradicionales Indígenas en aras de dar cumplimiento al Convenio 169 – Ley 21 de 1991 y la sentencia T-039 del 19 de febrero de 2024, entre ellos:

  - Tiempos propios de convocatoria, deliberación y toma de decisiones colectivas.
  - Requerimiento de mínimo tres reuniones por hito, cuya programación está sujeta a disponibilidad de autoridades y acuerdos internos.

  Estos factores han impedido el desarrollo completo de las actividades de concertación dentro de la vigencia, afectando el cronograma técnico sin responsabilidad del contratista ni de la entidad.

3.2 Justificación para la Constitución de Reserva Presupuestal

De acuerdo con el artículo 2.8.1.7.3.1 del Decreto 1068 de 2015, la constitución de reserva presupuestal procede cuando existen compromisos derivados de obligaciones contractuales que no pudieron ejecutarse dentro de la vigencia fiscal por causas no atribuibles a la entidad.

A la luz de este marco normativo, se expone lo siguiente:

La ejecución del componente social del proyecto se vio afectada por la aparición de circunstancias socio-organizativas no previsibles, entre ellas:

- La necesidad de ajustarse a los protocolos autónomos de gobernanza indígena, los cuales establecen tiempos y mecanismos propios para avalar proyectos de infraestructura.
- La obligatoriedad de concertar con múltiples Autoridades Tradicionales por tratarse de territorios no municipalizados.
- Las restricciones logísticas derivadas de condiciones climáticas en la Amazonía que afectan la navegabilidad y acceso a las comunidades.

Estos procesos, autónomos y ajenos al control de la entidad y del contratista, no podían anticiparse en la etapa precontractual y resultan inevitables, configurando una causal de caso fortuito que impidió realizar en tiempo las socializaciones requeridas por el objeto contractual.

De igual manera se aclara que, el contratista ha adelantado las actividades conforme al cronograma y ha efectuado los desplazamientos requeridos, los retrasos provienen estrictamente de los tiempos internos de decisión de las comunidades indígenas, los cuales no pueden ser modificados ni acelerados por terceros.

Como consecuencia de que no se han podido adelantar las socializaciones obligatorias para avanzar en etapas de la elaboración de los estudios y diseños, no fue posible ejecutar la totalidad de actividades previstas para la vigencia, certificar el avance del componente social, requisito previo para otras disciplinas técnicas y comprometer los recursos asociados a productos que dependen de la validación comunitaria.

Por tanto, parte del presupuesto del contrato no se encuentra ejecutado ni comprometido, y se requiere su traslado al siguiente periodo fiscal mediante la constitución de reserva presupuestal, garantizando la continuidad técnica del proyecto.

En conclusión, debido a las condiciones propias de los territorios indígenas, la complejidad de los protocolos de concertación y la imposibilidad material de realizar las socializaciones dentro de la vigencia:

Se solicita prórroga del plazo contractual, con el fin de culminar de manera adecuada las actividades de campo y concertación.

La prórroga requerida no implica adición de recursos y se limita a permitir la continuidad de las actividades contractuales pendientes, cuyo cumplimiento es necesario para finalizar las obligaciones

pactadas, evitar retrasos en el cronograma técnico y garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual. Esta continuidad se enmarca en los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad fiscal, dado que no se generan nuevos compromisos presupuestales para la vigencia siguiente.

En cuanto a los aspectos presupuestales, el contrato cuenta con compromisos válidamente adquiridos durante la vigencia fiscal 2025, respaldados en el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y en el Registro Presupuestal (RP). A la fecha de cierre de la vigencia, subsisten obligaciones pendientes de ejecución derivadas de compromisos jurídicamente perfeccionados durante 2025. En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 del mismo Estatuto, resulta procedente y obligatorio constituir Reserva Presupuestal 2025 para garantizar la continuidad de la ejecución contractual durante la vigencia 2026:

(…) *"Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen."* ***(…)***

La reserva se solicita en estricto cumplimiento del principio de anualidad, y se limita a cubrir obligaciones previamente contraídas, sin generar modificaciones al valor contractual ni nuevos compromisos fiscales.

La constitución de esta reserva cumple plenamente con los criterios de control fiscal y presupuestal, debido a que las apropiaciones comprometidas en 2025 cuentan con sustento documental suficiente, el contrato se encuentra en ejecución y las obligaciones a cumplir en 2026 derivan directamente de compromisos adquiridos dentro de la vigencia fiscal que se cierra. De esta manera se garantiza la trazabilidad presupuestal y la correcta administración de los recursos públicos, respetando los lineamientos de cierre establecidos por el Ministerio de Hacienda y ajustándose a los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en la ejecución del gasto.

En virtud de lo anterior, se considera plenamente justificada la solicitud de prórroga sin adición de recursos y la constitución de la Reserva Presupuestal de la vigencia 2025, como mecanismos necesarios y ajustados a la normatividad vigente para asegurar la continuidad, culminación y adecuada ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del Instituto.

3.3 Justificación jurídica

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, define de manera clara y taxativa los fines de la contratación estatal, deberes, derechos, atribuciones y límites de las Entidades Estatales, así como de los Contratistas, estipulando dentro de sus disposiciones, entre otras, las que a continuación señalamos:

- ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (Negrilla Fuera de Texto original)

- ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

  1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. (Negrilla Fuera de Texto original)

- ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.

De la lectura del texto anteriormente referido se deduce que:

1. Las Entidades Estatales tienen a su cargo la implementación de medidas necesarias para el cabal cumplimiento de los fines del Estado, dentro de lo cual se encuentra la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

2. Bajo la autonomía de las partes, se podrán introducir modificaciones al Contrato inicial, no obstante, ello no podrá superar los límites existentes sobre el particular.

3. Así también, la Ley otorga la facultad a las entidades de celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. No obstante, se reitera que, dichos acuerdos y contratos no podrán en ningún momento superar los límites existentes sobre el particular.

4. SOLICITUD

- Por lo expresado en el numeral 3 del presente documento y que el plazo de ejecución vence el 31 de diciembre del 2025, se solicita considerar prorrogar el Contrato No. 1914 de 2025, hasta el 30 de junio de 2026, así un tiempo adicional de Seis (6) meses.

Quedamos atentos a su pronta y positiva respuesta, para que, una vez sea aprobada la presente solicitud de Prorroga, se realice el control de avance del proyecto enmarcándolo dentro de la condición actualizada.

Los documentos que soportan la presente solicitud son los siguientes:

Anexos:

- MEPI-MN1-IN-12-FR-1 - SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORÍA.
- MEPI-MN1-IN-15-FR-13 - SEGUIMIENTO DE GARANTIAS.
- MEPI-MN1-IN-9-FR-2 - PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
- Cronograma
- Antecedentes

Cordialmente,



MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
Representante Legal

Anexo: Catorce (14) folios

Copia: Instituto Nacional de Vías. Paola Andrea Mahecha. Apoyo a la Supervisión
Instituto Nacional de Vías. Sirley Dabeiba Merchán. Subdirectora de Planificación de Infraestructura

Barranquilla, 19 de diciembre de 2025

II-871- L1-006-2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS.
Atn. Dra. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Subdirectora de Planificación de Infraestructura Bogotá D.C.
Bogotá D.C.

Ref.: CONTRATO 1914 DE 2025 CON OBJETO: CONTRATO 1914 DE 2025 CON OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1".

Asunto: Prórroga por 6.0 meses Lote 1

Respetada ingeniera Merchan,

Por medio de la presente la interventoría conceptúa que está de acuerdo con la solicitud de prórroga del contrato de la referencia, realizada mediante oficio CIF-OP-2025-1914-009, por un término de Seis meses (6.0 meses), para cumplir con el alcance contractual, en los términos establecidos en los documentos del contrato 1914-2025.

Lo anterior debido a que durante la ejecución de las actividades la zona del proyecto, se presentaron circunstancias extraordinarias y no previsibles vinculadas a los procesos de interacción comunitaria y socialización con las comunidades ribereñas e indígenas presentes en el área de influencia del proyecto, ha dificultado realizar las socializaciones dentro de la vigencia fiscal 2025, se solicita la prórroga del plazo contractual por un término de seis meses (6,0) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de junio de 2026, con el fin de culminar adecuadamente las actividades de campo y concertación.

El contrato No. 1914 de 2025, cuyo objeto es ""ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1", fue adjudicado el 11 de noviembre de 2025 en el marco del proceso de selección CMA-DTE-SPI-044-2025 en la plataforma SECOP II, e inició su ejecución el 16 de diciembre de 2025.

Es pertinente señalar que las fechas de adjudicación, suscripción e inicio del contrato se encuentran muy próximas al cierre presupuestal de la vigencia 2025. En este contexto, la identificación de la necesidad de extensión del plazo se produjo en un momento en el cual no era técnica ni materialmente viable adelantar el trámite de solicitud de vigencias futuras. La Circular Externa 036 del 21 de noviembre de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció el 16 de diciembre de 2025 como fecha límite para la radicación de dichas solicitudes, las cuales requieren el cumplimiento previo de etapas internas y revisiones

interinstitucionales obligatorias. En consecuencia, no resultaba jurídicamente procedente radicar una solicitud de vigencias futuras para el presente contrato.

La prórroga solicitada no implica adición de recursos y se limita a permitir la continuidad de las actividades contractuales pendientes, necesarias para el cumplimiento integral del objeto contractual, evitando retrasos adicionales y garantizando la adecuada ejecución del proyecto, en concordancia con los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad fiscal.

Desde el punto de vista presupuestal, el contrato cuenta con compromisos válidamente adquiridos durante la vigencia fiscal 2025, respaldados por el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el Registro Presupuestal (RP). A la fecha de cierre de la vigencia subsisten obligaciones pendientes de ejecución derivadas de compromisos jurídicamente perfeccionados durante 2025, lo que hace procedente y obligatorio constituir la Reserva Presupuestal 2025, conforme a lo previsto en el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

La constitución de dicha reserva se realiza en estricto cumplimiento del principio de anualidad y se limita a cubrir obligaciones previamente contraídas, sin generar modificaciones al valor contractual ni nuevos compromisos fiscales. De esta manera, se garantiza la trazabilidad presupuestal, la correcta administración de los recursos públicos y el cumplimiento de los lineamientos de cierre establecidos por el Ministerio de Hacienda.


En virtud de lo anterior, se considera técnicamente justificada la solicitud de prórroga sin adición de recursos y la constitución de la Reserva Presupuestal correspondiente a la vigencia 2025, como mecanismos necesarios y ajustados a la normatividad vigente para asegurar la continuidad, culminación y adecuada ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del Instituto.

Atentamente,

RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
C.C. 6.872.531 de Montería
Rep. Legal CONCEP S.A.S.

Copia.: Ing. Paola Mahecha Quintero – Apoyo a la supervisión
Ing. Patricia Morales Padron – supervisor de interventoría
Atencionciudadano@invias.gov.co


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**CRONOGRAMA ESTUDIOS Y DISEÑOS RED FLUVIAL LOTE 1**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 2.932.226.232,00**
2		**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 2.932.226.232,00**
3		**GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 156.408.000,00**
4		Director de Consultoría	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 25.848.000,00
5		Ingeniero residente de campo y estudios	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 59.040.000,00
6		Ingeniero Auxiliar	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 58.896.000,00
7		Dibujante	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 12.624.000,00
8		**GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 1.010.000.000,00**
9		**HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARÓN**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 193.000.000,00**
10		**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	**10 días**	**jue 1/01/26**	**mié 14/01/26**		**$ 17.000.000,00**
11		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 1/01/26	mié 7/01/26		$ 1.700.000,00
12		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 8/01/26	mié 14/01/26	11	$ 15.300.000,00
13		**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 6.000.000,00**
14		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	12	$ 600.000,00
15		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	14	$ 3.600.000,00
16		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	15	$ 1.800.000,00
17		**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
18		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	12	$ 1.000.000,00
19		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	18	$ 5.000.000,00
20		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	19CC	$ 2.000.000,00
21		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	20	$ 2.000.000,00
22		**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
23		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	18CC	$ 1.000.000,00
24		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	23	$ 6.000.000,00
25		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	24	$ 3.000.000,00
26		**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	**25 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/02/26**		**$ 10.000.000,00**
27		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	12	$ 1.000.000,00
28		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	15 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26	27	$ 4.500.000,00
29		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	28	$ 4.500.000,00
30		**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**mié 4/02/26**		**$ 15.000.000,00**

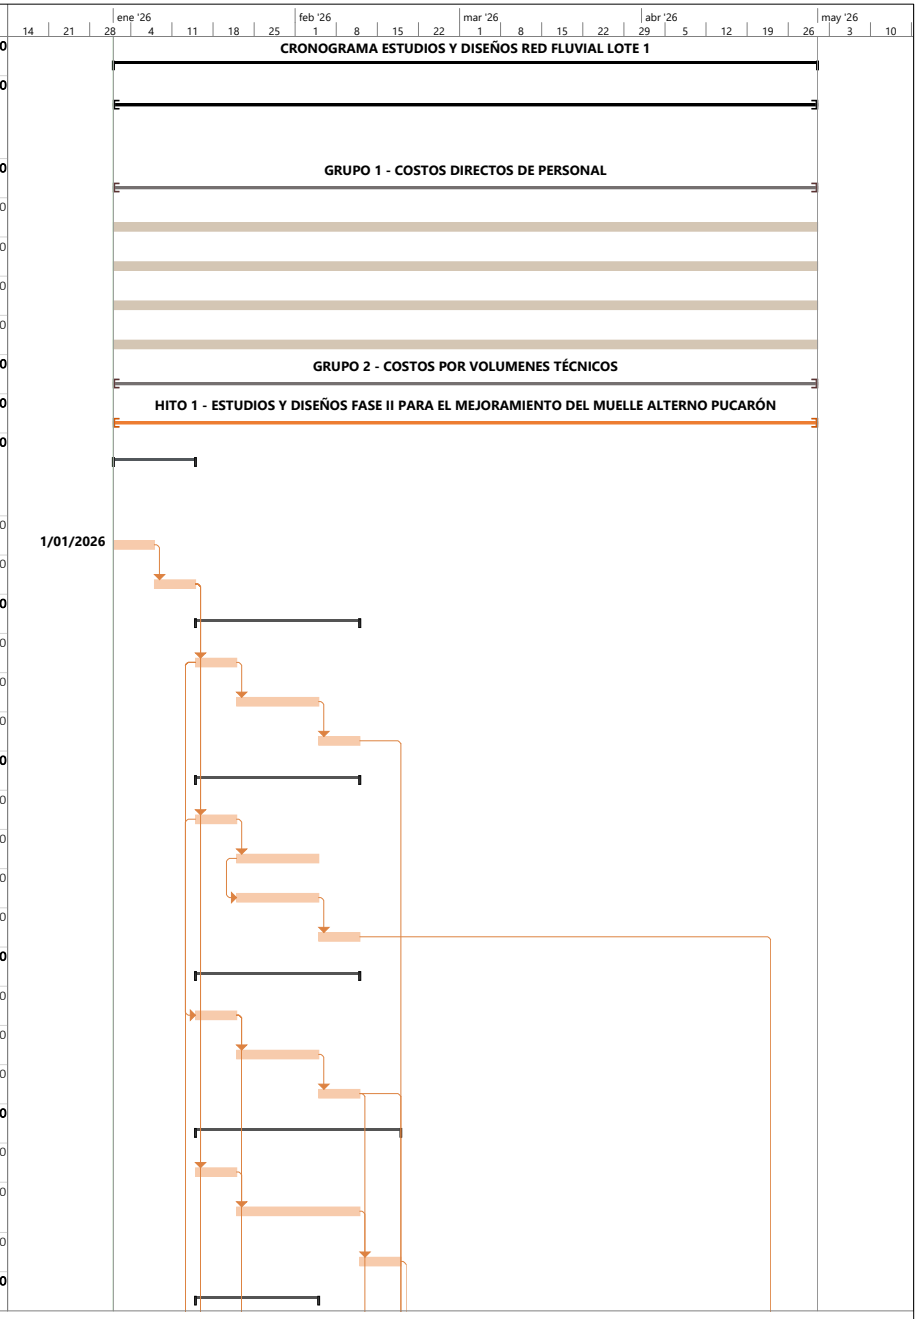

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
31		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	12	$ 1.500.000,00
32		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	12 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26	31	$ 13.500.000,00
33		**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	**12 días**	**jue 19/02/26**	**vie 6/03/26**		**$ 27.000.000,00**
34		Metodología aprobada por Interventoría	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	16;25;32;29	$ 2.700.000,00
35		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	34	$ 24.300.000,00
36		**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	**15 días**	**lun 9/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 13.000.000,00**
37		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	35	$ 1.300.000,00
38		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	37	$ 11.700.000,00
39		**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 16.000.000,00**
40		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	38	$ 1.600.000,00
41		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	40	$ 9.600.000,00
42		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	41	$ 4.800.000,00
43		**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 53.000.000,00**
44		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	12	$ 5.300.000,00
45		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	12	$ 5.300.000,00
46		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	12	$ 10.600.000,00
47		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	46	$ 10.600.000,00
48		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	47	$ 5.300.000,00
49		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 2/04/26	mié 8/04/26	48	$ 15.900.000,00
50		**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 6.000.000,00**
51		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	12	$ 600.000,00
52		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	50 días	jue 29/01/26	mié 8/04/26	51	$ 5.400.000,00
53		**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**		**$ 4.000.000,00**
54		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	42;49;52	$ 400.000,00
55		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26	54	$ 3.600.000,00
56		**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	**45 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 6.000.000,00**
57		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	44CC	$ 600.000,00
58		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	35 días	jue 29/01/26	mié 18/03/26	57	$ 5.400.000,00
59		**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 0,00**
60		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	55CC;58;21	$ 0,00
61		**HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 193.000.000,00**

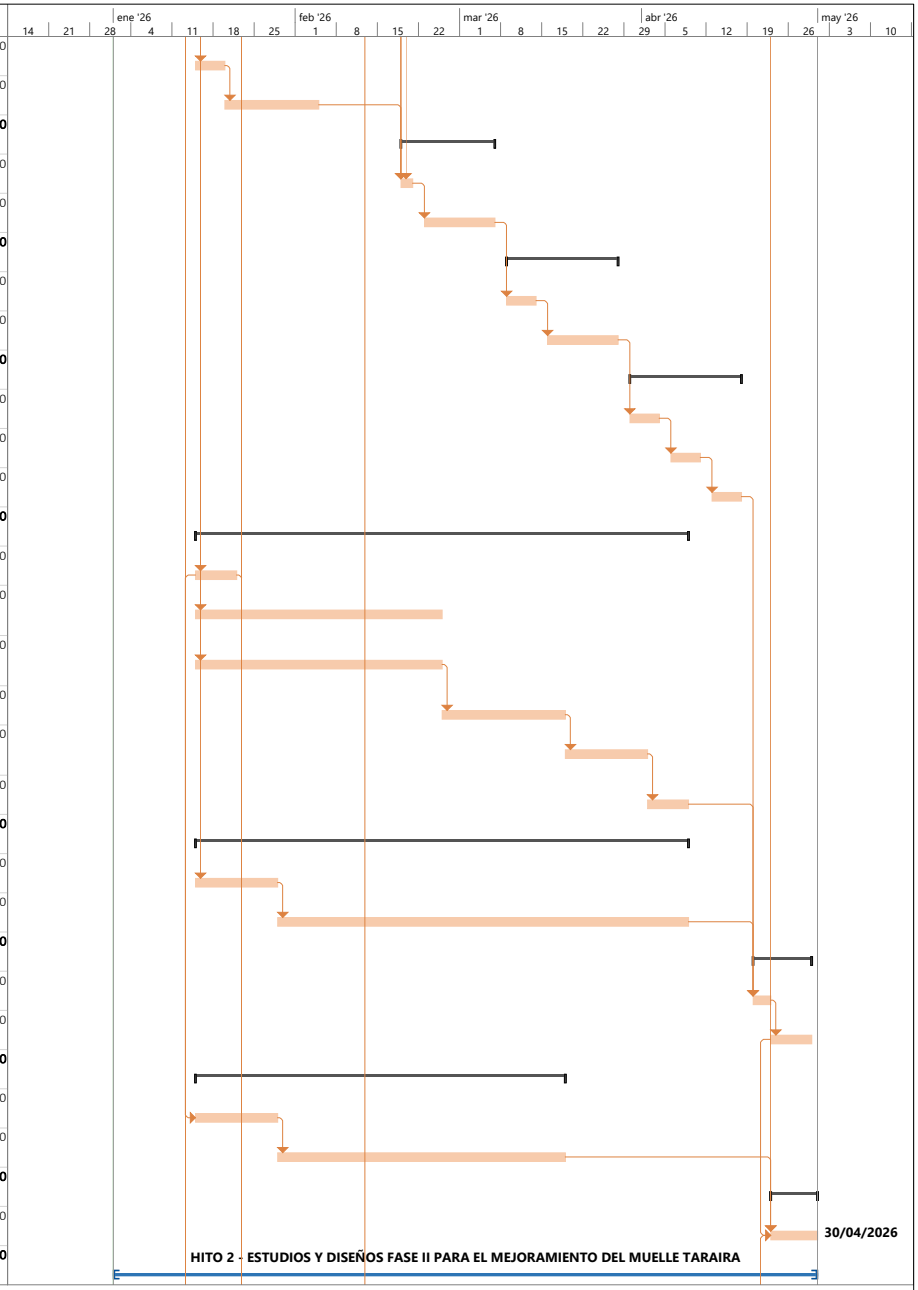

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
62		**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	**10 días**	**jue 1/01/26**	**mié 14/01/26**		**$ 17.000.000,00**
63		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 1/01/26	mié 7/01/26		$ 1.700.000,00
64		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 8/01/26	mié 14/01/26	63	$ 15.300.000,00
65		**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 6.000.000,00**
66		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	64	$ 600.000,00
67		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	66	$ 3.600.000,00
68		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	67	$ 1.800.000,00
69		**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
70		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	64	$ 1.000.000,00
71		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	70	$ 5.000.000,00
72		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	71CC	$ 2.000.000,00
73		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	72	$ 2.000.000,00
74		**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
75		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	70CC	$ 1.000.000,00
76		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	75	$ 6.000.000,00
77		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	76	$ 3.000.000,00
78		**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	**25 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/02/26**		**$ 10.000.000,00**
79		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	64	$ 1.000.000,00
80		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	15 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26	79	$ 4.500.000,00
81		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	80	$ 4.500.000,00
82		**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**mié 4/02/26**		**$ 15.000.000,00**
83		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	64	$ 1.500.000,00
84		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	12 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26	83	$ 13.500.000,00
85		**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	**12 días**	**jue 19/02/26**	**vie 6/03/26**		**$ 27.000.000,00**
86		Metodología aprobada por Interventoría	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	68;77;84;81	$ 2.700.000,00
87		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	86	$ 24.300.000,00
88		**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	**15 días**	**lun 9/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 13.000.000,00**
89		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	87	$ 1.300.000,00
90		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	89	$ 11.700.000,00
91		**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 16.000.000,00**
92		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	90	$ 1.600.000,00

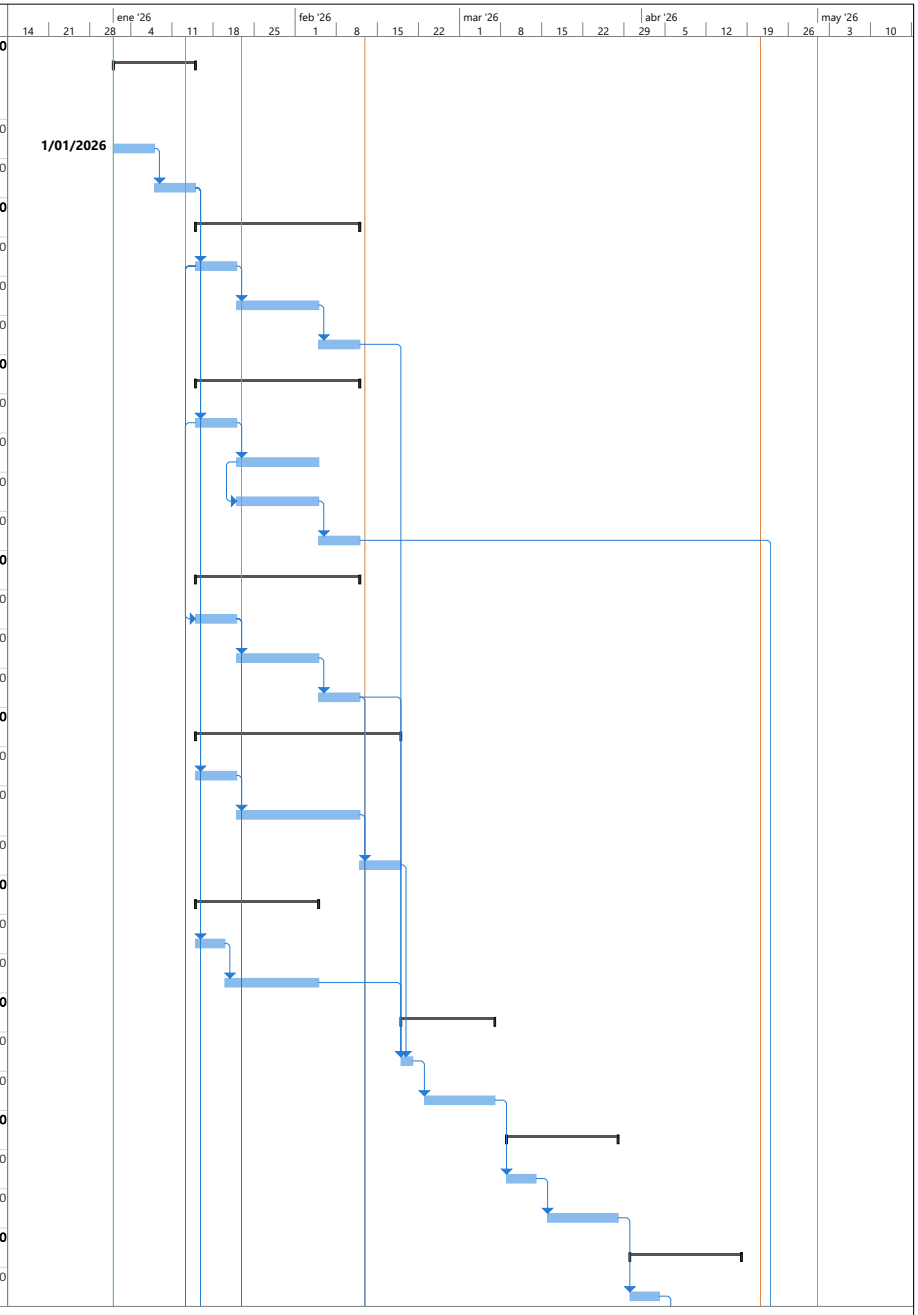

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
93		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	92	$ 9.600.000,00
94		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	93	$ 4.800.000,00
95		**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 53.000.000,00**
96		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	64	$ 5.300.000,00
97		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	64	$ 5.300.000,00
98		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	64	$ 10.600.000,00
99		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	98	$ 10.600.000,00
100		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	99	$ 5.300.000,00
101		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 2/04/26	mié 8/04/26	100	$ 15.900.000,00
102		**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 6.000.000,00**
103		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	64	$ 600.000,00
104		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	50 días	jue 29/01/26	mié 8/04/26	103	$ 5.400.000,00
105		**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**		**$ 4.000.000,00**
106		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	94;101;104	$ 400.000,00
107		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26	106	$ 3.600.000,00
108		**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	**45 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 6.000.000,00**
109		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	96CC	$ 600.000,00
110		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	35 días	jue 29/01/26	mié 18/03/26	109	$ 5.400.000,00
111		**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 0,00**
112		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	73;107CC;110	$ 0,00
113		**HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PACOA**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 208.000.000,00**
114		**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	**10 días**	**jue 1/01/26**	**mié 14/01/26**		**$ 19.000.000,00**
115		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 1/01/26	mié 7/01/26		$ 1.900.000,00
116		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 8/01/26	mié 14/01/26	115	$ 17.100.000,00
117		**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 6.000.000,00**
118		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	116	$ 600.000,00
119		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	118	$ 3.600.000,00
120		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	119	$ 1.800.000,00
121		**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
122		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	116	$ 1.000.000,00

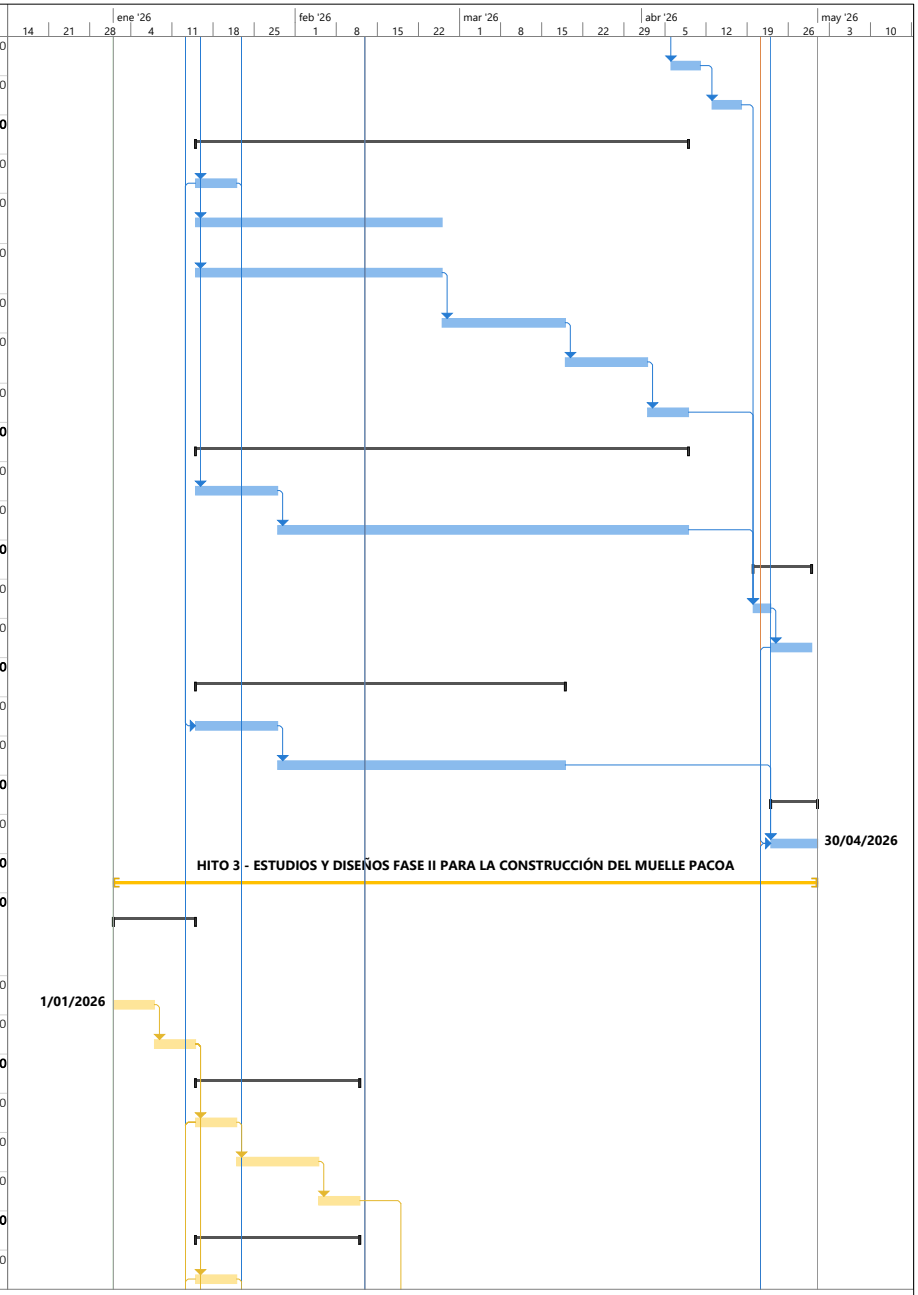

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
123		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	122	$ 5.000.000,00
124		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	123CC	$ 2.000.000,00
125		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	124	$ 2.000.000,00
126		**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 11.000.000,00**
127		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	122CC	$ 1.100.000,00
128		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	127	$ 6.600.000,00
129		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	128	$ 3.300.000,00
130		**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	**25 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/02/26**		**$ 11.000.000,00**
131		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	116	$ 1.100.000,00
132		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	15 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26	131	$ 4.950.000,00
133		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	132	$ 4.950.000,00
134		**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**mié 4/02/26**		**$ 18.000.000,00**
135		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	116	$ 1.800.000,00
136		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	12 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26	135	$ 16.200.000,00
137		**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	**12 días**	**jue 19/02/26**	**vie 6/03/26**		**$ 28.000.000,00**
138		Metodología aprobada por Interventoría	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	120;129;133;1	$ 2.800.000,00
139		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	138	$ 25.200.000,00
140		**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	**15 días**	**lun 9/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 14.000.000,00**
141		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	139	$ 1.400.000,00
142		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	141	$ 12.600.000,00
143		**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 19.000.000,00**
144		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	142	$ 1.900.000,00
145		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	144	$ 11.400.000,00
146		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	145	$ 5.700.000,00
147		**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 53.000.000,00**
148		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	116	$ 5.300.000,00
149		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	116	$ 5.300.000,00
150		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	116	$ 10.600.000,00
151		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	150	$ 10.600.000,00
152		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	151	$ 5.300.000,00
153		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 2/04/26	mié 8/04/26	152	$ 15.900.000,00

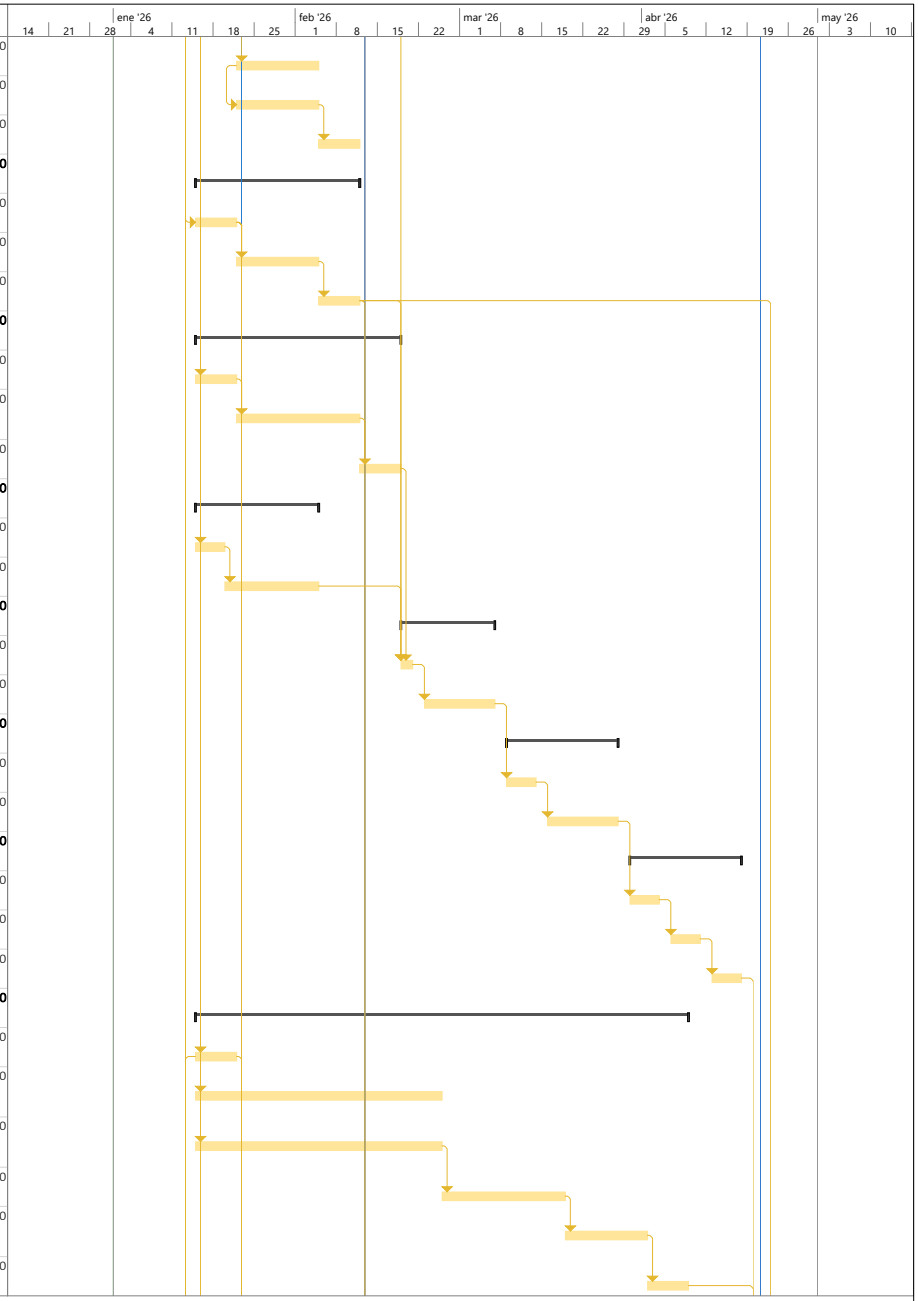

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
154		**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 7.000.000,00**
155		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	116	$ 700.000,00
156		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	50 días	jue 29/01/26	mié 8/04/26	155	$ 6.300.000,00
157		**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**		**$ 4.000.000,00**
158		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	146;153;156	$ 400.000,00
159		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26	158	$ 3.600.000,00
160		**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	**45 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 8.000.000,00**
161		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	148CC	$ 800.000,00
162		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	35 días	jue 29/01/26	mié 18/03/26	161	$ 7.200.000,00
163		**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 0,00**
164		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	129;159CC;162	$ 0,00
165		**HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 208.000.000,00**
166		**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	**10 días**	**jue 1/01/26**	**mié 14/01/26**		**$ 19.000.000,00**
167		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 1/01/26	mié 7/01/26		$ 1.900.000,00
168		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 8/01/26	mié 14/01/26	167	$ 17.100.000,00
169		**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 6.000.000,00**
170		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	168	$ 600.000,00
171		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	170	$ 3.600.000,00
172		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	171	$ 1.800.000,00
173		**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
174		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	168	$ 1.000.000,00
175		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	174	$ 5.000.000,00
176		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	175CC	$ 2.000.000,00
177		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	176	$ 2.000.000,00
178		**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 11.000.000,00**
179		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	174CC	$ 1.100.000,00
180		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	179	$ 6.600.000,00
181		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	180	$ 3.300.000,00
182		**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	**25 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/02/26**		**$ 11.000.000,00**
183		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	168	$ 1.100.000,00
184		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	15 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26	183	$ 4.950.000,00

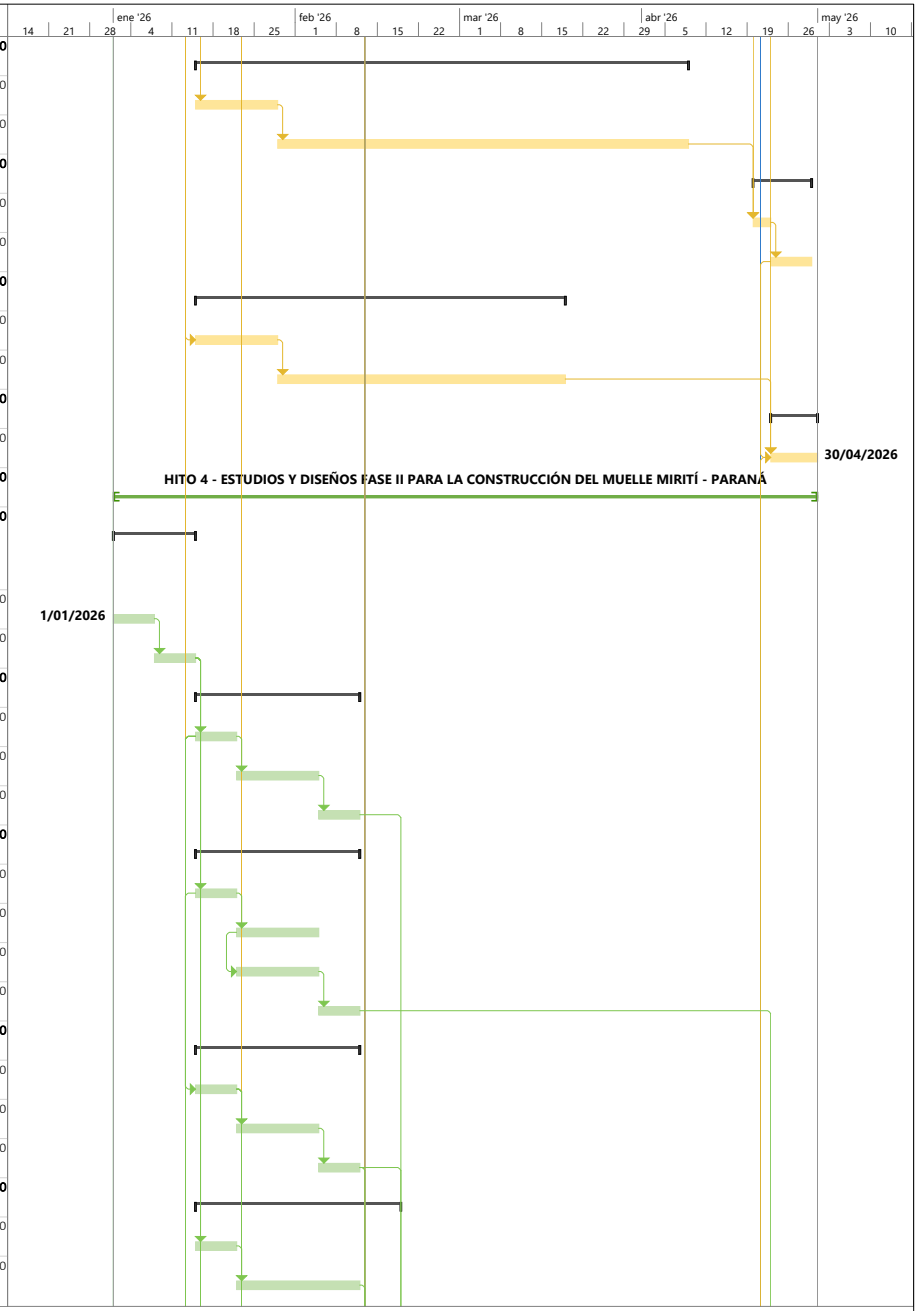

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
185		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	184	$ 4.950.000,00
186		**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**mié 4/02/26**		**$ 18.000.000,00**
187		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	168	$ 1.800.000,00
188		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	12 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26	187	$ 16.200.000,00
189		**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	**12 días**	**jue 19/02/26**	**vie 6/03/26**		**$ 28.000.000,00**
190		Metodología aprobada por Interventoría	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	172;181;185;1	$ 2.800.000,00
191		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	190	$ 25.200.000,00
192		**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	**15 días**	**lun 9/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 14.000.000,00**
193		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	191	$ 1.400.000,00
194		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	193	$ 12.600.000,00
195		**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 19.000.000,00**
196		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	194	$ 1.900.000,00
197		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	196	$ 11.400.000,00
198		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	197	$ 5.700.000,00
199		**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 53.000.000,00**
200		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	168	$ 5.300.000,00
201		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	168	$ 5.300.000,00
202		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	168	$ 10.600.000,00
203		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	202	$ 10.600.000,00
204		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	203	$ 5.300.000,00
205		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 2/04/26	mié 8/04/26	204	$ 15.900.000,00
206		**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 7.000.000,00**
207		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	168	$ 700.000,00
208		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	50 días	jue 29/01/26	mié 8/04/26	207	$ 6.300.000,00
209		**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**		**$ 4.000.000,00**
210		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	198;205;208	$ 400.000,00
211		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26	210	$ 3.600.000,00
212		**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	**45 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 8.000.000,00**
213		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	200CC	$ 800.000,00
214		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	35 días	jue 29/01/26	mié 18/03/26	213	$ 7.200.000,00
215		**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 0,00**

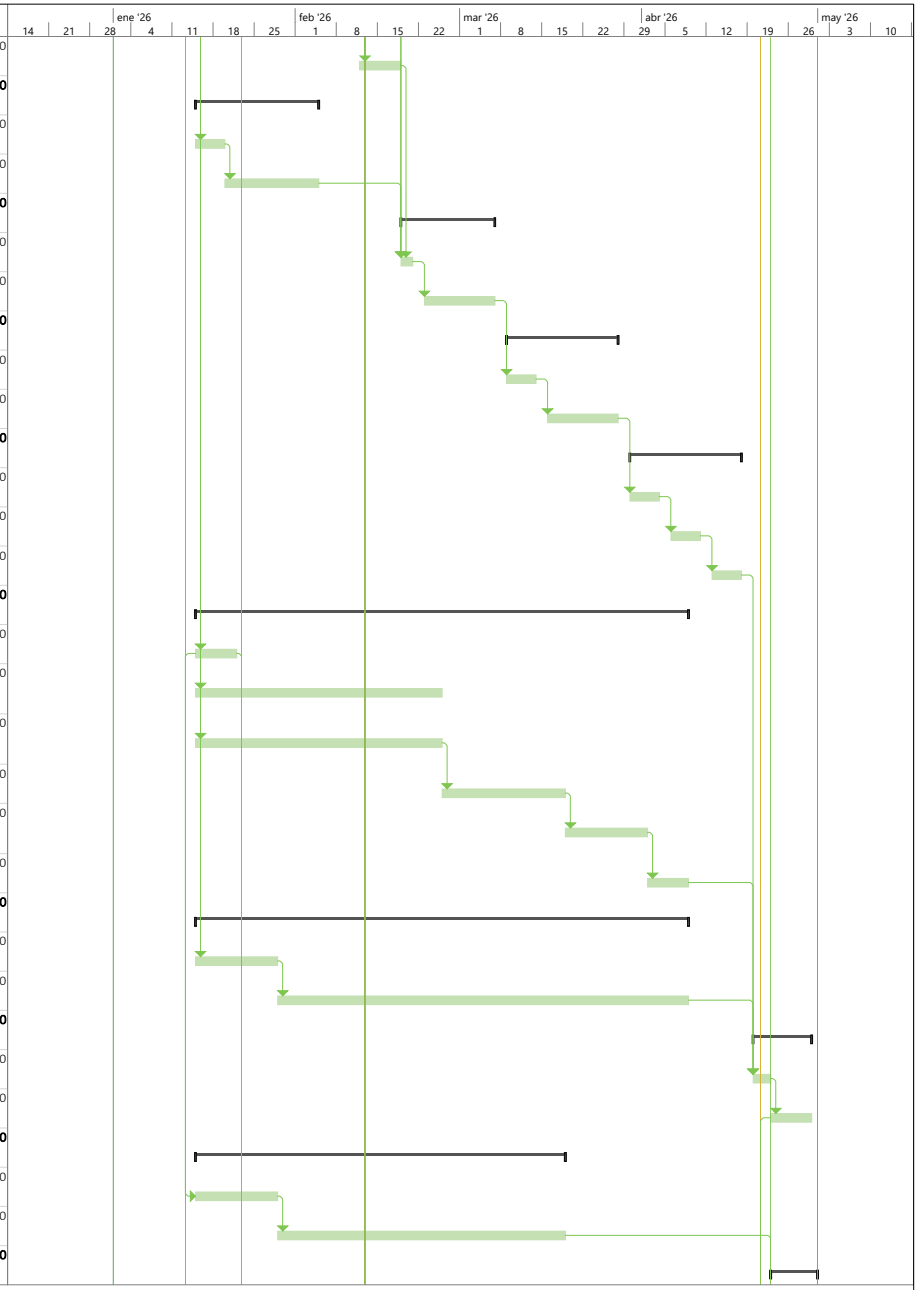

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
216		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	177;211CC;214	$ 0,00
217		**HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA VICTORIA**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 208.000.000,00**
218		**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	**10 días**	**jue 1/01/26**	**mié 14/01/26**		**$ 19.000.000,00**
219		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 1/01/26	mié 7/01/26		$ 1.900.000,00
220		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 8/01/26	mié 14/01/26	219	$ 17.100.000,00
221		**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 6.000.000,00**
222		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	220	$ 600.000,00
223		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	222	$ 3.600.000,00
224		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	223	$ 1.800.000,00
225		**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
226		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	220	$ 1.000.000,00
227		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	226	$ 5.000.000,00
228		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	227CC	$ 2.000.000,00
229		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	228	$ 2.000.000,00
230		**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 11.000.000,00**
231		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	226CC	$ 1.100.000,00
232		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	231	$ 6.600.000,00
233		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	232	$ 3.300.000,00
234		**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	**25 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/02/26**		**$ 11.000.000,00**
235		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	220	$ 1.100.000,00
236		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	15 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26	235	$ 4.950.000,00
237		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	236	$ 4.950.000,00
238		**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**mié 4/02/26**		**$ 18.000.000,00**
239		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	220	$ 1.800.000,00
240		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	12 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26	239	$ 16.200.000,00
241		**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	**12 días**	**jue 19/02/26**	**vie 6/03/26**		**$ 28.000.000,00**
242		Metodología aprobada por Interventoría	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	224;233;237;2	$ 2.800.000,00
243		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	242	$ 25.200.000,00
244		**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	**15 días**	**lun 9/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 14.000.000,00**
245		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	243	$ 1.400.000,00
246		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	245	$ 12.600.000,00

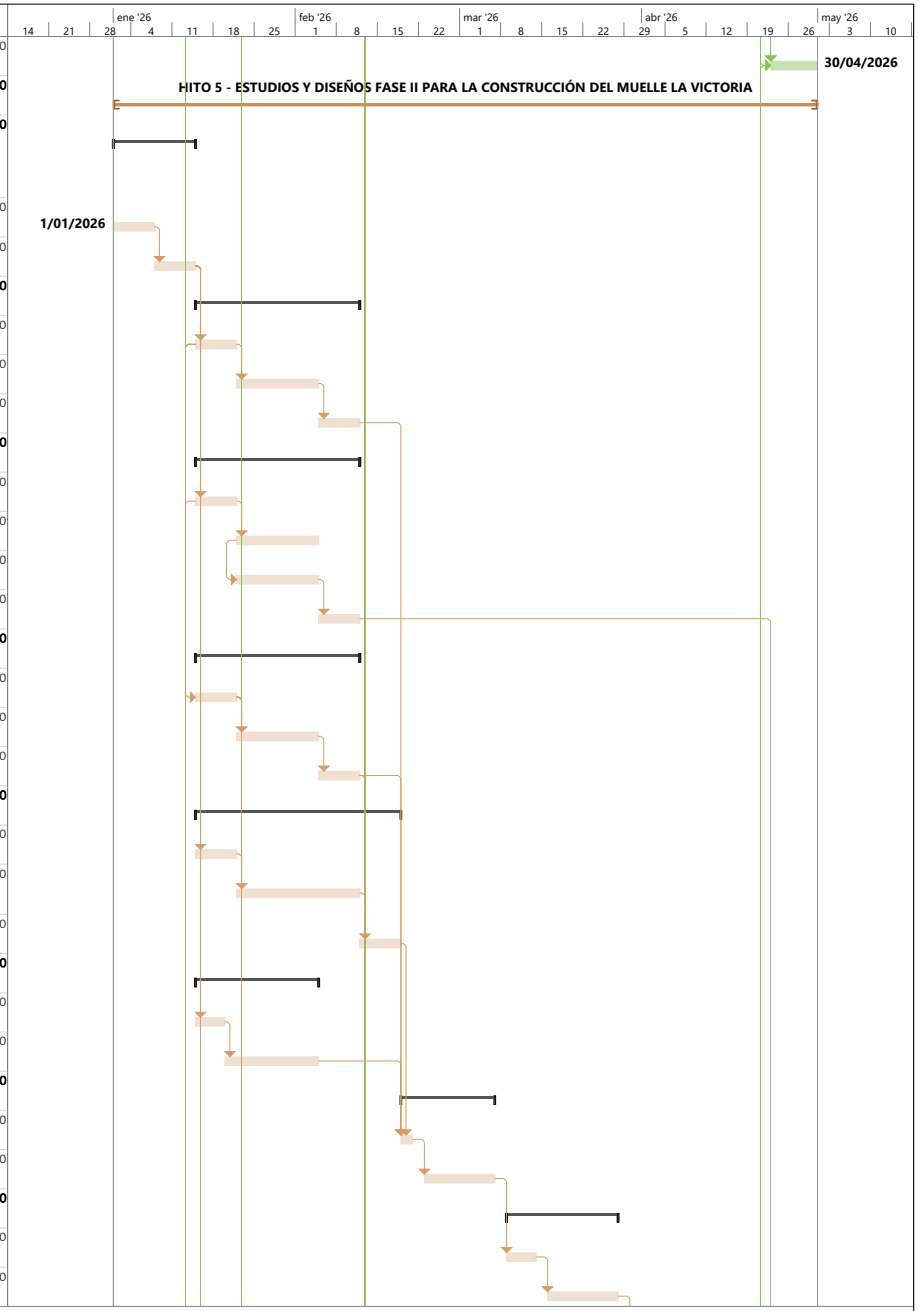

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
247		**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 19.000.000,00**
248		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	246	$ 1.900.000,00
249		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	248	$ 11.400.000,00
250		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	249	$ 5.700.000,00
251		**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 53.000.000,00**
252		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	220	$ 5.300.000,00
253		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	220	$ 5.300.000,00
254		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	220	$ 10.600.000,00
255		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	254	$ 10.600.000,00
256		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	255	$ 5.300.000,00
257		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 2/04/26	mié 8/04/26	256	$ 15.900.000,00
258		**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 7.000.000,00**
259		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	220	$ 700.000,00
260		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	50 días	jue 29/01/26	mié 8/04/26	259	$ 6.300.000,00
261		**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**		**$ 4.000.000,00**
262		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	250;257;260	$ 400.000,00
263		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26	262	$ 3.600.000,00
264		**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	**45 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 8.000.000,00**
265		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	252CC	$ 800.000,00
266		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	35 días	jue 29/01/26	mié 18/03/26	265	$ 7.200.000,00
267		**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 0,00**
268		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	229;263CC;266	$ 0,00
269		**GRUPO 3 - OTROS COSTOS**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 1.297.647.657,00**
270		Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 100.750.000,00
271		Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 15.000.000,00
272		Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 42.000.000,00
273		Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	14CC;66CC;118	$ 2.000.000,00
274		Levantamiento topobatimétrico detallado (S/comprobante) (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	14CC;66CC;118	$ 24.000.000,00
275		Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 6.100.000,00
276		Otros transportes especiales (s/comprobante) (vehículo/día, vehículo/mes (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros).	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 125.000.000,00

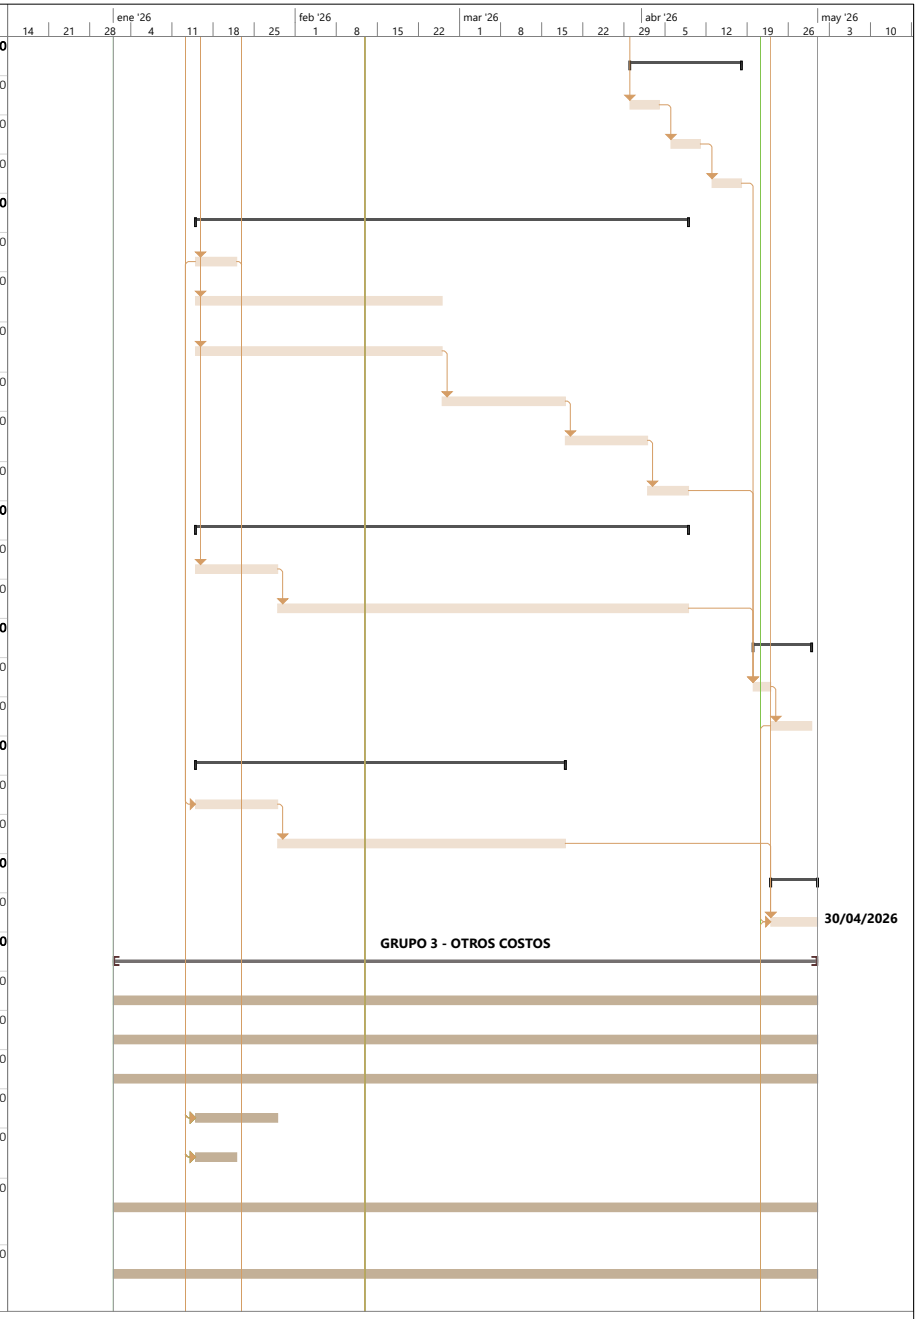

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
277		Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 1.000.000,00
278		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Alterno Pucarón (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	60CC	$ 5.000.000,00
279		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Taraira (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	112CC	$ 5.000.000,00
280		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Pacoa(S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	164CC	$ 5.000.000,00
281		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Miriti - Paraná (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	216CC	$ 5.000.000,00
282		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle La Victoria (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	268CC	$ 5.000.000,00
283		Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	14CC;66CC;118	$ 20.000.000,00
284		Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	5 días	jue 22/01/26	mié 28/01/26	23;75;127;179	$ 3.600.000,00
285		Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (viáticos))	5 días	jue 22/01/26	mié 28/01/26	23;75;127;179	$ 152.000.000,00
286		Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viáticos))	5 días	jue 22/01/26	mié 28/01/26	23;75;127;179	$ 75.000.000,00
287		Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezc	5 días	jue 29/01/26	mié 4/02/26	284;285;286	$ 208.050.625,00
288		Ensayos de Batimetría y socavación (S/comprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría, edición de planos, entre otros)	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	14CC;66CC;118	$ 119.200.000,00
289		Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambienta	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	44;96;148;200	$ 83.000.000,00
290		Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	30 días	jue 12/02/26	mié 25/03/26	25;77;129;181	$ 295.947.032,00
291		**IMPUESTOS**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 468.170.575,00**
292		IVA	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 468.170.575,00

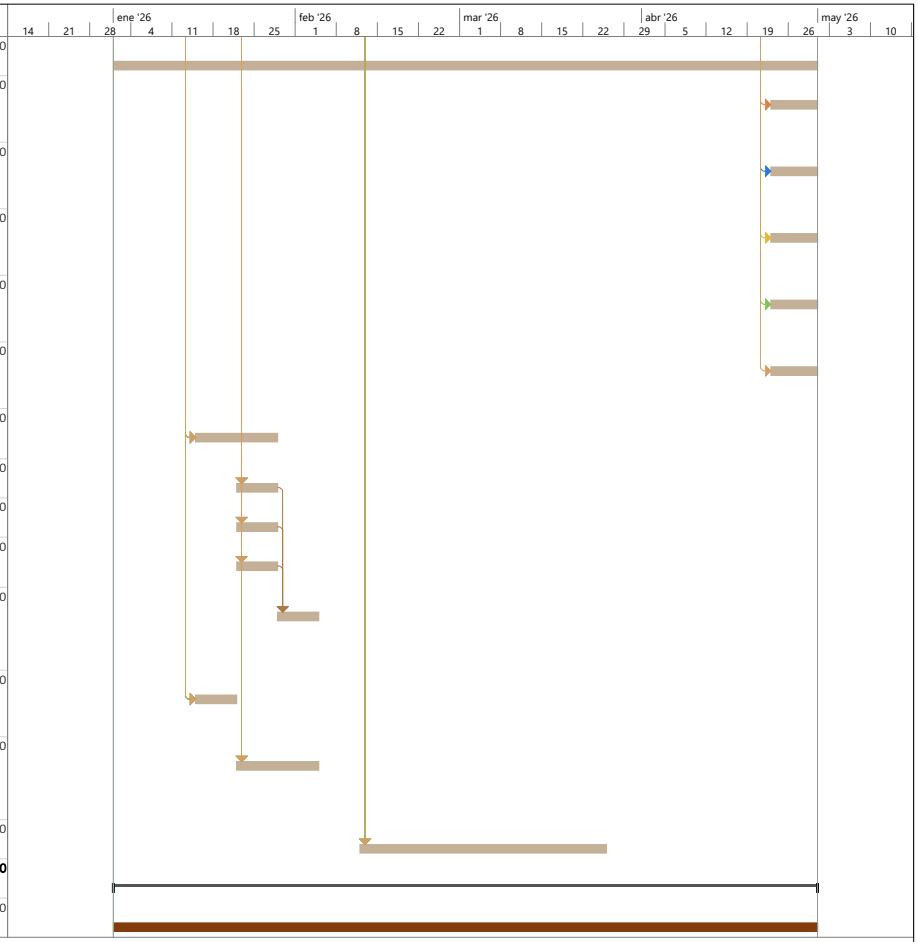

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 18/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1914 DE 2025

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

CONSULTOR: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025 CONTRATISTA: INTERVENTORIA CONCEP SAS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.932.226.232,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.932.226.232,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 (Incluidas las suspensiones, Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.1 de fecha Diciembre 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Director de Consultoría	$ 10.770.000,00		2,00	$ 10.770.000,00					+	2,50	$ 13.462.500,00	0,00	$ -	4,50	$ 24.232.500,00
2	2	Ingeniero residente de campo y estudios	$ 6.150.000,00		2,00	$ 24.600.000,00					+	2,50	$ 30.750.000,00	0,00	$ -	4,50	$ 55.350.000,00
3	3	Ingeniero Auxiliar	$ 4.090.000,00		2,00	$ 24.540.000,00					+	2,50	$ 30.675.000,00	0,00	$ -	4,50	$ 55.215.000,00
4	2	Dibujante	$ 2.630.000,00		2,00	$ 5.260.000,00					+	2,50	$ 6.575.000,00	0,00	$ -	4,50	$ 11.835.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 65.170.000,00							$ 81.462.500,00		$ -		$ 146.632.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 156.408.000,00							$ 195.510.000,00		$ -		$ 351.918.000,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen sobre valor total de los volúmenes	% de pago Sobre el valor del Volumen	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES															
		HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARÓN															
5	1	**Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)**			**100%**	**$ 17.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN I**	**8,81%**	10%	$ 1.700.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.700.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 15.300.000,00								0,00	$ -	90%	$ 15.300.000,00
6	2	**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**			**100%**	**$ 6.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN II**	**3,11%**	10%	$ 600.000,00								0,00	$ -	10%	$ 600.000,00
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60%	$ 3.600.000,00								0,00	$ -	60%	$ 3.600.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 1.800.000,00								0,00	$ -	30%	$ 1.800.000,00
7	3	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**			**100%**	**$ 10.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN III**	**5,18%**	10%	$ 1.000.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.000.000,00
		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50%	$ 5.000.000,00								0,00	$ -	50%	$ 5.000.000,00
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	$ 2.000.000,00								0,00	$ -	20%	$ 2.000.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20%	$ 2.000.000,00								0,00	$ -	20%	$ 2.000.000,00
8	4	**ESTUDIO DE GEOTECNIA**			**100%**	**$ 10.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IV**	**5,18%**	10%	$ 1.000.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.000.000,00
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	$ 6.000.000,00								0,00	$ -	60%	$ 6.000.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 3.000.000,00								0,00	$ -	30%	$ 3.000.000,00
9	5	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**			**100%**	**$ 10.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 1.000.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.000.000,00

9	5	Informe estudio hidrológico para el mejoramiento,para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	VOLUMEN V	5,18%	45%	$ 4.500.000,00							0,00	$ -	45%	$ 4.500.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45%	$ 4.500.000,00							0,00	$ -	45%	$ 4.500.000,00
10	6	**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**			**100%**	**$ 15.000.000,00**										
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN VI	7,77%	10%	$ 1.500.000,00							0,00	$ -	10%	$ 1.500.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 13.500.000,00							0,00	$ -	90%	$ 13.500.000,00
11	7	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**			**100%**	**$ 27.000.000,00**										
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN VII	13,99%	10%	$ 2.700.000,00							0,00	$ -	10%	$ 2.700.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 24.300.000,00							0,00	$ -	90%	$ 24.300.000,00
12	8	**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**			**100%**	**$ 16.000.000,00**										
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN VIII	8,29%	10%	$ 1.600.000,00							0,00	$ -	10%	$ 1.600.000,00
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría			60%	$ 9.600.000,00							0,00	$ -	60%	$ 9.600.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 4.800.000,00							0,00	$ -	30%	$ 4.800.000,00
13	9	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**			**100%**	**$ 13.000.000,00**										
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN IX	6,74%	10%	$ 1.300.000,00							0,00	$ -	10%	$ 1.300.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 11.700.000,00							0,00	$ -	90%	$ 11.700.000,00
14	10	**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**			**100%**	**$ 53.000.000,00**										
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN X	27,46%	10%	$ 5.300.000,00							0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00
		Informe de Área de influencia y línea base-Informe de impactos ambientales y sociales-aprobadoporel interventor			10%	$ 5.300.000,00							0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00
		Planes de Manejo,Permisos,Plan de Inversión Ambiental y Social,el nforme gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00							0,00	$ -	20%	$ 10.600.000,00
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00							0,00	$ -	20%	$ 10.600.000,00
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG Aprobado por la interventoría			10%	$ 5.300.000,00							0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 15.900.000,00							0,00	$ -	30%	$ 15.900.000,00
15	11	**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**			**100%**	**$ 6.000.000,00**										
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN XI	3,11%	10%	$ 600.000,00							0,00	$ -	10%	$ 600.000,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 5.400.000,00							0,00	$ -	90%	$ 5.400.000,00
16	12	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**			**100%**	**$ 4.000.000,00**										
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN XII	2,07%	10%	$ 400.000,00							0,00	$ -	10%	$ 400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 3.600.000,00							0,00	$ -	90%	$ 3.600.000,00
17	13	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**			**100%**	**$ 6.000.000,00**										
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN XIII	3,11%	10%	$ 600.000,00							0,00	$ -	10%	$ 600.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 5.400.000,00							0,00	$ -	90%	$ 5.400.000,00
18	14	**INFORME FINAL EJECUTIVO**														
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	VOLUMEN XIV	0,00%	0%	$ -							0,00	$ -	0%	$ -
		SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 1				**$ 193.000.000,00**										**$ 193.000.000,00**
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA														
19	15	**Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)**			**100%**	**$ 17.000.000,00**										
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN I	8,81%	10%	$ 1.700.000,00							0,00	$ -	10%	$ 1.700.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 15.300.000,00							0,00	$ -	90%	$ 15.300.000,00

		ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO			**100%**	**$ 6.000.000,00**														
20	16	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN II**	**3,11%**	10%	$ 600.000,00								0,00	$ -	10%	$ 600.000,00			
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60%	$ 3.600.000,00								0,00	$ -	60%	$ 3.600.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 1.800.000,00								0,00	$ -	30%	$ 1.800.000,00			
		ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA			**100%**	**$ 10.000.000,00**														
21	17	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN III**	**5,18%**	10%	$ 1.000.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.000.000,00			
		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50%	$ 5.000.000,00								0,00	$ -	50%	$ 5.000.000,00			
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	$ 2.000.000,00								0,00	$ -	20%	$ 2.000.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20%	$ 2.000.000,00								0,00	$ -	20%	$ 2.000.000,00			
		ESTUDIO DE GEOTECNIA			**100%**	**$ 10.000.000,00**														
22	18	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IV**	**5,18%**	10%	$ 1.000.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.000.000,00			
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	$ 6.000.000,00								0,00	$ -	60%	$ 6.000.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 3.000.000,00								0,00	$ -	30%	$ 3.000.000,00			
		ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL			**100%**	**$ 10.000.000,00**														
23	19	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN V**	**5,18%**	10%	$ 1.000.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.000.000,00			
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento,para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			45%	$ 4.500.000,00								0,00	$ -	45%	$ 4.500.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45%	$ 4.500.000,00								0,00	$ -	45%	$ 4.500.000,00			
		ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO			**100%**	**$ 15.000.000,00**														
24	20	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VI**	**7,77%**	10%	$ 1.500.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.500.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 13.500.000,00								0,00	$ -	90%	$ 13.500.000,00			
		ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO			**100%**	**$ 27.000.000,00**														
25	21	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VII**	**13,99%**	10%	$ 2.700.000,00								0,00	$ -	10%	$ 2.700.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 24.300.000,00								0,00	$ -	90%	$ 24.300.000,00			
		ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			**100%**	**$ 16.000.000,00**														
26	22	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VIII**	**8,29%**	10%	$ 1.600.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.600.000,00			
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría			60%	$ 9.600.000,00								0,00	$ -	60%	$ 9.600.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 4.800.000,00								0,00	$ -	30%	$ 4.800.000,00			
		DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE			**100%**	**$ 13.000.000,00**														
27	23	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IX**	**6,74%**	10%	$ 1.300.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.300.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 11.700.000,00								0,00	$ -	90%	$ 11.700.000,00			
		GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD			**100%**	**$ 53.000.000,00**														
28	24	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN X**	**27,46%**	10%	$ 5.300.000,00								0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00			
		Informe de Área de influencia y línea base-Informe de impactos ambientales y sociales-aprobadoporel interventor			10%	$ 5.300.000,00								0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00			
		Planes de Manejo,Permisos,Plan de Inversión Ambiental y Social,el nforme gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00								0,00	$ -	20%	$ 10.600.000,00			
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00								0,00	$ -	20%	$ 10.600.000,00			
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG Aprobado por la interventoría			10%	$ 5.300.000,00								0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 15.900.000,00								0,00	$ -	30%	$ 15.900.000,00			
		GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL			**100%**	**$ 6.000.000,00**														
29	25	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XI**	**3,11%**	10%	$ 600.000,00								0,00	$ -	10%	$ 600.000,00			
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 5.400.000,00								0,00	$ -	90%	$ 5.400.000,00			

		ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO			**100%**	**$ 4.000.000,00**													
30	26	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XII**	**2,07%**	10%	$ 400.000,00								0,00	$ -	10%	$ 400.000,00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 3.600.000,00								0,00	$ -	90%	$ 3.600.000,00		
		ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO			**100%**	**$ 6.000.000,00**													
31	27	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XIII**	**3,11%**	10%	$ 600.000,00								0,00	$ -	10%	$ 600.000,00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 5.400.000,00								0,00	$ -	90%	$ 5.400.000,00		
		INFORME FINAL EJECUTIVO																	
32	28	Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	**VOLUMEN XIV**	**0,00%**	0%	**$ -**								0,00	$ -	0%	$ -		
		SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 2				**$ 193.000.000,00**													**$ 193.000.000,00**
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PACOA																	
		Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)			**100%**	**$ 19.000.000,00**													
33	29	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN I**	**9,13%**	10%	$ 1.900.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.900.000,00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 17.100.000,00								0,00	$ -	90%	$ 17.100.000,00		
		ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO			**100%**	**$ 6.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 600.000,00								0,00	$ -	10%	$ 600.000,00		
34	30	Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	**VOLUMEN II**	**2,88%**	60%	$ 3.600.000,00								0,00	$ -	60%	$ 3.600.000,00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 1.800.000,00								0,00	$ -	30%	$ 1.800.000,00		
		ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA			**100%**	**$ 10.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 1.000.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.000.000,00		
35	31	Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	**VOLUMEN III**	**4,81%**	50%	$ 5.000.000,00								0,00	$ -	50%	$ 5.000.000,00		
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	$ 2.000.000,00								0,00	$ -	20%	$ 2.000.000,00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20%	$ 2.000.000,00								0,00	$ -	20%	$ 2.000.000,00		
		ESTUDIO DE GEOTECNIA			**100%**	**$ 11.000.000,00**													
36	32	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IV**	**5,29%**	10%	$ 1.100.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.100.000,00		
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	$ 6.600.000,00								0,00	$ -	60%	$ 6.600.000,00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 3.300.000,00								0,00	$ -	30%	$ 3.300.000,00		
		ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL			**100%**	**$ 11.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 1.100.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.100.000,00		
37	33	Informe estudio hidrológico para el mejoramiento,para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	**VOLUMEN V**	**5,29%**	45%	$ 4.950.000,00								0,00	$ -	45%	$ 4.950.000,00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45%	$ 4.950.000,00								0,00	$ -	45%	$ 4.950.000,00		
		ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO			**100%**	**$ 18.000.000,00**													
38	34	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VI**	**8,65%**	10%	$ 1.800.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.800.000,00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 16.200.000,00								0,00	$ -	90%	$ 16.200.000,00		
		ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO			**100%**	**$ 28.000.000,00**													
39	35	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VII**	**13,46%**	10%	$ 2.800.000,00								0,00	$ -	10%	$ 2.800.000,00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 25.200.000,00								0,00	$ -	90%	$ 25.200.000,00		
		ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			**100%**	**$ 19.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 1.900.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.900.000,00		
40	36	Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría	**VOLUMEN VIII**	**9,13%**	60%	$ 11.400.000,00								0,00	$ -	60%	$ 11.400.000,00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 5.700.000,00								0,00	$ -	30%	$ 5.700.000,00		
		DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE			**100%**	**$ 14.000.000,00**													
41	37	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IX**	**6,73%**	10%	$ 1.400.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.400.000,00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 12.600.000,00								0,00	$ -	90%	$ 12.600.000,00		

		GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD			**100%**	**$ 53.000.000,00**															
42	38	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN X**	**25,48%**	10%	$ 5.300.000,00									0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00			
		Informe de Área de influencia y línea base-Informe de impactos ambientales y sociales-aprobadoporel interventor			10%	$ 5.300.000,00									0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00			
		Planes de Manejo,Permisos,Plan de Inversión Ambiental y Social,el nforme gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00									0,00	$ -	20%	$ 10.600.000,00			
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00									0,00	$ -	20%	$ 10.600.000,00			
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG Aprobado por la interventoría			10%	$ 5.300.000,00									0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 15.900.000,00									0,00	$ -	30%	$ 15.900.000,00			
		GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL			**100%**	**$ 7.000.000,00**															
43	39	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XI**	**3,37%**	10%	$ 700.000,00									0,00	$ -	10%	$ 700.000,00			
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 6.300.000,00									0,00	$ -	90%	$ 6.300.000,00			
		ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO			**100%**	**$ 4.000.000,00**															
44	40	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XII**	**1,92%**	10%	$ 400.000,00									0,00	$ -	10%	$ 400.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 3.600.000,00									0,00	$ -	90%	$ 3.600.000,00			
		ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO			**100%**	**$ 8.000.000,00**															
45	41	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XIII**	**3,85%**	10%	$ 800.000,00									0,00	$ -	10%	$ 800.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 7.200.000,00									0,00	$ -	90%	$ 7.200.000,00			
46	42	**INFORME FINAL EJECUTIVO**																			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	**VOLUMEN XIV**	**0,00%**	0%	**$ -**									0,00	$ -	0%	$ -			
		SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 3				**$ 208.000.000,00**															**$ 208.000.000,00**
		HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ																			
47	43	**Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)**			**100%**	**$ 19.000.000,00**															
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN I**	**9,13%**	10%	$ 1.900.000,00									0,00	$ -	10%	$ 1.900.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 17.100.000,00									0,00	$ -	90%	$ 17.100.000,00			
		ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO			**100%**	**$ 6.000.000,00**															
48	44	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN II**	**2,88%**	10%	$ 600.000,00									0,00	$ -	10%	$ 600.000,00			
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60%	$ 3.600.000,00									0,00	$ -	60%	$ 3.600.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 1.800.000,00									0,00	$ -	30%	$ 1.800.000,00			
		ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA			**100%**	**$ 10.000.000,00**															
49	45	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN III**	**4,81%**	10%	$ 1.000.000,00									0,00	$ -	10%	$ 1.000.000,00			
		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50%	$ 5.000.000,00									0,00	$ -	50%	$ 5.000.000,00			
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	$ 2.000.000,00									0,00	$ -	20%	$ 2.000.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20%	$ 2.000.000,00									0,00	$ -	20%	$ 2.000.000,00			
		ESTUDIO DE GEOTECNIA			**100%**	**$ 11.000.000,00**															
50	46	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IV**	**5,29%**	10%	$ 1.100.000,00									0,00	$ -	10%	$ 1.100.000,00			
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	$ 6.600.000,00									0,00	$ -	60%	$ 6.600.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 3.300.000,00									0,00	$ -	30%	$ 3.300.000,00			
		ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL			**100%**	**$ 11.000.000,00**															
51	47	Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN V**	**5,29%**	10%	$ 1.100.000,00									0,00	$ -	10%	$ 1.100.000,00			
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento,para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			45%	$ 4.950.000,00									0,00	$ -	45%	$ 4.950.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45%	$ 4.950.000,00									0,00	$ -	45%	$ 4.950.000,00			

52	48	**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**			**100%**	**$ 18.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VI**	**8,65%**	10%	$ 1.800.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.800.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 16.200.000,00								0,00	$ -	90%	$ 16.200.000,00
53	49	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**			**100%**	**$ 28.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VII**	**13,46%**	10%	$ 2.800.000,00								0,00	$ -	10%	$ 2.800.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 25.200.000,00								0,00	$ -	90%	$ 25.200.000,00
54	50	**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**			**100%**	**$ 19.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VIII**	**9,13%**	10%	$ 1.900.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.900.000,00
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría			60%	$ 11.400.000,00								0,00	$ -	60%	$ 11.400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 5.700.000,00								0,00	$ -	30%	$ 5.700.000,00
55	51	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**			**100%**	**$ 14.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IX**	**6,73%**	10%	$ 1.400.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 12.600.000,00								0,00	$ -	90%	$ 12.600.000,00
56	52	**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**			**100%**	**$ 53.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN X**	**25,48%**	10%	$ 5.300.000,00								0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00
		Informe de Área de influencia y línea base-Informe de impactos ambientales y sociales-aprobadoporel interventor			10%	$ 5.300.000,00								0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00
		Planes de Manejo,Permisos,Plan de Inversión Ambiental y Social,el nforme gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00								0,00	$ -	20%	$ 10.600.000,00
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00								0,00	$ -	20%	$ 10.600.000,00
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG Aprobado por la interventoría			10%	$ 5.300.000,00								0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 15.900.000,00								0,00	$ -	30%	$ 15.900.000,00
57	53	**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**			**100%**	**$ 7.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XI**	**3,37%**	10%	$ 700.000,00								0,00	$ -	10%	$ 700.000,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 6.300.000,00								0,00	$ -	90%	$ 6.300.000,00
58	54	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**			**100%**	**$ 4.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XII**	**1,92%**	10%	$ 400.000,00								0,00	$ -	10%	$ 400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 3.600.000,00								0,00	$ -	90%	$ 3.600.000,00
59	55	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**			**100%**	**$ 8.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XIII**	**3,85%**	10%	$ 800.000,00								0,00	$ -	10%	$ 800.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 7.200.000,00								0,00	$ -	90%	$ 7.200.000,00
60	56	**INFORME FINAL EJECUTIVO**																	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	**VOLUMEN XIV**	**0,00%**	0%	**$ -**								0,00	$ -	0%	$ -
		SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 4				**$ 208.000.000,00**													**$ 208.000.000,00**
		HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA VICTORIA																	
61	57	**Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vias de acceso (carretero y/o fluvial)**			**100%**	**$ 19.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN I**	**9,13%**	10%	$ 1.900.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.900.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 17.100.000,00								0,00	$ -	90%	$ 17.100.000,00
62	58	**ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**			**100%**	**$ 6.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN II**	**2,88%**	10%	$ 600.000,00								0,00	$ -	10%	$ 600.000,00
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60%	$ 3.600.000,00								0,00	$ -	60%	$ 3.600.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 1.800.000,00								0,00	$ -	30%	$ 1.800.000,00
63	59	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**			**100%**	**$ 10.000.000,00**													
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN III**	**4,81%**	10%	$ 1.000.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.000.000,00
		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50%	$ 5.000.000,00								0,00	$ -	50%	$ 5.000.000,00
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	$ 2.000.000,00								0,00	$ -	20%	$ 2.000.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20%	$ 2.000.000,00								0,00	$ -	20%	$ 2.000.000,00

64	60	**ESTUDIO DE GEOTECNIA**			**100%**	**$ 11.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IV**	**5,29%**	10%	$ 1.100.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.100.000,00
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	$ 6.600.000,00								0,00	$ -	60%	$ 6.600.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 3.300.000,00								0,00	$ -	30%	$ 3.300.000,00
65	61	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**			**100%**	**$ 11.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN V**	**5,29%**	10%	$ 1.100.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.100.000,00
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento,para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			45%	$ 4.950.000,00								0,00	$ -	45%	$ 4.950.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45%	$ 4.950.000,00								0,00	$ -	45%	$ 4.950.000,00
66	62	**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**			**100%**	**$ 18.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VI**	**8,65%**	10%	$ 1.800.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.800.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 16.200.000,00								0,00	$ -	90%	$ 16.200.000,00
67	63	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**			**100%**	**$ 28.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VII**	**13,46%**	10%	$ 2.800.000,00								0,00	$ -	10%	$ 2.800.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 25.200.000,00								0,00	$ -	90%	$ 25.200.000,00
68	64	**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**			**100%**	**$ 19.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VIII**	**9,13%**	10%	$ 1.900.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.900.000,00
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría			60%	$ 11.400.000,00								0,00	$ -	60%	$ 11.400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 5.700.000,00								0,00	$ -	30%	$ 5.700.000,00
69	65	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**			**100%**	**$ 14.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IX**	**6,73%**	10%	$ 1.400.000,00								0,00	$ -	10%	$ 1.400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 12.600.000,00								0,00	$ -	90%	$ 12.600.000,00
70	66	**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**			**100%**	**$ 53.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN X**	**25,48%**	10%	$ 5.300.000,00								0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00
		Informe de Área de influencia y línea base-Informe de impactos ambientales y sociales-aprobadoporel interventor			10%	$ 5.300.000,00								0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00
		Planes de Manejo,Permisos,Plan de Inversión Ambiental y Social,el nforme gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00								0,00	$ -	20%	$ 10.600.000,00
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00								0,00	$ -	20%	$ 10.600.000,00
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG Aprobado por la interventoría			10%	$ 5.300.000,00								0,00	$ -	10%	$ 5.300.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 15.900.000,00								0,00	$ -	30%	$ 15.900.000,00
71	67	**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**			**100%**	**$ 7.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XI**	**3,37%**	10%	$ 700.000,00								0,00	$ -	10%	$ 700.000,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 6.300.000,00								0,00	$ -	90%	$ 6.300.000,00
72	68	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**			**100%**	**$ 4.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XII**	**1,92%**	10%	$ 400.000,00								0,00	$ -	10%	$ 400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 3.600.000,00								0,00	$ -	90%	$ 3.600.000,00
73	69	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**			**100%**	**$ 8.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XIII**	**3,85%**	10%	$ 800.000,00								0,00	$ -	10%	$ 800.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 7.200.000,00								0,00	$ -	90%	$ 7.200.000,00
74	70	**INFORME FINAL EJECUTIVO**															
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	**VOLUMEN XIV**	**0,00%**	0%	**$ -**								0,00	$ -	0%	$ -
		SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 5				**$ 208.000.000,00**											**$ 208.000.000,00**
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)				**$ 1.010.000.000,00**											**$ 1.010.000.000,00**
75	71	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 250.000,00	403,00	$ 100.750.000,00								0,00	$ -	403,00	$ 100.750.000,00
76	72	Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	MES	$ 1.500.000,00	10,00	$ 15.000.000,00								0,00	$ -	10,00	$ 15.000.000,00
77	73	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	$ 2.000.000,00	21,00	$ 42.000.000,00								0,00	$ -	21,00	$ 42.000.000,00
78	74	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	GL	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00					+	10	$ 20.000.000,00	0,00	$ -	11,00	$ 22.000.000,00
79	75	Levantamiento topobatimétrico detallado (S/comprobante) (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	GL	$ 24.000.000,00	1,00	$ 24.000.000,00					+	0,5	$ 12.000.000,00	0,00	$ -	1,50	$ 36.000.000,00
80	76	Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	MES	$ 6.100.000,00	1,00	$ 6.100.000,00								0,00	$ -	1,00	$ 6.100.000,00

81	77	Otros transportes especiales (s/comprobante) (vehículo/día, vehículo/mes (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros).	GL	$ 125.000.000,00	1,00	$ 125.000.000,00								0,00	$ -	1,00	$ 125.000.000,00
82	78	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	MES	$ 500.000,00	2,00	$ 1.000.000,00								0,00	$ -	2,00	$ 1.000.000,00
83	79	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Alterno Pucarón(S/comprobante)(Incluyeimpresión,ploteo de planchas original en papel de seguridad,una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	GL	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00								0,00	$ -	1,00	$ 5.000.000,00
84	80	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Taraira(S/comprobante)(Incluye impresión,ploteo de planchas original en papel de seguridad,una copia en papel bond y cuatro copia sen archivos magnéticos)	GL	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00								0,00	$ -	1,00	$ 5.000.000,00
85	81	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Pacoa(S/comprobante)(Incluye impresión,ploteo de planchas original en papel deseguridad,una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	GL	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00								0,00	$ -	1,00	$ 5.000.000,00
86	82	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Miriti-Paraná(S/comprobante)(Incluye impresión,ploteo de planchas original en papel de seguridad,una copia en papel bond yc uatrocopias en archivos magnéticos)	GL	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00								0,00	$ -	1,00	$ 5.000.000,00
87	83	Ediciónde Informes Finales de todos losv olúmenes MuelleLaVictoria(S/comprobante)(Incluye impresión,ploteo de planchas original en papel de seguridad,una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	GL	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00								0,00	$ -	1,00	$ 5.000.000,00
88	84	Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Par de Puntos	$ 4.000.000,00	5,00	$ 20.000.000,00								0,00	$ -	5,00	$ 20.000.000,00
89	85	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	UNIDAD	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00								0,00	$ -	12,00	$ 3.600.000,00
90	86	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (viáticos)	ML	$ 380.000,00	400,00	$ 152.000.000,00								0,00	$ -	400,00	$ 152.000.000,00
91	87	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viáticos)	ML	$ 500.000,00	150,00	$ 75.000.000,00								0,00	$ -	150,00	$ 75.000.000,00
92	88	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, batimetrías, monitoreo según requerimientos ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros)	GL	$ 208.050.625,00	1,00	$ 208.050.625,00								0,00	$ -	1,00	$ 208.050.625,00
93	89	Ensayos de Batimetría y socavación (S/comprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría, edición de planos, entre otros)	GL	$ 119.200.000,00	1,00	$ 119.200.000,00								0,00	$ -	1,00	$ 119.200.000,00
94	90	Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	GL	$ 83.000.000,00	1,00	$ 83.000.000,00								0,00	$ -	1,00	$ 83.000.000,00
95	91	Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	GL	$ 295.947.032,00	1,00	$ 295.947.032,00					-	0,77	$ (227.510.000,00)	0,00	$ -	0,23	$ 68.437.032,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente																
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.297.647.657,00**							$ (195.510.000,00)		$ -		**$ 1.102.137.657,00**
		*																
		* COSTO BASICO = (C) + (D) + (E) = (F)				$ 2.464.055.657,00							$ -		$ -		$ 2.464.055.657,00
		* IVA = 19% * (F) = (G)				$ 468.170.575,00							$ -		$ -		$ 468.170.575,00
		* COSTO TOTAL = (F) + (G)				$ 2.932.226.232,00							$ -		**$ -**		**$ 2.932.226.232,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/12/2025 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 2.464.055.657,00	$ 468.170.575,00	$ 2.932.226.232,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :			
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.464.055.657,00	$ 468.170.575,00	$ 2.932.226.232,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,46
ADICIONAL	4
ACUMULADO	4,46
FALTANTE	4,46

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Por prorroga al contrato de consultoria No.1914 de 2025 por un plazo de Seis (6) meses

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma
Nombre: Ricardo José Cogollo Ponce
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 01113-10666 CPITVC

Revisión:

Director Territorial — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: N/A — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: Paola Andrea Mahecha Quintero — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18 (Día) 12 (Mes) 25 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A

CONTRATO DE OBRA No. 1914 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

OBJETO DEL CONTRATO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 16/12/2025

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.932.226.232,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.932.226.232,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** INTERVENTORIA CONCEP SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 293.222.623,20	24	11	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.232.027.829,00	24	11	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 586.445.246,40	24	11	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 879.667.869,60	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/11/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	18 (Día)	12 (Mes)	25 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 293.222.623,20	24 / 11 / 2025	30 / 6 / 2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 1.232.027.829,00	24 / 11 / 2025	30 / 6 / 2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 586.445.246,40	24 / 11 / 2025	31 / 12 / 2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 879.667.869,60	31 / 12 / 2025	31 / 12 / 2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 174774

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Cesce

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Clausula vigesima primera paragrafo primero:
"Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONSULTOR, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo.
Que la calidad del Servicio con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría"

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8577890
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/11/2025 5:16:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1914-2025
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	41 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(16/12/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	◉ Sí ○ No *
Fecha de inicio de liquidación	12 días para terminar *(1/01/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	◉ Sí ○ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	28 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	12 días para terminar *(31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	○ Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No *
Reversión	○ Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

COLOMBIA, Cajicá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	Banco de Occidente	Ahorros	510- 85124-9

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mauricio Fernando Prieto Sánchez* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2025 8:01:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Sirley Dabeiba Merchan Carreño* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2025 11:20:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8577890_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8577890_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Subdirección de Planificación de Infraestructura
Proceso de Contratación	CMA-DTE-SPI-044-2025
Título de la oferta	CMA-DTE-SPI-044-2025 CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
Cuantía del contrato	2.932.226.232 COP

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.146.763**

BARRAGAN MEDINA

APELLIDOS

CARLOS ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-MAY-1951**

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

12-JUL-1973 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00129889-M-0019146763-20081119 **0006**07897A 3 1130026757

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de diciembre de 2025, a las 07:19:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19146763
Código de Verificación	19146763251215071943

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 286166635

PIB
07:24:32

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19146763:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:22:43 AM horas del 15/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **19146763**
Apellidos y Nombres: **BARRAGAN MEDINA CARLOS ENRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/12/2025 07:23:15 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **19146763** y Nombre: **CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **130076374** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 19146763 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 15/12/2025 07:26 AM

Código Verificación: **NWSFR6V2CZ**

Válida hasta: **15/03/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.049.625.075



Apellidos
PRIETO SANCHEZ

Nombres
MAURICIO FERNANDO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.76

Sexo
M

Fecha de nacimiento
06 ABR 1991

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
TUNJA (BOYACA)

Fecha y lugar de expedición
20 ABR 2009, TUNJA

Firma

Fecha de expiración
08 FEB 2034

.CO

0395540990

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

```
ICCOL0395540998070011<<<<<<<<<<<
9104060M3402085COL1049625075<7
PRIETO<SANCHEZ<<MAURICIO<FERNA
```

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de diciembre de 2025, a las 07:20:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1049625075
Código de Verificación	1049625075251215072037

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 286166528

PIB
07:21:34

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1049625075:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:22:37 AM horas del 15/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1049625075**
Apellidos y Nombres: **PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/12/2025 07:23:10 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1049625075** y Nombre: **MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **130076371** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1049625075 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 15/12/2025 07:24 AM

Código Verificación: **96H5SCGUV3**

Válida hasta: **15/03/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:24:02 horas del 15/12/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1049625075,**
Apellidos y Nombres **PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.**, con NIT **900779202-1** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de noviembre de 2025 Hora: 12:23:19
Recibo No. AB25771484
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25771484AC3A3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
Nit: 900779202 1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02507378
Fecha de matrícula: 8 de octubre de 2014
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 13 de febrero de 2025
Grupo NIIF: Grupo III.

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:
El empresario BRAIN INGENIERIA VIAL SAS realizó la renovación en la fecha: 13 de febrero de 2025.
El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 71.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 5 9 26 Sur Torre 2 Of 209
Municipio: Cajicá (Cundinamarca)
Correo electrónico: contabilidad@brainingenieria.com
Teléfono comercial 1: 8661718
Teléfono comercial 2: 3176574703
Teléfono comercial 3: 3176574703

Dirección para notificación judicial: Calle 25 # 8 E 161
Municipio: Cajicá (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: gerencia@brainingenieria.com
Teléfono para notificación 1: 8587251

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de noviembre de 2025 Hora: 12:23:19
Recibo No. AB25771484
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25771484AC3A3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 2: 3176574703
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 3 de octubre de 2014 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de octubre de 2014, con el No. 01875118 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada BRAIN INGENIERIA VIAL SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil relacionada con ingeniería civil; consultoría, construcción de vías, obras públicas, inmuebles, interventoría de todo tipo de obras, desarrollo de proyectos de infraestructura la construcción, pavimentación, mantenimiento, rehabilitación de infraestructura vial, diseños, y consultoría de transporte y vías.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $480.000.000,00
No. de acciones : 480.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de noviembre de 2025 Hora: 12:23:19
Recibo No. AB25771484
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25771484AC3A3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $360.000.000,00
No. de acciones : 360.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $360.000.000,00
No. de acciones : 360.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del Gerente, tendrá Primer Suplente y Segundo Suplente. Los suplentes del Gerente lo reemplazaran en sus ausencias temporales y absolutas. Los suplentes tendrán las mismas atribuciones que el Gerente cuando entre a reemplazar.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 3 del 17 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de marzo de 2021 con el No. 02675629 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Mauricio Fernando	C.C. No. 1049625075

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de noviembre de 2025 Hora: 12:23:19
Recibo No. AB25771484
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25771484AC3A3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Prieto Sanchez

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente	Lesley Tatiana Horta Barajas	C.C. No. 1013675227
Segundo Suplente	Monica Andrea Prieto Sanchez	C.C. No. 1049614902

Por Documento Privado del 12 de marzo de 2024, inscrito en esta Cámara de Comercio el 1 de Abril de 2024 con el No. 03083283 del Libro IX, Mónica Andrea Prieto Sánchez presentó la renuncia al cargo.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 8 del 7 de diciembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de diciembre de 2022 con el No. 02910351 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Nidia Irene Rodriguez Torres	C.C. No. 52603305 T.P. No. 200868-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 005 del 29 de diciembre de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02333670 del 24 de abril de 2018 del Libro IX
Acta No. 1 del 24 de septiembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02511801 del 2 de octubre de 2019 del Libro IX
Acta No. 09 del 22 de diciembre de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02922892 del 18 de enero de 2023 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de noviembre de 2025 Hora: 12:23:19
Recibo No. AB25771484
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25771484AC3A3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 7710, 7120

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 8.780.655.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de noviembre de 2025 Hora: 12:23:19
Recibo No. AB25771484
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25771484AC3A3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 24 de abril de 2018. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 15 de diciembre de 2025, a las 07:21:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9007792021
Código de Verificación	9007792021251215072102

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 286166542

PIB
07:21:57

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona BRAIN INGENIERIA VIAL SAS identificado(a) con NIT número 9007792021:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 00:05:19
Recibo No. AB25762658
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257626584B954

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INPROTEKTO LIMITADA
Nit: 800032486 5
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	00327938
Fecha de matrícula:	6 de mayo de 1988
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	4 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cl 81 No. 11-68 Of 510
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	inprotektolimitada@yahoo.es
Teléfono comercial 1:	6180770
Teléfono comercial 2:	6180865
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cl 81 No. 11-68 Of 510
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	inprotektolimitada@yahoo.es
Teléfono para notificación 1:	6180770
Teléfono para notificación 2:	6180865
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 00:05:19
Recibo No. AB25762658
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257626584B954

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 655 de la Notaría 26 de Bogotá del 30 de marzo de 1988, aclarada por Escritura Pública No. 840 de la Notaría 26 de Bogotá del 27 de abril de 1988, inscritas el 6 de mayo de 1988, bajo el No. 235298 del Libro IX, se constituyó la sociedad Comercial denominada IN PROTEKTO LIMITADA.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2035.

OBJETO SOCIAL

El objeto de la Sociedad será el de asesorías, interventorías en el campo de la ingeniería, así como ejecutar, dirigir y coordinar obras de ingeniería. Para la realización de su objeto, la Sociedad podrá celebrar contratos de arriendo, de compraventa, tomar dinero con o sin interés hipotecarios, celebrar contratos de administración y en general ejecutar todo acto de comercio y manufactura en el campo de la ingeniería, así como toda clase de consultas, estudios y asesorías técnicas como también el contrato de mutuo en todas sus formas. Clausula segunda: Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá garantizar y avalar deudas propias y de terceros, constituir de manera individual o conjunta fiducias mercantiles y/o encargos fiduciarios; celebrar todo tipo de actos y contratos civiles y mercantiles como la cesión de derechos de crédito, de la posición contractual, bien sea como cedente o cesionario, suscribir, emitir o aceptar toda clase de títulos valores, constituir prendas, hipotecas, avales y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social y de obligaciones legales y contractuales que le sea exigidos.

CAPITAL

El capital social corresponde a la suma de $ 200.000.000,00 dividido

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 00:05:19
Recibo No. AB25762658
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257626584B954

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en 1.000,00 cuotas con valor nominal de $ 200.000,00 cada una, distribuido así :

- Socio(s) Capitalista(s)

Carlos Enrique Barragan Medina	C.C. 000000019146763
No. de cuotas: 500,00	valor: $100.000.000,00
Nelsy Amparo Rojas Anzola	C.C. 000000035495471
No. de cuotas: 500,00	valor: $100.000.000,00
Totales	
No. de cuotas: 1.000,00	valor: $200.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

El Representante Legal es: El Gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Al Gerente le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía en forma administrativa, judicial o extrajudicial, policiva o contractual. Son funciones del Gerente, además de llevar la representación social y usar la razón o firma social las siguientes: A). Comparecer a la notaría para aceptar en nombre de la Sociedad la cesión de acciones a favor de otros socios o de terceros. B). Nombrar y remover libremente los empleados de la Sociedad. C). Presentar el informe semestral a la Junta General de Socios; D). Efectuar contratos a nombre de la Sociedad en los valores y cuantías que se requieran sin tener ninguna restricción ni requerirse de previa autorización de los demás socios que conforman la Sociedad. E). Presentar demandas, contestarlas, interponer todo recurso legal, desistir de ellos, transigirlos, conferir poderes, sustituir apoderados, etc. F). Abrir, cerrar y girar en cuentas corrientes y autorizar girar en ellas; G). Aceptar, firmar, negociar, recibir, tener, etc., toda clase de instrumentos negociables, así como el preparar y presentar ofertas de trabajo, licitaciones públicas y privadas, concursos de méritos públicos y privados a nombre de la Sociedad. Representar la Sociedad para lo cual podrá garantizar y avalar deudas propias y de terceros, constituir do manera individual o conjunta fiducias mercantiles y/o encargos fiduciarios, celebrar todo tipo de actos y contratos civiles y mercantiles como la cesión de derechos de crédito, de la posición contractual, bien, sea como

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 00:05:19
Recibo No. AB25762658
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257626584B954

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

cedente o cesionario, suscribir, emitir o aceptar toda clase de títulos valores, constituir prendas, hipotecas, avales y los damas que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social y de obligaciones legales y contractuales que le sea exigidos.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 0000007 del ?,, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de abril de 1991 con el No. 00322069 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Carlos Enrique Barragan Medina	C.C. No. 19146763

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Nelsy Amparo Rojas Anzola	C.C. No. 35495471

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 001 del 20 de enero de 2015, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de enero de 2015 con el No. 01904062 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Agustin Hernando Rodriguez Colorado	C.C. No. 17168172 T.P. No. 8297-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
626	11-III-1.994	41 STAFE BTA	4-IV-1.994 NO.442.707
2.284	22-VI--1.995	19 STAFE BTA	10-VII-1995 NO.499.812

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 00:05:19
Recibo No. AB25762658
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257626584B954

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0008864 del 5 de diciembre de 2008 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	01267813 del 13 de enero de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2457 del 30 de abril de 2015 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	01939852 del 15 de mayo de 2015 del Libro IX
E. P. No. 1869 del 1 de noviembre de 2023 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	03035890 del 16 de noviembre de 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7120
Otras actividades Código CIIU: 4112, 4111

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 00:05:19
Recibo No. AB25762658
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257626584B954

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 5.833.426.461
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 4 de marzo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 00:05:19
Recibo No. AB25762658
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B257626584B954

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 20 de diciembre de 2025, a las 18:03:18, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8000324865
Código de Verificación	800032486525122018031 8

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HELENA PATRICIA GARCÍA MAYA
Contralora Delegada EF

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 286641005

PIB
18:04:33

Bogotá DC, 20 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona INPROTEKTO LIMITADA identificado(a) con NIT número 8000324865:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

C E R T I F I C A D O

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL** identificados con C.C./NIT **902008292-2**, es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el día **18/11/2025** con la **Cuenta de Ahorros** No**. 510851256**, denominada **CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL-ANTICIPO,** la cual se encuentra activa y vigente.

Esta cuenta maneja el anticipo del **CONTRATO NÚMERO 1914-2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1,** dicha cuenta de ahorros genera rendimientos.

El manejo de la cuenta es de firmas conjuntas de los señores Mauricio Fernando Prieto Sanchez identificado con cedula No 1049625075 y Ricardo Cogollo con cedula No 6872531

Esta certificación se expide para los fines que el solicitante estime pertinentes, en la ciudad de **Bogotá DC** a los **22** días del mes de **diciembre** de **2025.**

Cordialmente,

Yuliana Vanessa Causado Julio
Asesora de Soporte Comercial
Mesa de Soporte De Negocio BE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
