ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

ASUNTO: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ

INTERESADO (S):

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL DONCELLO

CONTRATISTA: ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

SUPERVISOR: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

CONTRATO No.: COP-2025-004

CONTENIDO:

INFORME FINAL DE OBRA

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .....
2. OBJETIVO .....
3. DESCRIPCIÓN FISICA DEL MUNICIPIO EL DONCELLO - CAQUETÁ .....
4. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO ....
5. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA .....
6. INFORME ADMINISTRATIVO .....
   6.1 Discriminación de AIU .....
   6.2 Discriminación de Factor Prestacional .....
   6.3 Relación pagos de seguridad social .....
   6.4 Planillas de Seguridad Social .....
   6.5 Certificación de paz y salvo por pago de seguridad social y parafiscales ....
   6.6 Justificación de gastos de Administración .....
   6.7 Justificación de gastos de Factor Prestacional .....
7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE .....
   7.1 Acta de mayores y menores cantidades No 1 .....
   7.2 Relación de pagos .....
   7.3 Amortización del Anticipo .....
   7.3.1 Documentos soportes de Amortización del Anticipo .....
   7.4 Factura .....
   7.5 Certificado de cuenta bancaria .....
8. INFORME JURIDICO .....
   8.1 Amparos del contrato .....
   8.2 Certificado de existencia y representación legal Cámara y comercio .....
   8.3 Registro Único Tributario (RUT) .....

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

9. INFORME TECNICO .....

9.1 Acta Final .....

9.2 Memorias de Cantidades – Pre Actas Finales .....

9.3 Informe SISO .....

9.4 Certificación pago FIC.....

9.5 Certificación de Material.....

9.6 Registro Fotográfico.....

9.7 Bitácora.....

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

1. INTRODUCCIÓN

EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO, realizo contrato de obra No. COP-2025-004 con el fin de realizar el **MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ.**

Quien mediante proceso de selección abreviada de menor cuantía contrató el día 18 de septiembre del 2025, mediante contrato de obra No COP-2025-004, con un plazo de dos (02) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, por un valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($176.250.438.00) M/CTE M/cte. que serán pagados según la cláusula 8, a la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S con Nit. 901.209.615-7** representada legalmente por **WILLIAM CALDERON PEREZ.**

Que el contrato en referencia sufrió una adición en recursos el 13 de diciembre de 2025 por un valor de ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000) M/TE, para de esta manera modificar el valor total del contrato a CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($187.250.438,00) M/CTE.

Con los recursos adicionales se ejecutaron actividades que buscaban la prevención, evitar a futuro daños que puedan ocasionarse como lo es la captación de las aguas lluvias y su encauce de manera subterránea por el andén hasta un lugar de desagüe que no afecte al público.

Mejorar zonas donde el clima actuó de manera negativa, pues durante el mes de noviembre y diciembre se presentaron fuertes lluvias, lo cual generó estragos y desgaste temprano en paredes, placas y daños en elementos estructurales existentes del Palacio Municipal, produciendo deterioros que no estaban contemplados dentro del alcance inicial del contrato y que requerían intervención inmediata para garantizar el adecuado funcionamiento y seguridad de las instalaciones.

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

El presente informe técnico corresponde al informe final de obra que muestra el avance y proceso de las actividades ejecutadas durante el periodo entre el 20 de octubre y el 19 de diciembre del año 2025.

2. OBJETIVO

El objetivo al generar este informe es socializar el seguimiento y control realizado a las actividades ejecutadas en terreno en los aspectos técnico, administrativos y financieros de acuerdo al contrato de obra No COP-2025-004 y, suscrito entre EL **MUNICIPIO DE EL DONCELLO** y la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**, cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ".** En la zona urbana del municipio de El Doncello.

3. DESCRIPCIÓN FISICA DEL MUNICIPIO EL DONCELLO - CAQUETÁ

El Doncello es un municipio de Colombia en el departamento del Caquetá. Plantado sobre el piedemonte de la Cordillera Oriental, está ubicado al nororiente de Florencia, capital del departamento. Es el primer Municipio productor de caucho a nivel Nacional, existen más de 200 hectáreas cultivadas en la Inspección de Maguaré y Puerto Manrique. Es la capital comercial del Caquetá por su frecuente tráfico económico ya que sus fértiles tierras son manipuladas por campesinos y el personal agro, quien lo saben aprovechar al máximo.

La Colonización del Norte Caqueteño exigió la fundación de un pueblo intermedio entre Florencia y Puerto Rico que brindara descanso y aprovisionamiento. Las tierras más indicadas eran las de Jorge Abel Molina y Rufino Quichoya.

Analizadas las múltiples posibilidades, el 20 de marzo de 1951, durante la pernoctación en casa de Jorge Abel Molina, de Jesús González y Juan Vicente Aguirre Ortiz y frente a la propuesta de este último, se decidió levantar el caserío; para esto Jorge Abel Molina donó un lote destinado a la plaza y otro para la escuela.

Región: PIEDEMONTE Y LA LLANURA AMAZÓNICA
Altura: 280 m.s.n.m
Temperatura Media: 24°C
Precipitación anual: 2145 mm
Veredas: 63.

Límites: Tomando como punto de partida el nacimiento del río Anayá; de este lugar en línea recta en dirección norte hasta encontrar el filo más alto que divide el departamento del Huila con el Caquetá y siguiendo este mismo límite hasta situarse frente del nacimiento del Río Nemal; de este punto en línea recta, aguas abajo hasta su desembocadura en el río Guayas; río Guayas abajo hasta la desembocadura del río Anayá; río Anayá arriba hasta su nacimiento, (primer punto de partida).

Principales Ríos: El principal curso de agua del municipio es el rio El Doncello y la quebrada Anaya, adicional a esto cuneta con quebradas importantes como El Quebradon, La Granada, El Nemal y San Jose.

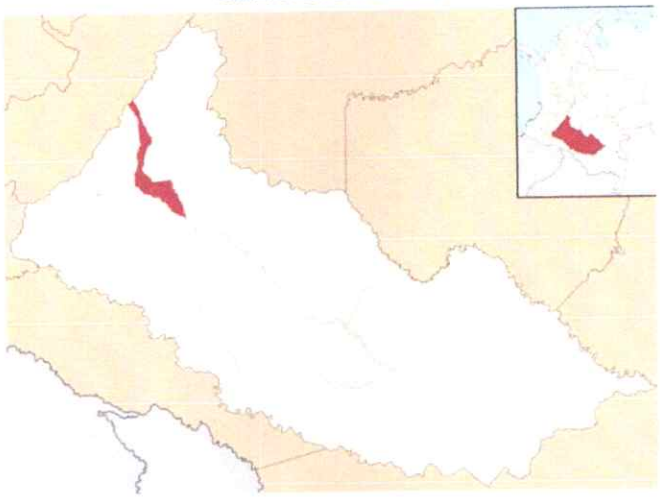


Ilustración 1. **Ubicación de El Doncello** – Fuente: **Google.**

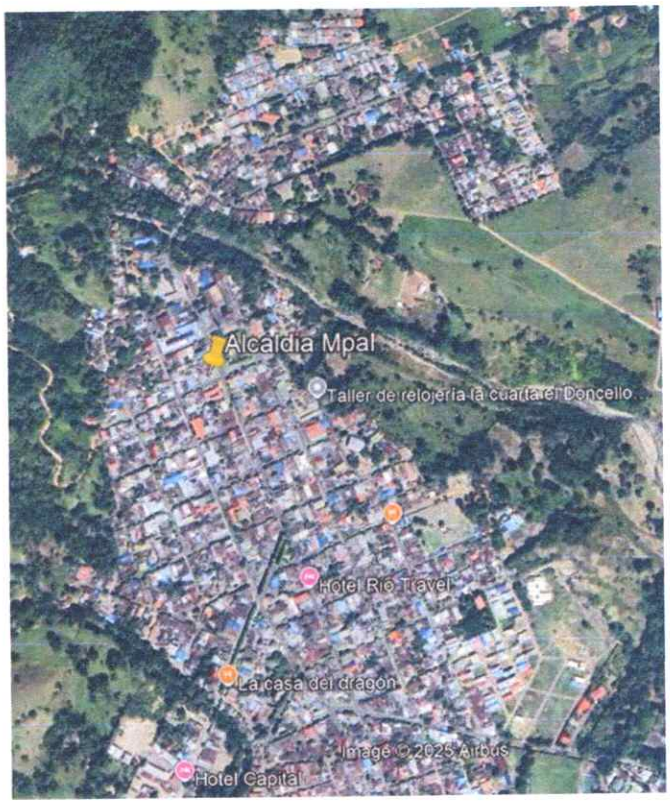


Ilustración 5. Ubicación del proyecto – Fuente: Google Earth

Latitud: 1°41'3.85"N – Longitud: 75°17'11.94"O

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

4. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL CONTRATO

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

JAIR DIAZ DIAZ

Alcalde de El Doncello

REPRESENTANTE DEL CONSTRATISTA:

WILLIAM CALDERON PEREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

5. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA

El municipio de El Doncello llevo a cabo un proceso de contratación estatal, con el fin de seleccionar un contratista de obra, que para este caso fue la empresa ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S, quien fue la encargada de ejecutar el contrato de obra No COP-2025-004, que tenía como alcance el mejoramiento de la infraestructura física del Palacio Municipal. El contrato de obra cuenta con unas características específicas las cuales se detallan a continuación, y deben ser cumplidas por el contratista; dentro de los involucrados en la ejecución del contrato de la referencia, se encuentra la máxima autoridad del municipio de El Doncello como ordenador del gasto y la Secretaria de Planeación y de las TIC´S como supervisor del contrato de obra No COP-2025-004.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**JAIR DIAZ DIAZ** Alcalde Municipal
SUPERVISOR DEL CONTRATO	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATISTA

NÚMERO DEL CONTRATO	**COP – 2025 - 004**

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ
NOMBRE CONTRATISTA	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	18 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO	20 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION	19 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION EFECTIVA	19 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (02) meses
VALOR INICIAL	$176.250.438
VALOR DEL ANTICIPO	$ 88.125.219
VALOR ADICION	$ 11.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 187.250.438
Valor Acta Final	$187.249.375
Valor a amortizar en el acta final	$ 88.125.219
Valor a pagar Acta Final	$99.124.156
Avance Ejecutado acumulado Porcentual en valor total	99.99%
Saldo a favor del municipio	$1.063

El contrato de obra No COP-2025-004 fue firmado el día 18 de septiembre de 2025, y se dio acta de inicio el día 20 de octubre del mismo año, y se finalizó el 19 de diciembre del 2025, dando cumplimiento al plazo establecido contractualmente.

El contrato fue ejecutado en su totalidad, es decir, que se dio cumplimiento al 99.99% de las actividades contratadas, teniendo en cuenta las costeadas con el recurso adicional, entre las cuales se encontraba el mejoramiento del palacio municipal, y como predominante, la reposición completa de la cubierta, la cual estaba en Eternit sobre cerchas, y fue adecuada con perfilería y tejas arquitectónica. Adicional a esto se desarrollaron actividades para la recolección de las aguas lluvias, tales como canales metálicas y bajantes en tubería pvc.

Finalmente, el contrato de obra fue ejecutado en dos (02) meses.

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

6. INFORME ADMINISTRATIVO

Durante el desarrollo de la obra se realizaron algunos aspectos administrativos que se resumen a continuación:

- ✓ Revisión y estudio de documentos generados en la etapa precontractual
- ✓ Se firmó acta de inicio del contrato
- ✓ Revisión del contrato de obra
- ✓ Chequeo equipo de trabajo
- ✓ Se participó en la socialización del proyecto con comunidad beneficiada

6.1 Discriminación de AIU

El AIU es clave para garantizar la viabilidad económica del proyecto, pues permite cubrir los costos indirectos, gestionar riesgos y asegurar que el contratista obtenga una utilidad razonable. De esta manera en la propuesta económica se presentó un porcentaje del 25.00% correspondiente a la Administración, el cual se discrimina así:

ADMINISTRACION INICIAL (SIN ADICION)

	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 135.577.260,00			
	DESCRIPCION	UND	CANT	% DE PART	FACT PREST	VALOR UNITARIO	MESES	VALOR TOTAL
1	PERSONAL DE OBRA							
1,1	Maestro de obra	mes	1	100%	138,36%	261.000	1,00	361.121
	TOTAL PERSONAL DE OBRA							361.121
2	OTROS - GASTOS GENERALES							
2,1	Estampillas y descuentos							
2.1.1	Pro-universidad	%	0,5%			176.250.438	1	881.252
2.1.2	Pro-Cultura	%	2,0%			176.250.438	1	3.525.009
2.1.3	Pro-Ancianato	%	4,0%			176.250.438	1	7.050.018
2.1.4	Pro-funcionamiento Casa de la Cultura e Imder	%	1,5%			176.250.438	1	2.643.757
2.1.5	Pro Electrificación	%	1,0%			176.250.438	1	1.762.504
2.1.6	Pro Deporte	%	2,5%			176.250.438	1	4.406.261
2.1.7	Pro Justicia	%	2,0%			176.250.438	1	3.525.009
2.1.8	Fondo de Seguridad	%	5,0%			176.250.438	1	8.812.522
2.1.9	Polizas	%	0,5%			176.250.438	1	926.863
	TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES:							33.533.194
	TOTAL ADMINISTRACION					25,00%		33.894.315
	IMPREVISTOS					0%		0
	UTILIDAD					5%		6.778.863
	TOTAL AIU					30%		40.673.178

ADMINISTRACION INICIAL (CON ADICION)

	COSTO DIRECTO TOTAL					**$ 144.038.798,46**		
	DESCRIPCION	**UND**	**CANT**	**% DE PART**	**FACT PRES**	**VALOR UNITARIO**	**MESES**	**VALOR TOTAL**
1	**PERSONAL DE OBRA**							
1,1	Maestro de obra	mes	1	100%	138,36%	319.098	1,00	441.506
	TOTAL PERSONAL DE OBRA							**441.506**
2	**OTROS - GASTOS GENERALES**							
2,1	Estampillas y descuentos							
2.1.1	Pro-universidad	%	0,5%			187.250.438	1	936.252
2.1.2	Pro-Cultura	%	2,0%			187.250.438	1	3.745.009
2.1.3	Pro-Ancianato	%	4,0%			187.250.438	1	7.490.018
2.1.4	Pro-funcionamiento Casa de la Cultura e Imder	%	1,5%			187.250.438	1	2.808.757
2.1.5	Pro Electrificación	%	1,0%			187.250.438	1	1.872.504
2.1.6	Pro Deporte	%	2,5%			187.250.438	1	4.681.261
2.1.7	Pro Justicia	%	2,0%			187.250.438	1	3.745.009
2.1.8	Fondo de Seguridad	%	5,0%			187.250.438	1	9.362.522
2.1.9	Polizas	%	0,5%			187.250.438	1	926.863
	TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES:							**35.568.194**
	TOTAL ADMINISTRACION					**25,00%**		**36.009.700**
	IMPREVISTOS					0%		0
	UTILIDAD					5%		7.201.940
	TOTAL AIU					**30%**		**43.211.640**

6.2 Discriminación de Factor Prestacional

El factor prestacional es el porcentaje del salario integral que corresponde a las prestaciones sociales que reciben los trabajadores, donde las prestaciones sociales corresponde a los beneficios adicionales que la empresa debe pagar a sus empleados, para el caso de las obras civiles, es común ver este factor afectado el salario base del personal ofrecido como equipo mínimo requerido, esto con el fin de que estos costos hagan parte de los gastos de administración, que para este caso

aplica para el maestro de obra, tal como se describe en la discriminación de la administración.

Ítem	Descripción	%
A	**SALARIO BÁSICO**	**100%**
B	**PRESTACIONES SOCIALES**	**35,87%**
	Primas de Servicios	8.33%
	Cesantías	8.33%
	Vacaciones	4,16%
	Auxilio de Transporte	14,05%
	Intereses sobre cesantías	1,00%
C	**SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**26,96%**
	Salud	4,00%
	Riesgos Profesionales	6,96%
	CCF	4,00%
	SENA	0,00%
	ICBF	0,00%
	Pensiones	12,00%
	SUBTOTAL FACTOR PRESTACIONAL (B+C)	**62.83%**
	TOTAL FACTOR PRESTACIONAL (A + B + C + D)	**162.83%**

6.3 Relación pagos de seguridad social

La seguridad social es la protección que proporciona la empresa ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S a las personas involucradas en la ejecución del contrato de obra en referencia, de esta manera se garantiza el acceso a la asistencia médica, en particular en caso de enfermedad o accidente laboral.

Para el caso de esta obra se relacionan las planillas pagadas del director, residente y maestro de obra, quienes hacen parte del equipo mínimo requerido, así mismo tres ayudantes entre ellos una mujer y un oficial, y un ornamentador, personal que está bajo la nómina de la empresa, y fueron los encargados del desarrollo de las actividades contractuales que dieron como resultado el mejoramiento de la Planta física del Palacio Municipal.

Es importante mencionar que LAURA CAMILA CALDERÓN NAVEROS de sexo femenino, se encuentra vinculada a la empresa y desarrolló actividades de mano de obra no calificada dentro de la obra, de esta manera se da cumplimiento a la cláusula

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

6.4 Planillas de Seguridad Social

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

OCTUBRE

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909592223	9494475467	E	2025/11/07	2025/11/06	NEQUI	0	$557,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 96352639	CALDERON WILLIAM									X									25-14	30	$1,800,000	$288,000	ESSC62	30	$1,800,000	$72,000	CCF13	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$125,300		$0	$0		$557,300

2025/12/22 09:24 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909592223	9494475467	E	2025/11/07	2025/11/06	NEQUI	0	$557,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,300	$0	$0	$125,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$125,300	$0	$0	$125,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,000	$0	$0	$72,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,000	$0	$0	$72,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
TOTAL				1	$557,300	$0	$0	$557,300

2025/12/22 09:24 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909624473	9494405262	E	2025/11/07	2025/11/06	NEQUI	0	$485,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077877363	CALDERON LAURA	X																	230301	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF13	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
2	CC	1006458912	MORALES YEFERSON	X																	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC62	11	$521,950	$20,900	CCF13	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
3	CC	1117499072	PALOMINO EDWIN	X																	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC62	11	$521,950	$20,900	CCF13	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
Total	**Afiliados(3)**																						$1,565,850	$250,800			$1,565,850	$62,700			$1,565,850	$62,700			$1,565,850	$109,200		$0	$0		$485,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1909624473	9494405262	E	2025/11/07	2025/11/06	NEQUI	0	$485,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$250,800	$0	$0	$250,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$250,800	$0	$0	$250,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200	$0	$0	$109,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$109,200	$0	$0	$109,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$62,700	$0	$0	$62,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$62,700	$0	$0	$62,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$62,700	$0	$0	$62,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$41,800	$0	$0	$41,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$20,900	$0	$0	$20,900
TOTAL				3	$485,400	$0	$0	$485,400

2025/12/22 09:09 AM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1909610661	9494431107	Y	2025/11/07	2025/11/06	NEQUI	0	$555,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1016077519	BAUTISTA HARVIN	X																	230301	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$65,300		0	$0	$0	14-23	11	$521,950	$36,400	0	$0	$0	No	$185,300
2	CC	1116920897	MARIN CRISTIAN	X																	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC62	11	$521,950	$65,300		0	$0	$0	14-23	11	$521,950	$36,400	0	$0	$0	No	$185,300
3	CC	1116917155	MORALES WILLIAM	X																	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC62	11	$521,950	$65,300		0	$0	$0	14-23	11	$521,950	$36,400	0	$0	$0	No	$185,300
Total	Afiliados(3)																						$1,565,850	$250,800			$1,565,850	$195,900			$0	$0			$1,565,850	$109,200		$0	$0		$555,900

2025/12/22 09:03 AM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1909610661	9494431107	Y	2025/11/07	2025/11/06	NEQUI	0	$555,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$250,800	$0	$0	$250,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$250,800	$0	$0	$250,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200	$0	$0	$109,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$109,200	$0	$0	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$195,900	$0	$0	$195,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$130,600	$0	$0	$130,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$65,300	$0	$0	$65,300
TOTAL				3	$555,900	$0	$0	$555,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1898538275	9493343626	I	2025/11/05	2025/11/04	BANCO DE BOGOTA	0	$1,033,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	$3,627,008	$580,400	EPS037	30	$3,627,008	$453,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2025/11/03 08:04 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1898538275	9493343626	I	2025/11/05	2025/11/04	BANCO DE BOGOTA	0	$1,033,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$580,400	$0	$0	$580,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$580,400	$0	$0	$580,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$453,400	$0	$0	$453,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$453,400	$0	$0	$453,400
TOTAL				1	$1,033,800	$0	$0	$1,033,800

2025/11/03 08:04 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	2007804740	9496420062	N	2025/11/05	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	40	$90,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0
1	CC	1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	($3,627,008)	($580,400)	EPS037	30	($3,627,008)	($453,400)		0	$0	$0	14-4	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	$3,627,008	$580,400	EPS037	30	$3,627,008	$453,400		0	$0	$0	14-4	30	$3,627,008	$88,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	2007804740	9496420062	N	2025/11/05	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	40	$90,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$88,400	$2,300	$0	$90,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$88,400	$2,300	$0	$90,700
TOTAL				1	$88,400	$2,300	$0	$90,700

2025/12/14 09:12 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1109005852
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL 8 N 1-23 CENTENARIO	TELÉFONO:	2600000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1749059353	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994426274

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1109005852	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF48-CONFATOLIMA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 469.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1109005852

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1109005852
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL 8 N 1-23 CENTENARIO	TELÉFONO:	2600000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4635887296**	TIPO DE PLANILLA:			I-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre	AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: octubre	AÑO: 2025
DIAS DE MORA:			26		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/19		NUMERO AUTORIZACIÓN:		9995207840
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA	1749359353		FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA		2025/10/23

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500									A										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1109005852	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF48-CONFATOLIMA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500									C										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.600	$ 0	$ 178.600	14-25-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1109005852	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF48-CONFATOLIMA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500									R										25-14 COLPENSIONES	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	NUEVA EPS CM	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0	1109005852	$ 64.400	0	$ 0	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 64.400**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17784323		VILLARREAL CRUZ JHOLIAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 7-50	EL DONCELLO-CAQUETA	4677922	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1922982123	9493541652	I	2025/11/10	2025/11/12	NEQUI	2	$557,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17784323	VILLARREAL JHOLIAN																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$43,900	0	$0	$0	No	$556,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0		$556,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17784323		VILLARREAL CRUZ JHOLIAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 7-50	EL DONCELLO-CAQUETA	4677922	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1922982123	9493541652	I	2025/11/10	2025/11/12	NEQUI	2	$557,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$400	$0	$288,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$400	$0	$288,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,900	$100	$0	$44,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,900	$100	$0	$44,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$300	$0	$225,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$225,000	$300	$0	$225,300
TOTAL				1	$556,900	$800	$0	$557,700

2025/12/22 09:27 AM

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

NOVIEMBRE

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975017561	9495852088	E	2025/12/04	2025/12/02	NEQUI	0	$557,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	96352639	CALDERON WILLIAM									X									25-14	30	$1,800,000	$288,000	ESSC62	30	$1,800,000	$72,000	CCF13	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$125,300		$0	$0		$557,300

2025/12/22 09:29 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975017561	9495852088	E	2025/12/04	2025/12/02	NEQUI	0	$557,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,300	$0	$0	$125,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$125,300	$0	$0	$125,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,000	$0	$0	$72,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,000	$0	$0	$72,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
TOTAL				1	$557,300	$0	$0	$557,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975038574	9495850975	E	2025/12/04	2025/12/02	NEQUI	0	$1,190,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077877363	CALDERON LAURA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1006458912	MORALES YEFERSON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1117499072	PALOMINO EDWIN	X	X																230301	21	$996,450	$159,500	ESSC62	21	$996,450	$39,900	CCF13	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
Total	**Afiliados(3)**																						$3,843,450	$615,100			$3,843,450	$153,900			$3,843,450	$153,900			$3,843,450	$267,600		$0	$0		$1,190,500

2025/12/22 09:16 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975038574	9495850975	E	2025/12/04	2025/12/02	NEQUI	0	$1,190,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$615,100	$0	$0	$615,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$615,100	$0	$0	$615,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$267,600	$0	$0	$267,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$267,600	$0	$0	$267,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$153,900	$0	$0	$153,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$153,900	$0	$0	$153,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$153,900	$0	$0	$153,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$96,900	$0	$0	$96,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				3	$1,190,500	$0	$0	$1,190,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1975061270	9495863986	Y	2025/12/04	2025/12/02	NEQUI	0	$1,529,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUBIERTA ALCALDIA (3 Afiliados)						$4,311,750	$689,900			$4,311,750	$539,000			$0	$0			$4,311,750	$300,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CUBIERTA ALCALDIA (3 Afiliados)						$4,311,750	$689,900			$4,311,750	$539,000			$0	$0			$4,311,750	$300,200		$0	$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (3 Afiliados)						$4,311,750	$689,900			$4,311,750	$539,000			$0	$0			$4,311,750	$300,200		$0	$0
1	CC	1016077519	BAUTISTA HARVIN	230301	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$89,000		0	$0	$0	14-23	15	$711,750	$49,600	0	$0	$0
2	CC	1116920897	MARIN CRISTIAN	230301	30	$1,800,000	$288,000	ESSC62	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$125,300	0	$0	$0
3	CC	1116917155	MORALES WILLIAM	230301	30	$1,800,000	$288,000	ESSC62	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$125,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$4,311,750	$689,900			$4,311,750	$539,000			$0	$0			$4,311,750	$300,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1975061270	9495863986	Y	2025/12/04	2025/12/02	NEQUI	0	$1,529,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$689,900	$0	$0	$689,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$689,900	$0	$0	$689,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$300,200	$0	$0	$300,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$300,200	$0	$0	$300,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$539,000	$0	$0	$539,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$450,000	$0	$0	$450,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$89,000	$0	$0	$89,000
TOTAL				3	$1,529,100	$0	$0	$1,529,100

2025/12/02 10:56 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1957623081	9494795401	I	2025/12/02	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	0	$1,033,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	$3,627,008	$580,400	EPS037	30	$3,627,008	$453,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2025/11/26 03:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1957623081	9494795401	1	2025/12/02	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	0	$1,033,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$580,400	$0	$0	$580,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$580,400	$0	$0	$580,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$453,400	$0	$0	$453,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$453,400	$0	$0	$453,400
TOTAL				**1**	**$1,033,800**	**$0**	**$0**	**$1,033,800**

2025/11/26 03:09 PM

38

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2007807814	9496420078	N	2025/12/02	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	13	$89,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0
1	CC	1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	($3,627,008)	($580,400)	EPS037	30	($3,627,008)	($453,400)		0	$0	$0	14-4	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	$3,627,008	$580,400	EPS037	30	$3,627,008	$453,400		0	$0	$0	14-4	30	$3,627,008	$88,400	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2007807814	9496420078	N	2025/12/02	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	13	$89,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$88,400	$800	$0	$89,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$88,400	$800	$0	$89,200
TOTAL				1	$88,400	$800	$0	$89,200

2025/12/14 09:13 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1109005852
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL 8 N 1-23 CENTENARIO	TELÉFONO:	2800000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1749308159	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994842974

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD							ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1109005852	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF48-CONFATOLIMA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 469.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1109005852

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1109005852
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL 8 N 1-73 CENTENARIO	TELÉFONO:	2600000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4635887822	TIPO DE PLANILLA:			N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	MES: noviembre	AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: noviembre	AÑO: 2025
DIAS DE MORA			7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		999297805
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA			1749308159 FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA		2025/11/27

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,423,500										A											25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	NUEVA EPS CM	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	S14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	1	$ 34,700	30	$ 1,423,500	CCF48-CONFATOLIMA	$ 28,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,423,500										C											25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	NUEVA EPS CM	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	S14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	1	$ 99,100	30	$ 1,423,500	CCF48-CONFATOLIMA	$ 28,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,423,500										R											25-14 COLPENSIONES	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	NUEVA EPS CM	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	S14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0	11090058 5	$ 64,400	0	$ 0	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 64.400**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17784323		VILLARREAL CRUZ JHOLIAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 7-50	EL DONCELLO-CAQUETA	4677922	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2022061787	9495079651	I	2025/12/05	2025/12/19	NU	14	$561,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17784323	VILLARREAL JHOLIAN																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$43,900	0	$0	$0	No	$556,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$43,900		$0	$0		$556,900

2025/12/22 09:31 AM

43

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17784323		VILLARREAL CRUZ JHOLIAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 7-50	EL DONCELLO-CAQUETA	4677922	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2022061787	9495079651	I	2025/12/05	2025/12/19	NU	14	$561,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$2,600	$0	$290,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$2,600	$0	$290,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,900	$400	$0	$44,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,900	$400	$0	$44,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$2,000	$0	$227,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$225,000	$2,000	$0	$227,000
TOTAL				1	$556,900	$5,000	$0	$561,900

44

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

DICIEMBRE

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2028503114	9496709901	E	2026/01/07	2025/12/22	NEQUI	0	$557,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	96352639	CALDERON WILLIAM									X									25-14	30	$1,800,000	$288,000	ESSC62	30	$1,800,000	$72,000	CCF13	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$125,300		$0	$0		$557,300

2025/12/22 09:38 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2028503114	9496709901	E	2026/01/07	2025/12/22	NEQUI	0	$557,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,300	$0	$0	$125,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$125,300	$0	$0	$125,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,000	$0	$0	$72,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,000	$0	$0	$72,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$72,000	$0	$0	$72,000
TOTAL				1	$557,300	$0	$0	$557,300

2025/12/22 09:38 AM

47

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2028512888	9496708221	E	2026/01/07	2025/12/22	NEQUI	0	$940,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077877363	CALDERON LAURA		X																230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF13	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300
2	CC	1006458912	MORALES YEFERSON		X																230301	19	$901,550	$144,300	ESSC62	19	$901,550	$36,100	CCF13	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300
3	CC	1117499072	PALOMINO EDWIN		X																230301	26	$1,233,700	$197,400	ESSC62	26	$1,233,700	$49,400	CCF13	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0	Si	$382,100
Total	Afiliados(3)																						$3,036,800	$486,000			$3,036,800	$121,600			$3,036,800	$121,600			$3,036,800	$211,500		$0	$0		$940,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2028512888	9496708221	E	2026/01/07	2025/12/22	NEQUI	0	$940,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$486,000	$0	$0	$486,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$486,000	$0	$0	$486,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$211,500	$0	$0	$211,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$211,500	$0	$0	$211,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$121,600	$0	$0	$121,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$121,600	$0	$0	$121,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$121,600	$0	$0	$121,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$85,500	$0	$0	$85,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,100	$0	$0	$36,100
TOTAL				3	$940,700	$0	$0	$940,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2028528601	9496709137	Y	2026/01/07	2025/12/22	NEQUI	0	$977,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1016077519	BAUTISTA HARVIN	X	T																230301	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$59,400		0	$0	$0	14-23	10	$474,500	$33,100	0	$0	$0	No	$168,500
2	CC	1116920897	MARIN CRISTIAN	X	T																230301	19	$1,140,000	$182,400	ESSC62	19	$1,140,000	$142,500		0	$0	$0	14-23	19	$1,140,000	$79,400	0	$0	$0	No	$404,300
3	CC	1116917155	MORALES WILLIAM		T																230301	19	$1,140,000	$182,400	ESSC62	19	$1,140,000	$142,500		0	$0	$0	14-23	19	$1,140,000	$79,400	0	$0	$0	No	$404,300
Total	**Afiliados(3)**																						$2,754,500	$440,800			$2,754,500	$344,400			$0	$0			$2,754,500	$191,900		$0	$0		$977,100

2025/12/22 09:46 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901209615	7	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CUBIERTA ALCALDIA	TV. 1A No. 4-86	EL DONCELLO-CAQUETA	3124219611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2028528601	9496709137	Y	2026/01/07	2025/12/22	NEQUI	0	$977,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$440,800	$0	$0	$440,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$440,800	$0	$0	$440,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$191,900	$0	$0	$191,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$191,900	$0	$0	$191,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$344,400	$0	$0	$344,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$285,000	$0	$0	$285,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$59,400	$0	$0	$59,400
TOTAL				3	$977,100	$0	$0	$977,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2007809806	9496420092	I	2026/01/05	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	0	$1,033,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	$3,627,008	$580,400	EPS037	30	$3,627,008	$453,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$3,627,008	$580,400			$3,627,008	$453,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2025/12/14 09:14 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2007809806	9496420092	I	2026/01/05	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	0	$1,033,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$580,400	$0	$0	$580,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$580,400	$0	$0	$580,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$453,400	$0	$0	$453,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$453,400	$0	$0	$453,400
TOTAL				1	$1,033,800	$0	$0	$1,033,800

2025/12/14 09:14 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2007812452	9496420110	N	2026/01/05	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	0	$88,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0
Ciudad: EL DONCELLO Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0
1	CC	1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	($3,627,008)	($580,400)	EPS037	30	($3,627,008)	($453,400)		0	$0	$0	14-4	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1110562700	BARTOLO YESID	25-14	30	$3,627,008	$580,400	EPS037	30	$3,627,008	$453,400		0	$0	$0	14-4	30	$3,627,008	$88,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,627,008	$88,400		$0	$0

2025/12/14 09:16 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110562700		BARTOLO LOZANO YESID FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAG 6 7 98 CEDRAL	EL DONCELLO-CAQUETA	4341416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2007812452	9496420110	N	2026/01/05	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	0	$88,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$88,400	$0	$0	$88,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$88,400	$0	$0	$88,400
TOTAL				1	$88,400	$0	$0	$88,400

2025/12/14 09:16 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1109005852
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO ESCOBAR LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CL S N 1-23 CENTENARIO	TELÉFONO:	2600000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4635888195		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/19		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995207885

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1109005852	ESCOBAR LOZANO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIOS AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL SALUD	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

SEGURIDAD SOCIAL ARP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1109005585	$ 99.100

PARAFISCALES	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	30	$ 1.423.500	CCF48-CONFATOLIMA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 533.400

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Unidad para las Víctimas

F-OAP-018-CAR

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **2025-0617831-1**
Fecha: 20/05/2025 09:58:57 AM

Firmado por: Diana Marcela Bustamante Arango 2025/05/20 09:59:02:094

Bogotá, martes 20 de mayo de 2025

Señor(a)
LAURA CAMILA CALDERON NAVEROS
Dirección: cra 4 # 6-08 b/ belalcazar
Teléfono: - 3102889738
El Doncello, Caquetá, 48

La UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS hace constar que, una vez consultado el Registro Único de Víctimas (RUV) el día **martes 20 de mayo de 2025**, el(la) señor(a) **LAURA CAMILA CALDERON NAVEROS**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1077877363**, evidencia el siguiente reporte de estado y hecho(s) victimizante(s):

DECLARACION/ RADICADO	ID	ESTADO VALORACION	HECHO(S) VICTIMIZANTES(	FECHA HECHO VICTIMIZANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
NK000711165	3408046(RUV)	Incluido	Desplazamiento forzado	01/10/2016	Caquetá (18)	El Doncello (18247)

ADVERTENCIA: Esta constancia se expide a petición del(a) interesado(a), previa verificación de su identidad, y da cuenta del estado de inscripción en el Registro Único de Víctimas, los hechos victimizantes por los que fue valorado y el lugar de ocurrencia de cada hecho, a la fecha de su expedición. El presente documento es de carácter personal e intransferible.

Al respecto, es preciso indicar que de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, toda la información suministrada por la Víctima y aquella relacionada con la solicitud de registro es de carácter RESERVADO, según lo citado en el parágrafo 1° del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011. En todo caso se deberá garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información.

De acuerdo con lo anterior y dadas las facultades legales descritas no se emitirán copias de este documento a ninguna otra entidad, ni persona natural o jurídica.

LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS SON GRATUITOS Y NO REQUIEREN DE INTERMEDIARIOS

DIANA MARCELA BUSTAMANTE ARANGO
Directora de Registro y Gestión de la Información
Unidad para las Víctimas

6.5 Certificación de paz y salvo por pago de seguridad social y parafiscales

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
NIT: 901.209.615-7

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S NIT: 901.209.615-7

CERTIFICA QUE:

Que, la empresa **ALWILL GLOBAL SERVICIO S.A.S,** identificado bajo el NIT No. 901.209.615-7, se encuentra obligada a cumplir con los pagos al SISTEMA DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; y que a la fecha la empresa **ALWILL GLOBAL SERVICIO S.A.S,** se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

En constancia, se firma en El Doncello - Caquetá, a los Veintidós días del mes de diciembre de 2025.

WILLIAM CALDERON PEREZ
C.C. No. 96.352.639 de El Doncello - Caquetá
R.L ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

JHOLIANA. VILLARREAL CRUZ
C.C. No. 17.784.323 de El Doncello – Caquetá
CONTADOR PÚBLICO
T.P No. 189865-T

Anexo: T.P, Certificado de la Junta de Contadores y Cedula de Ciudadanía.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189865-T



JHOLIAN ALBERTO
VILLARREAL CRUZ
C.C. 17784323
RESOLUCION INSCRIPCION 287
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FECHA 14/05/2014

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

200793

190696

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ACB11AE0EB10802 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHOLIAN ALBERTO VILLARREAL CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17784323 de EL DONCELLO (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 189865-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 17.784.323
VILLARREAL CRUZ
APELLIDOS
JHOLIAN ALBERTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1985
EL DONCELLO
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

01-SEP-2003 EL DONCELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-4400500-01083373-M-0017784323-20190711 0066288603A 2 51630347

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

6.6 Justificación de gastos de Administración

Los gastos de administración para el contrato en referencia, se encuentran soportados dentro del mismo informe final, toda vez que el 96.20% de los gastos de administración cuantificados en el discriminado a continuación, corresponden a los impuestos municipales (estampillas) para los contratos de obra y son de estricto cumplimiento, por ende son retenidos por el municipio antes de cualquier tipo de pago al contratista, mientras que el 3.80% restante corresponde a salarios del equipo mínimo requerido, donde dicho salario se justifica con el pago de seguridad social, por los días que se estuvo desarrollando la obra, y otros gastos que se soportan con los respectivos pagos, anexos seguidamente.

	COSTO DIRECTO TOTAL					$ 144.038.798,46			
	DESCRIPCION	UND	CANT	% DE PART	FACT PRES	VALOR UNITARIO	MESES	VALOR TOTAL	JUSTIFICACIÓN
1	PERSONAL DE OBRA								
1,1	Maestro de obra	mes	1	100%	138,36%	319.098	1,00	441.506	Se soporta con la seguridad social del personal. Ver cap. 6.4
	TOTAL PERSONAL DE OBRA							441.506	
2	OTROS - GASTOS GENERALES								
2,1	Estampillas y descuentos								
2.1.1	Pro-universidad	%	0,5%			187.250.438	1	936.252	Gastos que son descontados por la entidad contratante y son debitados al momento de los pagos
2.1.2	Pro-Cultura	%	2,0%			187.250.438	1	3.745.009	
2.1.3	Pro-Ancianato	%	4,0%			187.250.438	1	7.490.018	
2.1.4	Pro-funcionamiento Casa de la Cultura e Imder	%	1,5%			187.250.438	1	2.808.757	
2.1.5	Pro Electrificación	%	1,0%			187.250.438	1	1.872.504	
2.1.6	Pro Deporte	%	2,5%			187.250.438	1	4.681.261	
2.1.7	Pro Justicia	%	2,0%			187.250.438	1	3.745.009	
2.1.8	Fondo de Seguridad	%	5,0%			187.250.438	1	9.362.522	
2.1.9	Polizas	%	0,5%			187.250.438	1	926.863	Las pólizas se encuentran en el expediente contractual, donde se puede evidenciar los gastos acarreados
	TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES:							35.568.194	
	TOTAL ADMINISTRACION					25,00%		36.009.700	
	IMPREVISTOS					0%		0	

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

	UTILIDAD					5%		7.201.940	
	TOTAL AIU					**30%**		**43.211.640**	

La discriminación de la administración sufre una modificación durante la ejecución del contrato, toda vez que el valor del contrato vario, teniendo en cuenta la adición No 1 del 13 de diciembre de 2025, por esta razón, este discriminado presenta variaciones con respecto al entregado inicialmente.

6.7 Justificación de gastos de Factor Prestacional

Este gasto corresponde a los costos laborales con respecto a las leyes laborales, que establecen beneficios adicionales para los trabajadores más allá del salario básico. Este factor representa un coeficiente que incluye los costos asociados a las prestaciones sociales, beneficios legales y otros conceptos laborales obligatorios que el empleador debe pagar por cada trabajador, en este orden de ideas solo un empleado está afectado por el factor prestacional, lo cual es el caso del **MAESTRO DE OBRA,** quien se encuentra bajo la nómina de la empresa y acarrea un costo de prestaciones sociales que deben ser asumidas por Alwil Global Servicios S.A.S, esto se puede verificar con el pago de la seguridad social en capitulo 6.4.

7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

7.1 Acta de mayores y menores cantidades No 1

El contrato de obra No COP-2025-004, tuvo una modificación con respecto a las actividades iniciales, pues mediante el acta de mayores y menores cantidades No 01, se adicionaron actividades no previstas inicialmente, de donde partió la adición No 1 del 13 de diciembre de 2025.

Según la adición en mención se incluyeron actividades tales como:

NP 1	Corte de piso en concreto	ML	27,50
NP 2	Placa contrapiso e= 0,10 m en concreto de 3000 psi	M2	0,21
NP 3	Pintura para bajantes en PVC de 4"	ML	86,00
NP 4	Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Incluye elementos de fijación)	M2	40,80
NP 5	Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)	M2	10,80

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

NP 6	Suministro e Instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de incrustar)	UND	2,00
NP 7	Puerta en Aluminio con alma en lamina PVC	UND	1,00
NP 8	Suministro e instalación de pintura koraza	M2	236,00
NP 9	Estuco	M2	30,00

Esta modificación nace el día 27 de noviembre de 2025 cuando se realizó un Comité de Seguimiento y Supervisión donde el Representante Legal de ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S, el señor William Calderón Pérez toma la vocería e informa que, durante el desarrollo de las actividades y la inspección detallada de las áreas intervenidas, se identificaron afectaciones no previstas inicialmente en el alcance contractual, las cuales podrían generar daños mayores a futuro si no se atienden de manera oportuna. En tal sentido, y con concordancia con lo discutido en el Comité de Obra N° 01, se expone la necesidad de modificar el contrato mediante la inclusión de ítems no previstos, con el objetivo de prevenir deterioros adicionales, garantizar la correcta evacuación de aguas lluvias, recuperar zonas afectadas por humedad y asegurar la durabilidad de las obras ejecutadas.

ACTA MODIFICATORIA No 1

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FECHA	DD	10	MM	12
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	901.209.615-7	MODIFICATORIA	001		AA	2025
No. CONTRATO	COP-2025-004		ELABORO	WILLIAM CALDERON PEREZ			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ						
VALOR DEL CONTRATO	$ 176,250,438		VALOR ACTUAL	$ 187,250,438		PORCENTAJE	106.24%

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES (+/-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES							251.87	$ 18,474,665.00
1.1	Desmonte y retiro de cubierta existente (incluye	M2	251.87	$ 73,350.00	$ 18,474,665.00				
1.2	Demolicion de estructura existente (Incluye muros y losas)	M2	73.70	$ 43,650.00	$ 3,217,180.00	2.06	$ 89,919.00	75.76	$ 3,307,099.00
2	CUBIERTA								
2.1	Suministro e Instalación de Platina de anclaje de correas	KG	23.50	$ 28,950.00	$ 680,325.00			23.50	$ 680,325.00
2.2	Suministro e Instalación de Perfilería metálica en tubo rectangular	KG	1237.60	$ 35,250.00	$ 43,625,400.00			1,237.60	$ 43,625,400.00
2.3	Suministro e Instalación de teja arquitectónica	M2	436.84	$ 133,850.00	$ 58,471,034.00			436.84	$ 58,471,034.00
2.4	Suministro e Instalación de Flanche	ML	53.89	$ 119,550.00	$ 6,442,550.00			53.89	$ 6,442,550.00
2.5	Suministro e Instalación canal Metalica Cal, 18	ML	87.44	$ 323,100.00	$ 28,251,864.00			87.44	$ 28,251,864.00
2.6	Suministro e instalacion de bajantes de A-LL de 4"	ML	126.00	$ 49,650.00	$ 6,255,900.00			126.00	$ 6,255,900.00
2.7	Suministro e instalacion de tragantes de 4"	UND	14.00	$ 174,450.00	$ 2,442,300.00			14.00	$ 2,442,300.00
2.8	Suministro e Instalación caballete a=60 cm	ML	83.10	$ 98,200.00	$ 8,160,420.00			83.10	$ 8,160,420.00
3	ASEO GENERAL	GBL	1.00	$ 228,800.00	$ 228,800.00			1.00	$ 228,800.00
4	ITEMS NO PREVISTOS								
NP 1	Corte de piso en concreto	ML	27.50	$ 18,550.00		27.50	$ 510,125.00	27.50	$ 510,125.00
NP 2	Placa contrapiso e= 0,10 m en concreto de 3000 psi	M2	0.21	$ 178,900.00		0.21	$ 37,569.00	0.21	$ 37,569.00
NP 3	Pintura para bajantes en PVC de 4"	ML	86.00	$ 13,250.00		86.00	$ 1,139,500.00	86.00	$ 1,139,500.00
NP 4	Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Inlcuye elementos de fijación)	M2	40.80	$ 38,450.00		40.80	$ 1,568,760.00	40.80	$ 1,568,760.00
NP 5	Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)	M2	10.80	$ 85,850.00		10.80	$ 927,180.00	10.80	$ 927,180.00
NP 6	Suministro e Instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de incrustar)	UND	2.00	$ 118,650.00		2.00	$ 237,300.00	2.00	$ 237,300.00
NP 7	Puerta en Aluminio con alma en lamina PVC	UND	1.00	$ 789,650.00		1.00	$ 789,650.00	1.00	$ 789,650.00
NP 8	Suministro e instalación de pintura koraza	M2	149.31	$ 32,450.00		149.31	$ 4,844,997.00	149.31	$ 4,844,997.00
NP 9	Estuco	M2	30.00	$ 28,500.00		30.00	$ 855,000.00	30.00	$ 855,000.00
				VALOR COSTO TOTAL	$ 176,250,438.00		$ 11,000,000.00		$ 187,250,438.00
				ADMINISTRACION 25%	$ 33,854,315.00		$ 2,115,385.00		$ 36,009,700.00
				IMPREVISTOS 0%	$ -		$ -		$ -
				UTILIDAD 5%	$ 6,778,863.00		$ 423,077.00		$ 7,201,940.00
				VALOR AIU	$ 40,673,178.00		$ 2,538,462.00		$ 43,211,640.00
				COSTO DIRECTO	$ 135,577,260.00		$ 8,461,538.00		$ 144,038,798.00
				COSTO TOTAL	$ 176,250,438.00		$ 11,000,000.00		$ 187,250,438.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 176,250,438
VALOR AJUSTE	$ 11,000,000
PORCENTAJE DE AJUSTE	106.24%
VALOR TOTAL	$ 187,250,438

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

ORDENADOR DEL GASTO
JAIR DIAZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	DD	10	MM	12	AA	2025	EL DONCELLO	ELABORÓ	MUNICIPIO EL DONCELLO

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ
SEDE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO

ITEM	NP 1	CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	Corte de piso en concreto	UNID.	ML

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Area		
Piso anden fachada	1.53		2.00	9.00	27.5
					0.0
					0.0
					0.0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	DD	10	MM	12	AA	2025	EL DONCELLO	ELABORÓ	MUNICIPIO EL DONCELLO

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ
SEDE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO

ITEM	NP 2	CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	Placa contrapiso e= 0.10 m en concreto de 3000 psi	UNID.	M2

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Area		
Reposicion anden	0.23	0.10		9.00	0.2
					0.0
					0.0
					0.0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	DD	10	MM	12	AA	2025	EL DONCELLO	ELABORÓ	MUNICIPIO EL DONCELLO

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ
SEDE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO

ITEM	NP 3	CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	Pintura para bajantes en PVC de 4"	UNID.	ML

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Area		
Bajantes	9.56			9.00	86.0
					0.0
					0.0
					0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	DD	10	MM	12	AA	2025	EL DONCELLO	ELABORÓ	MUNICIPIO EL DONCELLO

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ
SEDE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO

ITEM	NP 4	CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Inlcuye elementos de fijación)	UNID.	M2

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Area		
Aula Concejo Municipal	6.00	6.80			40.8
					0.0
					0.0
					0.0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	DD	10	MM	12	AA	2025	EL DONCELLO	ELABORÓ	MUNICIPIO EL DONCELLO

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ
SEDE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO

ITEM	NP 5	CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)	UNID.	M2

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Area		
Cuarto Planeacion	2.50		4.30		10.8
					0.0
					0.0
					0.0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	DD	10	MM	12	AA	2025	EL DONCELLO	ELABORÓ	MUNICIPIO EL DONCELLO

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ
SEDE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO

ITEM	NP 6	CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	Suministro e Instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de incrustar)	UNID.	UND

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Area		
Cuarto Planeacion				2.00	2.0
					0.0
					0.0
					0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	DD	10	MM	12	AA	2025	EL DONCELLO	ELABORÓ	MUNICIPIO EL DONCELLO

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ
SEDE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO

ITEM	NP 7	CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	Puerta en Aluminio con alma en lamina PVC	UNID.	UND

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Area		
Puerta Planeacion				1.00	1.0
					0.0
					0.0
					0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	DD	10	MM	12	AA	2025	EL DONCELLO	ELABORÓ	MUNICIPIO EL DONCELLO

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ
SEDE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO

ITEM	NP 8	CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	Suministro e instalación de pintura koraza	UNID.	M2

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Area		
Muros internos					0.0
	2.00	2.30		1.00	4.6
	1.80	2.30		1.00	4.1
	10.00	2.30		1.00	23.0
	12.50	2.30		1.00	28.8
	15.9	2.30		1.00	36.6
	10.20	2.30		1.00	23.5
	2.800	2.30		1.00	6.4
	3.500	2.30		1.00	8.1
	1.800	2.30		1.00	4.1
	2.000	2.30		1.00	4.6
	2.424	2.30		1.00	5.6
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
Subtotal					149.31
Vienen					0.00
TOTAL					149.31

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y LAS TICS

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

FECHA	DD	10	MM	12	AA	2025	EL DONCELLO	ELABORÓ	MUNICIPIO EL DONCELLO

OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ
SEDE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO

ITEM	NP 9	CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	Estuco	UNID.	M2

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Area		
Muros internos					0.0
	2.00	2.30		1.00	4.6
	1.80	2.30		1.00	4.1
	9.28	2.30		1.00	21.3
					0.0
					0.0
					0.0

Codigo | GDE-ER-F-M-41 | Version

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
10	12	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 1	Corte de piso en concreto	ML	27.50

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	11,441.27	0.1	1,144.13
Cortadora industrial		DIA	50,000.00	0.03	1,683.89
				SUBTOTAL $	2,828.01

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0.05	-	-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria) 1Of y 1 Ay	188,738.00	1.8	339,728.00	0.03	11,441.27
				SUBTOTAL $	11,441.27
				TOTAL COSTO DIRECTO $	14,269.28

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	3,567.32	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	713.46	
		SUBTOTAL $	4,280.78
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	18,550.00

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y LAS TICS

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

Codigo	SCE-FICP-M-47	Version	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
10	12	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 2	Placa contrapiso e= 0,10 m en concreto de 3000 psi	M2	0.21

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	40,790.66	0.1	4,070.07
Mezcladora de concreto		acpm	15,000.00	0.17	2,500.00
				SUBTOTAL $	6,570.07

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO BASICO 1:2:3	M3	0.10	425425.00	42,542.50
Dilataciones de madera 0.10x3 m	UN	2.00	7500.00	15,000.00
Malla electrosoldada de 0.04	M2	1.00	28,500.00	28,500.00
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0.05	86,042.50	4,302.13
			SUBTOTAL $	90,344.63

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AAAAA (Albañilería) 1Of y 3Ay	365,614.00	1.8	658,105.00	0.06	40,700.66
			SUBTOTAL $		40,700.66
			TOTAL COSTO DIRECTO $		137,615.35

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	34,403.84	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	6,880.77	
		SUBTOTAL $	41,284.61
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	178,900.00

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y LAS TICS

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

Codigo | [illegible] | Version |

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
10	12	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Nº 3	Pintura para bajantes en PVC de 4"	ML	86.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	7,536.65	0.1	753.66
Andamios		Dia	2,500.00	0.03	84.19
				SUBTOTAL $	837.86

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
Pintura en esmalte	GL	0.02	78950.00	1,579.00
Brocha No 3	UND	0.01	15200.00	152.00
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0.05	1,731.00	86.55
			SUBTOTAL $	1,817.55

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNID	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria) 1Of y 1 Ay	188,736.00	1.8	339,725.00	0.02	7,536.65
				SUBTOTAL $	7,536.65
				TOTAL COSTO DIRECTO $	10,192.06

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	2,548.01	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	509.60	
		SUBTOTAL $	3,057.62
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	13,250.00

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y LAS TICS

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

Código	GDE-FO-PM-47	Versión	

La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
10	12	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 4	Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Incuye elementos de fijación)	M2	40.80

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	26,774.49	0.1	2,677.45
Andamios		DIA	2,500.00	0.05	125.00
				SUBTOTAL $	2,802.45

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0.05	-	-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria) 1Of y 1 Ay	188,738.00	1.8	339,728.00	0.08	26,774.49
				SUBTOTAL $	26,774.49
				TOTAL COSTO DIRECTO $	29,576.94

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	7,394.23	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	1,478.85	
		SUBTOTAL $	8,873.08
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	38,450.00

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ

R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y LAS TICS

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ

APOYO A LA SUPERVISION

Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
10	12	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 5	Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)	M2	10.80

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	6,289.39	0.1	628.94
Cortadora industrial		DIA			-
				SUBTOTAL $	628.94

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Angulo perimetral calibre 26	m	0.35	6655.00	2,329.25
Tornillo de 7 x 7/16"	UNIDAD	11.00	465.85	5,124.35
Perfil vertical paral 39 (viguetas)	UNIDAD	0.62	7,320.50	4,538.71
Perfil Omega	UNIDAD	0.90	8,651.50	7,786.35
Tornillo para placa 1" (6x1)	UNIDAD	13.00	465.85	6,056.05
Tornillo extraplano	UNIDAD	10.00	465.85	4,658.50
Angulo de cuelga	UNIDAD	0.30	9,982.50	2,994.75
PVC CIELO	UNIDAD	0.69	29,282.00	20,204.58
PERIMETRO SUJECION	m	0.25	5,124.35	1,281.09
Union	UNIDAD	0.10	13,310.00	1,331.00
Desperdicio	%	0.05	56,304.63	2,815.23
			SUBTOTAL $	59,119.86

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria) 1Of y 1 Ay	188,736.00	1.8	339,725.00	0.02	6,289.39
				SUBTOTAL $	6,289.39
			TOTAL COSTO DIRECTO $		66,036.19

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	16,509.55	
IMPREVISTOS	5%	3,301.91	
UTILIDAD		SUBTOTAL $	19,811.46
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	85,850.00

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y LAS TICS

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

Codigo		Version	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
10	12	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 6	Suministro e Instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de incrustar)	UND	2.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	7,180.85	0.1	718.09
					-
				SUBTOTAL $	718.09

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
Tubo conduit PVC de 1/2"	ML	8.00	1200.00	9,600.00
Alambre de cobre THW 12 AWG	ML	5.00	2200.00	11,000.00
Caja 2600 octogonal	UN	1.00	2,000.00	2,000.00
Caja 4x4 con suplemento	UN	1.00	5,300.00	5,300.00
interrup. sencillo	UN	1.00	7,500.00	7,500.00
Curva PVCE 1/2"	UN	2.00	800.00	1,600.00
Boquilla PVCE de 1/2"	UN	2.00	700.00	1,400.00
Cinta aislante	ROLLO	0.10	5,000.00	500.00
Lampara led de pvc 24 w	UN	1.00	40,500.00	40,500.00
Desperdicio	%	0.05	79,400.00	3,970.00
			SUBTOTAL $	83,370.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria) 1Of y 1 Ay	188,738.00	1.8	339,728.00	0.02	7,180.85
				SUBTOTAL $	7,180.85
				TOTAL COSTO DIRECTO $	91,268.94

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	22,817.23	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	4,563.45	
		SUBTOTAL $	27,380.68
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	118,650.00

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y LAS TICS

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

Codigo	COD-ESCP-F-M-47	Version	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
10	12	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 7	Puerta en Aluminio con alma en lamina PVC	UND	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	79,464.02	0.1	7,946.40
					-
				SUBTOTAL $	7,946.40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
Puerta en aluminio con alma en pvc	UND	1.00	480000.00	480,000.00
Elementos de fijación	UND	1.00	15250.00	15,250.00
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0.05	495,250.00	24,762.50
			SUBTOTAL $	520,012.50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañileria) 1Of y 1 Ay	188,738.00	1.8	339,728.00	0.23	79,464.02
				SUBTOTAL $	79,464.02
			TOTAL COSTO DIRECTO $		607,422.92

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	151,855.73	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	30,371.15	
		SUBTOTAL $	182,226.88
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	789,650.00

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y LAS TICS

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

Codigo: FOR-HOP-PMAT | Versión:

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
10	12	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8	Suministro e instalación de pintura koraza	M2	149.31

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	12,765.32	0.1	1,276.53
					-
				SUBTOTAL $	1,276.53

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
PINTURA KORAZA	GL	0.07	102000.00	7,140.00
RODILLO DE FELPA ANTIGOTEO	UND	0.10	14,000.00	1,400.00
LIJA	UND	0.40	2,200.00	880.00
BROCHA 2 1/2"	UND	0.20	7,500.00	1,500.00
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	10,920.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay	188,736.00	1.8	339,725.00	0.04	12,765.32
				SUBTOTAL $	12,765.32
				TOTAL COSTO DIRECTO $	24,961.85

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	6,240.46	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	1,248.09	
		SUBTOTAL $	7,488.55
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	32,450.00

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y LAS TICS

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

Codigo	GCE-EICP-FM-47	Version	1

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
10	12	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 9	Estuco	M2	30.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	17,295.60	0.1	1,729.56
					-
				SUBTOTAL $	1,729.56

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Estuco plastico	KG	1.20	1950.00	2,340.00
Lija	PLIEGO	0.30	1400.00	420.00
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0.05	2,760.00	138.00
			SUBTOTAL $	2,898.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNID	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					-
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay	188,738.00	1.8	339,728.00	0.05	17,295.60
				SUBTOTAL $	17,295.60
				TOTAL COSTO DIRECTO $	21,923.16

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	25%	5,480.79	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	1,096.16	
		SUBTOTAL $	6,576.95
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	28,500.00

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L WILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y LAS TICS

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE EL DONCELLO

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEM NO PREVISTOS

DEPARTAMENTO	CAQUETÁ		MUNICIPIO	EL DONCELLO		FECHA	10	diciembre	1900

CONTRATO No	COP-2025- 004	DE	2025					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ							
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S. R-L WILLIAM CALDERON PEREZ							
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC´S							
PROFESIONAL SUPERVISOR (A)	ING. KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO							
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	20	DE	octubre	DE	2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	176,250,438.00
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO		DE		DE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	176,250,438.00
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO		DE		DE				
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	20	DE	diciembre	DE	2025			

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
				CONTRATISTA	SUPERVISOR	VALOR ACORDADO
NP 01	Corte de piso en concreto	ML	27.50	$ 18,550.00	$ 18,550.00	$ 18,550.00
NP 02	Placa contrapiso e= 0,10 m en concreto de 3000 psi	M2	0.21	$ 178,900.00	$ 178,900.00	$ 178,900.00
NP 03	Pintura para bajantes en PVC de 4"	ML	86.00	$ 13,250.00	$ 13,250.00	$ 13,250.00
NP 04	Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Inlcuye elementos de fijación)	M2	40.80	$ 38,450.00	$ 38,450.00	$ 38,450.00
NP 05	Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)	M2	10.80	$ 85,850.00	$ 85,850.00	$ 85,850.00
NP 06	Suministro e Instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de incrustar)	UND	2.00	$ 118,650.00	$ 118,650.00	$ 118,650.00
NP 07	Puerta en Aluminio con alma en lamina PVC	UND	1.00	$ 789,650.00	$ 789,650.00	$ 789,650.00
NP 08	Suministro e instalación de pintura koraza	M2	149.31	$ 32,450.00	$ 32,450.00	$ 32,450.00
NP 09	Estuco	M2	30.00	$ 28,500.00	$ 28,500.00	$ 28,500.00

OBSERVACIONES: El precio unitario relacionado por el contratista, se obtuvo como resultado de promediar los precios unitarios de tres (03) cotizaciones, las cuales se anexan al presente tramite

Firma
ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S. R-L WILLIAM CALDERON PEREZ
CC N° 96.352.639 de El Doncello - Caquetá

Firma
ING. KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Supervisor
Secretaria de Planeación y de las Tic´s

Firma
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo a la supervisión CPSP - 2025-053
Secretaria de Planención y de las Tic´s

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE EL DONCELLO

ACTA DE FIJACIÓN DE ITEM NO PREVISTOS

FECHA: 10 | dic | 2025

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ MUNICIPIO: EL DONCELLO

CONTRATO No: COP-2025-004

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DOS (02) MESES**
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**20 DE octubre DE 2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	**DE DE**
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	**DE DE**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 176,250,438.00**
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	**20 DE diciembre DE 2025**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 176,250,438.00**

A.I.U :

A	25.00%
I	0.00%
U	5.00%
TOTAL	30.00%

GENERALIDADES:

Se deja constancia de la presente acta, se consideraron los siguiente documentos como soporte para respaldar los precios del mercado

1. Acta de Reunion No 01 del pasado 27 de noviembre del 2025,
2. Comparacion de precios unitarios de items no previstos, soportados con tres (03) cotizaciones previamente verificadas por la supervisión

Se establecen los precios que se resumen a continuación

ITEM	AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD APROX	PRECIO UNITARIO
NP 01		Corte de piso en concreto	ML	27.50	$ 18,550.00
NP 02		Placa contrapiso e= 0,10 m en concreto de 3000 psi	M2	0.21	$ 178,900.00
NP 03		Pintura para bajantes en PVC de 4"	ML	86.00	$ 12,250.00
NP 04		Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Inlcuye elementos de fijacion)	M2	40.80	$ 38,450.00
NP 05		Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)	M2	10.80	$ 85,850.00
NP 06		Suministro e instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de empotrar)	UND	2.00	$ 118,650.00
NP 07		Puerta en Aluminio con alma en lamina PVC	UND	1.00	$ 789,650.00
NP 08		Suministro e instalación de pintura koraza	M2	149.31	$ 32,450.00
NP 09		Estuco	M2	30.00	$ 28,500.00

NOTAS :

1- Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Item no previstos están referidos al origen del contrato y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado

2 - Para los contratos pactados sin ajustes, se tomaran los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud

3 -Hacen parte de la presente Acta de Fijacion los documentos relacionados en los numerales 1 y 2 de las generalidades del presente formato

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta los que en ella intervinieron a los diez (10) dias del mes de Diciembre de 2025

Firma
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
R.L. WILLIAM CALDERON PEREZ
CONTRATISTA

Firma
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Supervisor

Firma
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo a la supervisión CPSP - 2025-053
Secretaria de Planeación y de las Tic's

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ".

ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM NO PREVISTOS

Presentado a:

MUNICIPIO DE EL DONCELLO

2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ÍTEMS NO PREVISTOS

1. NP 1 – Corte de piso en concreto

Unidad de medida: Metro lineal (ML)

Descripción:
Consiste en realizar el corte controlado del piso en concreto existente mediante herramientas manuales o equipos eléctricos, para permitir la adecuación de instalaciones, reparaciones o remoción de secciones deterioradas.

Procedimiento:
Se inicia con la delimitación del área a intervenir, marcando la línea de corte según planos o indicaciones de la interventoría. Posteriormente, se realiza el corte con disco diamantado o herramienta eléctrica adecuada, asegurando profundidad uniforme. Finalmente, se retira el material desprendido y se limpia el área.
El procedimiento debe ejecutarse de manera continua, controlada y con medidas de seguridad para evitar daños en zonas no intervenidas.

Equipos:
Herramientas menores (pulidora, disco diamantado, elementos manuales).

Materiales:
No aplica.

Forma de Pago:
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de corte ejecutado y aprobado por la interventoría.

Incluye:
Mano de obra, herramientas y desperdicios.

2. NP 2 – Placa contrapiso e = 0,10 m en concreto de 3000 psi

Unidad de medida: Metro cuadrado (M^2)

Descripción:
Comprende la construcción de una placa de contrapiso con espesor de 10 cm en concreto de

3000 psi, destinada a áreas interiores o exteriores que requieren resistencia estructural y acabado nivelado.

Procedimiento:
Se realiza la limpieza del área, nivelación y preparación del terreno. Se coloca base granular si aplica y se instalan formaletas para contención. Luego se funde el concreto de 3000 psi, se vibra, se nivela y se ejecuta el acabado según especificaciones del proyecto. Debe garantizarse curado adecuado durante mínimo 7 días.

Equipos:
Herramientas menores (regla metálica, vibrador, palustre, carretilla).

Materiales:
Concreto 3000 psi premezclado o preparado en obra.

Forma de Pago:
Por metro cuadrado (M^2) de placa terminada y aprobada.

Incluye:
Mano de obra, herramientas, formaletas menores y desperdicios.

3. NP 3 – Pintura para bajantes en PVC de 4"

Unidad de medida: Metro lineal (ML)

Descripción:
Consiste en la aplicación de pintura especializada para PVC en bajantes de 4", con el fin de protegerlas y mejorar su acabado estético.

Procedimiento:
Se limpian las superficies con detergente o paño húmedo, se lija suavemente para dar adherencia, se aplica sellador para PVC y posteriormente dos manos de pintura tipo esmalte o vinilo apto para superficies plásticas.
La aplicación puede ser a brocha o rodillo según indicación técnica.

Equipos:
Herramientas menores (brochas, rodillos, lijas, recipientes).

Materiales:
Pintura para PVC, sellador, diluyentes si aplica.

Forma de Pago:
Por metro lineal (ML) pintado y aprobado por la interventoría.

Incluye:
Mano de obra, herramientas y desperdicios.

4. NP 4 – Desmonte y montaje de cielo raso en PVC (incluye elementos de fijación)

Unidad de medida: Metro cuadrado (M^2)

Descripción:
Comprende desmontar el cielo raso existente en PVC y realizar posteriormente su reinstalación, incluyendo el cambio o reposición de accesorios de fijación.

Procedimiento:
Se inicia retirando cuidadosamente las láminas y perfiles sin generar daño. Se revisa el estado de la estructura, reemplazando elementos deteriorados. Luego se reinstalan las láminas de PVC asegurando nivelación y correcta fijación.
Toda la operación debe ejecutarse evitando deformaciones o desprendimientos posteriores.

Equipos:
Herramientas menores (taladro, destornilladores, tijeras para PVC).

Materiales:
Tornillería, accesorios de fijación, uniones y elementos complementarios.

Forma de Pago:
Por metro cuadrado (M^2) desmontado y reinstalado.

Incluye:
Mano de obra, herramientas, accesorios y desperdicios.

5. NP 5 – Cielo raso en PVC (incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)

Unidad de medida: Metro cuadrado (M^2)

Descripción:
Instalación completa de cielo raso en PVC, incluyendo estructura metálica o en aluminio, láminas, perfiles, uniones y demás accesorios necesarios.

Procedimiento:
Se replantea el área y se instala la estructura de soporte nivelada. Posteriormente, se colocan las láminas de PVC y se fijan con tornillería adecuada. Se colocan uniones, remates y rinconeras para garantizar acabado limpio y hermético.
Debe preverse espacio para instalaciones eléctricas, luminarias y registros.

Equipos:
Herramientas menores (taladro, brocas, cortadora para PVC).

Materiales:
Láminas de PVC, estructura metálica, tornillería, uniones, remates.

Forma de Pago:
Por metro cuadrado (M^2) instalado y aprobado.

Incluye:
Mano de obra, herramientas y desperdicios.

6. NP 6 – Suministro e instalación de Panel LED redondo de 24W 6500K (de incrustar)

Unidad de medida: Unidad (UND)

Descripción:
Consiste en el suministro e instalación de luminaria tipo Panel LED redondo de 24W, luz blanca 6500K, de incrustar en cielo raso.

Procedimiento:
Se marca el punto donde será ubicada la luminaria, se realiza la perforación del cielo raso con herramienta adecuada, se conectan los cables con el driver siguiendo normativa RETIE y se incrusta el panel asegurando su fijación.
Debe verificarse funcionamiento y consumo.

Equipos:
Herramientas menores (destornilladores, perforadora, tester eléctrico).

Materiales:
Panel LED 24W, driver, conectores.

Forma de Pago:
Por unidad (UND) instalada y en funcionamiento.

Incluye:
Mano de obra, herramientas y desperdicios.

7. NP 7 – Puerta en aluminio con alma en lámina PVC

Unidad de medida: Unidad (UND)

Descripción:
Fabricación y colocación de puerta en aluminio con núcleo interno en lámina PVC, resistente a humedad y de uso institucional.

Procedimiento:
Se realiza la toma de medidas y replanteo. Se instala el marco y se nivelan los anclajes. Se fija la hoja de la puerta con bisagras y tornillería. Se colocan manija, chapa y accesorios complementarios.
Se verifica apertura, cierre y alineación.

Equipos:
Herramientas menores (taladro, remachadora, nivel).

Materiales:
Puerta en aluminio con alma en PVC, bisagras, tornillos, cerradura.

Forma de Pago:
Por unidad (UND) instalada y aprobada.

Incluye:
Mano de obra, herramientas y desperdicios.

8. NP 8 – Suministro e instalación de pintura Koraza

Unidad de medida: Metro cuadrado (M^2)

Descripción:
Aplicación de pintura tipo Koraza para interiores o exteriores, de alta durabilidad, protección y acabado fino.

Procedimiento:
Se limpia la superficie, se realiza resane menor si aplica y se aplica una mano de sellador.
Posteriormente se ejecutan dos manos uniformes de pintura Koraza.
Debe garantizarse secado entre capas y acabado uniforme.

Equipos:
Herramientas menores (rodillos, brochas, bandejas).

Materiales:
Pintura Koraza, sellador, resanes menores.

Forma de Pago:
Por metro cuadrado (M^2) pintado y aprobado.

Incluye:
Mano de obra, herramientas y desperdicios.

9. NP 9 – Estuco

Unidad de medida: Metro cuadrado (M^2)

Descripción:
Aplicación de estuco plástico para preparar superficies antes de pintura, corrigiendo porosidades y generando acabado liso.

Procedimiento:
Se limpia el muro, se aplica capa base de estuco y se deja secar. Luego se lija para lograr acabado fino y se aplica una o dos capas adicionales según necesidad.
Se debe garantizar superficie completamente lisa y libre de imperfecciones.

Equipos:
Herramientas menores (llana, espátulas, lijas).

Materiales:
Estuco plástico, lija, sellador si aplica.

Forma de Pago:
Por metro cuadrado (M^2) estucado y aprobado.

Incluye:
Mano de obra, herramientas y desperdicios.

WILLIAM CALDERÓN PÉREZ

R.L/ ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE EL DONCELLO

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEM NO PREVISTOS

DEPARTAMENTO	CAQUETÁ	MUNICIPIO	EL DONCELLO	FECHA	10	diciembre	1900

CONTRATO No: COP-2025- 004 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ

CONTRATISTA: ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S. R-L WILLIAM CALDERON PEREZ

SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC'S

PROFESIONAL SUPERVISOR (A): ING. KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	20	DE	octubre	DE	2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 176,250,438.00
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO		DE		DE		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 176,250,438.00
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO		DE		DE			
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	20	DE	diciembre	DE	2025		

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
				CONTRATISTA	SUPERVISOR	VALOR ACORDADO
NP 01	Corte de piso en concreto	ML	27.50	$ 18,550.00	$ 18,550.00	$ 18,550.00
NP 02	Placa contrapiso e= 0,10 m en concreto de 3000 psi	M2	0.21	$ 178,900.00	$ 178,900.00	$ 178,900.00
NP 03	Pintura para bajantes en PVC de 4"	ML	86.00	$ 13,250.00	$ 13,250.00	$ 13,250.00
NP 04	Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Inlcuye elementos de fijación)	M2	40.80	$ 38,450.00	$ 38,450.00	$ 38,450.00
NP 05	Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones rinconeras)	M2	10.80	$ 85,850.00	$ 85,850.00	$ 85,850.00
NP 06	Suministro e Instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de incrustar)	UND	2.00	$ 118,650.00	$ 118,650.00	$ 118,650.00
NP 07	Puerta en Aluminio con alma en lamina PVC	UND	1.00	$ 789,650.00	$ 789,650.00	$ 789,650.00
NP 08	Suministro e instalación de pintura koraza	M2	149.31	$ 32,450.00	$ 32,450.00	$ 32,450.00
NP 09	Estuco	M2	30.00	$ 28,500.00	$ 28,500.00	$ 28,500.00

OBSERVACIONES: El precio unitario relacionado por el contratista, se obtuvo como resultado de promediar los precios unitarios de tres (03) cotizaciones, las cuales se anexan al presente tramite.

Firma
ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S. R-L WILLIAM CALDERON PEREZ
CC N° 96.352.639 de El Doncello - Caquetá

Firma
ING. KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Supervisor
Secretaria de Planeación y de las Tic's

Firma
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo a la supervisión CPSP - 2025-053
Secretaria de Planeación y de las Tic's

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE EL DONCELLO
ACTA DE FIJACIÓN DE ITEM NO PREVISTOS

FECHA	10	dic	2025

DEPARTAMENTO: **CAQUETÁ** MUNICIPIO: **EL DONCELLO**

CONTRATO No. **COP-2025-004**

OBJETO DEL CONTRATO ☑ **MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ**

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**DOS (02) MESES**				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**20**	**DE**	**octubre**	**DE**	**2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO		**DE**		**DE**	
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO		**DE**		**DE**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 176,250,438.00**				
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	**20**	**DE**	**diciembre**	**DE**	**2025**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 176,250,438.00**				

A.I.U :

A	25.00%
I	0.00%
U	5.00%
TOTAL	30.00%

GENERALIDADES:

Se deja constancia de la presente acta. se consideraron los siguiente docuementos como soporte para respaldar los precios del mercado:

1. Acta de Reunión No.01 del pasado 27 de noviembre del 2025,
2. Comparación de precios unitarios de items no previstos. soportados con tres (03) cotizaciones previamente verificadas por la supervisión.

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD APROX	PRECIO UNITARIO
NP 01		Corte de piso en concreto	ML	27.50	$ 18,550.00
NP 02		Placa contrapiso e= 0,10 m en concreto de 3000 psi	M2	0.21	$ 178,900.00
NP 03		Pintura para bajantes en PVC de 4"	ML	86.00	$ 13,250.00
NP 04		Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Inlcuye elementos de fijación)	M2	40.80	$ 38,450.00

NP 05		Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)	M2	10.80	$ 85,850.00
NP 06		Suministro e Instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de incrustar)	UND	2.00	$ 118,650.00
NP 07		Puerta en Aluminio con alma en lamina PVC	UND	1.00	$ 789,650.00
NP 08		Suministro e instalación de pintura koraza	M2	149.31	$ 32,450.00
NP 09		Estuco	M2	30.00	$ 28,500.00

NOTAS :

1- Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Item no previstos están referidos al origen del contrato y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.

2 - Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.

3 -Hacen parte de la presente Acta de Fijación los documentos relacionados en los números 1 y 2 de las generalidades del presente formato.

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de Diciembre de 2025.

Firma
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
R.L. WILLIAM CALDERON PEREZ
CONTRATISTA

Firma
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Supervisor

Firma:
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo a la supervisión CPSP - 2025-053
Secretaria de Planeación y de las Tic´s

FERRECHIQUI

Luceli Taborda NIT. 65.631.399-7

Calle 6ª con Cra. 3 Esq. Cel. 3118334406 El Doncello - Caquetá

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
01	12	25	15	12	25

ENTREGA DE MATERIALES No. 4755

SEÑOR Municipio El Doncello - Caqueta

C.C. O NIT. 800045760-4 DIRECCIÓN Cra 4 Cll 3

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Alambre cobre No. 12	2500	25000
1	Angulo Cielo	10232,5	10.232,5
1	Angulo Perimetral cal 26	6905	6.905
1	Boquilla Pvc 1/2"	950	950
1	Broca 2 1/2"	7756	7.756
1	Broca No 3	15450	15.450
1	Caja 2600	2250	2.250
1	Caja 4x4	5550	5.550
1	Cinta aislante	5250	5.250
1	Curva Pvc 1/2"	1050	1.050
1	Dilatacion Madera 0,10x3	7750	7.750
1	Estuco kg	1950	1.950
1	Int. Sencillo	7500	7.500
1	Lamp led 24w	40500	40.500
1	Pliego Lija	1400	1.400
1	Malla electr. 0,04	28500	28.500

ACEPTADA

C.C. DE

TOTAL

FERRECHIQUI

Luceli Taborda NIT. 65.631.399-7

Calle 6ª con Cra. 3 Esq. Cel. 3118334406 El Doncello - Caquetá

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
01	12	25	01	12	25

ENTREGA DE MATERIALES

No. 4752

SEÑOR Municipio El Doncello Caqueta

C.C. O NIT. 900095760-4 DIRECCIÓN Cra 4 c/13

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Omega	8651,50	8.651,5
1	Viguetа	7320,50	7320,5
1	Esmalta 6l.	78950	78.950
1	Koraza 6l	102.000	102.000
1	Puerta Aluminio	479.900	479.900
1	Lamina Puc ciclo	29182	29.182
1	Rodillo (-el pq	13.900	13.900
1	Tornillo 7x7/16"	365,85	365,85
1	Tornillo Extraplano	365,85	365,85
1	Tornillo Placa 1"	365,85	365,85
1	Tubo Conduit Puc 1/2"	1100	1.100
1	Curva Puc ciclo	13210	13.210

ACEPTADA

C.C. DE

TOTAL

$ 680.811,5

ALMACÉN FERROCAMPO L.A

Calle 7 Cra. 4 No. 101
Cel. 310 8731148
El Doncello - Caquetá



DOCUMENTOS SOPORTE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADAS A FACTURAR

DOCUMENTO SOPORTE

FCLA N° 0167

01 | 12 | 25

SEÑOR Municipio El Doncello NIT 3138132427

C.C. O NIT 8000957 60-9 DIRECCIÓN Cra 4 cl 3 Esq.

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	m Alambre Co. N. 12	2.100	2.100
1	Angulo	4932	4832
1	Angulo cal 26	6505	6505
1	Boquilla 1/2"	5.50	550
1	Brocha 2 1/2"	7350	7350
1	Brocha N. 3	15050	15050
1	caja 2600	1850	1850
1	cj 4x4	5.150	5.150
1	Cinta Negra	4850	4850
1	curva PVC 1/2"	650	650
1	Estuco	2050	2.050
1	Int. Sencillo	7.600	7.600
1	Lamp. led. 24 W	40.600	40.600
1	Pliego lija	1500	1.500
1	M² Malla electrosoldada	28600	28.600

SUBTOTAL	
RETE IVA	
RETE ICA	
Total $	

4672821

ALMACÉN FERROCAMPO L.A

Calle 7 Cra. 4 No. 7-91
Cel. 310 8731145
El Doncello - Caquetá



DOCUMENTO SOPORTE

DOCUMENTOS SOPORTE DE DE ADQUISICIONES A NO OBLIGADAS A FACTURAR

FECHA DE EXPEDICIÓN: 01 | 12 | 25

FCLA N° 0167

SEÑOR Municipio El Doncello NIT 3188132427

C.C. O NIT 800095760-9 DIRECCIÓN Cra 4 Cll 3 Esq

CANT.	DETALLE	VL UNITARIO	VL TOTAL
1	omega	8754,5	8757,5
1	viguela	7,420,5	7,420,5
1	galon Esmalte	79050	79050
1	galon Koraza	102100	102100
1	Pueta Aluminio	479800	479800
1	Puc felpa oso	29082	29082
1	Rodillo Felpa	13800	13800
1	Tornillo 7 x 7/16"	265,85	265,85
1	Tornillo plana	265,85	265,85
1	Tornillo placa	265,85	265,85
1	conduit 1/2" (m)	1000	1000
1	Unión	13110	13110.

SON

AUTORIZACIÓN DE LA FACTURA No. TELEIMPRESORES PARA IMPRESIÓN AUTORIZACIÓN DE FACTURA DE VENTA

SUBTOTAL	
RETE IVA	
RETE ICA	
Total $	869,149.

CONFORME

FIRMA

4/07/26 2011

FERRETERIA EL DONCELLO

NADIA CRISTINA LOPEZ HOLGUIN
1.117.505.042-3
CRA 3 4-30 B/ Belalcazar El Doncello
ferreteriaeldoncello@outlook.com
tel: 3223261595

SEÑOR (A): MUNICIPIO EL DONCELLLO CAQUETÁ
NIT: 800.095.760-9
DIRECCION: CRA 4 CALLE 3 ESQ

ASUNTO: COTIZACION No 51632

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Alambre de cobre THW 12 AWG	UND	1,00	$ 2.000,00	$ 2.000,00
2	Angulo de cuelga	UND	1,00	$ 9.882,50	$ 9.882,50
3	Angulo perimetral calibre 26	UND	1,00	$ 6.555,00	$ 6.555,00
4	Boquilla PVCE de 1/2	UND	1,00	$ 600,00	$ 600,00
5	BROCHA 2 1/2"	UND	1,00	$ 7.400,00	$ 7.400,00
6	Brocha No 3	UND	1,00	$ 15.100,00	$ 15.100,00
7	Caja 2600 octogonal	UND	1,00	$ 1.900,00	$ 1.900,00
8	Caja 4x4 con suplemento	UND	1,00	$ 5.200,00	$ 5.200,00
9	Cinta aislante	UND	1,00	$ 4.900,00	$ 4.900,00
10	Curva PVCE 1/2	UND	1,00	$ 700,00	$ 700,00
11	Estuco plástico	UND	1,00	$ 1.850,00	$ 1.850,00
12	Interruptor sencillo	UND	1,00	$ 7.400,00	$ 7.400,00
13	Lampara led de pvc 24 w	UND	1,00	$ 40.400,00	$ 40.400,00
14	Lija	UND	1,00	$ 1.300,00	$ 1.300,00
15	Malla electrosoldada de 0.04	UND	1,00	$ 28.400,00	$ 28.400,00
16	Perfil Omega	UND	1,00	$ 8.551,50	$ 8.551,50
17	Perfil vertical paral 39 (viguetas)	UND	1,00	$ 7.220,50	$ 7.220,50
18	Pintura en esmalte	UND	1,00	$ 78.850,00	$ 78.850,00
19	PINTURA KORAZA	UND	1,00	$ 101.900,00	$ 101.900,00
20	Puerta en aluminio con alma en pvc	UND	1,00	$ 480.300,00	$ 480.300,00
21	PVC CIELO	UND	1,00	$ 29.582,00	$ 29.582,00
22	Rodillo de felpa antigoteo	UND	1,00	$ 14.300,00	$ 14.300,00
23	Torinillo de 7 x 7/16"	UND	1,00	$ 765,85	$ 765,85
24	Tornillo extraplano	UND	1,00	$ 765,85	$ 765,85
25	Tornillo para placa 1" (6x1)	UND	1,00	$ 765,85	$ 765,85
26	Tubo conduit PVC de 1/2	UND	1,00	$ 1.500,00	$ 1.500,00
27	Union	UND	1,00	$ 13.610,00	$ 13.610,00
				TOTAL	$ 871.699,05

ACEPTADA

C.C DE

Nota: Los materiales estan cotizados en valor unitarios

Cordialmente,

NADIA CRISTINA LOPEZ HOLGUIN

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

7.2 Relación de pagos

El contrato de obra en su cláusula quinta, menciona que el valor del contrato corresponde a CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($176.250.438) M/CTE más la adición de ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000), para un total de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($187.250.438,00) M/CTE, y en la cláusula octava, se evidencia la forma de pago, donde se indica que hará un anticipo del 47.063% del valor total del contrato luego de la adición, posterior se harán pagos parciales y un pago final; de esta manera se accedió al pago del anticipo y se va realizar un solo cobro final, del cual se amortiza el anticipo, toda vez que se dio cumplimiento al contrato de obra en un 99.99%, incluyendo las actividades no previstas.

VALOR INICIAL	$176.250.438,00
VALOR ADICION No 1	$ 11.000.000,00
VALOR TOTAL	$187.250.438,00
VALOR DEL ANTICIPO	$ 88.125.219,00
Valor Acta Final	$187.249.375,00
Valor a amortizar en el acta final	$ 88.125.219,00
Valor a pagar Acta Final	$99.124.156,00
Avance Ejecutado acumulado Porcentual en valor total	99.99%
Saldo a favor del municipio	$1.063

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

7.3 Amortización del Anticipo

A continuación, se presenta la relación de los documentos, y se hace claridad que el valor soportado corresponde a ***ochenta y ocho millones ciento veinticinco mil doscientos diecinueve pesos ($ 88.125.219),*** toda vez que este es el valor recibido en cuentas bancarias.

FECHA	No. FACTURA	NIT	RAZON SOCIAL	VR. TOTAL FACTURA
Materiales				
22/10/2025	FC14395	901,620,901-1	Fabritejas y laminas Caquetá S.A.S	$ 26.106.300,00
24/10/2025	FV6972	41,676,164-1	Ruth Elsy Mahecha Herrera	$ 696.000,00
25/11/2025	FEV-40381	65,631,399	Ferrechiqui	$ 2.370.494,00
15/12/2025	FEV-40773	65,631,399	Ferrechiqui	$ 2.774.999,00
Honorarios, salarios, prestaciones y/o Mano de obra				
20/10/2025	1	1016077519	Harvin Andres Bautistas Puente	$ 3.558.750,00
20/10/2025	2	1110562700	Yesid Fernando Bartolo Lozano	$ 9.600.000,00
20/10/2025	3	96352639	William Calderon Perez	$ 4.980.981,00
20/10/2025	4	1116920897	Cristian Marin	$ 9.000.000,00
20/10/2025	5	1116917155	William Morales	$ 9.000.000,00
20/10/2025	6	10778787363	Laura Calderón	$ 1.969.563,00
20/10/2025	7	1006458912	Yeferson Morales	$ 1.969.563,00
20/10/2025	8	1117499072	Edwin Palomino	$ 1.969.563,00
20/10/2025	9	17784323	Jholian Alberto Villareal Cruz	$ 7.000.000,00
20/10/2025	10	1109005852	Maria Camila Escobar Gaviria	$ 7.000.000,00
Alquiler				
20/10/2025	Oficina	40077673	Luz Mireya Lopez Bubu	$ 1.400.000,00

TOTAL AMORTIZACION	**$ 89.396.213,00**

7.3.1 Documentos soportes de Amortización del Anticipo

FABRITEJAS Y LAMINAS CAQUETA S.A.S.
901.620.901-1
CRA 11 4SUR 26 Diagonal Colegio La Normal Via a Puerto Arango
(601) 3204299238
Florencia - Colombia
fabritejasylaminascaqueta@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. FC 14395

Cliente: ALWIL GLOBAL SERVICIOS SAS
Nit: 901.209.615-7
Teléfono: (608) 3124219611 - Ext. 000
Dirección: CRA 4 #6-08
Ciudad: El Doncello - Colombia
Correo: alwill197101@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	22/10/2025, 14:45
Expedición	22/10/2025, 14:45
Vencimiento	22/10/2025
Vendedor	JHOJAN MAURICIO BERNAL
Centro de costo	0
Cotización	C-1-908

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 1/2 CCP	1,000.00	495.80	495,798.32	577,605.04
2	LAM GLV CAL 28 1.00x2,00m	7.00	34,453.78	241,176.47	280,970.59
3	LAM GLV CAL 18 en 1.10 mm 1,20x2,44m	18.00	140,336.13	2,526,050.42	2,942,848.74
4	TUBO 1/2 CAL 18 X 6M	14.00	21,176.47	296,470.59	345,388.24
5	TUBO 1 1/2 CAL 16 X 6M	10.00	57,563.03	575,630.25	670,609.24
6	TB CR RECTANGULAR 4 X 1 1/2 CL 18	10.00	57,983.19	579,831.93	675,504.20
7	PERLIN 150X50 TIPO C CAL 14 X 6M	5.00	109,243.70	546,218.49	636,344.54
8	TB CR RECTANGULAR 3 X 1 1/2 CL 18	50.00	46,218.49	2,310,924.37	2,692,226.89
9	TB CR RECTANGULAR 4 X 1 1/2 CAL 16	80.00	78,151.26	6,252,100.84	7,283,697.48
10	CABALLETE AZUL CL 26 2 X 0.60 M	43.00	21,008.40	903,361.34	1,052,415.97
11	CUBIERTA PREPINTADA ARQUITECTONICA AZUL CL 26 X 5 m	44.00	81,932.77	3,605,042.02	4,199,873.95
12	CUBIERTA PREPINTADA ARQUITECTONICA AZUL CL 26 x 6 m	36.00	98,319.33	3,539,495.80	4,123,512.61
13	CUBIERTA PREPINTADA ARQUITECTONICA AZUL CL 26 x 4 m	1.00	65,966.39	65,966.39	76,850.84

Total items: 13

Valor en Letras:
Veinticinco millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y ocho pesos m/cte con treinta y tres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - Tranferencia cuenta ahorros Banco Agrario de Colom	$	25,557,800.00
Efectivo - Otros Efectivo	$	48.33

Total Bruto	**21,938,067.23**
IVA 19%	**4,168,232.77**
Retefuente 2.5%	**548,451.67**
Total a Pagar	**25,557,848.33**

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092301314 aprobado en 20250425 prefijo FC desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE:
971e5eebdbe32ddb44cb5b8dbae60fc722e04fb7d4a0549a7ad9ca5a75302ac8b85eade11a7db4d9cfb3997431e2e57d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

MUNDO COLOR RM

RUTH ELSY MAHECHA HERRERA
NIT 41.676.164-1
RESPONSABLE DE IVA
CL 17 N 9 75 BRR CENTRO
TELS 3133517715 - 6084363287
FLORENCIA CAQUETA

Factura Electrónica de Venta **FV6972**

Fecha generación 2025-10-24 5:07:39-05:00
Fecha validación 2025-10-24 15:07:31 Moneda COP
Tipo operación Estandar

Adquiriente	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Documento/Nit	901209615-7
Dirección	CRA 4 6 08
Correo	alwill197101@gmail.com
Teléfono	3124219611
Código Postal	180002
Tipo Doc	31-NIT
Ciudad	Florencia-Caquetá

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1	774	12.00	unidad	SUPER ANTICORROSIVO - ROJO GALON	48.739.50	584.873.95	111.126.05	19	696.000.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Contado	2025-09-24	ZZZ	Acuerdo mutuo	VALOR PAGADO

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	584.873.95
Base	584.873.95
IVA	111.126.05
Impuestos	111.126.05
Total mas Impuesto	696.000.00
Total Operación	696.000.00

Observaciones

Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 00 /100 COP

Observación:

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a RUTH ELSY MAHECHA HERRERA. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceptode cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Cufe/Cude:561ecd01caef13b08caafcb9da3cf61142eb7201a89d6f12af0648f7a0bf7d0a43892330f2077c48057e15801d5906f7
Kiai Facturación, producto de KIAI S.A.S NIT 901337751, Proveedor Tecnológico Autorizado por la Dian www.kiai.co
Medellín-Colombia

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ce501a7d3b23cf2c82453fe455eb7c37a6b061f6c5a30ca29aa0d0e4123da9043c600a9ec68faff557951ac5320bfb05

Número de Factura: FEV-40381
Fecha de Emisión: 25/11/2025
Fecha de Vencimiento: 25/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRECHIQUI
Nombre Comercial: FERRECHIQUI
Nit del Emisor: 65631399
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: EL DONCELLO
Dirección: CL 6 CR 3 ESQ Brr. BELALCAZAR
Teléfono / Móvil: 3156293951
Correo: ferrechiquifacturasventas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901209615
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CR 4 6 08 BELALCAZAR
Teléfono / Móvil: 3124219611
Correo: alwil197101@gmail.com;alwil197101@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	010950	TAPON RECTANGULAR 4 X 1 1/2	94	15,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21
2	03661	TAPON PLASTICO RECTANGULAR 3 X 1 1/2	94	2,00	$ 1.680,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,65	19.00			$ 3.361,35
3	04089	CINTA TEFLON PEQUEÑA 8 MTS X 12 MM X 0.1 MM - UDUKE	94	1,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 239,50	19.00			$ 1.260,50
4	00461	TAPON SOLDADO DE 3/4	94	1,00	$ 672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 127,73	19.00			$ 672,27
5	00458	TAPON SOLDADO 1/2" - TIGRE	94	1,00	$ 420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 79,83	19.00			$ 420,17
6	00455	TAPON ROSCADO 3/4 TIGRE	94	1,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 239,50	19.00			$ 1.260,50
7	00263	SOLDADURA WEST ARCO 6013 X 3/32	94	10,00	$ 9.663,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.361,35	19.00			$ 96.638,65
8	06636	PINZA PORTA ELECTRODO 500 AMP - PRETUL	94	1,00	$ 41.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.823,53	19.00			$ 41.176,47
9	02037	CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX MEDIANA X 9 MTS-3M	94	1,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,48	19.00			$ 6.302,52
10	01810	DISCO CORTE FINO 7	94	3,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.550,42	19.00			$ 23.949,58
11	00558	TUBO PRESION 3/4 RDE 21 (TIGRE)	94	0,50	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 279,41	19.00			$ 1.470,59
12	00450	CODO PRESION 3/4" - TIGRE	94	3,00	$ 924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 526,89	19.00			$ 2.773,11
13	00279	UNION PRESION 1/2" - TIGRE	94	2,00	$ 420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,66	19.00			$ 840,34
14	00753	PERFIL CAL 18 8 X 4 - TUBO MUEBLE RECTANGULAR 1.10 MM 38 X 75 MM	94	32,00	$ 51.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 311.663,86	19.00			$ 1.640.336,14
15	05167	ANTICORROSIVO ROJO X GALON - SUPER	94	1,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.781,51	19.00			$ 46.218,49

16	04932	CEPILLO DE ALAMBRE 3 X 17 FILAS CON ESPATULA REF 11539 - TRUPER	94	1,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04
17	06478	SELLA GOTERAS CINTA M ULTIUSO 10CMX10M ROL LO	94	1,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.352,94	19.00			$ 117.647,06
18	00774	CINTA SEÑALIZACION X 500 MTS	94	1,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,23	19.00			$ 29.411,77
19	00499	UNION SANITARIA 4" - T UBOPLEX	94	1,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,49	19.00			$ 3.781,51
20	02290	ESTUCOMASTIC BLANCO GALON X 5 KG - PINTUCO	94	1,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
21	03571	YESO MARAVILLA 25KG C ORONA	94	2,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35
22	05730	LLANA ACERO INOXIDAB LE MANGO MADERA 420 M - GOYA	94	1,00	$ 32.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.226,89	19.00			$ 32.773,11
23	01874	PALUSTRE M/MADERA # 6	94	1,00	$ 12.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.315,13	19.00			$ 12.184,87
24	07509	1/1 ANTICORROSIVO BL ANCO X GALON - SUPER	94	1,00	$ 53.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.218,49	19.00			$ 53.781,51
25	00592	TINNER X GALON	94	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
26	00568	TUBO SANITARIO 4" X 6 MTS S/P - COLTUSEM TUB O COMPLETO X 6 M	94	21,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.941,18	19.00			$ 1.147.058,82
27	00517	LIJA DE AGUA OMEGA Y ABRACOL N.180 9X11	94	10,00	$ 1.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,05
28	00476	CODO SANITARIO 4 CXC TUBOPLEX	94	20,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59
29	00263	SOLDADURA WEST ARCO 6013 X 3/32	94	12,00	$ 9.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.033,61	19.00			$ 115.966,39
30	011373	TAPAGOTERAS GRIS 270 ML	94	5,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.764,71	19.00			$ 88.235,29
31	00756	ANGULO 1" X 1/8 - 2.5 M M X 25 MM X 6 M	94	10,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.899,16	19.00			$ 252.100,84
32	00030	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2 SEGMENTADO	94	5,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.785,72	19.00			$ 35.714,28
33	07429	DISCO CORTE METAL UL TRADELGADO 4.1/2" ROJ O	94	25,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,53
34	07671	PEGANTE TUBINSOL PEG A HUMEDO 1/4	94	1,00	$ 79.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.168,07	19.00			$ 79.831,93
35	00499	UNION SANITARIA 4" - T UBOPLEX	94	6,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.310,93	19.00			$ 22.689,07
36	10090	PISTOLA CALAFATEA RE FORZADA 81/2X2	94	1,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,23	19.00			$ 29.411,77
37	00271	GUANTE INGENIERO SEN CILLO	94	6,00	$ 8.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.196,64	19.00			$ 48.403,36
38	00271	GUANTE INGENIERO SEN CILLO	94	1,00	$ 8.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.532,77	19.00			$ 8.067,23
39	06220	SOGA MATIZ VERDE # 12 MM X 200 MTS	94	55,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.735,29	19.00			$ 161.764,71
40	01248	DISCO DIAMANTADO SE GMENTADO 7" CORNETA	94	1,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,23	19.00			$ 29.411,77
41	00756	ANGULO 1" X 1/8 - 2.5 M M X 25 MM X 6 M	94	2,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,17
42	07628	GAFA TIPO NORTON LEN TE TRANSPARENTE	94	4,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,56	19.00			$ 33.613,44
43	09098	DISCO CORTE FINO 7" T RICRAFT	94	2,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
44	010950	TAPON RECTANGULAR 4 X 1 1/2	94	10,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
45	01053	NIVEL TORPEDO 9" IMAN TADO - HOPEX	94	1,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,29	19.00			$ 11.764,71
46	00345	CEMENTO CEMEX X 50 KG KILO	94	5,00	$ 1.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
47	03571	YESO MARAVILLA 25KG C ORONA	94	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
48	09098	DISCO CORTE FINO 7" T RICRAFT	94	2,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
49	01811	DISCO DESBASTE METAL 4 1/2" X 1/4" X 7/8" - BAR RACUDA	94	1,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35
50	01677	DISCO FLAB 4 1/2 GRAN O 60	94	1,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35
51	011280	PISTOLA PINTAR ELECTR ICA 800 ML 450W TOTA	94	1,00	$ 142.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.142,86	19.00			$ 142.857,14
52	03707	COPA MAGNETICA TORN ILLO 1/4" X 5/16" - CORN ETA PATA LARGA	94	2,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.436,98	19.00			$ 7.563,02
53	00376	CLAVO CONCRETO 2 MEJ IA X 80 CAJA	94	1,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676,47	19.00			$ 8.823,53

54	00393	CLAVO LISO DE 1 MEJIA X760	94	5,00	$ 1.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 997,90	19.00			$ 5.252,10
55	05269	ESMALTE INDU AZUL ULT RAM ORBITEX BRILLANTE X GALON	94	1,00	$ 85.714,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.285,72	19.00			$ 85.714,28
56	07746	BISTURI METAL RECTRA + 10 HOHJA TRAPEZ FO RTE	94	1,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
57	00483	SEMICODO SANITARIO 4 " C X C - TUBOPLEX	94	10,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89
58	06478	SELLA GOTERAS CINTA M ULTIUSO 10CMX10M ROL LO	94	1,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.352,94	19.00			$ 117.647,06
59	00332	CODO SANITARIO 3" C X C - TUBOPLEX	94	4,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,60	19.00			$ 18.487,40
60	00578	TUBO SANITARIO 3" X 6 MTS S/P - COLTUSEM	94	2,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554,62	19.00			$ 13.445,38
61	01663	BROCA HSS 5/16 HIERRO - BARRACUDA	94	1,00	$ 18.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,60	19.00			$ 18.487,40
62	04421	ANGULO 1 1/4" X 1/8 X 6 MTS	94	1,00	$ 39.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.424,37	19.00			$ 39.075,63
63	00756	ANGULO 1" X 1/8 - 2.5 M M X 25 MM X 6 M	94	1,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.428,57	19.00			$ 28.571,43

Datos Totales

Documento generado el:
25/11/2025 17:44:33
Documento validado por la DIAN:
25/11/2025 17:44:34
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901337751
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.285.966,38
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.285.966,38
IVA	1.004.333,62
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.004.333,62
Total neto factura (=)	6.290.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6.290.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764100770511

Rango desde:
40001

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2027-10-29

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e69702c99204d9b25f2e88a4321a42d74f09d564448a287658a806c80a1c5d060dadaeaa1a49f8b35fd57306da805a36

Número de Factura: FEV-40773
Fecha de Emisión: 15/12/2025
Fecha de Vencimiento: 14/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRECHIQUI
Nombre Comercial: FERRECHIQUI
Nit del Emisor: 65631399
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: EL DONCELLO
Dirección: CL 6 CR 3 ESQ Brr. BELALCAZAR
Teléfono / Móvil: 3156293951
Correo: ferrechiquifacturasventas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901209615
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CR 4 6 08 BELALCAZAR
Teléfono / Móvil: 3124219611
Correo: alwill197101@gmail.com;alwill197101@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	07763	TEJA ARQUITECTONICA AZUL X 5 MTS CAL 26	94	15,00	$ 105.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 299.369,75	19.00			$ 1.575.630,25
2	04879	CABALLETE AZUL 2 X 60 MTS CAL 26	94	20,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.697,48	19.00			$ 756.302,52
3	06478	SELLA GOTERAS CINTA MULTIUSO 10CMX10M ROLLO	94	1,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.352,94	19.00			$ 117.647,06



Documento generado el:
15/12/2025 08:53:18
Documento validado por la DIAN:
15/12/2025 08:53:19
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901337751
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.449.579,83
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.449.579,83
IVA	465.420,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	465.420,17
Total neto factura (=)	2.915.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.915.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764100770511

Rango desde:
40001

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2027-10-29

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S Y HARVIN ANDRES BAUTISTA PUENTES

Entre las partes, por un lado **WILLIAM CALDERON PÉREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 96.352.639,** domiciliado en la ciudad de El Doncello, representante legal de **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**, con **NIT 901209615-7**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRANTANTE**, y por el otro, **HARVIN ANDRES BAUTISTA PUENTES**, identificado con cedula de ciudadanía **No 1.016.077.519** domiciliado en la ciudad de El Doncello, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATISTA**, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: **PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO DIRECTOR DE OBRA; EL CONTRATISTA** deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del **CONTRATANTE** unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **DOS (02) MESE,** contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** una suma de dinero que asciende a **TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.558.750) M/CTE** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de **EL CONTRATANTE.**

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará así: **EL CONTRATANTE** para al **CONTRATISTA** la suma de **MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($1.779.375) M/CTE** mensualmente, en el término de los primeros cinco (05) días calendarios posteriores al cumplimiento del mes.

CUARTA: Subcontratación, **EL CONTRATISTA** se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al **CONTRATANTE** de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. **El CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

1. Coordinar el inicio y desarrollo de la obra.
2. Revisar cronogramas de ejecución.
3. Verificar la calidad de los materiales y su correcta instalación.
4. Controlar los avances físicos y financieros de la obra.
5. Dirigir y coordinar el ingeniero residente.
6. Asignar tareas y verificar su ejecución.
7. Resolver conflictos laborales en la obra.
8. Revisar informes de avance técnico y financiero.

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por **EL CONTRATANTE** al **CONTRATISTA** son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de El Doncello, en la dirección Carrera 4 –

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

No 6 – 08 Barrio Belalcázar; y el TRABAJADOR, la ciudad de El Doncello en la dirección CALLE 4A NORTE No 5 - 25 BARRIO EL CEDRAL.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 20 DE OCTUBRE DE 2025, en tres (03) folios.

EL CONTRATANTE,

WILLIAM CALDERON PEREZ
C.C. 96.352.693
Representante Legal
Alwil Global Servicios S.A.S

EL CONTRATISTA,

HARVIN ANDRES BAUTISTA PUENTES
C.C. No 1.016.077.519
Contratista

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S Y YESID FERNANDO BARTOLO LOZANO

Entre las partes, por un lado **WILLIAM CALDERON PÉREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 96.352.639,** domiciliado en la ciudad de El Doncello, representante legal de **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**, con **NIT 901209615-7**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRANTANTE,** y por el otro, **YESID FERNANDO BARTOLO LOZANO**, identificado con cedula de ciudadanía **No 1.110.562.700** domiciliado en la ciudad de El Doncello, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATISTA**, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA; EL CONTRATISTA** deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del **CONTRATANTE** unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **DOS (02) MESES,** contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** una suma de dinero que asciende a **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600.000) M/CTE** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de **EL CONTRATANTE.**

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará así: **EL CONTRATANTE** para al **CONTRATISTA** la suma de **CUATRO MILLONES**

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

OCHOCIENTOS MIL PESOS ($4.800.000) M/CTE mensualmente, en el término de los primeros cinco (05) días calendarios posteriores al cumplimiento del mes.

CUARTA: Subcontratación, **EL CONTRATISTA** se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al **CONTRATANTE** de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. **El CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

1. Coordinar el inicio y desarrollo de la obra.
2. Elaborar y revisar cronogramas de ejecución.
3. Gestionar los recursos humanos, materiales y equipos.
4. Asegurar el cumplimiento de planos, especificaciones y normas de seguridad.
5. Verificar la calidad de los materiales y su correcta instalación.
6. Controlar los avances físicos y financieros de la obra.
7. Dirigir y coordinar al equipo de trabajo (obreros, técnicos, subcontratistas).
8. Asignar tareas y verificar su ejecución.
9. Resolver conflictos laborales en la obra.
10. Supervisar el uso eficiente de los recursos para evitar sobrecostos.
11. Aprobar valuaciones y certificaciones de obra.
12. Gestionar pedidos de materiales y equipos según el presupuesto.
13. Coordinar inspecciones con entidades reguladoras.
14. Informar avances, problemas y soluciones al director de obra o ingeniero residente.
15. Realizar informes de avance técnico y financiero.

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por **EL CONTRATANTE** al **CONTRATISTA** son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de El Doncello, en la dirección Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar; y el TRABAJADOR, la ciudad de El Doncello en la dirección DIAGONAL 6 No 7-98 BARRIO EL CEDRAL.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 20 DE OCTUBRE DE 2025, en tres (03) folios.

EL CONTRATANTE,

WILLIAM CALDERON PEREZ
C.C. 96.352.693
Representante Legal
Alwil Global Servicios S.A.S

EL CONTRATISTA,

YESID FERNANDO BARTOLO LOZANO
C.C. No 1.110.562.700
Contratista

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S Y CRISTIAN ALBERTO MARIN OROZCO

Entre las partes, por un lado **WILLIAM CALDERON PÉREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 96.352.639,** domiciliado en la ciudad de El Doncello, representante legal de **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**, con **NIT 901209615-7**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRANTANTE**, y por el otro, **CRISTIAN ALBERTO MARIN OROZCO**, identificado con cedula de ciudadanía **No 1.116.920.897** domiciliado en la ciudad de El Doncello, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATISTA**, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: **PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ORNAMENTADOR METALICO; EL CONTRATISTA** deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del **CONTRATANTE** unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **DOS (02) MESE,** contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** una suma de dinero que asciende a **NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) M/CTE** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de **EL CONTRATANTE.**

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará así: **EL CONTRATANTE** para al **CONTRATISTA** la suma de **CUATRO MILLONES**

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) M/CTE mensualmente, en el término de los primeros cinco (05) días calendarios posteriores al cumplimiento del mes.

CUARTA: Subcontratación, **EL CONTRATISTA** se compromete a asumir las cargas *contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente* vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al **CONTRATANTE** de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. **El CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

1. Interpretar planos, especificaciones y símbolos de soldadura (WPS/PQR) para entender el proyecto.
2. Limpiar, cortar, biselar y ensamblar las piezas metálicas.
3. Montar accesorios (sargentos, prensas) para fijar las piezas.
4. Operar equipos de soldadura (máquinas, antorchas)
5. Realizar cordones de soldadura con diferentes técnicas (ej. avance, oscilación).
6. Unir tuberías, láminas, estructuras metálicas, etc., según especificaciones.
7. Inspeccionar visualmente y realizar pruebas a las soldaduras.
8. Aplicar rigurosamente las normas de seguridad (EPP, ventilación, protección de la zona).

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por **EL CONTRATANTE** al **CONTRATISTA** son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de El Doncello, en la dirección Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar; y el TRABAJADOR, la ciudad de El Doncello en la dirección AVENIDA COLOMBIA NO 7-12 / BARRIO LA LIBERTAD.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 20 DE OCTUBRE DE 2025, en tres (03) folios.

EL CONTRATANTE,

WILLIAM CALDERON PEREZ
C.C. 96.352.693
Representante Legal
Alwil Global Servicios S.A.S

EL CONTRATISTA,

Cristian Marín

CRISTIAN ALBERTO MARIN OROZCO
C.C. No 1.116.920.897
Contratista

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S Y WILLIAM ANDRES MORALES

Entre las partes, por un lado **WILLIAM CALDERON PÉREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 96.352.639,** domiciliado en la ciudad de El Doncello, representante legal de **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**, con **NIT 901209615-7**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRANTANTE**, y por el otro, **WILLIAM ANDRES MORALES**, identificado con cedula de ciudadanía **No 1.116.917.155** domiciliado en la ciudad de El Doncello, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATISTA**, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: **PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ORNAMENTADOR METALICO; EL CONTRATISTA** deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del **CONTRATANTE** unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **DOS (02) MESE,** contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** una suma de dinero que asciende a **NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) M/CTE** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de **EL CONTRATANTE.**

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará así: **EL CONTRATANTE** para al **CONTRATISTA** la suma de **CUATRO MILLONES**

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) M/CTE mensualmente, en el término de los primeros cinco (05) días calendarios posteriores al cumplimiento del mes.

CUARTA: Subcontratación, **EL CONTRATISTA** se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al **CONTRATANTE** de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. **El CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

1. Interpretar planos, especificaciones y símbolos de soldadura (WPS/PQR) para entender el proyecto.
2. Limpiar, cortar, biselar y ensamblar las piezas metálicas.
3. Montar accesorios (sargentos, prensas) para fijar las piezas.
4. Operar equipos de soldadura (máquinas, antorchas)
5. Realizar cordones de soldadura con diferentes técnicas (ej. avance, oscilación).
6. Unir tuberías, láminas, estructuras metálicas, etc., según especificaciones.
7. Inspeccionar visualmente y realizar pruebas a las soldaduras.
8. Aplicar rigurosamente las normas de seguridad (EPP, ventilación, protección de la zona).

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por **EL CONTRATANTE** al **CONTRATISTA** son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de El Doncello, en la dirección Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar; y el TRABAJADOR, la ciudad de El Doncello en la dirección CALLE 16 No 7 58 B/O VILLA COLOMBIA.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 20 DE OCTUBRE DE 2025, en tres (03) folios.

EL CONTRATANTE,

WILLIAM CALDERON PEREZ
C.C. 96.352.693
Representante Legal
Alwil Global Servicios S.A.S

EL CONTRATISTA,

WILLIAM ANDRES MORALES
C.C. No 1.116.917.155
Contratista

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S Y JHOLIAN ALBERTO VILLAREAL CRUZ

Entre las partes, por un lado **WILLIAM CALDERON PÉREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 96.352.639,** domiciliado en la ciudad de El Doncello, representante legal de **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**, con **NIT 901209615-7**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRANTANTE**, y por el otro, **JHOLIAN ALBERTO VILLAREAL CRUZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 17.784.323** domiciliado en la ciudad de El Doncello, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATISTA**, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE; EL CONTRATISTA** deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del **CONTRATANTE** unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **DOS (02) MESE,** contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** una suma de dinero que asciende a **SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de **EL CONTRATANTE.**

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará así: **EL CONTRATANTE** para al **CONTRATISTA** la suma de **SIETE MILLONES DE**

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) M/CTE mensualmente, en el término de los primeros cinco (05) días calendarios posteriores al cumplimiento del mes.

CUARTA: Subcontratación, **EL CONTRATISTA** se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al **CONTRATANTE** de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. **El CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

1. Supervisar la contabilidad de la empresa para garantizar su exactitud
2. Calcular y presentar impuestos (IVA, retenciones, etc.)
3. Optimizar la carga impositiva dentro del marco legal.

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por **EL CONTRATANTE** al **CONTRATISTA** son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de El Doncello, en la dirección Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar; y el TRABAJADOR, la ciudad de El Doncello en la dirección TRANSVERSAL 1A No 4-86 BARRIO ABBAS TURBAY.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 20 DE OCTUBRE DE 2025, en tres (03) folios.

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

EL CONTRATANTE,

WILLIAM CALDERON PEREZ
C.C. 96.352.693
Representante Legal
Alwil Global Servicios S.A.S

EL CONTRATISTA,

JHOLIAN ALBERTO VILLAREAL CRUZ
C.C. No 17.784.323
Contratista

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S Y MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO

Entre las partes, por un lado **WILLIAM CALDERON PÉREZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 96.352.639,** domiciliado en la ciudad de El Doncello, representante legal de **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**, con **NIT 901209615-7**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRANTANTE**, y por el otro, **MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO**, identificado con cedula de ciudadanía **No 1.109.005.852** domiciliado en la ciudad de El Doncello, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denomina como **EL CONTRATISTA**, ambos mayores de edad, identificados como aparece al pie de las firmas, hemos acordado suscribir este contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL COMO SISO; EL CONTRATISTA** deberá prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y presupuestal, dentro del plazo acordado, los servicios y/o actividades enunciadas a lo largo del presente contrato. Como contraprestación recibirá por parte del **CONTRATANTE** unas sumas de dinero, a título de honorarios.

SEGUNDA: Plazo de Ejecución. El término de duración del presente contrato, será de **DOS (02) MESES,** contados a partir de la firma del mismo, el cual tiene como objeto las actividades descritas adelante, además de aquellas que por la naturaleza del mismo resulten pertinentes.

TERCERA: Valor. **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** una suma de dinero que asciende a **SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE** por la totalidad de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte de **EL CONTRATANTE.**

Parágrafo. Forma de Pago. El valor descrito en este clausula se pagará así: **EL CONTRATANTE** para al **CONTRATISTA** la suma de **SIETE MILLONES DE**

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

PESOS ($7.000.000) M/CTE mensualmente, en el término de los primeros cinco (05) días calendarios posteriores al cumplimiento del mes.

CUARTA: Subcontratación, **EL CONTRATISTA** se compromete a asumir las cargas contractuales u obligaciones laborales resultado de relaciones externas al presente vínculo, que tengan por finalidad el cumplimiento total o parcial del objeto contractual.

Parágrafo: EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne al **CONTRATANTE** de las acciones legales que sus dependientes ejerzan en su contra.

QUINTA: Obligaciones Del Contratista. **El CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el Objeto del Contrato, razón por la cual tendrá las siguientes obligaciones:

1. Realizar inspecciones para identificar peligros y evaluar riesgos.
2. Desarrollar e implementar planes de prevención de accidentes.
3. Recomendar y supervisar el uso adecuado de EPP (Elementos de Protección Personal).
4. Dictar charlas de seguridad (inducción, pausas activas, manejo de emergencias).
5. Capacitar al personal sobre normas de seguridad y buenas prácticas.
6. Garantizar que la obra cumpla con las normas de seguridad laboral (ej. Resolución 0312 de 2019 en Colombia).
7. Verificar el cumplimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

SEXTA: Las sumas de dinero que eventualmente sean reconocidas por **EL CONTRATANTE** al **CONTRATISTA** son por mera liberalidad y de ninguna manera pueden ser considerados como hechos o actos que infieran una relación de naturaleza laboral.

SÉPTIMA: Solución de conflictos. Se acuerda que de presentarse un conflicto entre las partes, en el marco del presente contrato, las partes deberán acudir en primera instancia a un centro de conciliación certificado.

OCTAVA: Domicilio. Para todos los efectos legales y de notificación el domicilio de las partes es: el EMPLEADOR: la ciudad de El Doncello, en la dirección Carrera 4 –

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

No 6 – 08 Barrio Belalcázar; y el TRABAJADOR, la ciudad de El Doncello en la dirección DIAGONAL 10B No 1 - 70 - 78.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato, en dos ejemplares del mismo tenor, el día 20 DE OCTUBRE DE 2025, en tres (03) folios.

EL CONTRATANTE,

WILLIAM CALDERON PEREZ
C.C. 96.352.693
Representante Legal
Alwil Global Servicios S.A.S

EL CONTRATISTA,

MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO
C.C. No 1.109.005.852
Contratista

MINUTA
Contrato de Arrendamiento de Oficina

DATOS DE LAS PARTES		
Nombre del Arrendador	Luz Mireya Lopez Bubú	
Identificación del arrendador	40077673	
Nombre del arrendatario	Alwil Global Servicios S.A.S	
Identificación del arrendatario	Nit. 901209615-7	
DATOS DEL INMUEBLE		
Dirección Inmueble	K 2 3 78	
Barrio de ubicación del inmueble	20 de Abril	
Ciudad	El Doncello Caquetá	
El inmueble se encuentra sometido a propiedad horizontal		**Sí___No_X_** (marque con una x)
El inmueble cuenta con disponibilidad de los siguientes servicios públicos:	Agua: **Sí_X_No___**(marque con una x)	Gas: **Sí___No_X__**(marque con una x)
	Energía Eléctrica: **Sí _X_ No___**(marque con una x)	Teléfono: **Sí___No_X** (marque con una x)
	Internet: **Sí_X__No___**(marque con una x)	Otros: _____
VALOR		
Valor del Canon	Setecientos mil pesos ($ 700.000) m/cte, mensuales por dos (02) meses para un total de Un millón cuatrocientos mil pesos ($1.400.000) m/cte.	
Término del Contrato:	Fecha de Inicio del Contrato	20/10/2025
	Fecha de terminación del Contrato	19/10/2025
La cuota de administración hace parte del Canon		**Sí____No____No aplica _X_** (marque con una x)
El canon debe pegarse a	Luz Mireya López Bubú, en efectivo	

Condiciones Generales

Los celebrantes, por una parte, la señora **Luz Mireya López Bubú,** identificada con Cédula *de Ciudadanía No.* **40077673 de Florencia,** *con domicilio principal en la ciudad de El Doncello.*, quien para todos los efectos de este contrato se denominará en adelante **El ARRENDADOR**, y de otra parte el señor **William Calderón Pérez,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **96352639 de El Doncello,** quien para todos los efectos de este contrato se denominarán **EL ARRENDATARIO,** han convenido celebrar el presente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE** ubicado en la **CARRERA 2 No 3 – 78 Barrio 20 de Abril en el municipio de El Doncello** que se regirá por lo establecido en el Código Civil Colombiano, sus normas concordantes y las siguientes **CLÁUSULAS:**

PRIMERA.- OBJETO. Mediante el presente contrato **EL ARRENDADOR** concede al **ARRENDATARIO** el goce del inmueble, obligándose éste a pagar a aquel un canon de arrendamiento y a destinarlo exclusivamente para **OFICINA** de la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S**. El presente contrato se regirá en todas sus partes por las cláusulas aquí

consignadas, así como por los términos de la Ley 820 de 2003 y demás normas concordantes vigentes.

SEGUNDA.- IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE. El presente contrato recae sobre el siguiente inmueble:

Dirección Inmueble	K 2 3 78	
Barrio de ubicación del inmueble	20 de Abril	
Ciudad	El Doncello Caquetá	
El inmueble se encuentra sometido a propiedad horizontal		**Sí___No_X__**(marque con una x)
El inmueble cuenta con disponibilidad de los siguientes servicios públicos:	Agua: **Sí__X__No___**(marque con una x)	Gas: **Sí___No_X__**(marque con una x)
	Energía Eléctrica: **Sí_X_ No___**(*marque con una x*)	Teléfono: **Sí___No_X** (*marque con una x*)
	Internet: **Sí__X__No** con una x)	Otros: _____

TERCERA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO. El valor mensual del canon por concepto de arrendamiento objeto de este contrato, es la suma de *SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 700.000)*, que **EL ARRENDATARIO** se obliga a pagar al **ARRENDADOR** en su totalidad de la siguiente manera: a) Un único pago por el total del valor del contrato al transcurrir los dos meses, se tienen cinco (05) días seguidos a la terminación del contrato para realizar el pago.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos aquí previstos se realizarán a la orden de **Luz Mireya López Bubú,** identificado con Cedula de Ciudadanía No **40.077.673 de Florencia** en efectivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de mora o retardo en el pago del precio del arrendamiento, de acuerdo con lo previsto en la presente cláusula, **EL ARRENDADOR** podrá dar por terminado unilateralmente con justa causa el presente contrato y exigir la entrega inmediata del inmueble, para lo cual el **ARRENDATARIO** renuncia expresamente a los requerimientos privados y judiciales previstos en la Ley (Artículos 1594 y 2007 del Código Civil).

CUARTA.- DESTINACIÓN DEL INMUEBLE. EL ARRENDADOR, mediante el presente contrato se obliga a conceder al **ARRENDATARIO** el uso y goce del bien inmueble descrito destinado a oficina, junto con los demás elementos que figuran en el inventario que para todos los efectos legales hacen parte del presente contrato.

QUINTA.- SERVICIOS PÚBLICOS. A partir del momento en que el inmueble arrendado sea *entregado al* **ARRENDATARIO** y *hasta la fecha de su entrega al* **ARRENDADOR**, *serán a cargo* del **ARRENDATARIO** el pago de los servicios públicos con los que cuenta el Inmueble, de acuerdo a las respectivas facturas. **EL ARRENDADOR** se reserva el derecho de solicitar mensualmente al **ARRENDATARIO** los recibos con la constancia de pago de los mismos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las reclamaciones que tengan que ver con la óptima prestación o facturación de los servicios públicos anotados, serán tramitadas directamente por **EL ARRENDATARIO** ante las respectivas empresas prestadoras del servicio. Cualquier otro servicio adicional o suntuario al que pretenda acceder el **ARRENDATARIO,** deberá ser previamente autorizado por el **ARRENDADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el **ARRENDATARIO** no paga oportunamente los servicios públicos antes señalados, este hecho se tendrá como incumplimiento del contrato, pudiendo el

ARRENDADOR darlo por terminado unilateralmente sin necesidad de los requerimientos privados y judiciales previstos en la Ley (artículos 1594 y 2007 del Código Civil).

PARÁGRAFO TERCERO: En cualquier caso, el incumplimiento de los pagos de servicios públicos a cargo del **ARRENDATARIO**, **EL ARRENDADOR** queda facultado para exigir de aquel el pago oportuno de los intereses de mora, sanciones, y los gastos que demande su re conexión, en caso de la suspensión o retiro.

SEXTA.- VIGENCIA. La vigencia del presente contrato será de dos meses contados a partir del 20 de Octubre de 2025.

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el término del contrato de arrendamiento NO se prorrogará automáticamente y su vigencia terminará el día 19 de diciembre de 2025.

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. 1. Pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado en este contrato a nombre del **ARRENDADOR**, de acuerdo con lo estipulado en el *presente contrato en la* **CLAUSULA TERCERA**. 2. *Gozar del inmueble según los términos* de éste contrato. 3. Velar por la conservación del inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo, que fueren imputables al mal uso del inmueble, o a su propia culpa, **EL ARRENDATARIO** deberá efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias. 4. Pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, así como las expensas comunes en los casos en que haya lugar de conformidad con lo aquí establecido. 5. Cumplir las normas consagradas en los reglamentos de propiedad y las que expida el gobierno en protección de los derechos de todos los vecinos. 6. Restituir el inmueble a la terminación del contrato en el estado en que le fue entregado, salvo el deterioro natural causado por el tiempo y el uso legítimo, poniéndolo a disposición del **ARRENDADOR.**

OCTAVA. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR. 1. Entregar al **ARRENDATARIO** en la fecha convenida, o en el momento de la celebración del contrato, el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicios, seguridad y sanidad, y poner a su disposición los servicios públicos. 2. Mantener en el inmueble los servicios Públicos y demás cosas o elementos determinados en el inventario, en buen estado de servir para el cumplimiento del objeto de éste contrato. Entregar con el inmueble los servicios, cosas o usos conexos para el fin convenido. 3. Suministrar al **ARRENDATARIO** copia del presente contrato con firmas originales, en un plazo máximo diez (10) días, contados a partir de la suscripción del mismo. 4. Hacer las reparaciones necesarias del bien *objeto del Arriendo, y las locativas solo cuando éstas provengan de fuerza mayor o caso fortuito, o* se deriven de la mala calidad o de los materiales utilizados en el inmueble arrendado. 5. Las demás obligaciones consagradas para los arrendadores en el Capítulo II, Titulo XXVI, Libro IV del Código Civil Colombiano.

NOVENA.- RECIBO Y ESTADO. EL ARRENDATARIO declara que ha recibido el inmueble objeto de este contrato en buen estado de servicio y presentación, conforme al inventario; que se obliga a cuidarlo, conservarlo y mantenerlo y, que en el mismo estado lo restituirá al **ARRENDADOR**.

Parágrafo: Los daños al inmueble derivados del mal trato o descuido que deterioren en forma inusual la calidad del inmueble por parte del **ARRENDATARIO**, durante su tenencia, serán de su cargo y **EL ARRENDADOR** estará facultado para hacerlos por su cuenta y posteriormente reclamar su valor hasta por el monto de un canon mensual al **ARRENDATARIO**.

(NOTA: Se recomienda a las partes que antes de firmarse el contrato de arrendamiento o al momento de la entrega del inmueble se realice un inventario sobre el estado del mismo, con copia para las dos partes)

DÉCIMA - REPARACIONES Y MEJORAS.- Las reparaciones, variaciones y reformas efectuadas por el **ARRENDATARIO** al inmueble, serán por cuenta de éste, y requerirán previa autorización

escrita del **ARRENDADOR** para desarrollarlas, entendiendo que de cualquier forma aquellas accederán al inmueble, sin lugar a indemnización para quien las efectuó.

DÉCIMA PRIMERA - SUBARRIENDO Y CESIÓN. El **ARRENDATARIO** no está facultado para ceder el arriendo ni subarrendar, a menos que medie autorización previa y escrita del **ARRENDADOR.** En caso de contravención, el **ARRENDADOR** podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento y exigir la entrega del inmueble.

DÉCIMA SEGUNDA.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.- El **ARRENDADOR** *no asume* responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que el **ARRENDATARIO** pueda sufrir por causas atribuibles a terceros o a otros arrendatarios de partes del mismo inmueble, o la culpa leve del **ARRENDADOR** o de otros arrendatarios o de sus empleados o dependientes, ni por robos, hurtos, ni por siniestros causados por incendio, inundación o terrorismo. Serán de cargo del **ARRENDATARIO** las medidas, dirección y manejo tomadas para la seguridad del bien.

DÉCIMA TERCERA. - ABANDONO DEL INMUEBLE. En caso de abandono del inmueble, se procederá de acuerdo a lo señalado en los artículos 35 y 36 de la Ley 820 de 2003 y las demás normas que regulen la materia.

DÉCIMA CUARTA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN POR PARTE DEL ARRENDADOR: Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: 1. La no cancelación por parte del arrendatario del precio del canon de arrendamiento, dentro del término estipulado en el contrato. 2. La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o pérdida del servicio, o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del arrendatario. 3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendatario, sin expresa autorización del arrendador. 4. La incursión reiterada del **ARRENDATARIO** en actuaciones que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen contravención, debidamente comprobados ante la autoridad policiva. 5. La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin expresa autorización del arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del **ARRENDATARIO**. 6. El **ARRENDADOR** podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento de conformidad con la normatividad vigente.

DÉCIMA QUINTA:- TERMINACIÓN POR PARTE DEL ARRENDATARIO: Son causales para que el **ARRENDATARIO** pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, las siguientes: 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada del **ARRENDADOR** o porque incurra en mora en pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el **ARRENDATARIO** podrá optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda hacer como **ARRENDATARIO**. 2. La incursión reiterada del **ARRENDADOR** en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el **ARRENDATARIO** del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva. 3. El desconocimiento por parte del **ARRENDADOR** de derechos reconocidos al **ARRENDATARIO** por la Ley o contractualmente.

DÉCIMA SÉXTA:- TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO: Las partes podrán dar por terminado de mutuo acuerdo en cualquier tiempo este contrato sin que se ocasione pago de indemnización alguna.

DÉCIMA SEPTIMA:- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan que en cualquier momento podrán suspender el contrato, buscando que no se generen perjuicios económicos a las partes.

Para efectos de recibir notificaciones judiciales y extrajudiciales, las partes en cumplimiento del Art. 12 de la Ley 820 de 2003, a continuación, y al suscribir este contrato indican sus respectivas direcciones.

Para constancia se firma por las partes, quienes declaran que han recibido copia del presente contrato, a los **VEINTE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025**.

EL ARRENDADOR



Nombre: MIRZA LÓPEZ
C.C. No.: 40077673
Dir. Notificación:
Ciudad: El Doncello
Celular: 3142061412

Firma MIRZA LÓPEZ
C.C.

EL ARRENDATARIO



Nombre: William Calderon Perez
C.C. No.: 96352639
Dir. Notificación: —
Ciudad: El Doncello
Celular: 3124219611

Firma
C.C. 96352639

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

7.4 Factura

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
75fee2c9b025351a83e30796dd0f2fc288b2b8183189c91b53dba4266322acd3cbad4758d8ca190df4dbdece4d0766f3

Número de Factura: FE-35
Fecha de Emisión: 26/12/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.
Nombre Comercial: ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.
Nit del Emisor: 901209615
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: El Doncello
Dirección: CR 4 6 08
Teléfono / Móvil: 3124219611
Correo: alwil197101@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO EL DONCELLO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800095760
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: El Doncello
Dirección: CRA. 4 CLL. 3 ESQ.
Teléfono / Móvil: 4310609
Correo: hacienda@eldoncello-caqueta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	027	COSTOS DIRECTOS	WSD	1,00	$ 144.037.981,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.037.981,00
2	028	ADMINISTRACION 25%	WSD	1,00	$ 36.009.495,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.009.495,00
3	029	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$ 7.201.899,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.201.899,00

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 88.125.219,00	11/11/2025

Notas Finales

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-2025-004, PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-2025-007, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO - CAQUETÁ."
SE REALIZA AMORTIZACION DE ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO POR VALOR DE $88.125.219,00, POR LO TANTO EL PRESENTE GIRO SERÁ POR VALOR DE $99.124.156,00 DONDE ESTA INCLUIDO UN OTRO SÍ POR VALOR DE $11.000.000,00..
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/12/2025 11:32:51
Documento validado por la DIAN:
26/12/2025 11:32:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	187249375
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	187249375
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	187249375
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 187249375

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	88125219

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	187.249.375,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	187.249.375,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	187.249.375,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $187.249.375,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	88.125.219,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103384110 Rango desde: 35 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-12-19

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

7.5 Certificado de cuenta bancaria

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ALWIL GLOBAL SERVICIOS SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9012096157 de EL DONCELLO, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-752-00-08354-5, fecha de apertura: 10/07/2025.

Se expide en EL DONCELLO, a los siete (07) días del mes de octubre de 2025, con destino a: AL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
OF. EL DONCELLO - CAQUETÁ

DIRECTOR (A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

Powered by CamScanner

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

8. INFORME JURIDICO

El contrato de obra No COP-2025-004, fue producto del proceso de selección abreviada de menor cuantía No SAMC-2025-007, el cual se abrió mediante resolución No 0521 del 02 de septiembre de 2025, y se adjudicó el 17 de septiembre de 2025 mediante resolución No 0539, y de esa manera se firma el contrato de obra en mención el día 18 de septiembre de 2025.

Dicho contrato tuvo fecha de inicio el día 20 de octubre de 2025, cuando el contratista dio cumplimiento con las garantías exigidas en la minuta y los requisitos pre obra.

FECHA DEL CONTRATO	18 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO	20 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION	19 de diciembre de 2025

8.1 Amparos del contrato

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA – CONTRATO (ANEXO 0)

Estas garantías corresponden al anexo cero, son las primeras pólizas que emite la aseguradora a un tomador, que para este caso es la empresa ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S, y da como beneficiario al Municipio de El Doncello, allí se ven reflejados todos los amparos requeridos por la parte contratante para así poder dar inicio a la ejecución del contrato, es importante mencionar que para este contrato se tienen dos pólizas, la de cumplimiento y la de responsabilidad civil extracontractual.

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADOR	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100057071	18/09/2025	18/05/2026	$ 35.250.087,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100057071	18/09/2025	18/05/2026	$ 88.125.219,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100057071	18/11/2025	18/11/2030	$ 52.875.131,40
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100057071	18/09/2025	18/11/2028	$ 17.625.043,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010802	18/09/2025	18/11/2025	$ 427.050.000,00

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

8.2 Certificado de existencia y representación legal Cámara y comercio

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/12/2025 - 10:03:34
Recibo No. S001420726, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN yczm5uUVjP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.
Nit : 901209615-7
Domicilio: El Doncello, Caquetá

MATRÍCULA

Matrícula No: 106284
Fecha de matrícula: 31 de agosto de 2018
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 19 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 4 6 08 BRR BELALCAZAR
Municipio : El Doncello, Caquetá
Correo electrónico : alwill197101@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3124219612
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 4 6 08 BRR BELALCAZAR
Municipio : El Doncello, Caquetá
Correo electrónico de notificación : alwill197101@gmail.com

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 15 de mayo de 2018 de la Asamblea De Constitucion de Florencia, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2018, con el No. 10864 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SORTEOS DEL CAQUETA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/12/2025 - 10:03:34
Recibo No. S001420726, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN yczm5uUVjP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Oficio No. 1 del 30 de agosto de 2018 de el Representante Legal de Florencia, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2018, con el No. 10865 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado una situación de control INSCRIPCION ACTO DE SITUACION DE CONTROL DE LA SOCIEDAD POR SU UNICO ACCIONISTA PERSONA NATURAL

Por Acta No. 2 del 25 de noviembre de 2019 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Cartagena De Chaira, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de diciembre de 2019, con el No. 12179 del Libro IX, se decretó SE REGISTAR LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LOS ARTICULOS, TERCERO, CUARTO Y SEXTO, CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO, RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.

Por documento privado del 24 de noviembre de 2021 de el Representante Legal de Florencia, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de noviembre de 2021, con el No. 14524 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado una situación de control SE REGISTRA LA CANCELACION DE LA SITUACION DE CONTROL DEL UNICO SOCIO CONTROLANTE

Por Acta No. 002 del 28 de febrero de 2022 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas de El Doncello, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de marzo de 2022, con el No. 14851 del Libro IX, se decretó REFORMA ESTATUTOS: AMPLIACION OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL

Consultoría, interventoría, asesoría, asistencia técnica, capacitación, construcción de obras civiles, adecuación, mantenimiento y suministro de materiales en relación con el uso, manejo, administración, conservación, rehabilitación de los recursos naturales, saneamiento básico y medio ambiente. Diseño, mantenimiento y ejecución de obras civiles, arquitectónicas y eléctricas. Servicio de consultoría en obras civiles, medio ambiente y sector agropecuario, interventoría en el área de obras civiles, medio ambiente y sector agropecuario. Realización, formulación, ejecución y consultorías de proyectos, civiles ambientales, mineros, sociales y formulación y consultoría de políticas pÚblicas. La explotación de minas de material de arrastre y/o cantera. Servicio de asesorías administrativas, económicas, civiles, ambientales, agropecuarias y gubernamentales tanto con personas de derecho pÚblico como de derecho privado. Capacitaciones ambientales, administrativas y agropecuarias. Suministro institucional de dotaciones textiles y de seguridad industrial. Importación y exportación de toda clase de frutas. Comercialización de productos veterinarios y agrícolas. Suministro de material publicitario, litográfico y carpas. Suministro de equipos de cómputo, celulares, fotocopiadoras, impresoras, cámara digitales y de circuito cerrado, scanner, papelería en general, escritorio y sillas para oficinas, toda clase de dotaciones escolares y para empresas pÚblicas o privadas, venta e instalación de software para empresas. Suministro y mantenimiento de redes eléctricas y sus derivados y anexos de la parte eléctrica. paralelamente, la sociedad desarrollará actividades comerciales de

adquisición, procesamiento, transformación, y en general, la distribución y venta bajo cualquier modalidad comercial, incluyendo venta, comercialización, exportación e importación y suministro, de toda clase de mercancías y productos nacionales y extranjeros, incluidos artículos farmacéuticos, elementos médicos y afines, al por mayor y/o al detal, comercialización y suministro de frutas y verduras, carnes (rojas, blancas y otros productos cárnicos), del mar (pescado, mariscos y productos conexos), alimentos y comestibles, bebidas y licores, huevos, leche, granos, víveres y abarrotes, confiterías y otros alimentos, cigarrillos, tabacos, productos derivados, productos de panadería y pastelería, farmacéuticos, medicinales, de perfumería, tocador, cosméticos, jabones y productos de limpieza; alimentos para mascotas y animales en general, artículos eléctricos y electrónicos para el hogar, papel y cartón, libros, revistas, periódicos, cuadernos y papelería en general, venta al por menor de cristales, lozas, porcelana, menaje (cristalerías), muebles (incluye colchones), lámparas, apliques y similares, aparatos, artículos de uso doméstico; ferretería y materiales de construcción, tubería de alta presión y para alcantarillado, pinturas, barnices y lacas, productos de vidrio, artículos fotográficos, juguetes, comercio y suministro de máquinas y equipos de oficina, articulas de escritorio en general, máquinas expendedoras, productos textiles, prendas de vestir, calzado y todo lo relacionado con la canasta familiar, materias primas agrícolas, partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, animales vivos, productos pecuarios, lanas, pieles, cueros sin procesar, instrumentos científicos, quirÚrgicos, medico quirÚrgicos, enseres domésticos, maquinaria agrícola y forestal, maquinaria metalÚrgica, maquinaria para la minería, maquinaria para la construcción, maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, maquinaria y equipo de transporte, herramientas, producto de aseo de uso industrial, suministro de productos de aseo y limpieza para piscinas. -realización de toda clase de eventos, servicio de restaurante, servicio de hospedaje, suministro de comidas preparadas, rápidas, refrigerios, servicio de parqueadero. Servicios de mantenimiento y reparación de todo tipo de maquinaria y equipo incluyendo equipos de computación y comunicación. Venta y alquiler de maquinaria industrial, pesada y toda clase vehículos; dar o tomar en arrendamiento locales comerciales, recibir o dar en arrendamiento o a otro título de mera tenencia, espacios o puestos de venta o de comercio dentro de sus establecimientos mercantiles, equipos, elementos y enseres destinados a la explotación de negocios de distribución de mercancías o productos y a la presentación de servicios complementarios.- constituir, financiar, promover y concurrir con otras personas naturales o jurídicas a la constitución de empresas o negocios que tengan por muebles o inmuebles, corporales o incorporales, requeridos para la realización del objeto social; e igualmente adquirir y poseer acciones, cuotas sociales y participaciones en sociedades comerciales o civiles, títulos valores de todas clases con fines de inversión estable, o como inversión de fomento o desarrollo para el aprovechamiento de incentivos fiscales establecidos por la ley; promover y constituir o invertir en compañías para el desarrollo de cualesquiera actividades comprendidas dentro del objeto social que se deja indicado, fusionarse con ellas o con otras compañías, absorberlas, o escindirse; adquirir marcas, emblemas, nombres comerciales, patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual,

explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo licencia contractual; en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, cualquiera que fuere su naturaleza, que se relacionen con el objeto social o que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividades desarrolladas por la sociedad. la sociedad actuara como asesora en apoyo logístico en la organización de eventos en las etapas de diseño, planificación, producción y suministro de materiales y elementos para congresos, festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones o actividades que involucren la comunidad y/o las instituciones de derecho pÚblico y privado del orden local, nacional o internacional para lo cual, específicamente desarrollara las siguientes actividades: suministro de implementos deportivos -dotación para instituciones educativas -servicio de alimentación, mantenimiento de parques, zonas verdes y alcantarillados asesorías financieras, contables y jurídicas, para de esta forma fomentar la cultura, la recreación, el deporte y todas aquellas que integren y beneficien la comunidad en general. Constituir, financiar, promover y concurrir con otras personas naturales o jurídicas a la constitución de empresas o negocios que tengan por objeto la producción de objetos, mercancías, artículos o elementos o la prestación de servicios relacionados con la explotación de los establecimientos comerciales de que tratan los apartes precedentes, y vincularse a dichas empresas en calidad de asociada, mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios. en desarrollo de su objeto la sociedad podrá adquirir bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, requeridos para la realización del objeto social; e igualmente adquirir y poseer acciones, cuotas sociales y participaciones en sociedades comerciales o civiles, títulos valores de todas clases con fines de inversión estable, o como inversión de fomento o desarrollo para el aprovechamiento de incentivos fiscales establecidos por la ley; efectuar inversiones transitorias en valores de pronta liquidez con fines de utilización productiva temporal de sobrantes de efectivo o excesos de liquidez u otras disponibilidades no necesarias de inmediato para el desarrollo de los negocios sociales; importar y exportar mercancías, productos, manufacturas de todo género; emitir bonos y/o papeles comerciales u otros títulos de emisión masiva autorizados por las normas legales o reglamentarias para colocación pÚblica, tomar dinero en mutuo, desarrollar o celebrar operaciones de factoring en firme con recursos propios, constituir garantías sobre sus bienes muebles o inmuebles, y celebrar las operaciones financieras que le permitan adquirir fondos u otros activos, o asegurar el suministro de bienes y/o servicios, unos u otros necesarios para el desarrollo de la empresa; actuar como agente o representante de empresarios nacionales o extranjeros, y celebrar toda clase de contratos relacionados con la distribución de mercancías y/o venta de bienes y servicios; promover y constituir o invertir en compañías para el desarrollo de cualesquiera actividades comprendidas dentro del objeto social que se deja indicado, fusionarse con ellas o con otras compañías, absorberlas, o escindirse; adquirir marcas, emblemas, nombres comerciales, patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo licencia contractual; en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, cualquiera que fuere su naturaleza, que se relacionen con el objeto social o

que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividades desarrolladas por la sociedad. Exploración y explotación de minerales.

De igual manera podrá desarrollar cualquier actividad comercial o civil, lícita permitida por la legislación colombiana, segÚn lo estipula la ley 1258 de 2008.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 3.200.000,00
No. Acciones	40,00
Valor Nominal Acciones	$ 80.000,00

	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 3.200.000,00
No. Acciones	40,00
Valor Nominal Acciones	$ 80.000,00

	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 3.200.000,00
No. Acciones	40,00
Valor Nominal Acciones	$ 80.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente o representante legal, está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones especificas del cargo, las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijara las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle

plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo: El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 2 del 25 de noviembre de 2019 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 03 de diciembre de 2019 con el No. 12180 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	WILLIAM CALDERON PEREZ	C.C. No. 96.352.639

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 2 del 25 de noviembre de 2019 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	12179 del 03 de diciembre de 2019 del libro IX
*) Acta No. 002 del 28 de febrero de 2022 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas	14851 del 11 de marzo de 2022 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/12/2025 - 10:03:34
Recibo No. S001420726, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN yczm5uUVjP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4112
Actividad secundaria Código CIIU: F4220
Otras actividades Código CIIU: B0899 B0811

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1.091.875.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4112.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

JEISON FABIAN TORRES RIVERA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

8.3 Registro Único Tributario (RUT)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931323248

(415)7707212489984(8020) 000001493132324 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 0 9 6 1 5	7	Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	El Doncello 2 4 7

41. Dirección principal
CR 4 6 08

42. Correo electrónico alwill197101@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 2 1 9 6 1 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 0 0 2 0 7	4 2 2 0	2 0 2 0 0 2 0 7	0 8 9 9	0 8 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 28 / 09 : 19: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CALDERON PEREZ WILLIAM

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931323248

(415)7707212489984(8020) 000001493132324 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 0 9 6 1 5	7	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 1	2
73. Fecha	2 0 1 8 0 5 1 5	2 0 1 9 1 1 2 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 8 3 1	2 0 1 9 1 2 0 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 0 6 2 8 4	1 0 6 2 8 4
78. Departamento	1 8	1 8
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 8 3 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 2 0 7	[redacted]	-
2	4 9	2 0 2 0 0 2 0 7	[redacted]	-
3			[redacted]	-
4			[redacted]	-
5			[redacted]	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: HINCAPIE ALVAREZ JAIME ALBERTO

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14931323248

(415)7707212489984(8020) **000001493132324 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 0 9 6 1 5	7	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 2 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 6 3 5 2 6 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CALDERON	PEREZ	WILLIAM	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

9. INFORME TECNICO

- Durante el desarrollo de la obra se ha velado por el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas de construcción que rigen el proyecto, en cuanto a procedimientos y a calidad de los materiales utilizados.

- El personal conto con los elementos de protección personal durante toda la obra.

- Realizando una comparación entre lo ejecutado vs lo programado, el contrato presenta un equilibrio en cuanto al tiempo de ejecución, toda vez que fue ejecutado en el plazo establecido, adicional a esto se anexa el acta final con las respectivas memorias de cantidades como constancia de la ejecución total del contrato de obra.

ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTO URBANO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante la ejecución del contrato se dio la importancia necesaria al tema ambiental, con respecto principalmente a la correcta utilización del agua y la debida solicitud de permiso ante la autoridad competente respecto a tala de árboles en obra en caso de ser necesario, no obstante, para la obra en mención no fue necesario. De acuerdo a lo establecido con el personal en obra, se mantiene el lugar limpio.

En cuanto a la seguridad industrial, se hace un control periódico a los elementos de protección y seguridad de todos los trabajadores que se encuentran en la obra, tal como se puede evidenciar en el informe SST presentado por el profesional.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se exige al ingreso del trabajador a la obra afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales.

CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA OBRA

En el presente capítulo se presenta el resumen de todos los aspectos inherentes a la labor de obra ejecutada por la ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.

GENERALIDADES DEL SERVICIO DE OBRA

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

La firma de obra dentro de sus funciones desarrolla el contrato de obra No. COP-2025-004. En este capítulo se presenta el resumen de todas las actividades realizadas:

ACTIVIDADES BÁSICAS

El contratista de obra ha proporcionado desde el inicio del Contrato los recursos necesarios para desarrollar las obligaciones según el Contrato. Estos recursos son:

- ✓ Personal mínimo requerido
- ✓ Personal no calificado
- ✓ Equipos
- ✓ Herramienta menor
- ✓ Elaboración de Informe
- ✓ Acta Final de obra
- ✓ Informe SST

CONTROL TÉCNICO REALIZADO EN LA OBRA

Se revisa continuamente la ejecución de las obras, localización, chequeo de calidad de materiales, recomendación y toma de decisiones en obra.

Además, velamos por el cumplimiento del contrato de acuerdo con especificaciones técnicas, estudios, cálculos y diseños, de igual forma para que cumpliéndose los requisitos técnicos y normas pertinentes, se empleen los materiales y sistemas constructivos previamente especificados o aquellos que cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía adecuada y necesaria, dentro del plazo establecido para el contrato.

Informe de obra correspondiente a las actividades ejecutadas en el periodo entre el 20 de octubre de 2025 y el 19 de diciembre de 2025, realizado por:

R.L. WILLIAM CALDERON PEREZ
ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

BALANCE FINAL DE OBRA

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

Libertad y Orden

BALANCE DE OBRA FINAL

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		**FECHA**	**DD**	19	**MM**	12
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	901.209.615-7	**MODIFICATORIA**	001		**AA**	2025
No. CONTRATO	COP-2025-004		**ELABORO**	WILLIAM CALDERON PEREZ			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ						
VALOR DEL CONTRATO	$ 187.250.438	**VALOR ACTUAL**		$ 187.249.375		**PORCENTAJE**	99,99%

CONDICIONES ACTUALIZADAS CON MODIFICATORIA No 1 / ADICION No 01 del 13 DE DICIEMBRE DE 2025						MAYORES Y MENORES CANTIDADES (+/-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**
1	**PRELIMINARES**								
1,1	Desmonte y retiro de cubierta existente (Incluye	M2	251,87	$ 73.350,00	$ 18.474.665,00			251,87	$ 18.474.665,00
1,2	Demolicion de estructura existente (Incluye muros y losas)	M2	75,764	$ 43.650,00	$ 3.307.099,00			75,764	$ 3.307.099,00
2	**CUBIERTA**								
2,1	Suministro e Instalación de Platina de anclaje de correas	KG	23,50	$ 28.950,00	$ 680.325,00			23,50	$ 680.325,00
2,2	Suministro e Instalación de Perfilería metálica en tubo rectangular	KG	1237,60	$ 35.250,00	$ 43.625.400,00			1.237,60	$ 43.625.400,00
2,3	Suministro e Instalación de teja arquitectónica	M2	436,84	$ 133.850,00	$ 58.471.034,00	10,70	$ 1.432.195,00	447,54	$ 59.903.229,00
2,4	Suministro e Instalación de Flanche	ML	53,89	$ 119.550,00	$ 6.442.550,00			53,89	$ 6.442.550,00
2,5	Suministro e Instalación canal Metalica Cal, 18	ML	87,44	$ 323.100,00	$ 28.251.864,00			87,44	$ 28.251.864,00
2,6	Suministro e instalacion de bajantes de A-LL de 4"	ML	126,00	$ 49.650,00	$ 6.255.900,00	-32,37	-$ 1.607.171,00	93,63	$ 4.648.729,00
2,7	Suministro e instalacion de tragantes de 4"	UND	14,00	$ 174.450,00	$ 2.442.300,00	1,00	$ 174.450,00	15,00	$ 2.616.750,00
2,8	Suministro e Instalación caballete a=60 cm	ML	83,10	$ 98.200,00	$ 8.160.420,00			83,10	$ 8.160.420,00
3	**ASEO GENERAL**	GBL	1,00	$ 228.800,00	$ 228.800,00			1,00	$ 228.800,00
4	**ITEMS NO PREVISTOS**								
NP 1	Corte de piso en concreto	ML	27,50	$ 18.550,00	$ 510.125,00			27,50	$ 510.125,00
NP 2	Placa contrapiso e= 0,10 m en concreto de 3000 psi	M2	0,21	$ 178.900,00	$ 37.569,00			0,21	$ 37.569,00

Libertad y Orden

BALANCE DE OBRA FINAL

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE		MUNICIPIO DE EL DONCELLO			FECHA	DD	19	MM	12			
CONTRATISTA		ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	901.209.615-7		MODIFICATORIA	001		AA	2025			
No. CONTRATO		COP-2025-004			ELABORO	WILLIAM CALDERON PEREZ						
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ										
VALOR DEL CONTRATO		$ 187.250.438			VALOR ACTUAL	$ 187.249.375		PORCENTAJE	99,99%			
NP 3	Pintura para bajantes en PVC de 4"	ML	86,00	$ 13.250,00	$ 1.139.500,00			86,00	$ 1.139.500,00			
NP 4	Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Inlcuye elementos de fijación)	M2	40,80	$ 38.450,00	$ 1.568.760,00			40,80	$ 1.568.760,00			
NP 5	Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)	M2	10,80	$ 85.850,00	$ 927.180,00			10,80	$ 927.180,00			
NP 6	Suministro e Instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de incrustar)	UND	2,00	$ 118.650,00	$ 237.300,00			2,00	$ 237.300,00			
NP 7	Puerta en Aluminio con alma en lamina PVC	UND	1,00	$ 789.650,00	$ 789.650,00			1,00	$ 789.650,00			
NP 8	Suministro e instalación de pintura koraza	M2	149,31	$ 32.450,00	$ 4.844.997,00	-0,02	-$ 537,00	149,29	$ 4.844.460,00			
NP 9	Estuco	M2	30,00	$ 28.500,00	$ 855.000,00			30,00	$ 855.000,00			
				VALOR COSTO TOTAL	$ 187.250.438,00		-$ 1.063,00		$ 187.249.375,00			
				ADMINISTRACION 25%	$ 36.009.700,00		-$ 204,00		$ 36.009.495,00			
				IMPREVISTOS 0%	$ -		$ -		$ -			
				UTILIDAD 5%	$ 7.201.940,00		-$ 41,00		$ 7.201.899,00			
				VALOR AIU	$ 43.211.640,00		-$ 245,00		$ 43.211.394,00			
				COSTO DIRECTO	$ 144.038.798,00		-$ 818,00		$ 144.037.981,00			
				COSTO TOTAL	$ 187.250.438,00		-$ 1.063,00		$ 187.249.375,00			

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 187.250.438
VALOR AJUSTE AL PESO - A FAVOR DEL MUNICIPIO	-$ 1.063
PORCENTAJE DE AJUSTE	99,99%
VALOR TOTAL	$ 187.249.375

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ

R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

SECRETARIO DE PLANEACIÓN

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ

APOYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2025	CORTE N°	BALANCE	ELABORÓ	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	NIT O C.C.	800.095.760-9	CONTRATO N°	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT O C.C.	901.209.615-7	CONTRATO N°	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC			

ITEM	2,3	CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Suministro e Instalación de teja arquitectónica	UNID.	M2





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Area		
CUBIERTA 1			157,08	1,00	157,1
CUBIERTA 2			199,63	1,00	199,6
CUBIERTA 3			90,83	1,00	90,8
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
			Subtotal		447,54
			Vienen		0,00
			TOTAL		**447,54**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2025	CORTE N°	BALANCE	ELABORÓ	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	NIT O C.C.	800.095.760-9	CONTRATO N°	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT O C.C.	901.209.615-7	CONTRATO N°	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC			

ITEM	2,6	CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Suministro e instalacion de bajantes de A-LL de 4"	UNID.	ML





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Bajantes hasta primer piso			9,00	8,00	72,0
Bajantes de un solo piso de altura			3,09	7,00	21,6
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Subtotal					93,63
Vienen					0,00
TOTAL					**93,63**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden


ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	BALANCE	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	2,7	**CAPÍTULO**	CUBIERTA	**ITEM**	Suministro e instalacion de tragantes de 4"	**UNID.**	UND

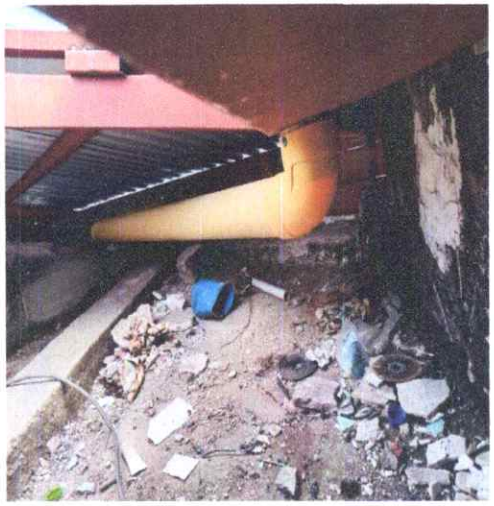



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Bajantes hasta primer piso				8,00	8,0
Bajantes de un solo piso de altura				7,00	7,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	15,00
				Vienen	0,00
				TOTAL	**15,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.1 Acta Final

ACTA FINAL DE OBRA

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FECHA	DD	19	MM	12	AA	2025
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	901.209.615-7	ACTA	FINAL					
No. CONTRATO	COP-2025-004		ELABORO	WILLIAM CALDERON PEREZ					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ								
VALOR DEL CONTRATO	$ 187.250.438	VALOR PRESENTE ACTA FINAL No 1		$ 187.249.375,00		PORCENTAJE	99,99%		

		CONDICIONES ACTUALIZADAS CON MODIFICATORIA No 1 / ADICION No 01 del 13 DE DICIEMBRE DE 2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE FINAL		ACTA FINAL No 1		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES										
1,1	Desmonte y retiro de cubierta existente (Incluye retiro de teja, estructura, templetes, anclajes, caballetes, limaoyas y limatesas)	M2	251,87	$ 73.350,00	$ 18.474.665,00	251,87	$ 18.474.665,00	251,87	$ 18.474.665,00	0,00	$ -
1,2	Demolicion de estructura existente (Incluye muros y losas)	M2	75,764	$ 43.650,00	$ 3.307.099,00	75,76	$ 3.307.099,00	75,76	$ 3.307.099,00	0,00	$ -
2	CUBIERTA										
2,1	Suministro e Instalación de Platina de anclaje de correas	KG	23,5	$ 28.950,00	$ 680.325,00	23,50	$ 680.325,00	23,50	$ 680.325,00	0,00	$ -
2,2	Suministro e Instalación de Perfilería metálica en tubo rectangular	KG	1237,6	$ 35.250,00	$ 43.625.400,00	1237,60	$ 43.625.400,00	1.237,60	$ 43.625.400,00	0,00	$ -
2,3	Suministro e Instalación de teja arquitectónica	M2	436,84	$ 133.850,00	$ 58.471.034,00	447,54	$ 59.903.229,00	447,54	$ 59.903.229,00	0,00	$ -
2,4	Suministro e Instalación de Flanche	ML	53,89	$ 119.550,00	$ 6.442.550,00	53,89	$ 6.442.550,00	53,89	$ 6.442.550,00	0,00	$ -
2,5	Suministro e Instalación canal Metalica Cal, 18 Desarrollo 60 cm	ML	87,44	$ 323.100,00	$ 28.251.864,00	87,44	$ 28.251.864,00	87,44	$ 28.251.864,00	0,00	$ -
2,6	Suministro e instalacion de bajantes de A-LL de 4"	ML	126	$ 49.650,00	$ 6.255.900,00	93,63	$ 4.648.729,00	93,63	$ 4.648.729,00	0,00	$ -
2,7	Suministro e instalacion de tragantes de 4"	UND	14	$ 174.450,00	$ 2.442.300,00	15,00	$ 2.616.750,00	15,00	$ 2.616.750,00	0,00	$ -
2,8	Suministro e Instalación caballete a=60 cm	ML	83,1	$ 98.200,00	$ 8.160.420,00	83,10	$ 8.160.420,00	83,10	$ 8.160.420,00	0,00	$ -
3	ASEO GENERAL	GBL	1	$ 228.800,00	$ 228.800,00	1,00	$ 228.800,00	1,00	$ 228.800,00	0,00	$ -
4	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 1	Corte de piso en concreto	ML	27,5	$ 18.550,00	$ 510.125,00	27,50	$ 510.125,00	27,50	$ 510.125,00	0,00	$ -
NP 2	Placa contrapiso e= 0,10 m en concreto de 3000 psi	M2	0,21	$ 178.900,00	$ 37.569,00	0,21	$ 37.569,00	0,21	$ 37.569,00	0,00	$ -
NP 3	Pintura para bajantes en PVC de 4"	ML	86	$ 13.250,00	$ 1.139.500,00	86,00	$ 1.139.500,00	86,00	$ 1.139.500,00	0,00	$ -
NP 4	Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Inlcuye elementos de fijación)	M2	40,8	$ 38.450,00	$ 1.568.760,00	40,80	$ 1.568.760,00	40,80	$ 1.568.760,00	0,00	$ -
NP 5	Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)	M2	10,8	$ 85.850,00	$ 927.180,00	10,80	$ 927.180,00	10,80	$ 927.180,00	0,00	$ -
NP 6	Suministro e Instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de incrustar)	UND	2	$ 118.650,00	$ 237.300,00	2,00	$ 237.300,00	2,00	$ 237.300,00	0,00	$ -
NP 7	Puerta en Aluminio con alma en lamina PVC	UND	1	$ 789.650,00	$ 789.650,00	1,00	$ 789.650,00	1,00	$ 789.650,00	0,00	$ -

Libertad y Orden

ACTA FINAL DE OBRA

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO			FECHA	DD	19	MM	12	AA	2025	
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	901.209.615-7		ACTA	FINAL						
No. CONTRATO	COP-2025-004			ELABORO	WILLIAM CALDERON PEREZ						
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ										
VALOR DEL CONTRATO	$ 187.250.438		VALOR PRESENTE ACTA FINAL No 1		$ 187.249.375,00			PORCENTAJE	99,99%		

NP 8	Suministro e instalación de pintura koraza	M2	149,31	$ 32.450,00	$ 4.844.997,00	149,29	$ 4.844.460,00	149,29	$ 4.844.460,00	0,00	$	-
NP 9	Estuco	M2	30	$ 28.500,00	$ 855.000,00	30,00	$ 855.000,00	30,00	$ 855.000,00	0,00	$	-
				VALOR TOTAL	$ 187.250.438,00		$ 187.249.375,00		$ 187.249.375,00		$	-
			ADMINISTRACION	25%	$ 36.009.700,00		$ 36.009.495,00		$ 36.009.495,00		$	-
			IMPREVISTOS	0%	$ -		$ -		$ -		$	-
			UTILIDAD	5%	$ 7.201.940,00		$ 7.201.899,00		$ 7.201.899,00		$	-
				VALOR AIU	$ 43.211.640,00		$ 43.211.394,00		$ 43.211.394,00		$	-
				COSTO DIRECTO	$ 144.038.798,00		$ 144.037.981,00		$ 144.037.981,00		$	-
				COSTO TOTAL DE OBRA	$ 187.250.438,00		$ 187.249.375,00		$ 187.249.375,00		$	-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 187.250.438
VALOR DE ANTICIPO (47,063%)	$ 88.125.219
VALOR PRESENTA ACTA No 1	$ 187.249.375
VALOR AMORTIZAR EN LA PRESENTE ACTA No 1	$ 88.125.219
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No 1	$ 99.124.156
PORCENTAJE AVANCE	99,99%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (AJUSTE AL PESO)	$ 1.063

CONTRATISTA
WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S
Nit. 901.209.615-7

ORDENADOR DEL GASTO
JAIR DIAZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO SECRETARIO DE PLANEACIÓN

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.2 Memorias de Cantidades – Pre Actas Finales

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden


ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	1,1	**CAPÍTULO**	PRELIMINARES	**ITEM**	Desmonte y retiro de cubierta existente (Incluye retiro de teja, estructura, templetes, anclajes, caballetes, limaoyas y limatesas)	**UNID.**	M2

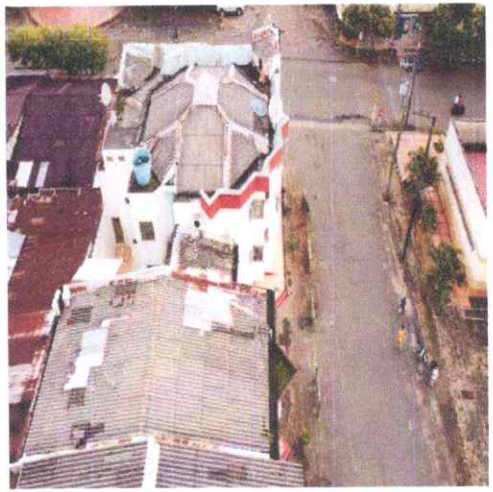



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Cubierta Tercer Piso Concejo			170,66	1,00	170,7
Cubierta Planeacion Gobierno			81,21	1,00	81,2
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	251,87
				Vienen	0,00
				TOTAL	**251,87**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S


CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	1,2	**CAPÍTULO**	PRELIMINARES	**ITEM**	Demolicion de estructura existente (Incluye muros y losas)	**UNID.**	M2



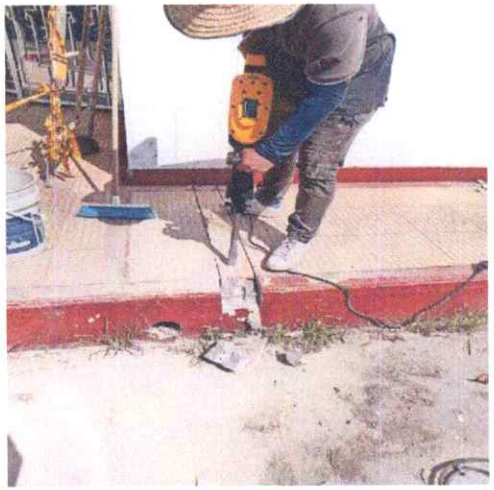

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Muro Frontal tercer piso		1,20	36,67	1,00	44,00
Muro Frontal Segundo piso planeacion		1,20	24,75	1,00	29,70
Piso para enterrar bajantes		1,00	0,26	8,00	2,1
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	75,76
				Vienen	0,00
				TOTAL	**75,76**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	2,1	**CAPÍTULO**	CUBIERTA	**ITEM**	Suministro e Instalación de Platina de anclaje de correas	**UNID.**	KG





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Cubierta tercer piso		0,50		9,00	4,5
Cubierta segundo piso		0,50		10,00	5,0
Cubierta Archivo		0,50		28,00	14,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	23,50
				Vienen	0,00
				TOTAL	**23,50**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S


CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT	901.209.615-7					
No. CONTRATO	COP-2025-004	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2025	CORTE N°	FINAL	ELABORÓ	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	NIT O C.C.	800.095.760-9	CONTRATO N°	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT O C.C.	901.209.615-7	CONTRATO N°	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC			

ITEM	2,2	CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Suministro e Instalación de Perfilería metálica en tubo rectangular	UNID.	KG



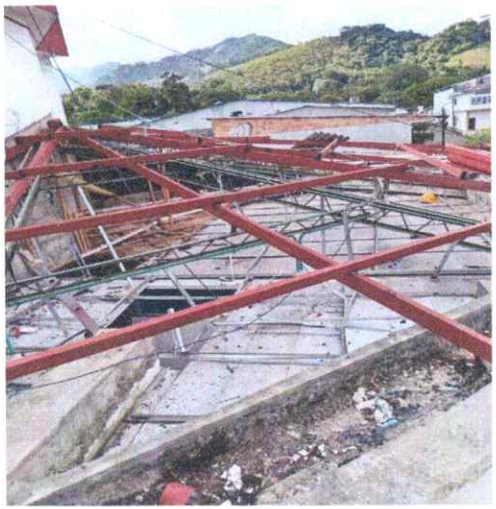





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	4,57	2,00	21,8
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	5,14	1,00	12,2
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	4,51	1,00	10,7
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	4,28	1,00	10,2
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	4,37	1,00	10,4
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	6,87	1,00	16,4
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	2,95	1,00	7,0
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	6,77	2,00	32,2
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	2,9	2,00	9,2
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	5,02	8,00	63,9
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	2,88	1,00	4,6
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	0,67	1,00	1,1
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	1,31	1,00	2,1
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	3,98	1,00	6,3
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	5,4	1,00	8,6
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	4,53	8,00	57,6
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	2,35	2,00	7,5
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	0,54	2,00	1,7
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	2,6	1,00	4,1
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	5,2	1,00	8,3
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	5,92	1,00	9,4
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	5,17	1,00	8,2
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	4,06	1,00	6,5
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	2,19	1,00	3,5
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	2,88	1,00	4,6
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	0,67	1,00	1,1
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	0,6	3,00	2,9
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	2,6	2,00	8,3
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	5,2	2,00	16,5
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	6,12	1,00	9,7
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	3,69	1,00	5,9
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	1,09	1,00	1,7
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	58,9	1,00	93,7
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	58,90	1,00	140,2
Cubierta Segundo piso - Planeacion					0,0
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	4,19	1,00	10,0
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	4,59	1,00	10,9
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	7,99	1,00	19,0
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	4,89	1,00	11,6
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	5,42	1,00	12,9

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT	901.209.615-7					
No. CONTRATO	COP-2025-004	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2025	CORTE N°	FINAL	ELABORÓ	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	NIT O C.C.	800.095.760-9	CONTRATO N°	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT O C.C.	901.209.615-7	CONTRATO N°	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC			





Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	0,38	1,00	0,6
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	1,14	1,00	1,8
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	2,52	1,00	4,0
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	1,00	1,00	1,6
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	2,10	1,00	3,3
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	4,57	1,00	7,3
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	6,88	1,00	10,9
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	4,60	3,00	21,9
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	3,42	1,00	5,4
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	1,77	1,00	2,8
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	0,26	1,00	0,4
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	1,07	1,00	1,7
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	2,62	1,00	4,2
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	4,80	1,00	7,6
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	6,99	1,00	11,1
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	8,62	1,00	13,7
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	0,46	1,00	0,7
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	2,29	1,00	3,6
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	4,13	1,00	6,6
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	4,80	1,00	7,6
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	28,90	1,00	46,0
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	28,90	1,00	68,8
Cubierta Segundo piso - Archivo					
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	8,45	1,00	20,1
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	4,92	1,00	11,7
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	0,59	2,00	2,8
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	8,45	11,00	147,8
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal18		1,59	10,88	4,00	69,2
Tub. Rect 3x1 1/2 Cal19		1,59	20,65	1,00	32,8
Tub. Rect 4x1 1/2 Cal16		2,38	20,65	1,00	49,1
				Subtotal	1.237,60
				Vienen	0,00
				TOTAL	**1.237,60**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**						
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7						
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1		

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	2,3	**CAPÍTULO**	CUBIERTA	**ITEM**	Suministro e Instalación de teja arquitectónica	**UNID.**	M2





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
CUBIERTA 1			157,08	1,00	157,1
CUBIERTA 2			199,63	1,00	199,6
CUBIERTA 3			90,83	1,00	90,8
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	447,54
				Vienen	0,00
				TOTAL	**447,54**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S


CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2025	CORTE N°	FINAL	ELABORÓ	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	NIT O C.C.	800.095.760-9	CONTRATO N°	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT O C.C.	901.209.615-7	CONTRATO N°	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC			

ITEM	2,4	CAPÍTULO	CUBIERTA	ITEM	Suministro e Instalación de Flanche	UNID.	ML



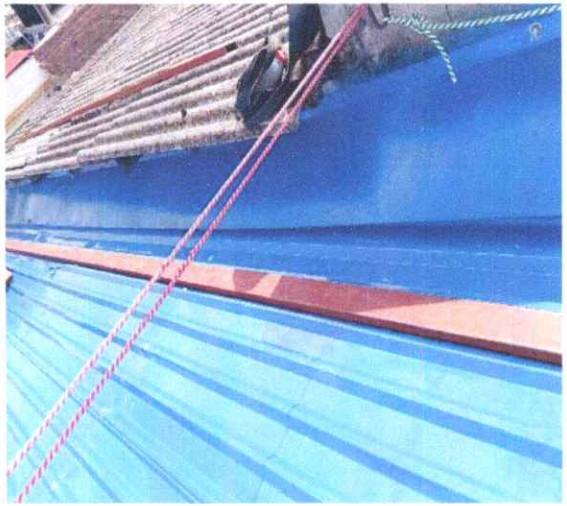

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Cubierta 1			17,75	1,00	17,8
Cubierta 2			16,83	1,00	16,8
Cubierta 3			7,98	1,00	8,0
Cubierta 2			11,33	1,00	11,3
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Subtotal					53,89
Vienen					0,00
TOTAL					**53,89**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**					
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7					
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1	

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	2,5	**CAPÍTULO**	CUBIERTA	**ITEM**	Suministro e Instalación canal Metalica Cal, 18 Desarrollo 60 cm	**UNID.**	ML





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Cubierta 1			8,45	1,00	8,5
Cubierta 3			25,02	1,00	25,0
Cubierta 3			12,52	1,00	12,5
Cubierta 2			29,15	1,00	29,2
Cubierta 1			12,30	1,00	12,3
					0,0
					0,0
					0,0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**					
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7					
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1	

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	2,6	**CAPÍTULO**	CUBIERTA	**ITEM**	Suministro e instalacion de bajantes de A-LL de 4"	**UNID.**	ML





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Bajantes hasta primer piso			9,00	8,00	72,0
Bajantes de un solo piso de altura			3,09	7,00	21,6
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	93,63
				Vienen	0,00
				TOTAL	**93,63**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden


ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**					
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7					
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1	

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	2,7	**CAPÍTULO**	CUBIERTA	**ITEM**	Suministro e instalacion de tragantes de 4"	**UNID.**	UND

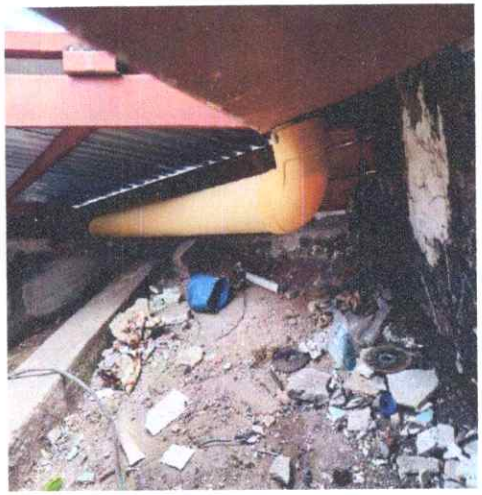



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Bajantes hasta primer piso				8,00	8,0
Bajantes de un solo piso de altura				7,00	7,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Subtotal					15,00
Vienen					0,00
TOTAL					**15,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

172

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	2,8	**CAPÍTULO**	CUBIERTA	**ITEM**	Suministro e Instalación caballete a=60 cm	**UNID.**	ML





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Cubierta 1			8,45	1,00	8,5
Cubierta 2			52,99	1,00	53,0
Cubierta 3			21,66	1,00	21,7
					0,0
					0,0
					0,0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	3	**CAPÍTULO**	ASEO GENERAL	**ITEM**	ASEO GENERAL	**UNID.**	GBL





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Aseo				1,00	1,0
					0,0
					0,0
					0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	NP 1	**CAPÍTULO**	ITEMS NO PREVISTOS	**ITEM**	Corte de piso en concreto	**UNID.**	ML





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Piso anden fachada	1,53		2,00	9,00	27,5
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	27,50
				Vienen	0,00
				TOTAL	**27,50**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**					
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7					
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1	

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	NP 2	**CAPÍTULO**	ITEMS NO PREVISTOS	**ITEM**	Placa contrapiso e= 0,10 m en concreto de 3000 psi	**UNID.**	M2





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Reposicion anden	0,23	0,10		9,00	0,2
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	0,21
				Vienen	0,00
				TOTAL	**0,21**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden


ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	NP 3	**CAPÍTULO**	ITEMS NO PREVISTOS	**ITEM**	Pintura para bajantes en PVC de 4"	**UNID.**	ML

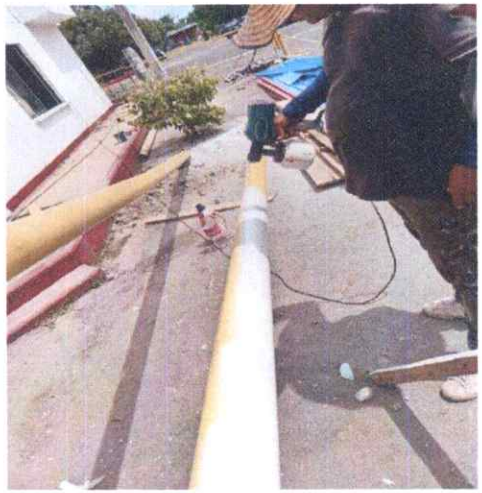



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Bajantes	9,56			9,00	86,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	86,00
				Vienen	0,00
				TOTAL	**86,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	NP 4	**CAPÍTULO**	ITEMS NO PREVISTOS	**ITEM**	Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Inlcuye elementos de fijación)	**UNID.**	M2





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Aula Concejo Municipal	6,00	6,80			40,8
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	40,80
				Vienen	0,00
				TOTAL	**40,80**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**					
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7					
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1	

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	NP 5	**CAPÍTULO**	ITEMS NO PREVISTOS	**ITEM**	Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)	**UNID.**	M2





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Cuarto Planeacion	2,50		4,30		10,8
					0,0
					0,0
					0,0

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**FORMATO**	**MEMORIAS DE CALCULO**					
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT**	901.209.615-7					
No. CONTRATO	COP-2025-004	**VERSIÓN**		**HOJA**	1	**DE**	1	

FECHA	**DD**	19	**MM**	12	**AA**	2025	**CORTE N°**	FINAL	**ELABORÓ**	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	**NIT O C.C.**	800.095.760-9	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**NIT O C.C.**	901.209.615-7	**CONTRATO N°**	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	**Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC**			

ITEM	NP 6	**CAPÍTULO**	ITEMS NO PREVISTOS	**ITEM**	Suministro e Instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de incrustar)	**UNID.**	UND





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Cuarto Planeacion				2,00	2,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	2,00
				Vienen	0,00
				TOTAL	**2,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S


CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT	901.209.615-7
No. CONTRATO	COP-2025-004	VERSIÓN	HOJA 1 DE 1

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2025	CORTE N°	FINAL	ELABORÓ	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT O C.C.	800.095.760-9	CONTRATO N°	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	NIT O C.C.	901.209.615-7	CONTRATO N°	COP-2025-004
		Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC			

ITEM	NP 8	CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	Suministro e instalación de pintura koraza	UNID.	M2



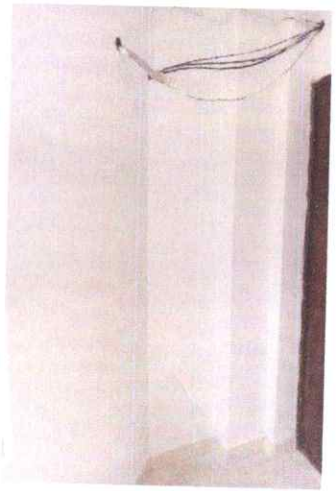



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Muros internos					0,0
	2,00	2,30		1,00	4,6
	1,80	2,30		1,00	4,1
	10,00	2,30		1,00	23,0
	12,50	2,30		1,00	28,8
	15,9	2,30		1,00	36,5
	10,20	2,30		1,00	23,5
	2,800	2,30		1,00	6,4
	3,500	2,30		1,00	8,1
	1,800	2,30		1,00	4,1
	2,000	2,30		1,00	4,6
	2,424	2,30		1,00	5,6
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
				Subtotal	149,30
				Vienen	0,00
				TOTAL	149,30

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT	901.209.615-7				
No. CONTRATO	COP-2025-004	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2025	CORTE N°	FINAL	ELABORÓ	WILLIAM CALDERON PEREZ

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO	NIT O C.C.	800.095.760-9	CONTRATO N°	COP-2025-004
CONTRATISTA	ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	NIT O C.C.	901.209.615-7	CONTRATO N°	COP-2025-004
SUPERVISOR	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO	Secretaria de Planeacion Municipal y de las TIC			

ITEM	NP 9	CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	Estuco	UNID.	M2







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Muros internos					0,0
	2,00	2,30		1,00	4,6
	1,80	2,30		1,00	4,1
	9,28	2,30		1,00	21,3
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Subtotal					30,00
Vienen					0,00
TOTAL					**30,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM CALDERON PEREZ
R-L ALWILL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISION

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.3 Informe SISO

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

INFORME
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

20 OCTUBRE – 19 DICIEMBRE 2025

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONTRATO DE OBRA: COP-2025-004

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ"

DONCELLO - CAQUETÁ
DICIEMBRE 2025

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
   2.1. Objeitvo General 4
   2.2. Objetivos Específicos 4
3. ALCANCE 5
4. DATOS GENERALES DE LA OBRA 5
   4.1. Relación Personal Vinculado en la Obra 5
   4.2. Herramientas y Equipos 6
5. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION SST 7
   5.1. Conformación del Grupo de Gestión SST 7
   5.2. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 8
   5.3. Elementos de Protección Personal 9
   5.4 Acciones de Prevención y Control para Intervenir Peligro 12
   5.5. Novedades de Reporte de Accidentes Laborales 12
   5.6 Punto de Hidratación 13
6. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 13
   6.1. Contactos de emergencia 14
   6.2 Verificación e inspección de herramienta y equipo 15
7. SEGURIDAD SOCIAL 15
8. ANEXOS PRESENTADOS EN EL INFORME SSTCONTRATISTA 17

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer la gestión desarrollada durante el período correspondiente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Las actividades ejecutadas y registradas permiten fortalecer la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, contribuyendo a la optimización de las acciones preventivas y a la mejora continua de las condiciones de trabajo durante la jornada laboral.

De acuerdo con lo anterior, la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.** tiene dentro de sus propósitos fundamentales el desarrollo de acciones de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas a mejorar la calidad de vida laboral de sus colaboradores y a reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales durante la ejecución de las actividades propias de la obra.

En este sentido, la empresa se compromete a suministrar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para atender las necesidades de la población trabajadora en relación con su salud y el adecuado ambiente laboral, así como a dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en el marco de sus funciones como contratista de obra.

La gestión preventiva en Seguridad y Salud en el Trabajo está orientada a una adecuada administración de los riesgos, que permita mantener su control permanente durante el desarrollo de las actividades laborales, contribuyendo al bienestar físico, mental y social de los colaboradores, así como al óptimo funcionamiento de los recursos e instalaciones de la empresa.

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

2. OBJETIVOS

2.1. Objeitvo General

Describir las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 20 de octubre y el 19 de diciembre de 2025, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. COP-2025-004, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ", evidenciando el cumplimiento del alcance contractual, las especificaciones técnicas, el cronograma establecido y las disposiciones normativas aplicables.

2.2. Objetivos Específicos

- Presentar y sustentar de manera clara y organizada las actividades desarrolladas en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.
- Facilitar la identificación, consulta y comprensión de la información relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a la normatividad legal vigente.
- Sensibilizar y concientizar al personal en obra sobre los peligros y riesgos presentes en el desarrollo de sus actividades diarias, promoviendo la implementación y el cumplimiento de los controles preventivos y correctivos necesarios.
- Dar cumplimiento a los criterios, lineamientos y obligaciones establecidos en el contrato de obra.

3. ALCANCE

El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un documento técnico que consolida la información y los lineamientos exigidos por la legislación colombiana vigente, en especial lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. Su aplicación es obligatoria para todos los procesos desarrollados por la empresa ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S., así como para cada uno de los proyectos y contratos de obra civil que ejecute, independientemente de su ubicación o duración, garantizando la implementación, control y mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las obras.

4. DATOS GENERALES DE LA OBRA

DATOS GERENERALES DE LA OBRA			
CONTRATISTA / EJECUTOR:	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	**N.º CONTRATO**	COP-2025-004
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ		
FECHA DE INICIO:	20 de Octubre del 2025		
FECHA DE TERMINACIÒN:	19 de Diciembre del 2025		
PLAZO DE EJECUCIÒN EFECTIVO:	Dos (02) meses		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 187.250.483		

4.1. Relación Personal Vinculado en la Obra

No.	NOMBRE	NO. DOCUMENTO	CARGO
1	Harvin Andrés Bautista Puentes	1016077519	Director de obra
2	Yesid Fernando Bartolo Lozano	1110562700	Residente de obra
4	William Calderón Pérez	96352639	Maestro Repre. *legal*
5	Cristian Alberto Marín Orozco	1116920897	Ornamentador
6	William Andrés Morales Gutiérrez	1116917155	Oficial
5	Laura Calderón	1077877363	Ayudante

6	Yeferson Morales Gutiérrez	1006458912	Ayudante
7	Edwin Andrés Palomino Arias	1117499072	Ayudante
8	María Camila Escobar Lozano	1109005852	SISO

4.2. Herramientas y Equipos

Equipos utilizados para las actividades:

- Pulidora
- Taladro
- Mezcladora
- Vibrador de concreto
- Andamios

Herramienta Menor:

- Rodillo
- Brocha
- Baldes
- Escalera

En el frente de obra se realizaron las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	**PRELIMINARES**	
1,1	Desmonte y retiro de cubierta existente (Incluye retiro de teja, estructura, templetes, anclajes, caballetes, limaoyas y limatesas)	M2
1,2	Demolicion de estructura existente (Incluye muros y losas)	M2
2	**CUBIERTA**	
2,1	Suministro e Instalación de Platina de anclaje de correas	KG
2,2	Suministro e Instalación de Perfilería metálica en tubo rectangular	KG
2,3	Suministro e Instalación de teja arquitectónica	M2
2,4	Suministro e Instalación de Flanche	ML
2,5	Suministro e Instalación canal Metalica Cal, 18 Desarrollo 60 cm	ML
2,6	Suministro e instalacion de bajantes de A-LL de 4"	ML

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

2,7	Suministro e instalacion de tragantes de 4"	UND
2,8	Suministro e Instalación caballete a=60 cm	ML
3	**ASEO GENERAL**	GBL
4	**ITEMS NO PREVISTOS**	
NP 1	Corte de piso en concreto	ML
NP 2	Placa contrapiso e= 0,10 m en concreto de 3000 psi	M2
NP 3	Pintura para bajantes en PVC de 4"	ML
NP 4	Desmonte y monte de cielo raso en PVC (Inlcuye elementos de fijación)	M2
NP 5	Cielo raso en PVC (Incluye estructura, accesorios de anclaje, uniones, rinconeras)	M2
NP 6	Suministro e Instalación de Panel Led Redondo de 24w 6500 K (de incrustar)	UND
NP 7	Puerta en Aluminio con alma en lamina PVC	UND
NP 8	Suministro e instalación de pintura koraza	M2
NP 9	Estuco	M2

5. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION SST

5.1. Conformación del Grupo de Gestión SST

Para la ejecución del proyecto, la empresa ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S. cuenta con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo contratado bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales (honorarios), quien es el responsable de dirigir, coordinar y supervisar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante el desarrollo del proyecto de construcción.

Dentro de sus funciones se encuentran la planificación, ejecución, seguimiento y control de las medidas preventivas y correctivas establecidas, el acompañamiento al personal en obra, la identificación y control de peligros y riesgos propios de las actividades, así como la verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente y de los lineamientos contractuales en materia de SST.

Inspector SST

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023

5.2. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST

Durante el tiempo de ejecución de la obra se realizaron las respectivas inducciones y reinducciones al personal que ingresó al proyecto, socializando las condiciones de trabajo, los peligros y riesgos asociados a las actividades propias de la obra, así como las medidas de prevención y control establecidas. Estas inducciones incluyeron la notificación de riesgos y las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben ser cumplidas durante la ejecución de las labores.

El objetivo principal de estas actividades es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los colaboradores, mediante el desarrollo de un proceso lógico y sistemático, basado en el ciclo de mejora continua, que permita prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Durante el período evaluado se desarrollaron charlas y actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocadas en los riesgos presentes, entre las cuales se destacan.

- Uso adecuado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Señalización de seguridad y demarcación de áreas de trabajo.
- Prevención de caídas al mismo y distinto nivel.
- Identificación de peligros y control de riesgos en actividades de construcción.

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S


5.3. Elementos de Protección Personal

Los EPP mínimos exigidos incluyen:

- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Guantes de seguridad
- Gafas de seguridad
- Protección auditiva
- Protección respiratoria
- Arnés de cuerpo completo y línea de vida.

El uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal fue socializado al personal mediante inducciones y charlas de seguridad, y su cumplimiento fue objeto de seguimiento y control durante toda la ejecución de la obra.



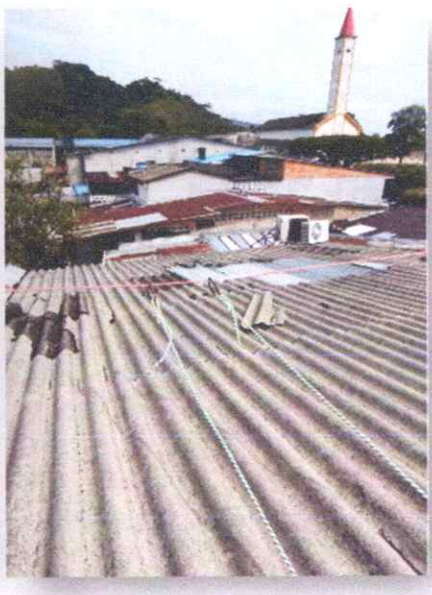

Fotos: 1 y 2

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

Evidencia fotografica entrega de Elementos de Proteccion Personal (EPP)

Los Elementos de Protección Personal (EPP) deben ser utilizados como parte integral del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Industrial de ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S., el cual contempla la identificación y evaluación de los peligros presentes en las actividades de mantenimiento y construcción, así como la definición de los controles necesarios para la mitigación de los riesgos laborales.

El programa incluye el uso adecuado de los EPP, la capacitación y formación de los colaboradores responsables de su utilización, y el compromiso de ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S para garantizar condiciones de trabajo seguras. En este sentido, los elementos de protección personal constituyen una medida fundamental para el control de los riesgos laborales, siempre y cuando sean correctamente seleccionados, utilizados y mantenidos.

Los EPP son equipos de seguridad de uso individual, cuya finalidad es proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que ejecuta en obra. Su función no es eliminar el riesgo, sino minimizar la exposición al mismo, en complemento con la aplicación de controles de ingeniería, administrativos y operativos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Los Elementos de Protección Personal (EPP) no eliminan los peligros ni evitan por sí mismos la ocurrencia de accidentes o el contacto con agentes agresivos; sin embargo, contribuyen significativamente a reducir la severidad de las lesiones y las consecuencias derivadas de la exposición a los riesgos laborales.

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

Las ventajas del uso de los elementos de protección personal:

- El uso adecuado de los Elementos de Protección Personal proporciona una barrera efectiva entre el trabajador y los diferentes riesgos presentes en el desarrollo de las actividades propias de la obra civil. Estos elementos contribuyen a mejorar la protección de la integridad física del trabajador y a disminuir la gravedad de las consecuencias derivadas de un posible accidente laboral. Si bien los EPP no eliminan el riesgo, su correcta utilización reduce significativamente la probabilidad de lesiones graves y fortalece las condiciones de seguridad en el entorno laboral.

Principales factores para el uso de los EPP:

- La implementación y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal requiere del compromiso permanente de todos los niveles de la organización, tanto del personal directivo como de aquellos con responsabilidades operativas. Este compromiso debe estar acompañado de procesos de sensibilización y concientización dirigidos a los colaboradores, que permitan reconocer la importancia del uso correcto y permanente de los EPP como medida preventiva.
- Asimismo, el uso de los EPP está orientado al control y prevención de los riesgos laborales, constituyéndose en una medida complementaria a los controles administrativos, de ingeniería y a las prácticas seguras de trabajo. Su finalidad es proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta, contribuyendo a preservar su salud, seguridad y bienestar durante el desarrollo de las actividades de la obra.

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S





Fotos: 3 y 4
Uso de Elementos de Proteccion Personal

5.4 Acciones de Prevención y Control para Intervenir Peligro

Las acciones que se utilizaron para este periodo fueron:

Durante la ejecución se implementaron acciones de prevención y control orientadas a la identificación, evaluación y mitigación de los peligros presentes en el desarrollo de las actividades propias de la obra, con el fin de proteger la integridad física y la salud de los colaboradores.

Las principales acciones ejecutadas fueron las siguientes:

- **Inspecciones periódicas al personal en obra**, con el propósito de verificar el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), evaluar su estado actual y garantizar su reposición o cambio oportuno cuando se evidenció desgaste, deterioro o incumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad.

- **Verificación de las condiciones de las herramientas y equipos de trabajo**, asegurando que se encontraran en buen estado de funcionamiento antes y durante su uso, así como el seguimiento permanente a los equipos existentes, con el fin de prevenir incidentes, accidentes laborales y fallas operativas durante la jornada laboral.

Estas acciones contribuyeron al control efectivo de los riesgos laborales, fortaleciendo la cultura de prevención y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

En el periodo del 20 Octubre – 19 Diciembre del 2025; no se presentaron accidentes de trabajo, dentro del Contrato de Obra No. COP-2025-004.

.

INDICADORES DE ACCIDENTES			
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:	0		
SIN ACCIDENTES QUE REPORTAR			

5.6 Punto de Hidratación

Durante la ejecución de la obra se dispuso de un (1) punto de hidratación debidamente ubicado y accesible para los colaboradores, con el fin de promover

hábitos saludables y prevenir riesgos asociados a la deshidratación y el estrés térmico.

Así mismo, se mantuvo un stock permanente de dos (2) pacas de bolsas de agua potable, garantizando su reposición oportuna en el momento que fuese necesario, asegurando de esta manera la disponibilidad continua del recurso para el personal en obra.

5. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

6.1. Contactos de emergencia

De conformidad con los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se informó y socializó a todos los colaboradores que, en caso de presentarse una situación de emergencia durante la ejecución de la obra, deberán comunicarse de manera inmediata con las entidades competentes a través de los siguientes números de atención de emergencias, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y adecuada ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se reiteró al personal la importancia de conocer y tener a disposición estos contactos, como parte de las acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencias implementadas en el proyecto de obra civil.

ENTIDAD	NUMERO DE CONTACTO
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	321 4347391
POLICÍA LÍNEA ÚNICA DE EMERGENCIAS NACIONAL CUADRANTE 1	3157922192
DEFENSA CIVIL	3112554476
HOSPITAL ESE SOR TERESA ADELE	317 442 2702

6.2 Verificación e inspección de herramienta y equipo

INSPECCION	FRECUENCIA	RESPONSABLE
HERRAMIENTAS MANUALES	UNA VEZ CADA QUINCE DIAS	INSPECTOR SST
INSPECCION INTERNA DE OBRA	UNA VEZ CADA QUINCE DIAS	INSPECTOR SST
INSPECCION A EQUIPOS	UNA VEZ CADA QUINCE DIAS	INSPECTOR SST

Otras Acciones:

Se desarrollaron acciones complementarias orientadas a la promoción de la salud, la prevención de riesgos laborales y la preparación ante situaciones de emergencia, entre las cuales se destacan:

- **Realización de pausas activas** dirigidas a los colaboradores, con el fin de prevenir la fatiga física, disminuir el riesgo de desórdenes musculoesqueléticos y promover hábitos saludables durante la jornada laboral. Estas actividades se encuentran debidamente soportadas mediante las respectivas planillas de asistencia del personal.
- **Socialización del punto de encuentro** establecido dentro del área de influencia de la obra, definido como lugar seguro en caso de presentarse una emergencia que requiera la evacuación parcial o total del personal. Esta información fue impartida durante la capacitación de inducción al personal, quedando respaldada con la planilla de asistencia correspondiente a la capacitación realizada el **31/10/2025**.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la cultura de prevención, al cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y a la adecuada respuesta ante posibles situaciones de emergencia durante el desarrollo de las actividades de obra civil.

6. SEGURIDAD SOCIAL

Durante el período evaluado se realizó la verificación de la afiliación de los colaboradores a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a través de la plataforma de **POSITIVA Compañía de Seguros**, conforme a los lineamientos establecidos por la empresa **ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.**

En dichas consultas se constató que el personal operativo vinculado a la obra, correspondiente a ayudantes, oficiales, maestro de obra y profesional SISO, se encuentra afiliado en **nivel de riesgo V**, acorde con las actividades propias de la ejecución de obra civil. Así mismo, los ingenieros director y residente de obra se encuentran afiliados en **nivel de riesgo V**, de acuerdo con las funciones administrativas y de supervisión que desempeñan.

Esta verificación garantiza el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y permite asegurar la cobertura adecuada frente a los riesgos laborales asociados al desarrollo del proyecto.

A continuación, se relaciona el personal.

No.	NOMBRE	NO. DOCUMENTO	CARGO
1	Harvin Andrés Bautista Puentes	1016077519	Director de obra
2	Yesid Fernando Bartolo Lozano	1110562700	Residente de obra
4	William Calderón Pérez	96352639	Repre. legal
5	Cristian Alberto Marín Orozco	1116920897	Ornamentador
6	William Andrés Morales Gutiérrez	1116917155	Oficial
5	Laura Camila Calderón Naveros	1077877363	Ayudante
6	Yeferson Morales Gutiérrez	1006458912	Ayudante
7	Edwin Andrés Palomino Arias	1117499072	Ayudante
8	María Camila Escobar Lozano	1109005852	SISO

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

7. ANEXOS PRESENTADOS EN EL INFORME SSTCONTRATISTA

- ANEXO 1. Planilla Asistencia Charla Inducción.
    - Uso y Mantenimiento Elementos de Protección Personal.
    - Señalización de seguridad y demarcación de áreas de trabajo
    - Prevención de caídas al mismo y distinto nivel
    - Identificación de peligros y control de riesgos en actividades de construcción.
- ANEXO 2. Entrega de EPP.
- ANEXO 3. Planilla de Seguridad Social.

ELABORÓ

María Camila Escobar Lozano

Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo

Profesional en Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, otorgada mediante Resolución No. 3673 del 05 de junio de 2023.

21 (Día)	10 (Mes)	25 (Año)

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ

PLANILLAS INFORME SST - ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL DONCELLO **CONTRATO DE OBRA No.** COP-2025-004 **CONTRATISTA:** ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONCEPTO: Entrega EPP.

No	NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS							FECHA DE ENTREGA	FIRMA
			CASCO	GUANTES	TAPA OIDOS	TAPA BOCAS	GUANTE CARNAZA	BOTAS	GAFAS		
1	Harvin Andrés Bautista Puentes	Director de obra	X			X		X	X	21/10/25	
2	Yesid Fernando Bartolo Lozano	Residente de obra	X			X		X	X	21/10/25	
3	William Calderón Pérez	Maestro	X	X	X	X		X	X	21/10/25	
4	Cristian Alberto Marín Orozco	Ornamentador	X	X	X	X	X	X	X	21/10/25	Cristian Marin O
5	William Andrés Morales Gutiérrez	Oficial / Ornamentado	X	X	X	X	X	X	X	21/10/25	William Morales.
6	Laura Camila Calderón Naveros	Ayudante	X	X	X	X		X	X	21/10/25	LAURA CAMILA CALDERON
7	Yeferson Morales Gutiérrez	Ayudante	X	X	X	X	X	X	X	21/10/25	Yeferson Morales
8	Edwin Andrés Palomino Arias	Ayudante	X	X	X	X		X	X	21/10/25	Edwin P.
9	María Camila Escobar Lozano	SISO	X			X		X	X	21/10/25	Maria Camila E
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL:

NOTA:

Firma: María Camila Escobar L.

Nombre: María Camila Escobar Lozano

Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023

20	11	25
(Día)	(Mes)	(Año)

Libertad y Orden

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL EL DONCELLO – CAQUETÁ

PLANILLAS INFORME SST - ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL DONCELLO **CONTRATO DE OBRA No.** COP-2025-004 **CONTRATISTA:** ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S

CONCEPTO: Reposicion EPP

No	NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS							FECHA DE ENTREGA	FIRMA
			CASCO	GUANTES	TAPA OIDOS	TAPA BOCAS	GUANTE CARNAZA	BOTAS	GAFAS		
1	Harvin Andrés Bautista Puentes	Director de obra								20-11-25	
2	Yesid Fernando Bartolo Lozano	Residente de obra								20-11-25	
3	William Calderón Pérez	Maestro								20-11-25	
4	Cristian Alberto Marín Orozco	Ornamentador		X		X			X	20-11-25	Cristian Marín O
5	William Andrés Morales Gutiérrez	Oficial / Ornamentado		X		X			X	20-11-25	William Morales.
6	Laura Camila Calderón Naveros	Ayudante		X		X				20-11-25	LAURA CAMILA CALDERO.
7	Yeferson Morales Gutiérrez	Ayudante		X		X				20-11-25	Yeferson Morales.
8	Edwin Andrés Palomino Arias	Ayudante		X		X				20-11-25	Edwin P.
9	María Camila Escobar Lozano	SISO								20-11-25	María Camila E.
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL:

NOTA:

Firma: María Camila Escobar.

Nombre: María Camila Escobar Lozano

Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	SG-SST

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÒN

Nombre o Temática o temática de la Charla o Capacitación:	Uso adecuado y mantenimiento EPP	**Departamento:**	**Caquetá**
		Ciudad o Municipio:	**Doncello**
Responsable(s):	**ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S – Profesional SST**		

Fecha de Realización	21/10/25	Hora	7:00 am

N°	*Nombres y Apellidos*	*N° Documento*	*Cargo*	*Firma*
1	Harvin Andrés Bautista Puentes	1016077519	Director de obra	
2	Yesid Fernando Bartolo Lozano	1110562700	Residente de obra	
3	William Calderón Pérez	96352639	Maestro	
4	Cristian Alberto Marín Orozco	1116920897	Ornamentador	Cristian Marin O.
5	William Andrés Morales Gutiérrez	1116917155	Oficial / Ornamentador	William Morales
6	Laura Camila Calderón Naveros	1077877363	Ayudante	LAURA CAMILA CALDERON
7	Yeferson Morales Gutiérrez	1006458912	Ayudante	Yeferson Morales
8	Edwin Andrés Palomino Arias	1117499072	Ayudante	Edwin P.
9	María Camila Escobar Lozano	1109005852	SISO	María Camila E.
10				
11				

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL:
Entrenamiento en Señalización y prevención de caídas.
Identificación de Peligros

Inspector SST María Camila Escobar.
María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	SG-SST

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÒN

Nombre o Temática o temática de la Charla o Capacitación:	Señalización de seguridad.	**Departamento:**	**Caquetá**
		Ciudad o Municipio:	**Doncello**
Responsable(s):	**ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S – Profesional SST**		

Fecha de Realización	05/11/25	Hora	8:00 am

N°	Nombres y Apellidos	N° Documento	Cargo	Firma
1	Harvin Andrés Bautista Puentes	1016077519	Director de obra	
2	Yesid Fernando Bartolo Lozano	1110562700	Residente de obra	
3	William Calderón Pérez	96352639	Maestro	
4	Cristian Alberto Marín Orozco	1116920897	Ornamentador	Cristian Marin O.
5	William Andrés Morales Gutiérrez	1116917155	Oficial / Ornamentador	William Morales
6	Laura Camila Calderón Naveros	1077877363	Ayudante	LAURA CAMILA CALDERON
7	Yeferson Morales Gutiérrez	1006458912	Ayudante	Yeferson Morales
8	Edwin Andrés Palomino Arias	1117499072	Ayudante	Edwin P.
9	María Camila Escobar Lozano	1109005852	SISO	María Camila E.
10				
11				

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL:

_____

_____

_____

Inspector SST María Camila Escobar.

María Camila Escobar Lozano

Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	SG-SST

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÒN

Nombre o Temática o temática de la Charla o Capacitación:	Prevencion de caidas en niveles.	Departamento:	Caquetá
		Ciudad o Municipio:	Doncello
Responsable(s):	ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S – Profesional SST		

Fecha de Realización	20/11/25	Hora	10:00 am

N°	Nombres y Apellidos	N° Documento	Cargo	Firma
1	Harvin Andrés Bautista Puentes	1016077519	Director de obra	
2	Yesid Fernando Bartolo Lozano	1110562700	Residente de obra	
3	William Calderón Pérez	96352639	Maestro	
4	Cristian Alberto Marín Orozco	1116920897	Ornamentador	Cristian Marin
5	William Andrés Morales Gutiérrez	1116917155	Oficial / Ornamentador	William Mor.
6	Laura Camila Calderón Naveros	1077877363	Ayudante	LAURA CAMILA CALDERON
7	Yeferson Morales Gutiérrez	1006458912	Ayudante	Yeferson Morales
8	Edwin Andrés Palomino Arias	1117499072	Ayudante	Edwin P.
9	María Camila Escobar Lozano	1109005852	SISO	Maria Camila E.
10				
11				

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL:

_____

_____

_____

Inspector SST Maria Camila Escobar.

María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023
Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	SG-SST

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÒN

Nombre o Temática o temática de la Charla o Capacitación:	Reentrenamiento en Identificación de Peligros.	**Departamento:**	**Caquetá**
		Ciudad o Municipio:	**Doncello**
Responsable(s):	**ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S – Profesional SST**		

Fecha de Realización	05/12/25	Hora	2:00 Pm

N°	Nombres y Apellidos	N° Documento	Cargo	Firma
1	Harvin Andrés Bautista Puentes	1016077519	Director de obra	
2	Yesid Fernando Bartolo Lozano	1110562700	Residente de obra	
3	William Calderón Pérez	96352639	Maestro	
4	Cristian Alberto Marín Orozco	1116920897	Ornamentador	Cristian Marin O.
5	William Andrés Morales Gutiérrez	1116917155	Oficial / Ornamentador	William Morales.
6	Laura Camila Calderón Naveros	1077877363	Ayudante	LAURA CAMILA CALDERON
7	Yeferson Morales Gutiérrez	1006458912	Ayudante	Yeferson Morales
8	Edwin Andrés Palomino Arias	1117499072	Ayudante	Edwin P.
9	María Camila Escobar Lozano	1109005852	SISO	Maria Camila E.
10				
11				

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL:

_____

_____

_____

Inspector SST Maria Camila Escobar.

María Camila Escobar Lozano
Profesional: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia SST: Resolución No. 3673 de 05/06/2023
Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.4 Certificación pago FIC

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611
email: alwil197101@gmail.com

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S. identificado con el NIT 901209615, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
COP-2025-004	CONTRATO DE OBRA PUBLICO	EL DONCELLO	468,126	2025-12	22-DIC-2025	152664546
		Total	468,126			

Expedido por el SENA, a los veintidos (22) dias del mes de Diciembre de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-12-22

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 1227911823 y el Número de Certificado: 450974

20

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	152664546	2028574320	22/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901209615**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.148.182.44**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 468,126.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 468,126.00	COP$ 468,126.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	152664546	2028574320	22/12/2025

Número de Identificación
901209615

Primer Nombre ó Razón Social
ALWIL GLOBAL SERVICIOS S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CAQUETA

Ciudad Capital
FLORENCIA (CAQUETA)

Dirección de Domicilio
CRA. 4 No. 6-08

Ciudad de Domicilio
EL DONCELLO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,312 4219611

Correo electrónico
alwill197101@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Caqueta

Regional Centros SIIF
36-02-00-018-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
COP-2025-004

Nombre Obra
CONTRATO DE OBRA PUBLICO

Fecha Inicio Obra
20/10/2025

Fecha Terminación Obra
19/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
EL DONCELLO

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
187250438.00

Costo Total Mano de Obra
46812610.00

Número de Trabajadores en el Periodo
4

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
468126.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
468126.00

ecollect
Seguro para ti

9.5 Certificación de Material

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S


9.6 Registro Fotográfico


ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S




Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

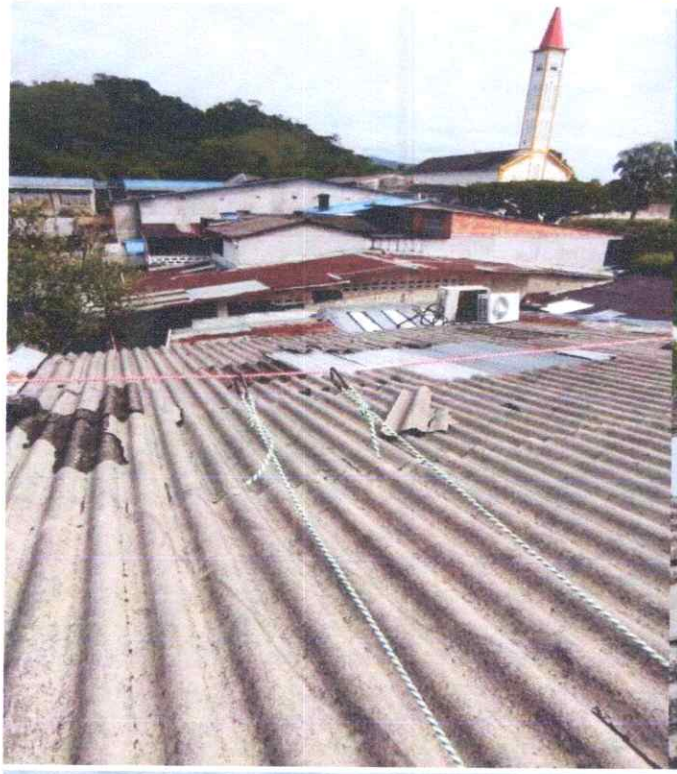

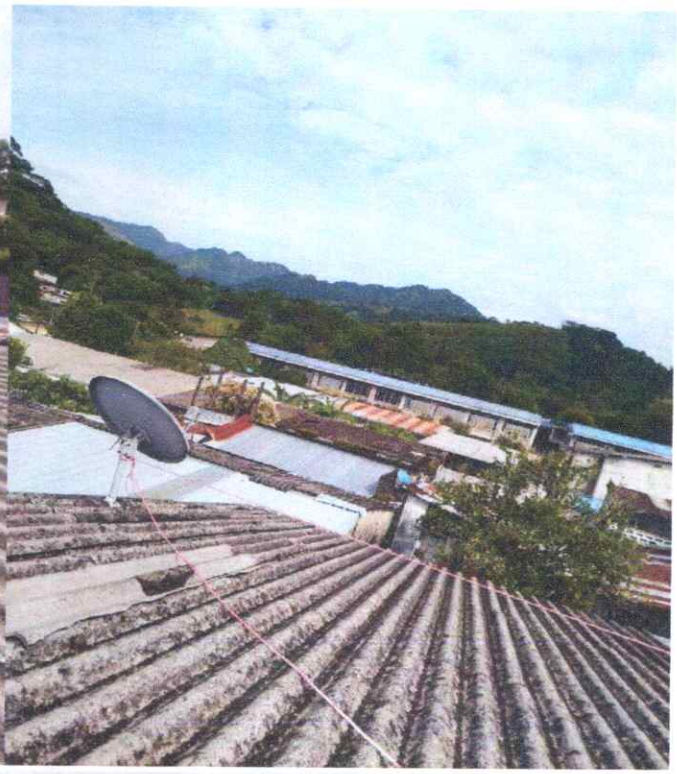

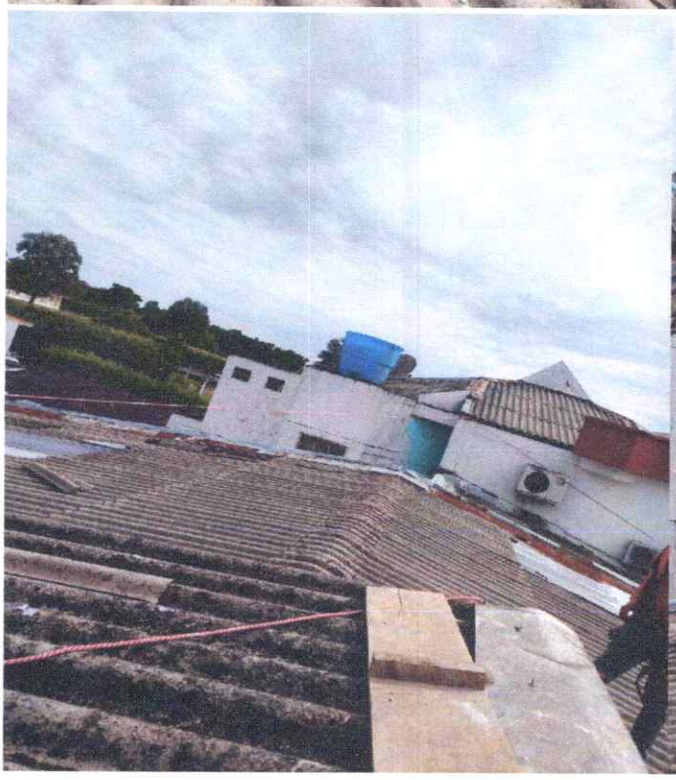




Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com


ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

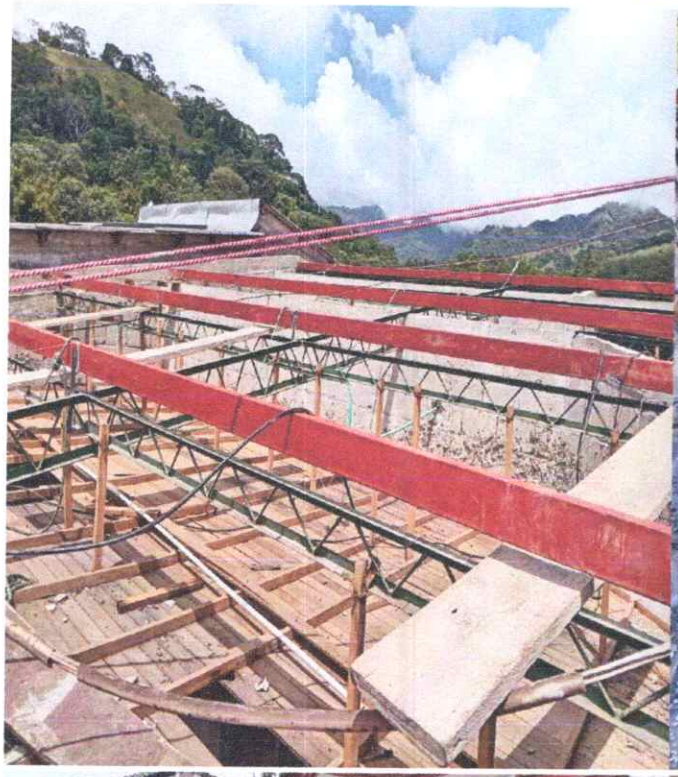

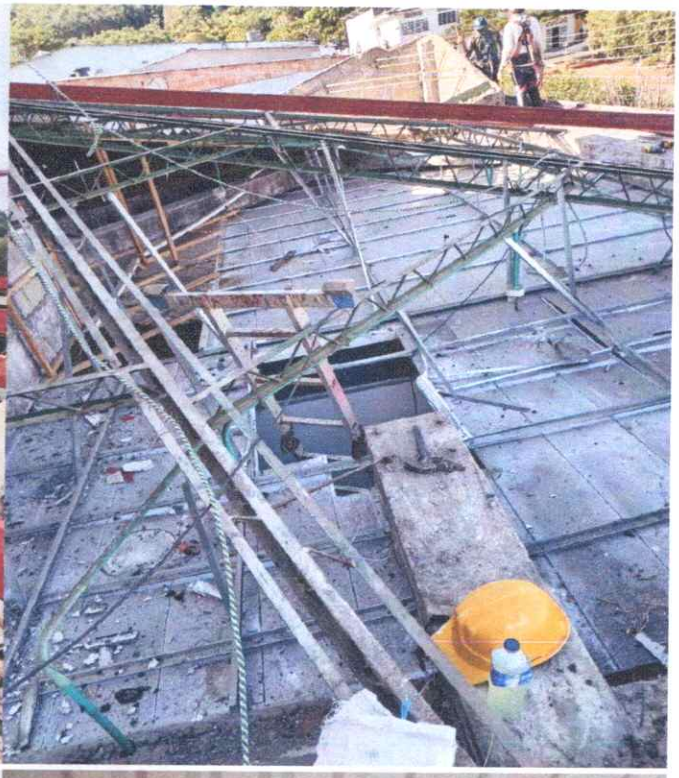






Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

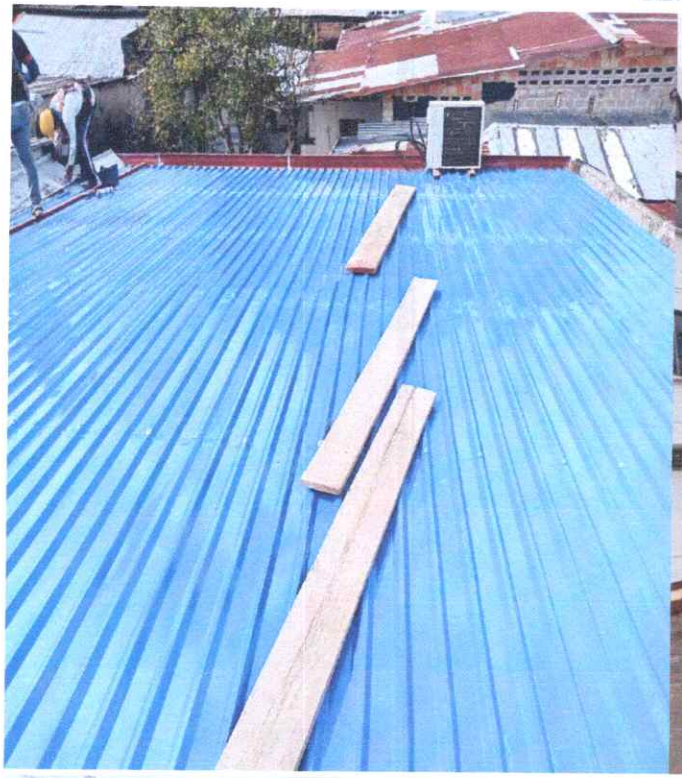








Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S







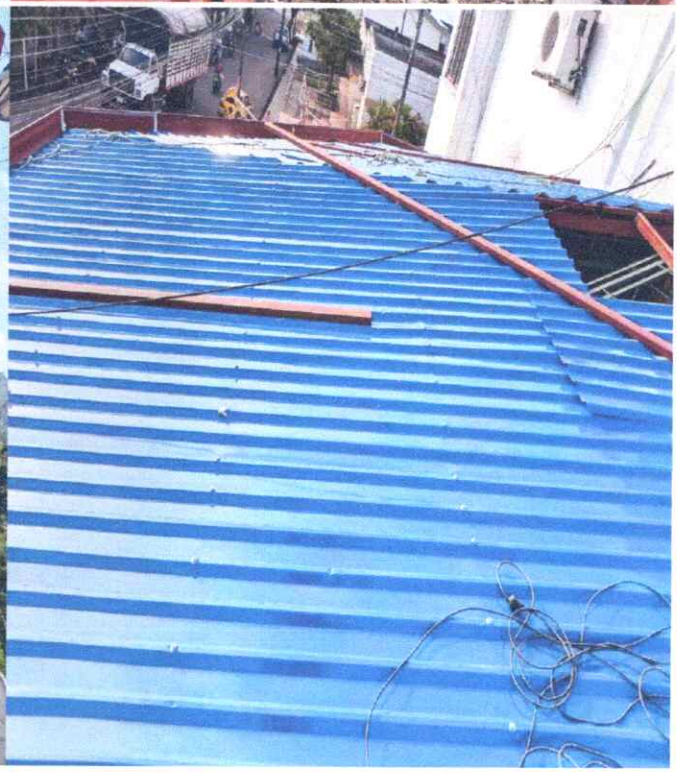

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S









Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S









Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email: alwil197101@gmail.com


ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



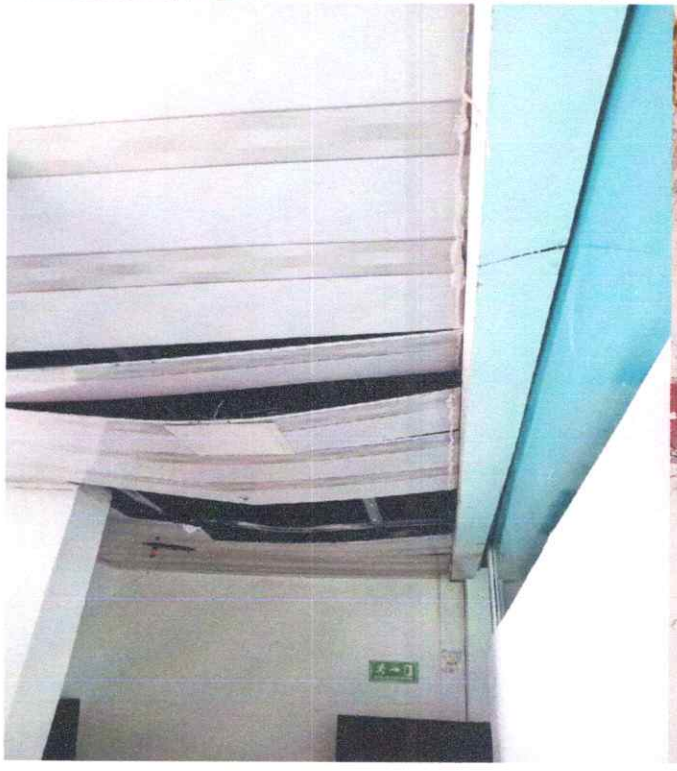



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S




Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S





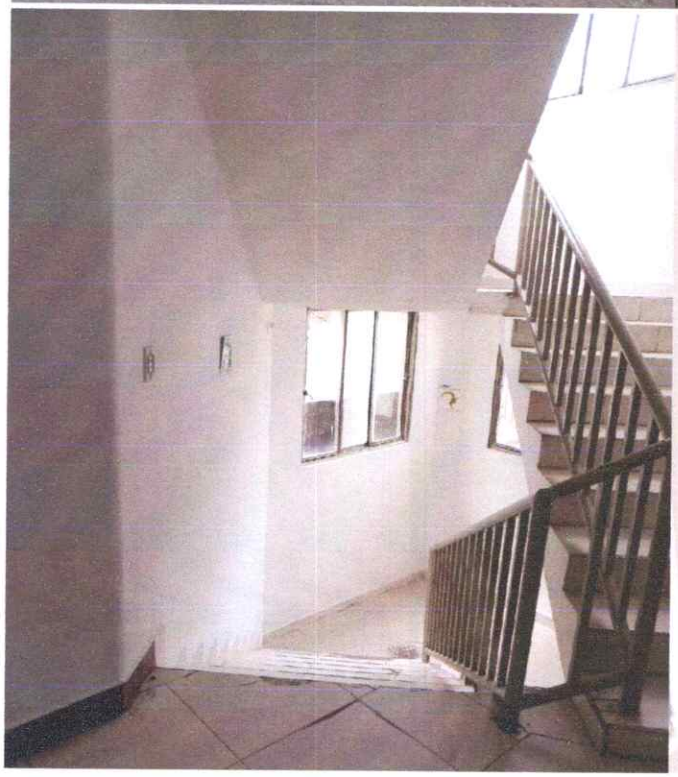



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email: alwil197101@gmail.com


ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S




Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email: alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S



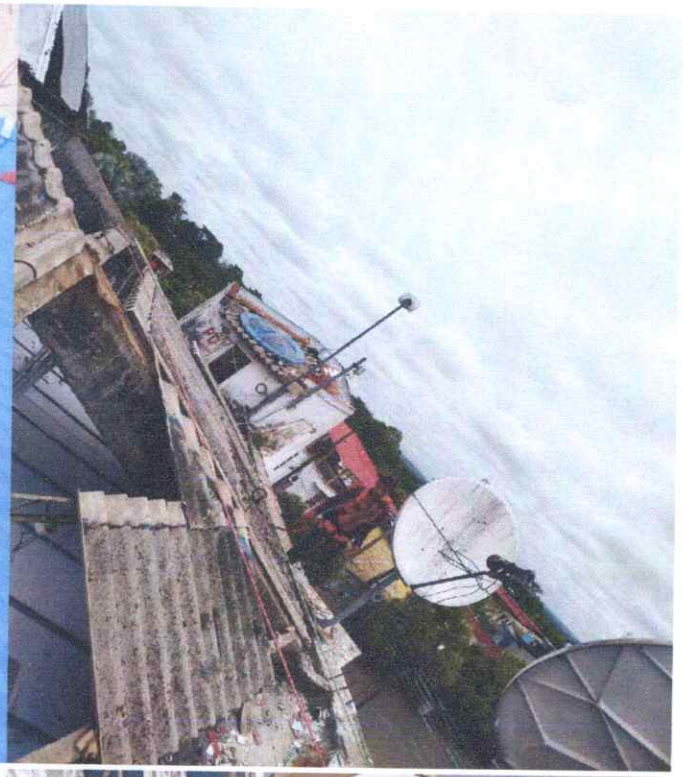

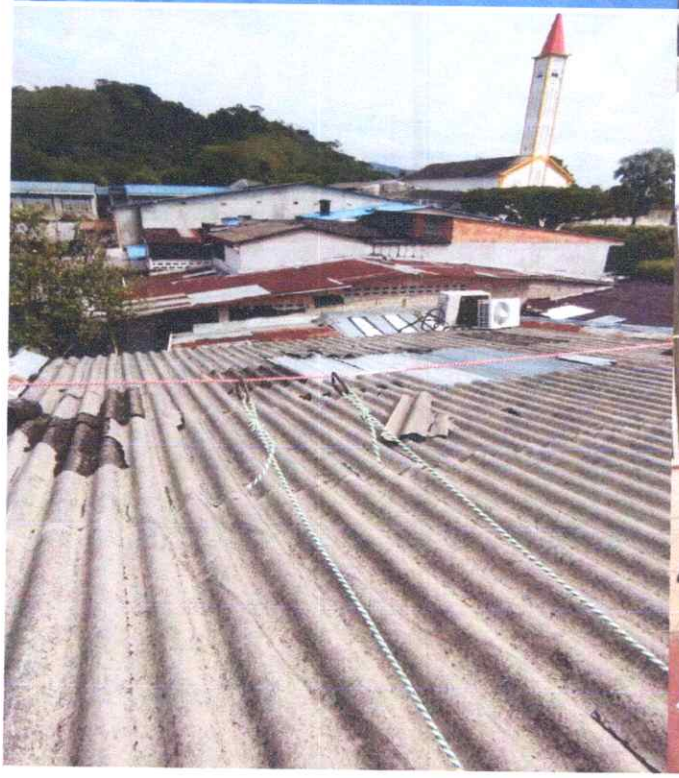



Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com

ALWIL GLOBAL
SERVICIOS S.A.S

9.7 Bitácora

Carrera 4 – No 6 – 08 Barrio Belalcázar – El Doncello Caquetá. Cel. 3124219611 email:
alwil197101@gmail.com
