CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

CONTRATO [ ] CONVENIO [X]

Proyecto (S): Formular e implementar estrategias y planes de manejo de especies focales de fauna; y ejecutar estrategias de control y manejo de especies invasoras de fauna y flora en municipios del departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: San Bernardo, San Antero, Lorica, Cereté, Chimá, Momil, Purísima, Cotorra, Ayapel, Planeta Rica, Buenavista, La Apartada, Montelíbano y Puerto Libertador, Montería, Sahagún y Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba.

Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: Diciembre 2025

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**014 – 2025**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	08/07/2025
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Formular e implementar estrategias y planes de manejo de especies focales de fauna; y ejecutar estrategias de control y manejo de especies invasoras de fauna y flora en municipios del departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$398.500.000
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $140.000.000
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses y/o hasta el 30 de Diciembre de 2025
FECHA DE INICIO:	Julio 10 de 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 de Diciembre de 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	**NA**		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**NA**		
VALOR DE ADICIÓN	**NA**		
APORTE CVS DE LA ADICIÓN	**NA**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**25-44-101203949**			**ANEXO No 1**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	(07/07/2025)	(30/06/2026)	$39.850.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(07/07/2025)	(30/06/2026)	$140.000.000,00
Calidad del servicio	Si	(07/07/2025)	(30/06/2026)	$39.850.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(07/07/2025)	(30/12/2028)	$19.925.000,00
POLIZA RCE No	**25-40-101054162**			
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(08/07/2025)	(30/12/2025)	$284.700.000,00

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO: NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Estrategia de conservación de la especie mono capuchino (*Cebus capucinus*) en el departamento de Córdoba	Julio Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025 Agosto Se realizaron cuatro talleres comunitarios (3 en el DMI Complejo Cenagoso del Bajo Sinú y 1 en el DCS Ciénaga de Bañó) con una asistencia global de 108 participantes. El resultado común en los 4 espacios, frente a la presencia y reconocimiento de la especie *C. capucinus* en ambas áreas fue negativa; es decir, que ninguno de los asistentes la ha visto en ninguna de las dos áreas protegidas. Se forma complementaria, se realizó un análisis cartográfico de coberturas en las dos áreas protegidas (DMI y DCS) y, en ambas zonas predominan las pasturas y arbustos, y no la presencia de bosques arbolados que son el hábitat de preferencia de la especie. En vista de los resultados, se le propone a la CVS el cambio de áreas de monitoreo por DCS Complejo de Humedales Arcial, Porro y Cintura (con registros bibliográficos) y la RNSC Santa Fe (liberaciones del CAV CVS). Propuesta que se encuentra en evaluación. - Fecha: 01 – 30 agosto de 2025	100%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Septiembre Se definieron el Distrito de Conservación de Suelos (DCS) del Complejo de Humedales Arcial, Porro y Cintura, y la Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) Santa Fe, como las áreas definitivas para el monitoreo biológico y evaluación comunitaria sobre la presencia de *C. capucinus*, con miras a la formulación de una estrategia de conservación de mono capuchino en el departamento de Córdoba. Se realizaron 4 talleres de evaluación en el área definitiva de evaluación (corregimiento Pueblo Santo, vereda Santa Rosa de Arcial, corregimiento de Cintura, corregimiento El Almendro), con una asistencia de 108 participantes en total, y obteniendo el reconocimiento del mono capuchino en sus territorios, la identificación de amenazas y un listado de propuestas desde la visión de las comunidades. - Fecha: 01 – 30 septiembre de 2025 Octubre Como estrategia complementaria a los talleres, se realizaron 40 entrevistas a informantes clave (miembros de la comunidad con conocimiento sobre la ocurrencia en vida libre de *C. capucinus* en las áreas protegidas que se están evaluando o zonas adyacentes). La entrevista construida y aplicada, constó de 19 ítems de consulta distribuidos en tres secciones: (1) sobre la presencia local de la especie, (2) amenazas potenciales locales para la especie y (3) percepciones sobre la especie e interés por su conservación. Su aplicación y posterior análisis aportó datos de interés sobre la ocurrencia en vida libre de la especie, se identificó una percepción local positiva sobre el mono capuchino y se confirmó que la deforestación para extensión de la frontera agropecuaria es percibida como su presión antrópica principal. - Fecha: 01 – 31 octubre de 2025	

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Noviembre Se realizo la depuración y análisis de los datos obtenidos durente las salidas de campo realizadas a las dos áreas de evaluación logrando confirmar presencia en 5 sitios de muestreo. se registraron dos tropas al interior del DCS Arcial, Porro y Cintura: una en el bosque denso de la hacienda La Martinica y la otra en la vegetación secundaria o en transición de la hacienda Peralonso. Además, se obtuvo evidencia de dos tropas por fuera del área protegida: una en el bosque denso de la hacienda Montebello y la otra en la vegetación secundaria o en transición de la finca Los Billetes. Por su parte, la especie no se encontró en la RNSC Santa Fe, pero se avistó una tropa en la vegetación secundaria o en transición de la hacienda La Daniela. Tamaño promedio de tropa de 10 individuos. Se realizó un taller interinstitucional de co-construcción con actores clave previamente identificados e invitados, cuyo objetivo fue el fortalecimiento de la estrategia formulada para la conservación de *C. capucinus*, con la participación de 4 de los 6 actores instituvionales contemplados. Se realizaron 4 socializaciones de resultados (3 en el DCS Arcial, Porro y Cintura, 1 en RNSC Santa Fe), logrando la participación de 64 asistentes. Se elaboró el documento "Estartegia de conservación para el mono capuchino (Cebus capuchinus), para dos áreas protegidas del departamento de Córdoba" - Fecha: 01 – 30 noviembre de 2025	
Áreas de avistamiento de manatíes y nutrias identificadas y georreferenciadas en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa, Tinajones y áreas aledañas.	Julio Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos	100%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025 Agosto Se realizó la 1ra salida de campo de monitoreo biológico, en la cual se recorrieron 303,5 km durante 11 días de muestreo y se lograron 1 registro directo 28 indirectos de manatí (*T. manatus*) y 26 registros indirectos de nutria (*L. longicaudis*). Se enviaron oficios a 2 Instituciones Educativas como avance en la planeación de los talleres de educación ambiental proyectados para septiembre y octubre de 2025. - Fecha: 01 – 30 agosto de 2025 Septiembre Se realizaron entrevistas a 16 personas, la mayoría hombres, tres del municipio de San Antero y 13 del municipio de San Bernardo del Viento (12 del corregimiento de Caño Grande y uno del corregimiento de Trementino) en un rango de edad de los 32 a los 67 años. La mayoría de los entrevistados tienen como actividad económica a la pesca y la agricultura, y otros alternan con actividades de transporte de turistas. Se realizaron 11 talleres de educación ambiental al grupo uno, el cual corresponde a los grados de bachillerato. Cuatro talleres en la I.E Isla de los Milagros y siete en I.E Julio Cesar Miranda, abarcando un total de 321 estudiantes desde los grados sexto a undécimo. En el marco de las actividades en Instituciones Educativas, se entregaron 340 carticuadernos de Manatí-Manatí. - Fecha: 01 – 30 septiembre de 2025	

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Octubre Como estrategia de participación comunitaria, se implementaron 25 entrevistas semiestructuradas (12 a pescadores de municipio de San Antero y 13 a pescadores del municipio de San Bernardo del Viento), obteniendo información acerca de la biología, ecología, el interés en participar de procesos de conservación y las estrategias que proponen las comunidades para la preservación de ambas especies de mamíferos en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa, Tinajones y áreas aledañas. - Fecha: 01 – 31 octubre de 2025 --- Noviembre Se lograron 11 registros directos de (un avistamiento directo en el río Sinú y 10 con cámaras trampa). Se identificaron 11 individuos de *Lontra annectens*, cinco en el mes de agosto y seis en noviembre, casi la misma cantidad reportada en los monitoreos de la nutria neotropical del año 2024, encontrando la presencia de la especie en los mismos cuerpos de agua, a excepción del caño Ferez que fue incluido este año en el esfuerzo de muestreo. También se obtuvieron 44 registros indirectos con heces de nutria y 5 de revolcaderos en salida de campo de agosto y noviembre (28 recorridos). Se realizaron 2 reuniones de socialización de resultados de las actividades de monitoreo biológico y educación ambiental respecto al manatí del Gran Caribe (*Trichechus manatus manatus*) y la nutria neotropical (*Lontra annectens*) en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa, Tinajones y sectores aledaños. A estas reuniones asistieron principalmente representantes de asociaciones de mangleros y pescadores, algunos asociados y demás personas interesadas, de San Bernardo del Viento (Tinajones, Caño Grande y Caño La Balsa), con la asistencia de 13 personas y San Antero con la asistencia de 20 personas. - Fecha: 01 – 30 noviembre de 2025	

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Áreas de presencia de la especie acacia pálida (*Leucaena leucocephala*) en dos subregiones del departamento de Córdoba.	Julio Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025 --- Agosto Se realizó la fase de revisión bibliográfica sobre atributos biológicos de la especie que incluyen su distribución en el departamento, logrando una base de datos de 7 publicaciones técnicas y científicas revisadas. Se adelantaron gestiones con agremiaciones de ganaderos y diferentes instituciones locales y regionales, con el propósito de identificar áreas en las que se han establecido siembras de esta especie bajo esquemas silvopastoriles o agroforestales. De manera complementaria, se realizaron visitas a las oficinas de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) de los municipios de Chinú, Sahagún, San Andrés de Sotavento y Tuchín, pertenecientes a la sabana cordobesa. Se radicaron oficios de solicitud de información en las asociaciones ganaderas GANACOR y ASOGAN. Se desarrolló un reconocimiento preliminar en campo con el propósito de evaluar de manera exploratoria las condiciones biofísicas y antrópicas del territorio, orientando así la definición de los puntos oficiales de muestreo. - Fecha: 01 – 30 agosto de 2025 --- Septiembre	100%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Se aplicaron 16 encuestas en las áreas de evaluación, en cuyos resultados preliminares el 50% de los encuestados afirma conocer la especie de acacia pálida y el 31% indicó haberla visto en el territorio, principalmente en los municipios de Pueblo Nuevo y Planeta Rica. Se realizaron visitas a las oficinas del sector agro en los municipios de Ayapel, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo. Se implementa el muestreo directo en campo mediante la instalación de 7 puntos de muestreo, cada uno con 4 parcelas de 10 x 10 m (100 m²) distribuidas en las subregiones Sabana y San Jorge del departamento de Córdoba, en las que se registraron los individuos de *Leucaena leucocephala* con diámetro superior a 2,5 cm. Los resultados muestran una abundancia variable entre cero y seis individuos por parcela, con un promedio de 2,9 individuos/parcela, lo cual equivale a una densidad aproximada de 41 individuos por hectárea. Se confirmó la presencia de la especie en los municipios de Chinú y Sahagún, correspondientes a la subregión de Sabanas, así como en Pueblo Nuevo y Planeta Rica, pertenecientes a la subregión de San Jorge. - Fecha: 01 – 30 septiembre de 2025 --- <u>Octubre</u> Se aplicaron 55 encuestas con el propósito de incorporar la percepción social y el conocimiento tradicional en torno a la especie, cuyos resultados actualizados muestran que el 67% de los encuestados afirma conocer la *Leucaena leucocephala*, y un 76% indica haberla observado en su territorio, principalmente en los municipios de Pueblo Nuevo, Sahagún y Chinú, seguidos de Planeta Rica y Montelíbano. Los sitios reportados como de mayor frecuencia de observación corresponden a potreros (46%) y bordes de caminos (32%). Y, los principales usos, el forraje para el ganado (31%), cercas vivas (18%), fuente de sombra (13%) y uso directo (18%).	

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Se desarrollaron 4 talleres en la subregión de Sabanas, específicamente en los municipios de Chinú, Sahagún y Pueblo Nuevo, este último con dos jornadas diferenciadas: una dirigida a la comunidad rural y otra con funcionarios de la Alcaldía Municipal, vinculados al programa UTAC (Unidad Técnica Agropecuaria y de Seguridad Alimentaria). De igual forma, en la subregión del San Jorge se realizó un taller en el municipio de Planeta Rica, con la participación de ganaderos, agricultores y representantes locales del sector agropecuario, se prepara un taller más para aumentar cobertura en la entrega de la información. Logrando la participación de 44 personas en total. - Fecha: 01 – 30 octubre de 2025 --- <u>Noviembre</u> Se desarrollaron 3 jornadas de socialización comunitaria y técnica en las subregiones priorizadas: dos en la zona de Sabanas (municipios de Chinú y Pueblo Nuevo) y otra en la subregión del San Jorge (municipio de Planeta Rica). Durante estos encuentros finales se expusieron de manera detallada los hallazgos del proyecto, incluyendo el estado actual de *Leucaena leucocephala* en el departamento, los patrones de establecimiento observados, las áreas de mayor recurrencia y las condiciones que favorecen su persistencia en los sistemas productivos, así como recomendaciones para su manejo y control. - Fecha: 01 – 30 noviembre de 2025	
Identificación de medidas de control y manejo de la especie acacia pálida (*Leucaena leucocephala*) en dos subregiones del departamento de Córdoba.	<u>Julio</u> Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo	100%

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025 Agosto Se realizó la fase de revisión bibliográfica sobre atributos biológicos de la especie que incluyen su distribución en el departamento, logrando una base de datos de 7 publicaciones técnicas y científicas revisadas. - Fecha: 01 – 30 agosto de 2025 Septiembre Se realiza un análisis preliminar de los resultados de campo y de las encuestas aplicadas, que evidencia que son pocas las fincas o productores que mantienen actualmente siembras activas de leucaena. Este patrón indica que, en el área de estudio, la leucaena no presenta un carácter expansivo descontrolado, sino más bien una presencia regulada y asociada a prácticas productivas específicas, lo que sugiere un nivel de control efectivo sobre su dispersión. Sin embargo, a orilla de carreteras se le observa en algunos lugares donde muestra crecimiento de individuos de diferentes edades, ya que en estos sitios dispone de libre crecimiento al no circular bovinos por estos corredores. - Fecha: 01 - 30 de septiembre Octubre En conjunto, la caracterización de los sitios de muestreo, los resultados de campo y de percepción comunitaria sugieren que la *Leucaena leucocephala* no presenta un comportamiento invasor activo, sino una ocupación regulada y dependiente del manejo antrópico, lo que resalta la necesidad de continuar el monitoreo ecológico y social de su expansión bajo un enfoque de gestión adaptativa y preventiva.	

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	- Fecha: 01 - 30 de octubre Noviembre Se elaboró e documento "Propuesta de manejo, control y monitoreo de *Leucaena leucocephala*, en las regiones ambientales de Sabana y San Jorge, del departamento de Córdoba" - Fecha: 01 – 30 noviembre de 2025	
Identificación y seguimiento de áreas de presencia de la especie caracol gigante africano (*Achatina fulica*) en los municipios de Montería y Sahagún.	Julio Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025 Agosto Se realizaron acciones de seguimiento de puntos con presencia de caracol africano en 9 puntos (6 en Montelíbano, 2 en Montería, 1 en Sahagún). Se identificó un nuevo punto de presencia de caracol gigante africano en la I.E. Mercedes Abregó, en la Sede Las Colinas. - Fecha: 01 – 30 agosto de 2025 Septiembre Se identificaron tres nuevos puntos de presencia de la especie (1 en el municipio de Montería y 2 en el municipio de Montelíbano).	100%

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	- Fecha: 01 – 30 septiembre de 2025 Octubre Se llevó a cabo una visita formal a la Secretaría de Salud municipal con el fin de conocer y revisar los reportes existentes sobre la presencia del caracol africano en la jurisdicción. Se encontraron restos de conchas de caracol africano alrededor del dispensario del batallón, zona previamente reportada por su presencia; sin embargo, actualmente no se observan ejemplares vivos debido al mantenimiento constante del lugar y la ausencia de maleza. - Fecha: 01 – 31 de octubre de 2025 Noviembre El 28 de octubre y el 20 de noviembre, se realizaron jornadas de control del caracol africano (*Lissachatina fulica*) en diferentes barrios del municipio de Montelíbano, con el apoyo de miembros de la Defensa Civil y de la Secretaría de Salud municipal. Este municipio presenta las mayores infestaciones en comparación con los demás municipios en estudio. Las actividades de control se realizaron en nueve barrios, donde se recolectaron un total de 73 kilogramos, incluyendo caracoles vivos y conchas secas. Adicionalmente, se entregaron ocho kits para el control del caracol en las viviendas más afectadas; cada kit contenía un balde, cal, sal y elementos de protección personal (EPP). - Fecha: 01 – 30 noviembre de 2025	
Identificación de áreas de presencia de la especie hormiga loca (*Nylanderia fulva*) en los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo.	Julio Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de	100%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025 --- <u>Agosto</u> Se realizaron 4 visitas de seguimiento (3 en estaciones del municipio de Sahagún y 1 en Pueblo Nuevo. - Fecha: 01 – 30 agosto de 2025 --- <u>Septiembre</u> Se realiza monitoreo en las 5 parcelas establecidas (veredas Villa Esperanza (2), Santiago Abajo, El Crucero, La Corocita). - Fecha: 01 – 30 septiembre de 2025 --- <u>Octubre</u> Se realiza monitoreo en las 5 parcelas establecidas (veredas Villa Esperanza (2), Santiago Abajo, El Crucero, La Corocita), y, se realizan acciones de identificación y verificación de nuevos puntos con presencia de Nylanderia fulva. Con el propósito de cuantificar la abundancia poblacional, se implementó la metodología propuesta por el ICA, que consiste en la instalación de 20 trampas (vasos plásticos de 12 oz con salchicha en rodajas adentro) dispuestas en forma de "S" dentro de una hectárea. Dichas trampas fueron instaladas en horas de la mañana y permanecieron activas durante un periodo de 40 minutos. Posteriormente, se procedió a la recolección y sacrificio de los especímenes capturados mediante la aplicación de alcohol al 70%, para	

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	un porterior conteo de individuos, obteniendo como resultado alta densidad poblacional según los valores de referencia del ICA. - Fecha: 01 – 31 octubre de 2025 Noviembre Se realizan análisis de efectividad de los metodos de control químico utilizados en los últimos tres años y de la periodididad de los mismos, identofocando como limitantes el cambio de producto químico cada año por regulaciones ambientales, el efecto de control inmediato (medido a los 15 días según bibliografía) y el periodo de recuperación de la especie (entre 2 y 3 meses, según reportes de la comunidad).	
Implementación de medidas de control y manejo de la especie hormiga loca (*Nylanderia fulva*) en los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo.	Julio Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025 Agosto No se realizaron medidas de manejo y control en este periodo, ya que primero se debía ejecutar acciones de identificación, verificación y seguimiento. - Fecha: 01 – 30 agosto de 2025 Septiembre No se realizaron medidas de manejo y control	100%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	en este periodo, ya que primero se debía ejecutar acciones de identificación, verificación y seguimiento. - Fecha: 01 – 30 de septiembre --- Octubre Se aplicó el método de control químico, en las 5 parcelas establecidas y monitoreadas, debido a la alta densidad poblacional registrada de la especie invasora. Para la aplicación de las medidas de control en nuevos puntos de presencia, se realizó la evaluación de áreas afectadas localizadas en las proximidades de viviendas y en zonas de transición entre sectores infestados y no infestados. Esta revisión permitió delimitar los bordes de infestación y priorizar los sitios de intervención para la aplicación del control químico. - Fecha: 01 – 31 de octubre --- Noviembre Se realizan análisis de efectividad de los metodos de control químico utilizados en los últimos tres años y de la periodididad de los mismos, identofocando como limitantes el cambio de producto químico cada año por regulaciones ambientales, el efecto de control inmediato (medido a los 15 días según bibliografía) y el periodo de recuperación de la especie (entre 2 y 3 meses, según reportes de la comunidad). Se realizan 3 aplicaciones (cubrimiento de 3 hectáreas) en tres fincas de la vereda El Orgullo, del municipio de Sahagún. - Fecha: 01 – 30 noviembre de 2025	
Acciones de educación ambiental implementadas para el manejo de especies invasoras como la hormiga loca y caracol gigante africano.	Julio Se realizó contratación del equipo de	100%

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025 --- <u>Agosto</u> Se realizaron 2 jornadas de divulgación sobre diversos aspectos de la especie (*A. fulica*), en las I.E. Guillermo Valencia y Mercedes Abrego – Las Colinas, con una asistencia total de 71 personas. - Fecha: 01 – 30 agosto de 2025 --- <u>Septiembre</u> Se desarrollaron jornadas de divulgación en los municipios de Montería y Sahagún, dirigidas a instituciones educativas y a la comunidad en general. Se estableció contacto con directivos de instituciones educativas y representantes de la comunidad para facilitar el reconocimiento de las especies, por medio de material divulgativo. La participación en los eventos de cada una de las especies fue de 230 para caracol gigante africano, y 123 para hormiga loca. - Fecha: 01 – 30 septiembre de 2025 --- <u>Octubre</u> Se realizaron 9 jornadas de divulgación orientadas a la sensibilización y manejo de caracol gigante africano. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación	

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	con instituciones educativas y miembros de la comunidad sobre hormiga loca. Se tienen las primeras versiones de los videos para redes de las dos especies invasoras. - Fecha: 01 – 30 septiembre de 2025 --- <u>Noviembre</u> Se realizan 2 joradas de divulgación sobre homiga loca en la vereda El crucero del municipio de Sahagún, y en la Alcaldía de Pueblo Nuevo, con la participación de 74 ersonal, para un total de participantes en eventos de divulgación sobre esta especie de 205 personas. Se realizan ajustes a los dos videos para redes de especies invasoras, solicitados por el área de comunicaciones de CVS. Se tiene la notificación telefoónica del OK de los videos y de la inclusión en la parrilla de contenidos de la CVS. - Fecha: 01 – 30 noviembre de 2025	
Videoclip resumen de actividades del proyecto en formato HD, de máximo 5 minutos.	<u>Julio</u> Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025 --- <u>Agosto</u> Se realizó taller virtual sobre uso de equipos y especificaciones técnicas para lo toma de imágenes, que serán insumo del video final.	100%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Se realizó un primer borardor del guión del video y se envió al área de comunicaciones de la CVS para revisión y visto bueno. - Fecha: 01 – 30 agosto de 2025 Septiembre Se empieza la toma de imágenes fotográficas y videográficas de los diferentes componentes, como galería de apoyo para la edición final del video. - Fecha: 01 – 30 septiembre de 2025 Octubre Se avanza en la versión final del guíon de cada componente y se da inicio al proceso de edición. - Fecha: 01 – 31 octubre de 2025 Noviembre Se continua con elproceso de edición final del video del convenio. - Fecha: 01 – 30 noviembre de 2025 Diciembre Se entrega versión final del video del convenio. - Fecha: 01 – 30 diciembre de 2025	

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: **$398.500.000**

VALOR ANTICIPO: **$140.000.000**
% AVANCE FINANCIERO: **100%**

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	21/08/2025	$140.000.000				$140.000.000		
ACTA 01	11/11/2025	$105.000.000				$105.000.000		
ACTA FINAL	30/12/2025	$105.000.000					$105.000.000	

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
- Registro mensual de afiliación y cobertura de ARL y Seguridad social para trabajadores y contratistas. - Elementos de protección personal	- Certificados vigentes - Uso de elementos de protección personal (EPP) en el desarrollo de actividades diarias	Se cuenta con los respectivos soportes documentales


VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Componente 1.**



Individuo perteneciente a una de las tropas de Cebus capucinus que se registraron en el área de estudio definitiva

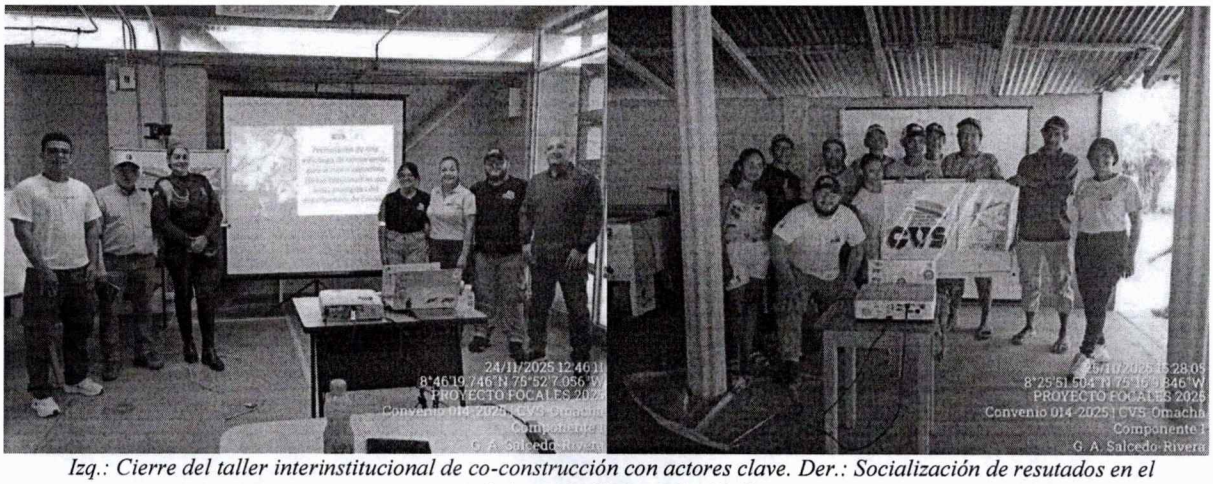

Izq.: Cierre del taller interinstitucional de co-construcción con actores clave. Der.: Socialización de resutados en el corregimiento de Cintura, Pueblo Nuevo

- **Componente 2.**




Registros de nutria neotropical en Caño Ferez, departamento de Córdoba.




Socialización de resultados en los municipios de San Bernardo del Viento y San Antero, departamento de Córdoba.

- **Componnete 3.**

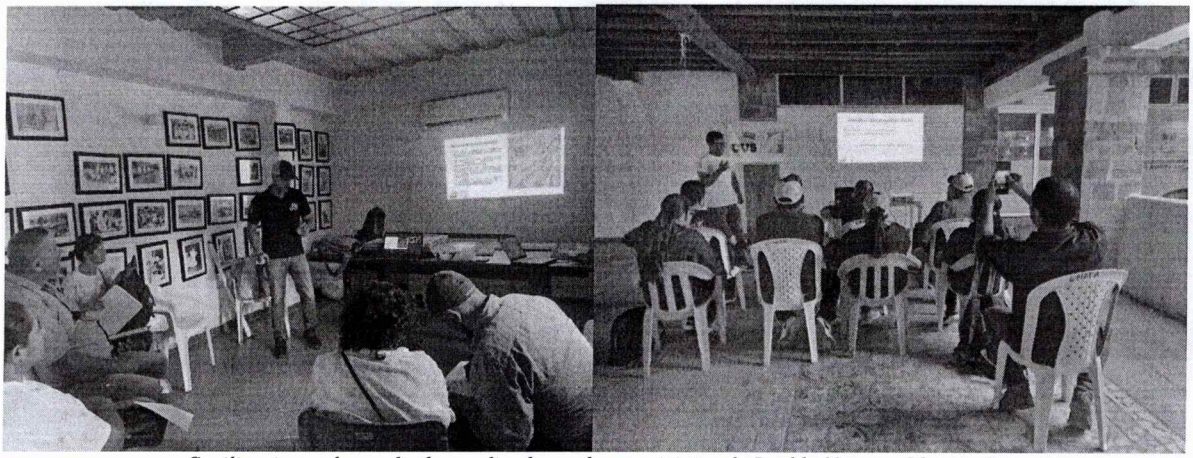


Socilizaciones de resultados realizadas en los municipios de Pueblo Nuevo y Planeta Rica

- **Componente 4.**

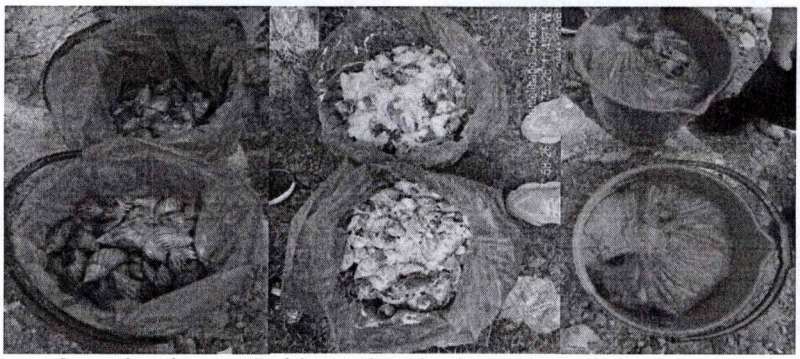

Caracoles africanos (L. fulica) colectados durante las jornadas de control.

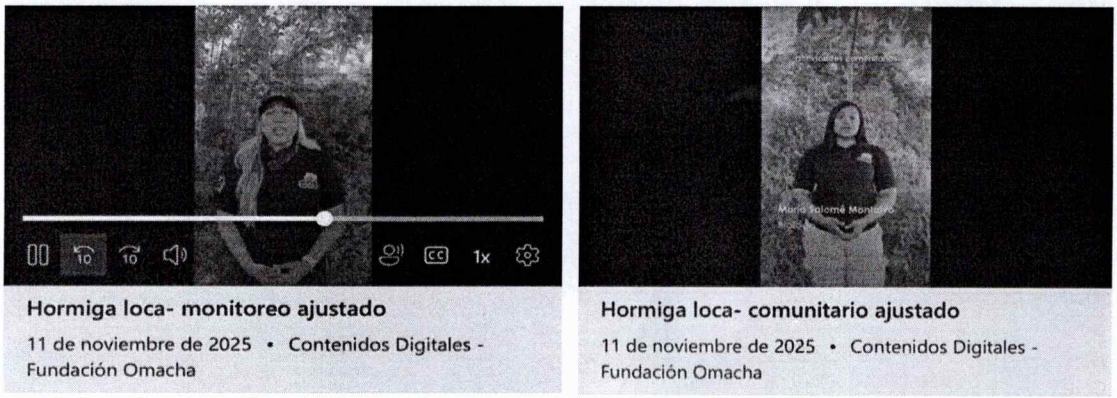

Imágenes de los videos para redes sobre hormiga loca.

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- **Porcentaje de avance: 100%**
- Todas las actividades programadas para el mes de octubre, para los cuatro componentes se han realizado en su totalidad.

Recomendaciones:

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los treinta (30) día del mes de diciembre del año 2025 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Supervisor CVS

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Diciembre 30 de 2025
