Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.

LA ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY, SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 2229-2025, REMITE A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGECONSULTA SAS NIT. 829.000.737-7	CONTRATO No. 2229 - 2025

DETALLE:

PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD:
○ ACTA RECIBO FINAL ● ACTA DE LIQUIDACIÓN

OTRA: _____

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Item	Descripcion del documento	FOLIOS		OBSERVACIONES
		Inicio	Final	
1	ACTA DE LIQUIDACIÓN	1	4	
2	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5	7	
3	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DEL CONTADOR	8	10	
4	INFORME FINAL	1868 Folios		Se entrego con el acta de recibo Final

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

RECIBIDO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA OFICINA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Item	Descripcion del documento	FOLIOS		OBSERVACIONES
		Inicio	Final	
1	FACTURA	1	1	
2	CERTIFICACIÓN BANCARIA	2	2	
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN	3	6	
4	COPIA DEL ACTA DE RECIBO	7	9	
5	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10	12	
6	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DEL CONTADOR	13	15	

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

○ CUENTA DE COBRO

○ ACTA RECIBO FINAL ○ LIQUIDACIÓN

OTRO: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

INGECONSULTA SAS

NIT: 829.000.737-7 DIR: Calle 50 N. 19-77 B. Colombia Barrancabermeja

Tel.: 6010454 correo: ingeconsultanotificaciones@hotmail.com
Responsable de IVA CIIU 7110

Factura electrónica de venta
No. FEN380

Resolución DIAN: 18764009931508. Prefijo: FEN. Rango: 361 al 500. Vigencia: 9/10/2025 hasta 9/10/2026.

INFORMACION DEL CLIENTE

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NIT No. : 890201900-6

DIRECCION : PALACIO MUNICIPAL CARRERA 5A N50-43

TELEFONO : 6115555

CIUDAD : BARRANCABERMEJA **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
29/12/2025	$ 73.211.946,00
VENDEDOR	
-	
FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
31/12/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41309501	ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO No.2229-2025, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ALEDAÑAS AL MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTÍ JARAMILLO, COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	$ 61.522.643,70

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 61.522.643,70
IVA liquidado 19%	$ 61.522.643,70	19%	$ 11.689.302,30
VALOR TOTAL :			$ 73.211.946,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 31/12/2025	$ 73.211.946,00

VALOR (en letras) : SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Factura a crédito, plazo hasta 31/12/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

LD7R6jNmPs8FPsJw4y2VACkC7ATVE/ux/Na14kUXATk6gr6jR1mC2z20YyDMFHxaNpbYwSf8zQtLxIG+FqxZjeBLqq6yXgasF2qXr+nMQriUXQprj/JxOAC5v7u
Fr4slp7U9QURkLXN53UJyh4CZnz/w8zRvfAKU9ZNzrhAXoa2WDMYZw5jBcGY2lk+574VJzdAFJ+4Kr5//hX/ZvfT8/UuLHaWfsWy4wKANPt9ko5Ah72TykHNM/
NM2cxzpPaMoQrRF0GKhKCTlxrqNSmnxTCSNnnqawpEAMRogfUemhpUr/y2BAeKKOJHDNgjueyRs8Z8E/3xHAUAUO43JN95o4w==

CUFE: cf449ce96098790177e784f8ff5cbd728d3c46622c35cf5b34d04781264f3816a04ddd69686709dc6f7d7dbd90c22e1c

Fecha emisión: 2025-12-29 16:37:50 **Fecha validación DIAN:** 2025-12-29 16:37:55-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Certificado
Bancario

29 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGECONSULTA S.A.S identificado(a) con NIT 829000737, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	30637224925	2015/01/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

CONTRATO	2229 – 2025
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	INGECONSULTA SAS
NIT	829.000.737-7
REP LEGAL	HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-004-2025
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ALEDAÑAS AL MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTÍ JARAMILLO, COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
VALOR	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($486.785.404).
DURACIÓN	TRES (03) MESES
SUPERVISION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPIN 202500000018386
RUBRO PRESUPUESTAL	(I) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación RECURSOS PROPIOS por valor de $6.566.048; (II) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación SGP-OTROS SECTORES-RECURSOS DEL BALANCE por valor de $370.304.392; (III) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP-OTROS SECTORES por valor de $109.914.963; (IV) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación REINTEGROS DE SGP OTROS SECTORES-RECURSOS DEL BALANCE por valor de $1.00. (V) 2.3-24-2402-0600-2402118-08- 2.3.2.02.02.008 POR CONCEPTO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS PROPIOS por un valor de $203.553.094,00
ADICIONAL N°1 EN VALOR Y N°1 EN PLAZO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR UN VALOR DE DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUNTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($203.553.094,00) Y POR UN PLAZO DE UN(01) MES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25 – 03641 del 06 de junio del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25 – 05353 del 24 de julio del 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION N°1	25-08919 del 27 de noviembre de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL N°1	25-10116 del 28 de noviembre de 2025
CEPPA No.	2859 del 6 de junio del 2025
ACTA DE SUSPENSION N°1	24 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE PRORROGA N°1 A LA SUSPENSION N°1	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICION N°1	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.17522435 del 29 de julio del 2025

En Barrancabermeja, a los treinta (30) días del mes de Diciembre 2025, se reunieron las partes a saber: La Secretaria de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cedula de ciudadanía No 37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, que mediante Acto Legislativo 01 de Julio de 2019 que otorgó la Categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al Municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT N°. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto número 106 de marzo de 2025; y quien para los efectos de este contrato se denominará de EL DISTRITO CONTRATANTE y HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES, representante legal del contratista cuya firma es INGECONSULTA SAS, con el fin de suscribir la presente Acta final y de liquidación, la cual tiene vigencia a partir de la fecha.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato fue suscrito por las partes el día 23 de julio del 2025.
2. Que la ejecución del contrato No. 2229 – 2025, inicio el día veintinueve (29) de julio del 2025.
3. Nuestra supervisión certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo y personal mínimo con lo correspondiente a la oferta presentada por el contratista de obra.
4. Nuestra supervisión revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista de obra, con base en los soportes presentados por éste.
5. La presente acta se elabora de acuerdo a las cantidades ejecutadas en campo, y el periodo de ejecución fue del 09 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025.
6. Que se autoriza el pago de la presenta acta que se relaciona a continuación y cuyo anexo de adjunta:

CERTIFICACIÓN

El supervisor del contrato y el contratista **CERTIFICAN** que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la Unidad de contabilidad y de Tesorería para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al contrato de consultoría No. 2229-2025 a nombre de **INGECONSULTA SAS.**

ESTADO DE LAS GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTIRIA No 2229-2025

PÓLIZAS POR LEGALIZACIÓN DE CONTRATO

DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	CUBRIMIENTO	VIGENCIAS
A) Garantía única			
Cumplimiento	CMB-100000433 ANEXO 0	$97.517.080,80	23/07/2025 a 22/04/2026
Salarios, prestaciones	CMB-100000433 ANEXO 0	$48.758.540,40	23/07/2025 a 22/10/2028
Calidad del servicio	CMB-100000433 ANEXO 0	$8.572.619,20	27/10/2025 a 27/05/2026
Responsabilidad civil extracontractual	CMB-100000170 ANEXO 0	$284,700,000.00	23/07/2025 a 22/10/2025

POLIZAS POR INICIO DE CONTRATO

DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	CUBRIMIENTO	VIGENCIAS
A) Garantía única			
Cumplimiento	CMB-100000433 ANEXO 2	$97.517.080,80	29/07/2025 a 28/04/2026
Salarios, prestaciones	CMB-100000433 ANEXO 2	$48.758.540,40	29/07/2025 a 28/10/2028
Calidad del servicio	CMB-100000433 ANEXO 2	$8.572.619,20	29/07/2025 a 28/04/2026
Responsabilidad civil extracontractual	CMB-100000170 ANEXO 2	$284,700,000.00	29/07/2025 a 28/10/2025

POLIZAS POR ACTA DE RECIBO FINAL

DESCRIPCIÓN	PÓLIZA	CUBRIMIENTO	VIGENCIAS
A) Garantía única			
Cumplimiento	CMB-100000433 ANEXO 7	$138.067.699,60	27/12/2025 a 29/06/2026
Salarios, prestaciones	CMB-100000433 ANEXO 7	$69.033.849,80	27/12/2025 a 29/12/2028
Calidad del servicio	CMB-100000433 ANEXO 7	$138.067.699,60	27/12/2025 a 29/06/2026
Responsabilidad civil extracontractual	CMB-100000170 ANEXO 7	$284,700,000.00	29/07/2025 a 29/12/2025

VALOR Y FORMA DE PAGO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: El valor final del contrato: SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 690.338.498,00)

CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. El 90% del valor del contrato se pagará en actas parciales y el respectivo informe recibido a satisfacción del DISTRITO con los productos recibidos, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución del contrato objeto de la consultoría así:

a) Actas de avance parcial: El valor del contrato se pagará mediante actas de pago parciales a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentación de las respectivas actas de avance e informe de ejecución de obra aprobado por el supervisor.
b) Acta de pago final: El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará una vez realizado el recibo final a satisfacción y la liquidación del contrato y los soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.

FACTURA

El contratista INGECONSULTA SAS 2025, allegará a la Secretaría de Infraestructura, Factura de venta, por valor de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 73.211.946,00)

VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN

La presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, servirá como fundamento para el cobro del pago final por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 73.211.946,00)

Con la suscripción de la presenta ACTA DE LIQUIDACIÓN y documentos anexos, se autoriza el pago FINAL del Contrato de obra No. 2229-25, correspondiente al 10,6 % de las actividades ejecutadas, el porcentaje y valor a cancelar, se relaciona en el siguiente cuadro:

RELACION DE PAGOS

CONCEPTO	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL No. 01	11 de agosto del 2025	$ 240.333.996,00	34,81 %	0,00	$ 240.333.996,00
ACTA PARCIAL No. 02	2 de septiembre del 2025	$ 153.712.949,00	22,27 %	0,00	$ 153.712.949,00
ACTA PARCIAL No. 03	22 de octubre de 2025	$ 32.626.808,00	4.73%	0,00	$ 32.626.808,00
ACTA PARCIAL No. 04	9 de diciembre de 2025	$ 190.452.799,00	27,59%	0,00	$ 190.452.799,00
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	29 de diciembre de 2025	$73.211.946,00	10,61%	0,00	$73.211.946,00

Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente autorizar el pago por valor de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS **($ 73.211.946,00),** al contratista INGECONSULTA SAS, identificado con NIT. 829.000.737-7**;** correspondiente al 10,61 % del valor total del Contrato y correspondiente al periodo del **09 DE DICIMEBRE DEL 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025**; los cuales se cargarán al rubro 2.3-24-2402-0600-2402118-08- 2.3.2.02.02.008 POR CONCEPTO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS PROPIOS por un valor de $203.553.094,00 . **Valor neto a pagar: $ 73.211.946,00**; contemplado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 25 – 03641 del 06 de junio del 2025, CEPAA No. 2859 del 6 de junio del 2025 y registro presupuestal No. 25 – 05353 del 24 de julio del 2025 y certificado de disponibilidad presupuestal No. 25 – 08919 del 27 de noviembre del 2025, CEPAA No. 7489 del 25 de noviembre del 2025 y registro presupuestal No. 25 – 10116 del 28 de noviembre del 2025

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Secretaría Distrital de **Infraestructura**

A continuación, se presenta la relación de rubros presupuestales y pagos realizados

RELACION RUBROS PRESUPUESTALS Y CUENTAS DE COBRO								
RUBRO PRESUUESTAL	VALOR	CUENTA N.01	CUENTA N.02	CUENTA N.03	CUENTA N.04	CUENTA FINAL Y DE LIQUIDACION	SALDO	PAGADO
2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación RECURSOS PROPIOS	$ 6.566.048				$ 6.566.048		$ 0,00	$ 6.566.048,00
2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación SGP-OTROS SECTORES-RECURSOS DEL BALANCE	$ 370.304.392	$ 240.333.996,00	$ 129.970.396,00				$ 0,00	$ 370.304.392,00
2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP-OTROS SECTORES	$ 109.914.963		$ 23.742.553,00	$ 32.626.808,00	$ 53.545.602,00		$ 0,00	$ 109.914.963,00
2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación REINTEGROS DE SGP OTROS SECTORES-RECURSOS DEL BALANCE	$ 1,00				$ 1,00		$ 0,00	$ 1,00
2.3-24-2402-0600-2402118-08- 2.3.2.02.02.008 POR CONCEPTO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS PROPIOS	$ 203.553.094				$ 130.341.148,00	$ 73.211.946,00	$ 0,00	$ 203.553.094,00
	$ 690.338.498	**$ 240.333.996,00**	**$ 153.712.949,00**	**$ 32.626.808,00**	**$ 190.452.799,00**	**$ 73.211.946,00**	**$ 0,00**	**$ 690.338.498,00**

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja a los 30 dias del mes de diciembre de 2025

HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
Representante Legal
INGECONSULTA SAS

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Contratante:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	Periodo del Acta:	9 de diciembre al 27 de diciembre de 2025
Contratista:	INGECONSULTA SAS	Fecha del Acta:	30 de diciembre de 2025
		VALOR DEL CONTRATO	$ 690.338.498,00
Plazo inicial:	Tres Meses	VALOR DEL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN	$ 73.211.946,00
Fecha de inicio:	29 de Julio 2025	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA	10,61%
Fecha final:	29 de diciembre 2025	PORCENTAJE A COBRAR	10,61%
		PORCENTAJE ACUMULADO	100,00%

INGECONSULTA SAS
INGENIERIA CIVIL

CONDICIONES CONTRACTUALES						Acta parcial N° 1		Acta parcial N°2		Acta parcial N°3		Acta parcial N°4		Acta final y de liquidación		Acumulado total		Saldo total	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR COSTO TOTAL DIRECTO	CANTIDAD	VALOR COSTO TOTAL DIRECTO	CANT	VALOR	CANT	VALOR					CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.1	Exploración Geotécnica y Geofísica																		
1.1.1	Perforación con barreno motorizado hasta 10 metros de profundidad o hasta alcanzar rechazo	ML	90	$ 704.666,00	$ 63.419.940,00	90	$ 63.419.940,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	90	$ 63.419.940,00	0	$ 0,00
1.1.2	Perforación con equipo de rotación dentro de zona de humedal o no, con recuperación de muestra.	ML	150	$ 845.710,00	$ 126.856.500,00	150	$ 126.856.500,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	150	$ 126.856.500,00	0	$ 0,00
1.1.3	Apiques con recuperación CBR hasta 1.50 mstros de profundidad	Und	8	$ 509.633,00	$ 4.077.064,00	0	$ 0,00	8	$ 4.077.064,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	8	$ 4.077.064,00	0	$ 0,00
1.1.4	Límites de Atterberg	Und	38	$ 45.164,00	$ 1.716.232,00	0	$ 0,00	38	$ 1.716.232,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	38	$ 1.716.232,00	0	$ 0,00
1.1.5	Granulometría por mallas con lavado sobre tamiz 200	Und	38	$ 37.440,00	$ 1.422.720,00	0	$ 0,00	38	$ 1.422.720,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	38	$ 1.422.720,00	0	$ 0,00
1.1.6	Humedad natural	Und	38	$ 10.770,00	$ 409.260,00	0	$ 0,00	38	$ 409.260,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	38	$ 409.260,00	0	$ 0,00
1.1.7	Peso unitario	Und	10	$ 22.592,00	$ 225.920,00	0	$ 0,00	10	$ 225.920,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10	$ 225.920,00	0	$ 0,00
1.1.8	Compresión inconfinada en suelos	Und	12	$ 128.848,00	$ 1.546.176,00	0	$ 0,00	12	$ 1.546.176,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	12	$ 1.546.176,00	0	$ 0,00
1.1.9	Corte directo en suelos	Und	12	$ 307.259,00	$ 3.687.108,00	0	$ 0,00	12	$ 3.687.108,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	12	$ 3.687.108,00	0	$ 0,00
1.1.10	Ensayo de Consolidación	Und	10	$ 440.003,00	$ 4.400.030,00	0	$ 0,00	10	$ 4.400.030,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10	$ 4.400.030,00	0	$ 0,00
1.1.11	Líneas Refracción Sísmica Método MASW y REMI	Und	3	$ 5.788.042,00	$ 17.364.126,00	0	$ 0,00	3	$ 17.364.126,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3	$ 17.364.126,00	0	$ 0,00
1.1.12	Ensayo CBR en muestra inalterada	Und	8	$ 125.000,00	$ 1.000.000,00	0	$ 0,00	8	$ 1.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	8	$ 1.000.000,00	0	$ 0,00
SUBTOTAL EXPLORACION GEOTECNICA					$ 226.125.076,00		$ 190.276.440,00		$ 35.848.636,00		$ 0,00						$ 226.125.076,00		$ 0,00
1.2	Entregables y estudios																		
1.2.1	Topografía																		
1.2.1.1	Levantamiento Topográfico Georreferenciado (Incluye planos, puntos de control e informes)	Und	1	$ 11.684.901,00	$ 11.684.901,00	1	$ 11.684.901,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 11.684.901,00	0	$ 0,00
1.2.1.2	Ortomosaico	Und	1	$ 7.232.740,00	$ 7.232.740,00		$ 0,00	1	$ 7.232.740,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 7.232.740,00	0	$ 0,00
1.2.2	Informe de Estudio de suelos y Geotécnico	Und	1	$ 14.213.375,00	$ 14.213.375,00		$ 0,00	1	$ 14.213.375,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 14.213.375,00	0	$ 0,00
1.2.3	Estudio lineamiento ambiental	Und	1	$ 24.458.308,00	$ 24.458.308,00		$ 0,00	1	$ 24.458.308,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 24.458.308,00	0	$ 0,00
1.2.4	Estudio catastral	Und	1	$ 12.630.196,00	$ 12.630.196,00		$ 0,00	1	$ 12.630.196,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 12.630.196,00	0	$ 0,00
1.2.5	Diseño geométrico de vía	Und	1	$ 14.787.290,00	$ 14.787.290,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 14.787.290,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 14.787.290,00	0	$ 0,00
1.2.6	Diseño de Pavimento	Und	1	$ 12.630.196,00	$ 12.630.196,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 12.630.196,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 12.630.196,00	0	$ 0,00
1.2.7	Estudio Hidrológico e Hidráulico	Und	1	$ 14.787.290,00	$ 14.787.290,00		$ 0,00	1	$ 14.787.290,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 14.787.290,00	0	$ 0,00
1.2.8	Diseño de alcantarillado pluvial y obras hidráulicas	Und	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00		$ 0,00	1	$ 20.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 20.000.000,00	0	$ 0,00
1.2.9	Diseño eléctrico de alumbrado público para certificar RETIE Y RETILAP	Und	1	$ 18.464.937,00	$ 18.464.937,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 18.464.937,00		$ 0,00	1	$ 18.464.937,00	0	$ 0,00
1.2.10	Diseño estructural	Und	1	$ 25.016.602,00	$ 25.016.602,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 25.016.602,00		$ 0,00	1	$ 25.016.602,00	0	$ 0,00
1.2.11	Presupuesto de obra y Especificaciones técnicas	Und	1	$ 7.032.454,00	$ 7.032.454,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 7.032.454,00	1	$ 7.032.454,00	0	$ 0,00
SUBTOTAL ENTREGABLES POR COMPONENTES					$ 182.938.259,00		$ 11.684.901,00		$ 93.321.999,00		$ 27.417.486,00		$ 43.481.539,00		$ 7.032.454,00		$ 182.938.259,00		$ 0,00
1.3	Entregables y estudios No Previstos																		
1.3.1	Diseño arquitectonico,urbanistico y paisajistico	Und	1	$ 43.631.000,00	$ 43.631.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 43.631.000,00		$ 0,00	1	$ 43.631.000,00	0	$ 0,00
1.3.2	Diseño de estructura de paso(Ponton)	Und	1	$ 37.118.860,00	$ 37.118.860,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 37.118.860,00		$ 0,00	1	$ 37.118.860,00	0	$ 0,00
1.3.3	Diseño de señalizacion y control vial	Und	1	$ 26.887.290,00	$ 26.887.290,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1	$ 26.887.290,00		$ 0,00	1	$ 26.887.290,00	0	$ 0,00
1.3.4	Plan de manejo de transito	Und	1	$ 18.787.470,00	$ 18.787.470,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 18.787.470,00	1	$ 18.787.470,00	0	$ 0,00
1.3.5	Avaluo de predios a intervenir	und	10	$ 4.462.840,00	$ 44.628.400,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2	$ 8.925.680,00	8,00	$ 35.702.720,00	10	$ 44.628.400,00	0	$ 0,00
SUBTOTAL ENTREGABLES POR COMPONENTES NO PREVISTOS					$ 171.053.020,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 116.562.830,00		$ 54.490.190,00		$ 171.053.020,00		$ 0,00
VALOR TOTAL					$ 580.116.385,00		$ 201.961.341,00		$ 129.170.545,00		$ 27.417.486,00		$ 160.044.369,00		$ 61.522.644,00		$ 580.116.385,00		$ 0,00
IVA(19%)				19%	$ 110.222.113,00		$ 38.372.655,00		$ 24.542.404,00		$ 5.209.322,00		$ 30.408.430,00		$ 11.689.302,00		$ 110.222.113,00		$ 0,00
VALOR TOTAL CON IVA					$ 690.338.498,00		$ 240.333.996,00		$ 153.712.949,00		$ 32.626.808,00		$ 190.452.799,00		$ 73.211.946,00		$ 690.338.498,00		$ 0,00

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
Representante Legal
INGECONSULTA SAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000737
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INGECONSULTA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 50 NO 19-77	TELÉFONO:	6023761
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	ING 1 - ING 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6000203823	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2023316275

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400,000	$ 0	$ 400,000
SUBTOTALES:										**$ 400,000**	**$ 0**	**$ 400,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 100,000
SUBTOTALES:													**$ 100,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 100,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 174,000	$ 174,000	$ 0	$ 0	$ 174,000
SUBTOTALES:									**$ 174,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 174,000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF38	CCF38-CAFABA	1	$ 100,000	$ 0	$ 100,000
SUBTOTALES:			**$ 100,000**	**$ 0**	**$ 100,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79419365	FLOREZ OLIVARES HERNAN DAVID	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2,500,000	$829000737	$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF38-CAFABA	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 774.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000737
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGECONSULTA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 50 NO 19-77	TELÉFONO:	6023761
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	ING 1 - ING 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6000129518	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2023303521

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 113.900
SUBTOTALES:										$ 113.900	$ 0	$ 113.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:													$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 28.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.800	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 3.800
SUBTOTALES:									$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 3.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF38	CCF38-CAFABA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			$ 28.500	$ 0	$ 28.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																											PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1096538570	PINEDA SANTOS IVAN SALVADOR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	15																	230201-PROTECCION	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 711.750	829000737	$ 3.800	15	$ 711.750	CCF38-CAFABA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 174.700

planilla pagada
Planilla Pagada

INGECONSULTA S.A.S
INGENIERIA CIVIL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

REFERENCIA: CERTIFICACACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Los suscrito, Hernán David Flórez Olivares de Representante Legal de **INGECONSULTA SAS** y María Elena Amaya Rios en Calidad de contador de la **INGECONSULTAS,** empresa que se encuentra ejecutando el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2229-2025 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ALEDAÑAS AL MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTÍ JARAMILLO, COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

Nos permitimos certificar que la empresa ha cancelado la seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al periodo de ejecución de los trabajos Acta Final y de Liquidación.

Dada en Barrancabermeja a los cinco (29) días del mes de Diciembre de 2025

Hernán David Flórez Olivares
Rep. Legal
Ingeconsulta

María Elena Amaya Ríos
Contador Publico
TP139290-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ELENA AMAYA RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63555505 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 139290-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

139290-T



MARIA ELENA
AMAYA RIOS
C.C. 63555505
RES. INSCRIPCION 10 DEL 12/02/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282649 **149086**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.555.505**

AMAYA RIOS

APELLIDOS

MARIA ELENA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-AGO-1984**

AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-DIC-2002 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2701900-00317447-F-0063555505-20110729 0027597989A 1 7151359218

INFORME ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
CONTRATO N° 2229 2025



OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ALEDAÑAS AL MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTÍ JARAMILLO, COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

CONTRATISTA:
INGECONSULTA SAS

ING. HERNÁN DAVID FLÓREZ OLIVARES
R/L INGECONSULTA SAS

INGECONSULTA S.A.S
INGENIERIA CIVIL

BARRANCABERMEJA, SANTANDER
DICIEMBRE 2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 3
3. CONDICIONES GENERALES 4
4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 2229-2025 4
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS 9

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados de las actividades del contratista realizadas en el marco del proyecto del contrato No. 2229-2025 que tiene por objeto: "**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ALEDAÑAS AL MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTÍ JARAMILLO, COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.**", desarrollado en el Distrito de Barrancabermeja.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y conforme al cronograma de ejecución establecido, el contratista presenta el presente Informe de Avance de la Consultoría, en el cual se describen las actividades técnicas desarrolladas durante el período evaluado. Dichas actividades han sido ejecutadas de acuerdo con los lineamientos normativos vigentes, las especificaciones del contrato y los requerimientos de la supervisión, garantizando calidad, precisión técnica y coherencia con los objetivos del proyecto.

Durante el periodo reportado se avanzó en la elaboración y desarrollo de los siguientes componentes de la consultoría: Presupuesto, apus , especificaciones técnicas , memorias de cantidades , plan de manejo de transito y se continuo con los avalúos restantes

De esta manera, las actividades adelantadas en el periodo contribuyen al cumplimiento final de los objetivos técnicos del proyecto, validación y aprobación de los diseños por parte de la entidad contratante.

2. OBJETIVOS

Objetivo general:


Llevar a cabo la correcta ejecución de los estudios de suelos y Mejorar la conectividad vial en la zona del megacolegio, facilitando el acceso tanto para los habitantes como de los usuarios del centro educativo y áreas circundantes. Verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas vigentes y condiciones contractuales, con el fin de garantizar la estabilidad, seguridad y funcionalidad de las infraestructuras proyectadas.

Objetivos específicos:

- Realizar los estudios y diseños que permitan la construcción de la infraestructura vial que facilite el acceso a la comunidad educativa alrededor del Mega Colegio Juan Francisco Sarasti de la comuna 3 del Distrito de Barrancabermeja.

- Diseñar las soluciones viales y peatonales que optimicen la movilidad, seguridad y accesibilidad para estudiantes, docentes y comunidad, garantizando el cumplimiento de las normas técnicas, de tránsito y de accesibilidad universal vigentes.
- Efectuar levantamientos topográficos, estudios de tránsito, geotécnicos e hidráulicos que permitan obtener la información técnica necesaria para definir las condiciones actuales y los requerimientos de la infraestructura vial y peatonal del sector.

3. CONDICIONES GENERALES

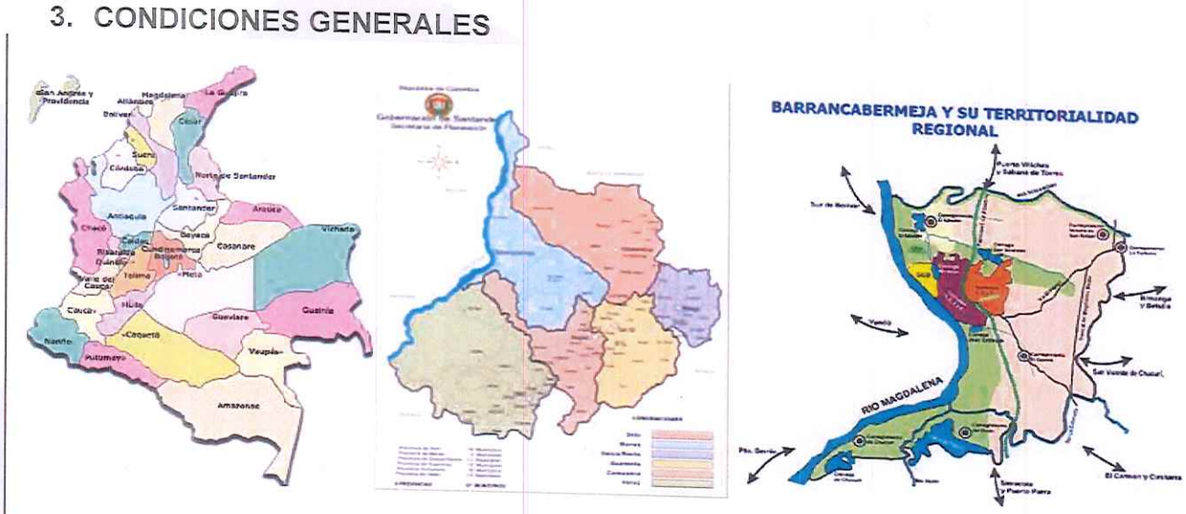

AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

El barrio Colinas del Norte, ubicado en la Comuna 3 de Barrancabermeja, se encuentra entre la vía férrea y la carrera 36 (vía al Llanito), cerca del actual Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF). Limita con los barrios Colinas del Sur, Torres Colinas del Norte, Jerusalén y Belén.

Ubicación del Proyecto: Barrio Colinas del Norte, Barrancabermeja, Santander.

Coordenadas:

N: 7°4'49,84"

O: 73°50'39,33"

Cantidad aproximada de metros: 700m (Aproximado)

Imagen 1. Localización general del proyecto

4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 2229-2025

CONTRATO	2229 – 2025
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	INGECONSULTA SAS

NIT	829.000.737-7
REP LEGAL	HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-004-2025
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ALEDAÑAS AL MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTÍ JARAMILLO, COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
VALOR	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($486.785.404).
DURACIÓN	TRES (03) MESES
SUPERVISION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPIN 202500000018386
RUBRO PRESUPUESTAL	(I) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación RECURSOS PROPIOS por valor de $6.566.048; (II) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación SGP-OTROS SECTORES-RECURSOS DEL BALANCE por valor de $370.304.392; (III) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP-OTROS SECTORES por valor de $109.914.963; (IV) 2.3-24-2402-0600-2402118-08-2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION fuente de financiación REINTEGROS DE SGP OTROS SECTORES-RECURSOS DEL BALANCE por valor de $1.00. (V) 2.3-24-2402-0600-2402118-08- 2.3.2.02.02.008 POR CONCEPTO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS PROPIOS por un valor de $203.553.094,00
ADICIONAL N°1 EN VALOR Y N°1 EN PLAZO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025 POR UN VALOR DE DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUNTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($203.553.094,00) Y POR UN PLAZO DE UN(01) MES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25 – 03641 del 06 de junio del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25 – 05353 del 24 de julio del 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION N°1	25-08919 del 27 de noviembre de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL N°1	25-10116 del 28 de noviembre de 2025
CEPPA No.	2859 del 6 de junio del 2025
ACTA DE SUSPENSION N°1	24 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE PRORROGA N°1 A LA SUSPENSION N°1	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE REINICION N°1	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.17522435 del 29 de julio del 2025

4.1 RELACION DE PAGOS

A continuación, se detalla la relación de pagos correspondientes a las actas parciales emitidas durante el desarrollo del proyecto. En él se especifican los montos aprobados, las fechas de emisión y pago, así como el avance físico y financiero asociado a cada acta. Esta relación permite verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y el adecuado flujo financiero conforme al cronograma establecido.

CONCEPTO	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL No. 01	11 de agosto del 2025	$ 240.333.996,00	49,37 %	0,00	$ 240.333.996,00
ACTA PARCIAL No. 02	2 de septiembre del 2025	$ 153.712.949,00	31,58 %	0,00	$ 153.712.949,00
ACTA PARCIAL No. 03	22 de octubre de 2025	$ 32.626.808,00	6,70%	0,00	$ 32.626.808,00
ACTA PARCIAL No. 04	9 de diciembre de 2025	$ 190.452.799,00	27,59%	0,00	$ 190.452.799,00
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	29 de diciembre de 2025	$73.211.946	10,61%	0,00	$73.211.946

Las actividades ejecutadas en el acta final y de liquidación corresponden al 10,61 % de ejecución, cumpliendo con las cláusulas del contrato en forma de pago la cual es por medio de actas parciales.

AVANCES GENERALES

Se deja constancia que, en el marco de la ejecución del contrato de consultoría, se desarrolló y entregó a satisfacción la totalidad del alcance contractual, incluyendo la elaboración y consolidación del presupuesto del proyecto, las especificaciones técnicas, los Análisis de Precios Unitarios (APU), las memorias de cantidades de obra y la consolidación integral de la información técnica del proyecto. Así mismo, se realizaron y entregaron los avalúos pendientes y el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), conforme a la normatividad vigente y a los requerimientos establecidos por la entidad contratante, permitiendo contar con insumos técnicos completos y consistentes para la ejecución del proyecto.representan un avance acumulado del 10,61 % de ejecución del contrato de consultoría.

Este porcentaje de avance evidencia el cumplimiento final de los hitos programados para la fase de estudios y diseños, reflejando un progreso acorde con la planificación establecida y constituyendo un soporte técnico fundamental para la continuidad y desarrollo de las siguientes etapas del proyecto.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en realizar los estudios y diseños que permitan la construcción de la infraestructura vial que facilite el acceso a la comunidad educativa alrededor del Mega Colegio Juan Francisco, ubicado en la Comuna 3 del Distrito de Barrancabermeja, Santander. Esta intervención es prioritaria debido a Congestión del

tráfico: La falta de infraestructura vial adecuada provoca embotellamientos frecuentes, incrementando los tiempos de desplazamiento y reduciendo la eficiencia en la movilidad urbana. Esta congestión es más costosa en las grandes ciudades y tiene un impacto significativo en la economía nacional.

Deterioro de la calidad del aire: Los atascos vehiculares aumentan las emisiones de gases contaminantes, deteriorando la calidad del aire y afectando la salud pública. En áreas con movilidad deficiente, el uso excesivo de vehículos particulares contribuye significativamente a la huella de carbono.

Incremento en los accidentes de tránsito: Vías en mal estado o insuficientes pueden ser escenario de accidentes frecuentes, poniendo en riesgo la integridad de conductores y peatones.

A continuación, se presentan las actividades a desarrollar en el proyecto:

Tabla 1. Cuadro de cantidades proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ALEDAÑAS AL MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTÍ JARAMILLO, COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

1.1.	Exploración Geotécnica y Geofísica						
1.1.1	Perforación con barreno motorizado hasta 10 metros de profundidad o hasta alcanzar	ML	90	$ 704.666,00	$ 63.419.940,00	90	$ 63.419.940,00
1.1.2	Perforación con equipo de rotación dentro de zona de humedal o no, con recuperación de muestra.	ML	150	$ 845.710,00	$ 126.856.500,00	150	$ 126.856.500,00
1.1.3	Apiques con recuperación CBR hasta 1.50 metros de profundidad	Und	8	$ 509.633,00	$ 4.077.064,00	8	$ 4.077.064,00
1.1.4	Límites de Atterberg	Und	38	$ 45.164,00	$ 1.716.232,00	38	$ 1.716.232,00
1.1.5	Granulometría por mallas con lavado sobre tamiz 200	Und	38	$ 37.440,00	$ 1.422.720,00	38	$ 1.422.720,00
1.1.6	Humedad natural	Und	38	$ 10.770,00	$ 409.260,00	38	$ 409.260,00
1.1.7	Peso unitario	Und	10	$ 22.592,00	$ 225.920,00	10	$ 225.920,00
1.1.8	Compresión inconfinada en suelos	Und	12	$ 128.848,00	$ 1.546.176,00	12	$ 1.546.176,00
1.1.9	Corte directo en suelos	Und	12	$ 307.259,00	$ 3.687.108,00	12	$ 3.687.108,00
1.1.10	Ensayo de Consolidación	Und	10	$ 440.003,00	$ 4.400.030,00	10	$ 4.400.030,00
1.1.11	Líneas Refracción Sísmica Método MASW y REMI	Und	3	$ 5.788.042,00	$ 17.364.126,00	3	$ 17.364.126,00
1.1.12	Ensayo CBR en muestro inalterada	Und	8	$ 125.000,00	$ 1.000.000,00	8	$ 1.000.000,00
SUBTOTAL EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA					$ 226.125.076,00		$ 226.125.076,00
1.2	Entregables y estudios						
1.2.1	Topografía						
1.2.1.1	Levantamiento Topográfico Georreferenciado (Incluye planos, puntos de	Und	1	$ 11.684.901,00	$ 11.684.901,00	1	$ 11.684.901,00
1.2.1.2	Ortomosaico	Und	1	$ 7.232.740,00	$ 7.232.740,00	1	$ 7.232.740,00
1.2.2	Informe de Estudio de suelos y Geotécnico	Und	1	$ 14.213.375,00	$ 14.213.375,00	1	$ 14.213.375,00
1.2.3	Estudio lineamiento ambiental	Und	1	$ 24.458.308,00	$ 24.458.308,00	1	$ 24.458.308,00
1.2.4	Estudio catastral	Und	1	$ 12.630.196,00	$ 12.630.196,00	1	$ 12.630.196,00
1.2.5	Diseño geométrico de vía	Und	1	$ 14.787.290,00	$ 14.787.290,00	1	$ 14.787.290,00
1.2.6	Diseño de Pavimento	Und	1	$ 12.630.196,00	$ 12.630.196,00	1	$ 12.630.196,00
1.2.7	Estudio Hidrológico e Hidráulico	Und	1	$ 14.787.290,00	$ 14.787.290,00	1	$ 14.787.290,00
1.2.8	Diseño de alcantarillado pluvial y obras hidráulicas	Und	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	1	$ 20.000.000,00
1.2.9	Diseño eléctrico de alumbrado público para certificar RETIE Y RETILAP	Und	1	$ 18.464.937,00	$ 18.464.937,00	1	$ 18.464.937,00
1.2.10	Diseño estructural	Und	1	$ 25.016.602,00	$ 25.016.602,00	1	$ 25.016.602,00
1.2.11	Presupuesto de obra y Especificaciones técnicas	Und	1	$ 7.032.454,00	$ 7.032.454,00	1	$ 7.032.454,00
SUBTOTAL ENTREGABLES POR COMPONENTES					$ 182.938.289,00		$ 182.938.289,00
1.3	Entregables y estudios No Previstos						
1.3.1	Diseño arquitectonico,urbanistico y paisajistico	Und	1	$ 43.631.000,00	$ 43.631.000,00	1	$ 43.631.000,00
1.3.2	Diseño de estructura de paso(Ponton)	Und	1	$ 37.118.860,00	$ 37.118.860,00	1	$ 37.118.860,00
1.3.3	Diseño de señalizacion y control vial	Und	1	$ 26.887.290,00	$ 26.887.290,00	1	$ 26.887.290,00
1.3.4	Plan de manejo de transito	Und	1	$ 18.787.470,00	$ 18.787.470,00	1	$ 18.787.470,00
1.3.5	Avaluo de predios a intervenir	und	10	$ 4.462.840,00	$ 44.628.400,00	10	$ 44.628.400,00
SUBTOTAL ENTREGABLES POR COMPONENTES NO PREVISTOS					$ 171.053.020,00		$ 171.053.020,00
VALOR TOTAL					$ 580.116.385,00		$ 580.116.385,00
IVA(19%)				19%	$ 110.222.113,00		$ 110.222.113,00
VALOR TOTAL CON IVA					$ 690.338.498,00		$ 690.338.498,00

Página 1

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.2.11 Presupuesto de obra y especificaciones técnicas

Presupuesto de Obra

En el marco de la consultoría para el proyecto vial, se elaboró el presupuesto de obra con base en los diseños aprobados, las cantidades de obra definidas y las condiciones reales del proyecto. Este presupuesto se estructuró a partir de los Análisis de Precios Unitarios, considerando costos directos, indirectos, utilidades, imprevistos y demás componentes económicos, garantizando coherencia técnica y financiera, así como su alineación con los precios de mercado y la normativa vigente. El presupuesto fue revisado, consolidado y entregado conforme a los lineamientos contractuales, quedando correctamente ejecutado.

Especificaciones Técnicas

Se formularon las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems que componen el proyecto vial, estableciendo de manera clara los materiales, procedimientos constructivos, normas de calidad, equipos, controles, ensayos y criterios de aceptación. Dichas especificaciones se desarrollaron conforme a la normatividad técnica aplicable (INVIAS y demás reglamentación vigente), asegurando la correcta ejecución de las obras y la adecuada interpretación técnica durante la fase constructiva. Esta actividad fue ejecutada y entregada satisfactoriamente.

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Se elaboraron los Análisis de Precios Unitarios correspondientes a las actividades del proyecto vial, descomponiendo cada ítem en sus componentes de mano de obra, materiales, equipos y transporte, de acuerdo con las condiciones particulares del proyecto. Los APU fueron calculados con criterios técnicos y económicos, garantizando su consistencia con las cantidades de obra, el presupuesto general y las especificaciones técnicas. La actividad se desarrolló de manera correcta y conforme al alcance de la consultoría.

1.3.4 Plan de manejo de transito

En desarrollo de la consultoría del proyecto vial, se elaboró el Plan de Manejo de Tránsito con el fin de garantizar la movilidad segura y continua de peatones, ciclistas y vehículos durante la ejecución de las obras. El PMT fue estructurado conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos de la autoridad de tránsito competente, incorporando la señalización temporal, desvíos, cierres parciales o totales, control de tráfico, dispositivos de seguridad vial y planes de contingencia. Esta actividad fue desarrollada, revisada y entregada de manera correcta, permitiendo mitigar impactos sobre la movilidad y la seguridad vial en el área de influencia del proyecto.

1.3.5 Avaluó de predios a intervenir

Se realizó el avalúo de los predios requeridos para la ejecución del proyecto vial, mediante la identificación, caracterización y valoración técnica y económica de los inmuebles afectados. El proceso incluyó el análisis de áreas, uso del suelo, estado de las construcciones, afectaciones parciales o totales y condiciones del mercado inmobiliario,

conforme a la normatividad vigente y a los procedimientos establecidos por la entidad competente. Los avalúos fueron elaborados, consolidados y entregados de manera adecuada, constituyéndose en un insumo técnico fundamental para la gestión predial y el desarrollo del proyecto.

Resultado del avance

Como resultado de la ejecución del contrato de consultoría, se deja constancia que todas las actividades previstas en el alcance contractual fueron desarrolladas y entregadas a satisfacción, incluyendo la elaboración del presupuesto de obra, las especificaciones técnicas, los Análisis de Precios Unitarios (APU), las memorias de cantidades y la consolidación integral de la información técnica del proyecto. Así mismo, se formuló y entregó el Plan de Manejo de Tránsito conforme a la normatividad vigente y a los requerimientos de la autoridad competente, y se realizaron los avalúos de los predios a intervenir, garantizando la viabilidad técnica, económica, predial y operativa del proyecto vial. ¡En consecuencia, los productos entregados cumplen con los lineamientos técnicos, normativos y contractuales, constituyéndose en insumos completos y confiables para la ejecución y posterior liquidación del proyecto.
