CONTRATO [ ] CONVENIO [x]

Proyecto (S): 4.3 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS

LOCALIZACIÓN: Municipio: San Antero, San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica y Cereté
Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 11 de abril al 26 de diciembre de 2025

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	006 de 2025
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	Convenio de asociación
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	10 de abril de 2025
CONTRATISTA:	Fundación Omacha
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZÁLEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para la implementación del plan de manejo de dos áreas protegidas en el departamento de Córdoba: área protegida marino costera Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa, Tinajones y sectores aledaños del delta estuarinos del río Sinú; y Distrito de Conservación de Suelos Ciénaga de Corralito"; celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS y la Fundación Omacha
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$611.998.565
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: $146.000.000
PLAZO:	Ocho (8) meses y quince (15) días
FECHA DE INICIO:	Once (11) de abril de 2025
FECHA DE TERMINACION:	Veintidós (22) de diciembre de 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	16 de octubre de 2025	NA	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	Dos (2) meses y quince (15) días		
ADICIÓN:1	$198.225.650		
OTRO SI N°1:	20 de junio de 2025		
OTRO SI N°2:	16 de octubre de 2025		
OTRO SI N°3:	05 de noviembre de 2025		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-101201651			**ANEXO No** 0
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	X	10/04/2025	20/05/2026	$41.377.291,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	10/04/2025	20/05/2026	$146.000.000,00
Calidad del servicio	X	10/04/2025	20/05/2026	$41.377.291,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	10/04/2025	20/11/2028	$20.688.645,75
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	10/04/2025	20/11/2025	$284.700.000,00

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-101201651			ANEXO No 2
CUBRIMIENTO	APLICA (Si/No)	INICIAL	FINAL	SUMA ASEG/ACTUAL
Cumplimiento del contrato	X	10/04/2025	21/05/2026	$41.377.291,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	10/04/2025	21/05/2026	$146.000.000,00
Calidad del servicio	X	10/04/2025	21/05/2026	$41.377.291,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	10/04/2025	21/11/2028	$20.688.645,75
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	10/04/2025	21/11/2025	$284.700.000,00

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-101201651			ANEXO No 5
CUBRIMIENTO	APLICA (Si/No)	INICIAL	FINAL	SUMA ASEG/ACTUAL
Cumplimiento del contrato	X	10/04/2025	10/07/2026	$61.199.856,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	10/04/2025	10/07/2026	$218.800.000,00
Calidad del servicio	X	10/04/2025	10/07/2026	$61.199.856,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	10/04/2025	10/01/2029	$30.599.928,25
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	10/04/2025	10/01/2026	$284.700.000,00

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el primer mes, las actividades se centraron en los procesos de contratación, planificación y programación de cada una de las actividades; para los meses siguientes de avance del convenio las acciones específicas por componente son:

- **Actividad 1. Seguimiento al proyecto productivo de abejas (apis y meliponas). El desarrollo de esta actividad incluye: Seguimiento al proyecto de investigación con abejas Apis en el municipio de San Antero y seguimiento de abejas meliponas en el municipio de San Bernardo del Viento.**

  Durante el primer mes, se realizó la visita preliminar del estado del proyecto, y diagnóstico de Apisanantero, para determinar el estado de las reinas y los avances con el sistema palmer. Durante el mes de mayo se realizaron visitas a los meliponarios de Caño Grande, La Balsa y Estación CIMACI, para revisar el estado de los mismos. En cuanto a Apisanantero, la entrega de insumos para la elaboración de tortas proteicas y la entrega de cajones para la adecuación de colmenas. Al quinto mes se han realizado 22 visitas de seguimiento de la siguiente manera: para el municipio de San Bernardo; 8 Visitas para el Meliponario de la Balsa y 5 visitas para Caño Grande con Covicompacgra; en el Municipio de San Antero, 7 Visitas al apiario de San Antero, en el que se incluyó acompañamiento a la cosecha de miel y visita de certificación del Sena, y 2 visita al meliponario de la Estación CIMACI. Para el mes actual y ultimo del tema de abejas, se realizó la evaluación del sistema palmer, especialmente con Apisanantero, y el estado de las otras iniciativas de abejas.

- **Actividad 2. Apoyar las acciones de vigilancia, control y acciones afines, relacionadas con el uso sostenible del bosque de manglar. El desarrollo de esta actividad incluye: mínimo 10 seguimientos y control mediante recorridos acuáticos y terrestres en las zonas de aprovechamiento sostenible.**

  Al iniciar el convenio se realizó la preparación de las rutas para el monitoreo en la Bahía de Cispatá y centros de acopio, para los temas de aprovechamiento forestal; se realizaron ocho monitoreos acuáticos y dos terrestres; para un total de diez monitoreos. En acciones del Programa Vida Manglar, participación en quince (16) Comités Técnicos (30 abril, 14 y 18 de mayo, 11 y 25 de junio; 9 y 23 de julio, y 6 y 22 agosto, 12 y 24 de septiembre, 8 octubre y 22 octubre, 5 y 19 noviembre y 3 de diciembre) y uno presencial de planificación el 27 y 28 de noviembre de forma presencial; así mismo la atención de la visita de auditoría de la empresa Aster Global (6 al 9 de mayo), como parte del proceso de certificación para segundo reporte de monitoreo del periodo 2019-2023, del programa.

- **Actividad 3. Capacitar a las asociaciones de mangleros legalmente constituidas del área protegida; únicos autorizados para el aprovechamiento del bosque de manglar, para el perfeccionamiento de los tramites en los permisos de aprovechamiento y movilización, relacionada con la plataforma SUNL. Esta actividad incluye cuatro**

espacios de capacitación comunitaria o institucional; dos por cada uno de los municipios en el tema de usos y aprovechamiento del manglar.

Se realizo la atención a la visita de Contraloría durante los días 23 y 24 de abril para el municipio de San Antero con 8 asociaciones de mangleros y visita en San Bernardo del Viento con las 6 asociaciones, como parte del proceso de seguimiento. Los profesionales encargados realizaron la planificación de las actividades de capacitación; se propusieron espacios conjuntos bajo la ejecución de la propuesta INTI, enfocada en tres componentes: capacidades jurídicas, capacidades blandas y monitoreo participativo. En el tema forestal se realizó la invitación a taller y capacitación de fortalecimiento de obligaciones jurídicas y técnicas; en atención a las obligaciones interpuestas en los permisos de "aprovechamiento forestal persistente por asociación", en la Zona de uso sostenible sector Estuarino de la Bahía de Cispatá en el área correspondiente al subsector I B- Caño Salado en el municipio de San Antero; en aras de acompañar el proceso de mejora y dar cumplimiento a las obligaciones jurídicas, mediante talleres teórico-práctico, como una fase preliminar para cada municipio y posterior a esto se ha realizado un taller de métricas para cada municipio. A la fecha se han beneficiado 14 asociaciones, en espacios realizados desde inicios de julio hasta agosto; contando con una lista de chequeo de obligaciones con tiempos de cumplimiento, y la proyección de borrador de informe de cumplimiento ambiental que exige la Corporación; para este último tema y teniendo en cuenta que la fase preparatoria se extendió, se proyectaron para el mes de septiembre dos espacios virtuales y dos presenciales; sin embargo por las diferentes actividades en ejecución de las asociaciones, estos espacios fueron reprogramados por la Corporación, teniendo en cuenta encuentro presencial de los aliados del programa Vida Manglar, con las 14 asociaciones de mangleros realizado el 16 de octubre, abordando el aprovechamiento forestal y los actuales desafíos. En coordinación con el área forestal se programaron los espacios presenciales de capacitación el 19 de noviembre para la revisión de los permisos de aprovechamiento y se realizó el espacio virtual para el 2 de diciembre, para las indicaciones y orientaciones relacionadas con el cargue en la plataforma SUNL. En total se realizaron los cuatros espacios programados para las asociaciones de mangleros.

- **Actividad 4. Apoyar el seguimiento ex situ de la especie Caimán Crocodylus acutus, en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones, conforme a lo establecido en la Resolución No 2298 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente las condiciones de salud. El desarrollo de esta actividad incluye dos monitoreos de los individuos ex situ, mediante seguimiento y valoración medico veterinaria de los individuos que se encuentran ex situ en la estación CIMACI de la Corporación, ubicada en la vereda Amaya y capacitación de las comunidades en fortalecimiento técnico para el manejo de la especie.**

Durante el primer mes se realizó, la adecuación de instalaciones para la tenencia de los animales y programación con personal de CAV, para la realización del censo de animales en custodia de Asocaimán. Se realizó acompañamiento para actividades de monitoreo del caimán aguja entre el 13 al 16 de mayo, y el censo y revisión de animales se efectuó el

26 de mayo, contabilizando 613, animales de los cuales 265 neonatos, 233 juveniles, y 15 adultos. Además de esto se realizó un taller de fortalecimiento el 18 de junio de 2025, identificando las fortalezas del Asocaimán, sumado el acompañamiento de profesional por parte del equipo de DRMI; que les ha permitido el seguimiento y orientación en las actividades, se realizó el segundo monitoreo de caimán aguja entre los días 8 a 11 de julio de 2025, del mismo modo se realizó el apoyo a la asociación para la organización de datos acerca del proceso de recolección de huevos, incubación y nacimientos durante los primeros días del mes de agosto; como parte de la ejecución del Convenio de Fondo Acción por parte de Asocaimán. El 18 de septiembre se realizó reunión de acompañamiento con Asocaimán, para la programación de las diferentes actividades y el estado y avances de otras tareas. Fue realizado el segundo censo y revisión de animales durante tres días, según a disponibilidad de personal CAV, (26 y 29 de septiembre y 2 de octubre), con un censo de 300 ejemplares distribuido en 109 neonatos, 172 juveniles y 19 adultos. Así mismo la realización de una mesa de trabajo con Asocaimán el día 9 de octubre, donde se consideró la reducción del número de ejemplares y otras situaciones propias de la estación CIMACI como el manejo de los animales, el ecoturismo, el mantenimiento de las instalaciones y el funcionamiento de la asociación, lo que conllevo a la decisión de realizar un cierre temporal del 14 al 21 de octubre, como acción de mejora. Se realizó dialogo y seguimiento desde la autoridad ambiental el 7 de noviembre de 2025, para la asociación Asocaimán. De igual forma desde el convenio se realizó el apoyo para la realización de monitoreo de caimán, en la Bahía de Cispatá, así como orientaciones en el diligenciamiento de formatos para Fondo Acción. Se realizo censo de animales el 15 de diciembre con un total de 161 ejemplares; de los cuales 17 neonatos, 127 juveniles, y 17 adultos reforzando las indicaciones sobre el cuidado de los individuos.

- **Actividad 5. Desarrollar una estrategia de comunicaciones y divulgación referente a las actividades realizadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa y Tinajones. La actividad incluye el diseño, implementación y divulgación de la estrategia de comunicaciones, se realizarán dos (2) Celebraciones ambientales, diez (10) publicaciones, cuatro (4) talleres al sector hotelero y cuatro (4) talleres de educación ambiental con Instituciones Educativas del área.**

  En total se cuenta con 16 comunicados en el marco del convenio, de la siguiente manera: Diez publicaciones o comunicados por redes sociales, un video y cinco boletines internos así:

  1- Ciclo de socializaciones comunitarias - 11 abril.
  2- Mensaje Dia de la tierra- 22 abril
  3- Inicio de auditoria Aster Global- 6 mayo.
  4- Mensaje Dia de las abejas – 20 mayo
  5- Mensaje Día de la Nutria- 28 de mayo
  6- Mensaje Dia del Medio Ambiente- 5 mayo
  7- Mensaje participación de VM en Feria de la Ganadería- 18 de junio
  8- Publicación sobre la celebración ambiental "día del medio ambiente"- 18 de junio
  9- Publicación video en conmemoración del día internacional para la defensa del manglar-26 de julio

10- Publicación sobre actividades de limpieza de caños en el DCS Ciénaga de Corralito, por las asociaciones- 10 octubre.
- Un Video resumen sobre la celebración del día de la de la defensa del manglar- 26 de julio
- Cinco Boletines "El Manglero", correspondientes al mes abril, mayo, junio, julio y agosto de las actividades del territorio.

Dos celebraciones ambientales: una realizada el 5 de junio "Día del medio ambiente" con la participación de 50 personas entre comunidad y aprendices del Sena, seccional Sucre, con la realización de jornada académica, visita al vivero, temas de biodiversidad, recolección de residuos y decoración de llantas usadas, conllevando a reflexiones sobre el lema "Sin contaminación por plásticos"; la segunda celebración ambiental se realizó el 25 de julio en conmemoración del "Día de la defensa del Manglar" contando con la participación de las 14 asociaciones de mangleros del área protegida, en esta jornada se buscó resaltar habilidades artísticas mediante un show de talentos "Talento Manglero", relacionado al manglar y a la cotidianidad de las comunidades contando con la participación de 86 personas y realizando la premiación y reconocimientos respectivos.

Para los talleres en hoteles e Instituciones Educativas se realizó la proyección de material audiovisual y programación de estos espacios; para el sector Hotelero se realizaron cuatro (4) espacios: en Cispatá Marina Hotel, el 16 de junio, con la participación de 22 personas; el hotel Semar Confort Luxury el 5 de agosto, contando con la participación de 7 personas; en el restaurante Pesecar el día 6 de agosto a 22 empleados de este establecimiento; y en Hotel Los Marinos de San Bernardo del Viento el 29 de agosto. En cuanto a las Instituciones Educativas de desarrollaron cuatro (4) talleres de divulgación sobre el área protegida, logrando la vinculación de siete (7) grados de escolaridad: el primero el día 15 de julio con los grados 801, 802 y 803 de la institución JUCEMI sede central logrando un alcance de 60 estudiantes, el 18 de julio se realizó en la sede Sagrado Corazón en los grados 801 y 802 con 52 estudiantes, el 22 de julio en la IE JUCEMI Sede Cispatá con estudiantes de prescolar a quinto grado alcanzando la participación de 31 estudiantes, el 23 de Julio se realizó en la IE Miguel Antonio Caro con la participación de 23 estudiantes.

En atención a las solicitudes de visitas a las instalaciones de la estación CIMACI se atendieron ocho (8) de la siguiente manera: 1 agosto grados noveno de la institución JUCEMI de la sede Sagrado Corazón de Jesús; 12 de agosto al Liceo de Tierralta, 15 y 29 de agosto a JUCEMI, como parte de las actividades de proyectos y pedagógicos del área ambiental, el 26 de septiembre con estudiantes de kínder del Colegio Maryar, 24 de octubre con Colegio Maryar de grado transición y el 31 octubre la atención de la Institución Educativa José María Berastagui del municipio de Ciénaga de Oro, con los grados novenos. La última visita el 16 de diciembre, correspondió a los niños y jóvenes pertenecientes a los guardianes ambientales de la CVS.

- **Actividad 6. Implementar actividades del plan de manejo del Área protegida del DCS - Distrito de Conservación Ciénaga de Corralito, con énfasis en el fortalecimiento**

de ecoturismo comunitario. Mediante la identificación de áreas críticas de la Ciénaga de Corralito, para proponer actividades de rehabilitación hídrica de las áreas críticas en la Ciénaga de Corralito. Para ello se centrará en diálogos con las comunidades para definir las áreas críticas y llevar a cabo la rehabilitación hídrica de mínimo 300 metros de caños.

Durante el mes de abril se realizó, la búsqueda y reactivación de contactos, para programación de espacio de diálogos y concertación comunidad- autoridad ambiental. Durante el mes de mayo, el 21 y 28 del mes, se realizaron reuniones con los delegados de tres asociaciones presentes en la Ciénaga de Corralito (ASOPISICO, ASOPARCER y APACIS), para la socialización de las actividades y el Plan de Manejo del área, posteriormente durante la primera semana del mes de junio, se realizaron reuniones personalizadas de forma individual con cada asociación, para la socialización del plan de manejo con mayor número de socios, y la ruta de trabajo para las actividades a desarrollar en el área protegida. Así mismo se incluyó en junio la participación de una nueva asociación. ASOPARCICO, con la cual se realizaron los acercamientos y diálogos respectivos, para ponerla al tanto de las actividades de socialización. A nivel técnico se realizaron tres actividades de campo, una con acompañamiento comunitario el 10 de junio, para revisión de áreas críticas y posibles sitios de implementación de actividades; el 12 de junio se programó un sobrevuelo con equipo no tripulado DRONE, y el 20 de junio, se realizó una nueva inspección para el área de la compuerta, para observar el estado de este sector. Siguiendo la ruta de trabajo, el 26 de junio se realizó, convocatoria a las 4 asociaciones, para compartir las observaciones preliminares y definir costos de actividad de limpieza, aproximación a la distribución de recursos y compromiso de documentación legal para la relación contractual y proyectar convenios de asociación, para hacer posible la limpieza. El 8 de julio, se realizó la revisión de documentación, encontrando muchas falencias en este sentido. Se entregaron borradores de minuta a los representantes legales, estos fueron revisados ajustados y posteriormente enviadas las minutas a cada asociación, se realizó el proceso de documentación para la gestión de los convenios mediante la reunión en la biblioteca con las asociaciones el día 15 de julio. La firma de convenios y acta de inicio, se realizó el 21 de julio, por un periodo de un mes, para los cual las asociaciones iniciaron el trámite de pólizas que se extendió más de lo previsto, realizando la solicitud de otro si, desde el 22 de agosto al 10 de septiembre, tiempo en el cual las asociaciones ejecutaron las actividades de limpieza de caños en el sector asignado. El 15 de septiembre se realizó la actividad de entrega comunitaria, con la verificación de los trabajos y la retroalimentación y lecciones aprendidas, dándole indicaciones a los representantes para las entrega final y la liquidación de convenios. Fue realizada reunión y visita del Director General de la CVS, el 23 de octubre en el sector de las Garitas en el municipio de Cereté, requerimiento realizado por las cuatros asociaciones de Corralito, posteriormente confirmada la adición del convenio, el día 6 de noviembre se socializaron los alcances de la segunda fase. El 11 de noviembre de 2025, se realizó la asignación de tramos con las asociaciones para el inicio de las labores de campo. Se realizo acompañamiento a las asociaciones durante las actividades de limpieza para 600 metros nuevos de caños y orientaciones respecto a la documentación, se realizó entrega comunitaria el 11 de diciembre evaluando la actividad y su retroalimentación y de forma

posterior, la entrega de busos, como identidad de las asociaciones sobre la unión por la conservación del área protegida.

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	Actividad 1: Seguimiento al proyecto productivo de abejas (apis y meliponas). El desarrollo de esta actividad incluye: Seguimiento al proyecto de investigación con abejas Apis en el municipio de San Antero y seguimiento de abejas meliponas en el municipio de San Bernardo del Viento.	1 visita preliminar del estado del Proyecto, y diagnóstico de Apisanantero. Durante el mes de mayo se realizaron visitas a los meliponarios de Caño Grande, La Balsa y Estación CIMACI para un total de 3 visitas. En cuanto a Apisanantero, la entrega de insumos para la elaboración de tortas proteicas y la entrega de cajones para la adecuación de colmenas. Para el quinto mes ya se han realizado 22 visitas de seguimiento de la siguiente manera: para el municipio de San Bernardo: 8 Visitas para el Meliponario de la Balsa y 5 visitas para Caño Grande con Covicompagra. En el Municipio de San Antero: 7 Visitas al apiario de San Antero, en el que se incluyó acompañamiento a la cosecha de miel y visita del Sena, y 2 visita al meliponario de la Estación CIMACI.	100 %
2	Actividad 2. Apoyar las acciones de vigilancia, control y acciones afines, relacionadas con el uso sostenible del bosque de manglar. El desarrollo de esta actividad incluye: mínimo 10 seguimientos y control mediante recorridos acuáticos y terrestres en las zonas de aprovechamiento sostenible	Preparación de las rutas para el monitoreo y ejecución de 8 monitoreos acuáticos por las zonas de aprovechamiento forestal (20 y 27 junio y 10, 18 y 22 de julio, 7 y 12 noviembre y 11 diciembre) y dos monitoreo terrestre (4 julio y 25 agosto), para un total de 10 monitoreos. En acciones del Programa Vida Manglar, participación de 16 Comités Técnico , (30 abril, 14 y 18 de mayo, 11 y 25 de junio; 9 y 23 de julio, 6 y 22 agosto, 12 y 24 septiembre, 8 y 22 octubre, 5 y 19 de noviembre y 3 de diciembre) y la Visita de Auditoria de la Empresa Aster Global en el mes de mayo.	100%
3	Capacitar a las asociaciones de mangleros legalmente constituidas del área protegida; únicos autorizados para el aprovechamiento del bosque de manglar, para el perfeccionamiento de los tramites en los permisos de aprovechamiento y movilización, relacionada con la plataforma SUNL.	Atención a la visita de Contraloría en el municipio de San Antero con 8 asociaciones de mangleros y visita en San Bernardo del Viento con las seis asociaciones. Planificación de las actividades de capacitación, y articulación con proyecto Inti, para las capacitaciones de tipo jurídico, convocando a las 14 asociaciones de mangleros, avance preliminar para la evaluación y seguimiento realizando dos espacios presenciales el 19 de noviembre y dos virtuales para el 2 de diciembre por parte de la Corporación para finalizar el proceso de capacitación forestal.	100%
4	Apoyar el seguimiento ex situ de la especie Caimán Crocodylus acutus, en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones, conforme a lo establecido en la Resolución No 2298 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente las condiciones de salud.	A inicios de convenio se realizó la adecuación de instalaciones para la tenencia de los animales y programación con personal de CAV, para la realización del censo de animales en custodia de Asocaimán. Se realizó acompañamiento para actividades de monitoreo del caimán aguja entre el 13 al 16 de mayo, y el censo y revisión de animales se efectuó el 26 de mayo, contabilizando 613, animales de los cuales 265 neonatos, 233 juveniles, y 15 adultos. En los temas sociales, el acompañamiento por parte de un profesional, para orientación y seguimiento de actividades y la realización de un taller de fortalecimiento en el mes de junio. Reunión de acompañamiento el 18 de septiembre y censo a finales de septiembre y principios de octubre con 300 ejemplares. Reunión e 9 de octubre para acciones de mejora en diferentes temas. Reunión el 21	100% Inicial 100% Adición

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
		de octubre con operadores turísticos y Asocaimán. Reunión el 7 noviembre entre la Corporación y asocaimán como actividad de seguimiento. Apoyo al monitoreo del 17 al 21 de noviembre, y orientación en el diligenciamiento de formatos para Fondo Acción. Se realizó censo de animales el 15 de diciembre con un total de 161 ejemplares; de los cuales 17 neonatos, 127 juveniles, y 17 adultos reforzando las indicaciones sobre el cuidado de los individuos.	
5	Desarrollar una estrategia de comunicaciones y divulgación referente a las actividades realizadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa y Tinajones. La actividad incluye el diseño, implementación y divulgación de la estrategia de comunicaciones, se realizarán dos (2) Celebraciones ambientales, diez (10) publicaciones, cuatro (4) talleres al sector hotelero y cuatro (4) talleres de educación ambiental con Instituciones Educativas del área.	**16 publicaciones o comunicados por redes sociales, de la siguiente manera: 10 mensajes un video y cinco boletines internos.** 1. Ciclo de socializaciones comunitarias - 11 abril. 2. Mensaje Dia de la tierra- 22 abril 3. Inicio de auditoria Aster Global- 6 mayo. 4. Mensaje Dia de las abejas – 20 mayo 5. Mensaje Día de la Nutria- 28 de mayo 6. Mensaje Dia del Medio Ambiente- 5 mayo 7. Mensaje participación de VM en Feria de la Ganadería- 18 de junio 8. Publicación sobre la celebración ambiental "día del medio ambiente"- 18 de junio 9. Publicación video en conmemoración del día internacional para la defensa del manglar-26 de julio 10. Publicación DCS Ciénaga de Corralito- 10 octubre. -Un video resumen sobre la celebración del día de la de la defensa del manglar- 26 de julio -Cinco (5) Boletín El Manglero, correspondientes al mes abril, mayo, junio, julio y agosto, de las actividades del territorio. **Dos Celebraciones ambientales** La primera el 5 de junio "Día del medio ambiente" con la participación de 50 personas entre comunidad y aprendices del Sena, seccional Sucre, con la realización de jornada académica, visita el vivero, temas de biodiversidad, recolección de residuos y decoración de llantas usadas, conllevando a reflexiones sobre el lema "Sin contaminación por plásticos", la segunda celebración ambiental realizada el 25 de julio "Día de la defensa del Manglar", con la participación de las 14 asociaciones de manglero en el evento denominado "Talento Manglero". **Cuatro Talleres en el sector hotelero** 1. Taller Hotel Cispatá Marina, el 16 de junio, con la participación de 22 personas. 2. Taller Hotel Semar Confort Luxury contando con la participación de 7 personas el día 5 de agosto 3. Taller Restaurante Pesecar con 22 empleados de este establecimiento. 4. Taller en Hotel Marinos en San Bernardo del Viento el 29 de agosto con la participación de 5 empleados. **Cuatro Talleres en Instituciones Educativas** 1. Taller día 17 de julio con los grados 801, 802 y 803 de la institución JUCEMI sede central logrando un alcance de 60 estudiantes. 2. 18 de julio se realizó en la sede Sagrado Corazón en los grados 801 y 802 con 52 estudiantes	200%

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
		3. 22 de julio en la IE JUCEMI Sede Cispatá con estudiantes de prescolar a quinto grado alcanzando la participación de 31 estudiantes, 4. 23 de Julio se realizó en la IE Miguel Antonio Caro con la participación de 23 estudiantes. Los talleres lograron impactar a siete grados con la divulgación sobre el área protegida, **Atención de ocho visitas en estación CIMACI** 1. 1 de agosto grados noveno de la institución JUCEMI de la sede Sagrado Corazón de Jesús. 2. 12 de agosto al Liceo de Tierralta, con más de 70 participantes. 3. 15 de agosto JUCEMI San Antero 4. 29 de agosto JUCEMI San Antero 5. 26 septiembre MARYAR Lorica 6. 24 Octubre MARYAR Lorica 7. 31 Octubre I.E José María Berastegui Ciénaga de Oro. 8. 16 diciembre visita guardianes ambientales CVS, del municipio de Canalete. Las visitas de las I.E como parte de las actividades de campo de los proyectos pedagógicos del área ambiental.	
6	Implementar actividades del plan de manejo del Área protegida del DCS - Distrito de Conservación Ciénaga de Corralito, con énfasis en el fortalecimiento de ecoturismo comunitario. Mediante la identificación de áreas críticas de la Ciénaga de Corralito, para proponer actividades de rehabilitación hídrica de las áreas críticas en la Ciénaga de Corralito.	Búsqueda y reactivación de contactos, para programación de espacio de diálogos y concertación comunidad- autoridad ambiental, en el mes de abril. 2 reuniones grupales el 21 y 28 de mayo para la socialización de actividades y el Plan de manejo con (ASOPISCISO, ASOPARCER, APACIS) 3 Reuniones individuales de la siguiente manera: 3 Junio ASOPISCICO 6 Junio ASOPARCER en la mañana y APACIS en la tarde. El 20 de junio el acercamiento y dialogo con ASOPARCICO, informando de todas las actividades. 10 Junio Salida de campo comunitaria, para revisión de áreas críticas. 12 junio sobrevuelo con DRON, y 20 junio, visita de campo al sector de la compuerta. 26 de junio convocatoria de las cuatro asociaciones y solicitud de documentación legal, para estudiar posibilidad de suscripción de convenios. 8 de julio revisión de documentación, entregando borradores de minutas para socializar con los asociados. El día 15 de julio se realizó el proceso de documentación para la gestión de los convenios mediante la reunión en la biblioteca con las 4 asociaciones. La firma de convenios y acta de inicio, se realizó el 21 de julio, por un periodo de un mes, para los cual las asociaciones iniciaron el trámite de pólizas que se extendió más de lo previsto, realizando la solicitud de otro si, desde el 22 de agosto al 10 de septiembre, tiempo en el cual las asociaciones ejecutaron las actividades de limpieza de caños en el sector asignado. 15 septiembre entrega comunitaria y verificación de trabajos. A partir de 16 de octubre ampliación de actividades en fortalecimiento comunitario y concertación para mantenimiento de 600mts de caños adicionales con el convenio. Reunión con Director General de CVS el 23 de octubre a petición de las asociaciones. Reunión de socialización segunda fase el 6 de noviembre. El 11 de noviembre de 2025, se realizó la asignación de tramos con las asociaciones para el inicio de las labores de	100% Inicial 100% Adición

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
		campo. Se realizo acompañamiento a las asociaciones durante las actividades de limpieza para 600 metros nuevos de caños y orientaciones respecto a la documentación, la entrega comunitaria el 11 de diciembre y la entrega posterior de busos de identificación por la unión del área protegida.	

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO $611.998.565
VALOR ANTICIPO $146.000.000
% AVANCE FINANCIERO 80%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	08-05-2025	$146.000.000				$146.000.000		$146.000.000
ACTA 01	11-07-2025	$109.500.000				$109.500.000		$255.500.000
ACTA 02	11-09-2025	$73.000.000				$73.000.000		$328.500.000
Adición 1	16-10-2025	$182.000.000						
Desembolso 2	27-11-2025	$87.400.000				$87.400.000		$415.900.000
ACTA 03	28-11-2025	$87.400.000				$87.400.000		$504.300.000
ACTA FINAL	26-12-2025	$43.700.000					$43.700.000	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: NA

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Inducción de Ingreso Exámenes ocupacionales	Contratación de personal Programación de convenio Solicitud de insumos Concertaciones preliminares Reactivación de contactos	En el tema de contratación entrega de la documentación, soportes digitales tema HSEQ.

	Programación capacitaciones HSEQ Realización de capacitaciones HSEQ.	Programación de capacitaciones HSEQ, con opciones de horarios en Montería y Lorica


REGISTRO FOTOGRAFICO



Reuniones con Asocaimán y operadores turisticos



Atención de visitas en Estación CIMACI – Colegio Maryar e IE

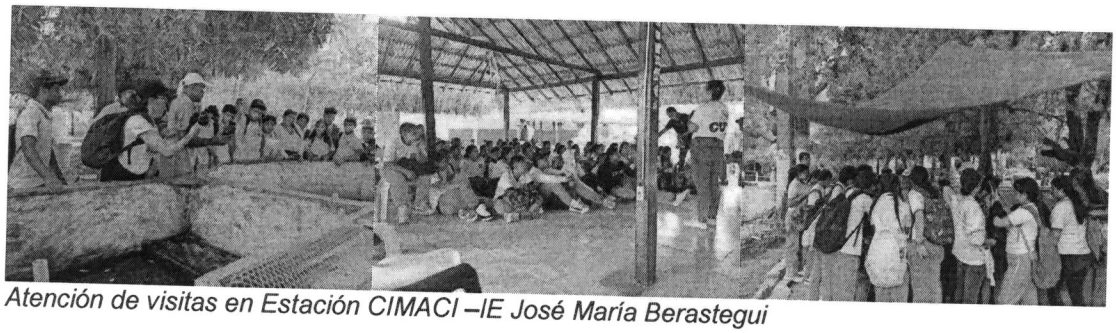

Atención de visitas en Estación CIMACI –IE José María Berastegui



Reunión con asociaciones del DCS Ciénaga de Corralito, para actividades de adición



Asignación de tramo de caños, segunda fase limpieza Corralito.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2025 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

Albeiro Arrieta López
Subdirector De Gestión Ambiental
CVS

ALBEIRO ARRIETA LOPEZ
Supervisor, CVS

Dalila Caicedo H.
Firmado digitalmente por Dalila Caicedo H.
Fecha: 2025.12.26 14:04:26 -05'00'

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora, Fundación Omacha

Fecha corte informe: 26 de diciembre de 2025
