Ibagué, 18 de diciembre de 2025.

Señores
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ– INFIBAGUÉ
NIT 890.700.755-5
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo contractual - Contrato No. 386 del 10 de noviembre de 2025 ***Proceso SECOP II No. SAMC-005-2025***

Yo, LILI TATIANA CÉSPEDES GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.234.645.495 de Ibagué, actuando en mi calidad de Representante Legal de la Unión Temporal RUEDA INTELIGENTE IBAGUÉ, se permite presentar de manera respetuosa la presente solicitud de prórroga del plazo contractual, con fundamento en los hechos y consideraciones que se exponen a continuación.

1. Estado de ejecución del contrato

La Unión Temporal ha venido ejecutando de manera diligente las obligaciones contractuales a su cargo, registrando avances verificables en los componentes tecnológicos, de software, IoT, planeación operativa y actividades preparatorias asociadas a la implementación del sistema, conforme al cronograma inicialmente aprobado.

2. Hechos sobrevinientes que afectan el cronograma

No obstante lo anterior, se han presentado circunstancias externas, sobrevinientes y no imputables a la Unión Temporal, relacionadas con los procesos de fabricación, alistamiento y despacho internacional de las bicicletas mecánicas y asistidas, las cuales han impactado los tiempos originalmente proyectados para su entrega.

Estas circunstancias se encuentran debidamente soportadas en las certificaciones emitidas por los proveedores, que se anexan a la presente comunicación, y que describen, entre otros aspectos:

- Demoras en la disponibilidad de insumos y componentes especializados.
- Alta demanda estacional y ajustes en la cadena internacional de suministro.
- Controles de calidad obligatorios no susceptibles de ser acelerados.
- Limitaciones logísticas propias del transporte marítimo internacional.

3. Solicitud concreta

En atención a lo anterior, y con el fin de preservar la correcta ejecución del contrato, el equilibrio contractual y el interés público asociado al proyecto, la Unión Temporal solicita la prórroga del plazo contractual hasta el 28 de febrero de 2026, como término razonable y proporcional para permitir la culminación del proceso de fabricación, el embarque internacional, la nacionalización, la entrega en sitio, la instalación, la puesta en operación y la realización de las pruebas finales de las bicicletas objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas pactadas.n.

4. Buena fe y ausencia de incumplimiento

La presente solicitud se formula antes del vencimiento del plazo contractual, en observancia de los principios de buena fe, transparencia y colaboración previstos en la Ley 80 de 1993, y no obedece a negligencia, incumplimiento o falta de gestión por parte de la Unión Temporal, sino a hechos ajenos a su control.

La Unión Temporal manifiesta su plena disposición para continuar con la ejecución del contrato una vez superadas las circunstancias descritas, manteniendo los estándares técnicos, de calidad y operativos exigidos.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

LILI TATIANA CÉSPEDES GARCÍA
C.C. 1.234.645.495 de Ibagué
UT Rueda Inteligente Ibagué
NIT 902.005.398-0

CERTIFICATION OF PRODUCTION AND INTERNATIONAL SHIPPING DELAYS
GUANGZHOU C.P. TRADING CO., LTD.
To whom it may concern,

Through this letter, GUANGZHOU C.P. TRADING CO., LTD., acting as international supplier and commercial agent in charge of the manufacturing and international logistics of bicycles and related components, hereby certifies the current conditions affecting the originally estimated production and international dispatch timelines of the goods supplied.

1. Production and supply chain conditions

During the recent period, external and seasonal circumstances beyond the direct control of the manufacturer have affected the availability and standard procurement timelines of essential inputs required for production, including but not limited to:

- Aluminum alloy frames and structural components,
- Mechanical transmission and braking systems,
- Electronic parts and specialized accessories,
- Finishing materials, packaging and export packing materials.

These conditions have required operational adjustments and rescheduling of production activities in order to ensure full compliance with the technical specifications, quality standards and safety requirements applicable to the final products.

2. Quality control and export preparation

In accordance with applicable technical and quality assurance procedures, each manufactured unit must undergo mandatory inspection stages, functional testing and technical verification, which cannot be reduced or accelerated without compromising product safety, durability and compliance.

The combination of high seasonal demand, global supply chain adjustments and strict quality control processes has resulted in an extension of the originally projected timelines for the completion of production and preparation for international shipment. The manufacturing process is currently **ongoing and under continuous monitoring**, with measurable progress at each production stage.

3. International logistics factors

Simultaneously, temporary constraints in international logistics have occurred, including:

- Adjustments in vessel schedules and container availability,
- Operational congestion at ports of departure,
- Variations in cargo consolidation and dispatch times.

4. Nature and scope of the situation

The circumstances described herein:

- Are temporary and beyond the direct control of both the manufacturer and the importer,
- Do not result from technical failures, operational negligence or deliberate non-performance,
- Do not affect the quality, safety or technical conformity of the goods,

- Are subject to ongoing follow-up in order to normalize timelines as soon as reasonably possible.

As a result, the originally estimated production and international shipping timelines require adjustment in accordance with the current manufacturing and logistics conditions.

This certification is issued as **informational and supporting evidence** for administrative, contractual and planning purposes, as deemed appropriate by the interested party.


Sincerely,

GUANGZHOU C.P. TRADING CO., LTD.
Nombre: German Cruz
Cargo: Gerente

Firma:
Sello de la empresa:

Supporting documentation

As supporting evidence of the circumstances described in this certification, the following documentation is attached:

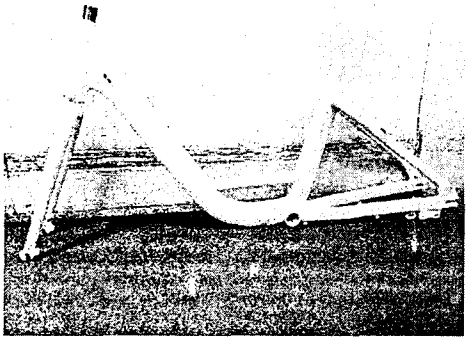

– A technical progress summary describing the current status of manufacturing.

GENERAL PRODUCTION STATUS
GUANGZHOU C.P. TRADING CO., LTD.

According to the consolidated information provided by the involved manufacturing plants and assembly workshops, the production process shows an approximate progress of seventy-five percent (75%), understood as an estimated and indicative percentage, typical of industrial processes carried out in batches and across different production lines.

Such progress generally corresponds to the cumulative advancement of the following stages:

- manufacturing of frames and structural components,
- partial assembly of units,
- progressive integration of mechanical components and accessories,
- implementation of intermediate quality control and technical verification processes.

During the development of the process, adjustments to the initially estimated timelines have occurred, mainly associated with external and operational conditions such as high seasonal demand, variations in the availability of certain inputs, internal rescheduling aimed at ensuring quality standards, and additional time required for testing and validation. As a result, progress has continued on a progressive basis, although with reasonable adjustments to the projected schedule, without affecting the quality or technical specifications of the bicycles.

Once the remaining percentage of production is completed, the process will proceed with the final stages of unit assembly, final inspections and quality control, packaging and preparation for export, and coordination of logistics space for international shipment.

The aforementioned activities are currently under planning and coordination, subject to the normal evolution of the production process and prevailing international logistics conditions.

JUAN PALOS S.A.S.

Diciembre 11, 2025.

Apreciados señores
FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DEL SOFTWARE - PARQUESOFT TOLIMA

En mi calidad de representante legal de JUAN PALOS S.A.S., proveedor encargado del diseño, fabricación y suministro de bicicletas con estructura en madera para el sistema de bicicletas públicas inteligentes "Rueda por Ibagué", me permito informar y certificar las circunstancias que han impactado los plazos inicialmente estimados para la fabricación y entrega de los productos a nuestro cargo.

1. Circunstancias sobrevinientes en la fabricación

Durante el proceso de ejecución se han presentado circunstancias asociadas a la disponibilidad de insumos, importaciones y factores logísticos, que han impactado los plazos inicialmente estimados para la fabricación, relacionadas principalmente con:

- Disponibilidad limitada y descontinuación temporal de referencias de ciertos accesorios y componentes específicos indispensables para la conformación final de las bicicletas, en especial el integrado trasero.
- Retrasos en los tiempos de importación de accesorios y partes especializadas, la mayoría de origen extranjero, cuya provisión depende de proveedores internacionales.
- Factores logísticos propios de la temporada de fin de año, caracterizada por alta demanda, congestión en despachos y extensión de los tiempos de entrega por parte de fabricantes y operadores logísticos.
- El proceso de fabricación de los marcos en madera incluye un curado previo del material, el cual se realiza de manera artesanal y requiere tiempos naturales de estabilización que no pueden ser acelerados sin afectar la resistencia y durabilidad de las estructuras. Esta condición técnica ha incidido en los tiempos inicialmente estimados del cronograma de fabricación

2. Estado actual del proceso

A la fecha, el proceso de fabricación, alistamiento y ensamblaje de las bicicletas y sus componentes se encuentra en ejecución, conforme a las especificaciones técnicas acordadas. No obstante, algunos componentes esenciales continúan pendientes de suministro por parte de proveedores internacionales, lo cual impide culminar el producto final dentro de los plazos inicialmente proyectados.

Las circunstancias descritas no obedecen a falta de gestión, negligencia o incumplimiento por parte de la organización, sino a limitaciones objetivas en la disponibilidad de insumos y a los tiempos de respuesta propios del comercio internacional, las cuales han sido atendidas de manera diligente y documentada.

3. Alcance de la información certificada

En consecuencia, solicitamos de manera formal que los plazos inicialmente establecidos para la fabricación, ensamblaje y entrega de los productos sean ajustados, de acuerdo con las condiciones actuales de producción y suministro, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las especificaciones técnicas y de calidad acordadas. Como respaldo de las circunstancias descritas en la presente certificación, se adjunta la siguiente documentación soporte:

- Resumen técnico del estado actual del proceso de fabricación y alistamiento.
- Registro fotográfico del proceso de fabricación y ensamblaje de las bicicletas y sus componentes.
- Soportes de pedidos con proveedores de componentes

JUAN MANUEL LINARES HERNANDEZ
Representante legal de JUAN PALOS S.A.S.

JUAN PALOS S.A.S.

ESTADO GENERAL DE AVANCE

En desarrollo del proceso de fabricación de las bicicletas con estructura en madera correspondientes al proyecto "Rueda por Ibagué", se presenta el siguiente estado general de avance, con el propósito de dejar constancia verificable de las actividades efectivamente ejecutadas, la gestión adelantada y las condiciones técnicas que inciden en la finalización del proceso, para efectos de seguimiento contractual.

Durante la ejecución se han adelantado de manera continua y documentada las gestiones de solicitud, seguimiento y recepción de materiales, insumos y componentes, tanto de origen nacional como importado, las cuales se encuentran soportadas en los anexos correspondientes (registros fotográficos y evidencias de pedidos), dando cuenta de una gestión activa y permanente del proceso productivo.

A la fecha, el proceso de fabricación y ensamblaje presenta un avance aproximado del sesenta por ciento (60 %) respecto del total previsto. Dicho avance corresponde a actividades estructurales y de alto impacto dentro del proceso productivo.

En cuanto al estado físico de las bicicletas, se cuenta con:

- Diseño y fabricación de los marcos en madera conforme a las especificaciones técnicas.
- Cuatro (4) cuadros ensamblados.
- Un (1) cuadro adicional con llantas instaladas, correspondiente a un proceso de ensamblaje avanzado.

El avance descrito evidencia un progreso material, real y verificable en la conformación de las bicicletas. No obstante, la finalización del proceso de ensamblaje se encuentra condicionada a la integración de componentes críticos, sin los cuales no es técnicamente posible culminar el producto final conforme a las condiciones de seguridad, funcionalidad y calidad exigidas.

En particular, se encuentran pendientes componentes mecánicos específicos principalmente integrados o bujes traseros cuyo suministro depende de proveedores externos. El seguimiento a dichos componentes ha sido constante y se encuentra debidamente documentado en los anexos.


Como parte de la gestión adelantada, se destacan los siguientes hitos relevantes del proceso:


- 10 de noviembre de 2025: se logró asegurar el suministro de la madera estructural requerida para la fabricación de los marcos, luego de presentarse una disponibilidad limitada del material en el mercado local, situación que requirió la gestión con proveedores para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
- 17 de diciembre de 2025: se realizó la solicitud y confirmación de compra de los bujes traseros o integrados, referencia que presentó dificultades de disponibilidad en el mercado, siendo localizada a través de proveedor en Miami, con un tiempo estimado de entrega de ocho (8) a diez (10) días hábiles.
- 18 de diciembre de 2025: recepción de frenos de seguridad para las bicicletas, provenientes de proveedor nacional, permitiendo avanzar en fases posteriores del ensamblaje.


En consecuencia, el estado actual del proceso refleja ejecución efectiva, avance sustancial y gestión diligente, así como la existencia de condiciones objetivas de suministro que inciden directamente en los tiempos inicialmente estimados para la finalización del proceso de fabricación y ensamblaje.


El presente documento se emite como soporte técnico del estado real de avance, y se acompaña de los anexos que evidencian el registro fotográfico del proceso y el seguimiento a pedidos y suministros.


JUAN PALOS S.A.S.

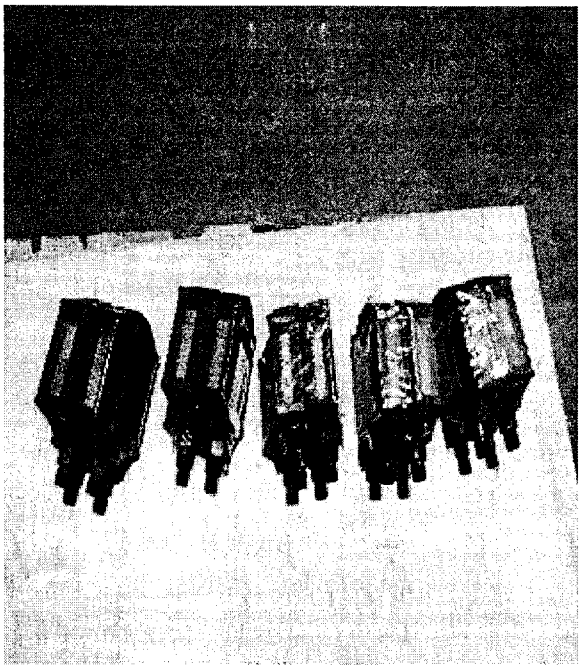


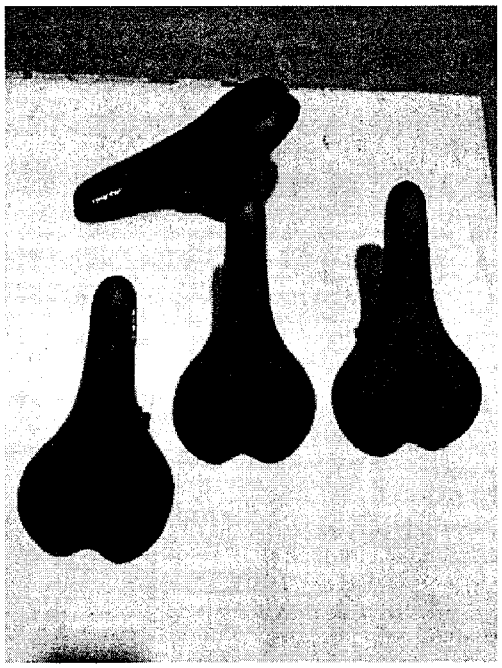

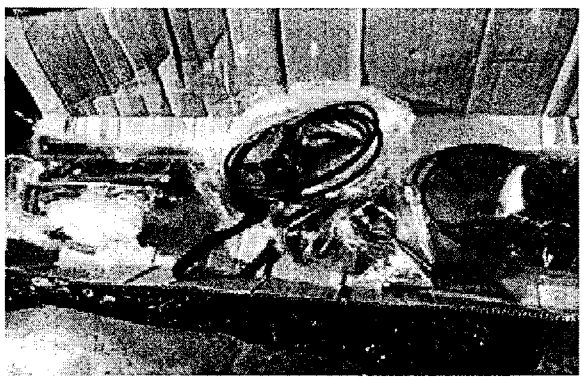




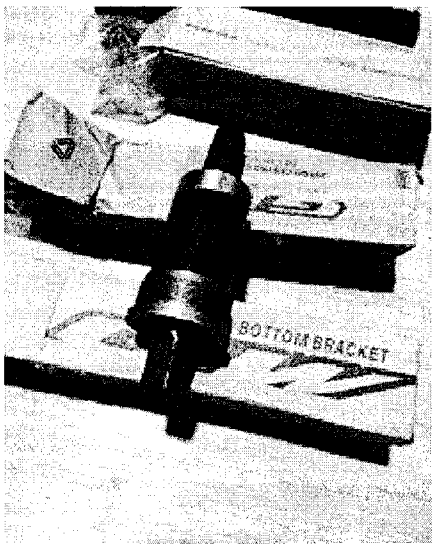


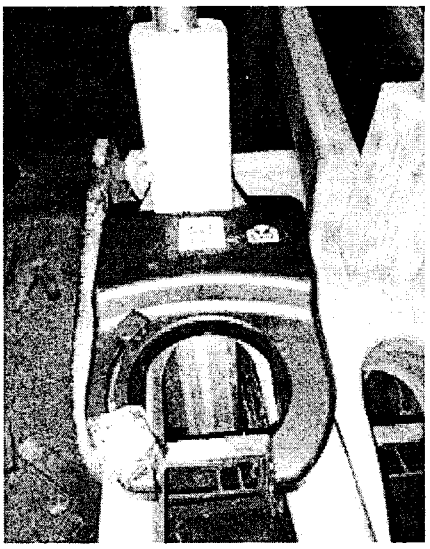

JUAN PALOS S.A.S.



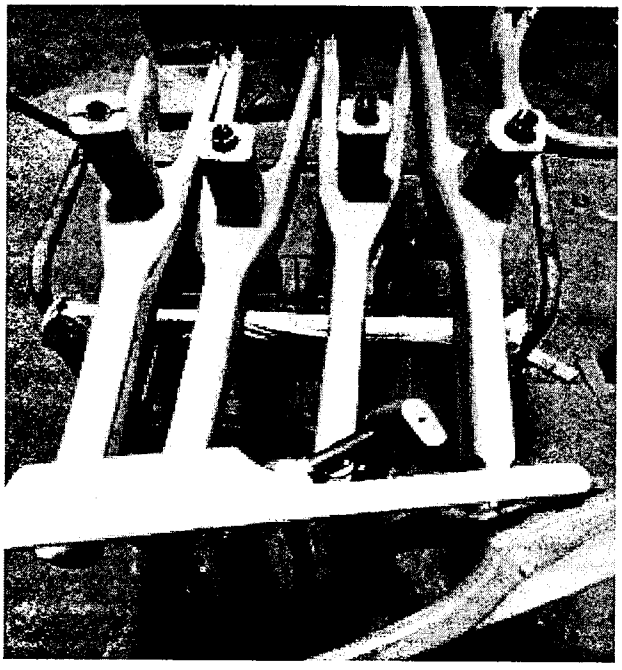

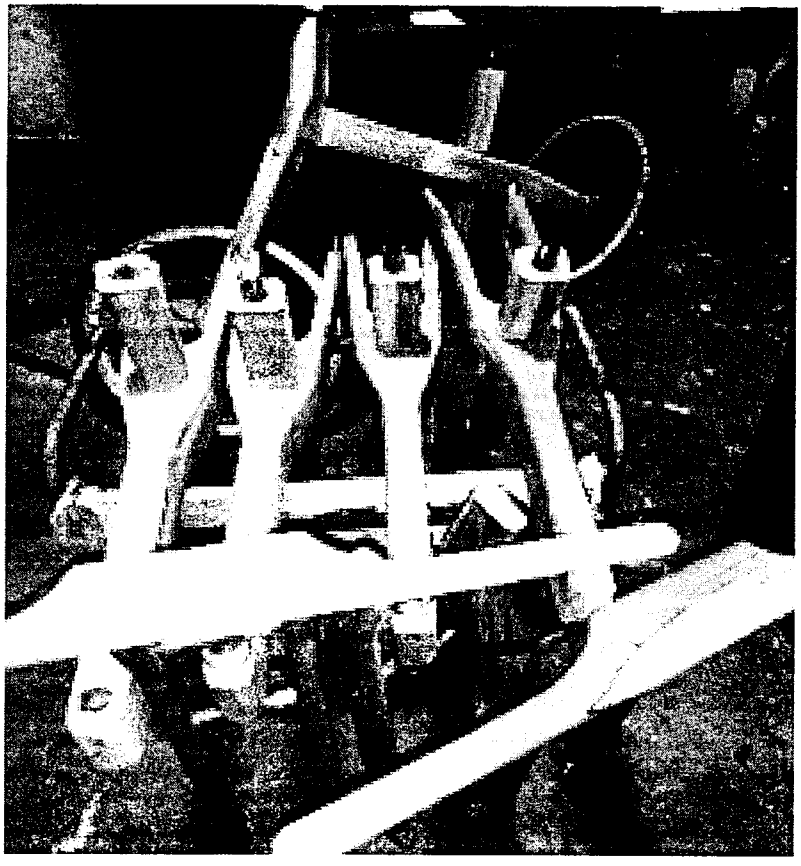

JUAN PALOS S.A.S.

Información del paquete bolsa 500mm x 600mm



Detalles del pedido >

Enviar a Jorge Altuzarra, Carrera 12 # 69 - 158, Torr... >

Servicio de mensajería: 99minutos 99Minutos

Número de seguimiento: 4172330136 Copiar

ⓘ Tu paquete está en camino a tu país. La información de seguimiento estará disponible en el sitio web de 99Minutos después de que llegue y 99Minutos recoja el paquete. Ver detalles >

Pedido enviado Cancelar suscripción

martes | 16 diciembre 2025, 8:08 pm

Ver más

Información del paquete bolsa 500mm x 600mm



Detalles del pedido >

Enviar a Jorge Altuzarra, Carrera 12 # 69 - 158, Torr... >

99minutos 2617558171 Contactar

ⓘ Tu paquete está en camino a tu país. La informa

En tránsito Cancelar suscripción

El vuelo que transporta el paquete ha despegado. Es posible que el envío se haya demorado debido a que los vuelos de conexión son limitados. Ten la seguridad de que actualizaremos la información de seguimiento lo antes posible para garantizar una entrega sin problemas.

Tus pedidos

Todos Procesando Enviado Entregado Devc


Paquete 1 >

Paquete llegó al aeropuerto



Paquete 2 >

El vuelo despegó



Paquete 3 >

Recogido por la empresa de de



Paquete 4 >

El vuelo despegó



Paquete 5 >

Pedido enviado



Información del paquete bolsa 650mm x 700mm



Detalles del pedido >

Enviar a Jorge Altuzarra, Carrera 12 # 69 - 158, Torr... >

envia 014154523888 Contactar

ⓘ Tu paquete está en camino a tu país. La informa

En tránsito Cancelar suscripción

EN BODEGA ORIGEN

CO

jueves | 18 diciembre 2025, 6:00 am

Ver más

JUAN PALOS S.A.S.

En tránsito

Información del paquete bolsa 380mm x 470mm



Detalles del pedido >

Enviar a Jorge Altuzarra, Carrera 12 # 69 - 158, Torr... >

Servicio de mensajería: J&T... J&T express
Número de seguimiento: JTC000015027423 Copiar

ⓘ Tu paquete está en camino a tu país. La información de seguimiento estará disponible en el sitio web de J&T express después de que llegue y J&T express recoja el paquete. Ver detalles >

ⓘ Lo sentimos, la nueva actualización del seguimiento de tu paquete aún no está disponible debido al despacho aduanero. Cuando se complete el despacho aduanero, J&T express recibirá tu paquete lo antes posible. [illegible]

Despacho aduanero Cancelar suscripción

Recogido por la empresa de despacho aduanero

Preparado para el... | Revisado por aduana | Autorizado por aduana | Transferido al servicio...

sábado | 13 diciembre 2025, 5:39 pm

Información del paquete bolsa 500mm x 600mm



Detalles del pedido >

Enviar a Jorge Altuzarra, Carrera 12 # 69 - 158, Torr... >

Servicio de mensajería: 99 minutos 99Minutos
Número de seguimiento: 4172330136 Copiar

ⓘ Tu paquete está en camino a tu país. La información de seguimiento estará disponible en el sitio web de 99Minutos después de que llegue y 99Minutos recoja el paquete. Ver detalles >

Pedido enviado Cancelar suscripción

martes | 16 diciembre 2025, 8:08 pm

Información del paquete bolsa 500mm x 600mm



Detalles del pedido >

Enviar a Jorge Altuzarra, Carrera 12 # 69 - 158, Torr... >

99 minutos 3109018025 Contactar >

ⓘ Tu paquete está en camino a tu país. La informa...

En tránsito Cancelar suscripción

Tu paquete ha llegado al país de destino y está en preparación para el despacho aduanero. Es posible que tarde un poco y actualizaremos la información de seguimiento lo antes posible para garantizar una entrega sin problemas.

Crédito de $4.000 si se entrega después del 6 ene

martes | 16 diciembre 2025, 8:55 pm

En transito
Paquete llegó al aeropuerto
domingo | 14 diciembre 2025, 8:55 pm

Información del paquete bolsa 650mm x 700mm



Detalles del pedido >

Enviar a Jorge Altuzarra, Carrera 12 # 69 - 158, Torr... >

6619028283869347 Contactar >

ⓘ Tu paquete está en camino a tu país. La informa...

En tránsito Cancelar suscripción

Paquete llegó al aeropuerto, a la espera de vuelo
miércoles | 17 diciembre 2025, 10:00 am

Ver más

JUAN PALOS S.A.S.



envia

Rastrea

Guia #

Ajuste temporal

en nuestros tiempos de entrega

Por el alto volumen de envios de temporada, **durante los próximos días** tendremos un ajuste en los tiempos de entrega:

Bogotá: +2 días
Cali: +2 días
Medellín: +2 días

Fecha de envio: **18/12/2025 00:00**

Datos remitente
Nombre:**CAN03**
Cantidad de unidades:**1**
Origen: **BOGOTA**

Datos destinatario
Nombre:**JO*** AL*******
Destino:**IBAGUE-TOLIMA**

Estado:
EN BODEGA ORIGEN
EN BOGOTA

Información del paquete bolsa 500mm x 600mm

x5 **Detalles del pedido >**

Enviar a Jorge Altuzarra, Carrera 12 # 69 - 158, Torr... >

Servicio de mensajería: 99 minutos **99Minutos**
Número de seguimiento: 4172330136 Copiar

Tu paquete está en camino a tu país. La información de seguimiento estará disponible en el sitio web de 99Minutos después de que llegue y 99Minutos recoja el paquete. **Ver detalles >**

Pedido enviado Cancelar suscripción
martes | 16 diciembre 2025, 8:08 pm

Ver más

DFPDE.400.403

Recibido.
23/12/2025
2:55PM

Ibagué, 23 de diciembre de 2025

PARA: AURA NATALIA RAMÍREZ ROZO
SECRETARIA GENERAL

DE: LAURA VICTORIA URREGO
Profesional Universitario 219-04

ASUNTO: Radicación de solicitud de modificación del contrato N° 386 de 2026- prorroga N°01

Respetada Doctora Aura, recibe un cordial saludo:

Por medio del presente documento, nos permitimos remitir la solicitud de modificación del contrato 386 de 2025 cuyo objeto es "Contratar el suministro de bicicletas mecánicas y asistidas inteligentes, junto con la provisión del servicio de acceso y uso de plataformas digitales en la modalidad de software como servicio en la nube (SaaS), para la gestión tecnológica integral del programa 'Rueda por Ibagué', con el fin de promover la movilidad sostenible y amigable con el medio ambiente en el municipio de Ibagué.

Lo anterior, para su revisión y respectiva aprobación.

Cordialmente,

Laura Urrego O

LAURA VICTORIA URREGO
Profesional Universitario 219-04
