INFORME NO. 8 CONTRATO CC 0088 DEL 2024

OBJETO: ESTUDIO PARA ESTABLECER SI HAY UNA RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD MINERA A GRAN ESCALA Y LA ESCASEZ DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES WAYÚU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON BPIN: 20233218000011

PRESENTA:

AGENCIA ESPACIAL DE COLOMBIA

Fecha: 04 de septiembre de 2025

Corte: Del 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025

HOJA CONTROL

INFORME DE AVANCE

Informe de actividades N° 8 Periodo reportado:	Desde: 01 de agosto de 2025	Hasta: 31 de agosto de 2025	Fecha de Acta de Inicio: 24 de enero 2025
Profesionales que intervienen en la elaboración:		Equipo administrativo, técnico y social. AGENCIA ESPACIAL DE COLOMBIA	

Este reporte ha sido preparado por el **AGENCIA ESPACIAL DE COLOMBIA** con un conocimiento razonable, con el cuidado y la diligencia establecidos en los términos del Contrato 0088 del 2024 suscrito con CORPOGUAJIRA.

Este informe es confidencial al cliente, no acepta cualquier responsabilidad en absoluto, si otros tienen acceso a parte o a la totalidad del informe**.**

Anotaciones:

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 8
3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 10
4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 20
5. ASPECTOS FINANCIEROS 21
6. ASPECTOS JURÍDICOS 27
7. REVISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 28
8. CONTROL DE CORRESPONDENCIA 29

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Localización del área de estudio 9

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Información general del Contrato 5
Tabla 2. Cronograma general del proyecto 6
Tabla 3. Presupuesto general del contrato 7
Tabla 4 Ponderación y avance actividades realizadas en el periodo del informe 10
Tabla 5. Actividades realizadas durante el periodo de este informe 11
Tabla 6. Avance físico de las actividades en la ejecución del Contrato 0088 de 2024 15
Tabla 7. Honorarios e IBC del personal del proyecto 20
Tabla 8. Balance financiero del contrato 21
Tabla 9. Ejecución financiera general 21
Tabla 10. Avance financiero del Contrato 23
Tabla 11. Reporte de gastos ejecutados por el Consorcio durante el período del informe. 25
Tabla 12. Detalle de la Garantía de Cumplimiento 27
Tabla 13. Detalle de la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 27
Tabla 14. Relación de correspondencia enviada por la AEC 29
Tabla 15. Relación de correspondencia recibidas Consorcio INTERMINERIA 29

1. **INTRODUCCIÓN**

El presente documento constituye el informe de actividades mensuales No. 8 del CC 0088 de 2024 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA y la Agencia Espacial de Colombia-AEC, cuyo objeto es realizar un estudio para establecer si hay una relación entre la actividad minera a gran escala y la escasez de agua potable para las comunidades Wayúu del Departamento de La Guajira.

Con base en la modificación del cronograma del Plan de Trabajo aprobado por la interventoría CONSORCIO INTER MINERIA mediante oficio CIM-2025-058 del 15 de julio de 2025. Las actividades reportadas por la AEC incluyen el avance realizado en el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025. En preliminar, a continuación, se presenta una información general del contrato de consultoría.

Tabla 1. Información general del Contrato

Contrato No.	CC 0088 de 2024	**Fecha de suscripción**	**Día**	**Mes**	**Año**
			03	09	2024
Fecha de suscripción del acta de inicio	24 de enero de 2025				
Objeto	Estudio para establecer si hay una relación entre la actividad minera a gran escala y la escasez de agua potable en las comunidades Wayúu del departamento de La Guajira con BPIN: 20233218000011.				
Objetivo General	Realizar estudios para establecer si hay una relación entre la actividad minera a gran escala y la escasez de agua potable para las comunidades Wayúu del Departamento de La Guajira.				
Objetivos Específicos	1. Generar información sobre la caracterización del recurso hídrico en el área de influencia de complejos de minería a gran escala. 2. Determinar las posibles causas de la escasez de agua en las comunidades indígenas Wayúu del departamento de La Guajira.				
Contratista	Agencia Espacial de Colombia	**NIT**	901176592-2		
Representante Legal	Pilar Zamora Acevedo	**C.C.**	52813469		
Valor Contrato	Tres mil trecientos cuarenta millones seiscientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos ($3.340.628.653) M/L	**Plazo**	Catorce (14) meses		
Fecha de inicio	24/01/2025	**Fecha de finalización**	21/03/2026		

Fuente: AEC

El tiempo programado para el estudio para establecer si hay una relación entre la actividad minera a gran escala y la escasez de agua potable en las comunidades Wayúu del departamento de La Guajira con BPIN: 20233218000011 es de **catorce (14) meses**, distribuidos por actividades como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Cronograma general del proyecto

ACTIVIDAD	DURACIÓN (días)	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FIN (DD/MM/AA)
Realizar la identificación, consolidación, revisión y análisis de la información existente referente a las fuentes hídricas en territorio indígena Wayuu (Estudios, Autorización Ambientales, informes de seguimiento, normas, instrumentos de planificación, administración y seguimiento de los recursos naturales, entre otros) y las modificaciones efectuadas, en las temporalidades trabajadas por las entidades de control.	212	01/02/2025	31/08/2025
Evaluar el estado y dinámica de las principales fuentes hídricas presentes en las zonas con presencia de comunidad indígena Wayúu, en mención de la sentencia T-302-17.	214	01/04/2025	31/10/2025
Evaluar la situación multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso hídrico.	214	01/05/2025	30/11/2025
Generación de información cartográfica actualizada.	334	01/04/2025	28/02/2026
Determinar la incidencia de las actividades de megaminería sobre la oferta hídrica en la comunidad indígena wayuu, con base en la información recopilada y generada.	120	01/11/2025	28/02/2026
Identificar las causas de la escasez de agua que se presenta en las comunidades indígenas wayuu que habitan en la alta y media guajira.	120	01/11/2025	28/02/2026
Realizar la socialización, publicidad y divulgación del proyecto.	423	01/02/2025	20/03/2026
Definir las zonas y medidas en procura de minimizar los impactos ambientales que posibiliten la recuperación de los territorios con afectación de cauces de consumo humano.	110	01/12/2025	20/03/2026

Fuente: AEC

De igual forma, se presenta el presupuesto general para la ejecución del contrato en la Tabla 3. Presupuesto general del contrato

Tabla 3. Presupuesto general del contrato

ACTIVIDAD	Subtotal	IVA	TOTAL + IVA
Realizar la identificación, consolidación, revisión y análisis de la información existente referente a las fuentes hídricas en territorio indígena Wayuu (Estudios, Autorización Ambientales, informes de seguimiento, normas, instrumentos de planificación, administración y seguimiento de los recursos naturales, entre otros) y las modificaciones efectuadas, en las temporalidades trabajadas por las entidades de control.	$ 338.651.281,00	$ 64.343.743,39	$ 402.995.024,39
Evaluar el estado y dinámica de las principales fuentes hídricas presentes en las zonas con presencia de comunidad indígena Wayúu, en mención de la sentencia T-302-17.	$ 552.267.800,00	$ 104.930.882,00	$ 657.198.682,00
Evaluar la situación multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso hídrico.	$ 347.263.200,00	$ 65.980.008,00	$ 413.243.208,00
Generación de información cartográfica actualizada.	$ 838.320.000,00	$ 159.280.800,00	$ 997.600.800,00
Determinar la incidencia de las actividades de megaminería sobre la oferta hídrica en la comunidad indígena wayuu, con base en la información recopilada y generada.	$ 226.730.640,00	$ 43.078.821,60	$ 269.809.461,60
Identificar las causas de la escasez de agua que se presenta en las comunidades indígenas wayuu que habitan en la alta y media guajira.	$ 231.704.400,00	$ 44.023.836,00	$ 275.728.236,00
Realizar la socialización, publicidad y divulgación del proyecto.	$ 43.566.288,00	$ 8.277.594,72	$ 51.843.882,72
Definir las zonas y medidas en procura de minimizar los impactos ambientales que posibiliten la recuperación de los territorios con afectación de cauces de consumo humano.	$ 228.747.360,00	$ 43.461.998,40	$ 272.209.358,40
Total	$ 2.807.250.969,00	$ 533.377.684,11	$ 3.340.628.653,11

Fuente: AEC


2. **GENERALIDADES**

La Guajira es la zona más desértica del país, cuya principal fuente hídrica es la cuenca del río Ranchería, en donde habita la mayoría de la población Wayúu. La cuenca del río Ranchería, cuenta con una superficie de 4.070 km^2 de extensión y está localizada en la parte media y baja de La Guajira. En el recorrido que hace desde su nacimiento hasta su desembocadura, pasa por los municipios de Riohacha, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao y Manaure y es el aportante principal para la actividad agrícola y ganadería de la zona. En los últimos años la explotación de carbón térmico se ha constituido en una fuente importante de recursos económicos para el país, siendo el departamento de La Guajira, el segundo productor del combustible fósil. La explotación en la minería en el departamento de La Guajira se hace a cielo abierto, lo cual genera gran cantidad de contaminantes atmosféricos que se depositan en los suelos y los cuerpos de agua. Entre estos contaminantes producto de la minería y sus procesos se encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados, que no solo contaminan las aguas superficiales y profundas, sino los sedimentos, la flora y la fauna que allí habita.

Como consecuencia de la problemática socioambiental y de la tutela interpuesta el 5 de febrero de 2016 por los casos de desnutrición y muerte infantil que registra cifras de hasta 4770 niños de la comunidad Wayúu entre 2009 y el 2016, la Corte Constitucional profirió la sentencia T 302 el 8 de mayo del 2017. En dicha sentencia, se ordena al señor presidente de la república para el momento iniciar o dar continuidad al plan de acción para mitigar la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas Wayúu. Dentro de los aspectos a tener en cuenta en dicho plan de acción se deben "*Tomar las medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener a la brevedad posible, acceso a agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de las niñas y los niños*".

Dentro de dicho plan de acción se requiere contar con insumos técnicos fehacientes para establecer si hay una relación entre la actividad minera a gran y la escasez de agua potable para las comunidades Wayúu. Por lo anterior, CORPOGUAJIRA abre una licitación para realizar un estudio para determinar la incidencia de las actividades mieras extractivas sobre la disponibilidad y calidad de agua en la cuenca del río Ranchería.

Figura 1. Localización del área de estudio

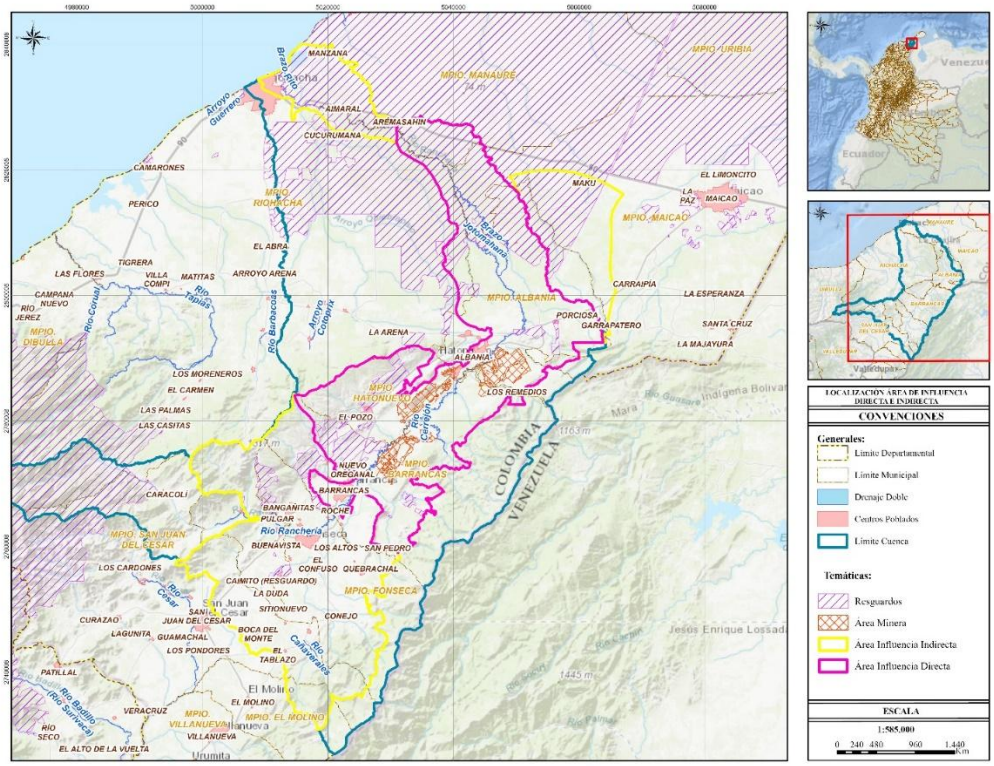

Fuente: AEC

Tras la recepción de ofertas técnico-económicas y su minuciosa evaluación por parte de CORPOGUAJIRA el contrato CC 0088 DE 2024 es adjudicado a la Agencia Espacial de Colombia quien suscribe el mismo el 03 de septiembre del 2024 y se inicia la ejecución del mismo tras la firma del acta de inicio el pasado 24 de enero de 2025, una vez es adjudicado el Contrato de la Interventoría al Consorcio INTER MINERIA el día 22 de enero del año 2025. La AEC cuenta con una alta capacidad y cobertura satelital sobre el territorio colombiano con un archivo de imágenes satelitales de hasta 20 años, de resoluciones espaciales de hasta 15 cm/píxel y espectrales de hasta 12 bandas del espectro y para el caso del Departamento de la Guajira tiene una cobertura espacial del 100% del territorio regional.

Con la ejecución de este proyecto, se busca obtener más información respecto a la dinámica y tendencias del recurso hídrico subterráneo y superficial en el área de influencia directa de las zonas donde se realizan actividades de minería a gran escala, mediante estudios hidrológicos e hídricos, que permitan establecer, si dichas actividades han tenido algún efecto contraproducente en la oferta hídrica total. Por otra parte, como producto de la ejecución del estudio se determinarán las causas de mayor incidencia en la problemática de escasez de agua, permitiendo contar con una línea base, a partir de la cual se puedan tomar decisiones para dar solución parcial o total a dicha problemática planteada desde la misma comunidad.

3. **ACTIVIDADES TÉCNICAS**

De acuerdo con las tareas definidas en el cronograma de actividades del Plan de Trabajo modificado, avalado por el Consorcio INTER MINERIA mediante el comunicado CIM-2025-058, en la siguiente tabla se reportan las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025, así como la perspectiva que se tiene para el próximo período. En el presente periodo se reporta un avance de ejecución del 28,20% respecto al 100% de las actividades previstas en el estudio. Actualmente, se encuentran en desarrollo las actividades 2, 3 y 4, con un avance del 6,88%, 0,13% y 8,14% de cumplimiento, respectivamente, en relación con lo programado para cada una de ellas. Por su parte, la actividad 1 se encuentra en proceso de revisión para concepto, dado que fue finalizada el 31 de agosto y sus productos fueron radicados el 29 de agosto mediante el comunicado AEC-2025-107.

Tabla 4 Ponderación y avance actividades realizadas en el periodo del informe

Objetivo específico	EDT	Actividad	Ponderación	Avance ponderado acumulado agosto 2025	Avance total de la Actividad ejecutada
Generar información sobre la caracterización del recurso hídrico en el área de influencia de complejos de minería a gran escala.	1	Realizar la identificación, consolidación, revisión y análisis de la información existente referente a las fuentes hídricas en territorio indígena Wayúu (Estudios, Autorización Ambientales, informes de seguimiento, normas, instrumentos de planificación, administración).	12,1%	12.1%	100%
	2	Evaluar el estado y dinámica de las principales fuentes hídricas presentes en las zonas con presencia de comunidad indígena Wayúu, en mención de la sentencia T-302-17.	19,7%	6.88%	34.90%
	3	Evaluar la situación multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso hídrico.	12,2%	0,13%	1.05%
	4	Generar información cartográfica actualizada	29,9%	8.14%	27.22%
Determinar las posibles causas de la escasez de agua en las comunidades	5	Determinar la incidencia de las actividades de megaminería sobre la oferta hídrica en la comunidad indígena Wayúu,	8,1%	0,00%	0%

Objetivo específico	EDT	Actividad	Ponderación	Avance ponderado acumulado agosto 2025	Avance total de la Actividad ejecutada
indígenas Wayúu del departamento de La Guajira.		con base en la información recopilada y generada			
	6	Identificar las causas de la escasez de agua que se presenta en las comunidades indígenas Wayúu.	8,3%	0,00%	0%
	7	Realizar la socialización, publicidad y divulgación del proyecto.	1,6%	0,96%	60%
	8	Definir las zonas y medidas en procura de minimizar los impactos ambientales que posibiliten la recuperación de los territorios en donde se afectan cauces, de los cuales las comunidades obtienen agua para su uso diario.	8,1%	0,00%	0%
Totales			100%	28.20%	28.20%

Fuente: AEC

En la Tabla 5 se presentan las actividades realizadas durante el este periodo de actividades. Los soportes pueden ser consultados en la carpeta de anexos (Anexo informe 8)

Tabla 5. Actividades realizadas durante el periodo de este informe

EDT	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AVANCE DE ACTIVIDADES AGOSTO 2025
1 Realizar la identificación, consolidación, revisión y análisis de la información existente referente a las fuentes hídricas en territorio indígena Wayúu (Estudios, Autorización Ambientales, informes de seguimiento, normas, instrumentos de planificación, administración).			
1.1	Recopilación de información desde 1970	Se adjunta el oficio AEC-025-107 del 29 agosto de 2025, correspondiente a la entrega de productos de las Actividades N.° 1 y N.° 7 del Contrato de Consultoría N.° 0088-2024. Este producto se encuentra disponible en la carpeta. 01_Repositorio_0088_2024	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_1\Oficio_Entrega
1.2	Organización de la información	La AEC respondió las observaciones de la Interventoría el 29 de agosto de 2025 mediante el oficio AEC-2025-107. Esto se	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_1\Oficio_Entrega

EDT	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AVANCE DE ACTIVIDADES AGOSTO 2025
		evidencia en la carpeta. 01 Repositorio 0088 2024 Incluye recopilación de la información secundaria disponible sobre las diferentes temáticas clave para el desarrollo del estudio que fue organizada de acuerdo con las observaciones recibidas en el comunicado CIM-2025-069, previamente radicadas en el oficio AEC-2025-102 – Observaciones a propuesta de codificación de información.	
1.3	Recopilar la cartografía histórica	Se adjunta el oficio AEC-025-107 del 29 de agosto de 2025, correspondiente a la entrega de productos de las Actividades N.° 1 y N.° 7 del Contrato de Consultoría N.° 0088-2024. Este producto se encuentra disponible en la carpeta. 01 Repositorio 0088 2024	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_1\Oficio_Entrega
1.4	Análisis multitemporal con información secundaria	De acuerdo con la información recopilada, se realizó una clasificación de los insumos en documental, bases de datos y cartografía, con el fin de identificar su cobertura espacial y temporal, esta información fue radicada mediante el oficio AEC-2025-107 del 29 de agosto de 2025. Este producto se encuentra disponible en la carpeta. 02 Analisis Insumos	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_1\Oficio_Entrega
1.5	Evaluación del cumplimiento de directrices de manejo de los recursos naturales	De acuerdo con la información recopilada en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) y en los expedientes LAM1094 y LAM3491, se organizó una carpeta con los autos, resoluciones y conceptos, generando un reporte del seguimiento ambiental por parte de las autoridades competentes en el área de estudio. Este producto se encuentra disponible en la carpeta, radicada en el oficio AEC-2025-107 del 29 de agosto de 2025. 03 Cumplimiento ambiental	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_1\Oficio_Entrega

EDT	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AVANCE DE ACTIVIDADES AGOSTO 2025
1.6	Acceso a plataforma en la nube para consulta y descarga de imágenes satelitales de alta resolución espacial y espectral	Desde el 1 de febrero de 2025, la plataforma de imágenes satelitales estuvo disponible para acceder a la plataforma. Esto en concordancia con el PDT, encontraran una carpeta en el marco del cierre de la Actividad 1, en la cual se consolidó un documento que explica los insumos descargados de la plataforma, junto con las imágenes requeridas para el estudio. Así mismo, durante este período se entregaron a la supervisión del contrato las credenciales de acceso y el manual de uso correspondiente. Este producto se encuentra disponible en la carpeta. 05_Plataforma_MAXAR.	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_1\MGP_PRO
2 Evaluar el estado y dinámica de las principales fuentes hídricas presentes en las zonas con presencia de comunidad indígena Wayúu, en mención de la sentencia T-302-17.			
2.1	Caracterización de unidades hídricas superficiales	La AEC realizó la identificación y delimitación de las principales unidades hídricas superficiales presentes en el área de estudio, mediante el uso de información cartográfica, registros hidrológicos y bases de datos oficiales de la red hidrográfica. Asimismo, se elaboró el informe morfométrico, en el cual se analizan parámetros como área de drenaje, densidad de drenaje, pendiente media, forma de la cuenca y tiempo de concentración, insumos fundamentales para explicar la respuesta hidrológica del sistema frente a eventos de precipitación.	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_2\Hidrologia
2.2	Caracterización del régimen hidrológico.	Se avanzó en el cálculo del balance hídrico del área de estudio, este ejercicio permitirá identificar preliminarmente los periodos de excedentes y déficit hídricos, los cuales son determinantes para evaluar la disponibilidad de agua y la presión de la demanda	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_2\Hidrologia
2.3	Análisis de frecuencia de caudales.	Se presenta un avance en la recopilación, depuración y análisis de las series históricas de caudal de las estaciones hidrológicas de referencia en la cuenca. Con esta información se están aplicando métodos de estadística hidrológica para	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_2\Hidrologia

EDT	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AVANCE DE ACTIVIDADES AGOSTO 2025
		la estimación de curvas de probabilidad y periodos de retorno de eventos extremos. Asimismo, se elaboraron mapas de isoyetas con base en la información pluviométrica disponible, los cuales permiten estimar la distribución espacial de la precipitación en la cuenca y sirven como insumo para la modelación hidrológica y la caracterización de los caudales medios y extremos.	
2.5	Modelo hidrogeológico conceptual	Dentro de las subactividades de la construcción del modelo hidrogeológico conceptual se encuentra la elaboración del modelo geológico a escala 1:25.000 de la zona de estudio. Para este fin, durante el presente mes se culminó la fase de campo, la cual constituye un insumo esencial, ya que permite la verificación y ajuste de la información cartográfica y bibliográfica previamente recopilada. En esta etapa se realizó la identificación y caracterización directa de afloramientos, estructuras, contactos litológicos y unidades estratigráficas, así como la toma de datos geológicos puntuales que aseguran mayor precisión en la delimitación espacial de las formaciones, garantizando de esta manera la construcción de un modelo geológico coherente, confiable y representativo de la realidad del área de estudio.	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_2\Campo
2.6	Trabajo de campo	Se culminó satisfactoriamente el trabajo de campo para la toma de muestras de calidad de agua en los 73 puntos de monitoreo establecidos, garantizando la cobertura completa del área de estudio. Adicionalmente, a través de contratistas de la AEC, se ejecutaron 24 pruebas de infiltración, cuyos resultados constituyen un insumo fundamental para el análisis de las condiciones hidrológicas y de recarga del sistema.	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_2\Campo
3. Evaluar la situación multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso hídrico			

EDT	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	AVANCE DE ACTIVIDADES AGOSTO 2025
3.1	Realización de modelo conceptual de amenazas del sistema hídrico.	Se envía la propuesta metodológica de acuerdo con los insumos disponibles para el desarrollo de esta actividad	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_3\Propuesta
4 Generar información cartográfica actualizada			
4.2	Consulta y descarga de información cartográfica y espacial para el área de estudio	Se generaron los Modelos Digitales de Elevación correspondientes a los años 2006, 2011, 2020 y 2024, a partir de la información de la cartobase y de puntos de nivelación geodésica.	Anexos_Informe_Mensual_8\Anexo1_Tecnicos\Actividad_4\Cartografia
4.3	Validación técnica de calidad de información existente	Se está realizando la validación técnica de la cartobase a partir de los insumos suministrados por el IGAC.	

Fuente: AEC

Adicionalmente, se acompañó a la supervisión del contrato en el desarrollo de la auditoría fiscal practicada por la Contraloría General de la República durante la semana del 25 al 29 de agosto de 2025 en la ciudad de Riohacha.

En la Tabla 6 se relacionan las subactividades que componen el proyecto, con la ponderación realizada en la definición y cuantificación de indicadores del PDT, de igual forma se presenta el cálculo en el avance del desarrollo de las subactividades de acuerdo con la ponderación ejecutada durante el período del informe con respecto a esta ponderación.

Tabla 6. Avance físico de las actividades en la ejecución del Contrato 0088 de 2024

Objetivo específico	EDT	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	Ponderación Total Actividad	Avance ponderado acumulado agosto 2025
Generar información sobre la caracterización del recurso hídrico en el área de influencia de complejos de minería a gran escala.	**1**	**Realizar la identificación, consolidación, revisión y análisis de la información existente referente a las fuentes hídricas en territorio indígena Wayúu (Estudios, Autorización Ambientales, informes de seguimiento, normas, instrumentos de planificación, administración).**	**12,1%**	**12.1%**
	1.1	Recopilación de información desde 1970	15,0%	15,0%
	1.2	Organización de la información	10,0%	10,0%
	1.3	Recopilar la cartografía histórica	10,0%	10,0%

Objetivo específico	EDT	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	Ponderación Total Actividad	Avance ponderado acumulado agosto 2025
	1.4	Análisis multitemporal con información secundaria	30,0%	30,0%
	1.5	Evaluación del cumplimiento de directrices de manejo de los recursos naturales	30,0%	30,0%
	1.6	Acceso a plataforma en la nube para consulta y descarga de imágenes satelitales de alta resolución espacial y espectral	5,0%	5,0%
	2	**Evaluar el estado y dinámica de las principales fuentes hídricas presentes en las zonas con presencia de comunidad indígena Wayúu, en mención de la sentencia T-302-17.**	**19,7%**	**6.88%**
	2.1	Caracterización de unidades hídricas superficiales	5,0%	2.5%
	2.2	Caracterización del régimen hidrológico.	10,0%	3.2%
	2.3	Análisis de frecuencia de caudales.	10,0%	2.4%
	2.4	Determinación de la oferta hídrica	20,0%	0,0%
	2.5	Modelo hidrogeológico conceptual	20,0%	6.0%
	2.6	Trabajo de campo	30,0%	22.5%
	2.7	Acceso a plataforma en la nube para consulta y descarga de imágenes satelitales de alta resolución espacial y espectral	5,0%	33%
	3	**Evaluar la situación multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso hídrico.**	**12,2%**	**0,13%**
	3.1	Realización de modelo conceptual de amenazas del sistema hídrico.	45,0%	3.2%
	3.2	Realización de modelo conceptual de vulnerabilidades del sistema hídrico.	50,0%	0,0%
	3.3	Acceso a plataforma en la nube para consulta y descarga de imágenes satelitales de alta resolución espacial y espectral	5,0%	0,0%

Objetivo específico	EDT	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	Ponderación Total Actividad	Avance ponderado acumulado agosto 2025
	4	**Generar información cartográfica actualizada**	**29,9%**	**8.14%**
	4.1	Consulta y descarga de imágenes para la zona de estudio	5,0%	5.0%
	4.2	Consulta y descarga de información cartográfica y espacial para el área de estudio	5,0%	5.0%
	4.3	Validación técnica de calidad de información existente	10,0%	4.5%
	4.4	Generación de curvas de nivel para el área de estudio	20,0%	0,0%
	4.5	Generación de capas de datos vectoriales	25,0%	0,0%
	4.6	Generación de base cartográfica digital en formato GDB	10,0%	0,0%
	4.7	Elaboración de metadato	5,0%	0,0%
	4.8	Control de calidad	15,0%	0,0%
	4.9	Acceso a plataforma en la nube para visualización y descarga de imágenes satelitales	5,0%	0,0%
Determinar las posibles causas de la escasez de agua en las comunidades indígenas Wayúu del departamento de La Guajira.	**5**	**Determinar la incidencia de las actividades de megaminería sobre la oferta hídrica en la comunidad indígena Wayúu, con base en la información recopilada y generada**	**8,1%**	**0,00%**
	5.1	Informe técnico	5,0%	0,0%
	5.2	Analizar oferta hídrica	10,0%	0,0%
	5.3	Generación de cartografía temática	10,0%	0,0%
	5.4	Evaluación de afectación hídrica	20,0%	0,0%
	5.5	Determinar posibles impactos en centros poblados	20,0%	0,0%
	5.6	Análisis de implicaciones para la comunidad indígena Wayúu	20,0%	0,0%
	5.7	Zonificación	10,0%	0,0%
	5.8	Acceso a plataforma en la nube para consulta y descarga de imágenes satelitales de alta resolución espacial y espectral	5,0%	0,0%

Objetivo específico	EDT	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	Ponderación Total Actividad	Avance ponderado acumulado agosto 2025
	6	**Identificar las causas de la escasez de agua que se presenta en las comunidades indígenas Wayúu.**	**8,3%**	**0,00%**
	6.1	Evaluación de causas y determinación de factores de escasez del agua	5,0%	0,0%
	6.2	Matriz de causas	30,0%	0,0%
	6.3	Análisis de impacto ambiental	30,0%	0,0%
	6.4	Análisis jurídico	30,0%	0,0%
	6.5	Acceso a plataforma en la nube para consulta y descarga de imágenes satelitales de alta resolución espacial y espectral	5,0%	0,0%
	7	**Realizar la socialización, publicidad y divulgación del proyecto.**	**1,6%**	**0,96%**
	7.1	Diseño de material	15,0%	15.0%
	7.2	Desarrollo de estrategias de divulgación	15,0%	15.0%
	7.3	Elaboración y socialización del plan de trabajo	30,0%	30.0%
	7.4	Socialización de los resultados del proyecto	40,0%	0,0%
	8	**Definir las zonas y medidas en procura de minimizar los impactos ambientales que posibiliten la recuperación de los territorios en donde se afectan cauces, de los cuales las comunidades obtienen agua para su uso diario.**	**8,1%**	**0,00%**
	8.1	Delimitación de áreas impactadas	5,0%	0,0%
	8.2	Priorización de áreas	10,0%	0,0%
	8.3	Plan de acción	15,0%	0,0%
	8.4	Programa de monitoreo	15,0%	0,0%
	8.5	Reporte final	50,0%	0,0%
	8.6	Acceso a plataforma en la nube para consulta y descarga de imágenes satelitales de alta resolución espacial y espectral	5,0%	0,0%

Objetivo específico	EDT	ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD	Ponderación Total Actividad	Avance ponderado acumulado agosto 2025
Total			**100%**	**28.20%**

Fuente: AEC

Actividades a desarrollar

A continuación, se presentan las actividades que se ejecutarán en el Contrato CC 0088 de 2024 durante el próximo periodo de actividades 01 de septiembre al 30 de septiembre 2025:

- Definición de los valores de recarga potencial (infiltración) hacia los acuíferos presentes en las unidades hidrogeológicas de la zona de estudio.
- Análisis de las muestras recolectadas en campo.
- Generación de curvas de nivel para el área de estudio

4. **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

En la Tabla 7 se presentan los honorarios del personal del proyecto correspondientes al periodo de este informe. En la carpeta Anexos Administrativos se adjuntan las planillas de parafiscales de los profesionales contratados mediante prestación de servicios, durante el mes de **AGOSTO**, de acuerdo con la normativa vigente.

Durante el período del presente informe no se requirió la realización de actividades y/o trámites de tipo administrativo diferentes a las de la operación básica del consultor para el desarrollo del proyecto.

Tabla 7. Honorarios e IBC del personal del proyecto

CARGO	NOMBRE	HONORARIOS MES	IBC
Director del proyecto	Yesica Hasbleidy Serrano Neira	$6,407,421	$ 2.562.969
Experto aspectos sociales	Miguel Ángel Forero	$4,318,800	$1.727.520
Experto calidad agua	Alejandra Caicedo	$4,710,184	$1.884.074
Experto cobertura y usos tierra	Yelena Cárdenas Bernal	$4,667,143	$1.866.858
Experto Forestal Ecólogo	Álvaro Suárez Navarro	$4,234,814	$ 1.693.926
Experto en geología	Diego Alejandro Peña	$4,511,571	$ 1.804.629
Experto hidrogeología	David Monroy Ramos	$4,511,571	$ 1.804.629
Experto hidrología	Crysthian Sánchez Rodríguez	$4,511,571	$ 1.804.629
Experto en suelos	Jaime Serna Vargas	$3,800,000	$ 1,520,000
Experto riesgos	Mónica Acosta Vega	$4,356,000	$ 1.742.400
Experto SIG	Carlos Plata Cabrera	$4,500,000	$ 1.800,000
Profesional apoyo SIG	Alex Javier Carvajal Ortiz	$2,946,429	$ 1.423.500
Vaquiano	Geraldine Niño López	$2,800,000	$ 1,080,000

Fuente: AEC

5. **ASPECTOS FINANCIEROS**

En la Tabla 8 se presenta el balance financiero acumulado del contrato. Para el presente informe, se radicó con el oficio AEC-2025-011 la cuenta de cobro correspondiente al anticipo, equivalente al 50% del valor del contrato, por un monto de $1.670.314.327, la cual aún se encuentra en trámite.

Tabla 8. Balance financiero del contrato

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 3.340.628.653	
MENOS VALOR ANTICIPO[1]		$ 1.670.314.327
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 0
VALOR PAGOS EN TRÁMITE		$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0
VALOR EJECUTADO JUNIO		$243.055.350.
VALOR TOTAL EJECUTADO CTO A 31 AGOSTO		
SUMAS IGUALES	$ 3.340.628.653	

Fuente: AEC

En la Tabla 9 se relacionan las actividades del proyecto con sus valores comprometidos en relación con el valor total de cada una, así como el valor ejecutado durante el período del presente informe y el valor ejecutado acumulado. Para el periodo de actividades durante el periodo 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025, se comprometieron $243.055.350.

Estos compromisos corresponden a los costos del recurso humano para el desarrollo de las actividades 1, y otros costos incluidos en el factor multiplicador.

Tabla 9. Ejecución financiera general

No. Actividad	Descripción de la actividad	Recursos asignados	Compromisos y pagos		% Avance financiero
1	Realizar la identificación, consolidación, revisión y análisis de la información existente referente a las fuentes hídricas en territorio indígena Wayúu (Estudios, Autorización Ambientales, informes de seguimiento, normas, instrumentos de planificación, administración).	$ 402.995.024,39	Comprometido (No Pagado)	$ 75.030.109,96	18,62%
			Pagado	$ 0,00	0,00%

No. Actividad	Descripción de la actividad	Recursos asignados	Compromisos y pagos		% Avance financiero
2	Evaluar el estado y dinámica de las principales fuentes hídricas presentes en las zonas con presencia de comunidad indígena Wayúu, en mención de la sentencia T-302-17.	$ 657.198.682,00	Comprometido (No Pagado)	$ 0,00	0,00%
			Pagado	$ 0,00	0,00%
3	Evaluarla situación multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso hídrico.	$ 413.243.208,00	Comprometido (No Pagado)	$ 0,00	0,00%
			Pagado	$ 0,00	0,00%
4	Generar información cartográfica actualizada	$ 997.600.800,00	Comprometido (No Pagado)		18,8%
			Pagado	$ 181.381.964	0,00%
5	Determinar la incidencia de las actividades de megaminería sobre la oferta hídrica en la comunidad indígena Wayúu, con base en la información recopilada y generada.	$ 269.809.461,60	Comprometido	$ 0,00	0,00%
			Pagado	$ 0,00	0,00%
6	Identificar las causas de la escasez de agua que se presenta en las comunidades indígenas Wayúu que habitan en la alta y media Guajira.	$ 275.728.236,00	Comprometido (No Pagado)	$ 0,00	0,00%
			Pagado	$ 0,00	0,00%
7	Realizar la socialización, publicidad y divulgación del proyecto.	$ 51.843.882,72	Comprometido (No Pagado)	0	28.18%
			Pagado	$14.607.205,00	0,00%
8	Definir las zonas y medidas en procura de minimizar los impactos ambientales que posibiliten la recuperación de los territorios en donde se afectan cauces, de los cuales las comunidades obtienen agua para su uso diario.	$ 272.209.358,40	Comprometido (No Pagado)	$ 0,00	0,00%
			Pagado	$ 0,00	0,00%
TOTAL		**$ 3.340.628.653,11**			

No. Actividad	Descripción de la actividad	Recursos asignados	Compromisos y pagos		% Avance financiero
			Total pagado	$243.055.350	**71%**

Fuente: AEC

En la Tabla 10 se presenta el reporte detallado de los gastos ejecutados por el Consultor durante el período del presente informe. En este periodo, se ejecutaron $243.055.350 para la actividad 1.

Tabla 10. Avance financiero del Contrato

Datos del contrato					Ejecución		Ejecución acumulada		
					Informe de avance				
Actividad	**Unidad**	**Cant.**	**Val. Unit.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**% de ejecución**
Realizar la identificación, consolidación, revisión y análisis de la información existente referente a las fuentes hídricas en territorio indígena Wayúu (Estudios, Autorización Ambientales, informes de seguimiento, normas, instrumentos de planificación, administración).	Numero	1	$ 402.995.024,39	$ 402.995.024,39	0,178	$ 70.445.827,96	0,41	$ 239.079.710,69	**59,33%**
Evaluar el estado y dinámica de las principales fuentes hídricas presentes en las zonas con presencia de comunidad indígena Wayúu, en mención de la sentencia T-302-17.	Numero	1	$ 657.198.682,00	$ 657.198.682,00	0,006	$ 0,00	0,006	$ 24.847.200,00	3,78%
Evaluarla situación multitemporal de las amenazas y vulnerabilidades del recurso hídrico.	Numero	1	$ 413.243.208,00	$ 413.243.208,00	0	$ 0,00	0	$ 24.847.200,00	6,01%
Generar información cartográfica actualizada	Numero	1	$ 997.600.800,00	$ 997.600.800,00	0,006	$ 125.899.233,00	0,006	$ 173.880.033,00	17,43%

Datos del contrato					Ejecución		Ejecución acumulada		
					Informe de avance				
Actividad	**Unidad**	**Cant.**	**Val. Unit.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**% de ejecución**
Determinar la incidencia de las actividades de megaminería sobre la oferta hídrica en la comunidad indígena Wayúu, con base en la información recopilada y generada	Numero	1	$ 269.809.461,60	$ 269.809.461,60	0	$ 0,00	0	$ 16.279.200,00	6,03%
se presenta en las comunidades indígenas Wayúu que habitan en la alta y media Guajira.	Numero	1	$ 275.728.236,00	$ 275.728.236,00	0	$ 0,00	0	$ 16.279.200,00	5,90%
Realizar la socialización, publicidad y divulgación del proyecto.	Numero	1	$ 51.843.882,72	$ 51.843.882,72	0,007	$ 14.607.205,00	0,007	$ 17.555.930,90	33,86%
Definir las zonas y medidas en procura de minimizar los impactos ambientales que posibiliten la recuperación de los territorios en donde se afectan cauces, de los cuales las comunidades obtienen agua para su uso diario.	Numero	1	$ 272.209.358,40	$ 272.209.358,40	0	$ 0,00	0	$ 16.279.200,00	5,98%

Fuente: AEC

Durante el periodo 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025, se ejecutaron **$ 75.030.109,96**, que corresponden a recurso humano y los gastos del factor multiplicador detallados para otros costos de la actividad 1 las cuales incluyen gastos legales y contables otros costos asociados a la administración.

CARGO	NOMBRE	HONORARIOS MES	IBC
Director del proyecto	Yesica Hasbleidy Serrano Neira	$6,407,421	$ 2.562.969
Experto aspectos sociales	Miguel Ángel Forero	$4,318,800	$1.727.520
Experto calidad agua	Alejandra Caicedo	$4,710,184	$1.884.074

Experto cobertura y usos tierra	Yelena Cárdenas Bernal	$4,667,143	$1.866.858
Experto Forestal Ecólogo	Álvaro Suárez Navarro	$4,234,814	$ 1.693.926
Experto en geología	Diego Alejandro Peña	$4,511,571	$ 1.804.629
Experto hidrogeología	David Monroy Ramos	$4,511,571	$ 1.804.629
Experto hidrología	Crysthian Sánchez Rodríguez	$4,511,571	$ 1.804.629
Experto en suelos	Jaime Serna Vargas	$3,800,000	$ 1,520,000
Experto riesgos	Mónica Acosta	$4,356,000	$ 1.742.400
Experto SIG	Carlos Plata Cabrera	$4,500,000	$ 1.800,000
Profesional apoyo SIG	Alex Javier Carvajal Ortiz	$2,946,429	$ 1.423.500
Vaquiano	Geraldine Niño López	$2,800,000	$ 1,080,000

Tabla 11. Reporte de gastos ejecutados por el Consorcio durante el período del informe.

OTROS COSTOS INDIRECTOS		
CONCEPTO/ RUBRO	**Descripcion/Justificación**	**VALOR EJECUTADO**
	SUBTOTAL ACT.1	
RECURSO HUMANO	**SUBTOTAL**	**$ 42.370.767**
Director del proyecto	Pago por servicios	$ 5.500.000
Experto aspectos sociales	Pago por servicios	$ 4.318.800
Experto hidrogeología	Pago por servicios	$4,511,571
Gestor documental	Pago por servicios	$ 3.182.143
Experto hidrología	Pago por servicios	$4,511,571
Experto SIG	Pago por servicios	$4,500,000
Experto Forestal Ecólogo	Pago por servicios	$ 4.234.814
Experto en Geología	Pago por servicios	$ 4.511.571
Experto en Suelos	Pago por servicios	$3,800,000
Experto en Calidad de agua	Pago por servicios	$ 4.000.000
Experto SIG	Pago por servicios	$4,500,000
Profesional apoyo SIG	Pago por servicios	$ 2.946.432
Vaquiano	Pago por servicios	$ $2,800,000

Asesoria Contable tributaria y juridica	**SUBTOTAL**	**$ 5.000.000**
Abogado	Gestion Legal contractual	$ 2.000.000
Asesoria Contable	Gestion contable	$ 3.000.000

ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	SUBTOTAL	$ 18.864.302,77
Arriendo y administración		$ 7.737.716,77
Administración		$ 1.458.072,00
servicios públicos		$ 417.123,00
Mantenimiento y alquiler de equipos		$ 4.200.000,00
papelería		$ 500.000,00
Transporte aéreo		$ 1.800.200,00
Viáticos		$ 300.000,00
Aseo		$ 580.000,00
Software ArcGIS		$ 551.935,00
Gastos de representación		$ 1.319.256,00

Honorarios	SUBTOTAL	$ 8.795.040
Honorarios del consultor		$ 8.795.040

Fuente: AEC

6. **ASPECTOS JURÍDICOS**

En las siguientes tablas se relacionan las Pólizas actualizadas y vigentes, de acuerdo con lo exigido en la minuta contractual, las cuales se encuentran aceptadas por CORPOGUAJIRA en la plataforma SECOP II y se anexan al presente informe.

Tabla 12. Detalle de la Garantía de Cumplimiento

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado ($)	Vigencia
63-44-101016076	Cumplimiento del Contrato	24/01/2025	$668,125,730.60	24/03/2027
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	24/01/2025	$1,670,314,326.50	21/09/2026
	Prestaciones sociales	24/01/2025	$167,031,432.65	21/09/2029
	Calidad del servicio	24/01/2025	$668,125,730.60	24/03/2027

Fuente: AEC

Tabla 13. Detalle de la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado ($)	Vigencia
63-40-101033958	Responsabilidad civil extracontractual	24/01/2024	$520,000,000.00	24/03/2026

Fuente: AEC

7. **REVISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Durante el período del presente informe **no** se presentaron dificultades o situaciones externas que representen un riesgo potencial y/o real a la ejecución del Contrato.

8. **CONTROL DE CORRESPONDENCIA**

En la Tabla 14 se relacionan las comunicaciones enviadas durante el período del presente informe de actividades del proyecto.

Tabla 14. Relación de correspondencia enviada por la AEC

FECHA	RADICADO AGENCIA ESPACIAL DE COLOMBIA	RADICADO CORPOGUAJIRA	ASUNTO
01/08/2025	AEC-2025-102	202508043440060681	Propuesta de codificación del repositorio documental
05/08/2025	AEC-2025-103	202508063440061761	Entrega Informe de Actividades Mensual N.° 7 del Contrato de Consultoría No. 0088-2024
06/08/2025	AEC-2025-104	Copia al correo de la Supervisión del Contrato	Agradecimiento por autorización y apoyo logístico para actividades de campo en predios del Cerrejón – Contrato 0088 de 2024
29/08/2025	AEC-2025-107	202509013440069751	Entrega de productos correspondientes a las Actividades N° 1 y N° 7 del Contrato de Consultoría No. 0088-2024

Fuente: AEC

En la Tabla 15 se listan las comunicaciones recibidas en el período del presente informe de avance por parte del Interventor.

Tabla 15. Relación de correspondencia recibidas Consorcio INTERMINERIA

FECHA	RADICADO INTERVENTORIA	ASUNTO
CIM-2025-067	05/08/2025	Solicitud de entrega de Informe mensual de Avance Nº 7
CIM-2025-068	19/08/2025	Respuesta a oficio AEC-2025-065 - Observaciones a plantillas cartográficas v3.
CIM-2025-069	19/08/2025	Respuesta a oficio AEC-2025-102 - Observaciones a propuesta de codificación de información.
CIM-2025-070	25/08/2025	Respuesta a oficio AEC-2025-103 – Informe Nº 7 de revisión de actividades

Fuente: AEC

Atentamente,

PILAR ZAMORA ACEVEDO
Representante Legal AEC
