INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 426 – 2025

"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META."

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CONTENIDO

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 5
3 POLIZAS DEL CONTRATO 6
4 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 7
4.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 7
4.2. CANTIDADES RECIBIDO FINAL 9
5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 8
5.3. ACTIVIDADES EJECUTA|DAS POR LA SUPERVISIÓN 7
5.4. TAREAS A REALIZADOS 11

6. APORTES SEGURIDAD SOCIAL 23
6.2. PERSONAL DE OBRA 23
7. POR LO ANTES EXPUESTO, EL SUSCRITO SUPERVISOR DETERMINA: 24

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, hacemos un resumen del contrato:

INFORMACIÓN GENERAL		
NO. DE CONTRATO DE SUMINISTRO	426 DE 2025	
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META."**	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA MESETAS (META)	
NIT:	892099317-1	
CONTRATISTA	LAURA STEPHANY MEDINA MORALES CC. 1.006.693.202	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 ($16.463.364,00) NACIONAL COLOMBIANA.	
VALOR ANTICIPO	N/A	
VALOR ADICIÓN	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025	
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	764 de 2025	**FUENTE** 40.01.1400.041.00-2024503300032-2.5.4-1.2.4.3.03
VALOR		$16.463.364,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	1020 DE 2025	12-12-2025
SUPERVISIÓN		
NOMBRE	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ	
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	

ACTO DE DESIGNACIÓN (SUPERVISOR)	NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido en el contrato, se deberán realizar los pagos así:

VALOR Y FORMA DE PAGO

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 ($16.463.364,00) NACIONAL COLOMBIANA.
El Municipio pagará al CONTRATISTA, El Municipio pagará al CONTRATISTA, el valor del contrato a la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, el municipio realizará un único pago al CONTRATISTA, por el cien por ciento (100%) valor total del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Presentación factura del contratista.
2. Informe final del contratista.
3. Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena, ICBF y FIC) y/o impuesto sobre la renta, según corresponda.
4. Actualización de las Garantías.
5. Informe del supervisor del contrato.
6. Planilla y soporte de pago de obligaciones en seguridad social.
7. Acta de terminación y/o liquidación del contrato. Los demás contemplados en las obligaciones del contratista.


De igual manera se señala que los pagos se realizaran de acuerdo al PAC.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista serán tramitadas en el estricto orden que le corresponda según la fecha de radicación.


2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El Municipio de Mesetas se encuentra localizado en la parte occidental de la región del Pie de monte del Departamento del Meta, el proyecto se ubicó en el casco urbano del municipio sus coordenadas elipsoidales son:

PUNTO	COORDENADA NORTE	COORDENADA OESTE
Casco urbano	3° 23'3,75"	74° 2' 33.32"

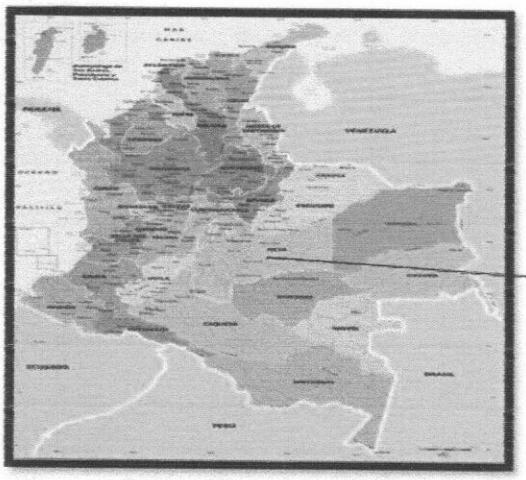

República de Colombia

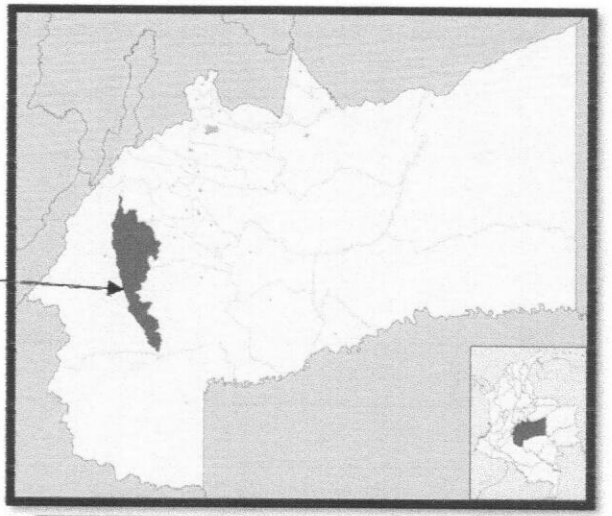

Departamento del Meta, municipio de Mesetas

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META"

4 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

4.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	MATERIALES				
1,1	CEMENTO GRIS (50 KG)	UND	60,00	$ 42.000	$ 2.520.000
1,2	BLOQUE # 4 TRADICIONAL 0.10X0.20X0.30M EN OBRA	UND	1400,00	$ 2.173	$ 3.042.000
1,3	ACERO CORRUGADO NO. 3 (Ø 3/8") PDR 60	KG	170	$ 5.210,00	$ 885.700,00
1,4	ACERO 1/2" CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80	KG	149,63	$ 6.160	$ 921.720
1,5	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	200	$ 7.268	$ 1.453.600.
1,6	PERFIL C PHR NEGRO 100x50x1.2 MM CAL. 18	ML	36,00	$ 28.987	$ 1.043.532
1,7	CUBIERTA ARQUITECTONICA 0.73 X 3.05 M REF: ACESCO	M2	42,00	$ 41.220	$ 1.731.240
2,0	INSTALACIONES SANITARIAS				
2,1	TUBERIA PVCS 6" SANITARIA	M	6,00	$ 83.796	$ 502.776
2,2	TUBERIA PVCS 4" SANITARIA	ML	12,00	$ 39.933	$ 479.196
2,3	TUBERIA PVCS 3" SANITARIA	ML	18,00	$ 28.394	$ 511.092
2,4	SIFON SANITARIO 2" PVC	UN	3,00	$ 6.315	$ 18.945
2,5	SIFON SANITARIO 4" 135° PVC	UN	1,00	$ 21.512	$ 21.512
2,6	YEE PVCS 3"	UN	4,00	$ 17.900	$ 71.600
2,7	CODO 90° PVCP 1 1/2"	UN	4,00	$ 12.115	$ 48.460
2,8	SANITARIO ACUACER CORONA	UN	1,00	$309.422	$309.422
3,0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3,1	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4"	M	6,00	$ 4.655	$ 27.930
3,2	TUBO PVC PRESIÓN 1/2" 13.5-315 PSI	ML	10,00	$ 3.523	$ 35.230
3,3	VALVULA CHEQUE CORTINA 1/2"	UN	1,00	$ 67.028	$ 67.028

3,4	TANQUE CÓNICO DE 500 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA	UN	1,00	$ 363.173	$ 363.173
3,5	LAVAMANOS EMPOTRAR MARSELLA CORONA REF. 01301100	UN	1,00	$ 250.000	$ 250.000
3,6	TANQUE LAVADERO PREFABRICADO 0.80X0.60X0.50	UN	1,00	$ 464.000	$ 464.000
3,7	LAVAPLATOS SOBREPONER ACERO 120 x 60 SOCODA	UN	1,00	$ 534.742	$ 534.742
3,8	REJILLA 3" X 2" SOSCO (ANTICUCARACHAS) ALUMINIO	UN	1,00	$11.489	$11.489
3,9	JUEGO DE INCRUSTACIONES COMPLETO	UN	1,00	$87.300	$87.300
4,0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
4,1	TABLERO 4 CIRCUITOS TRIFASICA TWS	UND	1,00	$ 265.300	$ 265.300
4,2	TOMA CORRIENTE BIFASICA (2x20 A/250 V) L.ABITARE	UN	11,00	$ 26.400	$ 290.400
4,3	INTERRUPTOR AUTOMATICO 1 X 30 AMP. 2230E1	UN	4,00	$ 17.300	$ 69.200,00
4,4	ADAPTADOR CONDUIT PVC 1½".	UN	3,00	$ 6.100	$ 18.300
4,5	ALAMBRE CU AISLADO No.10 THHN-THWN 90 600V	M	24,00	$ 4.400	$ 105.600,00
4,6	ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-THWN 90 600V	M	25,20	$2.800	$ 70.560,00
4,7	ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN THWN90 600V	M	11,30	$ 1.750	$ 19.775
4,8	CONECTOR BIMETÁLICO TIPO 1 PERNO	UN	6,00	$ 4.816	$ 28.896
4,9	CAJA 5800 GALV. RG100	UN	2,02	$ 2.670	$ 5.393
4,10	CAJA GALVAN OCTOGONAL CALIBRE 20	UN	1,00	$ 2.585	$ 2.585
4,11	TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO TIERRA AVE	UN	8,00	$ 16.250	$ 130.000
4,12	CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2" C X E	UN	4,00	$ 1.700	$ 6.800
4,13	TUBO CONDUIT PVC ½ "	M	12,24	$ 3.200	$ 39.168

4,14	INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE	UN	1,00	$ 9.500	$ 9.500
TOTAL					$ 16,463,364,00

4.2. CANTIDADES RECIBIDO FINAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	MATERIALES				
1,1	CEMENTO GRIS (50 KG)	UND	60,00	$ 42.000	$ 2.520.000
1,2	BLOQUE # 4 TRADICIONAL 0.10X0.20X0.30M EN OBRA	UND	1400,00	$ 2.173	$ 3.042.000
1,3	ACERO CORRUGADO NO. 3 (Ø 3/8") PDR 60	KG	170	$ 5.210,00	$ 885.700,00
1,4	ACERO 1/2" CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80	KG	149,63	$ 6.160	$ 921.720
1,5	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	200	$ 7.268	$ 1.453.600.
1,6	PERFIL C PHR NEGRO 100x50x1.2 MM CAL. 18	ML	36,00	$ 28.987	$ 1.043.532
1,7	CUBIERTA ARQUITECTONICA 0.73 X 3.05 M REF: ACESCO	M2	42,00	$ 41.220	$ 1.731.240
2,0	INSTALACIONES SANITARIAS				
2,1	TUBERIA PVCS 6" SANITARIA	M	6,00	$ 83.796	$ 502.776
2,2	TUBERIA PVCS 4" SANITARIA	ML	12,00	$ 39.933	$ 479.196
2,3	TUBERIA PVCS 3" SANITARIA	ML	18,00	$ 28.394	$ 511.092
2,4	SIFON SANITARIO 2" PVC	UN	3,00	$ 6.315	$ 18.945
2,5	SIFON SANITARIO 4" 135° PVC	UN	1,00	$ 21.512	$ 21.512
2,6	YEE PVCS 3"	UN	4,00	$ 17.900	$ 71.600
2,7	CODO 90° PVCP 1 1/2"	UN	4,00	$ 12.115	$ 48.460
2,8	SANITARIO ACUACER CORONA	UN	1,00	$309.422	$309.422

3,0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
3,1	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4"	M	6,00	$ 4.655	$ 27.930
3,2	TUBO PVC PRESIÓN 1/2" 13.5-315 PSI	ML	10,00	$ 3.523	$ 35.230
3,3	VALVULA CHEQUE CORTINA 1/2"	UN	1,00	$ 67.028	$ 67.028
3,4	TANQUE CÓNICO DE 500 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA	UN	1,00	$ 363.173	$ 363.173
3,5	LAVAMANOS EMPOTRAR MARSELLA CORONA REF. 01301100	UN	1,00	$ 250.000	$ 250.000
3,6	TANQUE LAVADERO PREFABRICADO 0.80X0.60X0.50	UN	1,00	$ 464.000	$ 464.000
3,7	LAVAPLATOS SOBREPONER ACERO 120 x 60 SOCODA	UN	1,00	$ 534.742	$ 534.742
3,8	REJILLA 3" X 2" SOSCO (ANTICUCARACHAS) ALUMINIO	UN	1,00	$11.489	$11.489
3,9	JUEGO DE INCRUSTACIONES COMPLETO	UN	1,00	$87.300	$87.300
4,0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
4,1	TABLERO 4 CIRCUITOS TRIFASICA TWS	UND	1,00	$ 265.300	$ 265.300
4,2	TOMA CORRIENTE BIFASICA (2x20 A/250 V) L. ABITARE	UN	11,00	$ 26.400	$ 290.400
4,3	INTERRUPTOR AUTOMATICO 1 X 30 AMP. 2230E1	UN	4,00	$ 17.300	$ 69.200,00
4,4	ADAPTADOR CONDUIT PVC 1½".	UN	3,00	$ 6.100	$ 18.300
4,5	ALAMBRE CU AISLADO No.10 THHN-THWN 90 600V	M	24,00	$ 4.400	$ 105.600,00
4,6	ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-THWN 90 600V	M	25,20	$2.800	$ 70.560,00
4,7	ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN THWN90 600V	M	11,30	$ 1.750	$ 19.775
4,8	CONECTOR BIMETÁLICO TIPO 1 PERNO	UN	6,00	$ 4.816	$ 28.896
4,9	CAJA 5800 GALV. RG100	UN	2,02	$ 2.670	$ 5.393

4,10	CAJA GALVAN OCTOGONAL CALIBRE 20	UN	1,00	$ 2.585	$ 2.585
4,11	TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO TIERRA AVE	UN	8,00	$ 16.250	$ 130.000
4,12	CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2" C X E	UN	4,00	$ 1.700	$ 6.800
4,13	TUBO CONDUIT PVC ½"	M	12,24	$ 3.200	$ 39.168
4,14	INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE	UN	1,00	$ 9.500	$ 9.500
SUBTOTAL					$ 16,463,364,00

4.3. TAREAS A REALIZADOS

En atención a lo contenido en el contrato, se realizan actividades desde el día 16 DE DICIEMBRE del 2025 hasta el 23 de DICIEMBRE del 2025.
Horario de trabajo:

La jornada laboral fue establecida de la siguiente manera:

- ✓ Inicio jornada laboral: 07:00 a.m.
- ✓ Hora de almuerzo: 12:00 m. a 1:00 p.m.
- ✓ Fin jornada laboral: 05:00 p.m.

El contratista llevó a cabo todas y cada una de las obligaciones previstas en el contrato de obra N° 270 de 2025, cumpliendo los estándares de calidad exigidos para este tipo de servicio y de conformidad a lo establecido en las circulares 001 del Misterio De Salud, Ministerio de Trabajo Y Ministerio de Vivienda al igual las contempladas circular conjunta número 03 del 08 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, donde cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo garantizando la salud e integridad de cada uno de los trabajadores.


4.4. DESARROLLO DETALLADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Las actividades que se encuentran contempladas dentro del objeto del contrato se encaminan única y exclusivamente al **"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META."**


1.MATERIALES1,1 CEMENTO




1,2 BLOQUE # 4 TRADICIONAL 0.10X0.20X0.30M EN OBRA

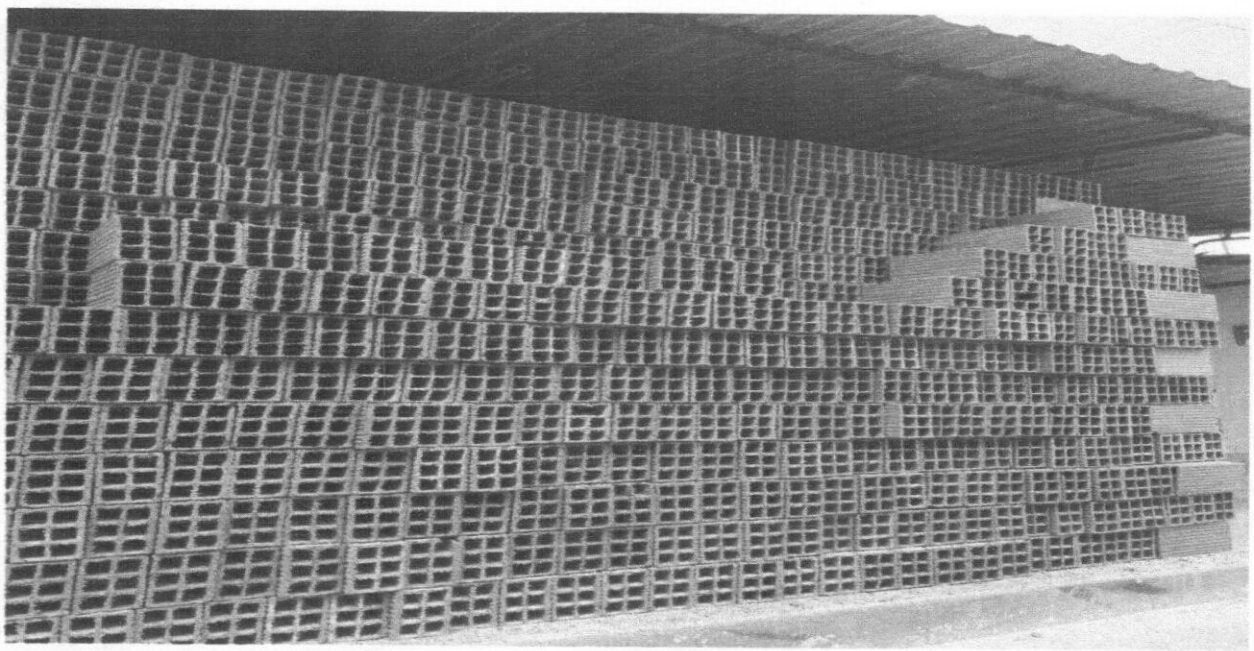

1,3 ACERO CORRUGADO NO. 3 (Ø 3/8") PDR 60 1,4 ACERO 1/2" CORRUGADO/FIGURADO (411 MPA 4200 KG / CM2, G80)

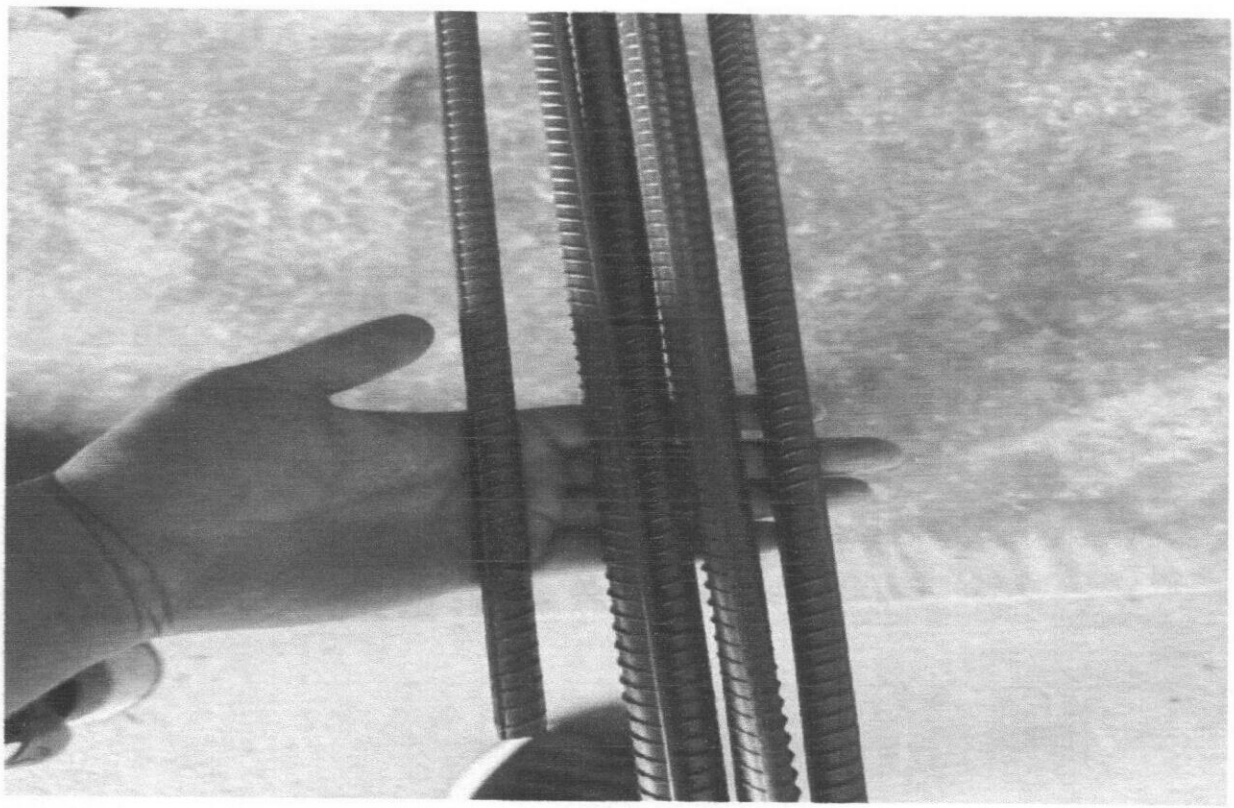


1,5 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

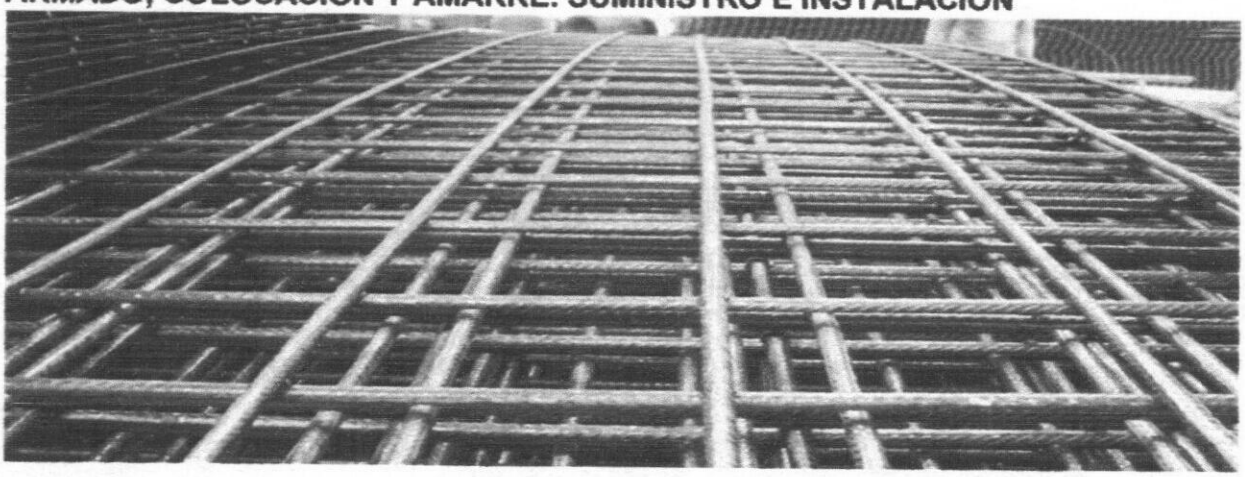


2, TUBERIA PVCS 6" SANITARIA, TUBERIA PVCS 4" SANITARIA, TUBERIA PVCS 3" SANITARIA



2,4 SIFON SANITARIO 2" PVC, SIFON SANITARIO 4" 135° PVC

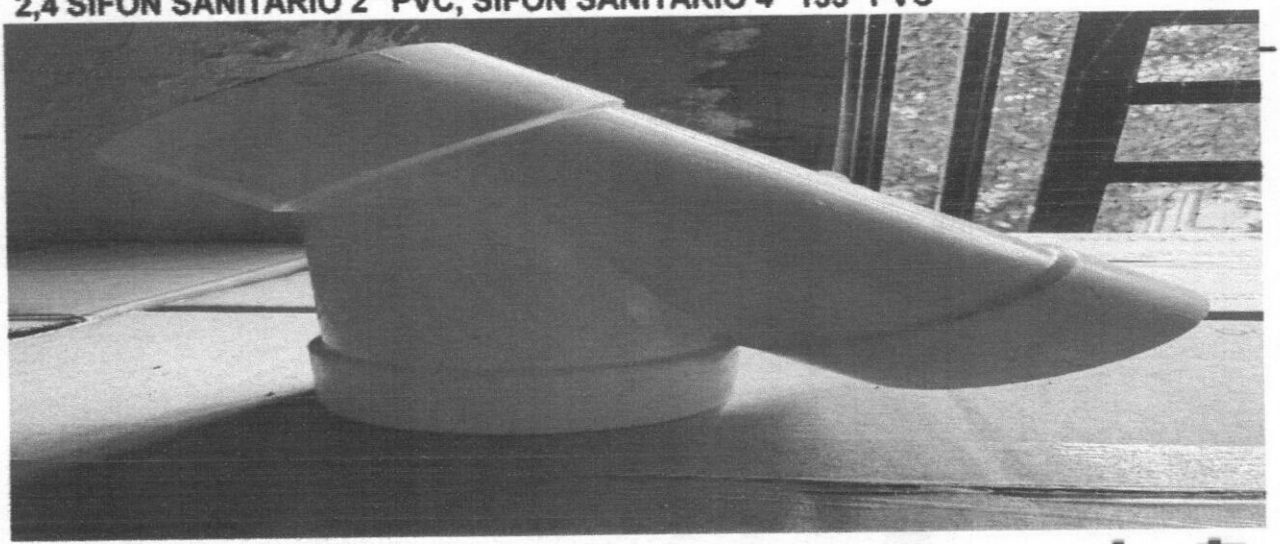

2,8 SANITARIO ACUACER CORONA

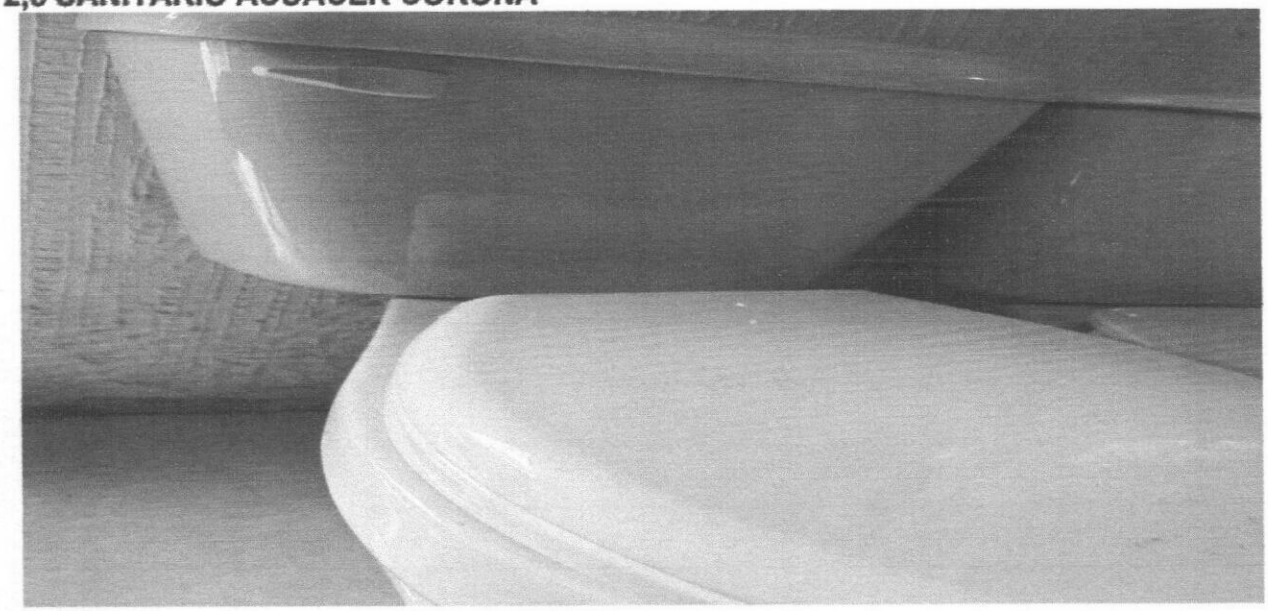


3,1 TUBERIA PVCP RDE 11 3/4"



3,2 TUBO PVC PRESIÓN 1/2" 13.5-315 PSI



3,4 TANQUE CÓNICO DE 500 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA

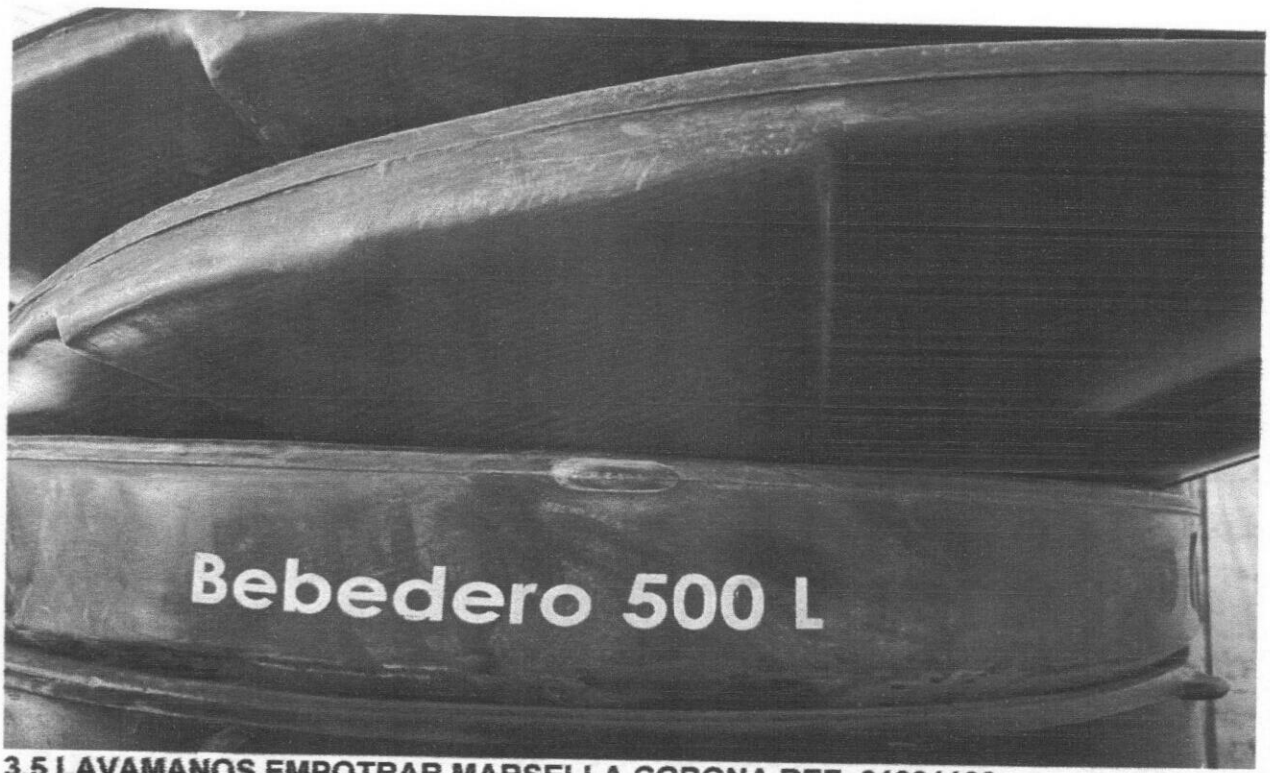

3,5 LAVAMANOS EMPOTRAR MARSELLA CORONA REF. 01301100




3,6 TANQUE LAVADERO PREFABRICADO 0.80X0.60X0.50

3,7 LAVAPLATOS SOBREPONER ACERO 120 x 60 SOCODA




3,8 REJILLA 3" X 2" SOSCO (ANTICUCARACHAS) ALUMINIO

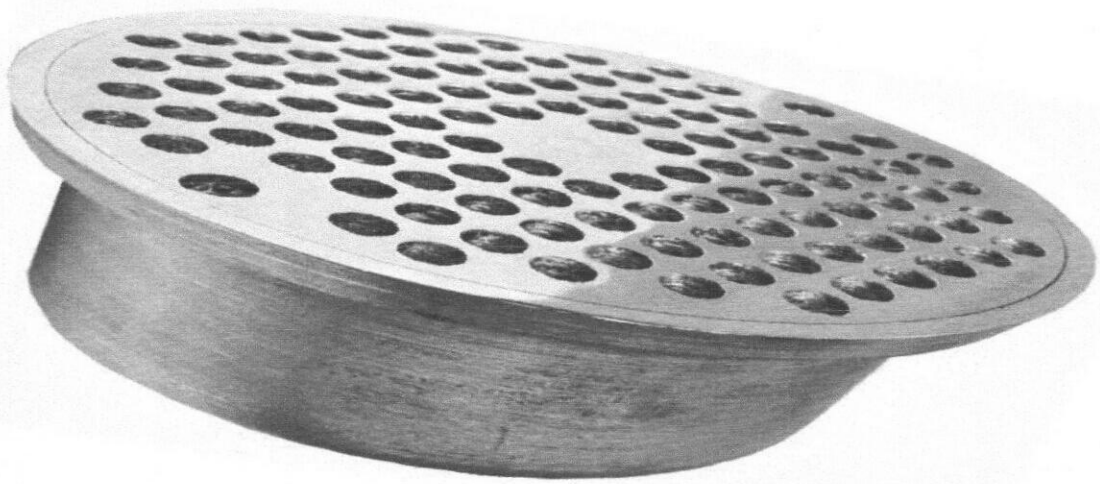


3,9 JUEGO DE INCRUSTACIONES COMPLETO




4,1 TABLERO 4 CIRCUITOS TRIFASICA TWS

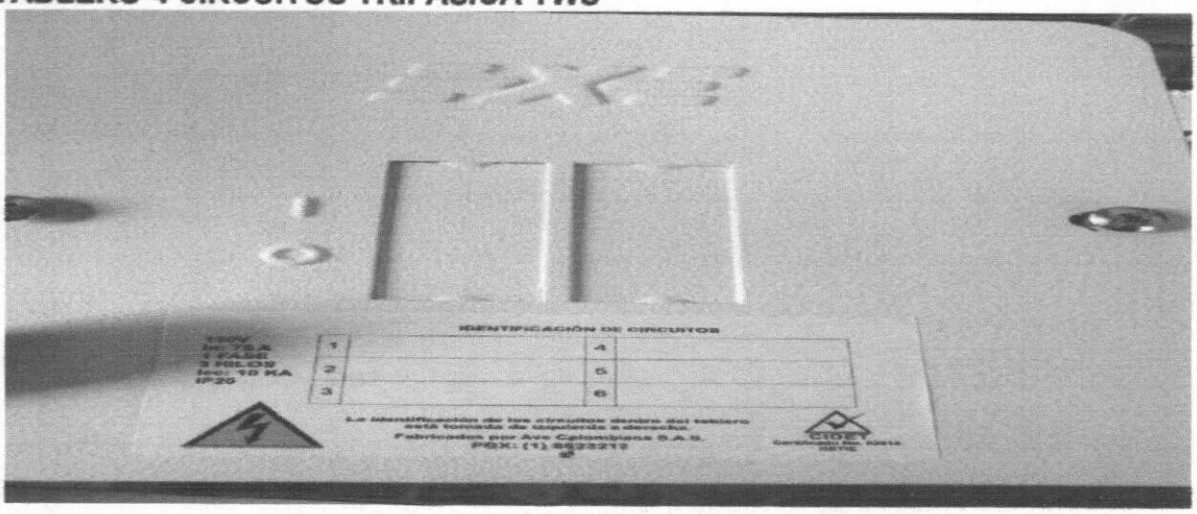


4,2 TOMA CORRIENTE BIFASICA (2x20 A/250 V) L.ABITARE

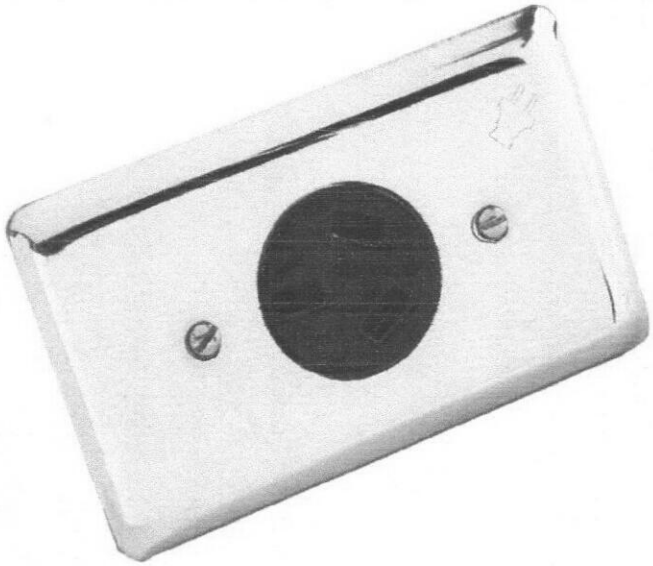


4,3 INTERRUPTOR AUTOMATICO 1 X 30 AMP. 2230E1

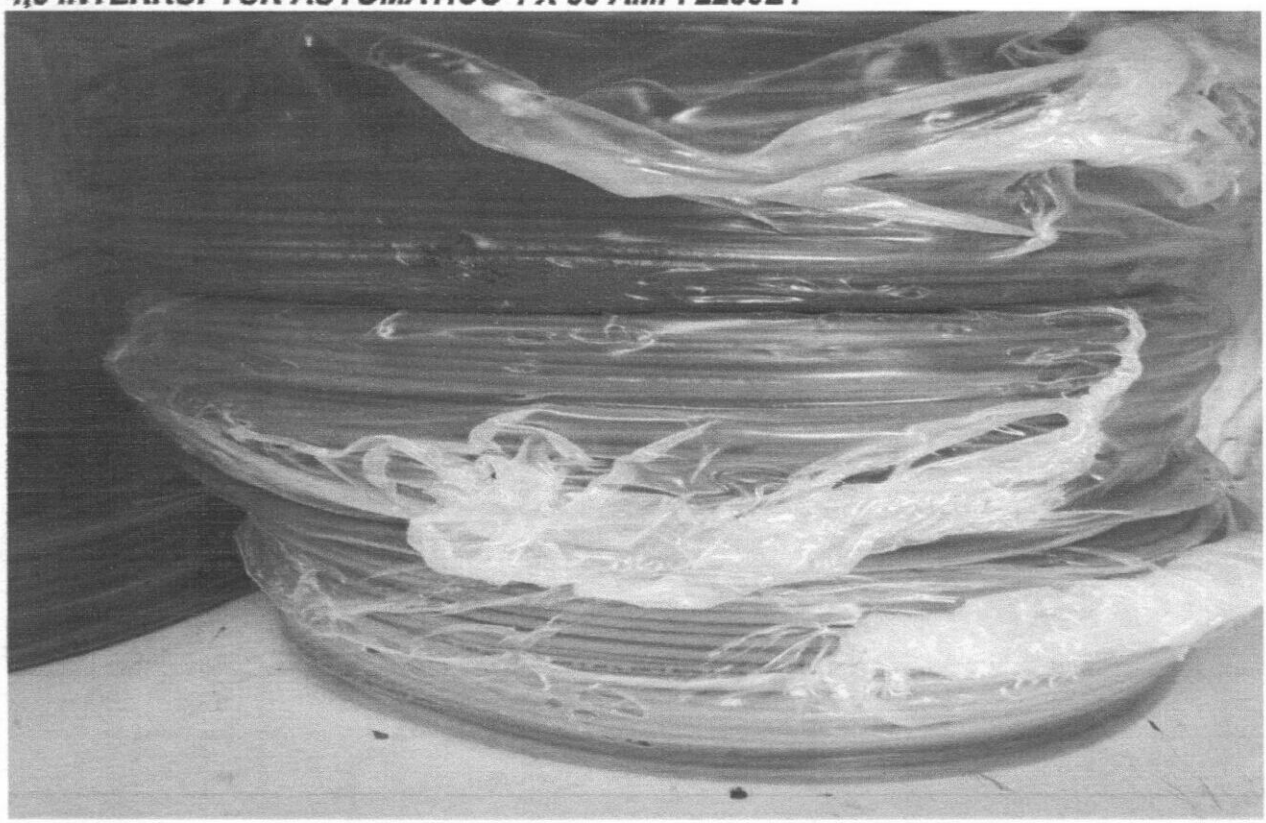


4,6 ALAMBRE CU AISLADO No.12 THHN-THWN 90 600V

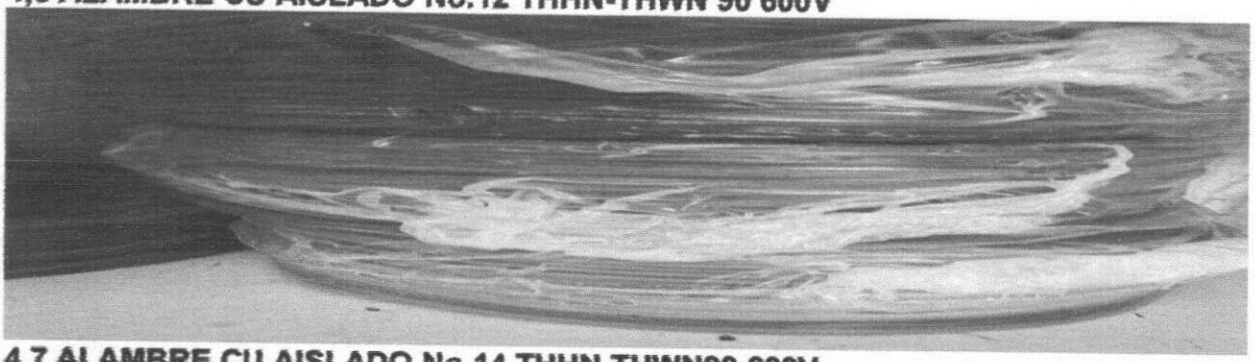


4,7 ALAMBRE CU AISLADO No.14 THHN THWN90 600V

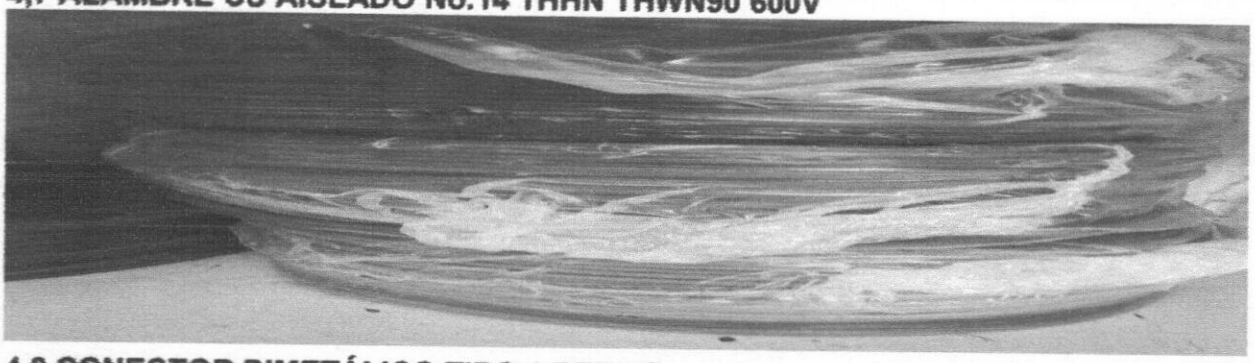


4,8 CONECTOR BIMETÁLICO TIPO 1 PERNO

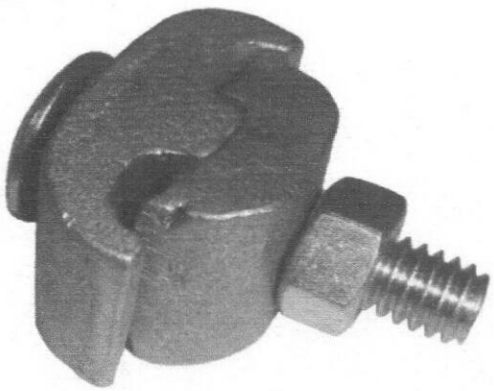

4,9 CAJA 5800 GALV. RG100




4,10 CAJA GALVAN OCTOGONAL CALIBRE 20

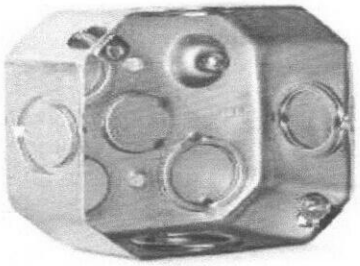


4,11 TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO TIERRA AVE




4,12CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2" C X E

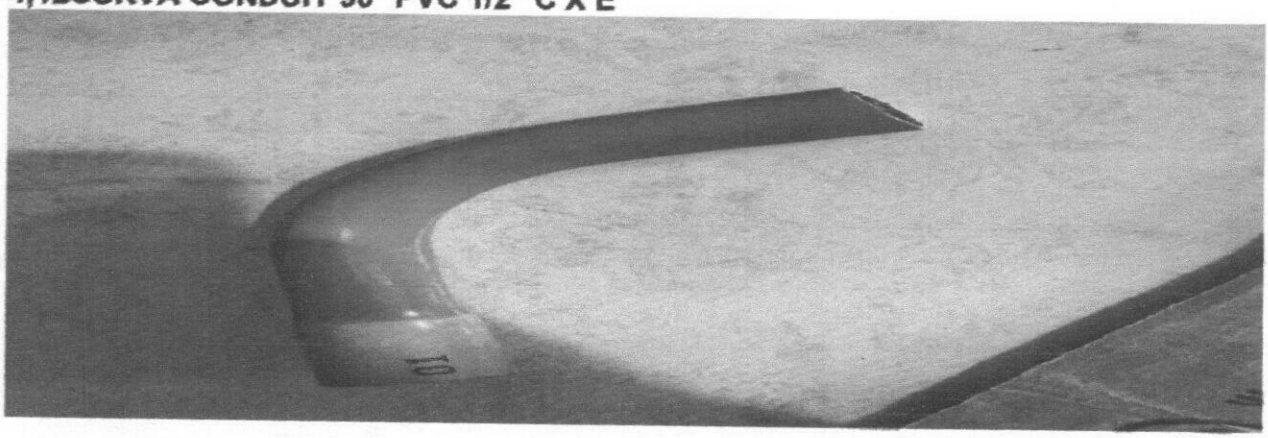

4,13TUBO CONDUIT PVC ½ "

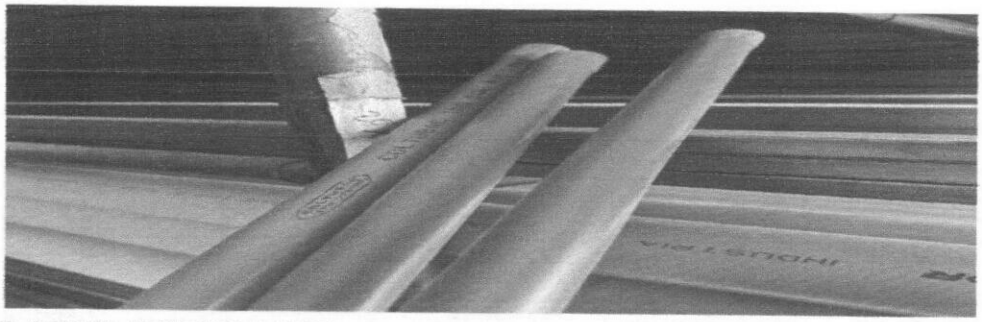

4,14 INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE

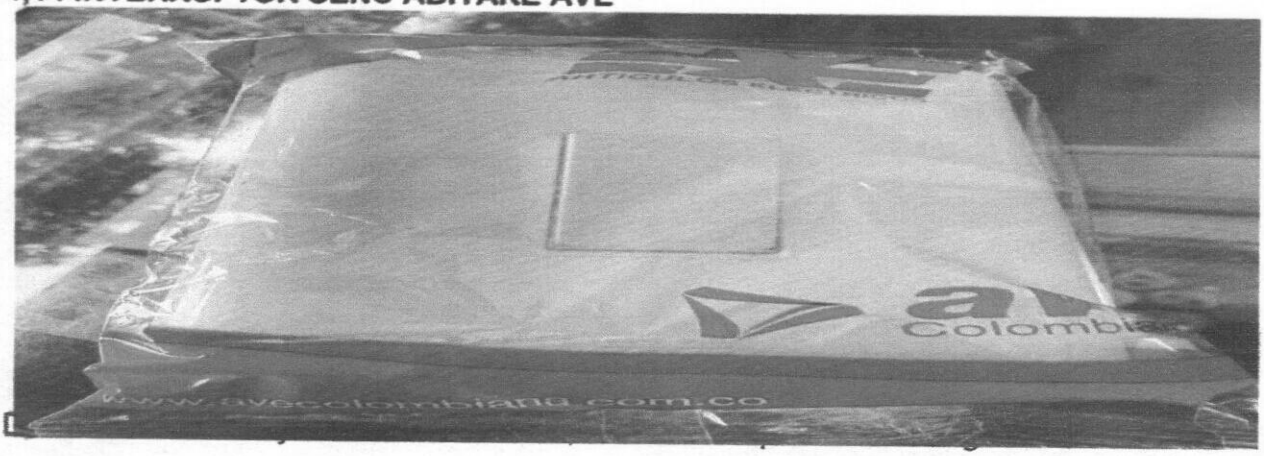

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$16.463.364,00
VALOR ADICION No. 1	$ 0,00
VALOR ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR MODIFICATORIA No. 01:	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA A LA FECHA:	$ 0,00
PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA	100%
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR EJECUTADO SEGUN ACTA DE RECIBIDO FINAL	$16.463.364,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo a favor del municipio	Saldo por pagar al Contratista según recibido final
1020 de 2025	12 -12- 2025	**$16.463.364,00**	$ 0	$ 0

5. APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

En mi calidad de supervisor del contrato de suministro No. 426 de 2025, luego de verificar el cumplimiento de relación las planillas de pago suministradas por el contratista, las cuales cuentan con su respectivo certificado de pago, constatando que todo el personal cumplió con el pago al Sistema de Seguridad Social **(SALUD, PENSIÓN Y ARL)** correspondiente a los ingresos provenientes del contrato de obra suscrito con la Alcaldía del Municipio de Mesetas – Meta, materia del presente liquidación, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META"**

PERSONAL DE OBRA.

El siguiente personal que se cita dio cumplimiento al pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (**SALUD, PENSIÓN Y ARL**), durante el mes de DICIEMBRE del 2025.

CONTRATISTA: LAURA STEPHANY MEDINA MORALES
CC. 1.006.693.202

PERIODO: DICIEMBRE 2025	**NO. PLANILLA: 9479544982**	
TIPO	**IBC**	**APORTE**
SALUD	8.541.000	$ 286.300
RIESGOS	8.541.000	$ 498.100
PENSION	7.117.500	$ 1.144.300

PERIODO: DICIEMBRE 2025			NO. PLANILLA: **9479544982**
NOMBRE	**C.C.**	**PENSIÓN**	**SALUD**
LAURA STEPHANY MEDI MORALES	1.066.933.202	227.800	178.000

6. POR LO ANTES EXPUESTO, EL SUSCRITO SUPERVISOR DETERMINA:

Efectuar el pago final al Contrato de suministro No. 426 del 2025, que tiene por objeto **SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS-META** Suscrito entre la Alcaldía Municipal de mesetas y el contratista legal **LAURA STEPHANY MEDINA MORALES** identificado con cedula de ciudadanía N°. CC. 1.006.693.202, según lo establecido en el presente Informe, para lo cual autorizo el pago final por una suma correspondiente de **DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 ($16.463.364,00) NACIONAL COLOMBIANA.M/CTE.**

Para constancia, se firma el presente Informe en el Municipio de Mesetas - Meta, luego de elaborado, revisado y aprobado a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del 2025

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyecto: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura
