Cota Cundinamarca, 14 de diciembre de 2025


Arquitecta
ANDREA RODRIGUEZ COLORADO
Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas
E.S.D.
Obras@alcaldiacota.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO **SIOM-SAMC-1162-2025** - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE.

ASUNTO : SOLICITUD DE MODIFICACION, PRORROGA Y ADICION

Teniendo en cuenta el desarrollo del contrato de obra, se ha evidenciado en los diferentes comites de obra, la necesidad de realizar el tramite descrito en la presente comunicación, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad del objeto contractual del contrato, y de lograr un mayor alcance que permita tener una mayor area de drenaje en el sector objeto del contrato. Por consiguinte se tienen las siguientes consideraciones:


1. Mayor longitud de intervencion.

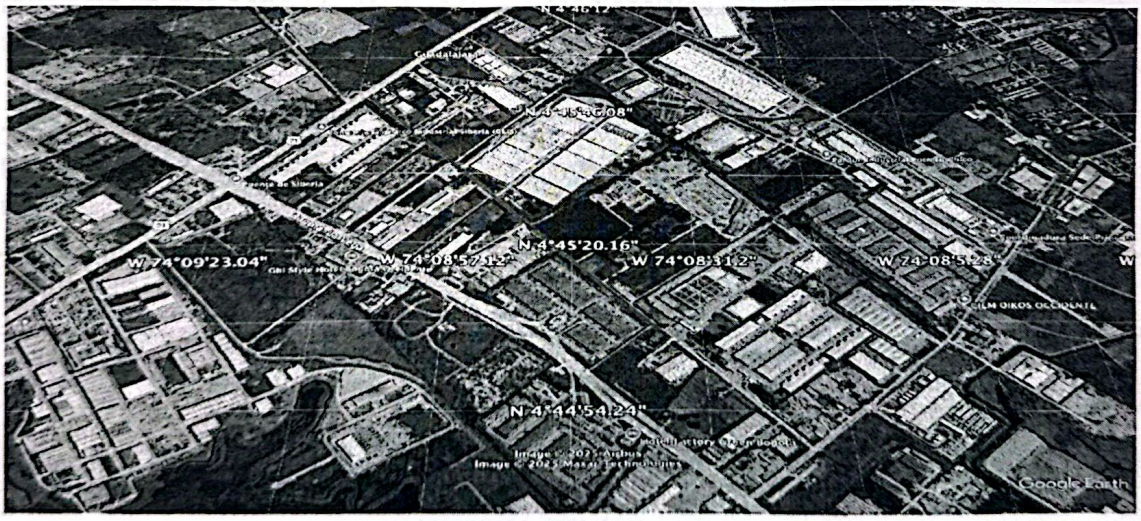

En el tramo inicialmente dispuesto se tenia la intervencion de 1600 metros lineales de vallado, asi como se observa en la linea roja, los cuales a la fecha ya han sido intervenidos y aunque han mejorado las condiciones de drenaje y una mayor seccion de recoleccion de aguas lluvias gracias al retiro no solamente del material vegetal de los taludes, y con el retiro del material sedimentado en el fondo del vallado.

Scanned with CamScanner

Sin embargo como se evidencia en la siguiente figura s observa que los canales subrayados en verde son canales adyacentes que permiten que el flujo de agua sea conducido al canal principal que esta construido en la calle 80 y que va hacia el sector del Guali.

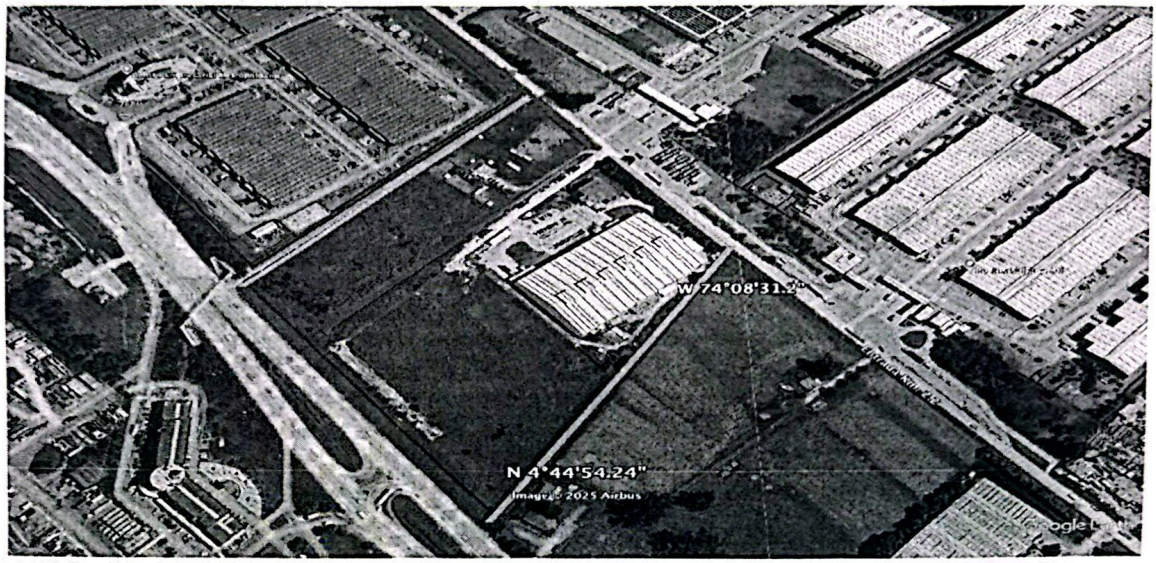

Es decir que con esta intervencion se lograria evacuar todo el volumen de agua que se recolecta en el la parte alta del vallado y evitaria posibles inundaciones en los predios de la parte baja.

2. Mayores y menores cantidades de obra.

En la evaluacion de esta alternativa de mayor intervencion nuestro equipo profesional, sugiere a la supervision, un aumento de las siguientes cantidades:

1.1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CALSIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
1.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
1.4	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)
1.8	PODA DE ESPECIMENES (INCLUYE MANO DE OBRA)
1.9	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS (INLCUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)
1.10	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES

Scanned with CamScanner

Y no ejecutar las siguientes ítems, teniendo en cuenta que estas actividades implican una logística mayor, así como mayores recursos económicos, teniendo en cuenta que se utilizaría para la ejecución de obras para el ingreso a las bodegas industriales, que implican mayores refuerzos ya que por allí pasarían vehículos tracto camiones cargados.

1.5	CONCRETOS CALSE D, F'c = 3000 psi (box coulvert)
1.6	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
1.7	CONCRETO CLASE F 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES

En el acta anexa se establecen con exactitud las cantidades y los valores generados, todo de acuerdo a revisión topográfica realizada de acuerdo a la solicitud realizada por el apoyo a la supervisión.

Solicitudes:

Adición del contrato:

De acuerdo al balance realizado anexo 1, es necesario realizar una adición por valor de doscientos cuarenta y ocho millones novecientos diez y seis mil pesos con cuarenta y un centavos m/cte ($ 248.916.000,41).

Prórroga del contrato:

Es necesario para finalizar las actividades contractuales en las cantidades iniciales y las cantidades adicionales un plazo de 30 días al plazo contractual actual que es hasta el 30 de diciembre de 2025.

Modificación del contrato.

De acuerdo al balance realizado, es necesario realizar la modificación del contrato, para realizar el balance de mayores y menores cantidades de obra y también incluir el valor adicional que se estima de acuerdo a la presente solicitud.

Scanned with CamScanner

ARCO
CONSTRUCTORES

De acuerdo a lo mencionado se solicita realizar el respectivo trámite administrativo, para de esta forma lograr dar cumplimiento al objeto contractual.

Cordialmente

LUIS GABRIEL FONSECA FONSECA
R. LEGAL , ARCO CONTRUCTORES SAS

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA SIOM-SAMC-1162-2025 - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 1.

FECHA DEL CORTE	11/12/25	PERIODO DE CORTE	29/09/2025 - 30/11/2025
CONTRATISTA (CONSTRUCTOR)	ARCO CONSTRUCTORES SAS	INTERVENTOR	N/A
FECHA INICIO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE FINALIZACION INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGAS:	30 DIAS	FECHA DE FINALIZACION ACTUAL	30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	$498.542.778,00	ADICIONES	N/A

CANTIDADES ORIGINALES						CANTIDES EJECUTADAS			MAYORES Y MENORES CANTIDADES				CANTIDADES FINALES	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	CANTIDAD FINAL	Valor Total FINAL	CANTIDADES POR TRAMO NUEVO	MAYORES CANTIDADES	VALOR	MENORES CANTIDADES	VALOR	CANT	V.Total
1.1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CALIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1100,00	$ 21.161,00	23.277.100,00	936,00	19.806.696,00	394,00	230,00	4.867.030,00		-	1.330,00	28.144.130,00
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0 - 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	300,00	$ 74.262,00	22.278.600,00	-	-		-	-	300,00	-	-	-
1.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	804,28	$ 42.371,00	34.078.208,00	730,10	30.935.067,10	2.529,24	2.455,09	104.023.458,96			3.259,34	138.101.664,62
1.4	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	HR	200,00	$ 10.541,00	2.108.200,00	151,00	1.591.691,00	279,00	230,00	2.424.430,00			430,00	4.532.630,00
1.5	CONCRETOS CLASE D, Pt = 3000 psi (box coulvert)	M3	8,00	$ 828.916,00	6.631.328,00		-			-	8,00	6.631.328,00	-	-
1.6	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	420,00	$ 7.966,00	3.345.720,00					-	420,00	3.345.720,00	-	-
1.7	CONCRETO CLASE F 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	12,00	$ 527.904,00	6.334.848,00		-			-	12,00	6.334.848,00	-	-
1.8	PODA DE ESPECIMENES (INCLUYE MANO DE OBRA)	ML	7248,00	$ 17.470,00	126.622.560,00	2.020,00	35.289.400,00	520,00	4.708,00	82.248.760,00			2.540,00	44.373.876,00
1.9	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M3	2174,00	$ 2.438,00	5.300.212,00	-	-	90,00	2.084,00	5.080.792,00			90,00	219.420,00
1.10	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXCAVACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES)	M3-KM	78809,00	$ 1.755,00	138.733.615,00	73.808,23	129.057.279,05	118.948,27	113.947,50	197.696.917,21			192.756,50	334.432.532,21
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				368.710.391,00	SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	215.680.133,15						SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$ 948.884.176,84
	COMPONENTE AMBIENTAL		3,00%		11.001.312,00	COMPONENTE AMBIENTAL	3,00%	6.470.403,99					COMPONENTE AMBIENTAL 3,00%	$ 18.494.125,31
	PMT		2,00%		7.334.208,00	PMT	2,00%	4.313.602,66					PMT 2,00%	$ 10.996.083,54
	ADMINISTRACION		24,00%		88.010.494,00	ADMINISTRACION	24,00%	51.763.231,96					ADMINISTRACION 24,00%	$ 131.953.002,44
	IMPREVISTOS		1%		3.667.104,00	IMPREVISTOS	1%	2.156.801,33					IMPREVISTOS 1%	$ 5.498.041,77
	UTILIDAD		5%		18.335.520,00	UTILIDAD	5%	10.784.006,66					UTILIDAD 5%	$ 27.490.208,84
	IVA SOBRE UTILIDADES		19%		3.483.748,80	IVA SOBRE UTILIDAD	19%	2.049.961,26					IVA SOBRE UTILIDADES 19%	$ 5.223.139,68
	VALOR TOTAL OBRA CIVIL				498.542.778,00	VALOR TOTAL OBRA CIVIL		293.217.141,02					VALOR TOTAL OBRA CIVIL	747.498.778,41

NO.	DESCRIPCION	VALOR
1	VALOR ADICION	248.916.000,41

ARCO CONSTRUCTORES SAS
GABRIEL FONSECA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

ARCO CONSTRUCTORES SAS
FRANKLIN PRADO
RESIDENTE DE OBRA

APOYO A LA SUPERVISION
ING GERMAN HUERTAS B


Scanned with CamScanner


MEMORIA DE CALCULO


OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE

GABRIEL FONSECA FONSECA		UBICACIÓN	COTA, CUNDINAMARCA				
CAPITULO		ITEM	0,00	UND	0,00	UBICACIÓN	



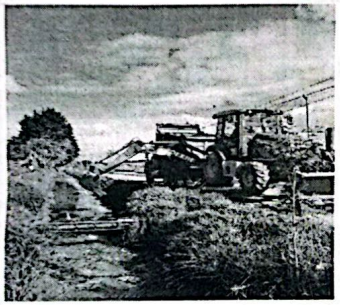

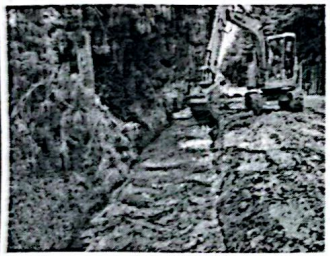

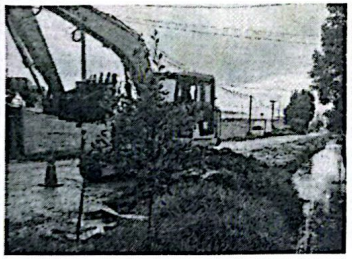

Item/descripcion	Dimensiones LONGITUD	Dimensiones AREA		No.Elem.	Medida Total
TRAMO 9 - CORTE 1	80,00		0,60		48,00
TRAMO 9 - CORTE 2	50,00		0,60		30,00
TRAMO 9 - CORTE 3	50,00		0,60		30,00
TRAMO 9 - CORTE 4	60,00		0,60		36,00
					0,00
TRAMO 10 - CORTE 1	40,00		0,60		24,00
TRAMO 10 - CORTE 2	40,00		0,60		24,00
TRAMO 10 - CORTE 3	50,00		0,60		30,00
TRAMO 11 - CORTE 1	30,00		0,60		18,00
TRAMO 11 - CORTE 2	40,00		0,60		24,00
TRAMO 11 - CORTE 3	50,00		0,60		30,00
TRAMO 11 - CORTE 4	30,00		0,60		18,00
TRAMO 12 - CORTE 1	30,00		0,60		18,00
TRAMO 12 - CORTE 2	40,00		0,60		24,00
TRAMO 12 - CORTE 3	50,00		0,80		40,00
VERIFICAR EN PLANOS ANEXOS					
TOTAL	640				
Sub-Total					394,00
TOTAL					394,00

GABRIEL FONSECA FONSECA
DIRECTOR DE OBRA

ING FRANKLIN PROAÑO
RESIDENTE DE OBRA


Scanned with CamScanner

MEMORIA DE CALCULO

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

UBICACIÓN	COTA, CUNDINAMARCA			
CAPITULO	ITEM	1.1	UND	M3

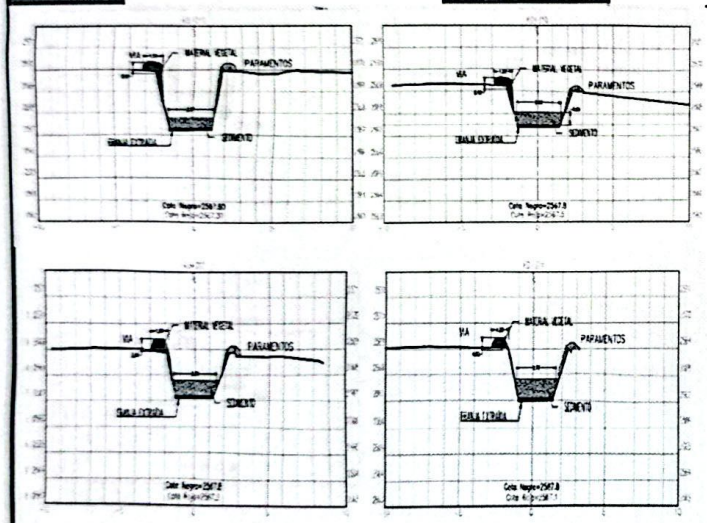

Item/descripcion	Dimensiones		No.Elem.	Medida Total
	LONGITUD	AREA		
TRAMO 2 - CORTE 4	20,00	0,94		18,84
TRAMO 3 - CORTE 1	10,00	1,26		12,64
TRAMO 3 - CORTE 2	20,00	1,59		31,86
TRAMO 4 - CORTE 1	30,00	1,01		30,24
TRAMO 4 - CORTE 2	80,00	2,52		201,60
TRAMO 4 - CORTE 3	30,00	1,38		41,25
TRAMO 4 - CORTE 4	30,00	1,16		34,92
TRAMO 5 - CORTE 1	10,00	0,60		5,96
TRAMO 5 - CORTE 2	20,00	1,15		22,95
TRAMO 5 - CORTE 3	30,00	3,00		90,00
TRAMO 5 - CORTE 4	20,00	1,69		33,76
TRAMO 6 - CORTE 1	50,00	1,39		69,30
TRAMO 6 - CORTE 2	50,00	1,35		67,50
TRAMO 6 - CORTE 3	50,00	1,35		67,50
TRAMO 6 - CORTE 4	10,00	1,91		19,13
Sub-Total				747,44
TOTAL				747,44

GABRIEL FONSECA FONSECA
DIRECTOR DE OBRA

ING FRANKLIN PROAÑO
RESIDENTE DE OBRA


Scanned with CamScanner


MEMORIA DE CALCULO


OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE

GABRIEL FONSECA FONSECA | UBICACIÓN: COTA, CUNDINAMARCA

CAPITULO | ITEM: 1.3 | UND: M3 | UBICACIÓN







Item/descripcion	Dimensiones LONGITUD	Dimensiones AREA	No.Elem.	Medida Total
TRAMO 7 - CORTE 1	50,00	2,85		142,50
TRAMO 7 - CORTE 2	100,00	0,95		95,20
TRAMO 7 - CORTE 3	100,00	1,28		128,34
TRAMO 7 - CORTE 4	100,00	0,90		89,90
TRAMO 8 - CORTE 1	100,00	0,91		91,00
TRAMO 8 - CORTE 2	50,00	1,57		78,75
TRAMO 8 - CORTE 3	50,00	1,57		78,57
TRAMO 8 - CORTE 4	50,00	1,66		82,80
TRAMO 9 - CORTE 1	80,00	1,63		130,32
TRAMO 9 - CORTE 2	50,00	1,61		80,70
TRAMO 9 - CORTE 3	20,00	1,61		32,22
TRAMO 9 - CORTE 4	60,00	1,66		99,72
TRAMO 10 - CORTE 1	40,00	0,61		24,30
TRAMO 10 - CORTE 2	40,00	1,80		72,07
TRAMO 10 - CORTE 3	50,00	2,17		108,63
TRAMO 11 - CORTE 1	30,00	1,77		53,04
TRAMO 11 - CORTE 2	40,00	1,54		61,64
TRAMO 11 - CORTE 3	50,00	1,57		78,49
TRAMO 11 - CORTE 4	30,00	1,41		42,44
TRAMO 12 - CORTE 1	30,00	1,77		53,04
TRAMO 12 - CORTE 2	40,00	1,54		61,64
TRAMO 12 - CORTE 3	50,00	1,57		78,49
TRAMO 12 - CORTE 4	30,00	0,60		18,00
Sub-Total				1781,81
TOTAL				1781,81

GABRIEL FONSECA FONSECA
DIRECTOR DE OBRA

ING FRANKLIN PROAÑO
RESIDENTE DE OBRA


Scanned with CamScanner


MEMORIA DE CALCULO


OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE

MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	UBICACIÓN	COTA, CUNDINAMARCA	
CAPITULO	ITEM	1.4	UND: HR — UBICACIÓN:



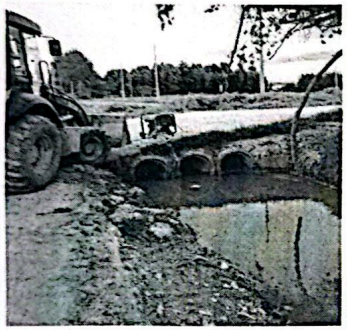

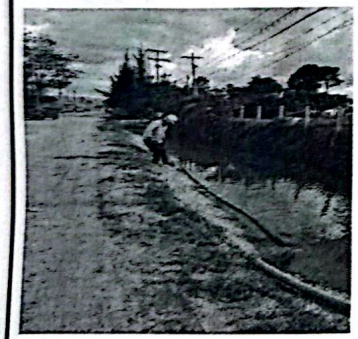

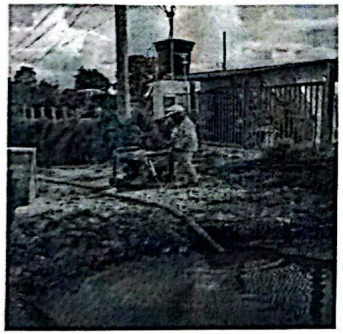

Item/descripcion	Dimensiones LONGITUD	Dimensiones AREA	No.Elem.	Medida Total
DIA DE MANEJO DE AGUA			HORAS	
05/11/2025			8,00	8,00
06/11/2025			8,00	8,00
07/11/2025			6,00	6,00
08/11/2025			8,00	8,00
09/11/2025			8,00	8,00
10/11/2025			8,00	8,00
11/11/2025			9,00	9,00
12/11/2025			8,00	8,00
13/11/2025			8,00	8,00
14/11/2025			8,00	8,00
15/11/2025			10,00	10,00
16/11/2025			10,00	10,00
17/11/2025			8,00	8,00
18/11/2025			8,00	8,00
19/11/2025			8,00	8,00
20/11/2025			8,00	8,00
21/11/2025			8,00	8,00
22/11/2025			8,00	8,00
23/11/2025			8,00	8,00
24/11/2025			8,00	8,00
25/11/2025			10,00	10,00
26/11/2025			8,00	8,00
27/11/2025			8	8,00
28/11/2025			10	10,00
29/11/2025			10	10,00
30/11/2025			8	8,00
01/12/2025			8	8,00
02/12/2025			8	8,00
03/12/2025			10	10,00
04/12/2025			10	10,00
05/12/2025			8	8,00
06/12/2025			10	10,00
07/12/2025			8	8,00
TOTAL			279,00	
Sub-Total				279,00
TOTAL				279,00

GABRIEL FONSECA FONSECA


ING FRANKLIN PROAÑO


Scanned with CamScanner

MEMORIA DE CALCULO


OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE

PODA DE ESPECIMENES (INCLUYE MANO DE OBRA)	UBICACIÓN	COTA, CUNDINAMARCA	
CAPITULO	ITEM	1.8	UND ML

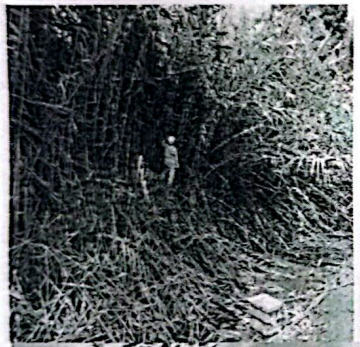

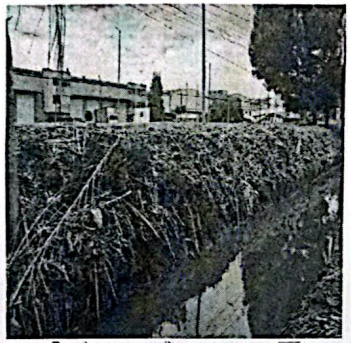



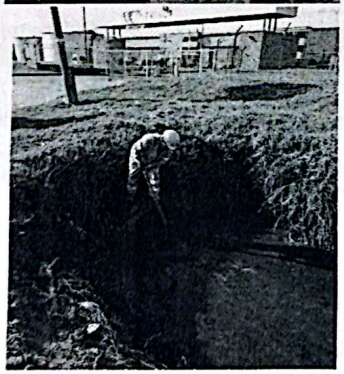

Item/descripcion	Dimensiones LONGITUD	Dimensiones AREA	No.Elem.	Medida Total
TRAMO 11	310,00			310,00
TRAMO 12	210,00			210,00
Sub-Total				520,00
TOTAL				520,00

GABRIEL FONSECA FONSECA
DIRECTOR DE OBRA

ING FRANKLIN PROAÑO
RESIDENTE DE OBRA


Scanned with CamScanner

MEMORIA DE CALCULO

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE

GABRIEL FONSECA FONSECA		UBICACIÓN	COTA, CUNDINAMARCA			
CAPITULO	NETAS (INLCUYE RETIRO DE SOBRANTES A	ITEM	0,00	UND	0,00	UBICACIÓN



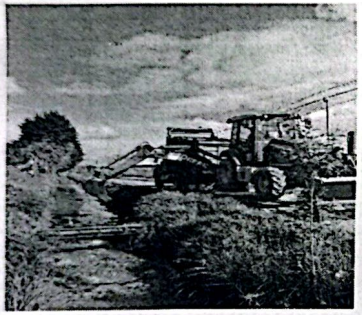





Item/descripcion	Dimensiones LONGITUD	Dimensiones AREA	No.Elem.	Medida Total
TRAMO 12 - CORTE 1	30,00	0,60		18,00
TRAMO 12 - CORTE 2	40,00	0,60		24,00
TRAMO 12 - CORTE 3	50,00	0,60		30,00
TRAMO 12 - CORTE 4	30,00	0,60		18,00
				0,00
VERIFICAR EN PLANOS ANEXOS				
TOTAL	150			
Sub-Total				90,00
TOTAL				90,00

GABRIEL FONSECA FONSECA
DIRECTOR DE OBRA


ING FRANKLIN PROAÑO
RESIDENTE DE OBRA

Scanned with CamScanner

MEMORIA DE CALCULO

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES		UBICACIÓN	COTA, CUNDINAMARCA				
CAPITULO		ITEM	1.10	UND	M3-KM	UBICACIÓN	

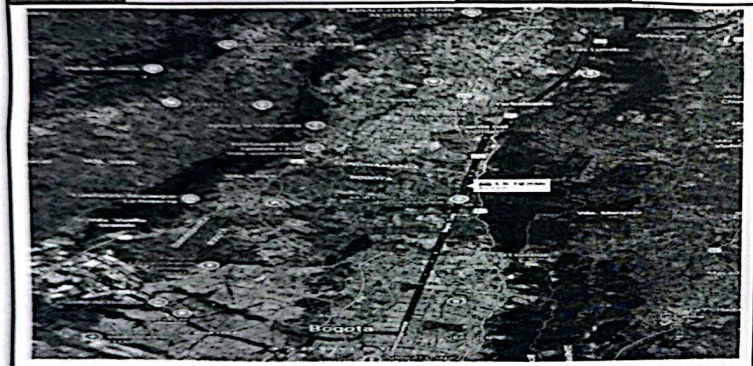

Item/descripcion	Dimensiones		No.Elem.	Medida Total
	LONGITUD	AREA		
Transporte de material proveniente de excavacion	44,30	distancia a botadero	230,00	10189,00
transporte de material prove excavacion bajo agua	44,30	distancia a botadero	2455,06	108759,27
Sub-Total				118948,27
TOTAL				118948,27

GABRIEL FONSECA FONSECA
DIRECTOR DE OBRA

ING FRANKLIN PROAÑO
RESIDENTE DE OBRA

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA NIT :899999705-3 Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00 **Certificado de Disponibilidad Presupuestal**	CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC

Número: 2025002926

09/12/2025

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Rubro / Fuente		Nombre Rubro	Valor
il.02.2.3.2.02.02.00 .4003026.040	1.2.1.0.002	Optimizar un (1) Sistema de saneamiento básico y aseo del Municipio de Cota. FUENTE: Ingresos ctes libre destiancion sobretasa a la gasolina	249,000,000.00
		Total Disponibilidad:	**249,000,000.00**

lúmero(s) Banco de Proyectos: 2025002678

)BJETO:

PRORROGA Y ADICION N. 1 AL CONTRATO SIOM-SAMC-1162-2025 CUYO OBJETO ES OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE.

on: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/C

ependencia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

esponsable MUNICIPIO COTA **Cargo:** CONTRATISTA DE APOYO

OTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025

Visto Bueno Presupuesto	**CASTAÑEDA FIQUITIVA LUIS ORLANDO** **SECRETARIO DE DESPACHO** **79533637**

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: E-DE-FR-014
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	CERTIFICADO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	FECHA: 17/Mayo/2024

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

EMITE EL CERTIFICADO DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS NÚMERO:

2025002678

QUE SEGÚN ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA Y VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA Y JURÍDICA EMITIDA POR: RODRIGUEZ COLORADO AMPARO ANDREA

LA ACTIVIDAD EN MENCIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE COTA, ASÍ:

NOMBRE DEL BANCO:	Optimización de estrategias para el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Cota, Cundinamarca
CODIGO BPIN:	2024252140169
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
PLAN DE DESARROLLO:	Con el Poder de la Gente, Cota Renace! 2024-2027
EJE ESTRATÉGICO:	1- Organizar Nuestra Casa
PROGRAMA:	4003- Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
META DE PRODUCTO:	040- Optimizar un (1) Sistema de saneamiento básico y aseo del Municipio de Cota.
INDICADOR DE PRODUCTO:	Optimizar un (1) Sistema de saneamiento básico y aseo del Municipio de Cota.
ACTIVIDAD:	PRORROGA Y ADICION N. 1 AL CONTRATO SIOM-SAMC-1162-2025 CUYO OBJETO ES OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE.
FINANCIACIÓN CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO:	$ 249,000,000.00
FINANCIACIÓN CON OTROS RECURSOS:	$ 0.00
TOTAL RECURSOS:	$ 249,000,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL:	GI.02.2.3.2.02.02.008.4003026.040-Optimizar un (1) Sistema de saneamiento básico y aseo del Municipio de Cota.
FUENTE(S) DE FINANCIACIÓN:	

1.2.1.0.002	Ingresos ctes libre destiancion sobretasa a la gasolina	$ 249,000,000.00

Dado en Cota Cundinamarca, a los 1 día(s) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco 2025

LADY DANIELA FONSECA SOCHA
SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN

NÚMERO Y FECHA SOLICITUD	ELABORÓ	REVISÓ
2025002930	Andres Cano	DIAZ OROZCO JASSER ANTONIO
01/12/2025	Técnico Administrativo	CONTRATISTA DE APOYO

Scanned with CamScanner

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CÓDIGO	GF01-01-FE02
VERSIÓN	N° 9 01/01/2021

DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	FECHA	DD	MM	AÑO
			02	12	2025

2025003155

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POSIBLE A SOLICITAR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TIPO DE SOLICITUD	
INICIAL	
ADICIÓN (*)	

Rubro	Descripción	Valor
	GASTOS	
	GASTOS DE INVERSION	
D2	SIOP	
D2.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
D2.2.3.2.02.02.008.4003026	Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales	
02.2.3.2.02.02.008.4003026.040	Optimizar un (1) Sistema de saneamiento básico y aseo del Municipio de Cota. Fuente: 1.2.1.0.002 Ingresos ctes libre destiancion sobretasa a la gasolina	249,000,000.00
27	Servicios de ingeniería en proyectos de tratamiento de agua, drenaje y alcantarillado	0.00
	TOTAL ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	249,000,000.00

OBJETO DE LA SOLICITUD	PRORROGA Y ADICION N. 1 AL CONTRATO SIOM-SAMC-1162-2025 CUYO OBJETO ES OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE COTA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE VALLADOS, CANALES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE. - N°: 5486

AUTORIZADO POR:

RODRIGUEZ COLORADO AMPARO ANDREA
ORDENADOR DE GASTO DECRETO No 056 de 2025

RODRIGUEZ COLORADO AMPARO ANDREA
SECRETARIO DE DESPACHO-INFRAESTRCUTURA Y OBRAS PUBLICAS

Adición Valladar

CONTRATISTA DE APOYO

Elaboró: SUSA TORRES LEIDY ANGHELIS

Scanned with CamScanner
