
CRONOGRAMA PROYECTO


Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
1		**LOTE 2**	**59 días**	**mié 19/11/25**	**sáb 31/01/26**		
2		**RURAL**	**59 días**	**mié 19/11/25**	**sáb 31/01/26**		
3		**VIA AL PATO PUEBLO PANCE - PANCE**	**59 días**	**mié 19/11/25**	**sáb 31/01/26**		
4		**PRELIMINARES**	**5 días**	**mié 19/11/25**	**dom 23/11/25**		
5		LOCALIZACION Y REPLANTEO	5 días	mié 19/11/25	dom 23/11/25	7;19	
6		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**19 días**	**lun 24/11/25**	**vie 12/12/25**		
7		EXCAVACION A MANO	15 días	lun 24/11/25	lun 8/12/25	8CC;11CC+2 día	5
8		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	15 días	lun 24/11/25	lun 8/12/25		7CC
9		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	15 días	vie 28/11/25	vie 12/12/25		12CC
10		**RELLENOS Y BASES**	**17 días**	**mié 26/11/25**	**vie 12/12/25**		
11		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	15 días	mié 26/11/25	mié 10/12/25	12CC+2 días	7CC+2 días
12		RELLENO ROCA MUERTA	15 días	vie 28/11/25	vie 12/12/25	9CC;14CC+5 día	11CC+2 día
13		**ACEROS**	**15 días**	**mié 3/12/25**	**mié 17/12/25**		
14		ACERO DE REFUERZO	15 días	mié 3/12/25	mié 17/12/25	16CC	12CC+5 día
15		**DRENAJES**	**45 días**	**mié 3/12/25**	**sáb 31/01/26**		
16		CONSTRUCCION DE CUNETAS	45 días	mié 3/12/25	sáb 31/01/26		14CC
17		**KM 18 SECTOR PINERA - LA ELVIRA**	**54 días**	**lun 24/11/25**	**sáb 31/01/26**		
18		**PRELIMINARES**	**4 días**	**lun 24/11/25**	**jue 27/11/25**		
19		LOCALIZACION Y REPLANTEO	4 días	lun 24/11/25	jue 27/11/25	21CC	5
20		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**10 días**	**lun 24/11/25**	**mié 3/12/25**		
21		EXCAVACION A MAQUINA	10 días	lun 24/11/25	mié 3/12/25	22CC;23CC;25C	19CC
22		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	10 días	lun 24/11/25	mié 3/12/25		21CC
23		ACARREO DE MATERIALES PETREOS	10 días	lun 24/11/25	mié 3/12/25		21CC
24		**RELLENOS Y BASES**	**20 días**	**lun 24/11/25**	**sáb 13/12/25**		
25		ESCARIFICACION DE SUBRASANTE	20 días	lun 24/11/25	sáb 13/12/25	26CC	21CC
26		RELLENO SUBBASE	20 días	lun 24/11/25	sáb 13/12/25	32	25CC

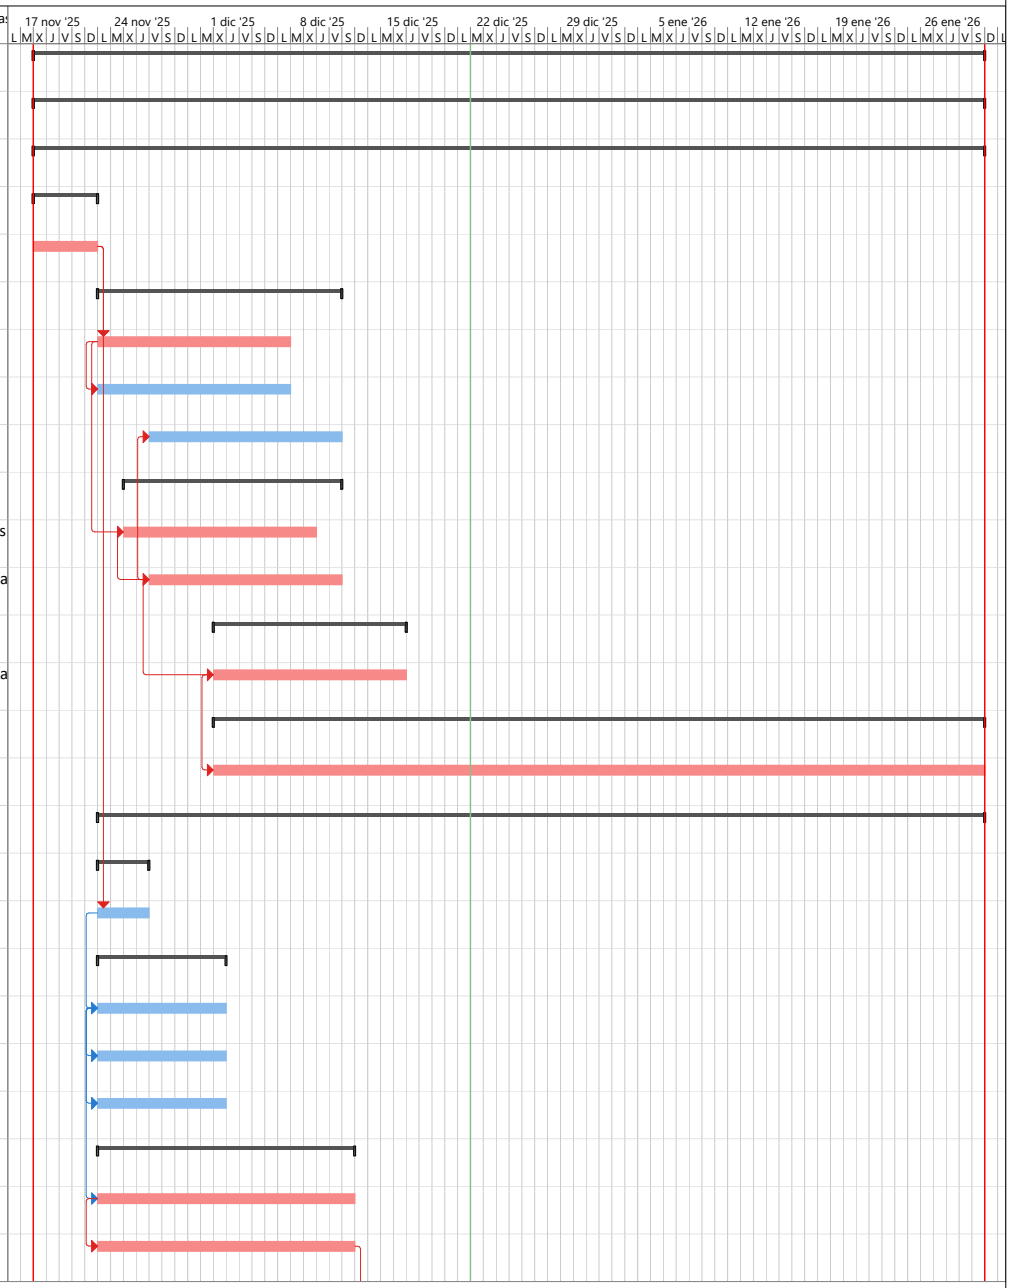

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso

CRONOGRAMA PROYECTO

Id	Texto16	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras
27		**CONCRETOS**	**20 días**	**dom 14/12/25**	**sáb 17/01/26**		
28		CONSTRUCCION DE HUELLAS	20 días	dom 14/12/25	sáb 17/01/26	29CC;30CC;34	32CC
29		EMPEDRADO	20 días	dom 14/12/25	sáb 17/01/26		28CC
30		CONSTRUCCION DE VIGA	20 días	dom 14/12/25	sáb 17/01/26		28CC
31		**ACEROS**	**8 días**	**dom 14/12/25**	**dom 21/12/25**		
32		ACERO DE REFUERZO	8 días	dom 14/12/25	dom 21/12/25	28CC	26
33		**DRENAJES**	**14 días**	**dom 18/01/26**	**sáb 31/01/26**		
34		CONSTRUCCION DE CUNETAS	14 días	dom 18/01/26	sáb 31/01/26		28

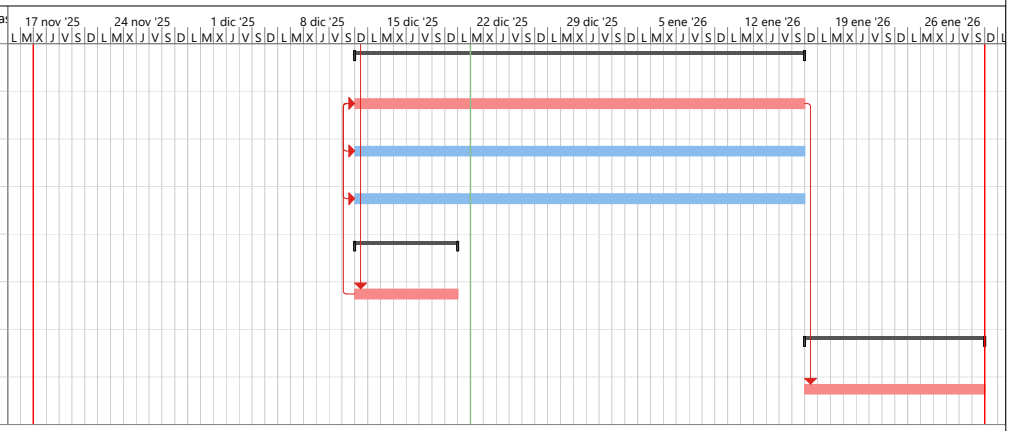

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
