ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	21-nov-25	**ACTA No.**	**60**
HORA DE INICIO:	10:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Contrato de obra 139-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Compromisos del acta anterior y otros

Tausa tramo piloto. Continuan las negociación con proveedor estabilizante

Especialista estructural cumple pero la interventoria hace la solicitud que para reforzar esta hoja de vida el estructural de que a diseñado muros alcantarillas. El contratista afirma de que solo con que cumpla es valido para el proyecto. Se remitira comunicado con la solicitud.

Profesionales SST pendiente por remisiòn de las hojas de vida por el contratista.

El contratistas esta haciendo laboratorios con otro producto dice que remitira a la interventoria el dia de mañana 22/11/2025 de remitir los resultados no comentan que en seco esta arrojado parametros de 1.49 Mpa y en humedo de 1.33 Mpa. Se espera por la interventoria la remisiòn de la informaciòn.

Topografia: Se remitio la topografia de la palma esta topografia sigue sin remitirse en su totalidad sigue avanzando.se tiene pendiente inciar con los frente de obra de choconta y sesquile esta pendiente

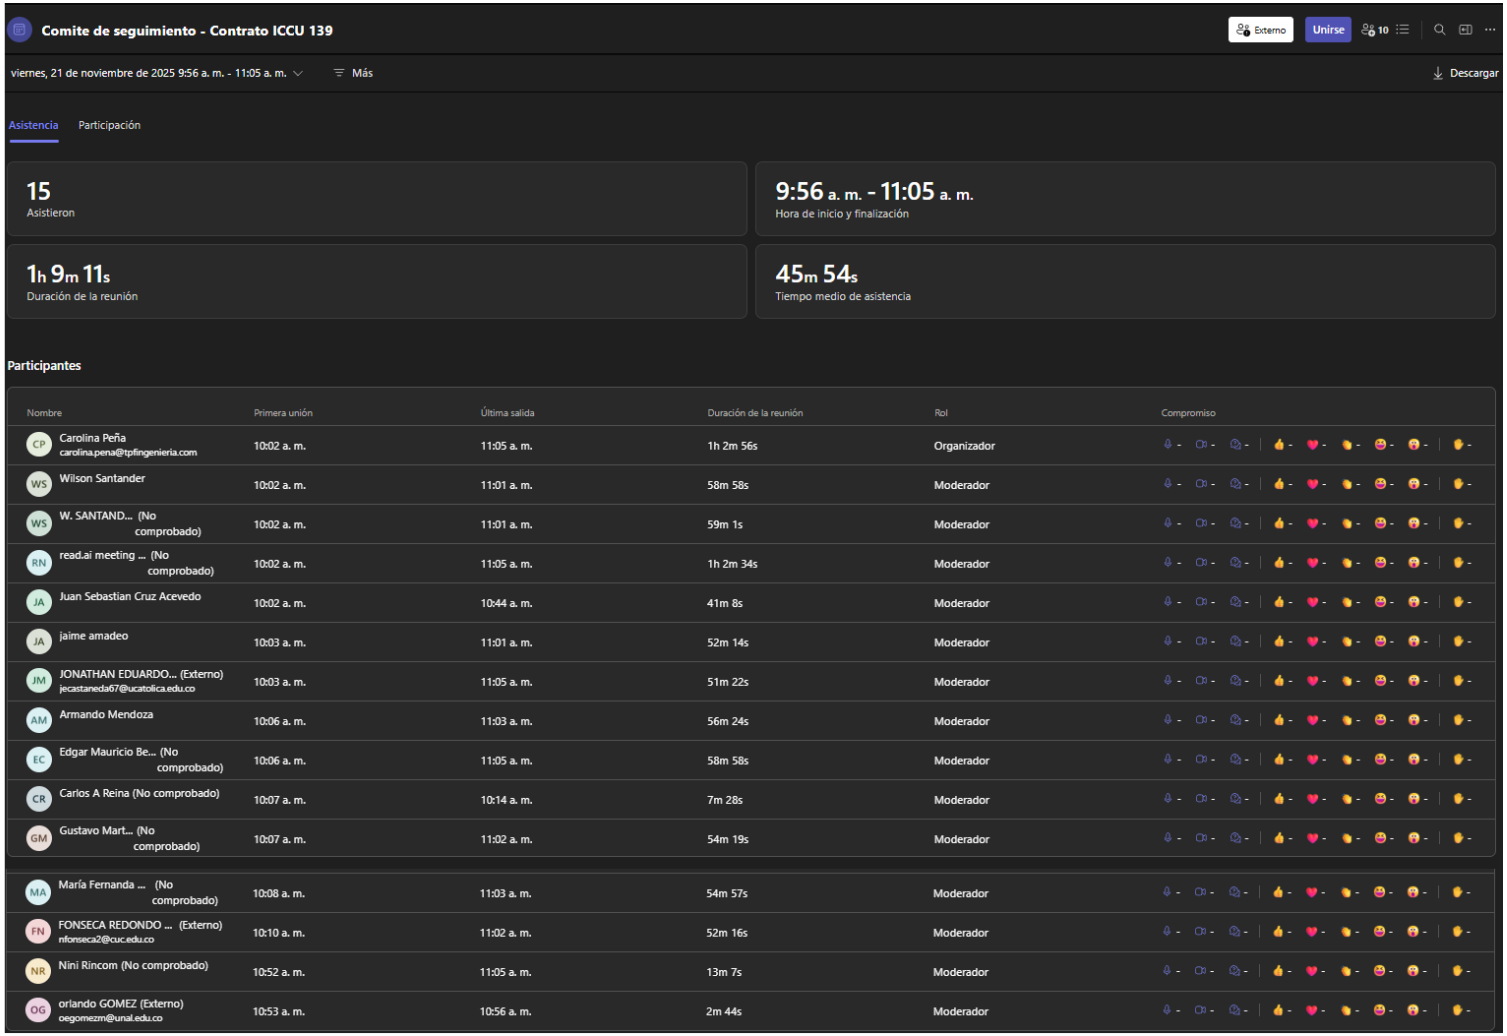
CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Tramo piloto - Tausa	Depende negociación con proveedor estabilizante
Presentación de HV Especialista estructural.	13-nov-25
Profesional SST - Ubaté y Almeidas - Información de proceso de vinculación	14-nov-25
Diseños pavimentos - Reunión entre especialistas-	14-nov-25
Entrega de información de topografía.	La Palma - Entregó parcial Villagómez 13/nov/2025 Topaipí y Yacopí inicia semana del 17/nov/2025 Tausa – Por definir por el contratista Ubaté - Por definir por el contratista Manta 28/nov/2025 Chocontá – Por definir por el contratista Sesquilé – Por definir por el contratista
Topaipí - Topografía de los 2 sectores que rpesentan perdida de banca y fueron objeto de visita especialistas Inician 18 nov 2025.	18-nov-25
Balance - Remisión de observaciones por parte de Interventoría - iniciar proceso de APU NP.	No se indica fecha. Se menciona como prioritario
La Palma Reunión personería Alcaldia	20-nov-25
Instalación de valla	preliminarmente para miercoles 19 nov 2025 informa contratista
Entrega de diseño de mezcla de concreto para encole y descole alcantarillas.	Ubaté – 31/oct/2025
Entrega de resultado de ensayos de placa y briquetas del tramo piloto de Simijaca	29-oct-25
Entrega archivo incidencias con valores y porcentajes de avance de etapa de ejecución	4-nov-25
Entregar a Interventoría de la Cuenta del 2do. 25%. - Contratista remitirá consulta	14-nov-25
Ampliación plazo - contratista presenta análisis	24-nov-25

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025
ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión. (Imagen de asistentes a la reunión virtual)			


Comite de seguimiento - Contrato ICCU 139
Externo
Unirse
10
viernes, 21 de noviembre de 2025 9:56 a. m. - 11:05 a. m.
Más
Descargar
Asistencia
Participación
15
Asistieron
9:56 a. m. - 11:05 a. m.
Hora de inicio y finalización
1h 9m 11s
Duración de la reunión
45m 54s
Tiempo medio de asistencia
Participantes
Nombre
Primera unión
Última salida
Duración de la reunión
Rol
Compromiso
Carolina Peña
carolina.pena@tpfingenieria.com
10:02 a. m.
11:05 a. m.
1h 2m 56s
Organizador
Wilson Santander
10:02 a. m.
11:01 a. m.
58m 58s
Moderador
W. SANTAND... (No comprobado)
10:02 a. m.
11:01 a. m.
59m 1s
Moderador
read.ai meeting ... (No comprobado)
10:02 a. m.
11:05 a. m.
1h 2m 34s
Moderador
Juan Sebastian Cruz Acevedo
10:02 a. m.
10:44 a. m.
41m 8s
Moderador
jaime amadeo
10:03 a. m.
11:01 a. m.
52m 14s
Moderador
JONATHAN EDUARDO... (Externo)
jecastaneda67@ucatolica.edu.co
10:03 a. m.
11:05 a. m.
51m 22s
Moderador
Armando Mendoza
10:06 a. m.
11:03 a. m.
56m 24s
Moderador
Edgar Mauricio Be... (No comprobado)
10:06 a. m.
11:05 a. m.
58m 58s
Moderador
Carlos A Reina (No comprobado)
10:07 a. m.
10:14 a. m.
7m 28s
Moderador
Gustavo Mart... (No comprobado)
10:07 a. m.
11:02 a. m.
54m 19s
Moderador
María Fernanda ... (No comprobado)
10:08 a. m.
11:03 a. m.
54m 57s
Moderador
FONSECA REDONDO ... (Externo)
nfonseca2@cuc.edu.co
10:10 a. m.
11:02 a. m.
52m 16s
Moderador
Nini Rincom (No comprobado)
10:52 a. m.
11:05 a. m.
13m 7s
Moderador
orlando GOMEZ (Externo)
oegomezm@unal.edu.co
10:53 a. m.
10:56 a. m.
2m 44s
Moderador
