Anexo No. 19

Bitacora

SECTOR PUENTE NACIONAL EN EL SECTOR DEL PR 88+205. -PR 88+462.20, SE REALIZA NIVELACION EN EL PR 0+930.-PR0+965 SECTOR PUENTE NACIONAL RUTA 45A06., EN LA JORNADA SE EXTIENDE 7.54 M³ DE MDC 19

MAQUINARIA Y EQUIPO.
MINICARGADOR
BERLINA
BASCULANTE, CARRO IRRIGADOR
VOLQUETAS
PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO, OPERADORES
CUADRILLA DE ASFALTO

Marthal Cotsp
Residente INTV

SE TERMINA LA ACTIVIDAD DE PARCHEO EN EL SECTOR DE PUENTE NACIONAL - GUEPSA, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS RECURSOS DEL ADICIONAL Nº 3 PARA LA RUTA 45A05 Y 45A06 YA SE TERMINARON.

OCTUBRE 04, AL 30 DE OCTUBRE NO SE EJECU TAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS RUTA. PUENTE NACIONAL - SANJOSE DE PARE RUTA 45A05, 45A06.

Marthal Cotsp

NOVIEMBRE 01-05 DE 2025
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTA 45A06; EN ESPERA DE RECURSOS ADICIONAL Nº 03 EN TRAMITE EL PERSONAL Y EQUIPO DE CONTRATISTA, SE ENCUENTRA EN DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO PARA INICIO DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO SECTOR RUTA.

SECTOR PUENTE NACIONAL EN EL SECTOR DEL PR 88+205. -PR 88+462.20, SE REALIZA NIVELACIÓN EN EL PR 0+950.-PR 0+965 SECTOR PUENTE NACIONAL RUTA 45A06., EN LA JORNADA SE EXTIENDE 7.54 m^3 DE LDC HG

MAQUINARIA Y EQUIPO.
MINICARGADOR
BENNIN
BASCULANTE, CARRO IRRIGADOR
VOLQUETAS
PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO, OPERADORES
CUADRILLA DE ASFALTO

Martha L Cotes p
Residente INTV
SE TERMINA LA ACTIVIDAD DE PARCHEO EN EL SECTOR DE PUENTE NACIONAL - GUEPSA, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS RECURSOS DEL ADICIONAL Nº 3 PARA LA RUTA 45A05 Y 45A06. YA SE TERMINARON.

OCTUBRE 04, AL 30 DE OCTUBRE NO SE EJECU TAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS RUTA. PUENTE NACIONAL - SANJOSE DE PARE
RUTA 45A05, 45A06.

Martha L Cotes p

NOVIEMBRE 01-05 DE 2025
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTA 45A06; EN ESPERA DE RECURSOS ADICIONAL Nº 03 EN TRAMITE EL PERSONAL Y EQUIPO DE CONTRATISTA, SE ENCUENTRA EN DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO PARA INICIO DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO SECTOR RUTA.

NOVIEMBRE 06 - DE 2025 (JUEVES)

RUTA ASA 06.

ESTADO DE TIEMPO: DIA. SECO

SE RETOMAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MEDIANTE BACHEO/PARCHEO. TECNICO, SE INICIAN ACTIVIDADES EN EL SECTOR DE O.BM., NIVELACIÓN DE FALLA GEOLÓGICA, POR ESCALONAMIENTO QUE PONE EN RIESGO A LOS USUARIOS, LAS ACTIVIDADES SE INICIAN EN EL PR 62+090 - HACIA MENORES - PR 62+220. SECTOR O.BM. POSTERIORMENTE SE CONTINUA EN EL PR 59+220 - PR 62+252, EN LA JORNADA DE HOY SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 145m. INSTALA 27.16 M³ DE BTA Y 51.64 M³ DE MDC 19 SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA DE LAS MEZCLAS INSTALADAS. Y SE RELACIONAN.

VEHICULO VIAJE N°	TIPO MEZCLA	N°CTA	T° LLT.
TSM 253	02 MDC19		
JSL 817	01 MDC19		
WGO 366	03 MDC19	130°	140°
SMP 552	04 MDC19	125	130
WOV 646	05 MDC19	130	130

MAQUINARIA Y EQUIPO:

FRESADORA
FINISHER VOGELE
MINICARGADOR CAT- N° 45. (2)
BARREDORA, COMPRESOR
VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75 MIXTO
VIBROCOMPACTADOR LISA)
CARRO IRRIGADOR
BARCHADANTE.
CARROTANQUE AGUA, VOLQUETAS

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR PAVIMENTOS, CONTROLADORES DE TRAFICO (3)
CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES,

Martha L. Cob P.
Residente INTV

NOVIEMBRE 07 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO : DIA SECO
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL SECTOR DE SUAITA - HASTA MENORES RUTA 45A 06
SE INTERVIENE EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PR 58+439 - PR 59+162, CARRIL IZQUIERDO LONGITUD 254 m. SE REALIZA LA SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CONTROL DE TIEMPO DE ROMPIMIENTO EMULSION (RIEGO LIGA) E INSTALACIÓN DE MEZCLAS. (CONTROLES DE TEMPERATURA)

VEHICULO	VIAJE Nº	INSTALACION	TIPO MEZCLA	T° CTA	T° INT
TSN 254	02		MDC 19	140	130
JSL 816	03		MDC 19	130	130
TSM 259	04		MDC 19	145	142
JSL 817	05		MDC 19	135	135
TSM 256	06		MDC 19	130	125

SE INSTALA 94.46 M³ - MDC 19
MAQUINARIA Y EQUIPO:

PRESTADORA
FINISHER VOGELE
MINICARGADORES CAT (2)
VIBROCOMPACTADOR MIXTO HAMM 75
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS
BARREDORA,
CARROTANQUE AGUA
CARRO IRRIGADOR
HERRAMIENTAS, CAMINERA

Martha L Cob P
INTV

NOVIEMBRE 08 DE 2025 (SABADO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Martha J. Cortés P

NOVIEMBRE 09 DE 2025 (DOMINGO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

NOVIEMBRE 10 DE 2025. (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO:

SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL SECTOR DEL PR 57+443 - PR 58+608 CARRIL IZQUIERDO, SE INTERVIENE UNA LONGITUD: 315 M INSTALA MDC 19: 114 43 47

EN LA JORNADA DE HOY SE SUMINISTRA MEZCLA MDC 19; M³ Y RIEGO DE MEB, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL PR6 DEL SECTOR DE PUENTE NACIONAL RUTA 45A06, EL CONTRATISTA DE GESTION VIAL REPLIZA EL TAPA HUECO EN EL SECTOR. ENC. EL SECTOR DE PARCHEO SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS NUEVAMENTE SE HACE LA SOLICITUD AL PERSONAL DE LABORATORIO DEL CONTRATISTA, YA QUE NO SE CUENTA CON LA CAMARA TERMOGRAFICA.

SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA DE LAS MEZCLAS

VEHICULO	VIAJE N:	INSTALACIÓN	TIPO MEZCLA	TºC	TºC
SPX 401	01		MDC 19	130	140
TSH 259	02		MDC 19	140	140
WBO 361	08		MDC 19	130	140
WOV 646	03		MDC 19	130	145
JSL 817	04		MDC 19	120	120
JSL 816	05		MDC 19	120	120
SUP 556	06		MDC 19	130	140
WOO 366	07		MDC 19	140	130
176	09		MDC 19	125	125

Scanned with CamScanner

MAQUINARIA Y EQUIPO

- FRESADORA WIRTGEN
- FINISHER
- VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO UNI #21
- VIBROCOMPACTADOR HAMM #23
- MOTONIVELADORA #42
- COMPRESOR INGERSOLRAND #01
- BASCULANTE
- CAMIONETA QUE RIEGA
- MINICARGADOR CAT #45
- MINICARGADOR CAT #42
- IRRIGADOR TIRO
- TURBO - CAMION. VOLQUETAS 01, 10, 92 & 97

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES, AUXILIARES DE TRAFICO, AUXILIAR LABORATORIO

Timothy Corp.

NOVIEMBRE 11 DE 2025 (MARTES)

ESTADO DE TIEMPO:

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, MEDIANTE PARCHEO, EN LOS SECTORES PREVIAMENTE PARCHADO, EN EL SECTOR DEL PR 571+359.40 PR 571+950 CD, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE: 323.00M SE INSTALA MOCHO 110 M³ Y SE REALIZAN LOS CONTADORES DE LA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA E INSTALACION DE MEZCLAS, EN LA JORNADA DE HOY NO SE QUIENTO CON EL COMPRESOR, SE VIBRA, SE REALIZA LIMPIEZA CON SOPLADORA MANUAL

CONTROLES DE TEMPERATURA

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° CTR	T° INT.
W60 360	01	MDC19	120	130
JSL 817	09	MDC19	120	130
SPX 402	02	MDC19	120	120
TSM 250	03	MDC19	130	130
TSM 251	04	MDC19	125	125
TSM 252	05	MDC19	140	130
W60 361	07	MDC19	120	130
TSM 256	08	MDC19	120	135

MAQUINARIA Y EQUIPO.
FRESADORA WIRTGEN
FINISHER
VIBROCOMPACTADOR HAMM. N°23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO
MINICARGADOR (2)
BARREDORA.
COMPRESOR. VARIOS POR REPARACION
IRRIGADOR TIRO
BASCULANTE, TURBO, VOLQUETAS (4)

PERSONAL EN OBRA.
INSPECTOR PAVIMENTO, 3 AUXILIARES TRAFICO
CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES, AUXILIAR
LABORATORIO

JONATHAN CORTES
INTV

NOVIEMBRE 12 DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA SE CP. TARDE SOBRE 4:30 HASTA 5:50 P.M. SE PRESENTÓ LLUVIAS SE DP. CONTINUANDO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRETA ASFALTICO PROYECTADO EN EL SECTOR DEL PR 571+071.30 - PR 571+930 CARRIL DERECHO, SE IZQUIERDO, SE INTERCALAN

UNA LONGITUD DE: 327.70 M
SE INSTALO MDC 19: 113.59 M3.
SE REALIZA CONTROL DE TEMPERATURA A LA MEZCLA INSTALADA

VEHICULO	VIAJE N:	TIPO MEZCLA	T° CTA	T° UNTV
JSL 816	02	MDC 19	130	120
TSM 254	03	MDC 19	140	130
TSM 259	04	MDC 19	140	138
176	06	MDC 19	130	120
WGO 366	05	MDC 19	135	135
TSM 258	07	MDC 19	135	130
TSM 257	08	MDC 19	125	120
SKI 252	01	MDC 19	110	110
TSM 250	10	MDC 19	110	120

FINALIZA INSTALACION 8.23 P.M.
MAQUINARIA Y EQUIPO:
FRESADORA WIRTGEN
FINISHER
VIBROCOMPACTADOR APAM 23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO
COMPRESOR INGERSOLRAND # 01 (VARIADO)
BASCULANTE, CARROTANQUE 06m
MINICARGADOR ENT # 45 Y 42
VOLQUETAS (4) FALTARON
IRRIGADOR DE TIRO
TURBO CAMION, SE REQUIERE LUMINARIA DEL CONTRATISTA Y MANIFIESTA Q' SE DISPONDRA EL JUEVES.
PERSONAL EN OBRA:
INSPECTOR, CONTROLADORES DE TRAFICO
CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES
AUXILIAR LABORATORIO

Stanhart Cortes P
INTIA.

NOV 13 - DE 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENI
MIENTO; POR MANTENIMIENTO PLANTA CMOD
EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON TRECO
RRIDO PARA PRIORIZAR SECTORES O.
INTERVENIR; QUE PRESENTAN DAÑOS COMO
BACHES, HUNDIMIENTOS, ONDULACION FALLAS

OTHONIEL CORTES P.
INTV.

NOVIEMBRE 14 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO DIA SECO
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MAN
TENIMIENTO RUTA 45 A-06,
SE REALIZA ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS
EN LA RUTA 45 A04 DESDE EL PEAJE
CASA BLANCA PR 41+000 - PR.
SE INSTALA. H.D.C 19. M3

MAQUINARIA Y EQUIPO:
MINICARGADOR, BENITIN, VOLQUETA,
BARCULANTE, HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA:
INSPECTOR, 3 AUXILIARES TRAFICO,
CUADRILLA TAPA HUECOS OPERADORES

OTHONIEL CORTES P

NOVIEMBRE 15 DE 2025. (SABADO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

OTHONIEL CORTES P

NOVIEMBRE 16 DE 2025 (DOMINGO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO
OTHONIEL CORTES P

NOVIEMBRE 17 DE 2025 (LUNES FESTIVO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

OTTO ARTHUR L. CORTES P
INTV.

NOVIEMBRE 18 DE 2025 (MARTES)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LA PLANTA CONTINUA EN MANTENIMIENTO EN CAMPO LLEGA A OBRA LA FRESADORA CAT PR 450 # 32.

OTTO ARTHUR L. CORTES P
INTV

NOVIEMBRE 19 DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO : SECO
SE RETOMAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PARCHEO TECNICO SE INTERVIENE EL SECTOR PR 554 913 CD - PR 544 890 CI EN UNA LONGITUD : 227.20 M
SE INSTALA BTA : 32.84 M³ Y MDC19 : 81.36 M³
SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS.

VEHÍCULO	VIAJE N°	MEZCLA	T° CAMP	T° INTV
TSM 255	01	BTA	110	120
JSL 816	03	BTA	145	140
TSM 259	01	MDC19	140	145
TSM 256	02	MDC19	145	140
WGO 361	03	MDC19	125	130
WGO 360	04	MDC19	125	125
TSM 250	05	MDC19	125	120
SPX 402	02	BTA	120	120
SMO 560	06	MDC19	130	120

Scanned with CamScanner

			T° CTA	T° INT
TSN 254	07	MDC19	120	130

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA WIRTGEN
FINISHER
VIBROCOMPACTADOR LANDUM #23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO #21
BARREDORA
COMPRESOR INGERSOLL #01
MINICARGADOR N: 45 Y 42
BASCULANTE, IRRIGADOR TIRO
NO SE CUENTA CON LUMINARIAS
REEMPLAZA EL COMPRESOR INGERSOLL
POR ATLAS COUPCO.
INGRESA FRESADORA. PR 450 #32

PERSONAL EN OBRA.
INSPECTOR, 3 AUXILIARES TRAFICO, OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO, AUXILIAR LABORATORIO, DIRECTOR OBRA
JONATHAN L. CONSP
INTV.

NOVIEMBRE 20 DE 2025 (JUEVES).

ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA SECA, EN LA TARDE SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS SOBRE LAS 4:15 P.M
SE DA CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD DE PARCHEO TECNICO EN LOS SECTORES PREVIAMENTE DEMARCADOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO. EN LA JORNADA DE HOY SE INTERVIENE EL SECTOR DEL PR 54+331. - PR 50+938.20 COSTADO IZQUIERDO SECTOR SUR/TO, SE INTERVIENE UNA LON GITUD: 2933.0M SE NIVELA FALLA GEOLOGICA INSTALA. BTA. e=0.12 = 29.2M³, MDC19 100.02 MP

LAS ACTIVIDADES SE ATRASAN POR (A) LLUVIA EN LA ZONA. SE SOLICITA AL CONTRATISTA DISPONER EN OBRA DE LA LUMINARIA. EL CONTRATISTA EXPRESA QUE LA PLANTA Y EL MINICARGADOR LLEGAN EL DIA DE MAÑANA A OBRA.

SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS.

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° OTA	T° PAVIM.
JSL 817	02	BTA	120	120
WGO 366	01	MDC19	110	120
176	02	MDC19	140	130
SMP 552	03	MDC19	135	135
TSM 251	04	MDC19	135	140
TSM 259	06	MDC19	130	130
TSM 258	05	MDC19	140	140
TSM 250	01	MDC19	120	120

FINALIZA INSTALACION 7:45PM

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA WIRTGEN, Y PR 450 C.

FINISHER

VIBROCOMPACTADOR HAMM H023

VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO

MINICARGADORES CAT (2)

BARREDORA, COMPRESOR., MOTOBOMBA AGUA

IRRIGADOR TIPO, TURBO CAMION

OBSERVACIONES: VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO CAT 21 PRESENTA DAÑO EN RODAMIENTOS Y FRENOS

PERSONAL EN OBRA:

DIRECTOR, INSPECTOR, 3 AUXILIARES DE TRAFICO, CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES AUXILIAR LABORATORIO

Jonathan Ortiz

INTV

NOVIEMBRE 21 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, EN LOS SECTORES PREVIAMENTE IDENTIFICADOS Y MARCADOS EN CONJUNTO CN RECORRIDO CON CONTRATISTA.
LA JORNADA DE HOY SE INTERVIENE EL SECTOR DE LA RUTA 45 A 06. ENTRE EL PR 50+475. - PR 49+553.10. CARRIL DERECHO Y PR 50+468.20 - PR 50+537.60 CARRIL IZQUIERDO, EN UNA LONGITUD INTERVENIDA DE: 221.50 M SE INSTALA BTA EN LAS ZONAS QUE REQUIEREN NIVELACION: 55.10 M3, MDC19: 71.01 M3
LA JORNADA SE VIO AFECTADA Y PRESENTO DEMORAS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FINISHER PRESENTO FALLAS SOBRE LAS 9:30 PM. FINALIZANDO JORNADA DE INSTALACION DE MEZCLA 6:20 P.m.
NUEVAMENTE SE REITERA AL CONTRATISTA QUE NO SE CUENTA CON LUMINARIA PARA ESTAS ACTIVIDADES NOCTURNAS QUE SURGEN POR IMPREVISTO COMO EL OCURRIDO EN LA JORNADA DE HOY.
EL CONTRATISTA EXPRESA QUE EL DIA DE MAÑANA INGRESA A OBRA LA PLANTA. Y EL LIMICARGADOR.
CONTROLES TEMPERATURA MEZCLA

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T°CITA	T° IN
JSL 816	01	BTA	128	125
JSL 817	02	MDC19	132	145
TSM 250	01	MDC19	128	110
TSM 251	03	MDC19	125	130
WOV 643	02	BTA		110

ESTE VIAJE FUE CARGADO A LA 1:19 PM EN PLANTA CMOD, EN OBRA INSTALO 2:0 PM

TSM 287	07	MDC19	128	120

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA WIRTGEN Y CAT PR 450E #32
FINISHER
MINICARGADORES CAT N° 45 y 42
BARREDORA # 42
COMPRESOR ATLAS COPCO #01
BASCULANTE
CARROTANQUE AGUA
IRRIGADOR TIRO, TURBO (ANILLO)
VOLQUETAS FRESADO (4)
VIBROCOMPACTADOR HAMM #23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO

PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR, 8 AUXILIARES DE TRAFICO
CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES,
AUXILIAR LABORATORIO

[illegible] CONTROL - V°B°
INTV.

NOVIEMBRE 22 DE 2025 (SABADO)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, MEDIANTE PARCHEO EN LA JORNADA DE HOY SE INTERVIENE EL SECTOR DEL PR 504 537-60 - PR 4919 16° CARRIL IZQUIERDO; SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE: 334.80 M.L., MDC 19: 130 KG. CONDUCTOS SE REALIZAN LOS CONTROLES A LAS ACTIVIDADES EN CAMPO, SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA:

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° CITA	T° INT
TSM 257	01	MDC 19	125	150
TSM 256	02	MDC 19	142	148
SPV 402	03	MDC 19	130	130
WGO 366	04	MDC 19	112	125

VEHICULO	VIAJE	MEZCLA	T° CTTA	T° INY
W60 361	06	MDC19	130	140
TSM 259	05	MDC19	140	130
SMP 552	07	MDC19	136	110
JSL 816	08	MDC19	134	118
WOV 643	09	MDC19	142	130
TSM 251	10	MDC19	150	135
TSM 250	12	MDC19	128	130

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORAS (2)
FINISHER (1)
MINICARGADORES (2)
VIBROCOMPACTADOR HAMM H23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO
BARREDORA, COMPRESOR
IRRIGADOR TIRO
INGRESO A OBRA LUMINARIA Y MINICARGADOR N: 32
CARROTANQUE, BASCULANTE, TURBOCAMION VOLQUETAS FRESADO (4)

PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR PAVIMENTOS, 3 AUXILIARES DE TRAFICO, CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES, AUXILIAR LABORATORIO

Jonathan Cortes P
INTV.

NOVIEMBRE 23 DE 2025 (DOMINGO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMP.

Jonathan Cortes P
INTV

NOVIEMBRE 24 DE 2025 (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
SE DA CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA MEDIANTE PARCHEO TECNICO, EN LA JORNADA DE HOY SE INTERVIENE EL SECTOR DEL PR 49+563,70 - PR 49+038.30 CARRIL IZQUIERDO Y EL PR 49+518.70 - PR 49+30 y CARRIL DERECHO SE REALIZA LA SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES EN CAMPO, SE REALIZARON LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE	MEZCLA	T° CITA	T° INTV
W60 173	01	BTA	125	130
SPX 402	02	BTA	125	136
TSM 250	01	MDC19	125	140
JSL 816	02	MDC19	140	140
WDV 643	03	MDC19	150	150
SMP 552	04	MDC19	150	150
SMP 560	05	MDC19	140	142
W60 366	06	MDC19	120	125
176	07	MDC19	120	110

SE INSTALA: BTA: 21.39 M³; MDC19: 74.07 M³; LONG: 205.90 M
MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORAS (2)
FINISHER (1)
VIBROCOMPACTADOR MIXTO HAMM 23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO, CONTINUA DANDO EN FRENTE
MINICARGADORES CAT # 45 y 42 EL # 45 PRESENTO DAÑO
BARREDORA, COMPRESOR, BASCULANTE
VOLQUETAS FRESADO (4)
BASCULANTE, TURBO CARGADO
IRRIGADOR TIRO

PERSONAL EN OBRA:

INSPECTOR PAVIMENTOS, 3 AUXILIARES TRAFICO, CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES AUXILIAR LABORATORIO

Martha Cortés P
INTV.

NOVIEMBRE 25 DE 2025 (MARTES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUA CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, SE INTERVIENE EL TRAMO ENTRE EL PR 48+772 - PR 47+644 CARRIL IZQUIERDO, SE INSTALA BTA: 49.67MP Y MDC 19.: 76.57 MP. LONGITUD INTERVENIDA: 233

CONTROLES DE TEMPERATURA

VEHICULO	VIAJE N°	MEZCLA	T° CTTA	T° INTV
TSH 259	02	BTA	120	125
TSM 259	01	BTA	110	110
JSL 817	01	MDC19	130	125
TSM 256	02	MDC19	130	130
TSM 250	03	MDC19	125	145
WGO 360	05	MDC19	120	125
TSM 254	03	BTA	130	140
176	04	BTA	140	135
TSM 257	05	BTA	125	140
TSM 251	06	MDC19	120	125
WOV 643	07	MDC19	120	125

MAQUINARIA Y EQUIPO:
FRESADORAS (2)
FINISHER (1)
MINICARGADORES (2) VARIOS 45
COMPRESOR, BARREDORA, IRRIGADOR TIRO
CARROTANQUE AGUA
VIBROCOMPACTADOR HAMM #23

VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO, CONTINUA PRESENTANDO DAÑO EN FRENOS
VOLQUETAS FRESADO (4)
CAMION TURBO, BASCULANTE

OTRAS EN OBRA

INSPECTOR, 3 AUXILIARES DE TRAFICO
CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES,
AUXILIAR LABORATORIO, DIRECTOR DE OBRA

Martha Cortes P.
INTV.

NOVIEMBRE 26 DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

SE REALIZA RECORRIDO CON DIRECTOR DE OBRA INSPECTOR E INTERVENTORIA, CON EL FIN DE CONTINUAR LA DEMARCACION Y PRIORIZACION DE SITIOS A INTERVENIR, MEDIANTE PARCHEO TECNICO
SE CONTINUA CON LA PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL SECTOR PR 49+266.70 - PR 47+970 INTERVINIENDO UNA LONGITUD DE: 2.86 m.
INSTALA BTA: 40.02 kg y MDC19: 100.46 kg
SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE N°	MEZCLA	T° OTT	T° INTV
176	01	MDC19	140	130
TSH 259	02	MDC19	140	150
SMP 552	01	BTA	125	120
TSH 258	03	MDC19	130	135
TSL 817	04	MDC19	130	125
SMP 554	05	MDC19	120	120
TSH 254	06	MDC19	150	150

Scanned with CamScanner

			T° CTA	T° INTV
TSM 257	07	MDC 19	130	135°
W60 360	08	MDC19	135	135
W60 366	02	BTA	120	130
W60 360	03	BTA	145	140
VOV 646	09	MDC19	120	120

MAQUINARIA Y EQUIPO
PRESADORA WIRTGEN, PRESADORA VOLVO PR 450C
RODILLOS COMPACTADORES (2).
BARREDORA, COMPRESOR, REGADOR TIRO
VIBROCOMPACTADOR CASSAGRANDE #23, VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO.
CARROTANQUE AGUA, VOLQUETAS PRESADORA (4)
TURBO COMBUSTIBLE, BASCULANTE, HERRAMIENTAS MENORES.

PERSONAL EN OBRA
DIRECTOR, INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO (3)
CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES, AUXILIAR LABORATORIO

OTTO THAS Corte p. Voh Bmw

INTV:

NOVIEMBRE 27 DE 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
SE CONTINUA REALIZANDO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA MEDIANTE PARCHEO TECNICO EN EL SECTOR DEL PR. 48+010 - PR 47+635 SO CARRIL DERECHO PR 48+369 - PR 47+680 CARRIL IZQUIERDO, SE INTERVIENE LONGITUD: 233.30M INSTALA BTA°. MDC19: 104.86M²
SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE N°	MEZCLA	T° CTA	T° INTV
TSM 250	01	MDC19	110	125

VEHICULO	VIAJE N°	MEZCLA	T° ETA	T° INTV
TSM 251	02	MDC19	125	125
WOV 643	03	MDC19	130	150
TSM 256	04	MDC19	150	130
TSM 254	05	MDC19	130	140
SMD 560	06	MDC19	140	140
TSM 259	07	MDC19	140	130
JSL 817	08	MDC19	120	135
SMP 554	09	MDC19	140	130
SMP 552	10	MDC19	125	125

TOMA DE MUESTRAS. SE OBSERVA NO HOMOGENEIDAD EN

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORAS (2)

FINISHER (1) VOGELE

MINICARGADORES (2)

VIBROCOMPACTADOR HAMM. #23

VIBROCOMPACTADOR NEUMATICOS

BARREDORA, COMPRESOR, IRRIGADOR TIPO CARROTANQUE AGUA, BOSCUDANTE CALENTADOR BUS, VOLQUETAS FRESADO, ILUMINARIA

PERSONAL EN OBRA:

DIRECTOR OBRA. INSPECTOR, 3 AUXILIARES TRAFICO OPERADORES, CUADRILLA ASFALTO, AUXILIAR LABORATORIO

Martha Castro

NOVIEMBRE 28 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: (DIA SECO) TARDE: 3:30 LLUVIA

SE CONTINUA CON LA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA. NIVELACION DE FISURAS QUE GENERAN ALTO GRADO DE ACCIDENTALIDAD, EN LA JORNADA SE INTERVIENE AMBOS CARRILES PR 46+500 - PR 46+012, CARRIL DERECHO PR 46+480 - PR 46+448 SB CARRIL IZQUIERDO

SECTOR DE FALLA GEOLOGICA, QUE PRESENTA ESCALONAMIENTO Y SE ENCUENTRA, DAÑO. CARPETA ASFALTICA. LA JORNADA DE HOY SE VIO AFECTADA POR LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE QUE INICIARON SOBRE LAS 3:00 PM Y TERMINAR SOBRE 5:30 PM POR LO CUAL SE TUVO QUE SUSPENDER LAS ACTIVIDADES.

SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE N°	MEZCLA	T° CTTA	T° CNT
WGO 361	01	BTA	130	135
TSM 258	02	BTA	150	150
TSM 254	03	BTA	120	125
WGO 361	01	MDC 19	140	140
WGO 366	02	MDC 19	130	130
WGO 360	03	MDC 19	135	135
TSM 256	05	MDC 19	125	120
TSM 250	06	MDC 19	125	140
SMP 560	04	MDC 19	130	130

INSTALA. BTA: 37.39 M³, MDC 19: 63.35 M³ L: 17632 M.

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORAS (2)
FINISHER WOGELE (1)
MINICARGADORES (2)
VIBROCOMPACTADOR HAMM #23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO, CONTINUA COMPACTADOS EN FRENTE
BOBCAT, COMPRESOR, TRIGADOR TIPO VOLQUETAS TRIGADO (4)
CARROTANQUE AGUA, BASCULANTE, TURBO CAMION-BUS, ILUMINACION

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO (3) OPERADORES CUADRILLA ASFALTO, AUXILIAR LABORAT.

NOVIEMBRE 29 DE 2025 (SABADO)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA MANTENIMIENTO CARPETA ASFALTICA, PASO DOBLADO SECTOR VIADUCTO EJE A EL PR 45+480 - PR 46+239 CARRIL IZQUIERDO, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE: 2401 ml INSTALA MDC19 = 99.2 TON

SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE Nº	MEZCLA	T° OTTA	T° INT.
WOV 643	01	MDC 19	130	150
TSM 251	02	MDC 19	135	145
TSM 259	03	MDC 19	125	140
TSM 257	04	MDC 19	130	150
TSM 254	05	MDC 19	110	120
WGO 361	06	MDC 19	140	135
WGO 366	08	MDC 19	140	150
TSM 258	07	MDC 19	140	145
WGO 360	09	MDC 19	130	130
JSL 817	01	BTA	130	120

MAQUINARIA Y EQUIPO


FRESADORA WIRTGEN W PRC450 #32 FINISHER, MINICARGADORES (2), BODREDORA COMPRESOR, VIBROCOMPACTADOR HAMM #2 VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO, CARRO IRRIGADOR CARROTANQUE AGUA, BASCULANTE, TURBO-CANION VOLQUETAS, FRESADO, BUS, LUMINARIAS

PERSONAL: INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO (3) OPERADORES, CUADRILLA ASFALTO, AUXILIAR LABORAT.

JMartinez Carlos

INTV.

Vista perfil - muro S26

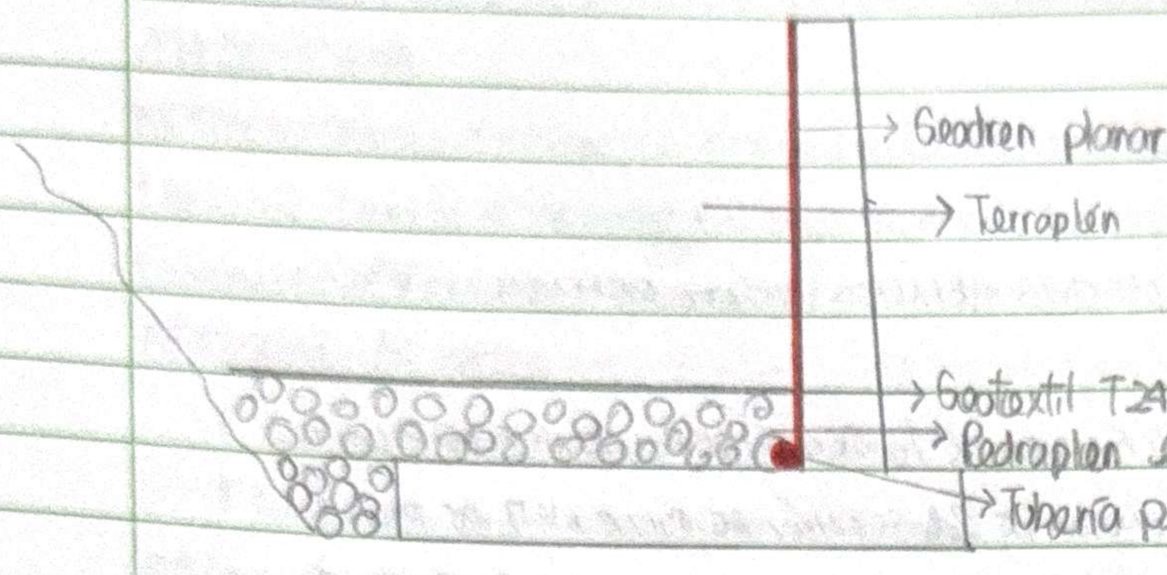

01/11/2025 - 03/11/2025 SÁBADO - LUNES FESTIVO.

CLIMA SECO.

SIN ACTIVIDADES EN OBRA

04/11/2025 MARTES

CLIMA SECO.

TRAMO 2.

PUENTE K44+500:- ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE PILAR N:5 DE PILA 1.

- ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 1er SECCIÓN DE PILAR N:6 DE PILA 1.

- ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 3er SECCIÓN DE PILAR N:7 DE PILA 1.

K44+940-K44+990 INSTALACIÓN DE CORONA DE TERRAPLÉN.

MAQUINARIA.

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 RENDIDÍN

2 VIBROCOMPACTADORES, 1 COMPACTADOR NEUMÁTICO, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOMIXER MIGUEL, 1 CAMABOSO,

1 LUMINARIA, 1 FINISHER, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA, 1 CUADRILLA DE PILOTES

RELACIÓN DE CANTIDADES

CONCRETO 28 MPA:

B-200 : 120 m³

05/11/2025 M

LLUVIAS MODERA

TRAMO 2.

·K44+490-K4

DEMORACIÓN

·REMOCIÓN: P

·TAUSA: PRS

MAQUINARI

1 RETROEXCA

2 VIBROCOMP

1 CAMABASO

PERSONAL

1 COMISI

RELACIÓN

06/

LLUV

TR

·IN

T

P

05/11/2025 MIÉRCOLES

LLUVIAS MODERADAS DE 11pm A 12a.

TRAMO 2.

-K447+490-K447+490 COMPACTACIÓN DE CORONA DE TERRAPLÉN

DEMARCACIÓN RUTA 45 A 04

-DEMOCIÓN: PR42 A PR44 LÍNEA BLANCA DE AMBOS BORDES

-TAISA: PR52 a PR54 LINEA BLANCA DE AMBOS BORDES

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 BENTÍN,

2 VIBROCOMPACTADORES, 1 COMPACTADOR NEUMÁTICO, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA,

1 CAMABAJA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 LUMINARIA, 1 FINISHER, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA, 1 CUADRILLA DE DEMARCACIÓN

RELACIÓN DE CANTIDADES: PINTURA (m): 7500m

06/11/2025 JUEVES

LLUVIAS MODERADAS DE 12a A 1am Y DE 7am A 9am

TRAMO 1

-INICIA CONFORMACIÓN DE ESPACIO DE ANTIGUO CAMPAMENTO DE AVE COLOMBIANA

TRAMO 2.

-PUENTE K447+500:- ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 3er SECCIÓN DE PILAR Nº 5 DE PILA 1.

- ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE PILAR Nº 6 DE PILA 1.

-K447+490-K447+490 COMPACTACIÓN DE CORONA DE TERRAPLÉN.

DEMARCACIÓN RUTA 45 A 04

-DEMOCIÓN: PR42 A PR44 LINEA AMARILLA DE EJE.

TAISA: PR52 A PR54 LINEA AMARILLA DE EJE.

MAQUINARIA.

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BENTÍN,

1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 COMPRESOR,

1 LUMINARIA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA, 1 CUADRILLA DE DEMARCACIÓN, 1 CUADRILLA DE PILOTES.

RELACIÓN DE CANTIDADES: CONCRETO 28 MPA:

PINTURA (m): 4200m

07/11/2025 VIERNES.
CLIMA SECO
TRAMO 1.
K4+750 INSTALACIÓN DEFENSA METÁLICO CRUCE DE LA GRANJA POR VÍA EXISTENTE.
TRAMO 2.
PUENTE K4+500: -ARMADO DE ACERO 3er SECCIÓN DE PILAR Nº6 DE PILA 1.
-DESCABECE DE PILOTE Nº9 DE PILA 2.
-ARMADO DE ACERO 1er SECCIÓN DE PILAR Nº 10 DE PILA 2.
OBRA Nº32 CONTINÚA DEMOLICIÓN PARA DESCOLE DE OBRA Nº 32A.
SEÑALIZACIÓN: INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS ENGLORIETA DE AVE.
DEMARCACIÓN RUTA 45 A 04, SUTATAUSA, PR56 A PR59 LINEAS BLANCAS DE BORDE Y AMARILLA DE EJE.
MAQUINARIA.
1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BENTIÑ, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 COMPRESOR, 1 LUMINARIA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.
PERSONAL DE OBRA.
1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA, 1 CUADRILLA DEFENSA, 1 CUADRILLA PILOTES, 1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS, 1 CUADRILLA SEÑALIZACIÓN, 1 CUADRILLA DE MARCACIÓN.
RELACIÓN DE CANTIDADES: DEFENSA: 30 m
PINTURA (m): 9000 m

08/11/2025 - 09/11/2025 SÁBADO-DOMINGO
CLIMA SECO.
SIN ACTIVIDADES EN OBRA.

10/11/2025 LUNES
LLUVIAS MODERADAS DE 7am A 9am.
TRAMO 2
PUENTE K4+500: -ARMADO DE ACERO 1er SECCIÓN DE PILAR Nº9 DE PILA 2.
-DESCABECE DE PILOTE Nº 11 DE PILA 2.
OBRA Nº 32 TERMINA DEMOLICIÓN PARA DESCOLE DE OBRA Nº 32A.
MAQUINARIA
1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR,

1 BENTIÑ, 1 BOMBA DE
1 LUMINARIA, 1 C
PERSONAL DE OB
1 COMISIÓN TOPO

11/11/2025
CLIMA SEC
TRAMO 2
PUENTE K4
OBRA Nº 32
MAQUINA
1 RETRO EX
1 BENTIÑ
1 COMPRE
PERSO
1 COM
RELA

12/
cl
T

1 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERO, 1 COMBAJA, 1 COMPRESOR,

1 LUMINARIA. 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA, 1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS, 1 CUADRILLA PILOTES

11/11/2025 MARTES

CLIMA SECO

TRAMO 2

PUENTE K44+560 ENCOFRADO DE 1er SECCIÓN DE PILAR Nº 10 DE PILA 2.

OBRA Nº 32A. INSTALACIÓN DE TUBERÍA 900mm HACIA OBRA 32.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR,

1 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERO, 1 COMBAJA, 1 EQUIPO DE EMPRUEBA

1 COMPRESOR, 1 LUMINARIA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA, 1 CUADRILLA PILOTES, 1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS.

RELACIÓN DE CANTIDADES: TUBERÍA 900mm : 12m.

12/11/2025 MIÉRCOLES

CLIMA SECO

TRAMO 2.

OBRA Nº 32A: - CONTINÚA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 900mm HACIA OBRA Nº 32.

- FUNDIDA DE ATRAQUE DE 1er SECCIÓN (TRAMO) DE TUBERÍA 900mm.

- EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y FUNDIDA DE SOLADO PARA CAJA DE TRANSICIÓN

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR,

1 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERO, 1 COMBAJA, 1 COMPRESOR,

1 LUMINARIA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA, 1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS, 1 CUADRILLA PILOTES.

RELACIÓN DE CANTIDADES: TUBERÍA 900mm :

CONCRETO 14mPa:

13/11/2025 JUEVES

LLUVIAS FUERTES DE 11am A 12m

TRAMO 2

PUENTE K44+500 CONTINÚA ARMADO DE ACERO DE PILARES

K44+440-K44+480 INSTALACIÓN DE SUBBASE MEZCLADA CON FRESADO (70%-30%)

CARRIL DE ACELERACIÓN RETORNO K44+450-K44+480 INSTALACIÓN DE CORONA DE TERRAPLÉN

OBRA N°32A:-ARMADO DE ACERO DE PLACA INFERIOR DE CASA DE INSPECCIÓN

- CONTINÚA FUNDIDA DE ATRAQUE DE TUBERÍA 900mm.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 BENITÍN,

1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 COMBAJA, 1 LUMINARIA, 1 CLASIFICADORA,

1 CARGADOR

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA, 1 CUADRILLA PILOTES, 1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS.

RELACIÓN DE CANTIDADES: SUBBASE

B-200

CONCRETO

14/11/2025 JUEVES

CLIMA SECO.

TRAMO 2

PUENTE K44+500:-FUNDIDA DE 3er SECCIÓN DE PILAR N° 6 DE PILA 1

-FUNDIDA DE 1er SECCIÓN DE PILAR N° 10 DE PILA 2.

CARRIL DE ACELERACIÓN RETORNO K44+450-K44+480 INSTALACIÓN DE SUBBASE MEZCLADA

CON FRESADO (70%-30%)

OBRA N°32A FUNDIDA DE PLACA INFERIOR DE CASA DE INSPECCIÓN

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 1 BENITÍN,

1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 COMBAJA, 1 LUMINARIA, 1 CLASIFICADORA,

1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA, 1 CUADRILLA DE PILOTES, 1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS.

RELACIÓN DE CANTIDADES: SB6 + FRESADO:

CONCRETO :

CONCRETO :

04 de Noviembre 2025

Para las cajas de las obras hidraulicas; en donde se requiera de traslapos, se trabajarán con longitud de 55cm para acero con diametro = 1/2", lo anterior fue revisado por especialista estructural del Consorcio Vial MHC 063.

15/11/2025 - 17/11/2025 SABADO - LUNES FESTIVO

SABADO: LLUVIAS MODERADAS DE 11am A 7pm

DOMINGO: LLUVIAS FUERTES DE 2am A 4am Y MODERADAS DE 4am A 6am y DE 1pm a 5pm.

LUNES: SECO.

SIN ACTIVIDADES EN OBRA.

18/11/2025 MARTES.

CLIMA SECO.

TRAMO 2

-PUENTE K44+500: ENCOFRADO Y FUNDIDA DE: - 1er SECCIÓN DE POLAR N: 9 DE PILA 2.

- 2da SECCIÓN DE PILAR Nº 10 DE PILA 2.

- 1er SECCIÓN DE PILAR Nº 12 DE PILA 2.

-K44+440-K44+480 INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN

-CARRIL DE ACELERACIÓN RETORNO, K44+450-K44+480 COMPACTACIÓN DE SUBBASE CON FRESADO

MAQUINARIA

1 RETRO EXCAVADORA, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BENTÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERO, 1 LUMINARIA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

CONCRETO 28 MPa:

19/11/2025 MIÉRCOLES

CLIMA SECO

PUENTE K44+500:- ARMADO DE ACERO DE 3er SECCIÓN DE PILAR N°10 DE PILA 2.

-DESCABECE DE PILOTE N°11 DE PILA 2.

-ARMADO DE ACERO 2da SECCIÓN DE PILAR N°12 DE PILA 2.

OBRA N° 32A:-RETIRO DE MATERIAL SATURADO E INSTALACIÓN 1er CAPA DE TERRAPLÉN AL COSTADO OCCIDENTAL.

-INSTALACIÓN 2da CAPA DE TERRAPLÉN COSTADO OCCIDENTAL.

K44+450 RETIRO DE FALLO EN SUBBASE.

MAQUINARIA

1 RETRO EXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 COMPRESOR, 1 LUMINARIAS, 1 CARGADOR, 1 CLASIFICADORA,

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200:

20/11/2025 JUEVES

CLIMA SECO

TRAMO 2.

PUENTE K44+500 ENCOFRADO Y FUNDIDA DE:- 2da SECCIÓN DE PILAR N° 9 DE PILA 2.

-3er SECCIÓN DE PILAR N°10 DE PILA 2

-2da SECCIÓN DE PILAR N°12 DE PILA 2.

-OBRA N° 32A INSTALACIÓN DE:-2da CAPA DE TERRAPLÉN COSTADO OCCIDENTAL.

-3er CAPA DE TERRAPLÉN COSTADO ORIENTAL.

-PERSONAL DE ENEL REINICIA ACTIVIDADES DE REUBICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR 1 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 LUMINARIA, 1 CARGADOR,

1 CLASIFICADORA

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

CONCRETO 28MPa:

B-200:

21/11/2025 VIERNES

LLUVIAS MODERADAS DE 2pm A 3pm

TRAMO 2.

-PUENTE K44+500 CONTINÚA DESCABECE DE PILOTE N° 11 DE PILA 2.

-OBRA N° 32A: -ARMADO DE ACERO DE MUROS DE CAJA DE INSPECCIÓN.

-INSTALACIÓN DE 4ta CAPA DE TERRAPLÉN COSTADO ORIENTAL.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER (R), 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR,

1 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 COMPRESOR, 1 LUMINARIA

1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200:

NOTA:

-SE SOLICITA REALIZAR DE MANERA ADECUADA EL CURADO DEL CONCRETO DE LAS PILAS, SE REQUIERE SU CORRECTA PROTECCIÓN Y HUMECTACIÓN.

Se realiza el correcto curado de las pilas en obra.

22/11/2025 - 23/11/2025 SÁBADO-DOMINGO

SÁBADO: LLUVIAS MODERADAS DE 9pm a 11pm.

DOMINGO: SECO

SIN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

24/11/2025 LUNES

CLIMA SECO.

TRAMO 2

PUENTE K447+500:- FUNDIDA DE 3er SECCIÓN DE PILAR N° 9 DE PILA 2

- FUNDIDA DE 1er SECCIÓN DE PILAR N° 11 DE PILA 2

- FUNDIDA DE 3er SECCIÓN DE PILAR N° 12 DE PILA 2.

OBRA N° 32A:- CONTINÚA ARMADO DE ACERO DE 1er SECCIÓN DE MUROS CAJA DE INSPECCIÓN.

- INSTALACIÓN DE 5ta y 6ta CAPA DE TERRAPLÉN COSTADO ORIENTAL.

- INSTALACIÓN DE 5ta CAPA DE TERRAPLÉN COSTADO OCCIDENTAL.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BENTÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 COMPRESOR, 1 LUMINARIA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200:

CONCRETO 28MPa:

25/11/2025 MARTES

LLUVIAS MODERADAS DE 1am A 2am

TRAMO 2.

PUENTE K447+500 ARMADO DE ACERO 2da SECCIÓN DE PILAR N° 11 DE PILA 2.

TERRAPLÉN SOBRE OBRA N° 32A SE CONVIERTE EN RETORNO SUR, K0+010 - K0+040, SE INSTALA 6ta y 7ma CAPA DE TERRAPLÉN.

OBRA N° 32A CONTINÚA ARMADO DE ACERO DE 1er SECCIÓN DE MUROS CAJA DE INSPECCIÓN.

PERSONAL DE MEDIACOMERCE REALIZA TRASLADO DE REDES TELEMÁTICAS, CABLES Y ACCESORIOS.

MAQUINARIA.

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 COMPRESOR, 1 LUMINARIA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-700:

NOTA:

- CAJA DE INSPECCIÓN OBRA Nº 32A SE EVIDENCIAN RETAZOS DE ACERO PARA GENERAR LOS GANCHOS EN LAS ESQUINAS DE LOS MUROS CUYAS LONGITUDES DE TRASLAPO NO CUMPLEN CON EL MÍNIMO ADICIONAL, SEGÚN PLANOS, HACE FALTA LE ACERO QUE ENVUELVE LA TUBERÍA. COMO LA CAJA NO CUMPLE CON LO INDICADO EN LOS PLANOS, NO SE RECIBE EL ACERO NI SE AUTORIZA LA FUNDIDA HASTA QUE SE SUBSANE LA OBSERVACIÓN.

Se revisa acero de la caja obra 32a en conjunto con la interventoría, donde se evidencia que NO SON RETAZOS; el acero figurado en obra cumple con el diseño y con los traslapos de acuerdo a la norma. Una vez revisada por la interventoría se aprueba la instalación del concreto.

26/11/2025 MIÉRCOLES.

CLIMA SECO

TRAMO 2

- PUENTE K44+500 ENCOFRADO Y FUNDIDO DE 2da SECCIÓN DE PILAR Nº 11 DE PILA 2.
- OBRA Nº 32A ENCOFRADO Y FUNDIDO DE 1er SECCIÓN DE MUROS DE CAJA DE INSPECCIÓN
- RETORNO SUR K0+010-K0+040 INSTALACIÓN DE 8va CAPA DE TERRAPLÉN.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 VIBROCOMPACTADORES, 1 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 COMPRESOR, 1 LUMINARIA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES.

B-200:

CONCRETO 24 MPa:

27/11/2025 JUEVES.

CLIMA SECO

TRAMO 2

CARRIL DE DESPLEGERACIÓN RETORNO, K44+340-K44+380 CONFORMACIÓN DE CORONA DE TERRAPLÉN

OBRA Nº32A ARMADO DE ACERO 2da SECCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 VIBROCOMPACTADORES, 1 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 LUMINARIA, 1 COMPRESOR, 1 CLASIFICADORES, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200:

28/11/2025 VIERNES

LLUVIAS MODERADAS DE 4am A 9am, DE 3pm A 4pm Y DE 8pm A 10pm.

TRAMO 2

CARRIL DE DESACELERACIÓN RETORNO, K44+340-K44+380, ESCARIFICACIÓN CORONA DE TERRAPLÉN

OBRA Nº32A INSTALACIÓN DE 1er y 2da CAPA DE RELLENO PERIMETRAL DE CAJA DE INSPECCIÓN.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 VIBROCOMPACTADORES, 1 BENITÍN, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 LUMINARIA, 1 COMPRESOR, 1 CLASIFICADORES, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA, 1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICOS.

29/11/2025 - 30/11/2025 SÓBODO - DOMINGO

SÁBADO: LLUVIAS FUERTES de 1pm A 4pm y MODERADAS DE 4pm A 7pm.

DOMINGO: LLUVIAS MODERADAS DE 1pm A 7pm.

SIN ACTIVIDADES
