CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

CONTRATISTA:

Consorcio CGSM4
NIT. 901.782.967-1




CONTRATO No. LP-005-2023.

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME MES DE NOVIEMBRE DE 2025

NOVIEMBRE 2025.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Edilberto G. Roys Corzo.		
			
	Residente de Obra		
Revisión	Ing. Ángel M. Vizcaíno Escobar.		
			
	Director de Obra		
Aprobación	Ing. Francisco A. Fernández Saltaren.		
			
	Director de Interventoría		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e ingeniería S.A.S	1		

CUADRO DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

1. INTRODUCCIÓN 6
1.1 Estado detallado del contrato 6
1.2 Estado de las garantías del proyecto 6
1.3 información técnica general 7
2. FICHA PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 8
3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 11
3.1 Localización general 11
3.2 Localización general del sector a intervenir 12
3.2.1 Localización del caño El Salado 12
4. ALCANCE CONTRACTUAL DE LAS ACTIVIDADES 13
4.1 Movilización y desmovilización. 13
4.2 Remoción mecánica de sedimentos incluye traz ado y replanteo 13
4.3 Localización, trazado y replanteo topográfico 13
4.4 Excavación manual. Incluye cargue, retiro y explanación lateral del material de excavación. 13
4.5 Concreto F'c 3.000 PSI (21 MPa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0.05m. Incluye: Transporte de materiales. 14
4.6 Construcción de box culvert en concreto reforzado de 4.000 PSI (28 MPa) con baja permeabilidad 14
4.7 Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 Mpa). Incluye: Transporte. 14
4.8 Concreto F'c 4.000 PSI (28 MPa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: formaletería, desencofre, y transporte de materiales. 14
4.9 Aislamiento al área de objeto de la restauración ecológica. 14
4.10 Establecimiento de la estrategia de restauración ecológica. 15
4.11 Mantenimiento al material vegetal establecido. 15
4.12 Salvamento de fauna acuática y terrestre. 15
4.13 Implementación de estrategia de sensibilización y participación ambiental dirigido a la comunidad en la zona de influencia del proyecto. 15
4.14 Mantenimiento preventivo de estación de monitoreo. 15
4.15 Actividades proyectadas para el año 2025. 15
5. AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO EN LA VIGENCIA 2025. 16
6. MODIFICACIONES 17
6.1 Diseño 17
6.2 Valor de obra 18
7. RECURSOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE 18
7.1 Personal 18

7.1.1 Personal previo al inicio de la ejecución de los trabajos 19
7.2 Maquinaria y equipos 19
7.3 Equipo de contingencia 20
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 20
8.1 Levantamiento topográfico..... 20
8.2 Informe de gestión ambiental..... 20
8.3 Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST)..... 20
8.4 Informe de gestión social 20
8.5 Salvamento de fauna acuática y terrestre..... 20
8.6 Informe de jornadas de sensibilización 20
9. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO..... 20
10. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO 21
10.1 Actividades generales 21
10.1.1 Ítem 1.1 Movilización y desmovilización de equipos, unidad: unidad. 21
10.1.2 Ítem 4.2 Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto. Unidad: unidad 21
10.2 Actividades de obra..... 22
10.2.1 ÍTEM 2.2, Remoción mecánica de sedimentos, Unidad: m3..... 22
10.2.2 ÍTEM 2.10, Localización, trazado y replanteo topográfico. 22
10.2.3 ÍTEM 2.11, Excavación manual. Incluye: Cargue, retiro y explanación lateral del material de excavación. 23
10.2.4 ÍTEM 2.12, Concreto F'c 3.000 psi (21 MPa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0.05m. Incluye transporte de materiales... 23
10.2.5 ÍTEM 2.13, Construcción de box culvert en concreto reforzado de 4.000 psi (28 Mpa) con baja permeabilidad (Incluye: transporte de materiales. No incluye: Acero de refuerzo)..... 23
10.2.6 ÍTEM 2.14, Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 psi (420 Mpa). Incluye transporte. 23
10.2.7 ÍTEM 2.15, Concreto de F'c 4.000 psi (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre y transporte de materiales. . 23
10.2.8 ÍTEM 3.1, Aislamiento del área de objeto de la restauración ecológica, Unidad: Ha……..23
10.2.8 ÍTEM 3.2, Establecimiento de la estrategia de restauración ecológica, Unidad: Ha……..23
10.2.9 ÍTEM 3.3, Mantenimiento de material vegetal establecido, Unidad: Ha. 24

10.2.10 ÍTEM 4.5, Mantenimiento preventivo de estación de monitoreo, Unidad: Ha……24
10.2.11 ÍTEM 4.1, Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre, Unidad: Mes. 24
10.3 Tiempo transcurrido..... 24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Detalle de garantías del proyecto en la vigencia 2025. 7
Tabla 2. Información Técnica General 7
Tabla 3. Ficha programa de Intervención Inicial Vigencia 2025. 8
Tabla 4. Ficha programa de Intervención Vigencia 2024. 9
Tabla 5. Cantidades actualizadas en acta de mayores y menores cantidades. 10
Tabla 6. Cantidades de obra actualizadas de vigencia 2024. 16
Tabla 7. Cantidades de obra actualizadas para vigencia 2025. 16
Tabla 8. Avance financiero programado vs ejecutado en la vigencia 2025. 17
Tabla 9. Presupuesto inicial del contrato. 18
Tabla 10. Personal empleado durante la vigencia 2025. 19
Tabla 11. Dedicación del personal empleado durante la vigencia 2025. 19
Tabla 12. Maquinaria y equipos durante la vigencia 2025. 19
Tabla 13. Abscisas intervenidas en el periodo. 22

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1. Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta. 11
Ilustración 2. Caño Hondo Localización general 12

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Avance Programado Vs Ejecutado 21

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, suscribió con CONSORCIO CGSM4 el Contrato de Obra No. LP-005-2023 para realizar las obras de “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES” Igualmente, celebró el Contrato de interventoría No. CM-008-2023 con INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S., para realizar la Interventoría al presente proyecto; como Supervisor del Contrato, fue designada la ingeniera Katty Paola Amaya Brieva funcionaria de CORPAMAG.

El contrato consta de una duración de 146 meses, por lo cual se desarrollará por medio de vigencias que se renovarán anualmente en año calendario, en este informe de obra se registra las actividades desarrolladas por el CONSORCIO CGSM4 en el periodo del mes de noviembre de 2025, correspondiente a la vigencia 2025, acorde a la programación de actividades emitida por CORPAMAG.

Hasta la fecha el Contrato no ha tenido adiciones, otrosí o modificaciones.

1.1 Estado detallado del contrato

A fecha de elaboración del presente informe se han presentado los siguientes cambios:

- Suspensiones: No se han presentado suspensiones en el contrato.
- Reinicios: No se han presentado reinicios en el contrato.
- Prórrogas: No se han aprobado prórrogas para el contrato.
- Adiciones: No se han realizado adiciones.

1.2 Estado de las garantías del proyecto

A fecha de elaboración del presente informe las garantías del proyecto se encuentran actualizadas. En la tabla 1 se presenta el detalle de las garantías del proyecto, correspondientes a la vigencia 2025.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO			
Póliza de cumplimiento	CG-1064217		
Expedida por	Compañía Mundial de Seguros S.A		
Fecha de expedición	7/05/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	Fecha final	
Cumplimiento de Contrato	11/03/2025	30/09/2026	$ 757.582.566,70
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	11/03/2025	11/03/2029	$ 378.791.283,35
Estabilidad de las obras	11/03/2026	11/03/2028	$ 236.718.812,00
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual	400063973		
Expedida por	Nacional de Seguros		
Fecha de expedición	8/05/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	Fecha final	
Responsabilidad Civil Extracontractual	11/03/2025	11/03/2026	$ 711.750.000,00

Tabla 1. Detalle de garantías del proyecto en la vigencia 2025.

1.3 información técnica general

CONTRATO DE OBRA:	No. LP-005-2023
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".
LOCALIZACIÓN:	Departamento del Magdalena
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATISTA:	Consorcio CGSM4
INTERVENTORÍA:	Interventores e Ingeniería S.A.S
NIT CONSORCIO CGSM4:	901.782.967-1
VALOR INICIAL:	$ 340.466.351.223,00
PLAZO INICIAL:	146 meses
FIRMA DEL CONTRATO:	26 de diciembre de 2023
ACTA DE INICIO:	11 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de mayo de 2036
VALOR A EJECUTAR VIGENCIA 2025:	$ 7.575.825.667,00
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO:	18,26%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO VIGENCIA 2025:	37,39%
PRORROGA:	NINGUNA

Tabla 2. Información Técnica General

2. FICHA PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

CORPAMAG, realizó el siguiente cuadro resumen de la intervención para el Contrato No. LP-005-2023 del 26 de diciembre de 2023 de los Principales Ítems de pago.

A continuación, se presentan las actividades correspondientes a condiciones iniciales para la vigencia 2025.

AÑO 2 (2025)

AÑO 2025			
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	Movilización y desmovilización de equipos	und	2,00
2	MANTENIMIENTO HIDRÁULICO		
2.1	Remoción Hidráulica de Sedimentos Mediante el uso de Draga Cortadora de Succión y Disposición de material en piscina de sedimentos por medio de tubería. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	77.713,01
2.2	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	20.000,00
2.3	Cargue, Retiro y Disposición Final de Material proveniente del Dragado y Excavaciones. Incluye: Disposición en Escombrera Autorizada.	m3	34.560,00
2.5	Limpieza de vegetación flotante y/o macrófitas. Incluye explaneación lateral de material vegetal.	m2	10.000,00
2.6	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	m3	7.245,00
2.7	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior.	m2	2.700,00
2.8	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50.	m2	8.437,50
2.9	Geotextil Tejido de Poliéster.	m2	6.187,50
3	REHABILITACIÓN ECOLÓGICA		
3.1	Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.2	Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido.	ha	40,00
4	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		
4.1	Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	8,00
4.2	Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto.	und	1,00
4.5	Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo.	und	5,00

Tabla 3. Ficha programa de Intervención Inicial Vigencia 2025.

Durante la vigencia 2023 - 2024 (Año 1) se realizaron actividades relacionadas en la tabla 4.

AÑO 1 (2023 - 2024):

AÑO 2024			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Movilización y desmovilización de equipos	und	2,00
2	**MANTENIMIENTO HIDRÁULICO**		
2.1	Remoción Hidráulica de Sedimentos Mediante el uso de Draga Cortadora de Succión y Disposición de material en piscina de sedimentos por medio de tubería. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	0,00
2.2	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	151.799,53
2.3	Cargue, Retiro y Disposición Final de Material proveniente del Dragado y Excavaciones. Incluye: Disposición en Escombrera Autorizada.	m3	0,00
2.6	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	m3	1.740,00
2.7	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior.	m2	800,00
2.8	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50.	m2	2.964,00
2.9	Geotextil Tejido de Poliéster.	m2	1.280,00
3	**REHABILITACIÓN ECOLÓGICA**		
3.1	Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.2	Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido.	ha	0,00
4	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**		
4.1	Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	1,00
4.2	Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto.	und	1,00
4.3	Estación Hidrológica de Monitoreo Automática.	und	1,00
4.5	Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo.	und	4,00

Tabla 4. Ficha programa de Intervención Vigencia 2024.

El día 21 de octubre se suscribió el acta de mayores y menores cantidades para la vigencia 2025, obteniendo las siguientes cantidades actualizadas.

AÑO 2024			
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
3	**REHABILITACIÓN ECOLÓGICA**		
3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido.	Ha	20,00
AÑO 2025			
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Movilización y desmovilización de equipos	und	2,00
2	**MANTENIMIENTO HIDRÁULICO**		
2.2	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	113.159,10
2.10	Localización, trazado y replanteo topográfico	m2	937,00
2.11	Excavación manual. Incluye: Cargue, retiro y explanación lateral del material de excavación.	m3	522,65
2.12	Concreto F'c 3.000 PSI (21 Mpa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0,05m. Incluye transporte de materiales.	m2	971,65
2.13	Construcción de Box Culvert en concreto reforzado de 4.000 PSI (28 Mpa) con baja permeabilidad. (Incluye: transporte de materiales. No incluye: Acero de refuerzo)	m3	770,67
2.14	Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 PSI). Incluye transporte.	kg	74.268,12
2.15	Concreto F'c 4.000 PSI (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre, y transporte de materiales.	m3	20,00
3	**REHABILITACIÓN ECOLÓGICA**		
3.1	Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.2	Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido.	ha	40,00
4	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**		
4.1	Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	6,00
4.2	Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto.	und	1,00
4.5	Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo.	und	4,00

Tabla 5. Cantidades actualizadas en acta de mayores y menores cantidades.

3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 Localización general

La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al norte del país en el extremo noroccidental del departamento del Magdalena, su área de influencia está comprendida entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio al sur, el río Magdalena por el oeste, el Mar Caribe al norte y al este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con una extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe a través del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por intermedio de caños que permiten a su vez intercomunicación con el río Magdalena.

Ilustración 1. Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta.



3.2 Localización general del sector a intervenir

Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir durante la vigencia del año 2025 es el caño Hondo, localizado en el Municipio de Salamina (Magdalena).

El municipio de Salamina se localiza en Colombia, en el Departamento del Magdalena, pertenece a la región geográfica de la ciénaga Grande del Magdalena, fue fundado en 1765, se encuentra ubicado al Centro del departamento del Magdalena, localizado a los 10° 29`25" de latitud norte y 74° 47`38" de longitud al oeste de Greenwich, comprende una extensión de 175 Km2 que equivale al 0.75% del área departamental y al 0.015% del total nacional, su altura sobre el nivel del mar es de 3m, dista 173.3 Km con la ciudad de Santa Marta (Capital del Departamento) y a 75.5 Km del distrito de Barranquilla. Su relieve está caracterizado por poseer un territorio bajo plano y cenagoso, bañado por algunos caños convirtiéndose en una inmensa llanura de inundaciones que contienen depósitos de terraza aluvial generándose una terraza ligeramente inclinada.

3.2.1 Localización del caño El Salado

El caño Hondo es un conector del Río Magdalena y del complejo Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta, el cual se localiza en el delta exterior del río Magdalena, en el municipio de Salamina sobre la margen derecha del Rio Magdalena, a unos 1,9 kilómetros de distancia, aguas abajo, de la Cabecera municipal de Salamina y con una longitud aproximada de 17.5 kilómetros desde su embocadura sobre el río Magdalena, hasta su intercepción con el caño Martinica.



Ilustración 2. Caño Hondo Localización general

4. ALCANCE CONTRACTUAL DE LAS ACTIVIDADES

Las principales actividades y/o obras a ejecutar son las siguientes, las cuales incluyen tanto las contempladas en el presupuesto inicial como aquellas incorporadas mediante el acta de mayores y menores cantidades en los ítems no previstos:

4.1 Movilización y desmovilización.

Se suministra el equipo necesario en los frentes de trabajo, para realizar las obras, cuyo transporte se realiza por vía terrestre o vía fluvial; por vía terrestre utilizando las vías de acceso que intercomunican la ciudad de origen de las máquinas con el frente de trabajo y por vía fluvial utilizando los ríos y caños que permitan el acceso de la maquinaria. Para la desmovilización o retiro de toda la maquinaria o equipo del frente de trabajo, se utilizan los medios de transporte descritos anteriormente.

4.2 Remoción mecánica de sedimentos incluye trazado y replanteo.

Se realiza la ubicación, nivelación y control topográfico permanente de las obras por ejecutar, siguiendo lo establecido en los planos de diseño suministrados al proyecto, de tal manera que ocupen la posición indicada con relación a las obras existentes y los accidentes topográficos, una vez materializado el trazado se realiza la extracción de los sedimentos, del lecho o cauce del caño mediante procesos mecánico, aumentando la sección hidráulica de los mismos, utilizando para esta labor equipo retroexcavadoras, dando así un estricto cumplimiento a los diseños, especificaciones técnicas, plan de dragado y Plan de Manejo Ambiental.

4.3 Localización, trazado y replanteo topográfico

Consiste en todas las actividades de precisión la que permiten la localización planimétrica y altimétrica de las obras objeto del contrato, con el fin de establecer los puntos y ejes dados como referencia necesarios para la correcta ejecución de los diseños, así como la nivelación y control topográfico inicial de las obras por ejecutar, siguiendo las referencias del proyecto suministrado, de tal manera que ocupen la posición indicada con relación a las obras existentes y los accidentes topográficos.

4.4 Excavación manual. Incluye cargue, retiro y explanación lateral del material de excavación.

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones manuales necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo.

4.5 Concreto F'c 3.000 PSI (21 MPa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0.05m. Incluye: Transporte de materiales.

Esta actividad contempla el suministro, transporte y colocación de concreto de limpieza con bajo contenido de cemento, puede ser premezclado o mezclado en obra; que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger, emparejar y mantener limpias las superficies del piso de cimentación de cualquier tipo de contaminación o la alteración de las condiciones iníciales del terreno. Este elemento se construye en una capa de concreto de 5.0 cm de espesor.

4.6 Construcción de box culvert en concreto reforzado de 4.000 PSI (28 MPa) con baja permeabilidad.

Esta actividad se refiere a la Construcción de Box Culvert en Concreto Reforzado de 4.000 Psi (28MPa) con Baja Permeabilidad (Incluye: Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo), en los lugares donde los planos estructurales así lo indiquen; el concreto se colocará en capas horizontales que no excedan una altura de cincuenta (50) centímetros con una continuidad tal que las superficies de concreto aun no terminadas no se endurezcan ni se permita la aparición de grietas en las uniones.

4.7 Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 Mpa). Incluye: Transporte.

En esta actividad se realizará el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del acero de refuerzo de 60.000 PSI para los elementos estructurales en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Se incluye en esta actividad el alambre de amarrar.

4.8 Concreto F'c 4.000 PSI (28 MPa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: formaletería, desencofre, y transporte de materiales.

Esta actividad se refiere a la losa de aproximación en Concreto Reforzado de 4.000 Psi (28MPa) con Baja Permeabilidad (Incluye: Formaletería, desencofre y Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo), en los lugares donde los planos estructurales así lo indiquen; el concreto se colocará en capas horizontales que no excedan una altura de cincuenta (50) centímetros con una continuidad tal que las superficies de concreto aun no terminadas no se endurezcan ni se permita la aparición de grietas en las uniones.

4.9 Aislamiento al área de objeto de la restauración ecológica.

Delimitar con algún tipo de barrera física a las zonas objeto de restauración, restringiendo el tráfico de personas, vehículos o animales. Generalmente las barreras de aislamiento son realizadas a partir de cercas de alambre de púas, para las cuales se colocan estacones cada cierta distancia.

4.10 Establecimiento de la estrategia de restauración ecológica.

Esta estrategia contempla la siembra de individuos arbóreos, es usada principalmente cuando la sucesión vegetal presenta algunos factores que impiden su natural desarrollo y por lo tanto se emplea la misma para acelerar o apoyar dicho proceso.

4.11 Mantenimiento al material vegetal establecido.

Realizar labores silviculturales como la limpieza, plateo, podas de formación, control fitosanitario y fertilización, con el fin de favorecer y dar seguimiento a los individuos plantados. Esta actividad se pretende realizar cada tres meses paras las actividades antes mencionadas y para la fertilización, durante un periodo de nueve (9) meses después de la siembra, dichos mantenimientos están ubicados de acuerdo con el cronograma en el mes 6, mes 9 y mes 12. Se contempla también la actividad de riego para la plantación cuando se encuentren ausentes las lluvias.

Luego de estos nueve (9) meses de mantenimiento, se espera que los individuos se muestren vigorosos y alcancen una altura prudente que les permita competir con pastos u otras plantas que desarrollen un rápido crecimiento.

4.12 Salvamento de fauna acuática y terrestre.

Esta actividad consiste en el ahuyentamiento y salvamento de la fauna que se encuentre amenazada durante la ejecución de las obras. Las actividades del dragado que se desarrollan sobre ecosistemas estratégicos (Manglares, eneales), pueden tener etapas como el descapote, remoción de la capa vegetal, remoción del suelo y procesos del dragado que pueden influir negativamente en la supervivencia de las especies.

4.13 Implementación de estrategia de sensibilización y participación ambiental dirigido a la comunidad en la zona de influencia del proyecto.

Es un componente que acompaña a los proyectos de restauración Hidráulica y Ambiental que se ejecutan desde la Corporación Autónoma Regional del Magdalena. Este contempla jornadas educativo-ambiental, que buscan promover la conservación y protección de los cuerpos de agua, utilizando como mecanismo la educación ambiental no formal.

4.14 Mantenimiento preventivo de estación de monitoreo.

Esta actividad consiste en la revisión, calibración, ajustes, limpieza y descarga de información de cada uno de los equipos que se encuentran en las estaciones de monitoreo, a las cuales se les realizará el mantenimiento preventivo.

4.15 Actividades proyectadas para el año 2025.

Durante la vigencia 2024 no se ejecutó el Ítem "*Mantenimiento al Material Vegetal Establecido*", correspondiente al costo total de $76.647.470,00, que representa un

1,39% del valor del contrato en el año 2024. Este valor será adicionado para ejecución en la presente vigencia.

A continuación, se muestra las cantidades de obra actualizadas para la presente vigencia.

AÑO 2024							MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	+ ó -	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA						$ 58.531.860,00			$ 58.531.860,00		$ 58.531.860,00
3.3	P - 3.3	Mantenimiento al material vegetal establecido	ha	20,0	$ 2.926.593,0	$ 58.531.860,00	0,00	20,00	$ 58.531.860,00	20,00	$ 58.531.860,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 58.531.860,00			$ 58.531.860,00		$ 58.531.860,00
		Administración			23,00%	$ 13.462.328,00			$ 13.462.328,00		$ 13.462.328,00
		Imprevistos			2,00%	$ 1.170.637,00			$ 1.170.637,00		$ 1.170.637,00
		Utilidad			5,00%	$ 2.926.593,00			$ 2.926.593,00		$ 2.926.593,00
		IVA (19%) sobre la Utilidad			19,00%	$ 556.052,67			$ 556.052,67		$ 556.052,67
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 18.115.610,67			$ 18.115.610,67		$ 18.115.610,67
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2024				$ 76.647.470,00			$ 76.647.470,00		$ 76.647.470,00

Tabla 6. Cantidades de obra actualizadas de vigencia 2024.

AÑO 2025							MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	+ ó -	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						$ 49.999.844,00			$ 49.999.844,00		$ 49.999.844,00
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	2,0	$ 24.999.922,0	$ 49.999.844,00	0,00	2,00	$ 49.999.844,00	2,00	$ 49.999.844,00
II. MANTENIMIENTO HIDRÁULICO						$ 4.757.183.011,00			$ 4.804.622.102,00		$ 4.804.622.102,32
2.2	P - 2.2	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	20.000,00	$ 19.639,00	$ 392.780.000,00	93.159,10	113.159,10	$ 2.222.331.531,00	113.159,10	$ 2.222.331.531,00
OBRAS DURAS											
2.10	NP - 2.10	Localización, Trazado y Replanteo Topográfico	m2	0,00	$ 4.319,00	$ 0,00	937,00	937,00	$ 4.046.903,00	937,00	$ 4.046.903,00
2.11	NP - 2.11	Excavación manual. Incluye: Cargue, Retiro y Explanación lateral del Material de Excavación	m3	0,00	$ 60.215,00	$ 0,00	522,65	522,65	$ 31.471.370,00	522,65	$ 31.471.370,00
2.12	NP - 2.12	Concreto de F'c 3.000 PSI (21 Mpa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e = 0.05 m. Incluye transporte de materiales	m2	0,00	$ 66.533,00	$ 0,00	971,65	971,65	$ 64.646.789,00	971,65	$ 64.646.789,00
2.13	NP - 2.13	Construcción de Box Culvert en Concreto Reforzado de 4.000 PSI (28 Mpa) Con Baja Permeabilidad (Incluye: Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo	m3	0,00	$ 2.313.980,00	$ 0,00	770,67	770,67	$ 1.783.314.966,60	770,67	$ 1.783.314.966,60
2.14	NP - 2.14	Suministro, Corte, Figuración y armado de Acero de Refuerzo Grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 PSI). Incluye Transporte	kg	0,00	$ 8.956,00	$ 0,00	74.268,12	74.268,12	$ 665.145.282,72	74.268,12	$ 665.145.282,72
2.15	NP - 2.15	Concreto de F'c 4.000 PSI (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre y Transporte de Materiales	m3	0,00	$ 1.683.263,00	$ 0,00	20,00	20,00	$ 33.665.260,00	20,00	$ 33.665.260,00

ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	+ ó -	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA						$ 418.523.000,00			$ 418.523.000,00		$ 418.523.000,00
3.1	P - 3.1	Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica	ha	20	$ 4.806.217,00	$ 96.124.340,00	0,00	20,00	$ 96.124.340,00	20,00	$ 96.124.340,00
3.2	P - 3.2	Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica	ha	20	$ 9.917.137,00	$ 198.342.740,00	0,00	20,00	$ 198.342.740,00	20,00	$ 198.342.740,00
3.3	P - 3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido	ha	40	$ 3.101.398,00	$ 124.055.920,00	0,00	40,00	$ 124.055.920,00	40,00	$ 124.055.920,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 5.225.705.855,00			$ 5.331.676.806,00		$ 5.331.676.806,00
		Administración			23,00%	$ 1.201.912.347,00			$ 1.226.285.665,00		$ 1.226.285.665,00
		Imprevistos			2,00%	$ 104.514.117,00			$ 106.633.536,00		$ 106.633.536,00
		Utilidad			5,00%	$ 261.285.293,00			$ 266.583.840,00		$ 266.583.840,00
		IVA (19%) sobre la Utilidad			19,00%	$ 49.644.206,00			$ 50.650.930,00		$ 50.650.930,00
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 1.617.355.963,00			$ 1.650.153.971,00		$ 1.650.153.971,00
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				$ 6.843.061.818,00			$ 6.981.830.777,00		$ 6.981.830.777,00
IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						$ 551.358.302,00			$ 499.155.370,00		$ 499.155.370,00
4.1	P - 4.1	Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	8,00	$ 19.004.991,00	$ 152.039.928,00	-2,00	6,00	$ 114.029.946,00	6,00	$ 114.029.946,00
4.2	P - 4.2	Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	1,00	$ 328.353.624,00	$ 328.353.624,00	0,00	1,00	$ 328.353.624,00	1,00	$ 328.353.624,00
4.5	P - 4.5	Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo	und	5,00	$ 14.192.950,00	$ 70.964.750,00	-1,00	4,00	$ 56.771.800,00	4,00	$ 56.771.800,00
		IVA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			19,00%	$ 104.758.077,00			$ 94.839.520,00		$ 94.839.520,00
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON IVA				$ 656.116.379,00			$ 593.994.890,00		$ 593.994.890,00
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				$ 7.499.178.197,00			$ 7.575.825.667,00		$ 7.575.825.667,00

Tabla 7. Cantidades de obra actualizadas para vigencia 2025.

5. AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO EN LA VIGENCIA 2025.

En la tabla No.8 se presenta el avance financiero programado para la vigencia 2025, de acuerdo con el programa de inversiones del proyecto.

PERIODO	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO			AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		
	Valor Programado	%Periodo	%Acumulado	Valor Ejecutado	%Periodo	%Acumulado
Marzo	$ -	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	0,00%
Abril	$ 11.279.952,69	0,15%	0,15%	$ 11.279.953,00	0,15%	0,15%
Mayo	$ 14.269.204,11	0,19%	0,34%	$ 14.269.205,00	0,19%	0,34%
Junio	$ -	0,00%	0,34%	$ -	0,00%	0,34%
Julio	$ 17.861.424,16	0,24%	0,57%	$ 17.861.424,00	0,23%	0,57%
Agosto	$ 330.714.565,61	4,37%	4,94%	$ 330.714.566,00	4,37%	4,94%
Septiembre	$ 470.455.692,66	6,21%	11,15%	$ 470.455.691,00	6,21%	11,15%
Octubre	$ 410.459.826,32	5,42%	16,57%	$ 604.693.422,00	7,98%	19,13%
Noviembre	$ 951.103.209,61	12,55%	29,12%	$ 1.383.421.628,90	18,26%	37,39%
Diciembre	$ 841.645.768,76	11,1%	40,23%			
Enero	$ 1.800.365.546,10	23,8%	64,00%			
Febrero	$ 2.727.670.476,98	36,0%	100,00%			

Tabla 8. Avance financiero programado vs ejecutado en la vigencia 2025.

6. MODIFICACIONES

6.1 Diseño

Durante el desarrollo del proyecto no se ha generado modificación alguna al diseño específico de las obras, conservando el trazado natural del caño y los lineamientos establecidos contractualmente fundamentados.

Sin embargo, realizó un balance general de las actividades y cantidades del contrato, considerando el levantamiento topográfico de predragado y el PGAR *“Hacia un Territorio Saludable y Sostenible” 2013–2027. El análisis evidenció la crítica situación del Caño Hondo, un cuerpo de agua clave para la Ciénaga Grande de Santa Marta, que actualmente no aporta caudal debido a la alta sedimentación y a obstrucciones en tramos sin mantenimiento y en cruces con vías terciarias. Para restablecer la conectividad hidráulica entre el río Magdalena y la CGSM, se requiere la construcción de cinco box culvert.
Las condiciones encontradas generaron variaciones en las cantidades de varios ítems contractuales relacionados con dragado, remoción de sedimentos, manejo de material, limpieza de vegetación y obras con geosintéticos. Adicionalmente, se identificó la necesidad de crear nuevos ítems asociados a trabajos topográficos, excavaciones, obras en concreto, acero de refuerzo y manejo de agua para la construcción de los box culvert.

En consecuencia, se solicita la elaboración del acta de mayores y menores cantidades del contrato LP 005 de 2023, aclarando que el ajuste no implica recursos adicionales.

6.2 Valor de obra

Por tratarse de un contrato cuya vigencia es de doce años, se aplicará lo relacionado con la indivisibilidad de la garantía, consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015. Por lo anterior, cada periodo contractual será de un año. Para efectos de suficiencias o cuantías a asegurar, se deberán tener en cuenta los valores detallados en la tabla 10.

RESUMEN DEL CONTRATO	
AÑO	**PRESUPUESTO**
2023	$ 373.831.754,00
2024	$ 5.157.831.143,00
2025	$ 7.499.178.197,00
2026	$ 9.288.760.538,00
2027	$ 10.844.940.805,00
2028	$ 12.798.878.393,00
2029	$ 18.695.134.989,00
2030	$ 22.064.785.300,00
2031	$ 40.643.579.127,00
2032	$ 45.323.780.165,00
2033	$ 49.656.838.902,00
2034	$ 55.823.229.009,00
2035	$ 62.295.582.901,00
TOTAL	**$ 340.466.351.223,00**

Tabla 9. Presupuesto inicial del contrato.

7. RECURSOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE

Para llevar a cabo el correcto desarrollo de las obras dentro de los términos de referencia se exige como mínimo el siguiente personal y equipo el cual se implementará acorde a necesidades y exigencias del trabajo a desarrollar.

7.1 Personal

CARGO	DEDICACIÓN	CANTIDAD
Gerente de obra	50%	1
Director de obra	50%	1
Ingeniero Residente	100%	1

Especialista hidráulico	50%	1
Ingeniero Topográfico	100%	1
Especialista ambiental	50%	1
Profesional SST	100%	1
Profesional en Trabajo social	100%	1

Tabla 10. Personal empleado durante la vigencia 2025.

7.1.1 Personal previo al inicio de la ejecución de los trabajos

Personal	Dedicación	Cantidad
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	1
Profesional En Trabajo Social	100%	1
Vigía HSE	100%	1
Personal Técnico, Operadores, Mecánicos.	100%	8
Mano de obra No Calificada debe ser local de Marinos, vigilantes y demás.	100%	10

Tabla 11. Dedicación del personal empleado durante la vigencia 2025.

7.2 Maquinaria y equipos

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Excavadora con brazo Largo de 18 m o superior.	Excavadora sobre oruga con potencia de motor de 175 HP y capacidad de balde igual o superior a 0.8 m3.	5
Equipo de topografía completo	Debe Incluir: Sistema de posicionamiento global satelital - GPS - Estación Total, Nivel de Precisión, Ecosonda, Software de levantamiento y procesamiento Hidrotopográfico debidamente licenciado.	1
Drones	Drones Phantom 4 pro	1
Cámara fotográfica	Digital camera Kodak Pixpro FZ51	1

Tabla 12. Maquinaria y equipos durante la vigencia 2025.

7.3 Equipo de contingencia

Para suplir cualquier eventualidad de daño a maquinaria mínima exigida se dispone permanentemente de Dos (2) excavadoras con potencia de motor de 175 HP y capacidad de balde igual o superior a 0.8 m3, las cuales se encuentran ubicadas en nuestras instalaciones en el municipio de Barranquilla – Atlántico.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las obras incluidas dentro de los Estudios Previos, página 53, nota 3, y en las Medidas de Manejo ambiental, en la página 18, numeral 28, se registran a continuación.

8.1 Levantamiento topográfico
Durante el periodo actual se han realizado levantamientos topográficos.

8.2 Informe de gestión ambiental
Durante el período actual, se llevaron a cabo las actividades planteadas en las Medidas de Manejo Ambiental del contrato

8.3 Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST)
Durante el período actual, se llevaron a cabo todas las actividades planteadas en el área de seguridad y salud en el trabajo.

8.4 Informe de gestión social
Durante el periodo actual se llevaron a cabo todas las actividades planteadas en la gestión social.

8.5 Salvamento de fauna acuática y terrestre
Durante el periodo se realizaron actividades del ítem.

8.6 Informe de jornadas de sensibilización
Durante el periodo se realizaron actividades del ítem.

9. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

En el presente periodo se realizaron actividades del componente de rehabilitación ecológica, específicamente del ítem *Mantenimiento al Material Vegetal Establecido* perteneciente al valor de la vigencia 2024, adicionalmente se inicia la ejecución del ítem "*Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental*

Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto", remoción mecánica de sedimentos y se inicia ejecución de ítems no previstos.

10. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO

Para este periodo se realiza reprogramación de obra, tenía programado 12,55% de avance, obteniendo 18,26% de ejecución. En la siguiente gráfica se presenta el avance.



Gráfica 1. Avance Programado Vs Ejecutado

Para este periodo CONSORCIO CGSM4 presentó el siguiente avance para las condiciones contractuales, relacionadas así:

10.1 Actividades generales

10.1.1 Ítem 1.1 Movilización y desmovilización de equipos, unidad: unidad.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 50,00% de avance acumulado para la vigencia 2025.

10.1.2 Ítem 4.2 Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto. Unidad: unidad

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 100,00% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental.	Und	0,2585

TOTAL	**1,0000**

10.2 Actividades de obra

10.2.1 ÍTEM 2.2, Remoción mecánica de sedimentos, Unidad: m3

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem.

- Se intervino las secciones iniciando en la K0+600 y finalizando en la K0+825 para un avance de 250 metros en el periodo actual.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Remoción Mecánica de Sedimentos entre las abscisas: K0+850 – K1+150. Box 1 y aletas Box 4 y aletas	m3	48.490,03
TOTAL		**87.498,97**

El volumen ejecutado en el periodo representa un avance del 42.85% del ítem y se llega a un acumulado de 87.498,97 m3, lo que equivale a un avance total acumulado del 77,32% del ítem. En la tabla 12 se presentan las secciones intervenidas.

Abscisa	Vol Sección
0+850.000	1968,36
0+875.000	1897,04
0+900.000	1793,53
0+925.000	1616,49
0+950.000	1658,59
0+975.000	1798,07
1+000.000	1839,43
1+025.000	1791,17
1+050.000	1787,16
1+075.000	1752,18
1+100.000	1657,21
1+125.000	1574,23
1+150.000	1483

Tabla 13. Abscisas intervenidas en el periodo.

10.2.2 ÍTEM 2.10, Localización, trazado y replanteo topográfico.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 60,00% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Localización, trazado y replanteo topográfico	m2	191,40
TOTAL		**562,20**

10.2.3 ÍTEM 2.11, Excavación manual. Incluye: Cargue, retiro y explanación lateral del material de excavación.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem.

10.2.4 ÍTEM 2.12, Concreto F'c 3.000 psi (21 MPa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0.05m. Incluye transporte de materiales.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem.

10.2.5 ÍTEM 2.13, Construcción de box culvert en concreto reforzado de 4.000 psi (28 Mpa) con baja permeabilidad (Incluye: transporte de materiales. No incluye: Acero de refuerzo)

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem.

10.2.6 ÍTEM 2.14, Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 psi (420 Mpa). Incluye transporte.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem.

10.2.7 ÍTEM 2.15, Concreto de F'c 4.000 psi (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre y transporte de materiales.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem.

10.2.8 ÍTEM 3.1, Aislamiento del área de objeto de la restauración ecológica, Unidad: Ha.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem.

10.2.8 ÍTEM 3.2, Establecimiento de la estrategia de restauración ecológica, Unidad: Ha.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem.

10.2.9 ÍTEM 3.3, Mantenimiento de material vegetal establecido, Unidad: Ha.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 100,00% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Mantenimiento del material vegetal establecido.	Has	3,06
TOTAL		**20,00**

10.2.10 ÍTEM 4.5, Mantenimiento preventivo de estación de monitoreo, Unidad: Ha.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem.

10.2.11 ÍTEM 4.1, Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre, Unidad: Mes.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 50,33% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	1,00
TOTAL		**3,50**

10.3 Tiempo transcurrido

A la fecha de elaboración del Informe de avance No. 9, del período de noviembre de 2025, han transcurrido 38 semanas de desarrollo del proyecto, para un porcentaje de 73,08% del plazo de la vigencia 2025 (52 semanas).

ANEXOS

ANEXO 1

Registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Remoción mecánica de sedimentos
Foto No 1: 01 de noviembre de 2025	



Foto No 2: Explanación de sedimentos – 08 de noviembre de 2025



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Explanación de sedimentos

Foto No 3: 11 de noviembre de 2025



Foto No 4: Remoción mecánica y explanación de sedimentos – 24 de noviembre de 2025



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Remoción mecánica de sedimentos
Foto No 5: 26 de noviembre de 2025	



Foto No 6: Excavación de box #1 – 1 de noviembre de 2025



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Excavación de box #1

Foto No 7: 04 de noviembre de 2025



Foto No 8: Excavación Box #1 – 07 de noviembre de 2025



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Excavación de box #1
Foto No 9: 10 de noviembre de 2025	



Foto No 10: Acero en obra – 25 de noviembre de 2025



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Excavación manual de Box #1

Foto No 11: 28 de noviembre de 2025



Foto No 12: Excavación Box #4 – 07 de noviembre de 2025



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Excavación Box #4
Foto No 13: 10 de octubre de 2025	



Foto No 14: Excavación Box #4 – 18 de noviembre de 2025



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Excavación de Box #4
Foto No 15: 21 de noviembre de 2025	



Foto No 16: Finalización de excavación Box #4 – 27 de noviembre de 2025



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Mantenimiento de estación – Caño Los Micos

Foto No 17: 27 de noviembre de 2025




Foto No 18: Mantenimiento de estación Caño Clarín Nuevo – 28 de noviembre de 2025




REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Mantenimiento de estación – Caño El Salado
Foto No 19: 28 de noviembre de 2025	





Foto No 20: Mantenimiento de estación Caño Clarín Nuevo – 30 de noviembre de 2025



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Cierre de jornadas de sensibilización – Carmen del Magdalena
Foto No 21: 21 de noviembre de 2025	





Foto No 22: Cierre Jornadas de sensibilización - Nueva Venecia
30 de noviembre de 2025





REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Inspección fitosanitaria de la rehabilitación ecológica
Foto No 23: 05 de noviembre de 2025	



Foto No 24: Actividades de plateo - 07 de noviembre de 2025



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Actividad de fertilización
Foto No 25: 10 de noviembre de 2025	



Foto No 26: Actividades de plateo - 14 de noviembre de 2025



ANEXO 2

Bitácora de obra.

(1) Veterinario (1) Profesional SST (1) Topógrafo (5) Operadores (1) Maquinaria (1) Ingeniero Agrónomo (1) Ingeniero Director de Interventoría (1) Residente de Interventoría (1) Esp. Ambiental de interventoría. (1) Inspector de interventoría (1) Coordinador de interventoría (1) Esp. Hidráulico de interventoría. (1) topógrafo **Equipos:** Computador portátil de obra e interventoría Vehículo de obra e interventoría Equipos de topografía - (1) RTK. Retro excavadora (4) Machete palas, martillo, Puntillas, metro, palustraga s Palin. Seguetas Guadañas s. motor impulsador de agua. Bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente Interventoría — Edilberto Pays - Residente Obra.

Sabado, 01 de noviembre de 2025: clima: Día soleado - Seco, Sin precipitaciones **Actividades:** Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilitación ecológica, limpieza, Plateo y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera en el caño hondo. Se realizaron charlas sobre evalúe la salud mental **Personal** (1) Director de obra, (1) Coordinador de Obra (1) Esp. Ambiental de obra, (1) Ingeniero Residente (1) Especialista hidraulico (1) Veterinario (1) Profesional SST, (1) Topógrafo (2) Operadores. (1) Maquinaria (1) Ingeniero agrónomo, (1) Residente de Interventoría (1) Coordinador de Interventoría **Equipos:** Computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo de obra e Interventoría, Equipos de topografía - (1) RTK, Retroexcavadora (4) machete palas, martillo, puntillas, metro, palustraga, Palin, Seguela, Guadañas, motor impulsador de agua, Bomba fumigadora.

Jorge Hernandez - Residente Interventoría — Edilberto Pays - Residente Obra

Domingo, 02 de noviembre de 2025: clima: Día Soleado - Seco, Sin precipitaciones **Actividades:** Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilitación ecológica, limpieza, Plateo y actividades de mantenimiento. Se realiza la actividad de remoción mecánica de sedimentos de Solera en el caño hondo y se realizaron Charlas **Personal:** (1) Director de Obra (1) Coordinador de obra, (1) Esp. Ambiental de obra,

Powered by CamScanner

(1) Ingeniero residente (1) Esp Hidraulica (1) Veterinaria (1) Profesional social (1) Topografo (4) Operadores (4) maestro (1) Ingeniero Agronomo (1) Residente de interventoria **Equipos:** Computador portatil de Obra e Interventoria, Vehiculo de obra e Interventoria, Equipos de topografia - (1) RTK, Retroexcavadora (4), machete palas, martillo pantillas, metro, Palatragas, Palin Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua Bomba fumigadora

Semana No. 35 (03 de noviembre de 2025 - 09 de noviembre de 2025).

Lunes, 03 de noviembre de 2025; clima: Día soleado - seco Sin precipitaciones **Actividades:** Se realizan las actividades enmarcadas en el Componente de rehabilitación ecologica, limpieza, plateo y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Se inician las actividades de localización, trazado y replanteo topográfico en el Box No. 3. Se inicia con la actividad de excavación mecánica de aletas y solera en el box No. 1. No se realizaron charlas. **Personal:** (1) Director de obra (1) Coordinador de obra (1) Biologo, (1) Esp Ambiental, de obra (1) Ingeniero residente (1) Esp Hidraulica, (1) Veterinario, (1) Trabajadora social (1) Profesional SST (2) Topografo (4) Operadores (7) maestro, (1) Ingeniero agronomo, (1) Ingeniero director de Interventoria, (1) Conductor, (1) Residente de Interventoria (1) Esp Ambiental de Interventoria, (1) Inspector de interventoria (1) Coordinador de interventoria. (1) Esp Hidraulica de Interventoria (1) Topografo (1) profesional social de interventoria **Equipos:** Computador portatil de Obra e Interventoria, Equipos de topografia - (1) RTK, Retroexcavadora, machete palas, martillo pantillas, metro, palatragas, Palin Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua, Bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente Interventoria — Edilberto Paus - Residente Obra

Martes, 04 de noviembre de 2025; Clima: Día soleado - seco, Sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizan las actividades enmarcadas en el Componente de rehabilitación ecologica, limpieza, plateo y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de Remoción mecánica de sedimentos de solera y Perfilación de taludes en el caño hondo. Se inician con

las actividades de localización, trazado y replanteo topográfico en el box No 3 Se inició con las actividades de localización, trazado y replanteo topográfico en el Box No 3 Se inició con la actividad de excavación mecánica de aletas y solera en el box No 1 Se realizaron charlas sobre Política de seguridad acuática Personal: (1) Director de obra (1) Coordinador de obra (1) Esp Ambiental de Obra (1) Ingeniero residente (1) Esp hidráulico (1) Veterinario (1) profesional SST (2) Topografo (5) Operadores (11) Maestro (1) Ingeniero agrónomo (1) Ingeniero director de interventoría (1) Conductor (1) Residente de Interventoría (1) Esp Ambiental de Interventoría (1) Inspector de interventoría (1) Coordinador de interventoría (1) Esp Hidraulico de interventoría (1) Topografo Equipos: Computador portatil de obra e Interventoría Vehiculo de obra e Interventoría, Equipos de topografía - (1) RTK, Retroexcavadora(s) machete, palas, martillo Puntillas, metro, paladragas, palin, Cegueta, Guadañas, Motor impulsador de agua, bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente de Interventoría

Gilberto Reyes - Residente de Obra

Miercoles, 05 de noviembre de 2025: Clima: Día soleado - 22°C, Sin precipitaciones
Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilito cuña ecológica limpieza, plateo y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Se realizaron con las actividades de localización, trazado y replanteo topografico en el Box No 3. Se inició con la actividad de excavación mecánica de aletas y solera en el Box No.1 Se realizaron charlas procedimiento en caso de inundaciones Personal: (1) Director de obra (1) coordinador de Obra (1) Esp Ambiental de obra (1) Ingeniero residente (1) Esp hidraulico. (1) Veterinario (1) Profesional SST (2) Topógrafo (5) Operadores (11) Maestros (1) Ingeniero Agronomo (1) Residente de interventoría (1) Esp Ambiental de interventoría (1) Inspector de interventoría (1) Coordinador de Interventoría Equipos: Computador portatil de Obra e Interventoría, Vehiculo de Obra e Interventoría, Equipos de topografía - (1) RTK, Retro excavadora(s) machete, Palas: martillo Puntillas, metro, paladragas, Palin, Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua, bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente Interventoría

Gilberto Reyes - Residente Obra

Powered by CamScanner

Jueves, 06 de noviembre de 2025: Clima: Se presentaron lluvias fuertes durante la jornada. Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilitación ecológica. limpieza, plateo y actividades de mantenimiento. Se realiza la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Se realizo con la actividad de excavación mecánica de aletas y soleras en el Box No 1. Se realizaron Charlas Sobre política de Seguridad vial. personal: (1) Director de obra (1) Coordinador de obra (1) Esp Ambiental de Obra (1) Ingeniero Residente (1) Esp hidráulico (1) Veterinario (1) Profesional SST (1) Topografo (5) operadores (1) Marino (1) Ingeniero Agronomo (1) Residente de Interventoría (1) Esp Ambiental de interventoría (1) Inspector de interventoría (1) Coordinador de Interventoría. Equipos: Computador portatil de Obra e interventoría, Vehiculo de obra e interventoría, Equipos de topografia - (1) RTK, Retroexcavadora (5) Machete, palas, martillo, pantillas metro, paladragas, palin cogueta, Guadañas motor impulsador de agua, Bomba fumigadora.

Jorge Hernandez - Residente Interventoría — Edilberto Pays - Residente Obra

Viernes, 07 de noviembre de 2025: Clima: Día soleado seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el Componente de rehabilitación Ecológica limpieza plateo y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecanica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Se realizaron con las actividades de localización, trazado y replanteo topográfico en el Box No 2. Se inicio con la actividad de excavación mecanica de aletas y solera en el Box No 1. Se realizaron charlas sobre incidentes ambientales. Personal: (1) Director de obra (1) Coordinador de obra (1) Esp Ambiental de obra (1) Ingeniero residente (1) Esp hidraulico (1) veterinario (1) Profesional SST (1) Topografo (5) Operadores (1) Marino (1) Ingeniero agrónomo (1) Residente de interventoria (1) Coordinador de interventoria. Equipos: Computador portatil de obra e interventoria, Vehiculo de obra e interventoria, Equipos de topografia - (1) RTK, Retroexcavadora (5) machete, palas, martillo, Pantillas, metro, Paladragas, Palin Cogueta, Guadañas, motor impulsador de agua, Bomba fumigadora.

Jorge Hernandez - Residente Interventoria — Edilberto Pays - Residente obra.

Powered by CamScanner

Sabado, 08 de noviembre de 2025: clima: Día soleado - Semi sin precipitaciones. Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilitación ecológica, limpieza, plateo y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecanica de sedimentos de solera en el caño hondo Se realizaron con las actividades de localización, trazado y replanteo topográfico en el Box No. 3 Se realizó la actividad de excavación mecánica de aletas y solera en el Box No 1 Se realizaron charlas sobre riesgos cardiocascular factores de riesgo Personal: (1) Director de obra (1) Coordinador de obra (1) Esp Ambiental de obra (1) Ingeniero residente (1) Esp Hidraulico (1) veterinario (1) profesional SST (1) topografo (2) Operadores (1) Marino (1) Ingeniero agronomo (1) Residente de interventoria (1) Esp Ambiental de interventoria (1) Inspector de Interventoría (1) Coordinador de Interventoría Equipos: Computador portátil de Obra e Interventoría, Vehículo de Obra e Interventoría Equipos de topografia - (1) RTK, Retroexcavadora (5) machete, palas martillo, pantillas, metro, paladragas, Palín, Cegueta, Guadañas, motor Impulsador de agua, Bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente Interventoría

Edilberto Rojo - Residente Obra

Domingo, 09 de noviembre de 2025: clima: Día soleado - Semi. Sin precipitaciones. Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilitación ecológica, limpieza plateo, y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción Mecanica de sedimentos de solera en el caño hondo Se Continuaron con las actividades de excavación mecánica de aletas y Solera en el Box No 1 No se realizaron charla Personal: (1) Director de obra, (1) Coordinador de obra (1) Esp Ambiental de obra (1) ingeniero residente (1) Esp Hidraulico (1) veterinario (1) profesional SST (1) topógrafo (2) Operadores (2) Marino (1) ingeniero agrónomo (1) Residente interventoría (1) Esp Ambiental de interventoría (1) Inspector de interventoría (1) Coordinador de interventoría Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, Vehículo de obra e Interventoría, Equipos de topografía - (1) RTK, Retroexcavadora (5) machete, palas, martillo, pantillas, metro, paladragas, Palin, Cegueta, Guadañas motor impulsador de agua, Bomba fumigadora

Jorge Fernandez Residente Interventoría. Edilberto Paus- Residente Obra

Semana No.6 (10 de noviembre de 2025 - 16 de noviembre de 2025)

Lunes, 10 de noviembre de 2025: Clima: Se presentaron lluvias fuertes durante la jornada Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el Componente de rehabilitación ecológica, limpieza, plateo, riego y actividades de mantenimiento. Se realizan las actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño tranquilo. Además, Se realizaron actividades de levantamiento postdragado. Se inicia con la actividad de excavación mecánico de sedimentos de solera y perfilación de aletas, losa inferior y solera en el Box No 4 Se realizaron charlas Sobre dra de los parques naturales Personal: (1) Director de obra. (1) Coordinador de obra (1) Biologo (1) Esp Ambiental de Obra. (1) Ingeniero residente (1) Esp Hidraulico (1) Veterinario (1) Trabajadora Social. (1) profesional SST (2) Topógrafo (4) Operadores (11) Maquino (1) ingeniero agronomo. (1) ingeniero. director de interventoría. (1) conductor (1) residente de interventoría (1) Esp Ambiental de interventoría (1) inspector de interventoría (1) Coordinador de interventoría (1) Esp Hidráulicos de interventoría (1) Topografo (1) Profesional Social de interventoría Equipos: Computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo de obra e interventoría, 6 equipos topografía - (1) RTK Retroexcavadora (6), machete palas, martillo, pantillas, metro, palustragas rollo, Pegueto, Cundanas, motor impulsador de agua Bomba fumigadora

Jorge Fernandez Residente Interventoría Edilberto Paus- Residente Obra

Martes, 11 de noviembre de 2025: Clima: Se presentaron lluvias fuertes durante la jornada Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilitación ecológica, limpieza, Plateo, riego, y actividades de mantenimiento. Se realiza actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño tranquilo. Además, Se realizaron actividades de levantamiento postdragado. Se realizaron excavaciones mecanicas de aletas, losa inferior y solera en el Box No 4 Se realizaron charlas - Cual es el ruido? Efecto del ruido Reforestación auditiva.

Powered by CamScanner

Personal: (1) Director de obra, (1) Coordinador de obra (1) Esp Ambiental de Obra (1) Ingeniero residente (1) Esp Hidráulico (1) Veterinario (1) Profesional SSP (2) Topografo (5) operadores (11) Maquinaria (1) Ingeniero agrónomo (1) Ingeniero Director de Interventoría (1) Conductor (1) Residente de interventoría (1) Esp Ambiental de interventoría (1) inspector de interventoría (1) coordinador de interventoría, (1) Esp Hidraulico de interventoría (1) Topografo **Equipos:** Computador portátil de obra e Interventoría, Vehículo de Obra e Interventoría, Equipos de topografía - (1) RPK retro excavadora (5) machete, palas, martillo puntillas, metro, paladragas, Palín Pegueta, Guadañas, motor impulsador de agua Bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente Interventoría — Edilberto Paus - Residente Obra

Miercoles, 12 de noviembre de 2025: Clima Se presentaron lluvias fuertes durante la Jornada **Actividades:** Se realizan las actividades enmarcadas en el Componente de rehabilitación ecológica, limpieza, plateo, riego y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes de caño hondo Además, se realizaron actividades de levantamiento Paisajismo Se realizan excavación mecanico de aletas, losa inferior y Solera en el Box No 1 Se realizaron Charlas Sobre qué hacer en caso de Inundaciones **Personal:** (1) Director de Obra (1) coordinador de Obra (1) Esp Ambiental de Obra (1) Ingeniero Residente, (1) Esp Hidraulico (1) veterinario (1) Profesional SSP (2) Topografo (5) Operadores (11) maquinaria (1) Ingeniero agrónomo (1) residente de interventoría (1) Esp Ambiental de interventoría (1) inspector de interventoría (1) Coordinador de interventoría **Equipos:** Computador portatil de obra e Interventoría, Vehiculo de Obra e Interventoría, Equipos de topografía - (1) RPK Retroexcavadora (5), machete, palas, martillo, puntillas, metro, paladragas, palin pegueta, Guadañas, motor impulsador de agua, bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente Interventoría — Edilberto Paus - Residente Obra

Jueves, 13 de noviembre de 2025: Clima: Se presentaron lluvias fuertes durante la Jornada **Actividades:** Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilitación ecológica, limpieza, plateo, riego y actividades de mantenimiento

Powered by CamScanner

Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño lando Además, se realizaron actividades de levantamiento posgrada Se realiza excavación mecánica de aletas, losa inferior y solera en el Box No 8 Se realizaron charlas Sobre temas en que las sustancias químicas ingresan. **Personal:** (1) Director de obra (1) Coordinador de Obra, (1) Esp. Ambiental de Obra, (1) ingeniero residente, (1) Esp Hidráulico, (1) Veterinario (1) profesional SST (1) Topógrafo (5) Operadores (1) Maestro (1) ingeniero agrónomo (1) residente de interventoría (1) Esp Ambiental de Interventoría (1) inspector de Interventoría (1) Coordinador de interventoría **Equipos:** Computador portatil de obra e Interventoría, Equipos de topografía (1) RTK, Vehículo de Obra e Interventoría Retroexcavadora (5) machete, palas, martillo, pantillas, metro, palachagas pollin, Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua Bomba fumigadora.

Jorge Fernandez - Residente Interventoría — Edilberto Reys - Residente Obra

Viernes, 14 de noviembre de 2025: **Clima:** Día Soleado - Seco, Sin precipitaciones

Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilitación ecológica, limpieza, plateo, riego y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño lando Además, se realizan actividades de levantamiento posdragada Se realiza excavación mecánica de aletas losa inferior y Solera en el Box No 8 Se realizaron charlas Sobre temas R **Personal:** (1) Director de obra (1) Coordinador de obra (1) Esp. Ambiental de Obra (1) ingeniero residente (1) Esp. Hidraulico, (1) veterinario (1) profesional SST (1) Topógrafo (5) Operadores (1) Maestro, (1) ingeniero agrónomo (1) residente Interventoría (1) Esp Ambiental de interventoría (1) inspector de interventoría, (1) Coordinador de interventoría **Equipos:** Computador portatil de obra e Interventoría Vehículo de obra e interventoría, Equipos de topografía - (1) RTK Retroexcavadora (5) machete, palas, martillos, Pantillas, metro, palachagas: pollín, Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua, bomba fumigadora.

Jorge Fernandez - Residente Interventoría — Edilberto Reys - Residente Obra

Sabado 15 de noviembre de 2025: **Clima:** Día Soleado Seco - Sin precipitaciones

Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el Componente de rehabilitación ecológica limpieza, plateo, riego y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y Perfilación de taludes en el caño hondo. Además, se realizaron actividades de levantamiento postdragado. Se realizan excavación mecánica de aletas, losa inferior y solera en el box No 4. Se realizaron charlas: Sobre ejercicio prácticos, Simulacro de derrame **Personal:** (1) Director de Obra (1) Coordinador de obra (1) Esp Ambiental de obra (1) Ingeniero residente (1) Esp Hidraulico (1) Veterinario (1) Profesional SST (1) Topografo (5) Operadores (7) Mamos (1) Ingeniero agrónomo (1) Residente de interventoría (1) Esp Ambiental de Interventoría (1) Inspector de interventoría (1) Coordinador de interventoría **Equipos:** Computador portatil de obra e interventoría. Vehículo de Obra e Interventoría. Equipos de topografia (1) RTK, Retroexcavadora (5), Machete, palas, martillo, puntillas, metro, palaadragas, palin, Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua. Bomba fumigadora.

Jorge Hernandez - Residente Interventoría — Edilberto Rays - Residente Obra.

Domingo 16, de noviembre de 2025: Clima: Se presentaron lluvias fuertes durante la jornada. **Actividades:** Se realizan las actividades enmarcadas en el Componente de rehabilitación ecologica, limpieza, plateo, riego y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecanica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Ademas, se realizaron actividades de levantamiento postdragado. Se realiza excavaciones mecanicas de aletas, losa inferior y solera en el Box No 4. No se realizaron charlas. **Personal:** (1) Director de obra, (1) Coordinador de obra (1) Esp Ambiental de Obra (1) ingeniero residente (1) Esp - Hidraulico, (1) Veterinario (1) Profesional SST, (1) Topografo (5) Operadores (7) mamo (1) ingeniero agrónomo (1) Residente de interventoría, (1) Esp. Ambiental de Interventoría (1) Inspector de Interventoría (1) Coordinador de Interventoría **Equipos:** Computador portatil obra e Interventoría, Vehiculo de Obra e Interventoría, Equipos de topografía (1) RTK, Retroexcavadora (5), machete, palas, martillo, puntillas, metro, paladragas, palin Cegueta, guadaña, motor impulsador de agua, Bomba fumigadora.

Jorge Hernandez - Residente Interventoría — Edilberto Rays - Residente Obra.

Powered by CamScanner

Semana No. 37 (17 de noviembre de 2025 - 23 de noviembre de 2025)

Lunes, 17 de noviembre de 2025: Clima: Día soleado sin Precipitaciones
Actividades: Se realizo la actividad de remoción mecánica de Sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Se continua con la actividad de excavación mecánica de losa inferior en el Box 1 y 4 Se realizaron charlas Sobre que tan Consiente es usted cuando se trata de seguridad Personal: (1) Director de obra, (1) Coordinador de obra, (1) Biologo, (2) Esp Ambiental de obra, (1) Ingeniero residente (1) Esp Hidraulico, (1) Veterinario (1) Trabajadora social (1) profesional SST (2) Topografo, (5) operadores (17) Mamo (1) Ingeniero agrónoma (1) ing director de interventoría, (1) inspector de Interventoría (1) Coordinador de interventoría (1) Esp Hidraulico de interventoría. (1) Topografo (1) Profesional Social de interventoría. Equipos: Computador portatil de Obra e Interventoría, Vehiculo de obra e Interventoría, Equipos de topografia (1) RTK Retroexcavadora (5) machete, palas, martillo, puntillas, metro, pulidraga S. pvm, cegueta, Guadaña, motor impulsador de agua, bomba fumigadora.

Jorge Fernandez - Residente Interventoría

Gilberto Rous - Residente Obra

Martes, 18 de noviembre de 2025: clima: Se presentaron lluvias fuertes en la tarde
Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el Componente de Implementación de estrategias de sensibilización y Participación ambiental dirigida a la Comunidad estudiantil de la Escuela Rural mixta de nueva venecia - Acompañamiento - Actividades de cierre de campaña educativa ambiental, a través de la implementación de murales y Jornada lúdica, Cultural y educativa ambiental, a través de la Implementación y para el cierre de las actividades del componente de Sensibilización y participación ambiental Se realizan la actividad de remoción mecánica de Sedimentos de solera y perfilación de taludes. en el Caño hondo. Se Continua Con la actividad de excavación mecánica de la losa inferior en el Box No 1 y 4. Se realizaron Charlas Sobre protección Personal en entornos mecánicos Personal: (1) Director de obra, (1) Coordinador de obra. (1) Esp. Ambiental de obra. (1) Ingeniero residente, (1) Esp. Hidráulico, (1) Veterinario (1) Profesional SST. (1) Topografo (5) Operadores. (17) Mamo (1) Ingeniero agrónomo. (1) Ingeniero director de interventoría (1) Coordinador

(1) Residente de interventoría. (1) Esp Ambiental de Interventoría. (1) Inspector de interventoría (1) Coordinador de interventoría (1) Esp. Hidraulico de interventoría. (1) Topógrafo **Equipos:** Computador portatil de obra e Interventoría, Vehiculo de obra e Interventoría, Equipos de topografía - (1) RTK retroexcavadora (5) machete, palas, martillo, puntillas, metro, paladragas, palin, Cegueta Guadañas. Motor impulsador de agua Bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente Interventoría — Edilberto Reys - Residente Obra

Miercoles, 14 de noviembre de 2025: Clima: Dia soleado - Seco, sin precipitaciones **Actividades:** Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Se continua con la actividad de excavación mecanica de losa inferior en el Box No 1 y 4 Se realizaron Charlas Sobre procedimiento en caso de tormenta o tormenta tropical **Personal:** (1) Director de obra (1) Coordinador de obra. (1) Esp. Ambiental de Obra. (1) Ingeniero residente. (1) Esp Hidraulico. (1) Veterinario. (1) profesional SST. (2) Topografo. (5) operadores (7) marino (1) Ingeniero Agronomo (1) Residente de interventoría (1) Esp. Ambiental de interventoría. (1) Inspector de interventoría (1) Coordinador de interventoría **Equipos:** Computador portatil de obra e interventoría, Vehiculo de obra e Interventoría, Equipos de topografía (1) RTK, retroexcavadora (5) machete, palas, martillo, puntillas, metro, paladragas, palin, cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua, Bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente Interventoría — Edilberto Reys - Residente Obra

Jueves, 20 de noviembre de 2025: Clima: Dia Soleado - Seco sin precipitaciones **Actividades:** Se realizan la actividad de remoción mecanica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo Se continua con la actividad de excavación mecánica de losa inferior en el Box No 1 y 4 No se realizaron charlas. **Personal:** (1) Director de obra, (1) Coordinador de obra, (1) Esp. Ambiental de obra. (1) Ing Residente (1) Esp hidraulico (1) Veterinario (1) Profesional SST (1) Topografo (5) operadores (7) Marino (1) Ingeniero agronomo (1) Residente Interventoría

Powered by CamScanner

(1) Esp Ambiental de interventoría. (1) Inspector de interventoría. (1) Coordinador de interventoría **Equipos:** Computador portatil de obra e Interventoría, Vehiculo de obra e interventoría Equipos de topografia - (1) RTK, Retroexcavadora (5) machete, palas, martillo, Pintillas, metro, palachagas, palin, Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua, Bomba fumigadora.

Jorge Fernandez - Residente Interventoría — Edilberto Rays - Residente obra

Viernes, 21 de noviembre cle 2025: clima: Dia soleado - Seco sin precipitaciones. **Actividades:** Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo Se continua con la actividad de excavación mecánica de losa inferior en el Box No. 1 y 4. Se continuaron las actividades contempladas en el componente de implementación de estrategias de sensibilización y Participación ambiental dirigida a la Asociación de mujeres del corregimiento cle El Carmen del Magdalena y a la comunidad estudiantil de la institución educativa Otilia Mena Alvarez del corregimiento de El Carmen del Magdalena. Acompañamiento. Actividades de cierre de campaña educativa ambiental a través de la implementación de murales y Jornada lúdica, cultural y educativa ambiental para el cierre de las actividades del componente cle sensibilización y participación Ambiental. Se realizaron charlas sobre la importancia de las coberturas Vegetales y como ayudan a la sostenibilidad del medio ambiente **Personal:** (1) Director de obra. (1) Coordinador de obra. (1) Esp Ambiental de obra (1) Ingeniero residente. (1) Esp. Hidraulico. (1) Veterinario (1) Profesional SST (1) Topógrafo (5) Operadores (7) Manno (1) Ingeniero agronomo (1) residente de interventoría (1) Esp - Ambiental de interventoría (1) Inspector de interventoría (1) Coordinador de interventoría **Equipos:** Computador portatil de obra e Interventoría, Vehiculo de obra e interventoría Equipos de topografia - (1) RTK, Retroexcavadora (5) machete, palas, martillo, Pintillas, metro, palachagas palin, Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua, Bomba fumigadora

Jorge Fernandez - Residente Interventoría — Edilberto Rays - Residente Obra

Powered by CamScanner

Sabado, 22 de noviembre de 2025: Clima: Día soleado - Seco, Sin precipitaciones Actividades: Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Se continua con la actividad de excavación mecánica de losa inferior en el box No 1 y 4. Se realizaron charlas sobre Consumo de alcohol efectos Personal: (1) Director de obra (1) Coordinador de obra (1) Esp. Ambiental de obra (1) Ingeniero Residente (1) Esp Hidraulico. (1) Veterinario, (1) Profesional SST (1) Topografo, (3) Operadores (7) mayos (1) Ingeniero Agronomo (1) Residente Interventoria (1) Esp. Ambiental de interventora (1) Inspector de interventora (1) Coordinador de Interventoría Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, Vehiculo de obra e interventoría, Equipos de topografia (1) RTK, Retroexcavadora (5) machete, palas, martillo, pantillas, metro, paladragas palin, Cegueta, Guaduañas, motor impulsador de agua, bomba fumigadora.

Jorge Hernandez - Residente Interventoria Edilberto Rays - Residente Obra.

Domingo 23 de noviembre de 2025: Clima: Día Soleado - Seco, Sin precipitaciones. Actividades: Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y Perfilación de taludes en el caño hondo. Se continua con la actividad de excavación mecanica de loca inferior en el Box No. 1 y 4 Se realizaron charlas sobre como actuar en situaciones de inhabilitación, derrames, Ingesta y salpicadura de sustancias quimicas. Personal: (1) Director de obra, (1) Coordinador de obra, (1) Esp Ambiental de obra (1) Ingeniero residente (1) Esp Hidraulico, (1) Veterinario, (1) profesional SST (1) topógrafo (2) operadores (7) mayos (1) Ingeniero agrónomo. (1) Residente de Interventoria (1) Esp Ambiental de Interventoría (1) Inspector de Interventoria (1) Coordinador de Interventoría Equipos: Computador portatil de obra e Interventoría, Vehiculo de obra e Interventoría, Equipos de topografía - (1) RTK, Retroexcavadora (5) machete, palas martillo, pantillas, metro, paladragas, palín, Cegueta, Guaduañas, motor Impulsadora de agua, bomba fumigadora.

Jorge Hernandez - Residente Interventoría Edilberto Rays - Residente Obra.

Powered by CamScanner

Semana No. 38 (24 de noviembre de 2025 - 30 de noviembre 2025)

Lunes, 24 de noviembre de 2025: clima: Día soleado: Seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilitación ecológica, limpieza, plateo, actividades de mantenimiento. Se realizó actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el cauce hondo. Se continúa con la excavación manual para la losa inferior de los Box No 1 y 4. Se inicia con el corte y figurado de acero de refuerzo para el box. Se realizaron charlas sobre política de SST. Personal: (1) Director de obra, (1) Coordinador de Obra, (1) Biologo (1) Esp. Ambiental de obra (1) Ingeniero residente. (1) Esp hidraulico, (1) Veterinario, (1) Trabajadora Social, (1) profesional SST (2) Topografos (6) Operadores (13) maestros (1) Ingeniero agronomo (1) Ingeniero director de Interventoría (1) Conductor, (1) Residente de interventoría, (1) Esp Ambiental de Interventoria, (1) Inspector de interventoria, (1) Coordinador de Interventoria (1) Esp. Hidraulico de interventoría, (1) Topografo (1) profesional Social de interventoría. Equipos: Computador portatil de obra e Interventoría, Vehiculo de obra e Interventoría, Equipos de topografia (1) EPP< Retroexcavadora (1), Bulldozer (1), machete, palas, martillo, Puntillas, metro, palachagas, palin, Cegueta, Guadaña, motor Impulsador de agua, Bomba fumigadora.

Jorge Hernandez Residente de Interventoría — Edilberto Rous Residente Obra

Martes, 25 de noviembre de 2025: clima: Día Soleado-Seco, Sin precipitaciones. Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el Componente de rehabilitación Ecologica, limpieza, plateo y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecanica de Sedimentos de Solera y perfilación de taludes en el cauce hondo. Se continua con la excavación manual para la losa inferior de los Box No 1 y 4. Se realiza el Corte y figurado de acero de refuerzo para el Box. Se recibieron plantulas y abono para la rehabilitación ecologica. Se realizaron Charlas sobre porque es necesaria la señalización en la empresa. Personal: (1) Director de obra (1) Coordinador de Obra.

Powered by CamScanner

(1) Esp Ambiental de obra, (1) Ingeniero residente (1) Esp. hidraulico (1) Veterinario (1) profesional SST (2) Topografo (5) Operadores (12) mannos (1) Ingeniero agronomo (1) Ingeniero director de interventoría (1) Conductor (1) Residente de interventoría (1) Esp Ambiental de interventoria (1) Inspector de interventoria (1) Coordinador de interventoría (1) Esp. hidraulico de interventoría (1) Topografo Equipos: Computador portatil de obra e Interventoría, vehiculo de obra e interventoria, Equipo de topografía - (1) RTK. Retroexcavadora (5), bulldozer (1) machete, palas, martillo, pantilla, metro, paladragas, palín, Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua, Bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente Interventoría — Edilberto Rous - Residente de Obra

Miercoles, 26 de noviembre: Clima: Día soleado - Seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el Componente de rehabilitación ecológica, limpieza platea y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecanica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Se continúa con la excavación manual para la losa inferior de los Box No 1 y 4. Se realiza el corte y figurado de acero de refuerzo para el box. Se realizaron charlas sobre que hacer en caso de tormenta tropical o eléctrica. **Personal:** (1) Director de Obra, (1) Coordinador de Obra, (1) Esp. Ambiental de Obra, (1) Ingeniero Residente, (2) Esp. Hidraulico, (1) Veterinario, (1) profesional SST, (2) Topografo (6) Operadores, (9) Manno, (1) Ingeniero agronomo, (1) Residente de interventoría, (1) Esp. Ambiental de interventoría, (1) Inspector de Interventoría, (1) Coordinador de interventoría, **Equipos:** Computador portatil de Obra e Interventoría, Vehiculo de Obra e Interventoría, Equipos de topografía - (1) RTK, Retroexcavadora (6) Bulldozer (1) machete, palas, martillo, pantillas, metro, paladragas, palín, Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua, Bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente Interventoría — Edilberto Rous - Residente Obra

Powered by CamScanner

Jueves, 27 de noviembre de 2025: clima: Día Soleado - Seco, Sin precipitaciones. Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilitación ecológica. limpieza, plateo y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Se continua con la excavación manual para la losa inferior de los Box No 1 y 4. Se realiza el corte y figurado de acero de refuerzo para el Box 2. Se realizaron charlas sobre gestión de la espiritualidad en el riesgo psicológico. Personal: (1) Director de obra (1) Coordinador de obra (1) Esp. Ambiental de obra, (1) Ingeniero residente, (1) Esp. Hidraulico. (1) veterinario, (1) profesional SST (1) Topografo (6) Operadores, (2) Mineros (1) Ingeniero agronomo, (1) Residente de interventoría, (1) Esp. Ambiental de interventoría, (1) Inspector de interventoría, (1) Coordinador de interventoría Equipos: Computador de obra e interventoría, Vehiculo de obra e interventoría, Equipos de topografia (1) RTK, retroexcavadora (5) Bulldozer (1) machete, palas, martillo, antillas, metro, paladragas, Palin, Pregueta, Guadañas, motor impulsador de agua, Bomba fumigadora

Jorge Hernandez Residente Interventoría — Ecthberto Reyes-Residente Obra

Viernes, 28 de noviembre de 2025: Clima: Día Soleado - Seco, Sin precipitaciones. Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de rehabilitación ecológica limpieza, plateo, y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de Solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Se continua con la excavación manual para la losa inferior de los Box No. 1 y 4. Se realizaron corte y figurado de acero de refuerzo para el Box. Se lleva a cabo el mantenimiento a la estación de monitoreo ubicada en el caño Los micos. Rocería y limpieza, Se realizaron charlas: Sobre conservación ambiental. Personal: (1) Director de obra (1) Coordinador de obra e Interventoria (1) Esp. Ambiental de obra, (1) Ingeniero residente (1) Esp. Hidraulico, (1) Veterinario, (1) Profesional SST. (1) Topografo (6) Operadores (2) Mineros (1) Ingeniero Agronomo (1) Residente de interventoría (1) Esp. Ambiental de interventoría,

(1) Inspector de Interventoria. (1) Coordinador de interventoría. Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, Vehiculo de obra e interventoria, Equipos de topografía - (1) RTK, Retroexcavadora (5), bulldozer (1), machete, martillo, puntillas metro, paladreagas, palin, Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua, bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente interventoría

Edilberto Rays - Residente Obra

Sabado 29 de noviembre de 2025: Clima: Dia soleado seco, Sin precipitaciones. Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de retabilitación ecológica, limpieza, plateo y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción mecánica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el caño hondo. Se continúa con la excavación manual para la losa inferior de los Box No 1 y 4 Se realiza el Corte y figurado de acero de refuerzo para el Box. Se lleva a cabo el mantenimiento a la estación de monitoreo ubicada en el caño los micos: Poceria y limpieza Se recibieron plántulas y abono para iniciar la rehabilitación ecológica. Se realizaron charlas sobre nutrición adecuada. Personal: (1) Director de obra (1) Coordinador de obra (1) Esp Ambiental de obra, (1) Ingeniero residente, (1) Esp. Hidráulico (1) Veterinario. (1) Profesional SST (1) Topografo (3) Operadores (12) Maestro (1) Ingeniero agrónomo (1) Residente de interventoría (1) Esp. Ambiental de Interventoría (1) Inspector de Interventoría (1) Coordinador de interventoría. Equipos: Computador portatil de obra e interventoría. Vehiculo de obra e Interventoría, Equipos topografia (1) RTK, Retroexcavadora (5), bulldozer (1), machete, palas, martillo, puntillas, metro, paladreagas, palin, Cegueta, Guadañas, motor impulsador de agua Bomba fumigadora.

Jorge Hernandez - Residente Interventoría

Edilberto Rays - Residente Obra

Domingo 30 de noviembre de 2025: Clima: Se presentaron lluvias fuertes durante la jornada Actividades: Se realizan las actividades enmarcadas en el componente de retabilitación ecológica limpieza, plateo y actividades de mantenimiento. Se realizan la actividad de remoción

Powered by CamScanner

mecanica de sedimentos de solera y perfilación de taludes en el Caño hondo Secantino con la excavación manual para la losa interior de los box No 1 y 4 Se realizaron el corte y figurado de acero de refuerzo para el box No se realizaron Charlas. Personal: (1) Director de obra, (1) Coordinador de obra (1) Esp Ambiental de obra (1) Ingeniero residente (1) Esp hidráulico (1) Veterinario (1) profesional SST (1) Topografo (2) Operadores, (7) Marino, (1) Ingeniero agrónomo (1) Residente de Interventoria (1) Esp Ambiental de interventoria (1) Inspector de interventoria (1) Coordinador de Interventoria Equipos: Computador portatil de obra e Interventoria; Vehiculo de obra e Interventoria Equipos de topografía - (1) RTK, Retro-excavadora (52), bulldozer (1), machete, palas, martillo, punchillas, metro, paladragas, poli.n, Cegueta, Guadañas motor impulsador de agua, Bomba fumigadora

Jorge Hernandez - Residente Interventoria

Edilberto Reys - Residente Interventoria

ANEXO 3

Informe Mantenimiento siembra.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATISTA:

Consorcio CGSM4
NIT. 901.782.967-1




CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL ESTABLECIDO

NOVIEMBRE 2025.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Yurani Acevedo C.		
			
	Residente Ambiental		
Revisión	Ing. Yurani Acevedo C.		
			
	Residente Ambiental		
Aprobación	Ing. Ángel Vizcaino Escobar		
			
	Director de Proyecto		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e Ingeniería S.A.S	1		

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 4
2.1 Localización 4
2.2 Localización Especifica 5
3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 6
3.1 Control Fitosanitario 6
3.2 Plateo 7
3.3 Fertilización 8
4. HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS 9

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, suscribió con CONSORCIO CGSM4 el Contrato de Obra No. LP-005-2023 para realizar las obras de "*MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES*" Igualmente, celebró el Contrato de interventoría No. CM-008-2023 con INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S., para realizar la Interventoría al presente proyecto.

Dentro del alcance del contrato, se encuentra contemplado el "Mantenimiento del material vegetal establecido", que contempla el mantenimiento de la siembra de individuos arbóreos en una extensión de 20 hectáreas. La actividad de siembra se realizó en la zona de intervención de la vigencia 2024 del contrato, específicamente en el caño El Salado, municipio de Remolino.

Esta actividad implica el mantenimiento de la plantación de árboles que utiliza principalmente cuando la sucesión natural de la vegetación se ve obstaculizada por ciertos factores, lo que requiere un apoyo o aceleración de este proceso. Entre los elementos que pueden dificultar el desarrollo de la sucesión vegetal se encuentran: la disponibilidad de agua, la distancia a fuentes de semillas, el uso histórico del suelo, la falta de fauna dispersora, entre otros. Por esta razón, la restauración activa mediante la plantación de árboles puede omitir algunas etapas del proceso sucesional, ayudando a recuperar gradualmente las funciones que el ecosistema tenía antes de las perturbaciones.

2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

2.1 Localización

La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), es el complejo lagunar más grande de Colombia con un área aproximada de 3.487 km2 de los cuales 73 corresponden al espejo de agua. Dentro de esta área se encuentran localizados la vía - Parque Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna. La CGSM está ubicada en el extremo noroccidental del Departamento del Magdalena, al norte del país y esta globalmente comprendido entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio por el Sur, el río Magdalena por el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta. *(Estudios previos).*



Imagen No 1. Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta.

2.2 Localización Especifica

Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se intervino durante la vigencia del año 2024 fue el caño El Salado, localizado en el Municipio de Remolino (Magdalena).

El municipio de Remolino se localiza en Colombia, en el Departamento del Magdalena, pertenece a la región geográfica de la ciénaga Grande del Magdalena, fue fundado en 1752, se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del Magdalena, localizado a los 10° 42" de latitud norte y 74° 43" de longitud al oeste de Greenwich, su relieve está caracterizado por poseer un territorio bajo plano y cenagoso, bañado por el río Magdalena y algunos caños convirtiéndose en una inmensa llanura de inundaciones que contienen depósitos de terraza aluvial generándose una terraza ligeramente inclinada.

Las actividades del componente de rehabilitación ecológica se llevaron a cabo en el predio "Doña María", ubicado en el caño El Salado en inmediaciones de la abscisa K2+550.

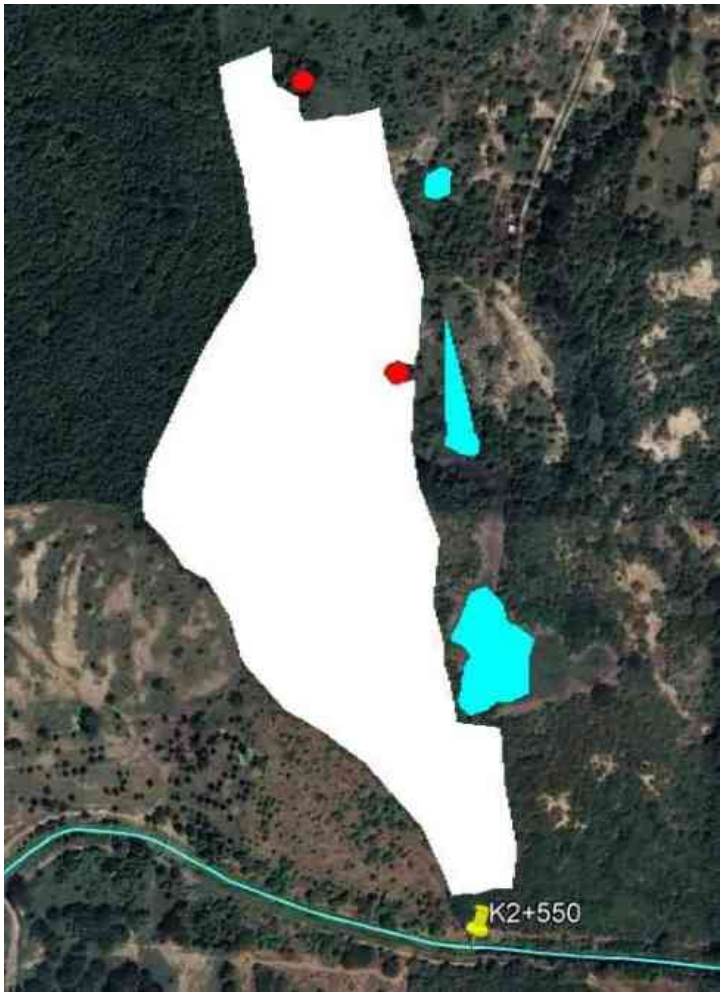


Imagen No 2. Polígono seleccionado para la siembra

3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

En el mes de noviembre se desarrollaron las siguientes actividades en mantenimiento:

3.1 Control Fitosanitario

Los árboles en un 100% se encuentran con buen desarrollo vegetativo, estado fitosanitario en excelentes condiciones y con una altura promedio entre 1.20 m hasta más de 3 metros de altura.



Imagen No 3. Inspección Individuo Arbóreo



Imagen No 4. Inspección Individuo Arbóreo

3.2 Plateo

La finca quedó en un 95% con labor de plateo, salve las zonas que se encontraban inundadas por las fuertes lluvias, esta labor se realizó de forma manual con machete y con guadañadora para optimizar los resultados.



Imagen No 5. Actividades de Plateo



Imagen No 6. Actividades de Plateo



Imagen No 7. Actividades de Plateo



Imagen No 8. Actividades de Plateo

3.3 Fertilización

Se realizó la tercera fertilización de manera foliar con fertilizante orgánico en dosis de 50cc/bomba de 20 litros, la fertilizante tenía componentes de elementos mayores y menores garantizando una buena nutrición a los árboles.



Imagen No 9. Actividades de fertilización



Imagen No 10. Actividades de fertilización

4. HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS

Para este mes se necesitaron las siguientes herramientas, insumos y equipos.

- Herramientas menores (machetes, grapas, matillos, mano de diablo, limas, paladragas, y metro).
- Guadañadoras
- Elementos de protección personal (Guantes, botas de protección para trabajo en campo).

ANEXO 4

Informe SST.

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)



MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES.

Áreas de intervención: Caño Hondo

PERIODO: Noviembre de 2025

CONTENIDO

1 LOCALIZACIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR 5
1.1. LOCALIZACION GENERAL. 5
1.2. LOCALIZACION GENERAL DEL SECTOR A INTERVENIR. 6
2. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL PROYECTO 7
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 10
3.1 INDUCCIONES O REINDUCCIONES. 10
3.2 CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 11
3.3 INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 19
3.4 ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP). 21
3.5 SEÑALIZACION. 27
4. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 31
5. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 34
6. ORDEN Y ASEO 39
7. INCIDENTES Y/O ACCIDENTES LABORALES 40
8. EXAMENES MEDICOS 40
9. HIDRATACION 41

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Personal asignado al proyecto 7
Tabla 2 Inducciones 10
Tabla 3. Charlas y capacitaciones SST 11
Tabla 4. Cronograma de inspecciones 19
Tabla 5. Capacitaciones relacionadas con el plan de emergencia 35
Tabla 6 Conceptos médicos 40

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general del proyecto 5

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1. Cumplimiento programa inspecciones 20

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Charlas y capacitaciones SST 14
Fotografía 2. Charlas y capacitaciones SST 15
Fotografía 3. Charlas y capacitaciones SST 16
Fotografía 4. Charlas y capacitaciones SST 17
Fotografía 5. Charlas y capacitaciones SST 18
Fotografia 6 Entrega de EPP 21
Fotografia 7 Entrega de EPP ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Fotografia 8 Entrega de EPP 22
Fotografia 9 Entrega de EPP 23
Fotografia 10 Entrega de EPP 24
Fotografia 11 Entrega de EPP 25
Fotografia 12 Entrega de EPP 26
Fotografia 13 Señalización áreas de trabajo 27
Fotografia 14 Señalización áreas de trabajo 28
Fotografia 15 Señalización áreas de trabajo 29
Fotografia 16 Señalización áreas de trabajo 30
Fotografia 17 Toma de combustible 32
Fotografia 18 Toma de combustible 33
Fotografia 19 Equipos de emergencias - Kit control derrame 36
Fotografia 20 Equipo de emergencia extintor 37
Fotografia 21 Equipo de emergencia botiquín ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Fotografia 22 Equipo de emergencia Camilla 38
Fotografia 23 Orden y aseo ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Fotografia 24 Punto ecológico 39
Fotografia 25 Punto de hidratación 41

1 LOCALIZACIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR

1.1. LOCALIZACIÓN GENERAL.

La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al Norte del país en el extremo Noroccidental del Departamento del Magdalena, su área de influencia está comprendida entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio al Sur, el río Magdalena por el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con una extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe a través del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por intermedio de caños que permiten a su vez intercomunicación con el rio Magdalena.

Ilustración 1. Localización general del proyecto



Figura 1, Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta

1.2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR A INTERVENIR

Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir con este proyecto se encuentra ubicada en el sector este, donde se ubica Caño Hondo del complejo lagunar, el cual se encuentran en la jurisdicción del municipio de Salamina, por tanto, los beneficiarios directos son los pobladores de los municipios de Salamina y Remolino. Ver figura No.2.

El municipio de Salamina es un municipio ubicado al norte del departamento del Magdalena, Colombia a escasos 50 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena. Funciona como punto de conexión de la Vía de la Cordialidad del Magdalena con el Corregimiento Puerto Giraldo en el Departamento del Atlántico. El desarrollo social y económico de la cabecera ha estado marcado, históricamente desde principios de siglo, por las actividades agropecuarias, fluvial y comercial, lo cual le representó un auge significativo durante los primeros cincuenta años del anterior siglo. Sin lugar a duda, a ello contribuyó el efecto de sus fuertes vínculos con el comercio de Barranquilla y su importante y estratégica localización sobre el río Magdalena y el Departamento del Atlántico con relación a las poblaciones del interior del departamento del Magdalena, sobre las cuales debía configurarse un importante mercado regional.

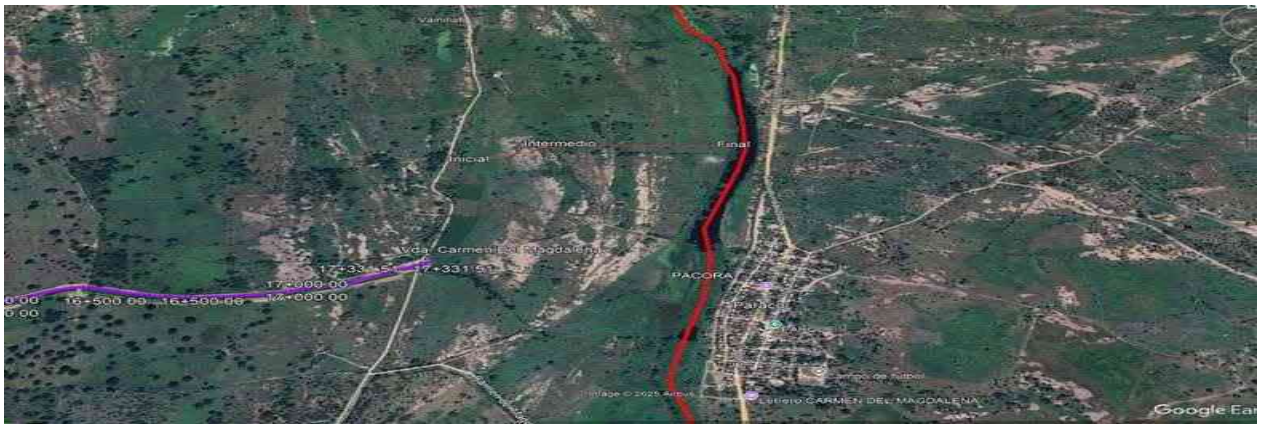


Figura 2. Caño Hondo, Localización general Tomado de Google Earth 2018.

2. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL PROYECTO

Como compromiso establecido en nuestra Política Integrada de Gestión y cumplimiento de la legislación colombiana en materia de Seguridad y Salud en el trabajo CONSORCIO CGSM 4, en su ANEXO 4.1 entrega los aportes a seguridad social del personal participante del proyecto, el cual se relaciona a continuación.

Tabla 1. Personal asignado al proyecto

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CARGO	EMPRESA
1129578658	ACEVEDO	COLON	YURANI ANDREA	INGENIERA AMBIENTAL SENIOR	PANAMERICAN
1081905903	ALMENDRALES	MEDINA	RICHARD DE JESUS	OPERADOR DE EXCAVADORA	PHD
1004213282	ALVAREZ	MANGA	KEVIN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
1079913769	ALVAREZ	MONTENEGRO	CARLOS ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
1143119327	BALLESTAS	QUINTERO	FRANCISCO	VETERINARIO	CONSORCIO CGSM 4
1010080507	BARRERA	MARTINEZ	CARLOS	MARINO	CONSORCIO CGSM 4
5078310	BONET	ACUÑA	ADOLFO RAFAEL	CAPATAZ	RUBEN FRANCO
1079934636	CABALLERO	CHARRIS	JOSE LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
1081027709	CAMACHO	CANTILLO	JOSE GREGORIO	MARINO	CONSORCIO CGSM 4
5095498	CANTILLO	CARRILLO	EDUARDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1079916394	CANTILLO	PACHECHO	EDULFO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
85479893	CANTILLO	BOLAÑO	ORLANDO RAFAEL	MAESTRO DE OBRA	RUBEN FRANCO
5082536	CASTAÑEDA	RETAMOZO	AROLDO RAFAEL	AYUDANTE	ANAVRIN
1079932676	CERVANTES	MENDEZ	FRAN CARLOS	OPERADOR DE EXCAVADORA	VIAS Y DRAGADOS

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CARGO	EMPRESA
5078785	CHARRIS	BOLAÑO	TEOVALDO ENRIQUE	AYUDANTE	ANAVRIN
1108767049	FUENTES	ACOSTA	LINA MARIA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	VIAS Y DRAGADOS
1083572789	GAMEZ	SANTODOMINGO	CARLOS SEGUNDO	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
1004121723	GOMEZ	ESCORCIA	SINIBALDO JOSE	MARINO	CONSORCIO CGSM 4
10044121831	GOMEZ	RAMIREZ	BRYAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
1010150262	GONZALEZ	VERGARA	ADRIANA CRISTINA	PROFESIONAL EN SST	PANAMERICAN
1082046890	GUETE	OJEDA	JOSE ANGEL	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1042348012	HERRERA	VILLAMIL	LUIS EDUARDO	OPERADOR DE EXCAVADORA	ROYS CORCIO INGENIERIA
5078492	HERRERA	CABARCAS	ARTURO RAFAEL	OFICIAL	MANUEL HERNANDEZ
1084738073	IBAÑEZ	OSPINO	ALFONSO ENRIQUE	OPERADOR DE EXCAVADORA	VIAS Y DRAGADOS
5078921	LARA	PASION	HERIBERTO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
84456544	LOPEZ	CLAVIJO	CHRISTIAN DARO	ESPECIALISTA HIDRAULICO	INDEPENDIENTE
7598807	MAESTRE	CHARRIS	DANIEL ALBERTO	MARINO	CONSORCIO CGSM 4
1079914724	MANOTAS	GUTIERREZ	JESUS DAVID	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
1085224296	MARTINEZ	JIMENEZ	MARIA AUXILIADORA	BIOLOGA	PANAMERICAN
73129552	MEZA	MENDOZA	PABLO FRANCISCO	OPERADOR DE BULLDOZER	HERRERA Y DURAN
1004298507	OROZCO	FERREIRA	JOHENDRYS	MARINO	CONSORCIO CGSM 4
1193547906	OROZCO	GUETE	JESUS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1082045696	PADILLA	FERREIRA	JONATAN ALBERTO	MARINO	CONSORCIO CGSM 4

Realizó:	Revisó:	Aprobó:
Adriana González Vergara Profesional SST	Adriana González Vergara Profesional SST	Ángel Vizcaino Escobar Director de Proyecto

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CARGO	EMPRESA
70530541	PAEZ	ARRIETA	ARMANDO ENRIQUE	OPERADOR DE EXCAVADORA	PANAMERICAN
1100549999	PALENCIA	GUZMAN	JESUS DANIEL	TOPOGRAFO	VIAS Y DRAGADOS
1082046517	POLO	NAVARRO	YESMITH VANESSA	VIGIA HSE	CONSORCIO CGSM 4
9464493661	PRADA	DAZA	EUGENIO	GERENTE DEL PROYECTO	INDEPENDIENTE
1118813194	ROYS	CORZO	EDILBERTO GREGORIO	INGENIERO RESIDENTE	PANAMERICAN
1031127390	SANTISTEBAN	MURIEL	IVONNE STIBALIZ	INGENIERO TOPOGRAFICO	PANAMERICAN
1079936122	SANTODOMINGO	DE LA CRUZ	CESAR ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
9153002	VALENCIA	PEREZ	FELIX	OPERADOR DE EXCAVADORA	VIAS Y DRAGADOS
73475172	VIZCAINO	ESCOBAR	ANGEL MARIA	DIRECTOR DE PROYECTOS	PANAMERICAN
1081028028	WILCHES	GONZALEZ	PEDRO MIGUEL	MARINO	CONSORCIO CGSM 4

Ver ANEXO 4.1. Seguridad Social

Ver ANEXO 4.2. Consolidado de personal

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

3.1 INDUCCIONES O REINDUCCIONES.

Durante el periodo reportado se programaron las inducciones relacionadas a continuación.

Tabla 2 Inducciones

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA DE LA INDUCCIÓN
1083572789	GAMEZ	SANTODOMINGO	CARLOS SEGUNDO	INDUCCIÓN	25/11/2025
1079913769	ALVAREZ	MONTENEGRO	CARLOS ANDRES	INDUCCIÓN	25/11/2025
1004412183	GAMEZ	RAMIREZ	BRYAN DAVID	INDUCCIÓN	25/11/2025
1079936122	SANTODOMINGO	DE LA CRUZ	CESAR ALFREDO	INDUCCIÓN	25/11/2025
1079934636	CABALLERO	CHARRIS	JOSE LEONARDO	INDUCCIÓN	25/11/2025
1079914724	MANOTAS	GUTIERREZ	JESUS DAVID	INDUCCIÓN	25/11/2025
1079932676	CERVANTES	MENDEZ	FRAN CARLOS	INDUCCIÓN	

Ver ANEXO 4.3. Inducciones

3.2 CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante este período se programaron las charlas de SST, dirigidas al personal operativo del proyecto, relacionadas a continuación:

Tabla 3. Charlas y capacitaciones SST

PROCESO/PROGRAMA	TIPO DE ACTIVIDAD	TEMA (NOMBRE DE LA CAPACITACION)	FECHA	ASISTENTES
Programa de riesgo acuático	Socializacion	Politica de seguridad acuática	4/11/2025	7
Plan de emergencias	Charla	Procedimiento en caso de inundaciones	5/11/2025	7
PESV	Socializacion	Politica de Seguridad Vial	6/11/2025	8
Programa riesgo cardiovascular	Charla	Riesgo cardiovascular - factores de riesgo	8/11/2025	6
SVE Conservación auditiva	Charla	¿Qué es el ruido? Efectos del ruido. Protección auditiva	11/11/2025	8
Plan de emergencias	Ejercicio practico	Que hacer en caso de inundaciones	12/11/2025	4
Tareas de alto riesgo	Charla	Formas en que las sustancias químicas ingresan	13/11/2025	7

PROCESO/PROGRAMA	TIPO DE ACTIVIDAD	TEMA (NOMBRE DE LA CAPACITACION)	FECHA	ASISTENTES
Cultura de seguridad	Charla	¿Qué tan consciente es usted cuando se trata de seguridad?	17/11/2025	7
Programa de riesgo mecánico	Charla	Protección personal en entornos mecánicos	18/11/2025	8
Plan de emergencias	Charla	Procedimiento en caso de tormenta eléctrica o tormenta tropical	19/11/2025	11
Prevención consumo alcohol y spa	Charla	Consumo de alcohol - efectos	22/11/2025	8
Sustancias químicas	Charla	¿Cómo actuar en situaciones de inhalación, derrames, ingesta y salpicadura de sustancias químicas?	23/11/2025	5
SGI	Socializacion	Politica del SGI	24/11/2025	11
Entorno de trabajo seguro	Charla	¿Por qué es crucial la señalización en la empresa? ¡Conozca 5 razones!	25/11/2025	8

PROCESO/PROGRAMA	TIPO DE ACTIVIDAD	TEMA (NOMBRE DE LA CAPACITACION)	FECHA	ASISTENTES
Plan de emergencias	Ejercicio practico	Que hacer en caso de tormenta tropical o eléctrica	26/11/2025	6
PESV	Charla	El alcohol y la conducción	27/11/2025	18
Programa estilo de vida saludable	Charla	Charla: Nutricion adecuada	29/11/2025	6

Ver ANEXO 4.4. Asistencia a charlas o capacitaciones

Fotografía 1. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2025

Fotografía 2. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2025

Fotografía 3. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2025

Fotografía 4. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2025

Fotografía 5. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2025


3.3 INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

Se realizaron las inspecciones a los elementos de seguridad relacionados a continuación:

Tabla 4. Cronograma de inspecciones

TIPO DE INSPECCION	PROGRAMADA	EJECUTADA
GIM-R-011 Inspección de extintores	1	1
GIM-R-012 Inspección de Kit control derrame	1	1
GIM-R-018 Inspección de elementos de protección personal	1	1
GIM-R-021 Inspección de señalización	2	2
GIM-R-022 Inspección de botiquines	1	1
GIM-R-023 Inspección orden y aseo	1	1
GIM-R-064 Inspección de camilla	1	1

Grafica 1. Cumplimiento programa inspecciones

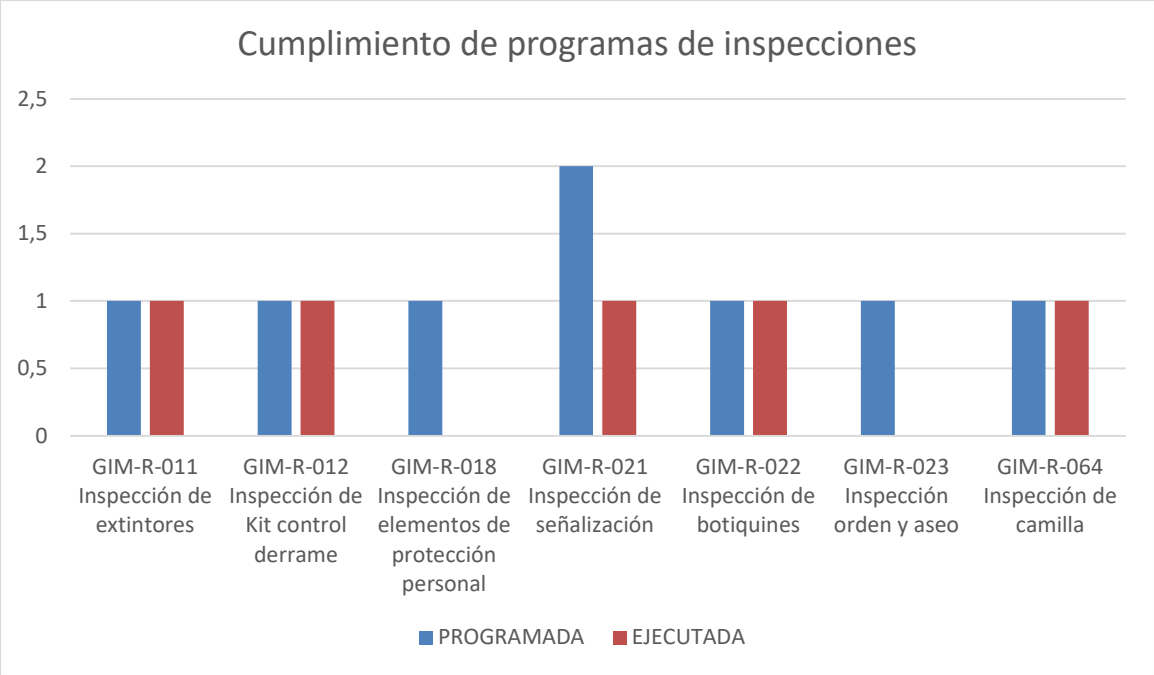

Ver ANEXO 4.5. Programa general de inspecciones 2025

Ver ANEXO 4.6. Registros de inspecciones

3.4 ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP).

Como compromiso con nuestras Políticas HSEQ en la prevención de accidentes se entrega al personal del proyecto los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo seguro de la operación. Se anexan soportes de entrega de los EPP. Ver ANEXO 4.7. Entrega de EPP

Fotografia 6 Entrega de EPP



Fuente: Autores, 2025

Fotografía 7 Entrega de EPP



Fuente: Autores, 2025

Fotografia 8 Entrega de EPP



Fuente: Autores, 2025

Fotografia 9 Entrega de EPP



Fuente: Autores, 2025

Fotografia 7 Entrega de EPP



Fuente: Autores, 2025

Fotografia 8 Entrega de EPP



Fuente: Autores, 2025

3.5 SEÑALIZACIÓN.

En CONSORCIO CGSM 4 se utiliza la señalización como medida correctiva o preventiva en el ambiente laboral, antes que ocurran accidentes o incidentes.

Fotografia 9 Señalización áreas de trabajo



Fuente: Autores, 2025

Fotografia 10 Señalización áreas de trabajo



Fuente: Autores, 2025

Fotografia 11 Señalización áreas de trabajo



Fuente: Autores, 2025

Fotografia 12 Señalización áreas de trabajo



Fuente: Autores, 2025

4. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Con el fin de garantizar un manejo adecuado de sustancias químicas y prevenir derrames y/o fugas se siguen los siguientes lineamientos:

- Todas las sustancias químicas que manipule el personal deben tener las etiquetas, acorde con las disposiciones del Sistema Globalmente Armonizado -SGA.
- Almacenar la sustancia asegurando la conservación y cumpliendo los criterios de compatibilidad de productos.
- Revisar se manera periódica el estado de envases y empaques de manera que se identifiquen puntos por donde pueda haber derrames o fugas.
- Disponer de las fichas de seguridad y seguir las recomendaciones que allí aparecen.
- Se realiza transporte y suministro de combustible para la maquinaria asignada al proyecto por parte de compañías que cuentan con todos sus documentos legales para al fin.
- Para al transporte y suministro de combustible se utilizan los camiones tipo tanque marca CHEVROLET WGV 681, CHEVROLET SZL 039 y HYUNDAI SMG 733. El servicio es prestado por Torcoroma comercializador industrial S.A.S

  Ver ANEXO 4.8. Documentos carrotanque de combustible

Fotografía 13 Toma de combustible



Fuente: Autores, 2025

Fotografía 14 Toma de combustible



Fuente: Autores, 2025

5. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

El proyecto cuenta con un plan de preparación y respuesta ante emergencias cuyo objeto es, proporcionar a los empleados los elementos adecuados que les permitan responder con eficacia en la prevención y atención de una emergencia, para así disminuir las lesiones que se puedan presentar tanto humanas como económicas.

Dentro de este plan, se cuenta con procedimientos de actuación en caso de:

- Evacuación
- Sismo
- Inundaciones
- Tormenta tropical o eléctrica
- Mordedura de serpiente
- Ataque de abejas africanas
- Incendio
- Explosión
- Derrame de sustancias químicas
- Hundimiento
- Colisión de embarcaciones
- Hombre al agua
- Atentado terrorista
- Robo o asalto
- Accidente de transito

Tabla 5. Capacitaciones relacionadas con el plan de emergencia

TIPO DE ACTIVIDAD	TEMA (NOMBRE DE LA CAPACITACION)	SUBTEMA	FECHA	ASISTENTES CGSM 4
Charla	Procedimiento en caso de inundaciones	Que es una inundación Que genera una inundación Que hacer en caso de inundaciones	5-nov-25	7
Ejercicio practico	Que hacer en caso de inundaciones		12-nov-25	4
Charla	Procedimiento en caso de tormenta eléctrica o tormenta tropical	Que es una tormenta eléctrica Que genera una tormenta eléctrica Que hacer en caso de una tormenta eléctrica	19-nov-25	11
Ejercicio practico	Que hacer en caso de tormenta tropical o eléctrica		26-nov-25	6

Ver ANEXO 4.4. Asistencia a charlas o capacitaciones

Ver ANEXO 4.9. Medevac

Ver ANEXO 4.10. Directorio de emergencias

Ver ANEXO 4.11. Guía para la evaluación prácticas de emergencia

Fotografia 15 Equipos de emergencias - Kit control derrame



Fuente: Autores, 2025

Fotografia 16 Equipo de emergencia extintor



Fuente: Autores, 2025

Fotografia 17 Equipo de emergencia Camilla



Fuente: Autores, 2025

6. ORDEN Y ASEO

El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud y la seguridad, es por esto, que de manera periódica se realizan jornadas de orden y aseo en los frentes de obra.

Fotografia 18 Punto ecológico



Fuente: Autores, 2025

7. INCIDENTES Y/O ACCIDENTES LABORALES

Durante el periodo no se presentaron incidentes ni accidentes laborales.

8. EXÁMENES MÉDICOS

En el proyecto se realiza exámenes de ingreso a su personal, con el fin de determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo y de manera periódica con el de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Así mismo, para detectar enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo.

Durante el periodo de reporte no se programaron exámenes médicos, sin embargo, si ingresó a laborar personal qu.

Tabla 6 Conceptos médicos

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	TIPO DE EXAMEN	FECHA DEL EXAMEN
1083572789	GAMEZ	SANTODOMINGO	CARLOS SEGUNDO	INGRESO	18/09/2025
1079913769	ALVAREZ	MONTENEGRO	CARLOS ANDRES	INGRESO	18/09/2025
1004412183	GAMEZ	RAMIREZ	BRYAN DAVID	INGRESO	18/09/2025
1079936122	SANTODOMINGO	DE LA CRUZ	CESAR ALFREDO	INGRESO	18/09/2025
1079934636	CABALLERO	CHARRIS	JOSE LEONARDO	INGRESO	22/09/2025
1079914724	MANOTAS	GUTIERREZ	JESUS DAVID	INGRESO	17/10/2025
1079932676	CERVANTES	MENDEZ	FRAN CARLOS	INGRESO	25/10/2025

9. HIDRATACION

En el proyecto se cuenta con punto de hidratación ubicado en el punto base, con el propósito de proteger la salud y el bienestar de todos nuestros colaboradores, teniendo en cuenta que una buena hidratación es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo ya que previene la fatiga, el agotamiento físico, y reduce el riesgo de deshidratación especialmente en labores que demandan esfuerzo físico y que se desarrollan en ambientes calurosos como es nuestro caso.

Fotografia 19 Punto de hidratación



Fuente: Autores, 2025

ANEXO 4.1.

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782967	1	CONSORCIO CGSM4	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CGSM4	CALLE 54 #76 - 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016552449	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928096695	9494732473	E	2025/11/19	2025/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,975,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CONSORCIO CGSM4 (9 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: INGENIERIA CIVIL RIESGO IV (9 Afiliados)																																
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (9 Afiliados)																																
1	CC	1143119327	BALLESTAS QUINTERO FRANCISCO MIGUEL																			25-14	30	EPS005	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
2	CC	1010080507	BARRERA MARTINEZ CARLOS ALFREDO									X										23030 1	30	EPS041	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
3	CC	1081027709	CAMACHO CANTILLO JOSE GREGORIO												X							23030 1	10	ESSC24	10	CCF07	0	14-7	10	0.000%	0	Si
4	CC	1081027709	CAMACHO CANTILLO JOSE GREGORIO									X										23030 1	20	ESSC24	20	CCF07	20	14-7	20	4.350%	20	Si
5	CC	1004121723	GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO JOSE									X										23030 1	30	ESSC24	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
6	CC	7598807	MAESTRE CHARRIS DANIEL ALBERTO									X										23020 1	30	ESSC24	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
7	CC	1004298507	OROZCO FERREIRA JOHENDRYS									X										23030 1	30	ESSC07	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
8	CC	1082045696	PADILLA FERREIRA JONATAN ALBERTO									X										23020 1	30	ESSC24	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
9	CC	1082046517	POLO NAVARRO YESMITH VANESSA									X										23030 1	14	EPS005	14	CCF07	14	14-7	14	4.350%	14	Si
10	CC	1082046517	POLO NAVARRO YESMITH VANESSA											X								23030 1	16	EPS005	16	CCF07	0	14-7	16	0.000%	0	Si
11	CC	1081028028	WILCHES GONZALEZ PEDRO JOSE									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
Total			**Afiliados(9)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782967	1	CONSORCIO CGSM4	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CGSM4	CALLE 54 #76 - 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016552449	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928096695	9494732473	E	2025/11/19	2025/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,975,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,430,300	$0	$0	$3,430,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$428,000	$0	$0	$428,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,092,300	$0	$0	$2,092,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$910,000	$0	$0	$910,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$879,200	$0	$0	$879,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	9	$879,200	$0	$0	$879,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$808,500	$0	$0	$808,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	9	$808,500	$0	$0	$808,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$857,900	$0	$0	$857,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$435,800	$0	$0	$435,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$81,000	$0	$0	$81,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$84,900	$0	$0	$84,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$87,800	$0	$0	$87,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$168,400	$0	$0	$168,400
TOTAL				**9**	**$5,975,900**	**$0**	**$0**	**$5,975,900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84456544
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CHRISTIAN DARO LOPEZ CLAVIJO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	MZ 18 CASA 8 CISNE	TELÉFONO:	4000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4629514216**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994593164

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 300.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.800	$ 0	$ 300.800
SUBTOTALES:										**$ 300.800**	**$ 0**	**$ 300.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.000	$ 0	$ 0	$ 235.000
SUBTOTALES:													**$ 235.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 235.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 45.800	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 45.800
SUBTOTALES:									**$ 45.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 45.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 84456544	LOPEZ CLAVIJO CHRISTIAN DARIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.880.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.880.000	$ 300.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.880.000	$ 235.000	$ 0	$ 235.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.880.000	84456544	$ 45.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 581.600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890404029	7	HERRERA Y DURAN LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTAGENA	san fernando calle 31 # 81-116	CARTAGENA-BOLIVAR	6618113	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CARTAGENA (46 Afiliados)						**$72,706,809**	**$11,699,900**			**$88,001,552**	**$3,522,400**			**$88,001,552**	**$3,522,400**			**$88,001,552**	**$6,067,100**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: OPERADORES (46 Afiliados)						**$72,706,809**	**$11,699,900**			**$88,001,552**	**$3,522,400**			**$88,001,552**	**$3,522,400**			**$88,001,552**	**$6,067,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (46 Afiliados)						**$72,706,809**	**$11,699,900**			**$88,001,552**	**$3,522,400**			**$88,001,552**	**$3,522,400**			**$88,001,552**	**$6,067,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1104130974	ANGEL JHON	230301	30	$1,590,365	$254,500	EPS037	30	$1,590,365	$63,700	CCF08	30	$1,590,365	$63,700	14-11	30	$1,590,365	$110,700	30	$0	$0
2	CC	3805685	ANGEL ROSELIANO	230301	30	$1,739,875	$278,400	EPS010	30	$1,739,875	$69,600	CCF08	30	$1,739,875	$69,600	14-11	30	$1,739,875	$121,100	30	$0	$0
3	CC	1143355159	ARDILA JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	5031425	BULLOSO GUILLERMO	25-14	30	$1,913,604	$306,200	EPS002	30	$1,913,604	$76,600	CCF08	30	$1,913,604	$76,600	14-11	30	$1,913,604	$133,200	30	$0	$0
5	CC	73102178	CABRERA HUGO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	73137705	CONDE FREDYS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	73229984	CONTRERAS MAIRO	231001	30	$2,152,563	$344,500	EPS048	30	$2,152,563	$86,200	CCF08	30	$2,152,563	$86,200	14-11	30	$2,152,563	$149,900	30	$0	$0
8	CC	73124680	CONTRERAS RAUL	25-14	30	$1,443,400	$231,000	EPS037	30	$1,443,400	$57,800	CCF08	30	$1,443,400	$57,800	14-11	30	$1,443,400	$100,500	30	$0	$0
9	CC	7617685	DAU JAIME	230201	30	$2,221,253	$355,500	EPS002	30	$2,221,253	$88,900	CCF08	30	$2,221,253	$88,900	14-11	30	$2,221,253	$154,600	30	$0	$0
10	CC	7616611	DAU WILLIAM	25-14	30	$2,124,000	$339,900	EPS002	30	$2,124,000	$85,000	CCF08	30	$2,124,000	$85,000	14-11	30	$2,124,000	$147,900	30	$0	$0
11	CC	73138698	DIAZ OSCAR	25-14	30	$2,313,375	$370,200	EPS010	30	$2,313,375	$92,600	CCF08	30	$2,313,375	$92,600	14-11	30	$2,313,375	$161,100	30	$0	$0
12	CC	1065627542	DOMINGUEZ CAMILO	231001	30	$1,918,166	$307,000	ESSC62	30	$1,918,166	$76,800	CCF08	30	$1,918,166	$76,800	14-11	30	$1,918,166	$133,600	30	$0	$0
13	CC	73210960	DORIA DIEGO	230301	30	$2,221,253	$355,500	EPS002	30	$2,221,253	$88,900	CCF08	30	$2,221,253	$88,900	14-11	30	$2,221,253	$154,600	30	$0	$0
14	CC	9298092	DUARTE FORTUNATO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC	45495329	DURAN ANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	32718692	DURAN HENNY		0	$0	$0	EPS010	30	$1,615,000	$64,600	CCF08	30	$1,615,000	$64,600	14-11	30	$1,615,000	$112,500	30	$0	$0
17	CC	5538569	DURAN RAMON		0	$0	$0	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
18	CC	7883358	FERNANDEZ PEDRO		0	$0	$0	EPS037	30	$2,176,218	$87,100	CCF08	30	$2,176,218	$87,100	14-11	30	$2,176,218	$151,500	30	$0	$0
19	CC	73090079	GODOY ALEJANDRO	25-14	24	$2,329,600	$372,800	MIN002	24	$2,329,600	$93,200	CCF08	24	$2,329,600	$93,200	14-11	24	$2,329,600	$162,200	24	$0	$0
20	CC	73085282	GONZALEZ CARLOS		0	$0	$0	EPS037	30	$2,444,156	$97,800	CCF08	30	$2,444,156	$97,800	14-11	30	$2,444,156	$170,200	30	$0	$0
21	CC	73105840	GONZALEZ GUSTAVO		0	$0	$0	EPS002	30	$1,955,869	$78,300	CCF08	30	$1,955,869	$78,300	14-11	30	$1,955,869	$136,200	30	$0	$0
22	CC	84005519	GUERRA LUIS	230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS037	30	$1,550,000	$62,000	CCF08	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
23	CC	1049348332	GUERRA OSVALDO	230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS037	30	$1,550,000	$62,000	CCF08	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
24	CC	1050954984	GUZMAN JHON	230301	30	$2,223,028	$355,700	EPS002	30	$2,223,028	$89,000	CCF08	30	$2,223,028	$89,000	14-11	30	$2,223,028	$154,800	30	$0	$0
25	CC	78029874	GUZMAN ROBERTO	25-14	30	$1,723,729	$275,800	EPS048	30	$1,723,729	$69,000	CCF08	30	$1,723,729	$69,000	14-11	30	$1,723,729	$120,000	30	$0	$0
26	CC	45767781	HERRERA BERENA	25-14	30	$6,463,100	$1,098,900	EPS010	30	$6,463,100	$258,600	CCF08	30	$6,463,100	$258,600	14-11	30	$6,463,100	$449,900	30	$0	$0
27	CC	73161972	HERRERA GERMAN	25-14	30	$3,853,300	$616,600	EPS010	30	$3,853,300	$154,200	CCF08	30	$3,853,300	$154,200	14-11	30	$3,853,300	$268,200	30	$0	$0
28	CC	9066583	HERRERA JOSE		0	$0	$0	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
29	CC	3817981	HERRERA RAMON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
30	CC	33199184	JIMENEZ MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
31	CC	3814237	JINETE DAMIEN	230201	30	$1,722,600	$275,700	EPS010	30	$1,722,600	$69,000	CCF08	30	$1,722,600	$69,000	14-11	30	$1,722,600	$119,900	30	$0	$0
32	CC	73290416	JOLY PEDRO	25-14	30	$1,820,301	$291,300	EPS002	30	$1,820,301	$72,900	CCF08	30	$1,820,301	$72,900	14-11	30	$1,820,301	$126,700	30	$0	$0
33	CC	73114978	LOPEZ GIL		0	$0	$0	EPS005	30	$1,680,000	$67,200	CCF08	30	$1,680,000	$67,200	14-11	30	$1,680,000	$117,000	30	$0	$0
34	CC	9289611	MARSIGLIA HECTOR	231001	9	$427,050	$68,400	EPS048	9	$427,050	$17,100	CCF08	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$0	9	$0	$0
35	CC	9289611	MARSIGLIA HECTOR	231001	21	$996,450	$159,500	EPS048	21	$996,450	$39,900	CCF08	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
36	CC	73129552	MEZA PABLO	230301	30	$1,788,312	$286,200	EPS002	30	$1,788,312	$71,600	CCF08	30	$1,788,312	$71,600	14-11	30	$1,788,312	$124,500	30	$0	$0
37	CC	73200584	MONDOL KARIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
38	CC	71982271	QUICENO WIDMER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
39	CC	45498844	RICO LILIANA	230201	30	$1,988,800	$318,300	EPS037	30	$1,988,800	$79,600	CCF08	30	$1,988,800	$79,600	14-11	30	$1,988,800	$138,500	30	$0	$0
40	CC	1128055853	RODRIGUEZ WILFRIDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
41	CC	8371995	SUAREZ LEONARDO	25-14	30	$1,695,313	$271,300	EPS002	30	$1,695,313	$67,900	CCF08	30	$1,695,313	$67,900	14-11	30	$1,695,313	$118,000	30	$0	$0
42	CC	7957911	TRIANA JULIO	230301	30	$1,630,729	$261,000	EPS002	30	$1,630,729	$65,300	CCF08	30	$1,630,729	$65,300	14-11	30	$1,630,729	$113,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
43	CC	1050956102	VASQUEZ JESUS	230201	30	$1,550,000	$248,000	EPS002	30	$1,550,000	$62,000	CCF08	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
44	CC	9285834	VASQUEZ MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
45	CC	12567186	VERA TOMAS	230301	30	$2,418,977	$387,100	ESSC62	30	$2,418,977	$96,800	CCF08	30	$2,418,977	$96,800	14-11	30	$2,418,977	$168,400	30	$0	$0
46	CC	73593905	VERGARA MARIO	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF08	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$0	9	$0	$0
47	CC	73593905	VERGARA MARIO	25-14	21	$996,450	$159,500	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF08	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
48	CC	73475323	VILLA PAULO	230201	30	$1,679,166	$268,700	EPS048	30	$1,679,166	$67,200	CCF08	30	$1,679,166	$67,200	14-11	30	$1,679,166	$116,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(46)**			**$72,706,809**	**$11,699,900**			**$88,001,552**	**$3,522,400**			**$88,001,552**	**$3,522,400**			**$88,001,552**	**$6,067,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921622036	9494614213	E	2025/11/11	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	$24,811,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$11,699,900	$0	$0	$11,699,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$879,400	$0	$0	$879,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$4,401,900	$0	$0	$4,401,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,585,600	$0	$0	$3,585,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,833,000	$0	$0	$2,833,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$6,067,100	$0	$0	$6,067,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	46	$6,067,100	$0	$0	$6,067,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$3,522,400	$0	$0	$3,522,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	46	$3,522,400	$0	$0	$3,522,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				46	$3,522,400	$0	$0	$3,522,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$173,600	$0	$0	$173,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$279,400	$0	$0	$279,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$1,039,600	$0	$0	$1,039,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$93,200	$0	$0	$93,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$567,000	$0	$0	$567,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,188,400	$0	$0	$1,188,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$181,200	$0	$0	$181,200
TOTAL				**46**	**$24,811,800**	**$0**	**$0**	**$24,811,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782967	1	CONSORCIO CGSM4	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CGSM4	CALLE 54 #76 - 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016552449	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1928128747	9494732911	Y	2025/11/19	2025/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$467,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CONSORCIO CGSM4 (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: INGENIERIA CIVIL RIESGO IV (1 Afiliados)																														
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																														
1	CC	1085224296	MARTINEZ JIMENEZ MARIA AUXILIADORA																	230301	30	ESSC24	30		0	14-7	30	4.350%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782967	1	CONSORCIO CGSM4	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CGSM4	CALLE 54 #76 - 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016552449	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1928128747	9494732911	Y	2025/11/19	2025/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$467,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,000	$0	$0	$62,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$62,000	$0	$0	$62,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$467,800	$0	$0	$467,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806003450	9	PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 76 No 54-11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3859150	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928045726	9494595002	E	2025/11/14	2025/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$77,983,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BARRANQUILLA (77 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (63 Afiliados)																																
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)																																
1	CC	63472480	ARTEAGA LOPEZ LUZ STELLA																			23030 1	30	EPS002	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
2	CC	91432427	BADILLO DE LA CRUZ HECTOR JULIO									X										25-14	30	EPS005	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
3	CC	1096233735	GARCIA SIERRA MAIRA JULIANA									X										23030 1	29	EPS002	29	CCF38	29	14-7	29	4.350%	29	Si
4	CC	13567645	GOMEZ BELEÑO GUILLERMO									X										25-14	21	EPS037	21	CCF38	21	14-7	21	4.350%	21	Si
5	CC	1050920160	GUERRERO PEINADO ARCADIO JESUS									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
6	CC	1096185809	LEON DITTA LILIANA																			23030 1	30	EPS005	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
7	CC	91432989	MANTILLA JORGE ENRIQUE									X										25-14	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
8	CC	91444860	MONCADA MONTOYA HUMBERTO									X										25-14	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
9	CC	71985790	PALACIOS MORENO LUIS OVIDIO									X										23100 1	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
10	CC	1096238842	PEREZ QUIROZ BRENDA VICTORIA																			23030 1	29	EPS017	29	CCF38	29	14-7	29	4.350%	29	Si
11	CC	3804458	SEQUEDA RODELO EDUARDO JOSE									X										25-14	16	ESSC24	16	CCF38	16	14-7	16	4.350%	16	Si
12	CC	91434416	VITOLA MARMOL JAVIER ALFONSO									X										25-14	27	EPS037	27	CCF38	27	14-7	27	4.350%	27	Si
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (47 Afiliados)																																
13	CC	1129578658	ACEVEDO COLON YURANI ANDREA																			23030 1	30	EPS005	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
14	CC	9126669	ACOSTA ESTRADA VICTOR MANUEL																				0	ESSC24	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
15	CC	73578230	BADILLO CAÑAS ALEX									X										25-14	30	EPS048	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
16	CC	73268545	BECERRA HERAZO ADRIANO SEGUNDO									X										25-14	30	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
17	CC	1128049263	BENITEZ MADRID JORGE ANDRES																			23030 1	30	EPS010	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
18	CC	72193392	BUELVAS GARCIA LUIS CARLOS									X										25-14	30	EPS002	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
19	CC	9100837	CABALLERO SALCEDO JAVIER ENRIQUE																			23020 1	29	EPS002	29	CCF07	29	14-7	29	4.350%	29	Si
20	CC	1045726109	CAMPOS SAMPER MARIA CLAUDIA																			23020 1	25	EPS010	25	CCF07	25	14-7	25	4.350%	25	Si
21	CC	1140825968	COLINA MERCADO JEIBER ANDRES																			23030 1	30	EPS005	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
22	CC	1143134321	DEL RIO CORONELL MAYRA ALEJANDRA																			23030 1	30	EPS010	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
23	CC	8853600	ESPINOSA HERRERA JAVIER ENRIQUE																			23020 1	30	EPS041	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
24	CC	8860886	GIL ORTEGA CRISTIAN DAVID																			25-14	27	EPS037	27	CCF07	27	14-7	27	4.350%	27	Si
25	CC	18762528	GOMEZ ARRIETA ANIBAL JOSE																			23030 1	26	EPS002	26	CCF07	26	14-7	26	4.350%	26	Si

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806003450	9	PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 76 No 54-11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3859150	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928045726	9494595002	E	2025/11/14	2025/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$77,983,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				73	$43,874,200	$0	$0	$43,874,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,521,300	$0	$0	$1,521,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$24,302,900	$0	$0	$24,302,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$13,341,900	$0	$0	$13,341,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$3,688,100	$0	$0	$3,688,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,020,000	$0	$0	$1,020,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				77	$11,045,300	$0	$0	$11,045,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	77	$11,045,300	$0	$0	$11,045,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				77	$11,632,600	$0	$0	$11,632,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	13	$1,906,300	$0	$0	$1,906,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	61	$9,513,600	$0	$0	$9,513,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$212,700	$0	$0	$212,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				77	$11,431,100	$0	$0	$11,431,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$722,300	$0	$0	$722,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$225,900	$0	$0	$225,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	$529,300	$0	$0	$529,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	$3,413,000	$0	$0	$3,413,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$112,800	$0	$0	$112,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$91,400	$0	$0	$91,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$1,545,800	$0	$0	$1,545,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$411,500	$0	$0	$411,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$2,177,200	$0	$0	$2,177,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$2,201,900	$0	$0	$2,201,900
TOTAL				**77**	**$77,983,200**	**$0**	**$0**	**$77,983,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901006746	1	VIAS Y DRAGADOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CALLE 76 NO. 54-11 OFICINA 712	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3692364	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2000173380	9496290654	E	2025/12/11	2025/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$150,345,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BARRANQUILLA (106 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4N (106 Afiliados)																														
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (106 Afiliados)																														
1	CC	1082400246	ACOSTA FERNANDEZ HENCER ARIS									X								230301	30	CCFC55	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
2	CC	72205126	ACOSTA PAGUANA JORGE LUIS									X								25-14	18	EPS048	18	CCF07	18	14-7	18	4.350%	18	Si
3	CC	72205126	ACOSTA PAGUANA JORGE LUIS												L					25-14	12	EPS048	12	CCF07	12	14-7	12	0.000%	12	Si
4	CC	8534368	ACOSTA LONDOÑO JORGE ELIECER									X								25-14	30	ESSC07	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
5	CC	1002130464	ACOSTA ROMAN NELDA ROSA									X								230301	30	ESSC24	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
6	CC	1045745427	AFANADOR ORTIZ ALEXANDER									X								230301	30	ESSC07	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
7	CC	8506555	AFANADOR SUAREZ JHON JAIRO									X								230301	30	EPS010	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
8	PT	5523165	AGAMEZ ARMANDO JOSE									X								230301	29	ESSC07	29	CCF07	29	14-7	29	4.350%	29	Si
9	PT	5523165	AGAMEZ ARMANDO JOSE											X						230301	1	ESSC07	1	CCF07	1	14-7	1	0.000%	1	Si
10	CC	1051356818	ALVAREZ ESCAMILLA VICTOR ALFONSO									X								230301	30	EPS048	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
11	CC	9098877	AYALA LIDUEÑA JHON JAIRO									X								230301	30	EPS002	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
12	CC	1081028843	BARRIOS TORRES JORGE EDUARDO																	230301	30	ESSC24	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
13	CC	1001869044	CABALLERO CASTELLANO CESAR CAMILO																	25-14	30	EPS010	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
14	CC	1080012753	CANDAMA CANTILLO EDIW RAFAEL									X								25-14	30	EPS002	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
15	CC	9307051	CARO PAREDES ALFREDO MANUEL									X									0	EPS037	27	CCF07	27	14-7	27	4.350%	27	Si
16	CC	9307051	CARO PAREDES ALFREDO MANUEL											X							0	EPS037	3	CCF07	3	14-7	3	0.000%	3	Si
17	CC	9079381	CARRANZA VERGARA TOMAS DE AQUINO									X									0	EPS010	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
18	CC	3911630	CARVAJAL MACHUCA REMBERTO											X							0	ESSC07	4	CCF07	4	14-7	4	0.000%	4	Si
19	CC	3911630	CARVAJAL MACHUCA REMBERTO												L						0	ESSC07	13	CCF07	13	14-7	13	0.000%	13	Si
20	CC	3911630	CARVAJAL MACHUCA REMBERTO									X									0	ESSC07	13	CCF07	13	14-7	13	4.350%	13	Si
21	CC	8660408	CASTRO DE LA HOZ CARLOS									X									0	EPS002	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
22	CC	8568984	CASTRO THOMA JESUS ANTONIO									X								230301	30	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
23	CC	1128164402	CASTRO MOYA JOSE FRANCISCO									X								230301	30	ESSC24	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si

24	CC	1001942153	CASTRO GOMEZ SHERLYN ECLECH	X								X								230301	20	EPS005	20	CCF07	20	14-7	20	4.350%	20	Si
25	CC	73142391	CAYCEDO MEZA JULIO									X								25-14	12	EPS002	12	CCF07	12	14-7	12	4.350%	12	Si
26	CC	73142391	CAYCEDO MEZA JULIO												X					25-14	18	EPS002	18	CCF07	18	14-7	18	0.000%	18	Si
27	CC	1042417475	CERRA MARTINEZ DANILO MANUEL									X								230301	30	EPS002	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
28	CC	1079932676	CERVANTES MENDEZ FRAN CARLOS	X								X								230301	26	ESSC07	26	CCF07	26	14-7	26	4.350%	26	Si
29	CC	1080429405	DE LA CRUZ MANJARRES ANDERSON DANIEL									X								230301	30	CCFC55	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
30	CC	1043131899	DIAZ DE HORTA JOHAN ANTONIO									X								230301	30	CCFC55	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
31	CC	73559089	ELLES ALVAREZ IDI AMIN									X								230301	30	EPS002	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
32	CC	1152942929	ESPITIA SOTO ENOC JUSSEPE									X								230301	30	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
33	CC	72431258	FERRER ESCORCIA RUDIS ENRIQUE									X								230301	30	EPS042	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
34	CC	72193092	FLORES VARGAS OSCAR ANDRES									X								230301	30	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
35	CC	1108767049	FUENTES ACOSTA LINA MARIA																	230301	30	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
36	CC	1080021674	GONZALEZ ACOSTA ALDAIR ALFONSO									X								230301	30	ESSC24	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
37	CC	1042449166	GONZALEZ BARROS DANILO ENRIQUE									X								230201	30	EPS017	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
38	CC	1124505407	GUARIN MERIÑO JOEL ENRIQUE									X								230301	30	EPS010	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
39	CC	1001893028	GUTIERREZ BADILLO JUAN CAMILO									X								230301	30	ESSC07	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
40	CC	72432371	GUZMAN BORNACHERA YEISON KIN									X								230301	30	EPS002	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
41	CC	1129524909	HOYOS TAPIA GERMAN ANDRES									X								230201	30	EPS002	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
42	CC	1084738073	IBAÑEZ OSPINO ALFONSO ENRIQUE									X								25-14	30	EPS002	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
43	CC	1051362191	IBARRA ORTIZ IVO LUIS	X								X								230301	14	EPS037	14	CCF07	14	14-7	14	4.350%	14	Si
44	CC	73267800	JIMENEZ DE LA HOZ CARLOS ARTURO									X								25-14	30	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
45	CC	73265644	JIMENEZ DE LA HOZ NARCISO									X								25-14	30	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
46	CC	1051359454	JIMENEZ ESCAMILLA YEISON EDUARDO									X								230301	30	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
47	CC	9140277	LOBO CERPA EMILIO JOSE									X								25-14	30	CCFC55	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
48	CC	72188198	LOPEZ LIMAS JORGE OSWALDO											X						230201	30	EPS010	30	CCF07	30	14-7	30	0.000%	30	Si
49	CC	50903236	MARTINEZ ARGUMEDO ENAUDIT																	25-14	30	EPS002	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
50	CC	73268094	MARTINEZ OROZCO HUMBERTO ENRIQUE											X						230301	23	EPS048	23	CCF07	23	14-7	23	0.000%	23	Si
51	CC	73268094	MARTINEZ OROZCO HUMBERTO ENRIQUE																	230301	7	EPS048	7	CCF07	7	14-7	7	4.350%	7	Si
52	CC	1051359115	MARTINEZ CASTRO SERGIO LUIS									X								230301	30	EPS041	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
53	CC	73267415	MEDRANO OROZCO ALFREDO JOSE	X								X								231001	27	ESSC07	27	CCF07	27	14-7	27	4.350%	27	Si
54	CC	1002409867	MEDRANO TAPIA LEONARDO FABIO									X								25-14	30	ESSC07	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
55	CC	1079913666	MERCADO LOBATO CARLOS JOSE									X								25-14	30	ESSC24	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
56	CC	1045722187	MERCADO MARTINEZ ERICK									X								230301	30	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BARRANCABERMEJA (69 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: IV (69 Afiliados)																														
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (69 Afiliados)																														
123	CC	28069941	AGUDELO PITALUA NORALBA									X									25-14	26	EPS002	26	CCF38	26	14-7	26	4.350%	26	Si
124	CC	28069941	AGUDELO PITALUA NORALBA												L						25-14	2	EPS002	2	CCF38	2	14-7	2	0.000%	2	Si
125	CC	28069941	AGUDELO PITALUA NORALBA												L						25-14	2	EPS002	2	CCF38	2	14-7	2	0.000%	2	Si
126	CC	1096222814	AGUDELO LONDOÑO YOSI ESTEBAN									X									230301	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
127	CC	1002387254	AGUILERA CABRERA JHON ALEXANDER									X									230301	30	ESSC07	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
128	CC	1005220318	ALDANA PACHECO RUBEN DAVID									X									230301	30	EPS005	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
129	CC	1072961353	BERNAL CASTIBLANCO JHON EDISON									X									230301	30	EPS041	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
130	CC	13571506	CAMPOS ESCOBAR GUMERSINDO									X									230201	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
131	CC	1062876414	CAÑAS OTALVAREZ ENSO RENE												X						230201	2	EPS041	2	CCF38	2	14-7	2	0.000%	2	Si
132	CC	1062876414	CAÑAS OTALVAREZ ENSO RENE									X									230201	28	EPS041	28	CCF38	28	14-7	28	4.350%	28	Si
133	CC	91156735	CANTERO ZUÑIGA EDRIN									X									231001	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
134	CC	1062878929	CAROS PURIN JESUS DANIEL									X									230301	30	EPS041	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
135	CC	1018422806	CARREÑO JIMENEZ LUIS EDUARDO																		230301	30	EPS005	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
136	CC	1045487460	CASTRILLON MORALES JOSE MAURICIO									X									230301	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
137	CC	13569416	CELIS JIMENEZ FABIAN DE JESUS									X									230301	26	EPS041	26	CCF38	26	14-7	26	4.350%	26	Si
138	CC	13569416	CELIS JIMENEZ FABIAN DE JESUS																X		230301	4	EPS041	4	CCF38	4	14-7	4	0.000%	4	Si
139	CC	72338657	CERVANTES NIETO ALEXANDER RAFAEL									X									25-14	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
140	CC	1096215181	COLLANTE ALARCON JHON SNEIDER																		25-14	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
141	CC	1062876030	CONDE MAHECHA YADER EDUARDO									X									231001	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
142	CC	10931436	CONTRERAS GUERRERO CARLOS ALBERTO									X									230301	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
143	CC	1731859	CONTRERAS PACHECO GEOVANNI												X						230301	11	EPS041	11	CCF38	11	14-7	11	0.000%	11	Si
144	CC	1731859	CONTRERAS PACHECO GEOVANNI												L						230301	19	EPS041	19	CCF38	19	14-7	19	0.000%	19	Si
145	CC	1001815045	CRESPO CARBALLIDO DUVAN ANDRES									X									230301	27	EPS037	27	CCF38	27	14-7	27	4.350%	27	Si
146	CC	1001815045	CRESPO CARBALLIDO DUVAN ANDRES										X								230301	3	EPS037	3	CCF38	3	14-7	3	0.000%	3	Si
147	CC	5594227	CRESPO MANTILLA JHOVANY									X									230301	30	EPS005	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
148	CC	1042212785	CRESPO CARVALLIDO OMAR YESID									X									230201	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
149	CC	80205109	DIAZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO											X							230301	7	EPS017	7	CCF38	7	14-7	7	0.000%	7	Si
150	CC	80205109	DIAZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO									X									230301	23	EPS017	23	CCF38	23	14-7	23	4.350%	23	Si
151	CC	4011423	ESPAÑA NAVARRO WILFREDO JOSE									X									231001	30	EPS037	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si
152	CC	1052973523	GARCIA MORALES CESAR AUGUSTO									X									230301	30	EPS017	30	CCF38	30	14-7	30	4.350%	30	Si

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				166	$83,398,400	$0	$0	$83,398,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$3,776,800	$0	$0	$3,776,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	37	$22,017,400	$0	$0	$22,017,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	104	$49,418,100	$0	$0	$49,418,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$8,186,100	$0	$0	$8,186,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				175	$23,217,200	$0	$0	$23,217,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	175	$23,217,200	$0	$0	$23,217,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				175	$21,728,200	$0	$0	$21,728,200
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	69	$8,634,400	$0	$0	$8,634,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	106	$13,093,800	$0	$0	$13,093,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				175	$22,001,600	$0	$0	$22,001,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	8	$1,007,800	$0	$0	$1,007,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$116,300	$0	$0	$116,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	$1,478,300	$0	$0	$1,478,300
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$723,400	$0	$0	$723,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$1,782,900	$0	$0	$1,782,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$611,100	$0	$0	$611,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$162,900	$0	$0	$162,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	18	$2,134,000	$0	$0	$2,134,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	59	$7,739,600	$0	$0	$7,739,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	16	$2,049,100	$0	$0	$2,049,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	$2,825,700	$0	$0	$2,825,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$1,300,400	$0	$0	$1,300,400
TOTAL				**175**	**$150,345,400**	**$0**	**$0**	**$150,345,400**

ANEXO 4.2.

CONSOLIDADO DE PERSONAL

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CARGO	FUNCIONES	EMPRESA	ARL	EPS	AFP	TIPO DE SANGRE	ALERGICO (SI/NO)	¿A QUE ES ALERGICO?
1129578658	ACEVEDO	COLON	YURANI ANDREA	INGENIERA AMBIENTAL SENIOR	Liderar, programar y ejecutar actividades para dar cumplimiento a los programas ambientales establecidos SGI .	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	PORVENIR	B+	SI	AINES
1081905903	ALMENDRALES	MEDINA	RICHARD DE JESUS	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	PHD	SURA	SURA		O+		
1004213282	ALVAREZ	MANGA	KEVIN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO	SURA				NO	
1079913769	ALVAREZ	MONTENEGRO	CARLOS ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	PROTECCION		NO	
1143119327	BALLESTAS	QUINTERO	FRANCISCO	VETERINARIO	Programa de control fauna y actividades socio ambientales con la comunidad	CONSORCIO CGSM 4	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	O+	NO	
1010080507	BARRERA	MARTINEZ	CARLOS	MARINO	Apoyo en actividades del proyecto	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	B+		
5078310	BONET	ACUÑA	ADOLFO RAFAEL	CAPATAZ	Ejecutar las actividades asignadas, como apoyo a los procesos	RUBEN FRANCO	SURA				NO	
1079934636	CABALLERO	CHARRIS	JOSE LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	PORVENIR		NO	
1081027709	CAMACHO	CANTILLO	JOSE GREGORIO	MARINO	Apoyo en actividades del proyecto	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	CAJA COPI	PORVENIR	O+		
5095498	CANTILLO	CARRILLO	EDUARDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA				NO	
1079916394	CANTILLO	PACHECHO	EDULFO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO	SURA				NO	
85479893	CANTILLO	BOLAÑO	ORLANDO RAFAEL	MAESTRO DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO	SURA				NO	
5082536	CASTAÑEDA	RETAMOZO	AROLDO RAFAEL	AYUDANTE	Apoyo en actividades manteniemiento de siembra	ANAVRIN	SURA	NUEVA EPS	COLPENSIONES		NO	
1079932676	CERVANTES	MENDEZ	FRAN CARLOS	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	MUTUAL SER	PORVENIR		NO	
5078785	CHARRIS	BOLAÑO	TEOVALDO ENRIQUE	AYUDANTE	Apoyo en actividades manteniemiento de siembra	ANAVRIN	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR		NO	
1108767049	FUENTES	ACOSTA	LINA MARIA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	Planificar, desarollar y evaluar actividades sociales del proyecto	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	A+	SI	AINES
1083572789	GAMEZ	SANTODOMINGO	CARLOS SEGUNDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	PORVENIR		NO	
1004121723	GOMEZ	ESCORCIA	SINIBALDO JOSE	MARINO	Apoyo en actividades del proyecto	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	O+		
10044121831	GOMEZ	RAMIREZ	BRYAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA		CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR	O+	NO	
1010150262	GONZALEZ	VERGARA	ADRIANA CRISTINA	PROFESIONAL EN SST	Realizar actividades encaminadas , al desarrollo y mantenimiento del SGI	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SURA	PORVENIR	B+	SI	AINES Y ALISCOS
1082046890	GUETE	OJEDA	JOSE ANGEL	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA				NO	
1042348012	HERRERA	VILLAMIL	LUIS EDUARDO	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	ROYS CORCIO INGENIERIA	SURA	SURA	PROTECCION	O+	NO	
5078492	HERRERA	CABARCAS	ARTURO RAFAEL	OFICIAL	Ejecutar las actividades asignadas, como apoyo a los procesos	MANUEL HERNANDEZ	SURA				NO	
1084738073	IBAÑEZ	OSPINO	ALFONSO ENRIQUE	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL		O+		

ANEXO 4.3.

INDUCCIONES O REINDUCCIONES

B&P	REGISTRO DE INDUCCIÓN	Código: GH-R-025 Versión: 2 Fecha: 19-06-2025

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Brayan David Gomez Ramirez **IDENTIFICACION:** 1004121831

CARGO: Ayudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo	T.P Gestión H	25/11/2025	15 Min	Stephanie Palacio M	Stephanie Palacio
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales	Tp. Gestión Humana.	25/11/2025	30 Min	Stephanie Palacio M.	Stephanie Palacio
Reglamento Interno de Trabajo	T.P. Gestión H.	25/11/2025	25 Min	Stephanie Palacio M	Stephanie Palacio
Manual de Convivencia Laboral	TP Gestión A.	25/11/2015	15 Min	Stephanie Palacio M	Stephanie Palacio
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	Profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gomez urrea	Adriana Gv
Procedimientos en caso de emergencia	profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gomez urrea	Adriana Gv
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gomez urrea	Adriana Gv
Programas ambientales – responsabilidad ambiental	Ing Ambiental	25-11-2025	20 Min	Daniela Patiño Ruiz	Daniela Patiño Ruiz
Gestión Social	Lider Gestión Social	25-11-25	20 minutos	Dayana Pinto	
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI	N/A				
Inducción al puesto de trabajo					
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: Brayan Gomez **FECHA:** 25/11/25

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO**	**Código: GH-R-019** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Brayan David Gamez Ramirez identificado con CC 1004121831 de Dibulla Magdalena, trabajador del CONSORCIO CGSM 4, certifico que conozco las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la autorizo consciente y voluntariamente para que reciba, almacene, analice y procese información sobre mi estado de salud que sirva como base para mantener actualizado los programas de prevención de accidente de trabajo, enfermedades laborales, sistema de vigilancia epidemiológica, perfil sociodemográfico, estadísticas de ausentismo, accidentabilidad para la respectiva gestión de los riesgos y lo que la organización considere pertinente, para tal fin.

Este consentimiento es válido siempre que la información sea manejada tal como lo establece la legislación Colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente me comprometo a facilitar la información y participar activamente en las actividades propias en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al firmar este consentimiento reconozco que he leído, entendido y comprendido perfectamente su contenido. Se me ha dado la oportunidad de formular preguntas las cuales han sido contestadas aclaradas en forma satisfactoria.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25-11-25

Firma del Trabajador: Brayan Gamez

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL**	**Código: GH-R-008** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Brayan David Gomez Ramos identificado con CC 1004171831 de Pivijay magdalena, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiablidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25-11-25

Firma del Trabajador: Brayan Gomez

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

Brayan Gomez
FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Brayan David Gomez Ramos

FECHA: 25-11-25

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN	Código: GH-R-006 Fecha: 01-07-2025 Versión: 2

Nombre y Apellidos: Brayan David Gomez Ramos

Cedula: 1004121831

Cargo: Ayudante de obra

Fecha: 25-11-25

1. ¿A qué se dedica el CONSORCIO CGSM 4?

X

a. Servicio de dragado hidráulico y mecánico, obras marítimas y fluviales, transporte fluvial, planeación y control de proyectos de ingeniería civil en el área de movimientos de tierra.



b. Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras.



c. Desarrollar, producir y comercializar productos de evolución constante que brinden calidad y rentabilidad; creando un alto valor notado para accionistas, proveedores y clientes.



d. Ninguna de las anteriores.

2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, mencione el propósito del cargo para el cual fue contratado. Realizar tareas de apoyo a la Operación

3. ¿Qué formatos tiene que diligenciar usted desde el desempeño de su labor?

Asistencia a charlas
entrega de EPP

4. De acuerdo con la inducción, mencione los peligros a los cuales usted está expuesto mientras realiza su trabajo.

Virus, Picaduras de animales temperaturas extremas

5. Elija 2 responsabilidades que usted tiene desde su cargo en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo.



Uso de epp X



Analizar los riesgos



Asistir a capacitaciones y charlas X



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo

6. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo identifique que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.





b. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes.



d. Todas las anteriores.

7. ¿Qué políticas posee la empresa?

a. Calidad - No Alcohol, No drogas y No fumadores – HSE
b. HSEQ (Calidad – Seguridad, Salud en el trabajo – Medio Ambiente), Política Seguridad acuática, Política de No alcohol no drogas, Política de Seguridad Vial.
c. Orden y Aseo – HSE – Uso de EPP
d. HSE
e. Ninguna

8. ¿De qué trata la política de alcohol y no drogas?

a. Que se puede consumir alcohol o drogas siempre y cuando no sea en el lugar de trabajo.
b. No se le permitirá a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
c. Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo siempre y cuando no altere el orden y rendimiento en la ejecución de mi labor.
d. Todas las anteriores.

9. ¿La Política de Seguridad Acuática está dirigida a que personas?

a. Los trabajadores
b. Contratistas
c. Los trabajadores y contratistas
d. Todos los trabajadores, contratistas y visitantes.

10. ¿Qué practicas están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial?

a. El uso de celulares durante la conducción.



b. Consumir o estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas cuando se conduce o de pasajero en vehículos al servicio de la empresa.



c. Transportar personal ajeno a la organización sin previa autorización.



d. No Colocarse el cinturón de seguridad.




e. Todas las anteriores

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.



Uniforme completo



Botas



Casco



Gafas



Chaleco salvavidas



Guantes



Protección auditiva



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. ¿Cuáles programas están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa?

a. Riesgo cardiovascular, Salud Publica, Mecánico, Acuático, Conservación Auditiva, Conservación Osteomuscular

b. Caída al mismo nivel, caída desde alturas y Resbalones



c. Ninguna de las anteriores

13. Unir con una línea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



Acto Inseguro



Condición Insegura

14. ¿Cuál es la función principal del COPASST?

a. Registrar los accidentes de trabajo.





b. Evaluar el desempeño de los empleados.

c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.





d. Registrar las actividades realizadas en el día.

e. Ninguna de las anteriores

15. En caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a. No hacer nada.



b. Informar al Jefe Inmediato y/o Vigia HSE para proceder a recibir atención médica.

c. Ir de manera independiente al médico.

d. Llamar a la oficina de Barranquilla a informar.

e. Ninguna de las anteriores

16. Escoja y relacione con el dibujo, las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa

a. Brigada de primeros auxilios.



b. Brigada de Evacuación.



c. Brigada contra incendios.



d. Todas las anteriores

17. ¿Cómo se reconocen las salidas de emergencia, rutas de evacuación

a. A través de señales de humo.
b. A través de cintas
c. A través de la señalización ubicadas en los equipos e instalaciones
d. A través de balizas.
e. No hay forma de reconocerlas.

18. Señale con una x los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a. Agua
b. Alarma de Incendio
c. Extintores
d. Kit control derrame
e. Ninguno

19. ¿Cuál es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental?

a. Contaminar las fuentes hídricas
b. Establecer e implementar medidas dirigidas al control ambiental del proyecto.
c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.
d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos?

a. Separar los residuos en la fuente
b. Para cuidar el medio ambiente
c. Para guardar los aceites reciclables
d. a y b son ciertas

21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse

*Papel aluminio
*Servilleta sucia de comida
*Bolsa de agua
*Restos de comida
*Trapo/recipiente sucio de ACPM

- CANECA ROJA
- CANECA VERDE
- CANECA NEGRA
- CANECA BLANCA

22. Son prohibiciones dentro de áreas de proyecto

a. Arrojar residuos sólidos al suelo o agua
b. Quemas a cielo abierto
c. Contaminar las áreas naturales
d. Cazar y comercializar especies de fauna
e. Todas las anteriores

23. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de Gestión Social?

a. Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.
b. Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas en el área de influencia del proyecto.
c. Realizar auditorías ambientales y sociales en las comunidades.
d. Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. ¿Qué actividad NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social?

a. Funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC)
b. Recolección de hojas de vida en las comunidades
c. Atención de P.Q.R.S.F. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)
d. Instalación de medios de comunicación como vallas informativas y buzones de sugerencias

EVALUADO POR: Adriana Camila Ug
CARGO: Profesional HSE
CALIFICACIÓN: 24/24 Ok.

B&P	INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL	Código: GH-R-004 Versión: 2 Fecha: 02-01-2025

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR																			
PRIMER NOMBRE	Brayan																		
SEGUNDO NOMBRE	David																		
PRIMER APELLIDO	Gamez																		
SEGUNDO APELLIDO	Ramirez																		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (marque con una x)																			
	TI		CC	X		CI		PPT		PA		Numero:	1004121831						
CARGO	Ayudante de obra																		
CIUDAD DE RESIDENCIA	Carmen del magdalena																		
DIRECCION ACTUAL	KR 4 C11 3-45																		
ESTRATO SOCIAL (marque con una x)	0		1		2		3		4		5		6						
TENENCIA DE LA VIVIENDA		PROPIA		ALQUILADA		FAMILIAR	X	OTRO, ¿Cuál?											
NO. TELEFONO/CELULAR CONTACTO	3025307884																		
CORREO ELECTRONICO	garnezramirezbrayandavid@gmail.com																		

ESTADO CIVIL (marque con una x)

Soltero		Casado		Unión libre	X
Separado		Viudo			

GRADO DE ESCOLARIDAD (marque con una x)

Sin escolaridad		Primaria incompleta	
Primaria completa		Bachiller incompleto	
Bachiller completo	X	Técnico	
Tecnólogo		Universitaria incompleta	
Universitaria completa		Especialista	
Maestría		Doctorado	

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
CONSORCIO CGSM 4 con domicilio en Barranquilla, Colombia es responsable del tratamiento de datos personales. Teniendo en cuenta la facultad otorgada por los numerales 2.2.2.25.2.1 - 8 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013, le informamos que su información personal ha sido recopilada en nuestras bases de datos para el desarrollo de diversas actividades relacionadas directamente con el objeto social de la compañía y el vínculo laboral que mantenemos con usted, son sometimiento exclusivo a las finalidades descritas en el punto 2.2.1 de nuestra Política de Protección de Datos Personales. Su información personal, será utilizada y administrada bajo estrictos estándares de responsabilidad, utilizando para ello los medios administrativos, tecnológicos, humanos y económicos idóneos que permiten su seguridad y confidencialidad. Si desea ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, hacer consultas y reclamos y demás derechos indicados en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 y las demás normas que lo complementen o sustituya usted puede comunicarse con nosotros por cualquiera de los siguientes medios: correo electrónico: coordinacionsgi@panamerican.com.co. Teléfono:60530692364. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo el manejo de la información en las condiciones establecidas en la Política de Protección de Datos Personales de CONSORCIO CGSM 4.

FIRMA DEL TRABAJADOR	
FIRMA	Brayan Cuna
FECHA	25-11-25

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS		
Versión Nº	Cambio efectuado	Fecha del cambio
1	Creación del Documento.	15-08-2024
2	Se incluye el campo "tenencia de la vivienda"	02-01-2025

B&P	REGISTRO DE INDUCCIÓN	Código: GH-R-025 Versión: 2 Fecha: 19-06-2025

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Andres Alvarez **IDENTIFICACION:** 1079913769

CARGO: Asudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo	T.P. Gestión H.	25/11/2025	15 Mn	Stephanie Palacio	Stephanie Palacio M
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales	T. P. Gestión Humana	25/11/2025	30 min	Stephanie Palacio M	Stephanie Palacio M
Reglamento Interno de Trabajo	T.P Gestión H.	25/11/2025	25 Min	Stephanie Palacio M	Stephanie Palacio M
Manual de Convivencia Laboral	T.P. Gestión H.	25/11/2025	15 Min	Stephanie Palacio M	Stephanie Palacio M.
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	Profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gomez Urrego	Adriana GU
Procedimientos en caso de emergencia	profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gomez Urrego	Adriana GU
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gomez Urrego	Adriana GU.
Programas ambientales – responsabilidad ambiental	Ing Ambiental	25-11-2025	20 Min	Danila Patiño Ruiz	Danila Patiño Ruiz
Gestión Social					
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI	N/A				
Inducción al puesto de trabajo					
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: Carlos Andres Alvarez **FECHA:** 25/11/2025

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO**	**Código: GH-R-019**
		Versión: 1
		Fecha: 15-08-2024

Yo Carlos Andres Alvarez Montenegro identificado con CC 1079913769 de Pivijay, trabajador del CONSORCIO CGSM 4, certifico que conozco las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la autorizo consciente y voluntariamente para que reciba, almacene, analice y procese información sobre mi estado de salud que sirva como base para mantener actualizado los programas de prevención de accidente de trabajo, enfermedades laborales, sistema de vigilancia epidemiológica, perfil sociodemográfico, estadísticas de ausentismo, accidentabilidad para la respectiva gestión de los riesgos y lo que la organización considere pertinente, para tal fin.

Este consentimiento es válido siempre que la información sea manejada tal como lo establece la legislación Colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente me comprometo a facilitar la información y participar activamente en las actividades propias en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al firmar este consentimiento reconozco que he leído, entendido y comprendido perfectamente su contenido. Se me ha dado la oportunidad de formular preguntas las cuales han sido contestadas aclaradas en forma satisfactoria.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25/11/2025

Firma del Trabajador: Carlos Alvarez

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL**	**Código: GH-R-008** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Carlos Andres Alvarez Montenegro identificado con CC 1079913769 de Piva Sola, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiablidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25/11/2025

Firma del Trabajador: Carlos Alvarez

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Andres Alvarez

FECHA: 25/11/2025

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN	Código: GH-R-006 Fecha: 01-07-2025 Versión: 2

Nombre y Apellidos: Carlos Andres Alvarez

Cedula: 1079913769

Cargo: ayudante de obra

Fecha: 25/11/25

1. ¿A qué se dedica el CONSORCIO CGSM 4?

a. Servicio de dragado hidráulico y mecánico, obras marítimas y fluviales, transporte fluvial, planeación y control de proyectos de ingeniería civil en el área de movimientos de tierra.



b. Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras.



c. Desarrollar, producir y comercializar productos de evolución constante que brinden calidad y rentabilidad; creando un alto valor notado para accionistas, proveedores y clientes.



d. Ninguna de las anteriores.

2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, mencione el propósito del cargo para el cual fue contratado.

realisar Tareas de apoyo a la operacion


3. ¿Qué formatos tiene que diligenciar usted desde el desempeño de su labor?

asistencia a charlas entregas de EPP

4. De acuerdo con la inducción, mencione los peligros a los cuales usted está expuesto mientras realiza su trabajo.

Virus. Picadura de insecto y picaduras de serpiente temperaturas estremas

5. Elija 2 responsabilidades que usted tiene desde su cargo en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo.



Uso de epp



Analizar los riesgos



Asistir a capacitaciones y charlas



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo

6. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo identifique que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.





b. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes.



(d) Todas las anteriores.

7. ¿Qué políticas posee la empresa?

a. Calidad - No Alcohol, No drogas y No fumadores – HSE
(b) HSEQ (Calidad – Seguridad, Salud en el trabajo – Medio Ambiente), Política Seguridad acuática, Política de No alcohol no drogas, Política de Seguridad Vial.
c. Orden y Aseo – HSE – Uso de EPP
d. HSE
e. Ninguna

8. ¿De qué trata la política de alcohol y no drogas?

a. Que se puede consumir alcohol o drogas siempre y cuando no sea en el lugar de trabajo.
(b) No se le permitirá a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
c. Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo siempre y cuando no altere el orden y rendimiento en la ejecución de mi labor.
d. Todas las anteriores.

9. ¿La Política de Seguridad Acuática está dirigida a que personas?

a. Los trabajadores
b. Contratistas
c. Los trabajadores y contratistas
(d) Todos los trabajadores, contratistas y visitantes.

10. ¿Qué practicas están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial?

a. El uso de celulares durante la conducción.



b. Consumir o estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas cuando se conduce o de pasajero en vehículos al servicio de la empresa.



c. Transportar personal ajeno a la organización sin previa autorización.



d. No Colocarse el cinturón de seguridad.




(e) Todas las anteriores

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.




Uniforme completo



Botas



Casco



Gafas



Chaleco salvavidas



Guantes



Protección auditiva



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. ¿Cuáles programas están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa?

(a) Riesgo cardiovascular, Salud Publica, Mecánico, Acuático, Conservación Auditiva, Conservación Osteomuscular

b. Caída al mismo nivel, caída desde alturas y Resbalones



c. Ninguna de las anteriores

13. Unir con una línea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



Acto Inseguro



Condición Insegura

14. ¿Cuál es la función principal del COPASST?

a. Registrar los accidentes de trabajo.





b. Evaluar el desempeño de los empleados.

(c.) Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.





d. Registrar las actividades realizadas en el día.

e. Ninguna de las anteriores

15. En caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a. No hacer nada.



(b) Informar al Jefe Inmediato y/o Vigia HSE para proceder a recibir atención médica.

c. Ir de manera independiente al médico.

d. Llamar a la oficina de Barranquilla a informar.

e. Ninguna de las anteriores

16. Escoja y relacione con el dibujo, las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa

a. Brigada de primeros auxilios.



b. Brigada de Evacuación.



c. Brigada contra incendios.



(d) Todas las anteriores

17. ¿Cómo se reconocen las salidas de emergencia, rutas de evacuación

a. A través de señales de humo.
b. A través de cintas
(c) A través de la señalización ubicadas en los equipos e instalaciones
d. A través de balizas.
e. No hay forma de reconocerlas.

18. Señale con una x los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a. Agua
b. Alarma de Incendio
x. Extintores
x. Kit control derrame
e. Ninguno


19. ¿Cuál es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guia Ambiental?

a. Contaminar las fuentes hídricas
(b) Establecer e implementar medidas dirigidas al control ambiental del proyecto.
c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.
d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos?

(a) Separar los residuos en la fuente
(b) Para cuidar el medio ambiente
c. Para guardar los aceites reciclables
d. a y b son ciertas

21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse



22. Son prohibiciones dentro de áreas de proyecto

a. Arrojar residuos sólidos al suelo o agua
b. Quemas a cielo abierto
c. Contaminar las áreas naturales
d. Cazar y comercializar especies de fauna
(e) Todas las anteriores

23. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de Gestión Social?

a. Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.
(b) Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas en el área de influencia del proyecto.
c. Realizar auditorías ambientales y sociales en las comunidades.
d. Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. ¿Qué actividad NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social?

a. Funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC)
(b) Recolección de hojas de vida en las comunidades
c. Atención de P.Q.R.S.F. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)
d. Instalación de medios de comunicación como vallas informativas y buzones de sugerencias

EVALUADO POR: Adriana Conrado Ugarte
CARGO: profesional HSE
CALIFICACIÓN: 24/24 OK

	INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL	Código: GH-R-004 Versión: 2 Fecha: 02-01-2025

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR	
PRIMER NOMBRE	Carlos
SEGUNDO NOMBRE	Andres
PRIMER APELLIDO	Alvarez
SEGUNDO APELLIDO	Montenegro

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (marque con una x)

TI		CC	X	CI		PPT		PA		Numero: 1079913769

CARGO	ayudante de obra
CIUDAD DE RESIDENCIA	Pivijay, Carmen de magdalena
DIRECCION ACTUAL	Calle 2 # 7-27

ESTRATO SOCIAL (marque con una x)

0		1	X	2		3		4		5		6	

TENENCIA DE LA VIVIENDA		PROPIA		ALQUILADA	X	FAMILIAR		OTRO, ¿Cuál?	

NO. TELEFONO/CELULAR CONTACTO	3135164038
CORREO ELECTRONICO	alvarezmontenegrocar7705@gmail.com

ESTADO CIVIL (marque con una x)

Soltero		Casado		Unión libre	X
Separado		Viudo			

GRADO DE ESCOLARIDAD (marque con una x)

Sin escolaridad		Primaria incompleta	
Primaria completa		Bachiller incompleto	
Bachiller completo	X	Técnico	
Tecnólogo		Universitaria incompleta	
Universitaria completa		Especialista	
Maestría		Doctorado	

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	Código: GH-R-004 Versión: 2 Fecha: 02-01-2025

PERSONAS A CARGO	
NUMERO DE PERSONAS A CARGO	2
NOMBRE DEL ESPOSO (A) O COMPAÑERO (A) PERMANENTE	Yaneth marmol
NUMERO DE HIJOS	1

NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO
Santiago david	6 de agosto

INFORMACION PARA CASOS DE EMERGENCIA			
NO. TELEFONO CELULAR CONTACTO	3135069837		
EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A	Maira montenegro		
PARENTESCO		TELEFONO DE CONTACTO	
TIPO DE SANGRE (marque con una x)			

A+		A-		B+		B-	
AB+		AB-		O+	X	O-	

¿ES ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO?	NO		SI	¿Cual?
¿DEPENDE DE ALGUN MEDICAMENTO?	NO		SI	¿Cual?

INFORMACION PARA DOTACIONES					
TALLA CAMISA	L	TALLA PANTALON	34	TALLA CALZADO	44

INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL	
NOMBRE DE LA EPS DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA SER AFILIADO	Nueva E.P.S
NOMBRE DE LA AFP DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA SER AFILIADO	Proteccion
NOMBRE DE LA AF CESANTIAS DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA QUE LE CONSIGNEN CUANDO HAYA LUGAR	Proteccion

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
CONSORCIO CGSM 4 con domicilio en Barranquilla, Colombia es responsable del tratamiento de datos personales. Teniendo en cuenta la facultad otorgada por los numerales 2.2.2.25.2.1 - 8 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013, le informamos que su información personal ha sido recopilada en nuestras bases de datos para el desarrollo de diversas actividades relacionadas directamente con el objeto social de la compañía y el vínculo laboral que mantenemos con usted, son sometimiento exclusivo a las finalidades descritas en el punto 2.2.1 de nuestra Política de Protección de Datos Personales. Su información personal, será utilizada y administrada bajo estrictos estándares de responsabilidad, utilizando para ello los medios administrativos, tecnológicos, humanos y económicos idóneos que permiten su seguridad y confidencialidad. Si desea ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, hacer consultas y reclamos y demás derechos indicados en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 y las demás normas que lo complementen o sustituya usted puede comunicarse con nosotros por cualquiera de los siguientes medios: correo electrónico: coordinacionsgi@panamerican.com.co. Teléfono:60530692364. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo el manejo de la información en las condiciones establecidas en la Política de Protección de Datos Personales de CONSORCIO CGSM 4.

FIRMA DEL TRABAJADOR	
FIRMA	
FECHA	25/11/25

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS		
Versión Nº	Cambio efectuado	Fecha del cambio
1	Creación del Documento.	15-08-2024
2	Se incluye el campo "tenencia de la vivienda"	02-01-2025

B&P	REGISTRO DE INDUCCIÓN	Código: GH-R-025 Versión: 2 Fecha: 19-06-2025

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos segundo Gamez santodomingo **IDENTIFICACION:** 1083 572 789

CARGO: Ayudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo	T.P gestión humana	25/11/2025	15 min.	Stephanie Palacio	
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales	Tp Gestión humana	25/11/2025	30 Min	Stephanie palacio	Stephanie Palacio Maranto
Reglamento Interno de Trabajo	T. P. Gestión Humana	25/11/2025	25 Min	Stephanie Palacio	Stephanie Palacio Maranto
Manual de Convivencia Laboral	Tp Gestión humana	25/11/2025	15 Min	stephanie Palacio	
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	Profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez Urrego	Adriana Gv
Procedimientos en caso de emergencia	Profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez Urrego	Adriana Gv
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez Urrego	Adriana GV -
Programas ambientales – responsabilidad ambiental	Ing Ambiental	25-11-2025	20 Min	Angela Patiño Ruiz	Angela Patiño Ruiz
Gestión Social	Líder Gestión Social	25-11-2025	20 min	Yuris Premo	
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inducción al puesto de trabajo					
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: Carlos Gamez **FECHA:** 25/11/2025

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO**	**Código: GH-R-019** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo carlos segundo gamez santodomingo identificado con CC 1083 572 789 de Pivijay, trabajador del CONSORCIO CGSM 4, certifico que conozco las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la autorizo consciente y voluntariamente para que reciba, almacene, analice y procese información sobre mi estado de salud que sirva como base para mantener actualizado los programas de prevención de accidente de trabajo, enfermedades laborales, sistema de vigilancia epidemiológica, perfil sociodemográfico, estadísticas de ausentismo, accidentabilidad para la respectiva gestión de los riesgos y lo que la organización considere pertinente, para tal fin.

Este consentimiento es válido siempre que la información sea manejada tal como lo establece la legislación Colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente me comprometo a facilitar la información y participar activamente en las actividades propias en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al firmar este consentimiento reconozco que he leído, entendido y comprendido perfectamente su contenido. Se me ha dado la oportunidad de formular preguntas las cuales han sido contestadas aclaradas en forma satisfactoria.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25/11/2025

Firma del Trabajador: carlos gamez

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL**	**Código: GH-R-008** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Carlos Segundo Gamez Santodomingo identificado con CC 1083572709 de Pivijay, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiablidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25/11/2025

Firma del Trabajador: Carlos Gamez

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

Carlos Gamez
FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: carlos segundo Gamez Santodomingo

FECHA: 25/11/2025

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN	Código: GH-R-006 Fecha: 01-07-2025 Versión: 2

Nombre y Apellidos: Carlos Gamez Santodomingo

Cedula: 1083 572 789

Cargo: Ayudande de obra

Fecha: 25/11/2025

1. ¿A qué se dedica el CONSORCIO CGSM 4?

a. Servicio de dragado hidráulico y mecánico, obras marítimas y fluviales, transporte fluvial, planeación y control de proyectos de ingeniería civil en el área de movimientos de tierra.



b. Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras.



c. Desarrollar, producir y comercializar productos de evolución constante que brinden calidad y rentabilidad; creando un alto valor notado para accionistas, proveedores y clientes.



d. Ninguna de las anteriores.

2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, mencione el propósito del cargo para el cual fue contratado.

realizar tareas de apoyo a la operación

3. ¿Qué formatos tiene que diligenciar usted desde el desempeño de su labor?

Asistencia a charlas
entrega de EPP

4. De acuerdo con la inducción, mencione los peligros a los cuales usted está expuesto mientras realiza su trabajo.

Virus, picaduras de insectos y mordeduras de serpientes temperaturas extremas

5. Elija 2 responsabilidades que usted tiene desde su cargo en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo.



~~Uso de epp~~



Analizar los riesgos



~~Asistir a capacitaciones y charlas~~



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo

6. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo identifique que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.





b. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes.



(d) Todas las anteriores.

7. ¿Qué políticas posee la empresa?

a. Calidad - No Alcohol, No drogas y No fumadores – HSE
(b) HSEQ (Calidad – Seguridad, Salud en el trabajo – Medio Ambiente), Política Seguridad acuática, Política de No alcohol no drogas, Política de Seguridad Vial.
c. Orden y Aseo – HSE – Uso de EPP
d. HSE
e. Ninguna

8. ¿De qué trata la política de alcohol y no drogas?

a. Que se puede consumir alcohol o drogas siempre y cuando no sea en el lugar de trabajo.
(b) No se le permitirá a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
c. Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo siempre y cuando no altere el orden y rendimiento en la ejecución de mi labor.
d. Todas las anteriores.

9. ¿La Política de Seguridad Acuática está dirigida a que personas?

a. Los trabajadores
b. Contratistas
c. Los trabajadores y contratistas
(d) Todos los trabajadores, contratistas y visitantes.

10. ¿Qué practicas están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial?

a. El uso de celulares durante la conducción.



b. Consumir o estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas cuando se conduce o de pasajero en vehículos al servicio de la empresa.



c. Transportar personal ajeno a la organización sin previa autorización.



d. No Colocarse el cinturón de seguridad.




(e) Todas las anteriores

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.



Uniforme completo



Botas



Casco



Gafas



Chaleco salvavidas



Guantes



Protección auditiva



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. ¿Cuáles programas están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa?

(a) Riesgo cardiovascular, Salud Pública, Mecánico, Acuático, Conservación Auditiva, Conservación Osteomuscular

b. Caída al mismo nivel, caída desde alturas y Resbalones

c. Ninguna de las anteriores



13. Unir con una línea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



Acto Inseguro



Condición Insegura

14. ¿Cuál es la función principal del COPASST?

a. Registrar los accidentes de trabajo.





b. Evaluar el desempeño de los empleados.

(c) Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.





d. Registrar las actividades realizadas en el día.

e. Ninguna de las anteriores

15. En caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a. No hacer nada.



(b) Informar al Jefe Inmediato y/o Vigia HSE para proceder a recibir atención médica.

c. Ir de manera independiente al médico.

d. Llamar a la oficina de Barranquilla a informar.

e. Ninguna de las anteriores

16. Escoja y relacione con el dibujo, las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa

a. Brigada de primeros auxilios.



b. Brigada de Evacuación.



c. Brigada contra incendios.



(d) Todas las anteriores

17. ¿Cómo se reconocen las salidas de emergencia, rutas de evacuación

a. A través de señales de humo
b. A través de cintas
(c) A través de la señalización ubicadas en los equipos e instalaciones
d. A través de balizas.
e. No hay forma de reconocerlas.

18. Señale con una x los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a. Agua
b. Alarma de Incendio
(c) Extintores
(d) Kit control derrame
e. Ninguno


19. ¿Cuál es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental?

a. Contaminar las fuentes hídricas
(b) Establecer e implementar medidas dirigidas al control ambiental del proyecto.
c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.
d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos?

(a) Separar los residuos en la fuente
(b) Para cuidar el medio ambiente
c. Para guardar los aceites reciclables
d. a y b son ciertas

21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse



22. Son prohibiciones dentro de áreas de proyecto

a. Arrojar residuos sólidos al suelo o agua
b. Quemas a cielo abierto
c. Contaminar las áreas naturales
d. Cazar y comercializar especies de fauna
(e) Todas las anteriores

23. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de Gestión Social?

a. Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.
(b) Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas en el área de influencia del proyecto.
c. Realizar auditorías ambientales y sociales en las comunidades.
d. Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. ¿Qué actividad NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social?

a. Funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC)
(b) Recolección de hojas de vida en las comunidades
c. Atención de P.Q.R.S.F. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)
d. Instalación de medios de comunicación como vallas informativas y buzones de sugerencias

EVALUADO POR: Adriana Gonzalez Lugo
CARGO: profesional HSE
CALIFICACIÓN: 24/24 OK

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR																			
PRIMER NOMBRE	carlos																		
SEGUNDO NOMBRE	segundo																		
PRIMER APELLIDO	gamez																		
SEGUNDO APELLIDO	santodomingo																		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (marque con una x)																			
	TI		CC	X		CI		PPT		PA		Numero: 1083 572 789							
CARGO	Ayudante de obra																		
CIUDAD DE RESIDENCIA	carmen del magdalena																		
DIRECCION ACTUAL	calle # 3-47																		
ESTRATO SOCIAL (marque con una x)	0		1	X	2		3		4		5		6						
TENENCIA DE LA VIVIENDA		PROPIA	X	ALQUILADA		FAMILIAR		OTRO, ¿Cuál?											
NO. TELEFONO/CELULAR CONTACTO	302 653 5637																		
CORREO ELECTRONICO	carlossegundogamez@gmail.com																		

ESTADO CIVIL (marque con una x)

Soltero	X	Casado		Unión libre	
Separado		Viudo			

GRADO DE ESCOLARIDAD (marque con una x)

Sin escolaridad		Primaria incompleta	
Primaria completa		Bachiller incompleto	
Bachiller completo	X	Técnico	
Tecnólogo		Universitaria incompleta	
Universitaria completa		Especialista	
Maestría		Doctorado	

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

PERSONAS A CARGO			
NUMERO DE PERSONAS A CARGO	3		
NOMBRE DEL ESPOSO (A) O COMPAÑERO (A) PERMANENTE			
NUMERO DE HIJOS			
NOMBRES		FECHA DE NACIMIENTO	

INFORMACION PARA CASOS DE EMERGENCIA			
NO. TELEFONO CELULAR CONTACTO	302 653 5637		
EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A	Ingrith santodomingo		
PARENTESCO		TELEFONO DE CONTACTO	302 653 5637
TIPO DE SANGRE (marque con una x)			

A+	X	A-		B+		B-	
AB+		AB-		O+		O-	

¿ES ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO?	NO		SI	¿Cual?
¿DEPENDE DE ALGUN MEDICAMENTO?	NO		SI	¿Cual?

INFORMACION PARA DOTACIONES					
TALLA CAMISA	L	TALLA PANTALON	32	TALLA CALZADO	40

INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL	
NOMBRE DE LA EPS DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA SER AFILIADO	Coosalud
NOMBRE DE LA AFP DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA SER AFILIADO	Porvenir
NOMBRE DE LA AF CESANTIAS DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA QUE LE CONSIGNEN CUANDO HAYA LUGAR	Porvenir

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
CONSORCIO CGSM 4 con domicilio en Barranquilla, Colombia es responsable del tratamiento de datos personales. Teniendo en cuenta la facultad otorgada por los numerales 2.2.2.25.2.1 - 8 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013, le informamos que su información personal ha sido recopilada en nuestras bases de datos para el desarrollo de diversas actividades relacionadas directamente con el objeto social de la compañía y el vínculo laboral que mantenemos con usted, son sometimiento exclusivo a las finalidades descritas en el punto 2.2.1 de nuestra Política de Protección de Datos Personales. Su información personal, será utilizada y administrada bajo estrictos estándares de responsabilidad, utilizando para ello los medios administrativos, tecnológicos, humanos y económicos idóneos que permiten su seguridad y confidencialidad. Si desea ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, hacer consultas y reclamos y demás derechos indicados en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 y las demás normas que lo complementen o sustituya usted puede comunicarse con nosotros por cualquiera de los siguientes medios: correo electrónico: coordinacionsgi@panamerican.com.co. Teléfono:60530692364. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo el manejo de la información en las condiciones establecidas en la Política de Protección de Datos Personales de CONSORCIO CGSM 4.

FIRMA DEL TRABAJADOR	
FIRMA	carlos bumez
FECHA	25/11/2025

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS		
Versión Nº	Cambio efectuado	Fecha del cambio
1	Creación del Documento.	15-08-2024
2	Se incluye el campo "tenencia de la vivienda"	02-01-2025

B&P	REGISTRO DE INDUCCIÓN	Código: GH-R-025 Versión: 2 Fecha: 19-06-2025

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Cesar A. santodomingo **IDENTIFICACION:** 1.079.936.122

CARGO: Ayudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo	T.P Gestión H.	25/11/2025	15 Min	Stephanie Palacio	
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales	T.P. Gestión Humana.	25/11/2025	30 min	Stephanie Palacio	Stephanie Palacio Morales
Reglamento Interno de Trabajo	Tp. Gestión H.	25/11/2025	25 Min	Stephanie Palacio	Stephanie Palacio
Manual de Convivencia Laboral	T.P. Gestión H.	25/11/2025	15 Min	Stephanie Palacio	Stephanie Palacio M.
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez urgero	Adriana GV
Procedimientos en caso de emergencia	profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez urgero	Adriana GV
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez urgero	Adriana GV.
Programas ambientales – responsabilidad ambiental	Ing Ambiental	25-11-2025	20 Min	Dueby Patricia Ruiz	Dueby Patricia Ruiz
Gestión Social	Lider Gestión Social	25-11-2025	20 Min	Osiris Primo	
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI	N/A				
Inducción al puesto de trabajo					
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: Cesar Stodomingo **FECHA:** 25-11-25.

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO**	**Código: GH-R-019**
		Versión: 1
		Fecha: 15-08-2024

Yo Cesar Alfredo santodomingo de la cruz identificado con CC 1079936122 de Pivijay, trabajador del CONSORCIO CGSM 4, certifico que conozco las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la autorizo consciente y voluntariamente para que reciba, almacene, analice y procese información sobre mi estado de salud que sirva como base para mantener actualizado los programas de prevención de accidente de trabajo, enfermedades laborales, sistema de vigilancia epidemiológica, perfil sociodemográfico, estadísticas de ausentismo, accidentabilidad para la respectiva gestión de los riesgos y lo que la organización considere pertinente, para tal fin.

Este consentimiento es válido siempre que la información sea manejada tal como lo establece la legislación Colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente me comprometo a facilitar la información y participar activamente en las actividades propias en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al firmar este consentimiento reconozco que he leído, entendido y comprendido perfectamente su contenido. Se me ha dado la oportunidad de formular preguntas las cuales han sido contestadas aclaradas en forma satisfactoria.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25 - 11 - 25

Firma del Trabajador: Cesar Stodomingo

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL**	**Código: GH-R-008** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Cesar Alfredo santodomingo de la cruz identificado con CC 1079936122 de Piedecuesta, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiablidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25-11-25

Firma del Trabajador: Cesar Stodomingo

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

Cesar Stodomingo
FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Cesar A. Santodomingo

FECHA: 25-11-25

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN	Código: GH-R-006 Fecha: 01-07-2025 Versión: 2

Nombre y Apellidos: Cesar Santodomingo

Cedula: 1079936122

Cargo: Ayudante de obra

Fecha: 25-11-25

1. ¿A qué se dedica el CONSORCIO CGSM 4?

X a. Servicio de dragado hidráulico y mecánico, obras marítimas y fluviales, transporte fluvial, planeación y control de proyectos de ingeniería civil en el área de movimientos de tierra.



b. Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras.



c. Desarrollar, producir y comercializar productos de evolución constante que brinden calidad y rentabilidad; creando un alto valor notado para accionistas, proveedores y clientes.



d. Ninguna de las anteriores.

2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, mencione el propósito del cargo para el cual fue contratado. Realizar tareas de apoyo a la operación.

3. ¿Qué formatos tiene que diligenciar usted desde el desempeño de su labor?

Asistencia a charlas, entrega de EPP.

4. De acuerdo con la inducción, mencione los peligros a los cuales usted está expuesto mientras realiza su trabajo.

Virus, Picaduras de insectos y mordeduras de serpientes, temperaturas extremas

5. Elija 2 responsabilidades que usted tiene desde su cargo en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo.



Uso de epp X



Analizar los riesgos



Asistir a capacitaciones y charlas X



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo

6. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo identifique que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.





b. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes.



X Todas las anteriores.

7. ¿Qué políticas posee la empresa?

a. Calidad - No Alcohol, No drogas y No fumadores – HSE

X HSEQ (Calidad – Seguridad, Salud en el trabajo – Medio Ambiente), Política Seguridad acuática, Política de No alcohol no drogas, Política de Seguridad Vial.

c. Orden y Aseo – HSE – Uso de EPP

d. HSE

e. Ninguna

8. ¿De qué trata la política de alcohol y no drogas?

a. Que se puede consumir alcohol o drogas siempre y cuando no sea en el lugar de trabajo.

X No se le permitirá a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

c. Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo siempre y cuando no altere el orden y rendimiento en la ejecución de mi labor.

d. Todas las anteriores.

9. ¿La Política de Seguridad Acuática está dirigida a que personas?

a. Los trabajadores

b. Contratistas

c. Los trabajadores y contratistas

X Todos los trabajadores, contratistas y visitantes.

10. ¿Qué practicas están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial?

a. El uso de celulares durante la conducción.



b. Consumir o estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas cuando se conduce o de pasajero en vehículos al servicio de la empresa.



c. Transportar personal ajeno a la organización sin previa autorización.



d. No Colocarse el cinturón de seguridad.




X Todas las anteriores

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.



Uniforme completo X



Botas X



Casco X



Gafas X



Chaleco salvavidas



Guantes X



Protección auditiva X



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. ¿Cuáles programas están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa?

X **a.** Riesgo cardiovascular, Salud Publica, Mecánico, Acuático, Conservación Auditiva, Conservación Osteomuscular

b. Caída al mismo nivel, caída desde alturas y Resbalones



c. Ninguna de las anteriores

13. Unir con una linea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



Acto Inseguro



Condición Insegura

14. ¿Cuál es la función principal del COPASST?

a. Registrar los accidentes de trabajo.





b. Evaluar el desempeño de los empleados

X **c.** Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.





d. Registrar las actividades realizadas en el día.

e. Ninguna de las anteriores

15. En caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a. No hacer nada.



X **b.** Informar al Jefe Inmediato y/o Vigia HSE para proceder a recibir atención médica.

c. Ir de manera independiente al médico.

d. Llamar a la oficina de Barranquilla a informar.

e. Ninguna de las anteriores

16. Escoja y relacione con el dibujo, las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa

a. Brigada de primeros auxilios.



b. Brigada de Evacuación.



c. Brigada contra incendios.



X Todas las anteriores

17. ¿Cómo se reconocen las salidas de emergencia, rutas de evacuación

a. A través de señales de humo.
b. A través de cintas
X A través de la señalización ubicadas en los equipos e instalaciones
d. A través de balizas.
e. No hay forma de reconocerlas.

18. Señale con una x los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a. Agua
b. Alarma de Incendio
X Extintores
X Kit control derrame
e. Ninguno

19. ¿Cuál es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental?

a. Contaminar las fuentes hídricas
X Establecer e implementar medidas dirigidas al control ambiental del proyecto.
c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.
d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos?

a. Separar los residuos en la fuente
b. Para cuidar el medio ambiente
c. Para guardar los aceites reciclables
X a y b son ciertas

21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse



22. Son prohibiciones dentro de áreas de proyecto

a. Arrojar residuos sólidos al suelo o agua
b. Quemas a cielo abierto
c. Contaminar las áreas naturales
d. Cazar y comercializar especies de fauna
X Todas las anteriores

23. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de Gestión Social?

a. Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.
X Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas en el área de influencia del proyecto.
c. Realizar auditorias ambientales y sociales en las comunidades.
d. Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. ¿Qué actividad NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social?

a. Funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC)
X Recolección de hojas de vida en las comunidades
c. Atención de P.Q.R.S.F. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)
d. Instalación de medios de comunicación como vallas informativas y buzones de sugerencias

EVALUADO POR: Adriana Gomez V.
CARGO: Profesional HSE
CALIFICACIÓN: 23/24 Ok

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR																			
PRIMER NOMBRE	Cesar																		
SEGUNDO NOMBRE	Alfredo																		
PRIMER APELLIDO	Santodomingo																		
SEGUNDO APELLIDO	De la cruz																		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (marque con una x)																			
	TI		CC X	X	CI		PPT		PA		Numero: 1079936122								
CARGO	Ayudante de obra																		
CIUDAD DE RESIDENCIA	Carmen del magdalena																		
DIRECCION ACTUAL	Calle 2 # 12-40																		
ESTRATO SOCIAL (marque con una x)	0		1	X	2		3		4		5		6						
TENENCIA DE LA VIVIENDA		PROPIA	X	ALQUILADA		FAMILIAR		OTRO, ¿Cuál?											
NO. TELEFONO/CELULAR CONTACTO	3105096769																		
CORREO ELECTRONICO	Santodomingocesar2@gmail.com																		

ESTADO CIVIL (marque con una x)

Soltero		Casado	X	Unión libre	
Separado		Viudo			

GRADO DE ESCOLARIDAD (marque con una x)

Sin escolaridad		Primaria incompleta	
Primaria completa		Bachiller incompleto	
Bachiller completo		Técnico	
Tecnólogo		Universitaria incompleta	X
Universitaria completa		Especialista	
Maestría		Doctorado	

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

PERSONAS A CARGO			
NUMERO DE PERSONAS A CARGO	2		
NOMBRE DEL ESPOSO (A) O COMPAÑERO (A) PERMANENTE	Kelly Solano Anaya		
NUMERO DE HIJOS	1		
NOMBRES		FECHA DE NACIMIENTO	
Rodrigo Santodomingo Solano		13-07-21	

INFORMACION PARA CASOS DE EMERGENCIA			
NO. TELEFONO CELULAR CONTACTO	323 695 1323		
EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A	Kelly Solano Anaya		
PARENTESCO	Esposa	TELEFONO DE CONTACTO	3236951323
TIPO DE SANGRE (marque con una x)			

A+		A-		B+		B-	
AB+		AB-		O+	X	O-	

¿ES ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO?	NO	X	SI		¿Cual?
¿DEPENDE DE ALGUN MEDICAMENTO?	NO		X	SI	¿Cual?

INFORMACION PARA DOTACIONES					
TALLA CAMISA	S	TALLA PANTALON	32	TALLA CALZADO	40

INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL	
NOMBRE DE LA EPS DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA SER AFILIADO	Nueva EPS
NOMBRE DE LA AFP DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA SER AFILIADO	Porvenir
NOMBRE DE LA AF CESANTIAS DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA QUE LE CONSIGNEN CUANDO HAYA LUGAR	Porvenir

	INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL	Código: GH-R-004 Versión: 2 Fecha: 02-01-2025

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
CONSORCIO CGSM 4 con domicilio en Barranquilla, Colombia es responsable del tratamiento de datos personales. Teniendo en cuenta la facultad otorgada por los numerales 2.2.2.25.2.1 - 8 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013, le informamos que su información personal ha sido recopilada en nuestras bases de datos para el desarrollo de diversas actividades relacionadas directamente con el objeto social de la compañía y el vínculo laboral que mantenemos con usted, son sometimiento exclusivo a las finalidades descritas en el punto 2.2.1 de nuestra Política de Protección de Datos Personales. Su información personal, será utilizada y administrada bajo estrictos estándares de responsabilidad, utilizando para ello los medios administrativos, tecnológicos, humanos y económicos idóneos que permiten su seguridad y confidencialidad. Si desea ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, hacer consultas y reclamos y demás derechos indicados en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 y las demás normas que lo complementen o sustituya usted puede comunicarse con nosotros por cualquiera de los siguientes medios: correo electrónico: coordinacionsgi@panamerican.com.co. Teléfono:60530692364. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo el manejo de la información en las condiciones establecidas en la Política de Protección de Datos Personales de CONSORCIO CGSM 4.

FIRMA DEL TRABAJADOR	
FIRMA	Cesar stodomingo
FECHA	25-11-25

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS		
Versión Nº	Cambio efectuado	Fecha del cambio
1	Creación del Documento.	15-08-2024
2	Se incluye el campo "tenencia de la vivienda"	02-01-2025

B&P	REGISTRO DE INDUCCIÓN	Código: GH-R-025 Versión: 2 Fecha: 19-06-2025

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jesos David Manotas G **IDENTIFICACION:** 1079141724

CARGO: Ayudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo	T.P. Gestión H.	25/11/2025	15 Min	Stephanie palacio M	Stephanie Palacio
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales	T.P. Gestión Humana	25/11/2025	30 Min	Stephanie Palacio M	Stephanie Palacio
Reglamento Interno de Trabajo	T.P. Gestión H.	25/11/2025	25 Min	Stephanie Palacio M	Stephanie Palacio
Manual de Convivencia Laboral	T.P. Gestión H.	25/11/2025	15 Min	Stephanie Palacio M	Stephanie Palacio
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	Profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez urrego	Adriana G
Procedimientos en caso de emergencia	profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez urrego	Adriana G
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez urrego	Adriana G.
Programas ambientales – responsabilidad ambiental	Ing Ambiental	25-11-2025	20 Min	Dunly Patiño Ruiz	Dunly Patiño Ruiz
Gestión Social	Lider Social Sreine	25-11-25	20min.	Doris Preino	
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI	N/A				
Inducción al puesto de trabajo					
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jesos David Manotas G **FECHA:** 25 11 2025

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO**	**Código: GH-R-019** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Jesus David Navotas Gutierrez identificado con CC 1079914724 de Pivijay, trabajador del CONSORCIO CGSM 4, certifico que conozco las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la autorizo consciente y voluntariamente para que reciba, almacene, analice y procese información sobre mi estado de salud que sirva como base para mantener actualizado los programas de prevención de accidente de trabajo, enfermedades laborales, sistema de vigilancia epidemiológica, perfil sociodemográfico, estadísticas de ausentismo, accidentabilidad para la respectiva gestión de los riesgos y lo que la organización considere pertinente, para tal fin.

Este consentimiento es válido siempre que la información sea manejada tal como lo establece la legislación Colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente me comprometo a facilitar la información y participar activamente en las actividades propias en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al firmar este consentimiento reconozco que he leído, entendido y comprendido perfectamente su contenido. Se me ha dado la oportunidad de formular preguntas las cuales han sido contestadas aclaradas en forma satisfactoria.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25 11 2025

Firma del Trabajador: Jesus David Navotas G

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL**	**Código: GH-R-008** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Jesus David MANotas Gutierrez identificado con CC 1079914724 de Pivija, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiablidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25 11 2025

Firma del Trabajador: Jesus David MANotas G.

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

Jesus David M.
FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jesus David MANOTAS G

FECHA: 25 11 2025

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN	Código: GH-R-006 Fecha: 01-07-2025 Versión: 2

Nombre y Apellidos: Jesus D Manotas G

Cedula: 1079 914724

Cargo: ayudante de obra

Fecha: 25 11 2025

1. ¿A qué se dedica el CONSORCIO CGSM 4?

a. Servicio de dragado hidráulico y mecánico, obras marítimas y fluviales, transporte fluvial, planeación y control de proyectos de ingeniería civil en el área de movimientos de tierra.



b. Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras.



c. Desarrollar, producir y comercializar productos de evolución constante que brinden calidad y rentabilidad; creando un alto valor notado para accionistas, proveedores y clientes.



d. Ninguna de las anteriores.

2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, mencione el propósito del cargo para el cual fue contratado.

realizar tareas de apoyos ala operacion


3. ¿Qué formatos tiene que diligenciar usted desde el desempeño de su labor?

asixistencia a charlas
entregade a epp

4. De acuerdo con la inducción, mencione los peligros a los cuales usted está expuesto mientras realiza su trabajo.

virus picaduras de insepto o picaduras de serpiente temperaturas extremas

5. Elija 2 responsabilidades que usted tiene desde su cargo en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo.



Uso de epp



Analizar los riesgos



Asistir a capacitaciones y charlas



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo

6. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo identifique que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.





b. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes.



d. Todas las anteriores.

7. ¿Qué políticas posee la empresa?

a. Calidad - No Alcohol, No drogas y No fumadores – HSE
b. HSEQ (Calidad – Seguridad, Salud en el trabajo – Medio Ambiente), Política Seguridad acuática, Política de No alcohol no drogas, Política de Seguridad Vial.
c. Orden y Aseo – HSE – Uso de EPP
d. HSE
e. Ninguna

8. ¿De qué trata la política de alcohol y no drogas?

a. Que se puede consumir alcohol o drogas siempre y cuando no sea en el lugar de trabajo.
b. No se le permitirá a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
c. Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo siempre y cuando no altere el orden y rendimiento en la ejecución de mi labor.
d. Todas las anteriores.

9. ¿La Política de Seguridad Acuática está dirigida a que personas?

a. Los trabajadores
b. Contratistas
c. Los trabajadores y contratistas
d. Todos los trabajadores, contratistas y visitantes.

10. ¿Qué practicas están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial?

a. El uso de celulares durante la conducción.



b. Consumir o estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas cuando se conduce o de pasajero en vehículos al servicio de la empresa.



c. Transportar personal ajeno a la organización sin previa autorización.



d. No Colocarse el cinturón de seguridad.




e. Todas las anteriores

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.



Uniforme completo



Botas



Casco



Gafas



Chaleco salvavidas



Guantes



Protección auditiva



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. ¿Cuáles programas están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa?

(a) Riesgo cardiovascular, Salud Publica, Mecánico, Acuático, Conservación Auditiva, Conservación Osteomuscular

b. Caída al mismo nivel, caída desde alturas y Resbalones


c. Ninguna de las anteriores



13. Unir con una línea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



Acto Inseguro



Condición Insegura

14. ¿Cuál es la función principal del COPASST?

a. Registrar los accidentes de trabajo.





b. Evaluar el desempeño de los empleados.

(c.) Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.





d. Registrar las actividades realizadas en el día.

e. Ninguna de las anteriores

15. En caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a. No hacer nada.



(b.) Informar al Jefe Inmediato y/o Vigía HSE para proceder a recibir atención médica.

c. Ir de manera independiente al médico.

d. Llamar a la oficina de Barranquilla a informar.

e. Ninguna de las anteriores

16. Escoja y relacione con el dibujo, las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa

a. Brigada de primeros auxilios.



b. Brigada de Evacuación.



c. Brigada contra incendios.



(d.) Todas las anteriores

17. ¿Cómo se reconocen las salidas de emergencia, rutas de evacuación

a. A través de señales de humo.
b. A través de cintas
(c.) A través de la señalización ubicadas en los equipos e instalaciones
d. A través de balizas.
e. No hay forma de reconocerlas.

18. Señale con una x los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a. Agua
b. Alarma de Incendio
(c.) Extintores
(d.) Kit control derrame
e. Ninguno


19. ¿Cuál es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental?

a. Contaminar las fuentes hídricas
(b.) Establecer e implementar medidas dirigidas al control ambiental del proyecto.
c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.
d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos?

(a.) Separar los residuos en la fuente
(b.) Para cuidar el medio ambiente
c. Para guardar los aceites reciclables
d. a y b son ciertas

21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse



22. Son prohibiciones dentro de áreas de proyecto

a. Arrojar residuos sólidos al suelo o agua
b. Quemas a cielo abierto
c. Contaminar las áreas naturales
d. Cazar y comercializar especies de fauna
(e.) Todas las anteriores

23. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de Gestión Social?

a. Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.
(b.) Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas en el área de influencia del proyecto.
c. Realizar auditorías ambientales y sociales en las comunidades.
d. Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. ¿Qué actividad NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social?

a. Funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC)
(b.) Recolección de hojas de vida en las comunidades
c. Atención de P.Q.R.S.F. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)
d. Instalación de medios de comunicación como vallas informativas y buzones de sugerencias

EVALUADO POR: Adriana Gonzalez Mejia
CARGO: Profesional HSE
CALIFICACIÓN: 24/24 Ok.

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR														
PRIMER NOMBRE	Jesos													
SEGUNDO NOMBRE	David													
PRIMER APELLIDO	MANOTAS													
SEGUNDO APELLIDO	Gutierrez.													
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (marque con una x)														
	TI	X	CC		CI		PPT		PA		Numero:			
CARGO	Ayudante de obra													
CIUDAD DE RESIDENCIA	Carmen del magdalena													
DIRECCION ACTUAL	Carrera 9 calle 7 #18													
ESTRATO SOCIAL (marque con una x)	0		1	X	2		3		4		5		6	
TENENCIA DE LA VIVIENDA		PROPIA	X	ALQUILADA		FAMILIAR		OTRO, ¿Cuál?						
NO. TELEFONO/CELULAR CONTACTO	3239271095													
CORREO ELECTRONICO	Jesusmanotas19@hotmail.com.													

ESTADO CIVIL (marque con una x)

Soltero		Casado		Unión libre	X
Separado		Viudo			

GRADO DE ESCOLARIDAD (marque con una x)

Sin escolaridad		Primaria incompleta	
Primaria completa		Bachiller incompleto	
Bachiller completo	X	Técnico	
Tecnólogo		Universitaria incompleta	
Universitaria completa		Especialista	
Maestría		Doctorado	

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

PERSONAS A CARGO			
NUMERO DE PERSONAS A CARGO	4		
NOMBRE DEL ESPOSO (A) O COMPAÑERO (A) PERMANENTE	Etilvia Sofia Sosa M		
NUMERO DE HIJOS	3		
NOMBRES		FECHA DE NACIMIENTO	
Eberto de Jesus manotas montenegro		15 de diciembre 2008	
Sebastian David manotas montenegro		5 de enero 2011	
Dilan david manotas sosa		18 de junio 2020	

INFORMACION PARA CASOS DE EMERGENCIA			
NO. TELEFONO CELULAR CONTACTO	323 927 1095.		
EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A	Etilvia Sofia Sosa.		
PARENTESCO		TELEFONO DE CONTACTO	3239271095
TIPO DE SANGRE (marque con una x)			

A+		A-		B+	X	B-	
AB+		AB-		O+		O-	

¿ES ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO?	NO		SI		¿Cual?
¿DEPENDE DE ALGUN MEDICAMENTO?	NO		SI		¿Cual?

INFORMACION PARA DOTACIONES					
TALLA CAMISA	M	TALLA PANTALON	32	TALLA CALZADO	42

INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL	
NOMBRE DE LA EPS DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA SER AFILIADO	Coodsalud
NOMBRE DE LA AFP DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA SER AFILIADO	Proteccion
NOMBRE DE LA AF CESANTIAS DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA QUE LE CONSIGNEN CUANDO HAYA LUGAR	Proteccion.

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
CONSORCIO CGSM 4 con domicilio en Barranquilla, Colombia es responsable del tratamiento de datos personales. Teniendo en cuenta la facultad otorgada por los numerales 2.2.2.25.2.1 - 8 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013, le informamos que su información personal ha sido recopilada en nuestras bases de datos para el desarrollo de diversas actividades relacionadas directamente con el objeto social de la compañía y el vínculo laboral que mantenemos con usted, son sometimiento exclusivo a las finalidades descritas en el punto 2.2.1 de nuestra Política de Protección de Datos Personales. Su información personal, será utilizada y administrada bajo estrictos estándares de responsabilidad, utilizando para ello los medios administrativos, tecnológicos, humanos y económicos idóneos que permiten su seguridad y confidencialidad. Si desea ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, hacer consultas y reclamos y demás derechos indicados en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 y las demás normas que lo complementen o sustituya usted puede comunicarse con nosotros por cualquiera de los siguientes medios: correo electrónico: coordinacionsgi@panamerican.com.co. Teléfono:60530692364. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo el manejo de la información en las condiciones establecidas en la Política de Protección de Datos Personales de CONSORCIO CGSM 4.

FIRMA DEL TRABAJADOR	
FIRMA	Jesus David Manotas Gutierrez.
FECHA	25 11 2025.

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS		
Versión Nº	Cambio efectuado	Fecha del cambio
1	Creación del Documento.	15-08-2024
2	Se incluye el campo "tenencia de la vivienda"	02-01-2025

B&P	REGISTRO DE INDUCCIÓN	Código: GH-R-025 Versión: 2 Fecha: 19-06-2025

NOMBRE DEL TRABAJADOR: JOSE CABALLERO **IDENTIFICACION:** 1079934636

CARGO: Ayudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo	T.P Gestión H	25/11/2025	15 Min	Stephanie palacio	Stephanie palacio M
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales	T. Profesional Gestión Humana	25/11/2025	30 Min	Stephanie Palacio Maralo	Stephanie palacio Maralo
Reglamento Interno de Trabajo	T.P. Gestión A.	25/11/2025	25 Min	Stephanie palacio M.	Stephanie palacio M
Manual de Convivencia Laboral	T.P. Gestión H.	25/11/2025	15 Min	Stephanie Palacio M	Stephanie Palacio M
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	Profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez Ugarte	Adriana Gv
Procedimientos en caso de emergencia	profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez Ugarte	Adriana Gv
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	profesional HSE	25-11-2025	20 Min	Adriana Gonzalez Ugarte	Adriana Gv.
Programas ambientales – responsabilidad ambiental	Ing Ambiental	25-11-2025	20 Min	Duvan Patiño Ruiz	Duvan Patiño Ruiz
Gestión Social	Líder Gestión Social	25-11-25	20Min.	Dsiri Prieto.	
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI	N/A				
Inducción al puesto de trabajo					
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: JOSE CABALLERO **FECHA:** 25-11-25

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO**	**Código: GH-R-019** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Joscar Ballero identificado con CC 1079934636 de Pivijay, trabajador del CONSORCIO CGSM 4, certifico que conozco las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la autorizo consciente y voluntariamente para que reciba, almacene, analice y procese información sobre mi estado de salud que sirva como base para mantener actualizado los programas de prevención de accidente de trabajo, enfermedades laborales, sistema de vigilancia epidemiológica, perfil sociodemográfico, estadísticas de ausentismo, accidentabilidad para la respectiva gestión de los riesgos y lo que la organización considere pertinente, para tal fin.

Este consentimiento es válido siempre que la información sea manejada tal como lo establece la legislación Colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente me comprometo a facilitar la información y participar activamente en las actividades propias en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al firmar este consentimiento reconozco que he leído, entendido y comprendido perfectamente su contenido. Se me ha dado la oportunidad de formular preguntas las cuales han sido contestadas aclaradas en forma satisfactoria.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25 - 11 - 25

Firma del Trabajador: Joscar Ballero

	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL	Código: GH-R-008
B&P		Versión: 1
		Fecha: 15-08-2024

Yo Josecaballero identificado con CC 1074993636 de Pivijay, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiablidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI X NO ___

Fecha de Autorización: 25-11-25

Firma del Trabajador: Josecaballero

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

Joscca Bonilla RO
FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Joscca Bonilla RO

FECHA: 25-11-25

B&P	**EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN**	**Código:** GH-R-006 **Fecha:** 1/07/2025 **Versión:** 2

Nombre y Apellidos: JoscaBallERO

Cedula: 1079934636

Cargo: Ayudante de obra

Fecha: 25-11-25

1. Marca con una X la imagen qué nos indica a que se dedica la empresa Consorcio Canal del Dique

a.



b.



c.



2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, marque con una X la imagen que indica el propósito de su cargo.

a.



b.



c.



3.Marque con una X el formato que usted debe diligenciar desde el desempeño de su labor.

a.



b.



c.



4. De acuerdo con la inducción recibida marque con una X los peligros a los cuales usted estaría expuesto mientras realiza su trabajo.

a.



b.



c.



d.



e.



d.



5. Marque con una X dos imágenes que correspondan a las responsabilidades que usted tiene desde su cargo.



Uso de epp X



Analizar los riesgos



Asistir a capacitaciones y charlas X



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo X

6. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo marque con una X la imagen que identifica que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a.



Entrega de documentos falsos

b.



Bajo rendimiento en el trabajo

c.



Presentarse a el trabajo en estado de embriaguez

7. Marque con una X la imagen que indica cuales políticas posee la empresa

a.



b.



c.



8. Marque con una X la imagen que indica de que qué trata la política de alcohol y no drogas.

a.



Se puede consumir alcohol siempre y cuando no sea en el trabajo.

b.



No se le permite a ninguna persona trabajar bajo los efectos de alcohol.

c.



Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo

9. Marca con una X la imagen que indica a que personas está dirigida La Política de Seguridad acuática.

a.



Todos los colaboradores, contratistas y visitantes

b.



Solo colaboradores

10. Marque con una X la imagen que indica las practicas que están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial.

a.



Uso de celular al momento de conducir

b.



Conducir bajo los efectos de alcohol

c.



No usar el cinturón de seguridad

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.



Uniforme completo X



Botas X



Casco X



Gafas X



Chaleco salvavidas



Guantes X



Protección auditiva X



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. Marque con una X la imagen de los programas que están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa.

a.



b.



c.



d.




e.



f.



13. Unir con una línea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



14. Marque con una X la imagen que indica cuál es la función principal del COPASST.

a.



b.



c.



15. Marque con una X la imagen que indica que se debe hacer en caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a.



b.



16. Marque con una X las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa.

a.



b.



c.



17. Marque con una X la señalización salida emergencia y rutas de evacuación.

a.



b.



c.



d.



18. Señale con una X los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a.



b.



c.



d.



19. Marque con una X la imagen que nos indica cual es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.

a.



b.



c.



20. Marque con una X las imágenes que nos indican cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos.

a.




b.



c.



21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse

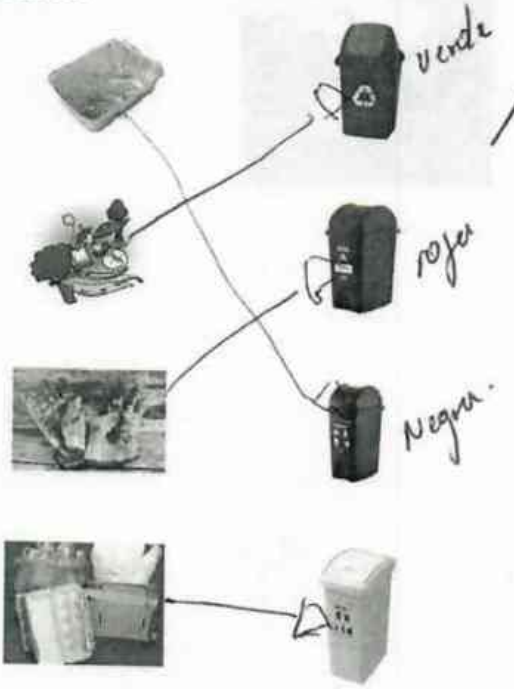

22. Marque con una X las imágenes que indican cuales son las acciones que están prohibidas dentro de áreas de proyecto.

a.



b.



c.



d.



23. Marque con una X la imagen que indica cual es el objetivo principal del proceso de Gestión Social.

a.



Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.

b.



Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas en el área de influencia del proyecto.

c.



Realizar auditorías ambientales y sociales en la comunidad

d.



Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. Señale con una X la actividad que NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social.

a.



b.



c.



d.



EVALUADO POR: Adriana Gonzalez urgoru
CARGO: Profesional HSE
CALIFICACIÓN: 23/24 OK

OBSERVACIONES:

TESTIGOS:

NOMBRE _____
CEDULA _____
FECHA _____

NOMBRE _____
CEDULA _____
FECHA _____

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

INFORMACION BASICA DEL TRABAJADOR																							
PRIMER NOMBRE	Jose																						
SEGUNDO NOMBRE	Leonardo																						
PRIMER APELLIDO	caballero																						
SEGUNDO APELLIDO	charris																						
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (marque con una x)																							
	TI		X	CC		CI		PPT		PA		Numero: 1079934636											
CARGO	Ayudante de obra																						
CIUDAD DE RESIDENCIA	carmen del magdalena																						
DIRECCION ACTUAL	calle 3 cra 4-25																						
ESTRATO SOCIAL (marque con una x)	0		1	X	2		3		4		5		6										
TENENCIA DE LA VIVIENDA		PROPIA		X	ALQUILADA		FAMILIAR		OTRO, ¿Cuál?														
NO. TELEFONO/CELULAR CONTACTO	3216591830																						
CORREO ELECTRONICO	caballerojoseleonardo245@gmail.com																						

ESTADO CIVIL (marque con una x)

Soltero		Casado		Unión libre	X
Separado		Viudo			

GRADO DE ESCOLARIDAD (marque con una x)

Sin escolaridad		Primaria incompleta	
Primaria completa	X	Bachiller incompleto	
Bachiller completo		Técnico	
Tecnólogo		Universitaria incompleta	
Universitaria completa		Especialista	
Maestría		Doctorado	

	INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL	Código: GH-R-004 Versión: 2 Fecha: 02-01-2025

PERSONAS A CARGO			
NUMERO DE PERSONAS A CARGO	2		
NOMBRE DEL ESPOSO (A) O COMPAÑERO (A) PERMANENTE	Adriana Fandiño Garcia		
NUMERO DE HIJOS	1		
NOMBRES		FECHA DE NACIMIENTO	
Gael Caballero Fandiño		23-07-21	

INFORMACION PARA CASOS DE EMERGENCIA			
NO. TELEFONO CELULAR CONTACTO	321 659 1830		
EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A	Adriana Fandiño		
PARENTESCO	Esposa	TELEFONO DE CONTACTO	3216591830

TIPO DE SANGRE (marque con una x)							
A+		A-		B+		B-	
AB+		AB-		O+	X	O-	

¿ES ALERGICO A ALGUN MEDICAMENTO?	NO	X	SI		¿Cual?
¿DEPENDE DE ALGUN MEDICAMENTO?	NO	X	SI		¿Cual?

INFORMACION PARA DOTACIONES					
TALLA CAMISA	L	TALLA PANTALON	34	TALLA CALZADO	41

INFORMACION DE SEGURIDAD SOCIAL	
NOMBRE DE LA EPS DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA SER AFILIADO	Coosalud
NOMBRE DE LA AFP DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA SER AFILIADO	Porvenir
NOMBRE DE LA AF CESANTIAS DONDE SE ENCUENTRA AFILIADO O DONDE DESEA QUE LE CONSIGNEN CUANDO HAYA LUGAR	Porvenir

B&P	**INFORMACION GENERAL PARA INGRESO DE PERSONAL**	**Código: GH-R-004** **Versión: 2** **Fecha: 02-01-2025**

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES	
CONSORCIO CGSM 4 con domicilio en Barranquilla, Colombia es responsable del tratamiento de datos personales. Teniendo en cuenta la facultad otorgada por los numerales 2.2.2.25.2.1 - 8 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013, le informamos que su información personal ha sido recopilada en nuestras bases de datos para el desarrollo de diversas actividades relacionadas directamente con el objeto social de la compañía y el vínculo laboral que mantenemos con usted, son sometimiento exclusivo a las finalidades descritas en el punto 2.2.1 de nuestra Política de Protección de Datos Personales. Su información personal, será utilizada y administrada bajo estrictos estándares de responsabilidad, utilizando para ello los medios administrativos, tecnológicos, humanos y económicos idóneos que permiten su seguridad y confidencialidad. Si desea ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, hacer consultas y reclamos y demás derechos indicados en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 y las demás normas que lo complementen o sustituya usted puede comunicarse con nosotros por cualquiera de los siguientes medios: correo electrónico: coordinacionsgi@panamerican.com.co. Teléfono:60530692364. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo el manejo de la información en las condiciones establecidas en la Política de Protección de Datos Personales de CONSORCIO CGSM 4.	
FIRMA DEL TRABAJADOR	
FIRMA	Jose Caballero
FECHA	25-11-25

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS		
Versión Nº	Cambio efectuado	Fecha del cambio
1	Creación del Documento.	15-08-2024
2	Se incluye el campo "tenencia de la vivienda"	02-01-2025

ANEXO 4.4.

ASISTENCIA A CHARLAS O CAPACITACIONES

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 04/11/2025 **Lugar:** Box culvert # 1 C. Hondo

Expositor: yesuitz polo navarro **Hora Inicio:** 7:00am **Hora Final:** 7:15 am

Temas: Política de Seguridad Acuatica **Obra:** CBS44 - Canto Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Johandys Ospino Ferrer	1004298507	Consorcio	Marino	Johandys O.
2.	Felix Valencia	9.153.002	VYD	op	
3.	Carlos Alfredo Barrera	1010090507	Consorcio	Marino	
4.	Jesus D Palencia	1045444444	UNP	topografo	Jesus D P.
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** yesuitz Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código GH-R-007 Versión 1 Fecha 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 04/11/2025	**Lugar:** Comedor del campamento
Expositor: Yesenia Polo Navarro	**Hora Inicio:** 1:00pm **Hora Final:** 1:35pm
Temas: Política de seguridad Vial	**Obra:** CBSM4 - Coco Manto

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Ricardo Paz	1067070344	Pavimenta	OP	
2.	Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
3.	Richard Marcelo	1081		OP	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 3	**Firma del Expositor (es):** Yesenia Polo N.

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica		
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa		
Otro		¿Cuál?				

Fecha: 05/11/2025	**Lugar:** Carmen del Magdalena	
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:00am	**Hora Final:** 7:15am
Temas: Procedimiento en caso de inundaciones	**Obra:** C BSM4 - Caño Hondo	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Orlando Ruiz	7032054	Panenerca	Op	Orlando Ruiz
2. Carlos Alfredo Correa	1010080507	Consorcio	Marino	
3. Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N.

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica		
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa		
Otro		¿Cuál?				

Fecha: 05/11/2025 **Lugar:** Box culvert #4 C. Hondo

Expositor: Yesuris Polo Navarro **Hora Inicio:** 11:50am **Hora Final:** 12:05 Pm

Temas: Procedimiento en caso de inundaciones **Obra:** CBS44- Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	LUIS HERRERA	1042348012		OP. Excavadora	
2.	Pedro WILCHES	1081028028	consorcio	Marino	Pedro Wilches
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2 **Firma del Expositor (es):** Yesuris Polo N.

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 05/11/2025 **Lugar:** Box Culvert #1 C. Hondo

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 4:10 pm **Hora Final:** 4:25 pm

Temas: Procedimiento en caso de inundaciones **Obra:** CBS114 - Coño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Felix Valencia	9.155.002	VYD	OP	
2. Johendys Cossio T.	1004298681	Consacio	Marino	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 2

Firma del Expositor (es): Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 06/11/2025 **Lugar:** Comun Sol Magdalena

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:00 am **Hora Final:** 7:15 am

Temas: Política de Seguridad Vial **Obra:** CB 3144 - Costa Hermosa

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Amanda Cera	7053054	comun	OP	Amanda Cera
2.	Juan Cervantes	1079002676	Vias y drenajes	OP	
3.	Richard Hernandez	1081709723	PHD	OP	
4.	Sinibaldo	1004121723	consorcio	Marino	Sinibaldo
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Sociolingüística			

Fecha: 06/11/2025	**Lugar:** Box Culvert #4 C. Hondo
Expositor: yesuith polo navarro	**Hora Inicio:** 11:20 am **Hora Final:** 11:35 am
Temas: Politica de Seguridad vial	**Obra:** C BS#4 - Cerro Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Pedro wilches	1081028029	consorcio	Maximo	Pedro wilches
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 1	**Firma del Expositor (es):** yesuith polo n

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Señalización caída			

Fecha: 06/11/2025 **Lugar:** Box Culvert #1 Chiriqui

Expositor: Yesuel Polo Navarro **Hora Inicio:** 12:00 pm **Hora Final:** 14:15 pm

Temas: Política de Seguridad Vial **Obra:** OB 344 - Cauce Mirador

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Johandys Orozco F	1004298804	Consorcio	Marino	
2.	Carlos Alfredo Pinnock	10100850	Consorcio	Marino	
3.	Felix Valencia	9.753.002	V x D	op	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):**

Powered by CamScanner

Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones

Código: GH-R-007
Versión: 1
Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 08/11/2025 **Lugar:** Carmen de Magdalena

Expositor: Yesuith Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:15am **Hora Final:** 7:30 am

Temas: Riesgo cardiovascular - Factores de riesgo **Obra:** CBS44 - Costa Hermosa

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Richard [illegible]	1082735907	[illegible]	Op	
2.	[illegible]	7007084	[illegible]	Op	
3.	Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Maino	Sinibaldo
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):** Yesuith Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 08/11/2025	**Lugar:** Box Culvert #4 C. Hondo
Expositor: Yesuith Polo Navarro	**Hora Inicio:** 10:00am **Hora Final:** 10:25am
Temas: Riesgo cardiovascular - factores de riesgo	**Obra:** CBSM4 - Costa Honda

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Pedro wilches Gonzalez	1081028028	consorcio	Marino	Pedro wilches
2. Carlos alfredo Barrera	1010080507	Consorcio	Marino	
3. IVIS HERRERA	1042348012		OP Excavadora	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3

Firma del Expositor (es): Yesuith Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 11/11/2025 **Lugar:** Box culvert #4 C Hondo

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 10:00am **Hora Final:** 10:15am

Temas: ¿Que es el ruido? Efectos del ruido. protección auditiva **Obra:** CBS 1141 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	LUIS Herrera	1042348012	Roys Corzo	op. Excavadora	
2.	Pedro wilcher Gonzalez	1081027024	Consorcio	Minero	Pedro wilchers
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 11/11/2025	**Lugar:** Punta Pacífica
Expositor: Jesus Pinto Hernandez	**Hora Inicio:** 7:00am **Hora Final:** 7:15am
Temas: ¿Qué es el ruido? Efectos del ruido, pro técnicas auditivas	**Obra:** CBSM - Cerro Negro

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Bernardo Ruiz	7053054	Pamesa	OP	
2.	Richard Wheatley	10819397	PHD	OP	
3.	Carlos Alfredo Barrera	100080507	Consorcio	Marino	
4.	Sinibaldo	1004171723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4	**Firma del Expositor (es):** Jesus Pinto Hernandez

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 11/11/2025	**Lugar:** Cox cultivo #1 C. Monte
Expositor: yesuby polo vocano	**Hora Inicio:** 1:30pm **Hora Final:** 1:45pm
Temas: ¿Que es el ruido? Efectos del ruido, protección auditiva	**Obra:** CBSMH- Cerro Monte

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jehondys Ortiz	10.429.850	Consorcio	Maniz	
2. FELIX VALENCIA	9.153.002	VYD	OP	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 2

Firma del Expositor (es): yesuby polo v

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/11/2025	**Lugar:** Punto Base	
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:20am	**Hora Final:** 7:35am
Temas: Temas en los que las sustancias pueden ingresar	**Obra:** CGS114 - Centro Hospitalario	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Osmando Paz	1057204941	Duncan	OP	
2. Richard Hernandez	1081905927	JPD	OP	
3. Fran Evans	1079932676	V y D	OP	
4. Sinibaldo	1004621773	Consorcio	Marino	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 4	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/11/2025	**Lugar:** Box Culvert #4 C Hondo
Expositor: yesnitt polo vasconez	**Hora Inicio:** 11:10am **Hora Final:** 11:25am
Temas: Formas en las que las sustancias químicas ingresan	**Obra:** CB544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pedro vilchez G	1081029088	Consorcio	Marino	Pedro vilchez
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1	**Firma del Expositor (es):** yesnitt polo v

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/11/2025	**Lugar:** Box culvert #1 C. Hondo
Expositor: Jesuits Polo Navarro	**Hora Inicio:** 2:10pm **Hora Final:** 2:25 pm
Temas: Como en lo que las sustancias químicas nos ingresan	**Obra:** CB 1444 - Canal Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Felix Valencia P	9.153.002	V y D	Op	
2.	Jesuits Jose Javier	1004298507	Consorcio	Marino	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** Jesuits Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 17/11/2025 **Lugar:** Punto base

Expositor: yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:25am **Hora Final:** 7:40am

Temas: ¿Que tan consciente es usted acerca de tema de seguridad? **Obra:** CBS44 - Cuiu Honda

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
2.	Carlos Alfredo Bonilla	1010090907	Consorcio	Marino	
3.	Alfonso Ibañez	1084733973	U y D	OP	
4.	Fran Cervantes	1042882646	V y D	OP	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 17/11/2025	**Lugar:** Box culvert #4 C Honda
Expositor: Yesuitz Polo Navarro	**Hora Inicio:** 10:15am **Hora Final:** 10:30am
Temas: ¿Que tan consciente es usted cuando de Seguridad se trata?	**Obra:** C B 5114- Cauca Honda

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pedro Wilches Gonzalez	1014029028	Consorcio	Maestro	Pedro Wilches
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 9	**Firma del Expositor (es):** Yesuitz Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 17/11/2025	**Lugar:** Box culvert #1 C Hondo
Expositor: yesuitt polo navarro	**Hora Inicio:** 2:40 Pm **Hora Final:** 2:55 Pm
Temas: ¿Que tan consciente es usted cuando se trata de seguridad?	**Obra:** CGSM4 - Cerro Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Johendrys Ospino T	1004298501	Consorcio	Marino	Johendrys O
2.	Felix Valbuena Perez	9.153.002	V y D	OP	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** yesuitt Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 18/11/2025	**Lugar:** Punto Base	
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:30am	**Hora Final:** 7:45am
Temas: Protección personal en entornos mineros	**Obra:** CBSM4 - Cerro Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
3.	Alfonso Ibañez	1.094.729.077	UYD	OP	[illegible]
4.	Fran Cervantes	1079931676	UYD	OP	[illegible]
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 18/11/2025 **Lugar:** Box cubierto #4C Huambo

Expositor: yesenia polo navarro **Hora Inicio:** 11:05 am **Hora Final:** 11:20 am

Temas: Protección personal en entornos mecánicos **Obra:** C 6344 - Coca Huambo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Pedro wilmer gonzales	1081028028	consorcio	Maestro	Pedro w. Gonzales
2. LUIS HERRERA	1042348012	Roy Coca	OP EXCAVADORA	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 2

Firma del Expositor (es): yesenia polo n

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re Inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 18/11/2025	**Lugar:** Box culvert #1 C Hondo	
Expositor: Yesuitt Polo Navarro	**Hora Inicio:** 4:15pm	**Hora Final:** 4:25pm
Temas: Protección personal en entornos mecánicos	**Obra:** CBS44 - Coño Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Felix Valencia P	9.153.002	V y D	op	
2.	Jahendrys Orozco F	1004792[illegible]	Consorcio	Marino	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2

Firma del Expositor (es): Yesuitt Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 19/11/2025 Lugar: Punto base

Expositor: Jesus Polo Navarro Hora Inicio: 7:30 am Hora Final: 7:45 am

Temas: Procedimiento en caso de tormenta eléctrica o tormenta tropical Obra: CBS114 - Coño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Orlando Cruz	7853054	Arcon	OP	
2.	Richard Arnedo	1081901703	PHO	OP	
3.	Fran Civants	1079936776	V Y D	OP	
4.	Carlos Alfredo Barrera	1010080507	Consorcio	Marino	
5.	Sinibaldo	1004124723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 Firma del Expositor (es): Jesus Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 19/11/2025	**Lugar:** Box culvert #4 c Hondo
Expositor: yesuth Polo navarro	**Hora Inicio:** 11:00am **Hora Final:** 11:15am
Temas: Procedimiento en caso de tormenta electrica o tormenta tropical	**Obra:** CBSM4 - Cauce Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jesus P Polanco	1100540999	CyP	Topografo	Jesus P P
2.	Luis Herrera	1042348012	Ray Caso	OP Excavadora	
3.	Pedro Wilches G	1081028021	consorcio	Marino	Pedro wilches
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 3	**Firma del Expositor (es):** yesuth Polo navarro

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 19/11/2025 | Lugar: Box culvert #1 Canto Hondo

Expositor: Yesuith Polo Navarro | Hora Inicio: 1:50pm | Hora Final: 2:05 Pm

Temas: Procedimiento en caso de derrame electrico o derrame tropical | Obra: CG544 - Canto Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Felix Valencia P	9.159.002	V y D	OP	
2.	Jonnathan Orozco Ferreira	1004298507	Consorcio	Mensu	
3.	Jonathan Pinedo	1082093696	Consorcio	Mensu	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 3 | Firma del Expositor (es): Yesuith Polo

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 22/11/2025	Lugar: Punto Base
Expositor: Yesuth Polo Navarro	Hora Inicio: 7:30am / Hora Final: 7:45am
Temas: Consumo de alcohol - Efectos	Obra: CBSM4- Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Amaris Ruiz	7693094	Barrera	op	
2.	Alfonso Ibañez	1089738012	VyD	op	
3.	Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Molino	
4.	Carlos Alfredo Correa	1010080507	Consorcio	Molino	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4	Firma del Expositor (es): Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 22/11/2025	**Lugar:** Box Culvert #4 C Hondo
Expositor: yesnitt polo navarro	**Hora Inicio:** 10:20am **Hora Final:** 10:35am
Temas: Consumo de alcohol - Efectos	**Obra:** CGSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Pedro Jose wilches	1082028021	consorcio	Maquino	Pedro wilches
2. Luis Herrera	1042349042	RC	OP	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** yesnitt polo n

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: SHA-FO-01 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 22/11/2025	**Lugar:** Bar cubierta #1 c. Hondo
Expositor: Yeraldy Polo Navarro	**Hora Inicio:** 1:30 pm **Hora Final:** 1:45 pm
Temas: Consumo de alcohol - Efectos	**Obra:** CG344 - Costa Honda

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Yeraldy Polo	1082048646	Consorcio	Maestro	
2.	Pablo Mieza	73179552	HYD	Abogado	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** Yeraldy Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 25/11/2025	**Lugar:** Punto Bose
Expositor: yesuth Polo Navano	**Hora Inicio:** 8:30am **Hora Final:** 7:45pm
Temas: ¿como actuar en situaciones de exposición de monoxido y golpicadura de sustancias quimicas?	**Obra:** CGSH4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. [illegible]	7e9304	Bamsa	op	
2. Richard Alvarado	1721723	PTP	Op	
3. Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Morino	Sinibaldo
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 23/11/2025	**Lugar:** Box Culvert #1
Expositor: yesuth Polo Navano	**Hora Inicio:** 10:50a.m **Hora Final:** 11:05a.m
Temas: ¿Cómo actuar en situaciones de peligro, derrames, ingesta y salpicaduras de sustancias químicas?	**Obra:** CBS44 - Canto Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pablo Alfaro	7312955?	HYD	operador	
2.	yesuth de paulo	1082026015	Consorcio	auxiliar	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 24/11/2025 **Lugar:** Punto Bose

Expositor: yesuly Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:00am **Hora Final:** 7:15am

Temas: Política del SGI **Obra:** CBSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Ernesto Paz	7853048	Consorcio	OP	
2.	Fran Cervantes	1049936676	V y D	OP	
3.	Jonas Ibañez	1084738073	V y D	op	
4.	Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Marino	sinibaldo
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** yesuly Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 24/11/2025 **Lugar:** Box culvert #4 C Manto

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 09:40am **Hora Final:** 09:57am

Temas: Política del SGI **Obra:** CGSM4- Caño Honda

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Luis Herrera	1042348012	RC	OP Excavadora	
2. Jesus D Palencia	1140859000	VU D	topografo	Jesus D P.
3. Pedro Wilches G	1081078029	Consorcio	Marino	Pedro Wilches
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 24/11/2025	**Lugar:** Box culvert Km 3
Expositor: Yesmith Polo Navarro	**Hora Inicio:** 1:15 Pm **Hora Final:** 1:30 Pm
Temas: Política del SGI	**Obra:** CG 5144 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pablo Meza	73129552	HYD	Perforador	
2.	Felix Valencia	9.153.002	HYD	OP	
3.	Jehandry Orozco F	1004211507	Consorcio	Marino	
4.	yonatan d pueblo	1052408686	Consor	Mari	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4	**Firma del Expositor (es):** yesmith polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 25/11/2025	**Lugar:** Punto Base
Expositor: Yesuith Polo Navarro	**Hora Inicio:** 2:30 Pm **Hora Final:** 2:45 Pm
Temas: ¿Por qué es crucial la señalización en la empresa? ¡Conozca 5 Razones!	**Obra:** CBSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Richard Mendoza	1088294723	PTD	Op	
2.	Omar de la Rosa	1069304744	Duracell	Op	
3.	Alfonso Ibañez	1094736073	UYU	Op	
4.	Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4	**Firma del Expositor (es):** Yesuith Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-P-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 25/11/2025 **Lugar:** Boxculvert Km 3

Expositor: Yesmith Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:00am **Hora Final:** 7:15 am

Temas: ¿Por qué es crucial la señalización en la empresa? ¿Conozco 5 Razones?

Obra: C6544 - Caño Rosario

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Felix Valencia P	9.153.002	VYD	OP	
2.	Pablo Mora	73124552	HYD	OP	
3.	Jonat A pastrana	1082095696	Monsuco	Aux	
4.	Johendrys Rojas Ferreira	1004297717	Marino	Marino	Johendrys O
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4

Firma del Expositor (es): Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Actividad de socialización de gracias			

Fecha: 27/11/2025	**Lugar:** Punto base	
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:00am	**Hora Final:** 7:18am
Temas: Gestión de la espiritualidad en el riesgo psicosocial	**Obra:** CBS14 - Caño Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	[illegible]	7089284	Oficina	OP	[signature]
2.	Victor [illegible]	1001707703	PTAR	OP	[signature]
3.	Sinibaldo	1002121723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
4.	Brayan Daniel	1004121831	consorcio	Ayudante obra	Brayan Gamez
5.	Fran Cervantes	1019982676	V y D	OP	[signature]
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5

Firma del Expositor (es): Yesuth Polo

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Actividad de oración de gracias			

Fecha: 27/11/2025 **Lugar:** Box Culvert #4

Expositor: Jesus Polo Novoa **Hora Inicio:** 04:40am **Hora Final:** 04:53am

Temas: Gestion de la espiritualidad en el riesgo Psicosocial **Obra:** CGSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. carlos ramez	1083572789	consorcio	Ayudante de obra	carlos ramez
2. Jesus D Palencia	1003544am	UuD	topografo	Jesus D P
3. Carlos alfredo Barrera	1010010107	Consorcio	Maestro	
4. Luis Herrera	1042348dl2	RC	OP	
5. Edulfo contillo	1079976394	RF	Ay de obra	Edulfo C
6. Adolfo Bonett	5078370	RF	Capataz	
7. Kevin Alvarez	1004213282	RF	Ay obra	Kevin A
8. Carlos Ramez	1087572789	Consorcio	Ay de obra	carlos ramez
9. Orlando Carrillo	85479793	RF	Maestro de obra	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 9 **Firma del Expositor (es):** Yesus Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Actividad de acción de gracias			

Fecha: 27/11/2025 **Lugar:** Box culvert Km3

Expositor: Yesuith Polo Navarro **Hora Inicio:** 3:00pm **Hora Final:** 3:15pm

Temas: Gestión de la espiritualidad en el ser humano psicosocial **Obra:** CB544- Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Felix Valencia	9.159.002	VYD	OP	
2.	Pablo Meza	73129552	HVD	OP	
3.	Yonatan Padilla	1082095696	Consorcio	Marino	
4.	Johanderys Orozco Ferrer	1004298591	Consorcio	Marino	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** Yesuith Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 29/11/2025	**Lugar:** Punto Base
Expositor: yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 8:00am **Hora Final:** 8:15am
Temas: Nutrición adecuada	**Obra:** CB544 - Caño Honda

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	carlos Gamez	1083572789	consorcio	Ayudante de obra	carlos Gamez
2.	Sinbaldo	1004121723	Consorcio	Marino	Sinbaldo
3.	Brayan Gamez	1004121831	consorcio	Ayudante obra	Brayan Gamez
4.	Carlos alfredo Barrera	1080080307	Consorcio	Marino	
5.	Fan Cevantes	1079926576	V y D	OP	
6.	Jesus D Palma	1100544999	V y D	Topografo	Jesus D. P.
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6	**Firma del Expositor (es):** yesuth Polo N

Powered by CamScanner

ANEXO 4.5.

PROGRAMA GENERAL DE INSPECCIONES

	PROGRAMA DE INSPECCIONES	Codigo		GH-PROG-008
		Version		1
		Fecha		2/02/2018

OBJETIVO GENERAL:	Determinar el estado de los elementos de seguridad y de los equipos que hacen parte de la empresa
ALCANCE	OFICINAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA
INDICADORES	**CUMPLIMIENTO - META: 90%** — **COBERTURA - META: <=80%** — **EFICACIA: META: control 90% de acciones**
RESPONSABLE	Coordinador HSEQ- Profesional HSE - Ingeniero Ambiental- Vigia HSE

ACTIVIDADES	1 - 6 ENERO 2025		7 - 12 de enero de 205		13 - 19 de enero de 2025		20 - 26 de enero de 2025		27 de enero a 2 de febrero de 2025		3 - 9 de febrero de 2025		4 - 9 de febrero de 2025		10 - 16 de febrero de 2025		17 - 23 de febrero de 2025		24 febrero - 2 de mazo de 2025		3 - 9 de marzo de 2025		10 - 16 de marzo de 2025		17 - 23 de marzo de 2025		24 - 30 de marzo de 2025	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
GIM-R-011 Inspecciòn de extintores	1	1									1	1									1	0						
GIM-R-012 Inspecciòn de Kit control derrame	1	1									1	1									1	1						
GIM-R-018 Inspecciòn de elementos de proteccion personal			1	1									1	1									1	1				
GIM-R-019 Inspeccion de orden y aseo draga y equipo de apoyo			1	0									1	0									1	0				
GIM-R-021 Inspecciòn de señalizaciòn			1	1			1	1					1	1			1	0					1	0			1	
GIM-R.022 Inspecciòn de botiquin	1	1									1	1									1	1						
GIM-R-023 Inspecciòn orden y aseo			1	1									1	1									1	0				
GIM-R-033 Inspeccion orden y aseo oficinas			1	1									1	1									1	0				
GIM-R-064 Inspeccion camilla	1	1									1	1									1	0						
GIM-R-073 Inspeccion orden y aseo campamentos			1	1									1	1									1	0				
GIM-R-074 Inspeccion para manejo de puntales					1	0									1	0									1	0		
	1 - 6 ENERO 2025		7 - 12 de enero de 205		13 - 19 de enero de 2025		20 - 26 de enero de 2025		e enero a 2 de febrero de		3 - 9 de febrero de 2025		4 - 9 de febrero de 2025		10 - 16 de febrero de 2025		17 - 23 de febrero de 2025		febrero - 2 de mazo de 20		3 - 9 de marzo de 2025		10 - 16 de marzo de 2025		17 - 23 de marzo de 2025		24 - 30 de marzo de 2025	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	4		6		1		1		0		4		6		1		1		0		4		6		1		1	
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	4		5		0		1		0		4		5		0		0		0		2		1		0		0	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES MENSUALES	100%		83%		0%		100%				100%		83%		0%		0%				50%		17%		0%		0%	

	PROGRAMA DE INSPECCIONES	Codigo		GH-PROG-008
		Version		1
		Fecha		2/02/2018

OBJETIVO GENERAL:	Determinar el estado de los elementos de seguridad y de los equipos que hacen parte de la empresa
ALCANCE	OFICINAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA
INDICADORES	**CUMPLIMIENTO - META: 90%** — **COBERTURA - META: <=80%** — **EFICACIA: META: control 90% de acciones**
RESPONSABLE	Coordinador HSEQ- Profesional HSE - Ingeniero Ambiental- Vigia HSE

ACTIVIDADES	31 marzo - 6 de abril 2025		7 - 13 de abril 2025		14 - 20 de abril		21 - 27 de abril		21 - 27 abril 2025		28 abril - 4 de mayo 2025		5 - 11 de mayo 2025		12 - 18 de mayo		19 - 15 de mayo		26 mayo - 1 de junio		2 - 8 de junio		9 -15 de junio		16 - 22 de junio		23 - 29 de junio	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
GIM-R-011 Inspecciòn de extintores			1								1										1							
GIM-R-012 Inspecciòn de Kit control derrame			1								1										1							
GIM-R-018 Inspecciòn de elementos de proteccion personal					1								1										1					
GIM-R-019 Inspeccion de orden y aseo draga y equipo de apoyo					1								1										1					
GIM-R-021 Inspecciòn de señalizaciòn					1				1				1				1						1				1	
GIM-R.022 Inspecciòn de botiquin			1								1										1							
GIM-R-023 Inspecciòn orden y aseo					1								1										1					
GIM-R-033 Inspeccion orden y aseo oficinas					1								1										1					
GIM-R-064 Inspeccion camilla			1								1										1							
GIM-R-073 Inspeccion orden y aseo campamentos					1								1										1					
GIM-R-074 Inspeccion para manejo de puntales							1								1										1			
	31 marzo - 6 de abril 2025		**7 - 13 de abril 2025**		**14 - 20 de abril**		**21 - 27 de abril**		**21 - 27 abril 2025**		**28 abril - 4 de mayo 2025**		**5 - 11 de mayo 2025**		**12 - 18 de mayo**		**19 - 15 de mayo**		**26 mayo - 1 de junio**		**2 - 8 de junio**		**9 -15 de junio**		**16 - 22 de junio**		**23 - 29 de junio**	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0		4		6		1		1		4		6		1		1		0		4		6		1		1	
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES MENSUALES			0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%	

	PROGRAMA DE INSPECCIONES	Codigo	GH-PROG-008
		Version	1
		Fecha	2/02/2018

OBJETIVO GENERAL:	Determinar el estado de los elementos de seguridad y de los equipos que hacen parte de la empresa
ALCANCE	OFICINAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA
INDICADORES	**CUMPLIMIENTO - META: 90%** — **COBERTURA - META: <=80%** — **EFICACIA: META: control 90% de acciones**
RESPONSABLE	Coordinador HSEQ- Profesional HSE - Ingeniero Ambiental- Vigia HSE

ACTIVIDADES	**30 de junio - 6 de julio**		**7 - 13 de julio**		**14 - 20 de julio**		**21 - 27 de julio**		**29 de julio - 3 de agosto**		**4 - 10 de agosto**		**11 - 17 de agosto**		**18 - 24 de agosto**		**25 - 31 de agosto**		**1 - 7 de septiembre**		**8 - 14 de septiembre**		**15 - 21 de septiembre**		**22 - 28 de septiembre**	
	P	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**
GIM-R-011 Inspecciòn de extintores	1										1	1							1							
GIM-R-012 Inspecciòn de Kit control derrame	1										1	1							1							
GIM-R-018 Inspecciòn de elementos de proteccion personal			1										1								1	1				
GIM-R-019 Inspeccion de orden y aseo draga y equipo de apoyo			1										1								1	1				
GIM-R-021 Inspecciòn de señalizaciòn			1				1						1				1	1			1	1			1	1
GIM-R.022 Inspecciòn de botiquin	1										1	1							1							
GIM-R-023 Inspección orden y aseo			1										1								1	1				
GIM-R-033 Inspeccion orden y aseo oficinas			1										1								1	1				
GIM-R-064 Inspeccion camilla	1										1	1							1							
GIM-R-073 Inspeccion orden y aseo campamentos			1										1								1	1				
GIM-R-074 Inspeccion para manejo de puntales					1	0									1	0							1	0		
	30 de junio - 6 de julio		**7 - 13 de julio**		**14 - 20 de julio**		**21 - 27 de julio**		**29 de julio - 3 de agosto**		**4 - 10 de agosto**		**11 - 17 de agosto**		**18 - 24 de agosto**		**25 - 31 de agosto**		**1 - 7 de septiembre**		**8 - 14 de septiembre**		**15 - 21 de septiembre**		**22 - 28 de septiembre**	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	**4**		**6**		**1**		**1**		**4**		**6**		**1**		**1**		**1**		**4**		**6**		**1**		**1**	
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	**0**		**0**		**0**		**0**		**4**		**0**		**0**		**0**		**1**		**0**		**6**		**0**		**1**	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES MENSUALES	**0%**		**0%**		**0%**		**0%**		**100%**		**0%**		**0%**		**0%**		**100%**		**0%**		**100%**		**0%**		**100%**	

	PROGRAMA DE INSPECCIONES	Codigo		GH-PROG-008
		Version		1
		Fecha		2/02/2018

OBJETIVO GENERAL:	Determinar el estado de los elementos de seguridad y de los equipos que hacen parte de la empresa		
ALCANCE	OFICINAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA		
INDICADORES	**CUMPLIMIENTO - META: 90%**	**COBERTURA - META: <=80%**	**EFICACIA: META: control 90% de acciones**
RESPONSABLE	Coordinador HSEQ- Profesional HSE - Ingeniero Ambiental- Vigia HSE		

ACTIVIDADES	29 septiembre - 5 de octubre		6 - 12 octubre		13 - 19 de octubre		20 - 26 de octubre		27 octubre - 2 de noviembre		3 - 9 de noviembre		10 - 16 de noviembre		17 - 23 de noviembre		24 - 30 de noviembre		1 - 7 de diciembre		8 - 14 de diciembre		15 - 21 de diciembre		22 - 28 de diciembre		29-31 de diciembre	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
GIM-R-011 Inspecciòn de extintores			1								1								1									
GIM-R-012 Inspecciòn de Kit control derrame			1								1								1									
GIM-R-018 Inspecciòn de elementos de proteccion personal					1								1								1							
GIM-R-019 Inspeccion de orden y aseo draga y equipo de apoyo					1								1								1							
GIM-R-021 Inspecciòn de señalizaciòn					1				1				1				1				1				1			
GIM-R.022 Inspecciòn de botiquin			1								1								1									
GIM-R-023 Inspección orden y aseo					1								1								1							
GIM-R-033 Inspeccion orden y aseo oficinas					1								1								1							
GIM-R-064 Inspeccion camilla			1								1								1									
GIM-R-073 Inspeccion orden y aseo campamentos					1								1								1							
GIM-R-074 Inspeccion para manejo de puntales							1								1								1					
	6 - 12 octubre		13 - 19 de octubre		20 - 26 de octubre		7 octubre - 2 de noviembr		3 - 9 de noviembre		10 - 16 de noviembre		17 - 23 de noviembre		24 - 30 de noviembre		1 - 7 de diciembre		8 - 14 de diciembre		15 - 21 de diciembre		22 - 28 de diciembre		29-31 de diciembre		29-31 de diciembre	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	4		6		1		1		4		6		1		1		1		4		6		1		1		0	
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES MENSUALES	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%			

ANEXO 4.6.

INSPECCIONES

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	Código: GIM-R-021 Versión: 1 Fecha: 15-08-2024

PROYECTO: Oleoducto - Cruce Hormiga

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 10/11/2025 **EQUIPO/LUGAR** Puente Pepe - Cruce Hormiga

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo	✓			
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro	✓			
3. Estado de la señalización preventiva			✓	
4. Estado de la señalización reglamentaria	✓			
5. Estado de la señalización prohibitiva	✓			
6. Estado de la señalización informativa	✓			
7. El extintor cuenta con señalización	✓			
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada				✓
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.	✓			
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo			✓	
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados	✓			
12. Estado de las rutas de evacuación.			✓	
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.		✓		
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.				✓

BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica

Observaciones: Señalizar cinta de ruta de evacuación deficientes. Los señalizaciones (extintores) de los recipientes para almacenar sustancias químicas se encuentran deterioradas

Nombre de quien Inspecciona: Yeraldy Pardo Hernandez

Cargo: Vigia HSE

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	**Código: GIM-R-021** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

PROYECTO: C Gsu4 - Caño Hondo

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 10/11/2025 **EQUIPO/LUGAR** Box culvert #4 C. Hondo

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo			✓	
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro			✓	
3. Estado de la señalización preventiva		✓		
4. Estado de la señalización reglamentaria			✓	
5. Estado de la señalización prohibitiva			✓	
6. Estado de la señalización informativa			✓	
7. El extintor cuenta con señalización			✓	
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada				✓
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.				✓
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo			✓	
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados			✓	
12. Estado de las rutas de evacuación.			✓	
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.	✓			
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.				✓

BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica

Observaciones: se requiere de ubicación de señalización de peligo de excavación profunda para complementar la delimitación y señalización con cinta, señalización reglamentaria, prohibitiva e informativa suficientes.

Nombre de quien Inspecciona: Yeraldy Polo Serrano

Cargo: Vigía HSE

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	**Código: GIM-R-021** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

PROYECTO: CGSM4 - Caño Honda

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 10/11/2025 **EQUIPO/LUGAR** Box culvert #1 Caño Honda

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo			✓	
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro			✓	
3. Estado de la señalización preventiva		✓		
4. Estado de la señalización reglamentaria			✓	
5. Estado de la señalización prohibitiva			✓	
6. Estado de la señalización informativa			✓	
7. El extintor cuenta con señalización			✓	
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada				✓
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.				✓
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo			✓	
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados			✓	
12. Estado de las rutas de evacuación.			✓	
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.	✓			
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.				✓

BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica

Observaciones: Se requiere de ubicación de Señalización de peligro caimanera profunda para complementar la delimitación y Señalización con cinta. Señalización reglamentaria, prohibitiva e informativa deficientes.

Nombre de quien Inspecciona: Yesenia Polo Navarro

Cargo: Vigia HSE

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE BOTIQUINES	CODIGO: GIM-R-022
B&P		VERSIÓN: 1
		FECHA: 15.08.2024

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Yesenia Pabon Navarro — CARGO: Vigia HSE

PROYECTO: CBS 44 - Santa Marta — UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Punta Rocas

FECHA DE INSPECCION: 02/11/2025

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA PUNTO BASE Y DRAGA	CANTIDAD REQUERIDA REMOLCADOR, LANCHA, EXCAVADORA, VEHICULOS, OFICINA	CANTIDAD DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Gasa esteril	Paquete	20	10	16		B		8 vencen el 01/11/29 6 el 23/10/29 y 2 vencen el 29/09/29
Esparadrapo microporo	Rollo x 4"	1	0	1	27/09/28	B		Disponible una de tela de 4" x 2 yd
Esparadrapo microporo	Rollo x 2"	0	1	1	31/08/29	B		Disponible otra de 1" x 2 yd
Bajalenguas	Paquete x 20	1	1	14 und	01/08/28	B		
Guantes esteril	Par	4	4	0				Disponibles en caja
Venda elastica 2" X 5 yardas	Unidad	1	0	1	18/10/28	B		
Venda elastica 3" X 5 yardas	Unidad	1	1	1	18/05/28	B		
Venda elastica 5" x 5 yardas	Unidad	1	0	1	07/06/29	B		
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 120 ml	1	0	1	07/05/27	B		
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 60 ml	0	1	0	/	/	/	NO Aplica
Solucion salina	Bolsa x 500 cc	1	1	2	07/06/26	B		Disponible 2 und
Termometro digital	Unidad	1	0	1		B		
Alcohol antiseptico	Frasco 120 ml	1	1	1	07/02/28	B		
Apositos o compresas no esteriles	Unidad	5	2	4	20/10/29	B		Falta 1 und
Tijera punta roma	Unidad	1	1	0	/	/	/	No hay disponible
Curas	Unidad	10	10	4		B		Faltan 6 und
Kit de inmovilizadores para adulto *	Unidad	1	0	1		B		

Powered by CamScanner

B&P	INSPECCION DE BOTIQUINES	CODIGO: GIM-R-022 VERSIÓN: 1 FECHA: 15-08-2024

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Yeraldy Peña Navarro | CARGO: Vigia HSE

PROYECTO: CGSM4 - Caño Hondo | UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: C.P 313

FECHA DE INSPECCION: 03/11/2025

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA PUNTO BASE Y DRAGA	CANTIDAD REQUERIDA REMOLCADOR, LANCHA, EXCAVADORA, VEHICULOS, OFICINA	CANTIDAD DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Gasa esteril	Paquete	20	10	10	25/07/29	B		
Esparadrapo microporo	Rollo x 4"	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Esparadrapo microporo	Rollo x 2"	0	1	1	11/11/29	B		
Baja lenguas	Paquete x 20	1	1	1	07/08/29	B		
Guantes esteril	Par	4	4	4	25/03/30	B		
Venda elastica 2" X 5 yardas	Unidad	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Venda elastica 3" X 5 yardas	Unidad	1	1	1	28/10/29	B		
Venda elastica 5" x 5 yardas	Unidad	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 120 ml	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 60 ml	0	1	1	07/04/27	B		
Solucion salina	Bolsa x 500 cc	1	1	1	07/07/27	B		
Termometro digital	Unidad	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Alcohol antiseptico	Frasco 120 ml	1	1	1	07/02/28	B		
Apositos o compresas no esteriles	Unidad	5	2	2	07/06/27	B		
Tijera punta roma	Unidad	1	1	0	/	/	/	No hay disponible
Curas	Unidad	10	10	8		B		Faltan 2 und
Kit de inmovilizadores para adulto *	Unidad	1	0	0	/	/	/	No Aplica

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE BOTIQUINES	CODIGO: GIM-R-022
B&P		VERSIÓN: 1
		FECHA: 15-08-2024

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Yesuly Polo Navarro | CARGO: Vigia HSE

PROYECTO: Cesar - Coão Hondo | UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Cat 325

FECHA DE INSPECCION: 03/11/2025

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA PUNTO BASE Y DRAGA	CANTIDAD REQUERIDA REMOLCADOR, LANCHA, EXCAVADORA, VEHICULOS, OFICINA	CANTIDAD DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Gasa esteril	Paquete	20	10	10	04/11/29	B		
Esparadrapo microporo	Rollo x 4"	1	0	0				No Aplica
Esparadrapo microporo	Rollo x 2"	0	1	1	07/06/27	B		Disponible uno de 1/2 x 10 yd
Bajalenguas	Paquete x 20	1	1	19 und	17/04/29	B		Disponible solo 19 und
Guantes esteril	Par	4	4	4	25/03/30	B		
Venda elastica 2" X 5 yardas	Unidad	1	0	0				No Aplica
Venda elastica 3" X 5 yardas	Unidad	1	1	1	28/10/29	B		
Venda elastica 5" x 5 yardas	Unidad	1	0	0				No Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 120 ml	1	0	0				No Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 60 ml	0	1	1	07/04/27	B		
Solucion salina	Bolsa x 500 cc	1	1	1	07/05/27	B		
Termometro digital	Unidad	1	0	0				No Aplica
Alcohol antiseptico	Frasco 120 ml	1	1	1	07/03/28	B		
Apositos o compresas no esteriles	Unidad	5	2	0				No hay disponible Solo 2 und
Tijera punta roma	Unidad	1	1	0				no hay disponible
Curas	Unidad	10	10	10		B		
Kit de inmovilizadores para adulto *	Unidad	1	0	0				No Aplica

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE BOTIQUINES	CODIGO: GIM-R-022
B&P		VERSIÓN: 1
		FECHA: 15-08-2024

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Yesenia Pabon Navarro — CARGO: Vigia HSE

PROYECTO: C 6544 - Caño Limón — UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Cat 345

FECHA DE INSPECCION: 03/11/2025

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA PUNTO BASE Y DRAGA	CANTIDAD REQUERIDA REMOLCADOR, LANCHA, EXCAVADORA, VEHICULOS, OFICINA	CANTIDAD DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Gasa esteril	Paquete	20	10	10	04/11/29	B		
Esparadrapo microporo	Rollo x 4"	1	0	0				No Aplica
Esparadrapo microporo	Rollo x 2"	0	1	1	31/08/29	B		Disponible uno de 1" x 3 yd
Baseñoles	Paquete x 20	1	1	1	01/08/29	B		
Guantes esteril	Par	4	4	4	17/02/30	B		
Venda elastica 3" X 5 yardas	Unidad	1	0	0				No Aplica
Venda elastica 3" X 5 yardas	Unidad	1	1	1	28/10/29	B		
Venda elastica 5" x 5 yardas	Unidad	1	0	0				No Aplica
Jabon espuma o jabon quirurgico	Unidad x 120 ml	1	0	0				No Aplica
Jabon espuma o jabon quirurgico	Unidad x 60 ml	0	1	1	01/04/27	B		
Solucion salina	Bolsa x 500 cc	1	1	1	01/05/27	B		
Termometro digital	Unidad	1	0	0				No Aplica
Alcohol antiseptico	Frasco 120 ml	1	1	1	01/03/28	B		
Apositos o compresas no esteriles	Unidad	5	2	0				No hay disponibles Bien 2 und
Tijera punta roma	Unidad	1	1	0				No tiene
Curas	Unidad	10	10	10		B		
Kit de inmovilizadores para adulto	Unidad	1	0	0				No Aplica

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE BOTIQUINES	CODIGO: GIM-R-022
B&P		VERSIÓN: 1
		FECHA: 15-08-2024

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Yesenia Pabon Navarro	CARGO: Virgen HSE
PROYECTO: CBS14 - Caño Hondo	UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: PHD 05
FECHA DE INSPECCION: 03/11/2025	

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA PUNTO BASE Y DRAGA	CANTIDAD REQUERIDA REMOLCADOR, LANCHA, EXCAVADORA, VEHICULOS, OFICINA	CANTIDAD DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Gasa esteril	Paquete	20	10	7	25/07/29	B		Faltan 3 und
Esparadrapo microporo	Rollo x 4"	1	0	0				NO Aplica
Esparadrapo microporo	Rollo x 2 "	0	1	1	05/07/29	B		Disponible una de 1" X 3 yd
Bajalenguas	Paquete x 20	1	1	1	07/09/28	B		
Guantes esteril	Par	4	4	3	30/08/26	B		Falta 1 par
Venda elastica 2" X 5 yardas	Unidad	1	0	0				NO Aplica
Venda elastica 3" X 5 yardas	Unidad	1	1	1	28/10/29	B		
Venda elastica 5" x 5 yardas	Unidad	1	0	0				NO Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 120 ml	1	0	0				NO Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 60 ml	0	1	0				No tiene es 1 und
Solucion salina	Bolsa x 500 cc	1	1	1	07/07/26	B		
Termometro digital	Unidad	1	0	0				NO Aplica
Alcohol antiseptico	Frasco 120 ml	1	1	1	07/07/26	B		
Apositos o compresas no esteriles	Unidad	5	2	0				No hay disponibilidad Son 2 und
Tijera punta roma	Unidad	1	1	1		B		
Curas	Unidad	10	10	10	08/09/29	B		
Kit de inmovilizadores para adulto *	Unidad	1	0	0				NO Aplica

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE BOTIQUINES	CODIGO: GIM-R-022
B&P		VERSIÓN: 1
		FECHA: 15-08-2024

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Yesuth Palomeque — CARGO: Vigia HSE

PROYECTO: CBS44- Coiin Hondo — UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Cub PHOCA

FECHA DE INSPECCION: 03/11/2025

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA PUNTO BASE Y DRAGA	CANTIDAD REQUERIDA REMOLCADOR, LANCHA, EXCAVADORA, VEHICULOS, OFICINA	CANTIDAD DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Gasa esteril	Paquete	20	10	10	27/01/29	B		
Esparadrapo microporo	Rollo x 4"	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Esparadrapo microporo	Rollo x 2 "	0	1	1	31/08/29	B		Disponible uno de 1" x 3 yd
Bajalenguas	Paquete x 20	1	1	1		B		
Guantes esteril	Par	4	4	0			M	Hay varios en una bolsa roja amarillo
Venda elastica 2" X 5 yardas	Unidad	1	0	1	07/03/26	B		Disponible una
Venda elastica 3" X 5 yardas	Unidad	1	1	0				no hay disponibilidad
Venda elastica 5" x 5 yardas	Unidad	1	0	1	07/02/26	B		Disponible una
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 120 ml	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 60 ml	0	1	1	07/04/27	B		
Solucion salina	Bolsa x 500 cc	1	1	1	07/06/26	B		
Termometro digital	Unidad	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Alcohol antiseptico	Frasco 120 ml	1	1	1	07/03/28	B		
Apositos o compresas no esteriles	Unidad	5	2	0	/	/	/	No hay disponibilidad son 2 unid
Tijera punta roma	Unidad	1	1	1		B		
Curas	Unidad	10	10	10		B		
Kit de inmovilizadores para adulto "	Unidad	1	0	0	/	/	/	No Aplica

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE BOTIQUINES	CODIGO: GIM-R-022
B&P		VERSIÓN: 1
		FECHA: 15-08-2024

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Yesuth Polo Hernandez — CARGO: Vigia HSE

PROYECTO: CC544 - Coño Hondo — UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Dec San 340

FECHA DE INSPECCION: 03/11/2025

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA PUNTO BASE Y DRAGA	CANTIDAD REQUERIDA REMOLCADOR, LANCHA, EXCAVADORA, VEHICULOS, OFICINA	CANTIDAD DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Gasa esteril	Paquete	20	10	10	04/11/24	B		
Esparadrapo microporo	Rollo x 4"	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Esparadrapo microporo	Rollo x 2"	0	1	1	11/11/29	B		Disponible uno de 1" x 5 Yds
Bajalenguas	Paquete x 20	1	1	1	01/08/29	B		
Guantes esteril	Par	4	4	4	25/03/30	B		
Venda elastica 2" X 5 yardas	Unidad	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Venda elastica 3" X 5 yardas	Unidad	1	1	1	28/10/29	B		
Venda elastica 5" x 5 yardas	Unidad	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 120 ml	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 60 ml	0	1	1	07/04/27	B		
Solucion salina	Bolsa x 500 cc	1	1	1	07/05/07	B		
Termometro digital	Unidad	1	0	0	/	/	/	No Aplica
Alcohol antiseptico	Frasco 120 ml	1	1	1	07/04/28	B		
Apositos o compresas no esteriles	Unidad	5	2	0				No hay disponibilidad en la unidad
Tijera punta roma	Unidad	1	1	0				No tiene
Curas	Unidad	10	10	14		B		Tiene 4 und de mas
Kit de inmovilizadores para adulto *	Unidad	1	0	0	/	/	/	No Aplica

Powered by CamScanner

BHP	**INSPECCION DE CAMILLAS**	CODIGO: GIM-R-064 VERSIÓN: 1 FECHA: 15-08-2024

NOMBRE DE QUIEN INSPECIONA: yesmit Polo Navarro CARGO: Virgo HSE

PROYECTO: CB544- Cañu Hondo

FECHA DE INSPECCIÓN	UBICACIÓN DE LA CAMILLA	Instalación (sitio de ubicación)	Señalización	Estado del soporte	Sujetadores de agarre	Soporte para el cuello	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
03/11/2025	Punto Base	B	B	M	B	B	La camilla no cuenta con soporte

B	Buen estado
M	Mal estado
NA	No aplica

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCIÓN DE EXTINTORES**	Código: GIM-R-011 Versión: 1 Fecha: 15-08-2024

PROYECTO	CBS44- Caño Hondo
FECHA DE LA INSPECCIÓN	03/11/2025

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: **B:** BUENO **R:** REGULAR **M:** MALO

Tipo Extintor	Ubicación	Capacidad	Estado									Fecha de última recarga (dd/mm/aaaa)	Observaciones
			Manometro	Pasador de seguridad	Manguera	Boquilla	Manija	Pintura	Señalización	Cilindro	Acceso	Visibilidad	
Multipropósito ABC	Punto Base	20 LB	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	07/02/25	
"	Cat 345	20 LB	B	B	N/A	B	B	B		B	M	M	07/02/25	Sin señalización cuenta con gráfico dicho señalización no visible
"	Cat 323	10 LB	B	B	N/A	B	B	B		B	M	M	07/08/25	"
"	Cat PHD08	10 LB	B	B	N/A	B	B	B		B	M	M	07/06/25	"
"	Cat 325	20 LB	B	B	N/A	B	B	B		B	M	M	07/09/25	"
"	Doosan 340	20 LB	B	B	N/A	B	B	B		B	M	M	07/08/25	"
"	Cat PHD 05	20 LB	B	B	N/A	B	B	B		B	M	M	07/08/25	"

INSPECCIONADO POR: yesenia Polo Moreno **FIRMA:** yesenia polo m.

Powered by CamScanner

B&P	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Salamina Magdalena

PROYECTO: CG 514 - Cruce Hocol

FECHA		10/11/2025			10/11/2025			10/11/2025			10/11/2025		
NOMBRE DEL TRABAJADOR		Pedro Wilches			Deiby Cardenas			Cindy Barrera			Yesith Polo		
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA	✓				✓		✓			✓		
	PANTALON		✓		✓			✓			✓		
	CALZADO	✓				✓		✓			✓		
CABEZA	CASCO	✓			✓			✓			✓		
	ALERON PARA CASCO	✓			✓			✓					
VISUAL	GAFAS CLARAS												
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				✓						✓		
	GAFAS OSCURAS							✓					
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE	✓			✓			✓			✓		
	CHALECO SALVAVIDAS												
	PITO PARA CHALECO												
	LUZ PARA CHALECO												
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO		✓		✓								
	POLIURETANO	✓			✓						✓		
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION	✓			✓						✓		
	COPA			✓									
FACIAL	ESCAFANDRA				✓						✓		
	CARETA DE ESMERILA			✓			✓						✓
PIES	BOTA PANTANERA	✓			✓			✓			✓		
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓			✓		✓				✓
	GAFAS DE OXICORTE			✓			✓		✓				✓
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓			✓		✓				✓
	FILTROS			✓			✓		✓				✓
	MANGAS DE CARNAZA			✓			✓		✓				✓
	GUANTES SOLDADOR			✓			✓		✓				✓
	DELANTAL DE CUERO			✓			✓		✓				✓
	POLAINAS			✓			✓		✓				✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	yesith polo nuvan
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	yesith polo N

Powered by CamScanner

BnP	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Soluciones Hospitalarias

PROYECTO: 8054 - Cañaveralejo

		FECHA			11/11/2025			11/11/2025			11/11/2025		
		NOMBRE DEL TRABAJADOR			Silvestre B			Daniel Cuesta			Jonathan Pitilla		
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA	✓			✓			✓					
	PANTALON	✓			✓				✓			✓	
	CALZADO					✓		✓				✓	
CABEZA	CASCO	✓			✓			✓				✓	
	ALERON PARA CASCO	✓			✓			✓					
VISUAL	GAFAS CLARAS												
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS	✓			✓				✓				
	GAFAS OSCURAS												
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE	✓			✓			✓					
	CHALECO SALVAVIDAS												
	PITO PARA CHALECO												
	LUZ PARA CHALECO												
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO				✓			✓					
	POLIURETANO	✓			✓								
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION												
	COPA												
FACIAL	ESCAFANDRA	✓			✓			✓					
	CARETA DE ESMERILA												
PIES	BOTA PANTANERA	✓											
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	GAFAS DE OXICORTE			✓			✓			✓			✓
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓			✓			✓			✓
	FILTROS			✓			✓			✓			✓
	MANGAS DE CARNAZA			✓			✓			✓			✓
	GUANTES SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	DELANTAL DE CUERO			✓			✓			✓			✓
	POLAINAS			✓			✓			✓			✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesith Polo Navarro
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesith Polo N

Powered by CamScanner

	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO	GIM-F-018
		VERSION	5
		FECHA	1/06/2025

CIUDAD: Salamina Magdalena

PROYECTO: OBRA - Casa Mundo

TIPO DE PROTECCION	EPP	FECHA	11/11/2025			11/11/2025			11/11/2025			11/11/2025		
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jesus Palacio			Felix Valencia			Francisco Martinez			Alfonso Ibañez		
			BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA			✓		✓			✓			✓		
	PANTALON			✓		✓			✓			✓		
	CALZADO		✓			✓			✓			✓		
CABEZA	CASCO		✓			✓			✓			✓		
	ALERON PARA CASCO													
VISUAL	GAFAS CLARAS													
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS					✓			✓					
	GAFAS OSCURAS		✓											
	MONOGAFAS													
CORPORAL	IMPERMEABLE		✓											
	CHALECO SALVAVIDAS													
	PITO PARA CHALECO													
	LUZ PARA CHALECO													
DE MANOS	CARNAZA													
	INDUSTRIAL													
	TIPO INGENIERO													
	POLIURETANO					✓								
	HYCROM													
AUDITIVA	INSERCION													
	COPA					✓								
FACIAL	ESCAFANDRA					✓								
	CARETA DE ESMERILA							✓						
PIES	BOTA PANTANERA		✓											
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				✓			✓			✓			✓
	GAFAS DE OXICORTE				✓			✓			✓			✓
	PROTECCION RESPIRATORIA				✓			✓			✓			✓
	FILTROS				✓			✓			✓			✓
	MANGAS DE CARNAZA				✓			✓			✓			✓
	GUANTES SOLDADOR				✓			✓			✓			✓
	DELANTAL DE CUERO				✓			✓			✓			✓
	POLAINAS				✓			✓			✓			✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuito Palo Navarro
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuito Palo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN	INSPECION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 7 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Sabanima Magdalena

PROYECTO: C Esun- Caño Hondo

FECHA				11/11/2025								
NOMBRE DEL TRABAJADOR		Amando Pacs			Richard Arrieta							
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA	✓			✓								
	PANTALON	✓			✓								
	CALZADO	✓			✓								
CABEZA	CASCO	✓			✓								
	ALERON PARA CASCO												
VISUAL	GAFAS CLARAS												
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				✓								
	GAFAS OSCURAS	✓											
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE	✓			✓								
	CHALECO SALVAVIDAS												
	PITO PARA CHALECO												
	LUZ PARA CHALECO												
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO												
	POLIURETANO	✓			✓								
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION												
	COPA	✓			✓								
FACIAL	ESCAFANDRA	✓			✓								
	CARETA DE ESMERILA			✓									
PIES	BOTA PANTANERA	✓			✓								
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR												
	GAFAS DE OXICORTE												
	PROTECCION RESPIRATORIA												
	FILTROS												
	MANGAS DE CARNAZA												
	GUANTES SOLDADOR												
	DELANTAL DE CUERO												
	POLAINAS												

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	yesuth polo navarro
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	yesuth polo n

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE KIT CONTROL DERRAME	Codigo: GIM-R-012 Version: 1 Fecha: 15.08.2024

PROYECTO: CBMN - Cerro Negro

FECHA: 03/11/2025

UBICACIÓN	ELEMENTOS DEL KIT (marcar con X si esta dentro del kit o dejar en blanco si no esta)														OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	PAÑOS ABSORVENTES	MAT. ABSOR.	BARRERAS	ALMOHADILLAS	JABON DESENGRASANTE	CINTA DE SEÑALIZACION	CEPILLO	PALA	BOLSA ROJA	MASILLA EPOXICA	GUANTES NITRILO	MASCARILLA	GAFAS	MALETIN	
Cat 323	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	Sin Bolsas Sin Cepillo
Punto Base	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	Sin almohadillas ni cinta de señalizacion
Doosan 340	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	Sin Cepillo Sin Bolsas
Cat 325	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	No tiene cepillo
Cat 345	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	No tiene cepillo
Cat PAD 05	X	X	X		X	X		X	X		X		X	X	Sin almohadillas ni cinta de señalizacion
Cat PAD 08	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sin almohadillas ni cinta de señalizacion
Doosan 225															No tiene Kit

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Yesenia Polo Navarro

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA: Yesenia Polo N

Powered by CamScanner

BaP	INSPECCION ELEMENTOS PARA MANEJO DE PUNTALES	CÓDIGO: GIM-R-074 VERSIÓN: 1 FECHA: 15-08-2024

FECHA: 17/11/2025 INSPECCIONADO POR: Yesenia Pola Navarro

PROYECTO: C 6544- Cañaveral

CABLES DE ACERO	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Tiene su identificacion (peso , toneladas, mts, etc)?			✓	
¿Sin cortaduras ni roturas?			✓	
¿Estan libres de cocas y distorsion de alambres y torones?			✓	
¿Estan libres de corrosion?			✓	
¿Estan lubricados adecuadamente, sin signos de sequedad?			✓	
¿Sin fatiga ni picadura de hebras			✓	
¿Sin estiramiento o alargue del cable?			✓	
¿Condicion adecuada del alma o soporte central?			✓	
Otros			✓	
GANCHOS				
¿Tiene su identificacion (peso , toneladas, mts, etc)?			✓	
¿Cuenta con cierre de seguridad?			✓	
¿Sin desgaste/deformacion?			✓	
¿Sin grietas/fisuras?			✓	
¿Cuenta con certificacion?			✓	
Otros			✓	
GRILLETES				
¿Tiene su identificacion (peso , toneladas, mts, etc)?			✓	
¿Se encuentra sin deformacion?			✓	
¿Se encuentran libres de oxidacion, corrosion?			✓	
¿Poseen pines de seguridad en los extermos del pasador?			✓	
¿El pasador se encuentra sin desgaste, deformacion, estiramiento?			✓	
¿La apertura de la boca es adecuda?			✓	
¿Puntos de resistencia sin deformacion?			✓	
¿Cuenta con certificacion?			✓	
Otros			✓	
ESLINGAS				
¿Tiene su identificacion (peso , toneladas, mts, etc)?			✓	
¿Cuenta con certificacion?			✓	
¿Presenta bordes, ganda y ojales con deshilachamiento importante de fibras?			✓	
¿Presenta aspectos fisicos de deformaciones, retorcida o anudada?			✓	
Otros			✓	

Powered by CamScanner

BAP	**INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO**	CÓDIGO: GIM-R-023 VERSIÓN: 1 FECHA: 15-08-2024

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

FECHA: 10/11/2025	**INSPECCIONADO POR:** yesuth pola navarro
CIUDAD: Salamina Magdalena	**PROYECTO:** CPS144- Cerro Hondo

AREA DE TRABAJO Y PUNTO DE MANDO UNIFICADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿La carpa se encuentra limpia, despejada de herramientas o residuos quimicos y sólidos?	✓			
¿Las areas se encuentran libres de obstáculos que permitan el fácil acceso hacia otros lugares de trabajo, entradas y salidas?	✓			
¿Los suelos se encuentran limpios, sin presencia de materiales, herramientas, aceites u otros?	✓			
¿Existen canecas o depósitos de basura en el puesto de trabajo o centro de acopio para los trabajos?	✓			
¿Al terminar la jornana laboral se deja la estación de trabajo limpia y libres de obstáculos?	✓			
¿Se cuenta con lavamanos?		✓		
¿Se cuenta con botiquin de primeros auxilios?	✓			
¿Se cuenta con camilla?	✓			
¿Se cuenta con extintor?	✓			
¿Se cuenta con kit control derrame?	✓			
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS				
¿Se encuentran almacenado los residuos de la manera adecuada según matriz de compatibilidad?	✓			
¿El almacenamiento de materiales peligrosos cumple con las normas de seguridad , acompañada con rótulos y fichas de seguridad correspondiente?	✓			
¿Al finalizar las tareas el área de trabajo permanece limpia, sin desechos, herramientas y otros?	✓			
MAQUINARIA Y EQUIPO				
¿Se encuentra limpio y ordenadas de buena manera?	✓			
¿Se observan derrames de aceite, grasa u otro liquido?	✓			
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO				
¿Se encuentran almacenada las sustancias quimicas de la manera adecuada según especificaciones?	✓			
¿Se colocan las herramientas en su lugar al finalizar las tareas?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran limpios?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran en buenas condiciones?	✓			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
¿Los equipos de protección personal se encuentran limpios , ordenados y en buen estado?	✓			
¿Los equipos de protección personal se encuentran en buen estado?	✓			
¿Se utilizan los equipo de proteccion personal de la forma adecuada?	✓			

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO**	CÓDIGO: GIM-R-023 VERSIÓN: 1 FECHA: 15-08-2024

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

FECHA: 10/11/2025	INSPECCIONADO POR: Jairo Peña Jimenez
CIUDAD: Sabanalarga Atlantico	PROYECTO: Gas Natural - Suministro B&P #4

AREA DE TRABAJO Y PUNTO DE MANDO UNIFICADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿La carpa se encuentra limpia, despejada de herramientas o residuos químicos y sólidos?			✓	El area de trabajo B&P #4 no cuenta con carpa
¿Las areas se encuentran libres de obstáculos que permitan el fácil acceso hacia otros lugares de trabajo, entradas y salidas?	✓			
¿Los suelos se encuentran limpios, sin presencia de materiales, herramientas, aceites u otros?	✓			
¿Existen canecas o depósitos de basura en el puesto de trabajo o centro de acopio para los trabajos?	✓			
¿Al terminar la jornada laboral se deja la estación de trabajo limpia y libres de obstaculos?	✓			
¿Se cuenta con lavamanos?		✓		
¿Se cuenta con botiquin de primeros auxilios?		✓		
¿Se cuenta con camilla?		✓		
¿Se cuenta con extintor?		✓		
¿Se cuenta con kit control derrame?		✓		
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS				
¿Se encuentran almacenado los residuos de la manera adecuada según matriz de compatibilidad?	✓			
¿El almacenamiento de materiales peligrosos cumple con las normas de seguridad, acompañada con rótulos y fichas de seguridad correspondiente?		✓		
¿Al finalizar las tareas el área de trabajo permanece limpia, sin desechos, herramientas y otros?	✓			
MAQUINARIA Y EQUIPO				
¿Se encuentra limpio y ordenadas de buena manera?	✓			
¿Se observan derrames de aceite, grasa u otro liquido?		✓		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO				
¿Se encuentran almacenada las sustancias quimicas de la manera adecuada segun especificaciones?	✓			
¿Se colocan las herramientas en su lugar al finalizar las tareas?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran limpios?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran en buenas condiciones?	✓			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
¿Los equipos de protección personal se encuentran limpios, ordenados y en buen estado?	✓			
¿Los equipos de protección personal se encuentran en buen estado?	✓			
¿Se utilizan los equipo de proteccion personal de la forma adecuada?	✓			

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	CÓDIGO: GIM-R-023 VERSIÓN: 1 FECHA: 15-08-2024

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

FECHA: 10/11/2025	INSPECCIONADO POR: Gerardo Pelaez
CIUDAD: Sabaneta - Antioquia	PROYECTO: Box - Santa Monica / Box #7

AREA DE TRABAJO Y PUNTO DE MANDO UNIFICADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿La carpa se encuentra limpia, despejada de herramientas o residuos químicos y sólidos?			✓	Estamos en Proceso Box #7 aun no cuenta con carpa
¿Las areas se encuentran libres de obstáculos que permitan el fácil acceso hacia otros lugares de trabajo, entradas y salidas?	✓			
¿Los suelos se encuentran limpios, sin presencia de materiales, herramientas, aceites u otros?	✓			
¿Existen canecas o depósitos de basura en el puesto de trabajo o centro de acopio para los trabajos?	✓			
¿Al terminar la jornana laboral se deja la estación de trabajo limpia y libres de obstáculos?	✓			
¿Se cuenta con lavamanos?		✓		
¿Se cuenta con botiquin de primeros auxilios?		✓		
¿Se cuenta con camilla?		✓		
¿Se cuenta con extintor?		✓		
¿Se cuenta con kit control derrame?		✓		
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS				
¿Se encuentran almacenado los residuos de la manera adecuada segùn matriz de compatibilidad?	✓			
¿El almacenamiento de materiales peligrosos cumple con las normas de seguridad , acompañada con rótulos y fichas de seguridad correspondiente?		✓		
¿Al finalizar las tareas el área de trabajo permanece limpia, sin desechos, herramientas y otros?	✓			
MAQUINARIA Y EQUIPO				
¿Se encuentra limpio y ordenadas de buena manera?	✓			
¿Se observan derrames de aceite, grasa u otro liquido?		✓		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO				
¿Se encuentran almacenada las sustancias quimicas de la manera adecuada segùn especificaciones?	✓			
¿Se colocan las herramientas en su lugar al finalizar las tareas?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran limpios?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran en buenas condiciones?	✓			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
¿Los equipos de protección personal se encuentran limpios , ordenados y en buen estado?	✓			
¿Los equipos de protección personal se encuentran en buen estado?	✓			
¿Se utilizan los equipo de proteccion personal de la forma adecuada?	✓			

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-R 010
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 03 HASTA 09 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: Cat 320D 05 OPERADOR: [illegible]

PROYECTO: CPS44 - Caño Mondo

ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL		X		X		X									No sirven
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores		X		X		X		X		X					Incompletos
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X					Presenta Fallas
Estado de cabina		X		X		X		X		X					Pastas en general desprendidas
Pito		X		X		X		X		X					No le sirve
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de Puertas		X		X		X		X		X					No se puede cerrar - No tiene chapa
Estado del vidrio frontal		X		X		X		X		X					Está fija
Limpia brisas		X		X		X		X		X					no tiene
Aire acondicionado		X		X		X		X		X					No le Funciona
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓						
Pedales		X		X		X		X		X					Fuga en pedales
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓						
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓						
Freno de servicio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado del picorni y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓						Zapatas se encuentran Flojas
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓						
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓						
Fugas de cualquier tipo		X		X		X		X		X					Fuga en gatos gemelos y de levante
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓						Indicador de ACPM no Funciona
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓						
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓						
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓						
EQUIPO DE EMERGENCIAS	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓						
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓		✓						
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓						

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

FECHA	22/02/2011
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 03 HASTA 07 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: Dx Son 225 OPERADOR: J. S. Herrera

PROYECTO: CBS44 - Caño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL									✓		✓				
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores										X					
Alarma de retroceso										X					
Estado de cabina									✓		✓				
Pito									✓		✓				
Cinturón (es) de seguridad									✓		✓				
Estado de Silla									✓		✓				
Estado de Puertas									✓		✓				
Estado del vidrio frontal									✓		✓				
Limpia brisas										X		X			
Aire acondicionado									✓		✓				
Palancas de mando									✓		✓				
Pedales									✓		✓				
Escaleras y apoyos de acceso									✓		✓				
Tubo de escape									✓		✓				
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde									✓		✓				
Estado del picorril y bujes del brazo									✓		✓				
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion									✓		✓				
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas									✓		✓				
Verificar grietas en el brazo									✓		✓				
Estado de fusibles y fusilera									✓		✓				
Estado de las baterias									✓		✓				
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor									✓		✓				
Nivel de refrigerante									✓		✓				
Estado filtros de aire									✓		✓				
Drenar tanque de combustible									✓		✓				
Nivel de aceite del motor de giro									✓		✓				
Nivel de aceite de traslacion									✓		✓				
Nivel de aceite hidraulico									✓		✓				
Bateria y Cables									✓		✓				
Fugas de cualquier tipo									✓		✓				
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)									✓		✓				
Tensionar cadena si es necesario									✓		✓				
Engrase del equipo									✓		✓				
Compartimiento del motor limpio y aseado									✓		✓				
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin										X		X			No Tiene Baterias
Kit de contencion de derrames										X		X			" Kit de Control de derrame
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)										X		X			No Tiene Extintor

Powered by CamScanner

PANAMERICAN CRUDOS & PETROLEO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GLR-019
FECHA	22/02/2021
VERSION	1

SEMANA DESDE: 03 HASTA 09 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: Cat 313 OPERADOR: Ricardo Ruiz

PROYECTO: CG544- Caño Hondo

ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del vidrio frontal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NO Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del picorril y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Fugas de cualquier tipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horometro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Extinto de 40 LBS

Powered by CamScanner

PANAMERICAN CRYSTAL & PACKAGING

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-R-010
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 03 HASTA 09 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO PC008 OPERADOR Richard Arandia

PROYECTO: Cesar-Cano Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores		X				X		X		X		X			Incompletos
Alarma de retroceso		X				X		X		X		X			Comando dañado
Estado de cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del vidrio frontal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NO Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del picorril y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de fusibles y fussiera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Fugas de cualquier tipo		X	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Fuga por tubería de hierro del sistema hidraulico — solucionado
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Extintor de 10 LBS

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-R.010
FECHA	22/02/2021
VERSION	3

SEMANA DESDE: 10 HASTA 16 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO Doosan 340 OPERADOR Juan Rojas

PROYECTO: CPS44- Caño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso				X		X		X		X		X		X	No Funciona
Estado de cabina				X		X		X		X		X		X	Postas desprendidas
Pito				X		X		X		X		X		X	No Funsiona
Cinturon (es) de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de Silla			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de Puertas			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del vidrio frontal			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas				X		X				X		X		X	No le sirve
Aire acondicionado				X		X	✓		✓		✓		✓		No le funciona - Arreglado
Palancas de mando			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras y apoyos de acceso			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tubo de escape			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde				X		X		X		X		X		X	Pasadores del balde desgastados
Estado del picorri y bujes del brazo				X		X		X		X		X		X	Bujes del brazo desgastados
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas			✓		✓		✓		✓		✓		✓		Le faltan algunas zapatas
Verificar grietas en el brazo			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de fusibles y fusilera			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de las baterias			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECANICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de refrigerante			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado filtros de aire			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Drenar tanque de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite del motor de giro			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite de traslacion			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite hidraulico			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bateria y Cables			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Fugas de cualquier tipo				X		X		X		X		X		X	Fuga en bomba hidraulica
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horometro, aceite-motor)				X		X		X		X		X		X	No Funcionan
Tensionar cadena si es necesario			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Engrase del equipo			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimiento del motor limpio y aseado			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Kit de contencion de derrames			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)			✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Powered by CamScanner

PANAMERICAN BRIDGES & ENGINEERING

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-R-010
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 10 HASTA 16 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: DooSan 225 OPERADOR: A

PROYECTO: C6544 - Cano Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓												
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores		X		X											No tiene
Alarma de retroceso		X		X											No le funciona
Estado de cabina	✓		✓												
Pito	✓		✓												
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓												
Estado de Silla	✓		✓												
Estado de Puertas	✓		✓												
Estado del vidrio frontal	✓		✓												
Limpia brisas		X		X											No tiene
Aire acondicionado	✓		✓												
Palancas de mando	✓		✓												
Pedales	✓		✓												
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓												
Tubo de escape	✓		✓												
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓												
Estado del picorril y bujes del brazo	✓		✓												
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓												
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓												
Verificar grietas en el brazo	✓		✓												
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓												
Estado de las baterias	✓		✓												
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓												
Nivel de refrigerante	✓		✓												
Estado filtros de aire	✓		✓												
Drenar tanque de combustible	✓		✓												
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓												
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓												
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓												
Bateria y Cables	✓		✓												
Fugas de cualquier tipo	✓		✓												Bajo
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante horometro, aceite-motor)	✓		✓												
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓												
Engrase del equipo	✓		✓												
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓												
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin		X		X											No tiene Botiquin
Kit de contencion de derrames		X		X											" Kit de contencion de derrame
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)		X		X											" Extintor

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-R-010
FECHA	22/12/2021
VERSIÓN	1

SEMANA DESDE: 10 HASTA 16 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: PHD05 OPERADOR: [illegible]

PROYECTO: CESU4 - Cano Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL		X		X		X		X		X		X		X	No Prende
CABINA	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Espejos retrovisores		X		X		X		X		X		X		X	Incompletos
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X	Pedazo Faltan
Estado de cabina		X		X		X		X		X		X		X	Partes en general destruidas
Pito		X		X		X		X		X		X		X	No le sirve
Cinturon (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de Silla	✓		✓		✓			X		X		X		X	Esta partida El Soporte
Estado de Puertas		X		X		X		X		X		X		X	No se puede cerrar no tiene Chapa
Estado del vidrio frontal		X		X		X		X		X		X		X	Está Fijo con un bastón sintético
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X		X	No Tiene
Aire acondicionado		X		X		X		X		X		X		X	No funciona
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Tiene fuga
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del picorni y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Zapatas se encuentran Flojas
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Fugas de cualquier tipo		X		X		X		X		X		X		X	Fuga en gatas y cadenas y en Brazo
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Indicadores de Aceite no funcionan
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
EQUIPO DE EMERGENCIAS	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DRILLING & PROCESSING

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GLR-010
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	1

SEMANA DESDE: 10 HASTA 16 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: PHD08 OPERADOR: [illegible]

PROYECTO: 06 sur - Caño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores		X		X		X		X		X					Incompletos 2.
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X					Contenido demandado
Estado de cabina	✓		✓		✓		✓		✓						
Piso	✓		✓		✓		✓		✓						
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado del vidrio frontal	✓		✓		✓		✓		✓						
Limpia brisas	✓		✓		✓		✓		✓						
Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓						
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓						
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓						
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓						
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓						
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No Aplica.
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado del picorril y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓						
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓						
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓						
Fugas de cualquier tipo	✓		✓		✓		✓		✓						
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horometro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓						
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓						
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓						
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓						
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓						
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓		✓						
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓						Extintor de 10 LB 3

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GLP-019
FECHA	15/01/2021
VERSIÓN	1

SEMANA DESDE: 10 HASTA 16 MES: 11 AÑO: 2025 EQUIPO: CAT 323 OPERADOR: Fernando Ruiz

PROYECTO: CESVA - Caño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Espejos retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Piso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cinturon (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del vidrio frontal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del picorni y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Fugas de cualquier tipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horometro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
EQUIPO DE EMERGENCIAS	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Extintor de 10 LBS

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-R-010
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 17 HASTA 23 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: Cat 325 OPERADOR: Alfonso Ibarra

PROYECTO: C6544 - Caño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL						X		X		X		X			Encuentra parcial
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores						X		X		X		X			Incompletos.
Alarma de retroceso					✓		✓		✓		✓				
Estado de cabina						X		X		X		X			
Pito					✓		✓		✓		✓				
Cinturon (es) de seguridad						X		X		X		X			
Estado de Silla						X		X		X		X			Sistema de ajuste no funciona
Estado de Puertas					✓		✓		✓		✓				
Estado del vidrio frontal					✓		✓		✓		✓				Vidrio frontal interno fisurado
Limpia brisas						X		X		X		X			No tiene
Aire acondicionado						X		X	✓		✓				No funciona - Averiado
Palancas de mando						X		X		X		X			Punto neutro no funciona
Pedales					✓		✓		✓		✓				
Escaleras y apoyos de acceso					✓		✓		✓		✓				
Tubo de escape					✓		✓		✓		✓				
Freno de servicio					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde					✓		✓		✓		✓				
Estado del picorril y bujes del brazo					✓		✓		✓		✓				
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion					✓		✓		✓		✓				
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas					✓		✓		✓		✓				
Verificar grietas en el brazo						X		X		X		X			Presenta fisura cerca al picorril
Estado de fusibles y fusilera					✓		✓		✓		✓				
Estado de las baterias					✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor					✓		✓		✓		✓				
Nivel de refrigerante					✓		✓		✓		✓				
Estado filtros de aire					✓		✓		✓		✓				
Drenar tanque de combustible					✓		✓		✓		✓				
Nivel de aceite del motor de giro					✓		✓		✓		✓				
Nivel de aceite de traslacion					✓		✓		✓		✓				
Nivel de aceite hidraulico					✓		✓		✓		✓				
Bateria y Cables					✓		✓		✓		✓				
Fugas de cualquier tipo						X		X		X		X			Pingo en joystick, pedales y bomba de inicio
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)					✓		✓		✓		✓				
Tensionar cadena si es necesario					✓		✓		✓		✓				
Engrase del equipo					✓		✓		✓		✓				
Compartimiento del motor limpio y aseado					✓		✓		✓		✓				
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin					✓		✓		✓		✓				
Kit de contencion de derrames					✓		✓		✓		✓				
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)					✓		✓		✓		✓				

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-R-010
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	1

SEMANA DESDE: 17 HASTA 23 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: Cat 323 OPERADOR: Armando Paez

PROYECTO: CQ544 - Cuño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Espejos retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del vidrio frontal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Limpia brisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del picorril y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Fugas de cualquier tipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
EQUIPO DE EMERGENCIAS	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Extintor de 10LBS

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GLP-019
FECHA	22/03/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 17 HASTA 23 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: Doosan 340 OPERADOR: Juan Cervantes

PROYECTO: CESU4 - Caño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Espejos retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			No Funciona
Estado de cabina		X		X		X		X		X		X			Partes desprendidas
Pito		X		X		X		X		X		X			No Funciona
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del vidrio frontal	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			No le Sirve
Aire acondicionado		X		X		X		X		X		X			
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde		X		X		X		X		X		X			Pasadores del balde desgastados
Estado del picorril y bujes del brazo		X		X		X		X		X		X			Bujes desgastados
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas »	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de las baterias		X		X		X		X		X		X			Baterias no cargan
ESTADO MECÁNICO	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Fugas de cualquier tipo		X		X		X		X		X		X			Fuga en bomba hidraulica
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)		X		X		X		X		X		X			No Funcionan
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
EQUIPO DE EMERGENCIAS	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	**Bueno**	**Malo**	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-P-018
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 17 HASTA 23 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: CAT PA10 OPERADOR: Richard Hernandez

PROYECTO: CGSM4 - Caño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓		✓		✓						✓		
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores		X		X		X								X	Incompletos
Alarma de retroceso		X		X		X								X	Caminos afectado
Estado de cabina	✓		✓		✓		✓						✓		
Pito	✓		✓		✓		✓						✓		
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓						✓		
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓						✓		
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓						✓		
Estado del vidrio frontal	✓		✓		✓		✓						✓		
Limpia brisas	✓		✓		✓		✓						✓		
Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓						✓		
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓						✓		
Pedales	✓		✓		✓		✓						✓		
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓						✓		
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓						✓		
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NO Aplica
Estados de casquillos, cartoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓						✓		
Estado del picorri y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓						✓		
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓						✓		
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓						✓		
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓						✓		
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓						✓		
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓						✓		
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓						✓		
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓						✓		
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓						✓		
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓						✓		
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓						✓		
Nivel de aceite de trasiacion	✓		✓		✓		✓						✓		
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓						✓		
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓						✓		
Fugas de cualquier tipo	✓		✓		✓		✓						✓		
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓						✓		
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓						✓		
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓						✓		
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓						✓		
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin	✓		✓		✓		✓						✓		
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓							X	Kit incompleto
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓						✓		Extintor de 10 LBS

Powered by CamScanner

PANAMERICAN	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS	CODIGO	GI-R-010
		FECHA	22/02/2021
		VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 17 HASTA 23 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: Doosan 225 OPERADOR: Luis Alvarez

PROYECTO: CGSM4- Cerro Negro

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores		X		X		X		X		X		X			No Tiene
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			No Funciona
Estado de cabina	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturon (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del vidrio frontal	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia brisas		X		X		X		X				X			NO Sirve
Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NO Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del picorril y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Fugas de cualquier tipo		X		X		X		X		X		X			Fuga en Pistolas
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin		X		X		X		X		X		X			No Tiene
Kit de contencion de derrames		X		X		X		X		X		X			No Tiene
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)		X		X		X		X		X		X			No Tiene

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GLM-019
FECHA	22/12/2021
VERSION	3

SEMANA DESDE: 17 HASTA 23 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: PHD 05 OPERADOR:

PROYECTO: Cesar - Caño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL		X		X		X		X		X					No encienden
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores		X		X		X		X		X					Incompletos
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X					Presenta Fallas
Estado de cabina		X		X		X		X		X					Partes en general desprendidas
Pito		X		X		X		X		X					No le sirve
Cinturon (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de Silla		X		X		X		X		X					Está Partida
Estado de Puertas		X		X		X		X		X					No se puede cerrar - Sin Chapa
Estado del vidrio frontal		X		X		X		X		X					Está Fijo, sin sistema retractil
Limpia brisas		X		X		X		X		X					No tiene
Aire acondicionado		X		X		X		X		X					No funciona
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓						
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓						Presentan fugas
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓						
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓						
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado del picorni y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas		X		X		X		X		X					Componentes des gastados. Zapatas Flojas
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓						
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓						
Fugas de cualquier tipo		X		X		X		X		X					Fuga en gatos tensores y delantero
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓						Indicadores de ACPM no funciona
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓						
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓						
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓						
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓						
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓		✓						
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓						

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DESIGNS & ENGINEERING

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-R-010
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 24 HASTA 30 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: Cat PHD05 OPERADOR: Felix Valencia

PROYECTO: CBSH4 - Cano Honda

ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL		X		X				X		X		X		X	No encienden
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores		X		X				X		X		X		X	Incompletos
Alarma de retroceso		X		X				X		X		X		X	Presenta Fallas
Estado de cabina		X		X				X		X		X		X	Partes en general desprendidas
Pito		X		X				X		X		X		X	No le Sirve
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Estado de Silla		X		X				X		X		X		X	Está partida
Estado de Puertas		X		X				X		X		X		X	No se puede cerrar - Sin chapa
Estado del vidrio frontal		X		X				X		X		X		X	No ajusta bien y este Fijo - Fisurado
Limpia brisas		X		X				X		X		X		X	No Tiene
Aire acondicionado		X		X	·		✓		✓		✓		✓		No Funciona - Arreglado
Palancas de mando	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Pedales	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Tubo de escape	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Freno de servicio	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Estado del picorril y bujes del brazo	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas		X		X			✓	·	✓		✓		✓		Cojinetes de 3 gusanos, zapatas flojas - Sprocket y bujes con bujes
Verificar grietas en el brazo	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Estado de las baterias	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Nivel de refrigerante	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Estado filtros de aire	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Drenar tanque de combustible	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Bateria y Cables	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Fugas de cualquier tipo		X		X				X		X		X		X	Fuga en gatos y gusanos y de varios retenes
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓				✓		✓		✓		✓		Indicadores de ACPM no Funcionan
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Engrase del equipo	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Kit de contencion de derrames	✓		✓				✓		✓		✓		✓		
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓				✓		✓		✓		✓		

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GLR-019
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 24 HASTA 30 MES 77 AÑO 2025 EQUIPO CAT PHD 08 OPERADOR [illegible]

PROYECTO: CG544 - Caño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores		X		X		X		X							Incompletos, Cambiar el resto para estado
Alarma de retroceso		X		X		X		X							
Estado de cabina	✓		✓		✓		✓		✓						
Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado del vidrio frontal	✓		✓		✓		✓		✓						
Limpia brisas	✓		✓		✓		✓		✓						
Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓						
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓						
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓						
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓						
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓						
Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado del picorri y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓						Rodillos desgastados
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite de trasiacion	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓						
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓						
Fugas de cualquier tipo	✓		✓		✓		✓		✓						
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓						
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓						
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓						
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓						
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓						
Kit de contencion de derrames		X		X		X		X		X					Incompleto en su mayoría
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓						Extintor de 10 LBS

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-R-010
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE 24 HASTA 30 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO CAT 325 OPERADOR [illegible]

PROYECTO. CG 544 - Caño Hondo

ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL		X		X		X		X		X		X		X	En cuanto parcial
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores		X		X		X		X		X		X		X	Incompletos
Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de cabina		X		X		X		X		X		X		X	Puertas sin pretidas
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cinturón (es) de seguridad		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de Silla		X		X		X		X		X		X		X	Sistema de ajuste no Funciona
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del vidrio frontal		X		X		X		X		X		X		X	Vidrio Frontal inferior Fisurado
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X		X	No Tiene
Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Palancas de mando		X		X		X		X		X		X		X	Punto neutro no Funciona
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado del picorril y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Verificar grietas en el brazo		X		X		X		X		X		X		X	Presenta Fisura cerca al picorril
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Fugas de cualquier tipo		X		X		X		X		X		X		X	Fuga en Joystick, pedales y bomba de Vibrador
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-R-010
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 24 HASTA 30 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: DooSan 225 OPERADOR: Juli Herrera

PROYECTO: CPS144 - caño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores		X		X		X		X		X					No tiene
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X					NO Funciona
Estado de cabina	✓		✓		✓		✓		✓						
Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado del vidrio frontal	✓		✓		✓		✓		✓						
Limpia brisas		X		X		X		X		X					No le Sirve
Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓						
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓						
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓						
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓						
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓						
Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado del picorril y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓						
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓						
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓						
Fugas de cualquier tipo		X		X		X		X		X					Fuga en pedales y
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓						
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓						
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓						
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓						
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquín		X		X		X		X		X					No tiene
Kit de contencion de derrames		X		X		X		X		X					No tiene
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)		X		X		X		X		X					No tiene

Powered by CamScanner

PANAMERICAN CIVIL & MINING

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI R-010
FECHA	22/02/2021
VERSION	3

SEMANA DESDE: 24 HASTA 30 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO Daosan 340 OPERADOR Fontenant

PROYECTO: CP544- Cano Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓				✓				✓		✓		
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores	✓		✓				✓				✓		✓		
Alarma de retroceso		X		X				X				X		X	no funciona
Estado de cabina		X		X				X				X		X	puertas desprendidas
Pito		X		X				X				X		X	no funciona
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓				✓				✓		✓		
Estado de Silla	✓		✓				✓				✓		✓		
Estado de Puertas	✓		✓				✓				✓		✓		
Estado del vidrio frontal	✓		✓				✓				✓		✓		
Limpia brisas		X		X				X				X		X	No de Sirve
Aire acondicionado *		X		X				X				X		X	no funciona
Palancas de mando	✓		✓				✓				✓		✓		
Pedales	✓		✓				✓				✓		✓		
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓				✓				✓		✓		
Tubo de escape	✓		✓				✓				✓		✓		
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NO Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde		X		X				X				X		X	Pasadores del balde desgastados
Estado del picorril y bujes del brazo		X		X				X				X		X	Bujes desgastados
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓				✓				✓		✓		
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓				✓				✓		✓		
Verificar grietas en el brazo	✓		✓				✓				✓		✓		
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓				✓				✓		✓		
Estado de las baterias *		X		X			✓				✓		✓		Baterias no cargan - Ya Cargan bien
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓				✓				✓		✓		
Nivel de refrigerante	✓		✓				✓				✓		✓		
Estado filtros de aire	✓		✓				✓				✓		✓		
Drenar tanque de combustible	✓		✓				✓				✓		✓		
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓				✓				✓		✓		
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓				✓				✓		✓		
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓				✓				✓		✓		
Bateria y Cables	✓		✓				✓				✓		✓		
Fugas de cualquier tipo		X		X				X				X		X	Fuga en bomba hidraulica
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horometro, aceite-motor)		X		X				X				X		X	No Funciona
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓				✓				✓		✓		
Engrase del equipo	✓		✓				✓				✓		✓		
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓				✓				✓		✓		
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin	✓		✓				✓				✓		✓		
Kit de contencion de derrames	✓		✓				✓				✓		✓		
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓				✓				✓		✓		

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORAS

CODIGO	GI-R-010
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 24 HASTA 30 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: Cat 313 OPERADOR: Arnulfo Paz

PROYECTO: C6544 - Caño Hondo

ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
LUCES GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Espejos retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓						
Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de cabina	✓		✓		✓		✓		✓						
Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
Cinturón (es) de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de Silla	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de Puertas	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado del vidrio frontal	✓		✓		✓		✓		✓						
Limpia brisas	✓		✓		✓		✓		✓						
Aire acondicionado	✓		✓		✓		✓		✓						
Palancas de mando	✓		✓		✓		✓		✓						
Pedales	✓		✓		✓		✓		✓						
Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓						
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓						
Freno de servicio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	No Aplica
Estados de casquillos, cantoneras, pasadores del brazo / balde	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado del picorril y bujes del brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estados de tornillos, esparragos y demas elementos de sujecion	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de gato tensor, cadenas, rodillos y zapatas	✓		✓		✓		✓		✓						
Verificar grietas en el brazo	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de fusibles y fusilera	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado de las baterias	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECÁNICO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓						
Estado filtros de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
Drenar tanque de combustible	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite del motor de giro	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite de traslacion	✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel de aceite hidraulico	✓		✓		✓		✓		✓						
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓						
Fugas de cualquier tipo	✓		✓		✓		✓		✓						
Indicadores y medidores (hidraulico, refrigerante, horómetro, aceite-motor)	✓		✓		✓		✓		✓						
Tensionar cadena si es necesario	✓		✓		✓		✓		✓						
Engrase del equipo	✓		✓		✓		✓		✓						
Compartimiento del motor limpio y aseado	✓		✓		✓		✓		✓						
EQUIPO DE EMERGENCIAS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓						
Kit de contencion de derrames	✓		✓		✓		✓		✓						
Extintor contra incendios (20 lbs PQS)	✓		✓		✓		✓		✓						Extintor de 10 LBS

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CG544 - Caño Honda PERÍODO: DEL 24 AL 30 DE 2025

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Martillo	Herragro							✓		✓		✓			
Segueta	Herragro							✓		✓		✓			
Pala	Herragro							✓		✓		✓			
Pica	Herragro							✓		✓		✓			
Palin	Herragro							✓		✓		✓			
Rula	Herragro							✓		✓		✓			
Punzon	Herragro							✓		/		✓			

OBSERVACIONES:

Las Herramientas menores Box culvert #1

Inspeccionado por:

FIRMA: yesuth Polo V

NOMBRE: yesuth Vanessa

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DRILLING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO: CGS 44- Cerro Hondo PERÍODO: DEL 24 AL 30 DE 2025

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Martillo	Herogro					✓		✓		✓		✓			
Segueta	Crescen					✓		✓		✓		✓			
Pala	Herrag.o					✓		✓		✓		✓			
Pico	Herragro					✓		✓		✓		✓			
Rodillo	Herragro					✓		✓		✓		✓			
Rula	Herragro					✓		✓		✓		✓			
Pinza	ThomKing					✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

Inspeccionar Herramientas menores Box culvert #4

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuith Pola N

NOMBRE: Yesuith Venero.

Powered by CamScanner

PANAMERICAN	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	Codigo	GI-R-024
		Fecha	1/02/2023
		Versión	1

RPM 100 PROYECTO CQ544- Cañón Hondo OPERADOR Edilfo Castillo

SEMANA DESDE 26 HASTA 30 MES 11 AÑO 2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas							✓		✓		✓				
	Estado del interruptor de encendido y su seguro								✓		✓		✓			Pulidora está directo no le sirve el interruptor
	Estado del accesorio portadiscos							✓		✓		✓				
	Estado del mango fijo y auxiliar							✓		✓		✓				
	Estado del cuerpo (CARCAZA)							✓		✓		✓				
	Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)							✓		✓		✓				
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora							✓		✓		✓				
	Estado general de la guía y la guarda							✓		✓		✓				
	Estado de la plaqueta de identificación								✓		✓		✓			plaqueta Ilegible

yesuith Polo N
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBAS

CÓDIGO	GI-R-013
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 24 HASTA 30 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: _____ OPERADOR: Eduardo Castillo

PROYECTO: COSN4. Coiñ Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
ESTADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE MANGUERA DE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE YOYO DE ARRANQUE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE TUBERÍAS Y ABRAZADERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO GENERAL EXTERIOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
VERIFICACIÓN DE FUGAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADOS DE ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

Yesenia Polo N

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBAS

CÓDIGO	GI-R-013
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: 01 HASTA 07 MES 12 AÑO 2025 EQUIPO: _____ OPERADOR: _____

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
ESTADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE															
NIVEL DE COMBUSTIBLE															
ESTADO DE MANGUERA DE MOTOR															
ESTADO DE YOYO DE ARRANQUE															
ESTADO DE TUBERÍAS Y ABRAZADERAS															
ESTADO GENERAL EXTERIOR															
VERIFICACIÓN DE FUGAS															
ESTADOS DE ACCESORIOS															

Yesenia Polo N

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBAS

CÓDIGO	GI-R-013
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	3

SEMANA DESDE: _____ HASTA _____ MES _____ AÑO _____ EQUIPO: _____ OPERADOR: _____

ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
ESTADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE															
NIVEL DE COMBUSTIBLE															
ESTADO DE MANGUERA DE MOTOR															
ESTADO DE YOYO DE ARRANQUE															
ESTADO DE TUBERÍAS Y ABRAZADERAS															
ESTADO GENERAL EXTERIOR															
VERIFICACIÓN DE FUGAS															
ESTADOS DE ACCESORIOS															

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION PREOPERACIONAL DE EMBARCACIONES MENORES

CÓDIGO	G.R.009
FECHA	22/02/2021
VERSIÓN	4

SEMANA DESDE: 10 HASTA 16 MES 11 AÑO 2025 EQUIPO: Canoa de Lenga OPERADOR:

PROYECTO: Cesar - Caño Hondo

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
INTERNO	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
ESTRUCTURA DE LA EMBARCACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CHALECO SALVAVIDAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
AROS SALVAVIDAS CON CUERDA															No Aplica
ASIENTOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
EXTERNA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
CASCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
BOMBA DE ACHIQUE															No Aplica
ESTADO DE DEFENSAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CARPA															No Aplica
MOTOR FUERA DE BORDA	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
ESTADO EXTERIOR DEL MOTOR															No Aplica
ACEITE TRANSMISIÓN															"
BUJÍAS															"
FILTRO DE ACEITE															"
ACEITE DE MOTOR															"
HORÓMETRO															"
ENCENDIDO															"
HÉLICE															No Aplica
ACCESORIOS	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	
EXTINTORES															No Aplica
KIT ANTI DERRAME															"
KIT DE EMERGENCIA															"
LUCES DE NAVEGACIÓN															"
REMOS		X		X		X		X		X		X		X	Se perdió, se utiliza una palanca

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	07-NOV-2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat 325
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuly Polo Navarro
PROYECTO:	CC 3544 - Caños Mancha
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	105.1 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	07:17:02 am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	07:25:03 am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo **Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora**	Yesuly Polo N. VoBo **Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE**

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	01-NOV-2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cut PAD 08
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Polo Moreno
PROYECTO:	CGS244- Cano Mondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	56 gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	07:12:11 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	07:16:35 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	NO Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones .....

Richard Almanzales
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth Polo M
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	01-Nov-2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Reserva
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuith Polo Navarro
PROYECTO:	C6544- Caño Mondo-
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	433 GLS
HORA INICIO DEL TANQUEO:	07:25:15 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	07:47:09 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	NO Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	/				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuith Polo N
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	07/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Reserva
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesith Polo Navarro
PROYECTO:	PCB544- Cano Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	517 GLS
HORA INICIO DEL TANQUEO:	08:58:07 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	09:23:06 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones .....

VoBo **Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora**	Yesith Polo N VoBo **Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE**

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	07/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat PHD08
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Pedo Navarro
PROYECTO:	Cpo 44 Caño Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	772 GLS
HORA INICIO DEL TANQUEO:	08:40:39 Seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	08:47:13 Seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	NO Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Richard Arrieta Les
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth Pedo Navarro
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	07/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat 323
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth palo navarro
PROYECTO:	CCSU4 - Caño Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	71 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	08:47:23 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	08:52:46 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	no Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingencias y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Armando Paez
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

yesuth palo n
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Sabanas Magdalena
FECHA	12/11/2022
NOMBRE DEL EQUIPO (Draga, Remolcador,Lancha)	[illegible]
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO	[illegible]
PROYECTO	[illegible]
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO	[illegible]
HORA INICIO DEL TANQUEO	[illegible]
HORA FINAL DEL TANQUEO	[illegible]

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS					no Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

[illegible]
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

[illegible]
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Sabanas Magdalena
FECHA:	12/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Dan Jose 340
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Jesus Polo Navarro
PROYECTO:	CC544 - Caño Mundo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	66 G
HORA INICIO DEL TANQUEO:	10:16:33 am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	10:43:27 segam

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	no Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones .....

Frans Camargo
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesus Polo N
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-015 FECHA 25/01/2017 VERSION 2

CIUDAD:	Sabanas Magdalena
FECHA:	12/11/2020
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat 313
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesid Pedro Arango
PROYECTO:	CC-114 - Casa Nueva
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	23 GLS
HORA INICIO DEL TANQUEO:	10:52:54 segundos
HORA FINAL DEL TANQUEO:	10:57:42 segundos

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	✓	✓	✓	✓	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingencias y conoce del mismo	✓		✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Armando Paez
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesid Pedro
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien Inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Buenaventura
FECHA:	26/11/25
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Remolcador
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO	Jesus Pedro Arango
PROYECTO:	Obras Varias Manzanillo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	547 GLS
HORA INICIO DEL TANQUEO	11:58:18 pm
HORA FINAL DEL TANQUEO	11:23:59 pm

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado de pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion de etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado de numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado de numero CAS	✓	✓	✓	✓	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingencias y conoce del mismo			✓		
12	Estado de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Salamina Magdalena
FECHA:	22/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Bulldozer D6H
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Polo Navarro
PROYECTO:	CGSM4 - Cuña Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	41 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	11:44:35 Seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	11:53:15 Seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado de: pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Taneta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	/				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

VoBo Yesuth Polo N
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Solamar Magdalena
FECHA:	22/11/2015
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Reserva
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	yesuith palo navarro
PROYECTO:	C6544- Caños Mamba
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	105 gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	11:53:29 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	12:01:27 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

VoBo yesuith palo n
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Sabanas Magdalena
FECHA:	13/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Reserva
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO	Yesuith Polo Navarro
PROYECTO:	Cpsm - Cerro Tasajo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	424 GLS
HORA INICIO DEL TANQUEO:	09:26:37 segundos am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	09:50:35 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	no aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

VoBo Yesuith polo n
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Sabanas Magdalena
FECHA:	18/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	CAT 323
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO	Yesuith Polo Vaquero
PROYECTO:	CBSAG - Cano Mosquito
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	61 gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	07:12:46 say am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	07:14:12 say am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condición de etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado de numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado de numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga de combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingencias y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de nivel de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Armando La Paz
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuith Polo V
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Salamina Magdalena
FECHA:	18/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cot PHD 08
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuith Polo Navarro
PROYECTO:	C6544 - Caño Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	702 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	09:50:53 Segundos
HORA FINAL DEL TANQUEO:	09:05:11 Segundos

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Rafael Manuel Scholz
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuith Polo N
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD:	Salamina Magdalena
FECHA:	18/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Doosan 340
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Polo Navarro
PROYECTO:	CBS44- Cuña Honda
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	81 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	09:20:58 Seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	09:26:21 Seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Fran Camacho
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth Polo N
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Salamina Mag
FECHA:	26/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Reserva
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuitty Polo Navarro
PROYECTO:	CGS44 - Canto hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	455 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	12:00:56 seg pm
HORA FINAL DEL TANQUEO:	12:22:26 seg pm

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuitty Polo N
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD:	Soledad Atl.
FECHA:	26/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Retro Excavadora #4
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Polo V
PROYECTO:	CC 5461 Cano Mendoza
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	107 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	10:49:30 Seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	10:59:27 Seg am

ITEM	DESCRIPCIÒN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth Polo V
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Soledad Atlantico
FECHA:	26/11/15
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Lol PHD 08
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Polo Vasquez
PROYECTO:	Ecopetrol - Cano Limon
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	1266 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	11:19:54 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	11:36:21 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado de pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Richard Almendrales
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth Polo
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Solamar Magdalena
FECHA	26/11/25
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat 323
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth polo Navarro
PROYECTO:	CGS44- Caño Honda
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	85 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO	11:36:30 Seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	11:41:01 Seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Armando Paez
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth polo
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Soledad Mora
FECHA	26/01/25
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat 325
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO	Jesus Pablo Navarro
PROYECTO:	@ 6 114- Cuña Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	52 gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	11:46:59 seg
HORA FINAL DEL TANQUEO:	11:51:22 seg

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado de pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	NO Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Alfonso Ibañez
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesus Pabon
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien Inspecciona HSE

Powered by CamScanner

ANEXO 4.7.

ENTREGA DE EPP

BP	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÒN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 3 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Sabanalarga Atlántico

PROYECTO: ESSMAR - Centro Hospitalario

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES					
OTROS	REPELENTE						
CABEZA	CASCO						
	ALERON PARA CASCO		1				
VISUAL	GAFAS CLARAS						
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS						
	GAFAS OSCURAS						
	MONOGAFAS						
CORPORAL	IMPERMEABLE						
	CHALECO SALVAVIDAS						
	PITO PARA CHALECO						
	LUZ PARA CHALECO						
DE MANOS	CARNAZA						
	INDUSTRIAL						
	TIPO INGENIERO						
	POLIURETANO	1 Par		1 Par		1 par	
	HYCROM						
AUDITIVA	INSERCION						
	COPA						
FACIAL	ESCAFANDRA	1					
	CARETA DE ESMERILA						
PIES	BOTA PANTANERA						
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR						
	GAFAS DE OXICORTE						
	PROTEC. RESPIRAT.						
	FILTROS						
	MANGAS DE CARNAZA						
	GUANTES SOLDADOR						
	DELANTAL DE CUERO						
	POLAINAS						

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa esi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	03/11/2025	03/11/2025	05/11/2025	05/11/2025
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	yesuth polo	Daniel Mestre	Sinibaldo	Pedro wilches
IDENTIFICACION	1082046517	7598807	1004121723	1081622028
FIRMA DE QUIEN RECIBE	yesuth polo		Sinibaldo	Pedro wilches
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	yesuth polo	yesuth polo	yesuth polo	yesuth polo
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	yesuth polo	yesuth polo	yesuth polo	yesuth polo

Powered by CamScanner

BnP	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO GH-R-009 VERSION 3 FECHA 1/06/2025

CIUDAD: Soledad Atl

PROYECTO: Cerro - Caño Hondo

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES				
OTROS	REPELENTE					
CABEZA	CASCO					
	ALERON PARA CASCO					
VISUAL	GAFAS CLARAS					
	GAFAS INDOORS OUTDOORS					
	GAFAS OSCURAS					
	MONOGAFAS					
CORPORAL	IMPERMEABLE					
	CHALECO SALVAVIDAS					
	PITO PARA CHALECO					
	LUZ PARA CHALECO					
DE MANOS	CARNAZA					
	INDUSTRIAL					
	TIPO INGENIERO					
	POLIURETANO	1 Par				
	HYCROM					
AUDITIVA	INSERCION					
	COPA					
FACIAL	ESCAFANDRA					
	CARETA DE ESMERILA					
PIES	BOTA PANTANERA					
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR					
	GAFAS DE OXICORTE					
	PROTEC. RESPIRAT.					
	FILTROS					
	MANGAS DE CARNAZA					
	GUANTES SOLDADOR					
	DELANTAL DE CUERO					
	POLAINAS					

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	05/11/2025			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jonathan Oviedo			
IDENTIFICACION	1004748507			
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Jonathan O.			
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	yesuith polo			
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	yesuith polo			

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 7 FECHA: 1/08/2025

CIUDAD:	Sabaneta Ant
PROYECTO:	Cra 44 - Cra Hernando

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES				
OTROS	REPELENTE					
CABEZA	CASCO					
	ALERON PARA CASCO					
VISUAL	GAFAS CLARAS					
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS					
	GAFAS OSCURAS					
	MONOGAFAS					
CORPORAL	IMPERMEABLE					
	CHALECO SALVAVIDAS					
	PITO PARA CHALECO					
	LUZ PARA CHALECO					
DE MANOS	CARNAZA					
	INDUSTRIAL					
	TIPO INGENIERO					
	POLIURETANO	1 Par				
	HYCROM					
AUDITIVA	INSERCION					
	COPA					
FACIAL	ESCAFANDRA					
	CARETA DE ESMERILA					
PIES	BOTA PANTANERA					
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR					
	GAFAS DE OXICORTE					
	PROTEC. RESPIRAT.					
	FILTROS					
	MANGAS DE CARNAZA					
	GUANTES SOLDADOR					
	DELANTAL DE CUERO					
	POLAINAS					

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleve el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	05/11/2025			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FELIX VALENCIA			
IDENTIFICACION	9153002			
FIRMA DE QUIEN RECIBE				
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Yesith Pulo			
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Yesith Pulo			

Powered by CamScanner

BnP	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH.R.009 VERSION: 3 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Sincelejo Sucre

PROYECTO: Tubería línea Caribe

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS				
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO				
	POLIURETANO				
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION	1	1	1	
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA				
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa así me lo solicite. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleve el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos, adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Pedro wilches	Johendrys O.	yesuth pabo	
IDENTIFICACION	1081 028028	Johendrys Orozco	1081146517	
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Pedro wilches	[illegible]	yesuth pabo	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	yesuth pabo	yesuth pabo	yesuth pabo	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	yesuth pabo	yesuth p	yesuth pabo	

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 7 FECHA: 1/09/2025

CIUDAD: Soledad Atlántico

PROYECTO: Cesar Cerro Hermoso

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE	1			
CABEZA	CASCO	1			
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS				
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE	1 Talla L			
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO				
	POLIURETANO	1 Par			
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA	1			
FACIAL	ESCAFANDRA				
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos, adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo

FECHA	13/11/2025
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Frans Cervantes
IDENTIFICACION	1079932676
FIRMA DE QUIEN RECIBE	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Yesenia Pab
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Yesenia P.

Powered by CamScanner

BnP	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 3 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Solarina Magdalena

PROYECTO: C6544- Coñ Hondo

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS				
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO	1 Par	1 Par		
	POLIURETANO				
	HYCROM	1 Par			
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA				
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa así me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	14/11/2025	14/11/2025		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Johendrys O.	Jonatan Padilla		
IDENTIFICACION	1004298507	1082075696		
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Johendrys	Jonata		
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	yesuitt pabo	yesuitt P		
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	yesuitt pabo	yesuitt pabo		

Powered by CamScanner

BnP	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 3 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD:	Sabanas Magdalena
PROYECTO:	C 6544 - Cerro Horeb

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OBSCURAS				
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO	1 Par	1 Par		
	POLIURETANO				
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA				
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa esi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	27/11/2025	27/11/2025		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Pedro wilches	sinibaldo		
IDENTIFICACION	1081028029	1004121723		
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Pedro wilches	sinibaldo		
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Yesenia Pabon	Yesenia Pabon		
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Yesenia Pabon	Yesenia Pabon		

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO GH-R-009 VERSION. 7 FECHA 1/06/2025

CIUDAD: Salamina Magdalena

PROYECTO: CGS44 - Caño Hondo

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS	1			
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS				
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO				
	POLIURETANO				
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA				
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	14/11/2025			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Felix Valencia			
IDENTIFICACION	9.153.002			
FIRMA DE QUIEN RECIBE				
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Yesuth Polo			
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Yesuth Polo			

Powered by CamScanner

BnP	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 3 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Salamina Magdalena

PROYECTO: CG544 - Caño Hondo

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS				1
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO		1 Par	1 Par	
	POLIURETANO	1 Par			
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA				1
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa así me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	24/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	28/11/2025
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jesus David Polo	Carlos Gomez	Brayan Gomez	Sin baldo
IDENTIFICACION	1082045696	1083572789	1004121831	1004121723
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Jesus David Polo	carlos Gomez	Brayan Gomez	sin baldo
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Yesuth Polo	yesuth polo	yesuth polo	yesuth polo
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	yesuth Polo	yesuth polo	yesuth polo	yesuth polo

Powered by CamScanner

B&P	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO GH-R-009 VERSION 3 FECHA 1/06/2025

CIUDAD: Sabana Mar

PROYECTO: CGSM4 - Canoa Honda

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES											
OTROS	REPELENTE												
CABEZA	CASCO												
	ALERON PARA CASCO												
VISUAL	GAFAS CLARAS	1				1							
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS												
	GAFAS OSCURAS												
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE												
	CHALECO SALVAVIDAS												
	PITO PARA CHALECO												
	LUZ PARA CHALECO												
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO												
	POLIURETANO												
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION							1		1			
	COPA							1					
FACIAL	ESCAFANDRA	1				1		1					
	CARETA DE ESMERILA												
PIES	BOTA PANTANERA												
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR												
	GAFAS DE OXICORTE												
	PROTEC. RESPIRAT.												
	FILTROS												
	MANGAS DE CARNAZA												
	GUANTES SOLDADOR												
	DELANTAL DE CUERO												
	POLAINAS												

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos, adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo

FECHA	29/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Brayan David	Carlos Gomez	Carlos Alfredo	Sinibaldo	
IDENTIFICACION	1004121831	1083 572 789	1001080507	[illegible]723	
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Brayan Gomez	Carlos Gomez	[signature]	Sinibaldo	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	yesuth Polo	yesuth Polo	yesuth polo	yesuth Polo	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	yesuth Polo	yesuth P	yesuth polo	yesuth Polo	

Powered by CamScanner

B&P	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 3 FECHA: 1/08/2025

CIUDAD: Sabana Mog

PROYECTO: CCS114 - Cairo Hondo

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS	1	1	1	
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS				
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO	1 Par	1 Par	1 Par	
	POLIURETANO				
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA	1	1	1	
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa así me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	29/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jose Carlos Ballesteros	Cesar santodomingo	Jesus Hernandez	
IDENTIFICACION	1079934636	1.079936122	1079914724	
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Jose Carlos Ballesteros	Cesar santodomingo	Jesus Hernandez	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Yesuith Vanessa	Yesuith Vanessa	Yesuith Vanessa	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Yesuith Polo	Yesuith Polo	Yesuith Polo	

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 7 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Sabana Mog

PROYECTO: CBS44 - Costa Honda

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS	1			
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO				
	POLIURETANO	1 Par			
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA	1			
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa así me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	26/11/2025			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Fran Covantes			
IDENTIFICACION	1077932676			
FIRMA DE QUIEN RECIDE				
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Yesuth Vanes			
FIRMA DE QUIEN ENTREGA				

Powered by CamScanner

ANEXO 4.8.

DOCUMENTOS CARROTANQUE DE COMBUSTIBLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011764718

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WGV681	CHEVROLET	NPR	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO GALAXIA	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	TANQUE	DIESEL	3410

NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-337408

REG: N

VIN: 9GDNPR756GB004850

NÚMERO DE SERIE: 9GDNPR756GB004850

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9GDNPR756GB004850

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): F.D.S LA TORCOROMA ALVAREZ TRILLOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 9003160034

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 153

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32015000428803

I/E: I

FECHA IMPORT.: 24/03/2015

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA: 14/04/2016

FECHA EXP. LIC. TTO.: 17/05/2016

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE PUERTO COLOMBIA



LT02003935492

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179523734

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA PRADERA

NIT: 901396508

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-041

Fecha de expedición: 2025/02/13

Fecha de vencimiento: 2026/02/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WGV681

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2016

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 4HK1-337408

NRO. CHASIS: 9GDNPR756GB004850

VIN: 9GDNPR756GB004850

LÍNEA: NPR

COLOR: BLANCO GALAXIA

NOMBRE PROPIETARIO: E.D.S LA TORCOROMA ALVAREZ TRILLOS S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE AÑO | MES | DÍA LAS 00 HORAS DEL	HASTA AÑO | MES | DÍA LAS 11:59 HORAS DEL
2025-02-13	2025-02-16	2026-02-15

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006089328000	WGV681	CARGA O MIXTO	PUBLICO	5193	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	CISTERNA O TANQUE
	LÍNEA VEHÍCULO: NPR	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4HK1337408	9GDNPR756GB004850	9GDNPR756GB004850	3.41

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
E D S LA TORCOROMA ALVAREZ TRILLOS	3164745602	NI	9003160034	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	12042	0	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 560700	$ 301900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 884700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Los obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el pago por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos [illegible]

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031557657

PLACA: SZL939	MARCA: CHEVROLET	LÍNEA: NPR	MODELO: 2013
CILINDRADA CC: 5.193	COLOR: BLANCO GALAXIA		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION	TIPO CARROCERIA: TANQUE	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD KG/PSJ: 4100
NÚMERO DE MOTOR: 4HK1 867285		MOD: N	VIN: 9GDNPR7550D001918
NÚMERO DE SERIE: 9GDNPR7550D001918		VIN: N	NÚMERO DE CHASIS: 9GDNPR7550D001918

PROPIETARIO: E.D.S LA TORCOROMA ALVAREZ TRILLOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 8031168034



		CILINDRAJE: ******	POTENCIA HP: 148
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32912000237951	NO: 1	FECHA IMPORT: 21/02/2012	PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/06/2012	12/04/2024	******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA MCPAL TTOYTTE PUERTO COLOMBIA

LT03007340067

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180802267

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA PRADERA

NIT: 901396508

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-041

Fecha de expedición: 2025/04/15

Fecha de vencimiento: 2026/04/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SZL039

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 4HK1-967365

NRO. CHASIS: 9GDNPR755DB001918

VIN: 9GDNPR755DB001918

LÍNEA: NPR

COLOR: BLANCO GALAXIA

NOMBRE PROPIETARIO: E.D.S LA TORCOROMA ALVAREZ TRILLOS S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-02-22	2025-02-25	2026-02-24

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006102627000	SZL039	CARGA O MIXTO	PUBLICO	5193	2013

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
3	CHEVROLET	NPR	CISTERNA O TANQUE

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4HK1967365	9GDNPR755DB001918	9GDNPR755DB001918	4.10

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
EDS LA TORCOROMA ALVAREZ TRILLOS	3164745602	NI	9003160034	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	12042	0	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 884700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1] **Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

[2] **Para las demás tarifas no citadas en (1).**

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030428249

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SMG733	HYUNDAI	HD 65	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
CAMION	TANQUE	DIESEL	

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
DADB83B9939	N	KMFGA17BP9C096198

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMFGA17BP9C096198	N	KMFGA17BP9C096198	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) / IDENTIFICACIÓN

TORCOROMA COMERCIALIZADOR INDUTRI NIT 900318003



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 01639040651646

VE: I

FECHA IMPORT.: 14/10/2008

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 20/01/2010

FECHA EXP. LIC. TTO: 09/11/2023

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE PUERTO COLOMBIA

LT07002692267

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180844016

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA PRADERA

NIT: 901396508

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-041

Fecha de expedición: 2025/04/19

Fecha de vencimiento: 2026/04/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SMG733	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	HYUNDAI	**MODELO:**	2009
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3907	**NRO. MOTOR:**	DADB8369939
NRO. CHASIS:	KMFGA17BP9C096198	**VIN:**	KMFGA17BP9C096198
LÍNEA:	HD 65		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: TORCOROMA COMERCIALIZADOR INDUTRIAL S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-04-10	2025-04-12	2026-04-11

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006184199000	SMG733	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3907	2009

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
2	HYUNDAI	HD 65	CISTERNA O TANQUE

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DADB8369939	KMFGA17BP9C096198	KMFGA17BP9C096198	4.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TORCOROMA COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL SA	3164745602	NI	9003160034	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	12042	0	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 884700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

ANEXO 4.9.

MEDEVAC

MEDEVAC

CÓDIGO	GIM-R-062
VERSIÓN	1
FECHA	15/03/2024

PROYECTO: **CGSM4-CAÑO HONDO**

FECHA DE ACTUALIZACION: **15/12/2025**

CEDULA	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	ACTIVIDAD/UBICACION	EMPRESA	ARL	EPS	TIPO DE SANGRE	ALERGIAS		¿A QUE ES ALERGICO?
									SI	NO	
1129578658	ACEVEDO COLON	YURANI ANDREA	INGENIERO AMBIENTALES SENIOR	Programar y ejecutar actividades para dar cumplimiento a los programas ambientales	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	B+	X		AINES
1081905903	ALMENDRALES MEDINA	RICHARD DE JESUS	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	PHD	SURA	SURA	O+		X	
1004213282	ALVAREZ MANGA	KEVIN AN DRES	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO	SURA					
1079913769	ALVAREZ MONTENEGRO	CARLOS ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS				
1143119327	BALLESTAS QUINTERO	FRANCISCO	VETERINARIO	Programa de control fauna y actividades socio ambientales con la comunidad	CONSORCIO CGSM 4	SURA	SANITAS	O+		X	
1010080507	BARRERA MARTINEZ	CARLOS	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	B+		X	
5078310	BONET ACUÑA	ADOLFO RAFAEL	CAPATAZ	Ejecutar las actividades asignadas, como apoyo a los procesos	RUBEN FRANCO	SURA					
1079934636	CABALLERO CHARRIS	JOSE LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD				
1081027709	CAMACHO CANTILLO	JOSE GREGORIO	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	CAJA COPI	O+		X	
5095498	CANTILLO CARRILLO	EDUARDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA					
1079916394	CANTILLO PACHECO	EDULFO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO	SURA					
85479893	CANTILLO BOLAÑO	ORLANDO RAFAEL	MAESTRO DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO	SURA					
5082536	CASTAÑEDA RETAMOZO	AROLDO RAFAEL	AYUDANTE	Apoyo en actividades manteniemiento de siembra	ANAVRIN	SURA	NUEVA EPS			X	
1079932676	CERVANES MENDEZ	FRANC CARLOS	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	MUTUAL SER				
5078785	CHARRIS BOLAÑO	TEOVALDO ENRIQUE	AYUDANTE	Apoyo en actividades manteniemiento de siembra	ANAVRIN	SURA	NUEVA EPS			X	
1108767049	FUENTES ACOSTA	LINA MARIA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	Planificar, desarollar y evaluar actividades sociales del proyecto	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	A+	X		AINES
1083572789	GAMEZ SANTODOMINGO	CARLOS SEGUNDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD				
8860886	GIL ORTEGA	CRISTIAN DAVID	INGENIERO RESIDENTE	Programar , coordinar y llevar el control de la ejecucion deloroyecto.	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	O+		X	
1004121723	GOMEZ ESCORCIA	SINIBALDO JOSE	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	O+		X	
10044121831	GOMEZ RODRIGUEZ	BRAYAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	O+			
1010150262	GONZALEZ VERGARA	ADRIANA CRISTINA	PROFESIONAL EN SST	Realizar actividades encaminadas , al desarrollo y mantenimiento del SGI	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SURA	B+	X		AINES Y ALISCOS
1082046890	GUETTE OJEDA	JOSE ANGEL	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA					
1042348012	HERRERA VILLAMIL	LUIS EDUARDO	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	ROYS CORCIO INGENIERIA	SURA	SURA			X	
5078492	HERRERA CABARCAS	ARTURO RAFAEL	OFICIAL	Ejecutar las actividades asignadas, como apoyo a los procesos	MANUEL HERNANDEZ	SURA					
1084738073	IBAÑEZ OSPINO	ALFONSO ENRIQUE	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	O+		X	
5078921	LARA PASION	HERIBERTO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA					
84456544	LOPEZ CLAVIJO	CHRISTIAN DARO	ESPECIALISTA HIDRAULICO	Revision de aspectos hidraulicos del proyecto	INDEPENDIENTE	COLMENA	SANITAS				
7598807	MAESTRE CHARRIS	DANIEL ALBERTO	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	O+	X		AINES
1079914724	MANOTAS GUTIERREZ	JESUS DAVID	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	O+			
1085224296	MARTINEZ JIMENEZ	MARIA AUXILIADORA	BIOLOGA	Trabajar en la conservación de especies y hábitats, diseñando estrategias para proteger la biodiversidad.	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	B+		X	
73129552	MEZA MENDOZA	PABLO FRANCISCO	OPERADOR DE BULLDOZER		HERRERA Y DURAN	SURA	SALUD TOTAL	O+			
1004298507	OROZCO FERREIRA	JOHENDRYS	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	MUTUAL SER	O+		X	
1193547906	OROZCO GUTE	JESUS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA					
1082045696	PADILLA FERREIRA	JONATAN ALBERTO	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD			X	
70530541	PAEZ ARRIETA	ARMANDO ENRIQUE	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SURA	A+		X	
1100549999	PALENCIA GUZMAN	JESUS DANIEL	TOPOGRAFO	Realizar actividades topobatrimetricas en el proyecto asignado	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	A+		X	
1082046517	POLO NAVARRO	YESMITH VANESSA	VIGIA HSE	Realizar todas las actividades que surjan de la implementacion y documentacion del SGI relacionados con la SST en todos los procesos	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	B+		X	

CEDULA	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	ACTIVIDAD/UBICACION	EMPRESA	ARL	EPS	TIPO DE SANGRE	ALERGIAS		¿A QUE ES ALERGICO?
9464493661	PRADA DAZA	EUGENIO	GERENTE DEL PROYECTO	Llevar parte administrativa y financiera del proyecto	INDEPENDIENTE	SURA	SURA			X	
1118813194	ROYS CORZO	EDILBERTO GREGORIO	INGENIERO RESIDENTE	Programar , coordinar y llevar el control de la ejecucion delproyecto.	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SURA	O+		X	
1031127390	SANTISTEBAN MURIEL	IVONNE STIBALIZ	INGENIERO TOPOGRAFICO	Coordinar todas las actividades topo-batrimetricas en el proyecto	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	O+		X	
1079936122	SANTODOMINGO DE LA CRUZ	CESAR ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	O+			
9153002	VALENCIA PEREZ	FELIX	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	A+			
73475172	VIZCAINO ESCOBAR	ANGEL MARIA	DIRECTOR DE OBRA		PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SURA	A+		X	
1081028028	WILCHEZ GONZALEZ	PEDRO MIGUEL	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	A+			

ANEXO 4.10.

DIRECTORIO DE EMERGENCIA

	DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	CÓDIGO	GIM-R-060
		VERSIÓN	1
		FECHA	15/03/2024

PROYECTO/AREA:	CGSM 4 - MANTENIMIENTO CUERPOS DE AGUA QUE ALIMENTA LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA (CAÑO HONDO)
FECHA DE ACTUALIZACION:	27/08/2025

ENTIDAD	DIRECCION	TELEFONO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
CONTROL TRAFICO MARTIMO		3104770348 CANAL VHF 16 Y 69		
POLICIA NACIONAL : Linea de atencion de emergencias		123		
BOMBEROS		3016142992	Salamina	Magdalena
BOMBEROS	Calle 6 Carrera 6 Esquina	Líneas de atención: Teléfono: CITEL (57)6015557926 Ext.: 213 Número Directo.: CITEL (57)6015557932 Celular: CITEL +57 322 347 2150 - +57 3228662944	Sitio Nuevo	Magdalena
OFICINA GESTION DEL RIESGO Jaime Enrique Camacho Avendaño	cdgrd.magdalena@gestiondelriesgo.gov.co	3202406959/ 3013867413	Santa Marta	Magdalena
CRUZ ROJA		132		
DEFENSA CIVIL		144		
DIRECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE		167		
AIR-E		115		
GASES DEL CARIBE		164		
ARL SEGUROS BOLIVAR		# 322 Linea Nacional 018000123322 Línea de atencion: 601 312 2122		
E.S.E Hospital Local de Salamina (NIVEL 1)	Calle 5 # 7 - 13	3145068603	Salamina	Magdalena
HOSPITAL DE SITIO NUEVO	Carrera 8 # 2-20	3232317064 - esesitionuevo@gmail.com	Sitio Nuevo	Magdalena
Fundacion Hospital Universidad Del Norte	CALLE 30 VIA AL AEROPUERTO AL LADO DEL PARQUE MUVDI, SOLEDAD, ATLANTICO	(605) 3715562 - 3715555	Soledad	Atlantico
VIGIA HSE	YESMITH POLO		Salamina	Magdalena

ANEXO 4.11.

GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE PRACTICAS DE EMERGENCIAS

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-~~R-072~~
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	12/11/2025
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	Yesith Polo Navarro
TIPO DE EMERGENCIA	Qué hacer en caso de inundación
PROYECTO:	CG544- Caño Mondo
EMBARCACION:	

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Armando Ruiz	Panamericana	
Fran Cervantes	V Y D	
Richard Hernandez	PTD	
Sinibaldo	Consorcio	

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-~~R-~~072
PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			con observaciones en un principio se encontraba
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?	✓			
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?	✓			
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?	✓			parcialmente
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?		✓		
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?	✓			
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?	✓			
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?	✓			
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta	7:50:12 seg	
Activación de la alarma de emergencia	7:52:46 seg	
Salida de la primera persona	7:53:07 seg	
Salida de la última persona	7:53:56 seg	
Llegada de la primera persona al punto de encuentro	7:54:06 seg	
Llegada de la última persona al punto de encuentro	7:54:16 seg	
Retorno a las instalaciones	7:56:28 seg	

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	26/11/2025
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	Yesuth Polo Navarro
TIPO DE EMERGENCIA	Qué hacer en caso de tormenta tropical o distrca
PROYECTO:	CBS44 - Caño Hondo
EMBARCACION:	

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Richard Alexander	PHD	
Armando Ruiz	Consorcio	
Alfonso Ibañez	Vias y Drogados	
Brayan Gomez	Consorcio	
Sinibaldo	Consorcio	
Jesus D Palencia	VH D	

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?	✓			
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?	✓			
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?		✓		parcialmente
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?	✓			
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?	✓			
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?	✓			
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta	7:48:06 seg am	
Activación de la alarma de emergencia	7:48:09 seg	
Salida de la primera persona	7:48:28 seg	
Salida de la última persona	7:48:40 seg	
Llegada de la primera persona al punto de encuentro	7:49:30 seg	
Llegada de la última persona al punto de encuentro	7:49:53 seg	
Retorno a las instalaciones	8:03:42 seg	

Powered by CamScanner

ANEXO 4.12 CONCEPTOS MÉDICOS

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL O INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

INFORMACION GENERAL:

CÉDULA:	1004121831		
APELLIDOS:	GAMEZ RAMIREZ	NOMBRES:	BRAYAN DAVID
CIUDAD:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
EMPRESA:	*CONSORCIO CGSM4	ACT. ECONÓMICA:	SD
TIPO DE EXAMEN:	INGRESO	CARGO:	MARINO
FECHA:	18-09-2025	SECCIÓN:	OPERATIVA
EMPRESA EN MISIÓN:	NO APLICA		



ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A: CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

EL INFORME SE REALIZA CON EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES:

VLR MD INGRESO - VISIOMETRIA - ESPIROMETRIA TAMIZ - RX COLUMNA LUMBOSACRA - GLUCOSA EN SUERO - AUDIOMETRIA VIA AEREA Y OSEA -

INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

RX COLUMNA LUMBOSACRA:	FUERA DE LOS LIMITES NORMALES
VISIOMETRIA:	LIMITES NORMALES
ESPIROMETRIA TAMIZ:	LIMITES NORMALES
GLUCOSA EN SUERO:	LIMITES NORMALES
AUDIOMETRIA VIA AEREA Y OSEA:	LIMITES NORMALES

RECOMENDACIONES:

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO AL TRABAJADOR:
PRACTICAR EJERCICIO EN FORMA HABITUAL (MÍNIMO TRES VECES A LA SEMANA).
ADOPTAR BUENOS HÁBITOS DE HIGIENE POSTURAL

RECOMENDACIONES LABORALES:

INCLUIR Y HACER SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA EXPOSICION LABORAL.
CAPACITAR EN HIGIENE POSTURAL

CONCEPTO APTITUD LABORAL:

SIN RESTRICCIONES

FIRMA DEL PROFESIONAL EVALUADOR
Eduardo Jairo Solano Gutierrez
Md. Esp.
RM: L.S.O: 7268-17 - Cc: 72261774

FIRMA DEL TRABAJADOR
Brayan David Gamez Ramirez
CC 1004121831

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL O INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

INFORMACION GENERAL:

CÉDULA:	1079913769		
APELLIDOS:	ALVAREZ MONTENEGRO	NOMBRES:	CARLOS ANDRES
CIUDAD:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
EMPRESA:	*CONSORCIO CGSM4	ACT. ECONÓMICA:	SD
TIPO DE EXAMEN:	INGRESO	CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA:	18-09-2025	SECCIÓN:	OPERATIVA
EMPRESA EN MISIÓN:	NO APLICA		



ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A: CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

EL INFORME SE REALIZA CON EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES:

VLR MD INGRESO - VISIOMETRIA - ESPIROMETRIA TAMIZ - GLUCOSA EN SUERO - RX COLUMNA LUMBOSACRA - AUDIOMETRIA VIA AEREA Y OSEA -

INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

RX COLUMNA LUMBOSACRA:	LIMITES NORMALES
VISIOMETRIA:	LIMITES NORMALES
ESPIROMETRIA TAMIZ:	LIMITES NORMALES
GLUCOSA EN SUERO:	LIMITES NORMALES
AUDIOMETRIA VIA AEREA Y OSEA:	FUERA DE LOS LIMITES NORMALES

RECOMENDACIONES:

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO AL TRABAJADOR:
PRACTICAR EJERCICIO EN FORMA HABITUAL (MÍNIMO TRES VECES A LA SEMANA).
REALIZAR EJERCICIOS PREVENTIVOS PARA VARICES.
SE RECOMIENDA EVITAR EL USO DE AUDIFONOS, ASI COMO EXPOSICION A RUIDOS ALTOS EN PICOS O PARLANTES QUE MANEJEN VOLUMENES ALTOS.

RECOMENDACIONES LABORALES:

INCLUIR Y HACER SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA EXPOSICION LABORAL.
SE RECOMIENDA EVITAR LABORAR CONTINUAMENTE EXPUESTO A RUIDO MAYOR DE 85 DB. UTILIZAR PROTECCIÓN AUDITIVA AL LABORAR EXPUESTO A RUIDO.

REMISIONES:

VALORACION POR MEDICO VASCULAR EN EPS PARA MANEJO DE HALLAZGO AL EXAMEN FÍSICO.
VALORACION POR OTORRINO PARA ESTUDIO DE HALLAZGO AUDITIVO

CONCEPTO APTITUD LABORAL:

CON RECOMENDACIONES LABORALES



FIRMA DEL PROFESIONAL EVALUADOR
Eduardo Jairo Solano Gutierrez
Md. Esp.
RM: L.S.O: 7268-17 - Cc: 72261774



FIRMA DEL TRABAJADOR
Carlos Andres Alvarez Montenegro
CC 1079913769

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL O INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

INFORMACION GENERAL:

CÉDULA:	1079914724		
APELLIDOS:	MANOTAS GUTIERREZ	NOMBRES:	JESUS DAVID
CIUDAD:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
EMPRESA:	*CONSORCIO CGSM4	ACT. ECONÓMICA:	SD
TIPO DE EXAMEN:	INGRESO	CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA:	17-10-2025	SECCIÓN:	OPERATIVA
EMPRESA EN MISIÓN:	NO APLICA		



ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A: CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

EL INFORME SE REALIZA CON EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES:

VLR MD INGRESO - AUDIOMETRIA VIA AEREA Y OSEA - VISIOMETRIA - RX COLUMNA LUMBOSACRA - GLUCOSA EN SUERO - ESPIROMETRIA TAMIZ -

INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

AUDIOMETRIA VIA AEREA Y OSEA:	FUERA DE LOS LIMITES NORMALES
VISIOMETRIA:	FUERA DE LOS LIMITES NORMALES
RX COLUMNA LUMBOSACRA:	FUERA DE LOS LIMITES NORMALES
ESPIROMETRIA TAMIZ:	LIMITES NORMALES
GLUCOSA EN SUERO:	LIMITES NORMALES

RECOMENDACIONES:

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL(LA) TRABAJADOR(A):
PRACTICAR EJERCICIO EN FORMA HABITUAL (MÍNIMO TRES VECES A LA SEMANA).
SE RECOMIENDA EVITAR EL USO DE AUDIFONOS, ASI COMO EXPOSICION A RUIDOS ALTOS EN PICOS O PARLANTES QUE MANEJEN VOLUMENES ALTOS.

RECOMENDACIONES LABORALES:

INCLUIR Y HACER SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA EXPOSICION LABORAL.
SI SU LABOR ASI LO REQUIERE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN UNA ADECUADA MECÁNICA CORPORAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE CARGAS, REALIZANDO EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SUPERVISIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS PARA LA MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE CARGAS.
UTILIZAR PROTECCIÓN AUDITIVA AL LABORAR EXPUESTO A RUIDO MAYOR DE 85 DB.
DEBE USAR LENTES PARA VISION LEJANA Y CERCANA
CAPACITAR EN HIGIENE POSTURAL

REMISIONES:

VALORACION POR OTORRINO PAA ESTUDIO DE HALLAZGO AUDITIVO LEVE
VALORACIÓN POR OPTÓMETRA PARA EVALUAR DEFECTO DE REFRACCIÓN Y FORMULACIÓN DE CORRECCIÓN.

CONCEPTO APTITUD LABORAL:

SIN RESTRICCIONES



FIRMA DEL PROFESIONAL EVALUADOR
Lilia Edith Bolivar Vieira
Md. Esp. Medico Eso
RM: 4714-2006 L.S.O: 4580-2017



FIRMA DEL TRABAJADOR
Jesus David Manotas Gutierrez
CC 1079914724

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-10-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	VIAS Y DRAGADOS S.A.S	Actividad económica:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
Nombre:	FRAN CARLOS CERVANTES MENDEZ	Documento:	CC 1079932676
Fecha de nacimiento:	1990-12-20	Lugar de nacimiento:	Barranquilla (Atlantico)
Edad:	34 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	1
Dirección actual:	SALAMINA	Municipio:	EL PASO
Teléfono:	3215936855	Escolaridad:	Tecnico_completo
Ocupación:	OPERADOR DE EXCAVADORA	EPS:	Mutualser
Responsable**:	YOJEIDIS MOLINA (COMPAÑERA)	Teléfono:	3022233290
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: Su capacidad visual es adecuada para la ocupación..
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a FRAN CARLOS CERVANTES MENDEZ con documento de identificación No. 1079932676 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OPERADOR DE EXCAVADORA del sector económico Construcción de otras obras de ingeniería civil

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

RESULTADO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL: Los siguientes son los resultados de los exámenes de Laboratorio Clínico realizados: - Glucosa en suero: Dentro de valores límites normales.

CONSIDERACIONES SOBRE EL RESULTADO DE ESTUDIO RADIOLÓGICO DE LA COLUMNA LUMBOSACRA NORMAL: En el estudio radiológico realizado las estructuras óseas visibles no evidencian patologías de ningún tipo. La relación entre las diferentes estructuras está conservada. Las curvaturas de la columna son normales. No hay signos de espasmo muscular. En conclusión, el estudio radiológico realizado es Normal.

RESULTADO DE PRUEBA PSICOSENSOMETRICA PARA ELPROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL: El resultado de la Evaluación psicosensométrica es: Evaluación motriz: sin alteraciones, Test de personalidad: sin alteraciones.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DEL ALCANCE DEL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PARA CONDUCTORES DE VEHICULO CON RELACIÓN A SU LICENCIA: De acuerdo a la normatividad vigente, el Examen Médico Ocupacional no reemplaza la certificación de la aptitud psicofísica para obtener la expedición de la licencia de conducción vehicular, que debe adelantarse en un Centro de Reconocimiento de Conductores o entidad idónea, con la periodicidad establecida en dicha normatividad.

Seguridad vial: Apto.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión

de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Samanda Jaimes Aguilar
Medico
Especialista en Salud Ocupacional
Universidad del Norte
Res No. 3507-18/11/2020
Barranquilla



Firma para identificación de usuario Indice der
FRAN CARLOS CERVANTES MENDEZ
Documento: 1079932676

Escanee el código si desea verificar datos

Carrera 53 No. 64-28 Barranquilla - Colombia PBX: 605-3669700
www.laboquimico.com laboquimico@metrotel.net.co

Impreso por:
Fecha: 2025-11-04 Hora: 14:36

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL O INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

INFORMACION GENERAL:

CÉDULA:	1079934636		
APELLIDOS:	CABALLERO CHARRIS	NOMBRES:	JOSE LEONARDO
CIUDAD:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
EMPRESA:	*CONSORCIO CGSM4	ACT. ECONÓMICA:	SD
TIPO DE EXAMEN:	INGRESO	CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA:	22-09-2025	SECCIÓN:	OPERATIVA
EMPRESA EN MISIÓN:	NO APLICA		



ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A: CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

EL INFORME SE REALIZA CON EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES:

VLR MD INGRESO - AUDIOMETRIA VIA AEREA - ESPIROMETRIA TAMIZ - VISIOMETRIA - GLUCOSA EN SUERO - RX COLUMNA LUMBOSACRA -

INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

RX COLUMNA LUMBOSACRA:	LIMITES NORMALES
AUDIOMETRIA VIA AEREA:	FUERA DE LOS LIMITES NORMALES
ESPIROMETRIA TAMIZ:	LIMITES NORMALES
VISIOMETRIA:	LIMITES NORMALES
GLUCOSA EN SUERO:	LIMITES NORMALES

RECOMENDACIONES:

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL(LA) TRABAJADOR(A):
PRACTICAR EJERCICIO EN FORMA HABITUAL (MÍNIMO TRES VECES A LA SEMANA).
SE RECOMIENDA EVITAR EL USO DE AUDIFONOS, ASI COMO EXPOSICION A RUIDOS ALTOS EN PICOS O PARLANTES QUE MANEJEN VOLUMENES ALTOS.

RECOMENDACIONES LABORALES:

INCLUIR Y HACER SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA EXPOSICION LABORAL.
SE RECOMIENDA EVITAR LABORAR CONTINUAMENTE EXPUESTO A RUIDO MAYOR DE 85 DB.

REMISIONES:

VALORACION POR MEDICO EN EPS PARA ESTUDIO DE HALLAZGO AUDIOMETRICO.

CONCEPTO APTITUD LABORAL:

CON RECOMENDACIONES LABORALES



FIRMA DEL PROFESIONAL EVALUADOR
Lilia Edith Bolivar Vieira
Md. Esp. Medico Eso
RM: 4714-2006 L.S.O: 4580-2017



FIRMA DEL TRABAJADOR
Jose Leonardo Caballero Charris
CC 1079934636

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL O INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

INFORMACION GENERAL:

CÉDULA:	1079936122		
APELLIDOS:	SANTODOMINGO DE LA CRUZ	NOMBRES:	CESAR ALFREDO
CIUDAD:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
EMPRESA:	*CONSORCIO CGSM4	ACT. ECONÓMICA:	SD
TIPO DE EXAMEN:	INGRESO	CARGO:	AYUDANTE DE OBRA
FECHA:	18-09-2025	SECCIÓN:	OPERATIVA
EMPRESA EN MISIÓN:	NO APLICA		



ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A: CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

EL INFORME SE REALIZA CON EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES:

VLR MD INGRESO - VISIOMETRIA - ESPIROMETRIA TAMIZ - RX COLUMNA LUMBOSACRA - GLUCOSA EN SUERO - AUDIOMETRIA VIA AEREA Y OSEA -

INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

RX COLUMNA LUMBOSACRA:	FUERA DE LOS LIMITES NORMALES
VISIOMETRIA:	LIMITES NORMALES
GLUCOSA EN SUERO:	LIMITES NORMALES
ESPIROMETRIA TAMIZ:	LIMITES NORMALES
AUDIOMETRIA VIA AEREA Y OSEA:	LIMITES NORMALES

RECOMENDACIONES:

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR


RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL(LA) TRABAJADOR(A):
PRACTICAR EJERCICIO EN FORMA HABITUAL (MÍNIMO TRES VECES A LA SEMANA).
ADOPTAR BUENOS HÁBITOS DE HIGIENE POSTURAL TANTO AL ADOPTAR LA POSTURA SEDENTE O BIPEDA.

RECOMENDACIONES LABORALES:

INCLUIR Y HACER SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA EXPOSICION LABORAL.
CAPACITAR EN HIGIENE POSTURAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS EN LA JORNADA LABORAL

CONCEPTO APTITUD LABORAL:

SIN RESTRICCIONES



FIRMA DEL PROFESIONAL EVALUADOR
Marilyn Consuegra Pertuz
Md. Esp. Médico Ocupacional
RM: 21608 L.S.O: 6102-2016 - Cc: 26812082

FIRMA DEL TRABAJADOR
Cesar Alfredo Santodomingo De La Cruz
CC 1079936122

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL O INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

INFORMACION GENERAL:

CÉDULA:	1083572789		
APELLIDOS:	GAMEZ SANTODOMINGO	NOMBRES:	CARLOS SEGUNDO
CIUDAD:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
EMPRESA:	*CONSORCIO CGSM4	ACT. ECONÓMICA:	SD
TIPO DE EXAMEN:	INGRESO	CARGO:	MARINO
FECHA:	18-09-2025	SECCIÓN:	OPERATIVA
EMPRESA EN MISIÓN:	NO APLICA		



ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A: CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

EL INFORME SE REALIZA CON EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES EXÁMENES:

VLR MD INGRESO - AUDIOMETRIA VIA AEREA - VISIOMETRIA - ESPIROMETRIA TAMIZ - RX COLUMNA LUMBOSACRA - GLUCOSA EN SUERO -

INFORME DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

RX COLUMNA LUMBOSACRA:	LIMITES NORMALES
AUDIOMETRIA VIA AEREA:	LIMITES NORMALES
VISIOMETRIA:	LIMITES NORMALES
GLUCOSA EN SUERO:	LIMITES NORMALES
ESPIROMETRIA TAMIZ:	LIMITES NORMALES

RECOMENDACIONES:

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA EL(LA) TRABAJADOR(A):
PRACTICAR EJERCICIO EN FORMA HABITUAL (MÍNIMO TRES VECES A LA SEMANA).

RECOMENDACIONES LABORALES:

INCLUIR Y HACER SEGUIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA DE ACUERDO CON LA EXPOSICION LABORAL.

CONCEPTO APTITUD LABORAL:

SIN RESTRICCIONES

FIRMA DEL PROFESIONAL EVALUADOR
Lilia Edith Bolivar Vieira
Md. Esp. Medico Eso
RM: 4714-2006 L.S.O: 4580-2017

FIRMA DEL TRABAJADOR
Carlos Segundo Gamez Santodomingo
CC 1083572789

ANEXO 5

Informe Gestión ambiental.

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL



CONTRATISTA:

CONTRATO No. LP-005-2023

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

NOVIEMBRE 2025

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Yurani Acevedo		
			
	Residente Ambiental		
Revisión	Ing. Yurani Acevedo		
			
	Residente Ambiental		
Aprobación	Ing. Ángel Vizcaino Escobar		
			
	Director de Proyecto		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e Ingeniería S.A.S	1		

CUADRO DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
2.1 Objetivo General 5
Objetivos Específicos 5
3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 6
Localización 6
Localización Del Sector A Intervenir 6
Localización De Caño Hondo 7
Zonas De Intervención 8
4. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 10
PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO 11
4.2.1 P-MA-P1 Programa De Control De Calidad De Aire Y Ruido 11
4.2.3 P-MA-P3 Programa De Manejo Del Recurso Hídrico Para El Manejo De Residuos Líquidos 21
4.3 PROGRAMAS DEL MEDIO BIÓTICO 26
4.3.1 P-MB-P1 Programa De Protección De Fauna Y Flora. 26
PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 30
4.4.1 P-MS-P1 Programa Socioeconómico Y Cultural. 30
4.4.2 P-MS-P2 Programa Manejo De Residuos. 34
5. MEDIDA DE COMPENSACIÓN 38
Establecimiento De La Estrategia De Restauración Ecológica. 38
6. OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES. 40
Salvamento De Fauna Acuática Y Terrestre 40
Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto. 40
Mantenimiento Preventivo De Estación De Monitoreo. 42

1. INTRODUCCIÓN

En atención a los lineamientos establecidos por la **Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG**, el presente documento expone la formulación y puesta en marcha de las **Medidas de Manejo Ambiental** correspondientes al proyecto *"Obras de mantenimiento para la Ciénaga Grande de Santa Marta en vigencias futuras"*, enmarcado en el **Contrato de Obra No. LP-005-2023**, cuyo objeto es el *"Mantenimiento y recuperación de las condiciones ambientales del complejo delta estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta mediante la intervención de los cuerpos de agua y otras estrategias adicionales"*.

Estas medidas han sido definidas con el propósito de **prevenir, evitar, controlar, mitigar y compensar** los impactos ambientales que puedan generarse durante la ejecución de las obras, garantizando la sostenibilidad de los procesos y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

El documento integra una descripción general de las actividades desarrolladas, organizadas en fichas de manejo ambiental, donde se relacionan las acciones ejecutadas de acuerdo con el contrato. Cada ficha está acompañada de un registro fotográfico y de los soportes correspondientes, que evidencian la gestión realizada en el marco del cumplimiento ambiental del proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Definir y aplicar las medidas de manejo ambiental necesarias para **prevenir, evitar, controlar, mitigar y compensar** los impactos ambientales y sociales potenciales derivados de las actividades contempladas en la ejecución del proyecto *"Mantenimiento y recuperación de las condiciones ambientales del complejo delta estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta, mediante la intervención de los cuerpos de agua y otras estrategias adicionales"*.

Objetivos Específicos

- Identificar los posibles impactos ambientales y sociales negativos asociados a las actividades previstas durante la ejecución del proyecto.
- Diseñar e implementar medidas de manejo orientadas a prevenir, mitigar, controlar, minimizar y compensar los efectos adversos de las obras sobre el entorno natural y las comunidades.
- Garantizar la protección y conservación de los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos presentes en el área de influencia durante el desarrollo de las intervenciones.

3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Localización

La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al norte del país en el extremo noroccidental del departamento del Magdalena, su área de influencia está comprendida entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio al sur, el río Magdalena por el oeste, el Mar Caribe al norte y al este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con una extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe a través del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por intermedio de caños que permiten a su vez intercomunicación con el río Magdalena.



Imagen No 1. Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta.

Localización Del Sector A Intervenir

El municipio de Salamina se localiza en Colombia, en el Departamento del Magdalena, pertenece a la región geográfica de la ciénaga Grande del Magdalena, fue fundado en 1765, se encuentra ubicado al Centro del departamento del Magdalena, localizado a los 10° 29`25" de latitud norte y 74° 47`38" de longitud al oeste de Greenwich, comprende una extensión de 175 Km2 que equivale al 0.75% del área departamental y al 0.015% del total nacional, su altura sobre el nivel del mar es de 3m, dista 173.3 Km con la ciudad

de Santa Marta (Capital del Departamento) y a 75.5 Km del distrito de Barranquilla. Su relieve está caracterizado por poseer un territorio bajo plano y cenagoso, bañado por algunos caños convirtiéndose en una inmensa llanura de inundaciones que contienen depósitos de terraza aluvial generándose una terraza ligeramente inclinada.



Imagen No 2. Localización del sector a intervenir. Caño Hondo

Localización De Caño Hondo

El caño Hondo es un conector del Río Magdalena y del complejo Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta, el cual se localiza en el delta exterior del río Magdalena, en el municipio de Salamina sobre la margen derecha del Rio Magdalena, a unos 1,9 kilómetros de distancia, aguas abajo, de la Cabecera municipal de Salamina y con una longitud aproximada de 17.5 kilómetros desde su embocadura sobre el río Magdalena, hasta su intercepción con el caño Martinica.



Imagen No 3. Localización de Caño Hondo

Zonas De Intervención

Los cuerpos de agua a intervenir serán definidos año a año por la entidad, soportado en el informe de INVEMAR y/o IDEAM, así como en el concepto expedido por la INTERVENTORÍA.

La entidad sugiere de manera preliminar priorizar las intervenciones en los siguientes cuerpos de agua:

✓ CAÑO EL BURRO
✓ CAÑO SALADO
✓ CAÑO CLARIN VIEJO
✓ CAÑO CLARIN NUEVO
✓ CAÑO CALETA DEL TAMBOR
✓ CAÑO BRISTOL
✓ CAÑO CERRO DE SAN ANTONIO
✓ CAÑO TORNO, ALIMENTADOR Y ALMENDROS
✓ CAÑO REAL DEL OBISPO
✓ CAÑO AGUAS NEGRAS
✓ CAÑO MARTINICA
✓ CAÑO CONDAZO
✓ CAÑO RENEGADO
✓ CIENAGA BUENAVISTA
✓ CAÑO HONDO

Para la vigencia del año 2025, se tiene prevista realizar la intervención en el sector de "Caño Hondo", que incluirá la remoción mecánica de sedimentos a lo largo de 1.300 metros (ver ilustración No. 4), con el objetivo de conectar Caño Hondo con Caño Martinica. Durante la ejecución de estas actividades, se llevará a cabo el salvamento de fauna acuática y terrestre, como medida de protección ambiental.



Imagen No 4. Eje de remoción mecánica de sedimentos

Dentro del componente de rehabilitación ecológica, se contempla el aislamiento del área objeto de intervención, la implementación de una estrategia de restauración ecológica y el mantenimiento del material vegetal previamente establecido.

4. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

Las medidas dirigidas a la prevención, control, mitigación, protección, recuperación o compensación de los impactos que se generen durante las actividades del proyecto, se presentan dentro de una serie de actividades y/o obras a ejecutar como programas descritos en las fichas de manejo ambiental.

A continuación, se relacionan los programas ambientales y sus respectivas fichas de seguimiento las cuales aplican al contrato en curso:

COMPONENTE	FICHA	NOMBRE
PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO	P-MA-P1	Programa de control de calidad de aire y ruido.
	P-MA-P2	Programa de protección de suelos.
	P-MA-P3	Programa de manejo del recurso hídrico para el manejo de residuos líquidos
PROGRAMAS DEL MEDIO BIÓTICO	P-MB-P1	Programa de protección de fauna y flora.
PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO	P-MS-P1	Programa socioeconómico y cultural.
	P-MS-P2	Programa manejo de residuos.

Tabla No 1. Fichas de manejo ambiental

PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO

4.2.1 P-MA-P1 Programa De Control De Calidad De Aire Y Ruido

Medidas Para El Control De La Alteración De La Calidad Del Aire:

- Durante este periodo se realiza traslado en cama baja de bulldocer para apoyar el extendido del material

- Durante este periodo ser realizaron mantenimientos correctivos y/o preventivos a las maquinarias presentes en el frente de obra. (**Ver Anexo No. 1 - Mantenimiento correctivo/preventivo)**

- El vehículo de apoyo (camioneta de placas HQM 275) cuenta con revisión técnico–mecánica vigente y con aprobación de prueba de emisiones de gases, así como con la totalidad de sus documentos soporte. **(Ver Anexo No. 2 – Documentos del vehículo**).

- Se prohíbe realizar incineración de desperdicios en el área de influencia del proyecto

- Durante la ejecución de las labores se han presentado lluvias aisladas que han permitido el control de material particulado en suspensión dentro de la zona de trabajo.

Medidas Para El Control En La Generación De Olores Molestos:

- La camioneta asignada al proyecto, con placa HQM 275, cuenta con revisión técnico-mecánica vigente, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares de emisión de gases para este tipo de vehículo.

- Los residuos sólidos generados durante las actividades diarias del dragado, y en los Box Culvert se almacena temporalmente y se dispone con los proveedores autorizados. **Ver Anexo No 3 – Proveedores Ambientales**

- Se prohíbe realizar quemas/incineración de desperdicios en el área de influencia del proyecto.

Medidas Para El Control Del Incremento De Los Niveles De Ruido:

- Los trabajos se realizan en una única jornada diurna.

❖ Se realizaron mantenimientos preventivos y/o correctivos



Imagen No 5. Traslado de maquinaria hacia Box



Imagen No 6. Traslado de maquinaria hacia Box



Imagen No 7. Dragado y conformación de talud



Imagen No 8. Excavación Box Culvert # 4



Imagen No 9. Punto ecológico

Actividades del periodo:


ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
	Si	No	No Aplica	Observación
Mantenimientos a maquinaria y equipo de trabajo	X			Se realizaron las actividades programadas para su cumplimiento
Control de material particulado	X			
Lugares adecuados para manejo de los materiales y/o insumos	X			
Prohibición incineración	X			
Velocidad máxima de 15 Km/hora	X			
Puntos ecológicos en campo	X			
Disposición adecuada de residuos	X			
Prohibición quemas	X			
Proveer equipos de protección personal auditiva a trabajadores que lo requieran	X			

Indicadores:

INDICADOR	META
$Mantenimientos = \frac{\textbf{Mantenimientos ejecutados}}{\textbf{Mantenimientos programados}}\ x\ 100$	100%

RESULTADO

INDICADOR MANTENIMIENTOS			
FORMULA DEL INDICADOR: (Mantenimientos Ejecutados/Mantenimientos programados) * 100			
META: 100%			
MES	MANTENIMIENTOS EJECUTADOS	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	% CUMPLIMIENTO
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	2	2	100%
Octubre	4	4	100%
Noviembre	2	2	100%

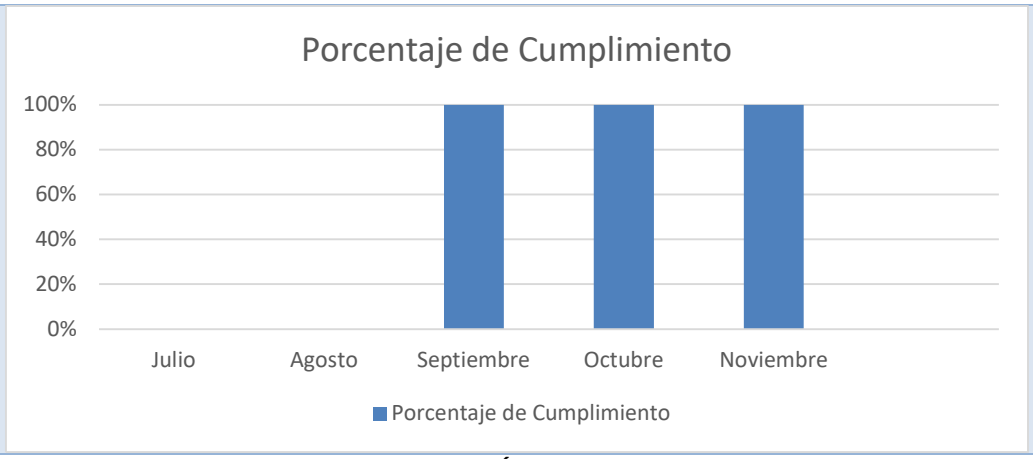


ANÁLISIS

Se ejecuto el programa de acuerdo con los mantenimientos preventivos y/o correctivos programados

INDICADOR	
$\textbf{Cumplimiento actividades} = \frac{\textbf{Actividades ejecutadas en el periodo}}{\textit{Actividades que aplican al período}}\ x\ 100$	100%

RESULTADO

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES			
FORMULA DEL INDICADOR: (Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades que aplican al periodo) * 100			
META: 100%			
MES	**ACTIVIDADES EJECUTADOS**	**ACTIVIDADES QUE APLICAN**	**% CUMPLIMIENTO**
Julio	-	-	
Agosto	-	-	
Septiembre	9	9	100%
Octubre	9	9	100%
Noviembre	9	9	100%

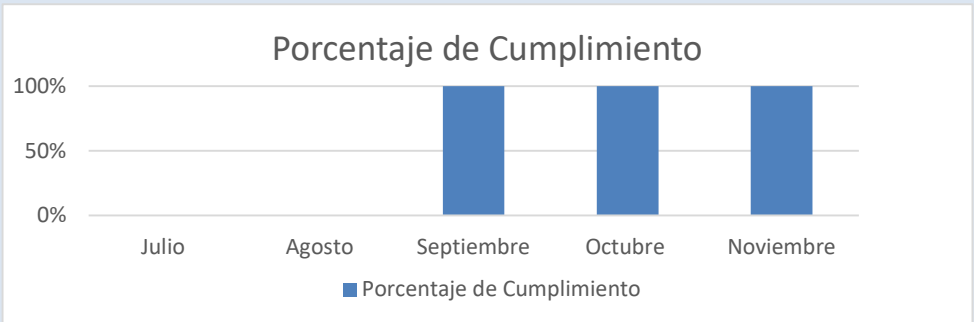

ANÁLISIS

Se ejecutaron las actividades de acuerdo con lo establecido y ejecutado en cada periodo

4.2.2 P-Ma-P2 Programa De Protección De Suelos

Medidas para la conservación de suelos (erosión y sedimentación):

- Durante el presente periodo se realizaron actividades de excavaciones en los Box, pase provisional y arreglo de las vías con el mismo material vegetal para su aprovechamiento, de igual forma se explano material a los márgenes del caño en el dragado mecánico

- Durante este tiempo de ejecución del proyecto durante el movimiento de tierra y remoción del material no se presentó escorrentías

Medidas para el control de la compactación de suelos:

- La mayor cantidad de operaciones se realizaron durante días soleados, se presentaron lluvias aisladas

- En la zona de operaciones solo circulan vehículos, maquinaria y equipos de trabajo para la de ejecución del proyecto.

Medidas para controlar la contaminación del suelo:

- Se realizo mantenimientos correctivo y preventivo en este periodo como se menciona en el programa 4.2.1 P-MA-P1 Programa De Control De Calidad De Aire Y Ruido

- Durante este periodo se realizó suministro de combustible. Es realizo de acuerdo con los establecido en el GI-I-003 Instructivo de toma de combustible y preoperativo de toma de combustible, **Ver Anexo No 4. Documentos toma de combustible**

- Se cuenta con kit control de derrames en el proyecto

- Se mantiene el almacenamiento temporal de las sustancias químicas con su respectivo dique y se realiza rotulación de estos

- Durante el tiempo de jornada el personal realiza actividades de orden y aseo para prevenir alguna contaminación en el suelo

- El día 22 de noviembre, aproximadamente a las 2:20 p. m., se presentó la ruptura de una manguera hidráulica de los gatos gemelos de la retroexcavadora CAT

PHD08, lo que ocasionó un derrame de aceite hidráulico en la zona de operación. De manera inmediata se procedió a detener la máquina y a realizar la inspección del área afectada. Este fue reportado en GIM-R-016- Reporte de No Conformes. **Ver Anexo No. 5 Derrame**

- Se realiza disposición final de residuos peligrosos con el proveedor de RECITRAC. **Ver Anexo No. 3 - Proveedores Ambientales**

- Durante este período se realizó charla relacionado al programa protección del suelo. **Ver Anexo No. 6 - Charlas y/o Capacitaciones**

FECHA	TIPO DE FORMACIÓN	NOMBRE DE LA FORMACIÓN
07/11/2025	Charla	Incidentes ambientales
11/11/2025	Charla	¿Qué es el ruido? Efectos del ruido. Protección auditiva
13/11/2025	Charla	Formas en que las sustancias químicas ingresan
15/11/2025	Charla	Simulacro de derrame
21/11/2025	Capacitación	Importancia de las coberturas vegetales y como ayudan a la sostenibilidad del medio ambiente
23/11/2025	Charla	¿Cómo actuar en situaciones de inhalación, derrames, ingesta y salpicadura de sustancias químicas?

Tabla No 2. Educación Ambiental



Imagen No 10. Excavaciones en el Box # 1



Imagen No 11. Explanación del material en el dragado mecánico



Imagen No 12. Excavación Box # 4



Imagen No 13. Explanación del material



Imagen No 14. Explanación del material



Imagen No 15. Adecuación de la vía



Imagen No 16. Suministro del combustible



Imagen No 17. Almacenamiento temporal sustancias químicas



Imagen No 18. Kits control de derrames



Imagen No 19. Orden y Aseo



Imagen No 20. Educación Ambiental



Imagen No 21. Entrega de EPP



Imagen No 22. Atención del derrame presentado



Imagen No 23. Atención del derrame presentado

Actividades del Periodo:


ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
	Si	No	No Aplica	Observación
Mantenimientos a maquinaria y equipos de trabajo	X			
Manejo apropiado de combustibles y lubricantes	X			
Kits control derrames en obra	X			Se presento 1 derrame durante el periodo el cual se atendió con el control kit de control de derrame a la menor brevedad
Atención apropiada de derrames	X			
Disposición de residuos por derrame	X			
Formación del personal en temas relacionados	X			

Indicadores:

INDICADOR	META
$Formación = \frac{Formación\ ejecutada}{Formación\ programada}\ x\ 100$	100%

RESULTADO

FORMACION			
FORMULA DEL INDICADOR: (Formación ejecutada/Formación programada) * 100			
META: 100%			
MES	FORMACION EJECUTADA	FORMACION PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	5	4	125%
Octubre	3	3	100%
Noviembre	6	6	100%

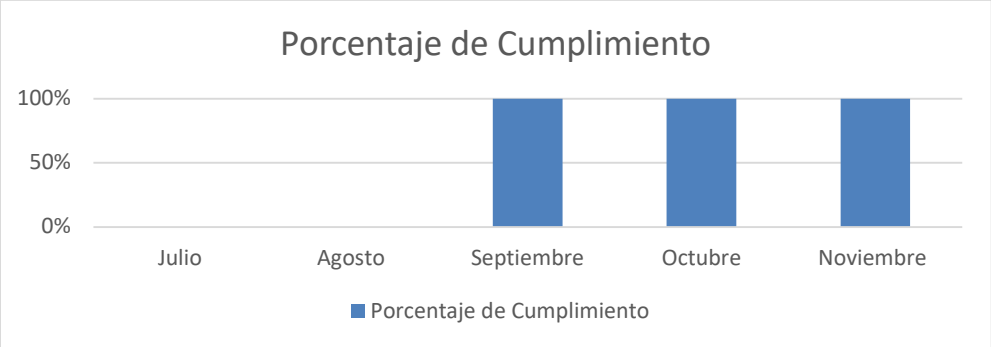

ANÁLISIS

Para este periodo se ejecutó las capacitaciones programadas de acuerdo con la programación de charlas y capacitaciones HSEQ 2025

$$Derrames = \frac{Derrames\ atendidos\ en\ el\ periodo}{Derrames\ ocurridos\ en\ el\ período}\ x\ 100$$	100%

RESULTADO

DERRAME			
FORMULA DEL INDICADOR: (Derrames atendidos en el periodo/Derrames ocurridos en el periodo) * 100			
META: 100%			
MES	**DERRAMES ATENDIDOS**	**DERRAMES OCURRIDOS**	**% CUMPLIMIENTO**
Noviembre	1	1	100%




ANÁLISIS

Durante este periodo se presentó 1 derrame en la zona de trabajo el cual se atendió de la manera inmediata

Cumplimiento actividades $$= \frac{\textbf{Actividades ejecutadas en el periodo}}{\textbf{Actividades que aplican al período}}\ \textbf{x 100}$$	100%

RESULTADO

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES: (Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades que aplican al periodo) * 100			
META: 100%			
MES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**FORMACION PROGRAMADA**	**% CUMPLIMIENTO**
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	6	6	100%
Octubre	6	6	100%
Noviembre	6	6	100%

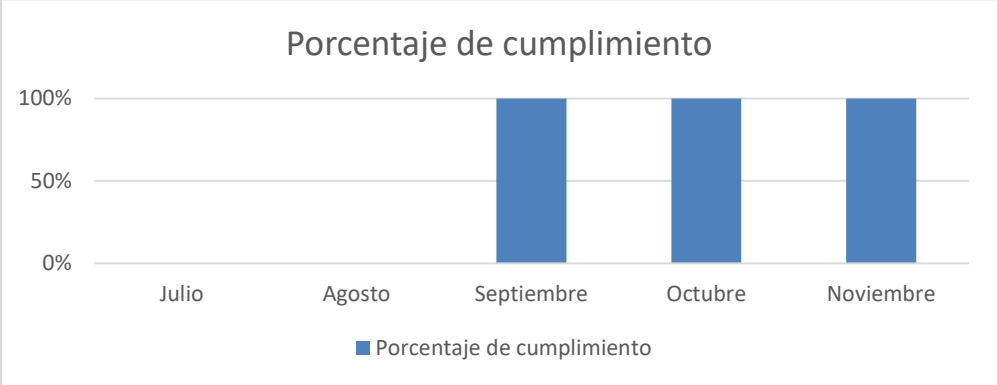

ANÁLISIS
Las actividades relacionadas se llevaron a cabo de manera satisfactoria

4.2.3 P-MA-P3 Programa De Manejo Del Recurso Hídrico Para El Manejo De Residuos Líquidos

Medidas para mitigar la alteración del régimen de drenaje de las aguas:

- Se realiza dique provisional sobre el caño sin obstruir drenajes ni pasos de agua.
- Se almacena los materiales pétreos se almacena lejos del flujo de las aguas pluviales **Ver Anexo No. 7. Documentación Cantera**

Medidas para el control de la alteración del nivel freático local:

- Se trabaja sobre el caño sin obstaculizar la infiltración natural de las aguas superficiales.

- Durante este período se realizó el retiro de los diques provisionales ubicados aguas abajo y/o aguas arriba, con el fin de dar continuidad a la construcción de los box culvert.

Medidas para mitigar el deterioro de la calidad de las aguas superficiales:

- Ante el derrame presentado, se activaron de manera inmediata las medidas de contención mediante el uso de barreras flotantes y el kit de control de derrames, evitando la dispersión del contaminante en el cuerpo de agua.

- Para este periodo por parte del proveedor se realizó aseo al baño portátil el cual el proveedor realiza los aseos correspondientes **Ver Anexo No 3. Documentos del proveedor – Certificado de disposición final**

- Se cuenta con los proveedores para realizar la adecuada disposición de residuos sólidos y líquidos.

- Se cuenta con kits control derrame en zona de trabajo y punto base, así como equipos de emergencia, como se menciona en el -P-MA-P2 Programa de protección de suelos- de este mismo documento. Ver Informe de SST para verificar las inspecciones a los kits de emergencia

Medidas para mitigar el deterioro de la calidad de las aguas por la actividad de dragado:

- Se realizo mantenimiento preventivo y/o correctivo a las maquinas presente en los frentes de obra

- Los sedimentos del dragado se depositan en sitios estipulados



Imagen No 24. Adecuación del material



Imagen No 25. Adecuación del material



Imagen No 26. Kits control de derrame



Imagen No 27. Suministro de combustible



Imagen No 28. Limpieza de baño portátil



Imagen No 29. Atención de derrame



Imagen No 30. Almacenamiento de materiales pétreo



Imagen No 31. Retiro de dique provisional

Actividades del periodo:

ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
	Si	No	No Aplica	Observación
No se obstruirán pasos de agua	X			
Manejo de aguas sanitarias	X			
Disposición de residuos sólidos y líquidos	X			
Disponer de kit de emergencias en obra	X			
Sanitarios portátiles	X			El proveedor realizo los aseos correspondientes al mes
Señalización en zona de trabajo	X			
Atención de derrames en obra	X			
Supervisión suministro de combustibles	X			
Monitoreo a la calidad del agua superficial y sedimentos			X	
Movilización y desmovilización de equipos			X	

Indicadores:

INDICADOR	META
$Monitoreos\ caño = \frac{Monitoreos\ \text{ejecutados}}{Monitoreos\ programados}\ x\ 100$	100%

RESULTADO

MONITOREOS			
MONITOREOS CAÑO: (Monitoreos ejecutados/Monitoreos Programados) * 100			
META: 100%			
MES	MONITOREOS EJECUTADOS	MONITOREOS PROGRAMADOS	% CUMPLIMIENTO
Julio	1	1	100%
Agosto	-	-	-
Septiembre	-	-	-
Octubre	-	-	-

Noviembre	-	-	-




ANÁLISIS

Se realizo el monitoreo antes de iniciar las actividades de dragado

Cumplimiento actividades $= \frac{\textbf{Actividades ejecutadas en el periodo}}{\textbf{Actividades que aplican al período}}$ **x 100**	100%

RESULTADO

CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES			
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES: (Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades que aplican al periodo) * 100			
META: 100%			
MES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**ACITIVDADES QUE APLICAN**	**% CUMPLIMIENTO**
Julio	1	1	100%
Agosto	-	-	-
Septiembre	9	9	100%
Octubre	9	9	100%
Noviembre	8	8	100%

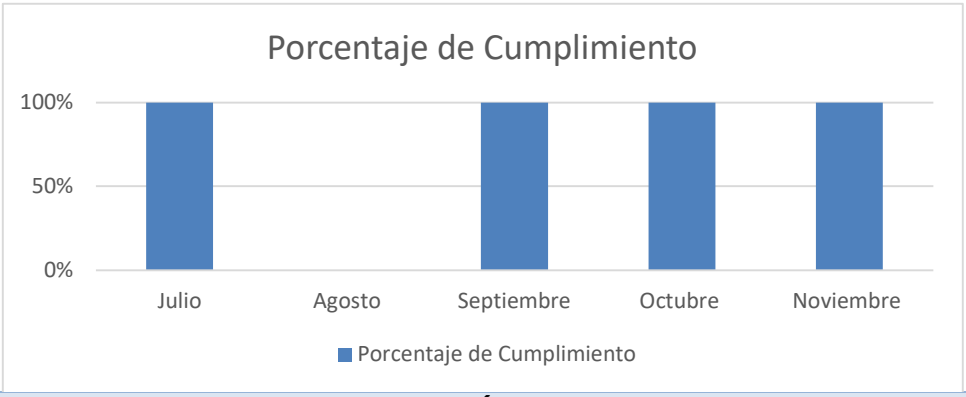

ANÁLISIS
Se cumplieron con las actividades programadas durante el periodo reportado

4.3 PROGRAMAS DEL MEDIO BIÓTICO

4.3.1 P-MB-P1 Programa De Protección De Fauna Y Flora.

Medidas para mitigar la afectación de la flora presente en el área de influencia directa del proyecto:

- En el proyecto se tiene instalado sensibilización visual por medio de letreros de prohibición.
- La biomasa vegetal producto de la tarea es aprovechado, esta fue utilizada al suelo para su aprovechamiento en el enriquecimiento de este.
- Durante la ejecución del proyecto se operó con el equipo móvil de mínimo deterioro a la vegetación
- Durante este periodo el biólogo realizo avistamiento de fauna en la zona de trabajo

Medidas para el control a la perturbación de la fauna silvestre:

- Para las operaciones se maneja una única jornada diurna.
- Se evito realizar ruidos innecesarios por silbatos, bocinas sirenas, pitos, motores encendidos, etc.

Medidas para el control al incremento de la cacería furtiva:

- En la obra está prohibida la práctica de cacería furtiva y el porte de armas.

<u>Medidas para el rescate y salvamento de especies</u>:

- Antes de inicio de actividades se realiza ahuyenta miento de fauna silvestre

  *Ver informe SALVAMENTO DE FAUNA ACUÁTICA Y TERRESTRE para profundizar de las actividades realizadas.



Imagen No 32. Avistamiento de fauna



Imagen No 33. Avistamiento de fauna



Imagen No 34. Avistamiento de fauna



Imagen No 35. Avistamiento de fauna



Imagen No 36. Ahuyenta miento de fauna



Imagen No 37. Transecto paralelo a la carretera y área de pastizales y suelos descubiertos con cobertura vegetal característica del Bosque Seco Tropical.



Imagen No 38. Recorrido avistamiento de fauna



Imagen No 39. Ahuyenta miento de fauna



Imagen No 40. Herramientas y medicamentos para el manejo y atención de fauna silvestre presentes en el campamento de atención provisional del proyecto

Actividades del periodo:


ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
	Si	No	No Aplica	Observación
Demarcación de zona de trabajo	X			
Evitar acumular la biomasa vegetal en sitios no autorizados, mezclarla con el suelo para su aprovechamiento	X			Se realizaron las actividades programadas para su cumplimiento
En caso de poda debe realizarse con personal capacitado con las herramientas que corresponden y según las indicaciones del cliente.			X	
Realizar labores de preferencia en horarios diurnos, en caso de que sea necesaria la operación nocturna dirigir las luces hacia los sitios específicos de trabajo, evitando la iluminación de los hábitats de la fauna	X			
Mantenimientos a maquinaria y equipos de trabajo	X			
Evitar los ruidos innecesarios por silbatos, bocinas sirenas, pitos, motores encendidos, etc.	X			
Prohibir a los trabajadores la práctica de cacería furtiva.	X			
Educación ambiental para los trabajadores sobre protección de los recursos naturales.	X			
Salvamento de fauna acuática: equipo de personas y elementos para manejo de fauna.	X			
Ahuyenta miento, reubicación y rescate de especies	X			

Indicadores:

INDICADOR	META
$\textbf{Cumplimiento Actividades} = \frac{\textbf{Actividades ejecutadas en el periodo}}{\textit{Actividades que aplican al período}}\ x\ 100$	100%

RESULTADO

CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES			
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES: (Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades que aplican al periodo) * 100			
META: 100%			
MES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**ACITIVDADES QUE APLICAN**	**% CUMPLIMIENTO**
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	9	9	100%
Octubre	9	9	100%
Noviembre	9	9	100%

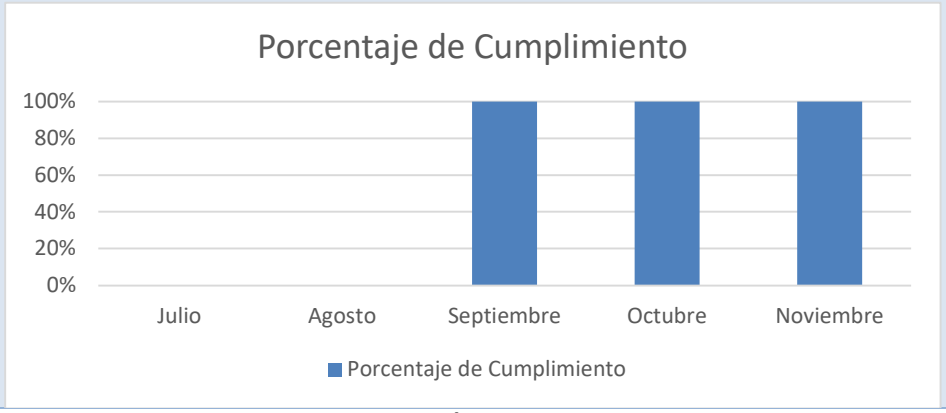

ANÁLISIS

Se cumplieron con las actividades programadas durante el periodo reportado

PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

4.4.1 P-MS-P1 Programa Socioeconómico Y Cultural.

Medidas para reducir el incremento en el riesgo de accidentes laborales:

- Se realizo la formación ambiental en los temas relacionados con las fichas de manejo Ambiental.

- El personal vinculado conto con su dotación y elementos de protección individual

- Se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas.

- Todo el personal conto con afiliación a una entidad prestadora del servicio de salud (EPS) y a la aseguradora de riesgos profesionales (ARP). Ver Informe HSE

- Ver informe Social para la visualización de la valla informativa

- Se prohíbe realizar fuego en área de influencia del proyecto.

FECHA	TIPO DE FORMACIÓN	NOMBRE DE LA FORMACIÓN
07/11/2025	Charla	Incidentes ambientales
09/11/2025	Dia	Dia de los parques naturales
11/11/2025	Charla	¿Qué es el ruido? Efectos del ruido. Protección auditiva
13/11/2025	Charla	Formas en que las sustancias químicas ingresan
14/11/2025	Charla	Las 3 R
15/11/2025	Charla	Simulacro de derrame
21/11/2025	Capacitación	Importancia de las coberturas vegetales y como ayudan a la sostenibilidad del medio ambiente
23/11/2025	Charla	¿Cómo actuar en situaciones de inhalación, derrames, ingesta y salpicadura de sustancias químicas?
28/11/2025	Charla	Conservación ambiental

Tabla No 3. Educación Ambiental

Medidas para controlar la migración y el establecimiento de asentamientos humanos:

- Para la contratación de mano de obra local. Ver Informe Gestión Social del periodo.

- Se ejecutan trabajos en las zonas específicas del contrato donde hay restricción del personal externo.

*En el informe de SST se puede verificar y ampliar información de charlas/capacitaciones al personal en temas de sustancias químicas, Seguridad y salud en el trabajo



Imagen No 41. Entrega de EPP



Imagen No 42. Entrega de EPP



Imagen No 43. Educación Ambiental



Imagen No 44. Educación Ambiental



Imagen No 45. Educación Ambiental



Imagen No 46. Instalación de Valla informativa

Actividades del periodo:


ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
	Si	No	No Aplica	Observación
Educación y formación ambiental en los temas relacionados con las fichas de manejo ambiental.	X			Se realizaron las actividades programadas para su cumplimiento
Uso de los elementos de protección individual	X			
Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas	X			
Prohibido hacer fuego en el área de influencia del proyecto	X			
Afiliación del personal a EPS y ARP	X			
Asistencia a reuniones de socialización			X	
Contar con valla del proyecto	X			
Restricción de personal no contratado en zona de trabajo	X			

Indicadores:

INDICADOR	META
$\textbf{Cumplimiento actividades} = \frac{\textbf{Actividades ejecutadas en el periodo}}{\textbf{Actividades que aplican al período}}\ \textbf{x 100}$	100%

RESULTADO

CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES			
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES: (Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades que aplican al periodo) * 100			
META: 100%			
MES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**ACITIVDADES QUE APLICAN**	**% CUMPLIMIENTO**
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	7	7	100%
Octubre	7	7	100%
Noviembre	7	7	100%

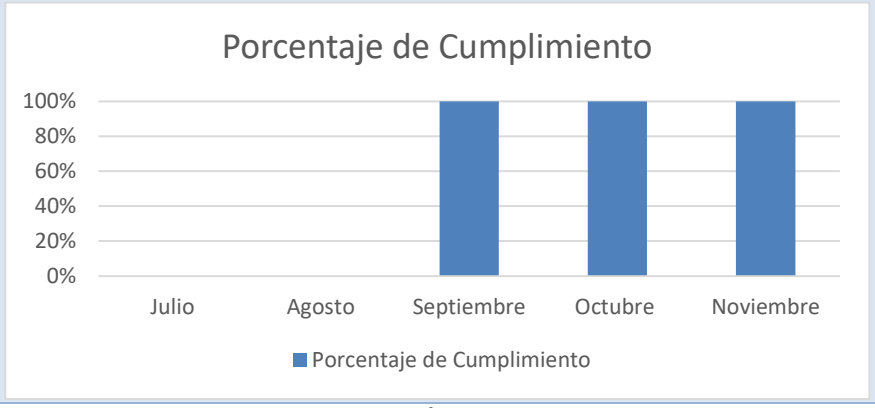

ANÁLISIS

Se cumplieron con las actividades programadas durante cada periodo de la vigencia

4.4.2 P-MS-P2 Programa Manejo De Residuos.

Manejo de residuos sólidos:

- Los residuos aprovechables y no aprovechables de las actividades de dragado y la construcción de los boxes se dispusieron con la fundación ECOPALERMO, para su aprovechamiento y su disposición final. Se encuentra pendiente el certificado de disposición final.

Fecha	Residuo	Cantidad Kg
18 julio 2025	Residuo no aprovechable	17.8
	Plástico	15.9
	PET	1.8
	Cartón	0,4
	Pasta	0,8
	Hierro	0,4
15 agosto -2025	Plástico	10.6
26 septiembre - 2025	Residuos No aprovechables	47,3
	PVC	3.1
	PET	1
	Cartón	3,1
	Pasta	2,4
	Hierro	8
	Cartón color	3,4
	Archivo	2,3
24 octubre - 2025	Residuos no aprovechables	19
	PVC	2,3
	Tetrapak	1,4
	Plástico	5,1

Tabla No 4. Cantidad de generación de residuos solidos

- Manejo de residuos líquidos:

- Durante el periodo reportado se generaron residuos líquidos del baño portátil y se dispuso con el proveedor autorizado. Se encuentra pendiente el certificado de disposición final.

Fecha	Cantidad (m3)
Octubre 2025	0,080 m3

Tabla No 5. Cantidad de generación de residuos líquidos

Manejo De Residuos Peligrosos:

- Durante este periodo se generó residuos peligrosos estos fueron entregados al proveedor RECITRAC. Se adjunta el manifiesto se encuentra pendiente el certificado de disposición final. **Ver Anexo No 3. Documentos del proveedor**

- La cantidad generada es de:

Fecha	Tipo de residuo	Cantidad	Ud. Medida
12 – sept – 2025	Filtro de aire	9,50	Kg
08-oct-2025	Respel	6,85	Kg
12-oct-2025	Filtros de aire	9,50	Kg
31-oct-2025	Aceite usado	5	Gl
	Cartón contaminado	1,80	Kg
	Filtros de aceite	7,25	Kg
	Mangueras	3,75	Kg
28 nov-2025	Arenas – contaminadas	2.50	Kg

Tabla No 6. Cantidad de generación de residuos peligrosos

Almacenamiento de Residuos Peligrosos:

- Durante este periodo se instaló los centros de acopio temporal de los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, estos cuenta con su dique de contención.



Imagen No 41. Punto ecológico en punto base



Imagen No 42. Almacenamiento de residuos aprovechables – no aprovechables- peligroso



Imagen No 43. Clasificación de los residuos



Imagen No 44. Entrega de residuos a proveedor autorizado



Imagen No 45. Entrega de residuos a proveedor autorizado



Imagen No 46. Entrega de residuos a proveedor autorizado

5. MEDIDA DE COMPENSACIÓN

Establecimiento De La Estrategia De Restauración Ecológica.

- Durante el período evaluado se inspeccionó el terreno destinado a las siembras y se recibieron los individuos arbóreos destinados al inicio de las actividades de establecimiento de la estrategia de restauración ecológica.



Imagen No 47. Recorrido en predio para reforestación



Imagen No 48. Recorrido en predio para reforestación



Imagen No 49. Entrega de individuos arbóreos



Imagen No 50. Entrega de individuos arbóreos



Imagen No 51. Entrega de individuos arbóreos



Imagen No 52. Entrega de individuos arbóreos

6. OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES

Salvamento De Fauna Acuática Y Terrestre

- Las actividades contempladas en este ítem se pueden verificar en el programa 4.3.1 P-MB-P1 Programa De Protección De Fauna Y Flora y en el informe de Salvamento De Fauna Acuática Y Terrestre

Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto.

- Durante el período evaluado se culminó la implementación de las estrategias de sensibilización y participación ambiental dirigidas a las comunidades del Carmen del Magdalena y Nueva Venecia, ubicadas en la zona de influencia del proyecto

La verificación de las actividades ejecutadas se encuentra soportada en el informe detallado de sensibilización y participación ambiental, donde se presentan los resultados y las evidencias correspondientes a las jornadas desarrolladas.



Imagen No 53. Jornada Institución Educativa – Nueva Venecia



Imagen No 54. Institución Educativa – Carmen del Magdalena



Imagen No 55. Jornada Institución Educativa – Carmen del Magdalena



Imagen No 56. Cláusula de la Jornada de estrategias – Carmen del Magdalena



Imagen No 57. Cláusula de la Jornada de estrategias – Nueva Venecia



Imagen No 58. Cláusula de la Jornada de estrategias – Nueva Venecia



Imagen No 59. Jornada Institución Educativa – Nueva Venecia



Imagen No 52. Cláusula de la Jornada de estrategias – Carmen del Magdalena

Mantenimiento Preventivo De Estación De Monitoreo.

Para este periodo se realizó mantenimiento preventivo a las siguientes estaciones



Imagen No 53. Mantenimiento Estación Caño los Micos



Imagen No 54. Mantenimiento Estación Caño los Micos

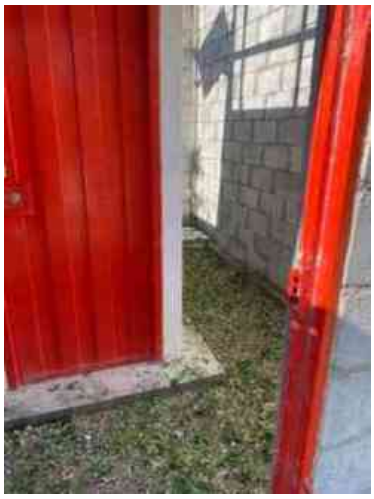


Imagen No 55. Mantenimiento Estación Caño los Micos



Imagen No 56. Mantenimiento Estación Caño los Micos



Imagen No 57. Mantenimiento Estación Caño los Micos



Imagen No 58. Mantenimiento Estación Caño los Micos



Imagen No 59. Mantenimiento Estación Caño los Micos



Imagen No 60. Mantenimiento Estación Caño El Salao



Imagen No 61. Mantenimiento Estación Caño El Salao



Imagen No 62. Mantenimiento Estación Caño El Salao

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	07-NOV-2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat 325
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuly Polo Navarro
PROYECTO:	CC 3544 - Caños Mancha
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	105.1 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	07:17:02 am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	07:25:03 am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo **Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora**	Yesuly Polo N. VoBo **Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE**

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	01-NOV-2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cut PAD 08
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Polo Moreno
PROYECTO:	CGS244- Cano Mondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	56 gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	07:12:11 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	07:16:35 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	NO Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones .....

Richard Almanzales
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth Polo M
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	01-Nov-2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Reserva
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuith Polo Navarro
PROYECTO:	C6544- Caño Mondo-
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	433 GLS
HORA INICIO DEL TANQUEO:	07:25:15 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	07:47:09 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	NO Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	/				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuith Polo N
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	07/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Reserva
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesith Polo Navarro
PROYECTO:	PCB544- Cano Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	517 GLS
HORA INICIO DEL TANQUEO:	08:58:07 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	09:23:06 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones .....

VoBo **Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora**	Yesith Polo N VoBo **Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE**

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	07/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat PHD08
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Pedo Navarro
PROYECTO:	Cpo 44 Caño Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	772 GLS
HORA INICIO DEL TANQUEO:	08:40:39 Seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	08:47:13 Seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	NO Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Richard Arrieta Les
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth Pedo Navarro
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Carmen del Magdalena
FECHA:	07/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat 323
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth palo navarro
PROYECTO:	CCSU4 - Caño Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	71 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	08:47:23 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	08:52:46 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	no Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingencias y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Armando Paez
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

yesuth palo n
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Salamina Magdalena
FECHA:	22/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Bulldozer D6H
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Polo Navarro
PROYECTO:	CGSM4 - Cuña Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	41 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	11:44:35 Seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	11:53:15 Seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado de: pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Taneta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	/				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

VoBo Yesuth Polo N
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Solamar Magdalena
FECHA:	22/11/2015
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Reserva
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	yesuith palo navarro
PROYECTO:	C6544- Caños Mamba
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	105 gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	11:53:29 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	12:01:27 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

VoBo yesuith palo n
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Sabanas Magdalena
FECHA	12/11/2022
NOMBRE DEL EQUIPO (Draga, Remolcador,Lancha)	[illegible]
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO	[illegible]
PROYECTO	[illegible]
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO	[illegible]
HORA INICIO DEL TANQUEO	[illegible]
HORA FINAL DEL TANQUEO	[illegible]

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS					no Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

[illegible]
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

[illegible]
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Sabanas Magdalena
FECHA:	12/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Dan Jose 340
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Jesus Polo Navarro
PROYECTO:	CC544 - Caño Mundo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	66 G
HORA INICIO DEL TANQUEO:	10:16:33 am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	10:43:27 segam

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	no Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones .....

Frans Camargo
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesus Polo N
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-015 FECHA 25/01/2017 VERSION 2

CIUDAD:	Sabanas Magdalena
FECHA:	12/11/2020
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat 313
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesid Pedro Arango
PROYECTO:	CC-114 - Casa Nueva
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	23 GLS
HORA INICIO DEL TANQUEO:	10:52:54 segundos
HORA FINAL DEL TANQUEO:	10:57:42 segundos

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	✓	✓	✓	✓	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingencias y conoce del mismo	✓		✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Armando Paez
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesid Pedro
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien Inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Buenaventura
FECHA:	26/11/25
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Remolcador
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO	Jesus Pedro Arango
PROYECTO:	Obras Leve Mercado
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	547 Galones
HORA INICIO DEL TANQUEO:	11:58:18 pm
HORA FINAL DEL TANQUEO:	11:23:59 pm

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado de pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion de etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado de numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado de numero CAS	✓	✓	✓	✓	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingencias y conoce del mismo			✓		
12	Estado de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Sabanas Magdalena
FECHA:	13/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Reserva
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO	Yesuith Polo Navarro
PROYECTO:	Cpsm - Cerro Tasajo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	424 GLS
HORA INICIO DEL TANQUEO:	09:26:37 segundos am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	09:50:35 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	no aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

VoBo Yesuith polo n
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Sabanas Magdalena
FECHA:	18/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	CAT 323
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO	Yesuith Polo Vaquero
PROYECTO:	CBSAG - Cano Mosquito
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	61 gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	07:12:46 say am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	07:14:12 say am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condición de etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado de numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado de numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga de combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingencias y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de nivel de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Armando La Paz
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuith Polo V
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Salamina Magdalena
FECHA:	18/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cot PHD 08
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuith Polo Navarro
PROYECTO:	C6544 - Caño Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	702 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	09:50:53 Segundos
HORA FINAL DEL TANQUEO:	09:05:11 Segundos

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Rafael Manuel Scholz
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuith Polo N
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD:	Salamina Magdalena
FECHA:	18/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Doosan 340
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Polo Navarro
PROYECTO:	CBS44- Cuña Honda
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	81 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	09:20:58 Seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	09:26:21 Seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		
	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		
	Abastecimiento de combustible	**BIEN**	**MAL**	**SI**	**NO**	**ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA**
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Fran Camacho
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth Polo N
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Salamina Mag
FECHA:	26/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Reserva
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuitty Polo Navarro
PROYECTO:	CGS44 - Canto hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	455 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	12:00:56 seg pm
HORA FINAL DEL TANQUEO:	12:22:26 seg pm

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuitty Polo N
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD:	Soledad Atl.
FECHA:	26/11/2025
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Retro Excavadora #4
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Polo V
PROYECTO:	CC 5461 Cano Mendoza
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	107 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	10:49:30 Seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	10:59:27 Seg am

ITEM	DESCRIPCIÒN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth Polo V
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Soledad Atlantico
FECHA:	26/11/15
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Lol PHD 08
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth Polo Vasquez
PROYECTO:	Ecopetrol - Cano Limon
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	1266 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	11:19:54 seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	11:36:21 seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado de pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Richard Almendrales
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth Polo
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Solamar Magdalena
FECHA	26/11/25
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat 323
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO:	Yesuth polo Navarro
PROYECTO:	CGS44- Caño Honda
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	85 Gls
HORA INICIO DEL TANQUEO	11:36:30 Seg am
HORA FINAL DEL TANQUEO:	11:41:01 Seg am

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado del pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	No Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Armando Paez
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesuth polo
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien inspecciona HSE

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	PREOPERATIVO DE TOMA DE COMBUSTIBLE EN EQUIPOS	CODIGO GI-R-016 FECHA: 25/01/2017 VERSION: 2

CIUDAD	Soledad Mora
FECHA	26/01/25
NOMBRE DEL EQUIPO, (Draga, Remolcador,Lancha)	Cat 325
OPERADOR EQUIPO Y/O ENCARGADO / QUIEN INSPECCIONO	Jesus Pablo Navarro
PROYECTO:	@ 6 114- Cuña Hondo
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE RECIBIDO:	52 gls
HORA INICIO DEL TANQUEO:	11:46:59 seg
HORA FINAL DEL TANQUEO:	11:51:22 seg

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL *Transporte de combustible*	BIEN	MAL	SI	NO	ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado de pictograma que clasifica el peligro de la sustancia	✓				
2	Condicion del etiquetado y rotulado de la sustancia	✓				
3	Estado del numero de Naciones Unidas (UN)	✓				
4	Estado del numero CAS	/	/	/	/	NO Aplica
5	Lleva Manifiesto de carga del combustible			✓		
6	Lleva Hoja de seguridad del combustible			✓		
7	Lleva Planilla para transporte de sustancia de uso restringido			✓		
8	Lleva Remesa terrestre de carga			✓		
9	Lleva Registro nacional de transporte de carga			✓		
10	Lleva Tarjeta de emergencia			✓		
11	Lleva Plan de contingenicas y conoce del mismo			✓		
12	Estabilidad de la carga	✓				
13	Lleva extintores			✓		
14	Lleva Kit antiderrames completo			✓		

	Surtidor,mangueras,acoples,fugas,otros	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Estado pistola del surtidor	✓				
2	Estado de las mangueras	✓				
3	Estado de acoples	✓				
4	Existen fugas de combustible en mangueras				✓	
5	Existen fugas por los acoples				✓	
6	Estado de valvulas	✓				
7	Existen fugas por las valvulas				✓	
8	Estado del cubitanque	✓				
9	Existen fugas en el cubitanque				✓	
10	Estado de pimpinas y canecas	✓				
11	Existen fugas en pimpinas y canecas				✓	
12	Estado de las tapas de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
13	Rotulacion de recipientes utilizados en el trasiego de combustible	✓				
14	Estado del surtidor	✓				
15	Disponibilidad de extintor			✓		
16	Disponibilidad de Kit antiderrame			✓		

	Abastecimiento de combustible	BIEN	MAL	SI	NO	ACCION CORRECTIVA RECOMENDADA
1	Demarcacion del area			✓		
2	Verifique reporte de inicio de maniobra	✓				
3	Asistencia en maniobra de personal calificado para operación de combustible			✓		
4	Porte de EPP por parte de personal calificado para operación de combustible			✓		
5	Motores apagados			✓		

Observaciones y Recomendaciones

Alfonso Ibañez
VoBo
Operador de Draga y/o Piloto de Remolcador y/o Operador de Excavadora

Yesus Pabon
VoBo
Maquinista y/o Marino y/o Quien Inspecciona HSE

Powered by CamScanner

	REPORTE DE NO CONFORMES	CODIGO:	GIM-R-016
		VERSION:	2
		FECHA:	15/01/2019

FECHA:	29/11/2025	**NC No.**	
PROCESO:	Gestion integral de mejoras - Ambiental		

DESCRIPCION:

El día 22 de noviembre, aproximadamente a las 2:20 p. m., se presentó la ruptura de una manguera hidráulica de los gatos gemelos de la retroexcavadora CAT PHD08, lo que ocasionó un derrame de aceite hidráulico en la zona de operación. De manera inmediata se procedió a detener la máquina y a realizar la inspección del área afectada. Posteriormente, se implementaron las medidas de control correspondientes mediante el uso del kit de control de derrames, logrando la contención y limpieza del aceite derramado. Finalmente, se informó al área de infraestructura para realizar la corrección y reparación del equipo, con el fin de prevenir la repetición del evento.

Responsable de Identificación / Cargo:	Yesmith Polo - Vigia HSE

TRATAMIENTO DE NO CONFORME

1. CORRECCION	**x**	**5. REPROCESO**	
2. RECLASIFICACION		**6. REPARACION**	
3. CONCESIÓN		**7. DESECHO**	
4. LIBERACION			

DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO:	1. Apagar el equipo 2. Evaluación del origen de la ruptura de la manquera 3. Verificacion de la contención del aceite vertido 4. Recogida del aceite vertido 5. Correccion de la ruptura de la manguera
Fecha de Ejecución:	22/11/2025
Responsable / Cargo:	Yesmith Polo - Vigia HSE/Yurani Acevedo - Ingeniera Ambiental

LIBERACIÓN DE NO CONFORMES

Estado en que se libera el No Conforme:

ACCIONES CORRECTIVAS :

1. Se realizó la contención inmediata del derrame, utilizando el kit de control de derrames para la recolección del aceite hidráulico. El material contaminado fue dispuesto en bolsa roja, garantizando su adecuada disposición final mediante un proveedor autorizado, conforme a la normativa ambiental vigente.
2. Posteriormente, se llevó a cabo la reparación de la manguera hidráulica del equipo, verificando su correcto funcionamiento antes de reiniciar las operaciones, con el fin de prevenir la repetición del evento.







Equipo / Inmueble : PHD08 CATERPILLAR 326DL CAT0326DKPJM00139 (EX-22)

RETRO PHD08: se reventa manguera hidraulica	Realizado	2/12/2025	002157	32 h 00 m	32 h 00 m	Alta	Correctivo
Mangueras hidraulicas sistema de gatos	Realizado	22/11/2025	002125	48 h 00 m	3 h 00 m	Alta	Correctivo
Tubo de hidráulico con fisurai	Realizado	5/11/2025	002053	8 h 00 m	4 h 00 m	Media	Correctivo

Responsable de Liberación / Cargo:	Yesmith Polo - Vigia HSE/Yurani Acevedo - Ingeniera Ambiental	**Fecha:**	23/11/2025

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 07/11/2025 **Lugar:** Carmen del Magdalena

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 7:00am **Hora Final:** 7:15am

Temas: Incidentes ambientales **Obra:** CB 5414 - Caño Mocho

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Hernando Pena	7037694(	Demarcar	OP	
2.	Richard Almendra 41	1081905703	DHJ	Op	
3.	Juan Cervantes	1799382676	V y D	OP	
4.	Jesus D Polanía	1100549999	Unid	topografo	
5.	Carlos Alfredo Ramos	1010080507	Consorcio	Marino	
6.	Jonatan d padilla	7082095646	Consorcio	Marino	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 03/11/2025 **Lugar:** Ex Colonial #4 C. Hondo

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 10:10am **Hora Final:** 10,35am

Temas: Incidentes ambientales **Obra:** CBSM4- Cuto Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pedro Wilches G.	108/028028	consorcio	Marino	Pedro Wilches
2.	Luis Herrera	10423482		OP	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 09/7/2025 **Lugar:** Exterior #1 C. Hondo

Expositor: Yesuto Polo Navarro **Hora Inicio:** 11:00 am **Hora Final:** 12:00 pm

Temas: Trabajos ambientales **Obra:** CBSU4 - Cuñ. Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Johendys Cosco F	1004294851	Consorcio	Marino	Johendys C
2.	Felix Valencia P	9.153.002	V y D	op	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2 **Firma del Expositor (es):** Yesuto Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 07/11/2025 **Lugar:** Carmen de Magdalena

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:00am **Hora Final:** 7:15am

Temas: Incidentes ambientales **Obra:** CB544- Canal Hombre

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Armando Ruiz	7657094	Panamerican	OP	
2.	Richard Rondon	1.047.923.03	PAD	OP	
3.	Fran Cervantes	1079932676	V y D	OP	
4.	Jesus D Palencia	1100549999	V y D	Topografo	
5.	Carlos Alfredo Barrera	1010080007	Consorcio	Marino	
6.	Jonathan de padilla	1082095691	Consorcio	Marino	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

VIAS & DRAGADOS S.A.S	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 03/11/2020

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 07/11/2025	Lugar: Comuna del magdalena
Expositor: Yesuth polo navarro	Hora Inicio: 7:10am Hora Final: 7:15am
Temas: Incidentes ambientales	Obra: CB 544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Juan Cervantes	1047932676	V y D	OP	
2.	Jesus P Palencia	1100xxxxxx	V y D	Logista	Jesus P P.
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	Firma del Expositor (es): Yesuth polo n

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 07/11/2025	**Lugar:** Box culvert #4 C Hondo	
Expositor: Yesus Polo Navarro	**Hora Inicio:** 10:10am	**Hora Final:** 10:35am
Temas: Incidentes ambientales	**Obra:** CBS#4 - Caño Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pedro Miches G	1081028628	Consorcio	Maquino	Pedro Miches
2.	Luis Herrera	1042348212		OP	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** Yesus Polo Navarro

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 07/11/2025 **Lugar:** Box culvert #1 C. Izquierdo

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 11:45am **Hora Final:** 12:00pm

Temas: Incidentes ambientales **Obra:** CB-114 - Cauca Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jonendrys Orozco F	1.004298501	Consorcio	Marino	
2.	Felix Valencia P	9.159.002	VYD	Op	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 03/11/2020

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 03/11/2025	Lugar: Box Culvert #1 C Hondo
Expositor: Yesuly Polo Novoa	Hora Inicio: 11:40 Hora Final: 12:00
Temas: Incidentes ambientales	Obra: CB3114 - Cali Juanchito

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	FELIX VALENCIA	9.153.002	VXD	OP	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1	Firma del Expositor (es): Yesuly Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 10/11/2025 **Lugar:** Punto Base

Expositor: yesus polo novana **Hora Inicio:** 7:40 am **Hora Final:** 7:55 am

Temas: Dia de los parques naturales **Obra:** CBS44 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Diomedes Ruiz	7053084	Ramon	op	
2.	Richard Hernandez	1078908907	pto	op	
3.	Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
4.	Jesus D Palencia	1100537626	V y D	topasto	
5.	Carlos Alfredo Bonilla	1010078507	Consorcio	Marino	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** yesus polo n

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 10/11/2025 **Lugar:** Parque Cultural del Río Cali - Cañaveralejo

Expositor: Yesenia Polo Rivera **Hora Inicio:** 12:00pm **Hora Final:** 1:03pm

Temas: Día de los parques nacionales **Obra:** C.B.S.M.S. - Cañaveralejo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Pedro wilches gonzalez	1084029024	Consorcio	Maestro	Pedro wilches
2. LUIS HERRERA	1042348807		OP. Excavadora	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 2 **Firma del Expositor (es):** Yesenia Polo R

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 10/11/2024 **Lugar:** Parque Cultural Mirador Hacienda

Expositor: Yesenia Polo Maestre **Hora Inicio:** 2:00 p.m. **Hora Final:** 3:00 p.m.

Temas: Día de los parques naturales **Obra:** CBMM - Guacharaca

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Feliz Valencia	9.159.002	V y D	OP	
2.	Jairo Ospino Herrera	1004799507	Consorcio	Marino	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2 **Firma del Expositor (es):** Yesenia Polo

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 10/11/2025 **Lugar:** Punto Base

Expositor: Yesuis Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:40 am **Hora Final:** 7:55 am

Temas: Dia de los Parques naturales **Obra:** OBS 14 - Caño Mondá

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Ernesto Baez	7653094	Conaveca	Op	
2.	Richard Hernandez	1081209807	PHD	Op	
3.	Sinibaldo	1004121723	consorcio	Marino	Sinibaldo
4.	Jesus N Palma	1100514109	U n	topogra	
5.	Carlos Alfredo Pereira	1010080503	Consorcio	Marino	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesuis Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 03/11/2020

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 10/11/2025	Lugar: Punto Base	
Expositor: Jesus Polo Valencia	Hora Inicio: 7:00 am	Hora Final: 7:55 am
Temas: Dia de los parques naturales	Obra: CB 3 Mun. Cuña Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jesus P Valencia	1100541000	UnD	Terapeuta	J. P. P
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1	Firma del Expositor (es): Jesus Polo V

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/11/2025 **Lugar:** Bar cabecera #41 C Nuevo

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 11:40 am **Hora Final:** 1:02 pm

Temas: Día de los parques naturales **Obra:** CBS44 - Caño Nuevo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Pedro Withes	1081028022	consorcio	Marino	Pedro Withes
2. IVIS HERRERA	1042348077		OP Excavadora	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 2 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha:	**Lugar:** Bx Cañaveral #1 Chambacu	
Expositor: Yesuito Polo Navarro	**Hora Inicio** 2:10 p.m.	**Hora Final:** 3:15 P.M.
Temas: Dia de los parques nacionales	**Obra:** CBSU4 - Baño Hondo	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Felix Valencia P.	9.153.002	VyD	OP	
2. Johnnatan Araujo Ferreira	1004277501	Consorcio	Marino	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** Yesuito Polo N

Powered by CamScanner

MAS & PRIMADOS S.A.S	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 03/11/2020

Capacitación/Entrenamiento		**Charla Seguridad**		**Charla Técnica**	
Re inducción		**Inducción**		**Reunión Informativa**	
Otro		**¿Cuál?**			

Fecha: 10/11/2025	**Lugar:** Box Culvert #1 C Hondo	
Expositor: Yesuris Polo Navarro	**Hora Inicio:** 3:00 pm.	**Hora Final:** 3:15 pm.
Temas: Dia de los parques naturales	**Obra:** CPS 114 - Canto Hondo	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Felix Valencia	9.153.002	V y D	op	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 1	**Firma del Expositor (es):** Yesuris Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 11/11/2025 **Lugar:** Box culvert #4 C Hondo

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 10:00am **Hora Final:** 10:15am

Temas: ¿Que es el ruido? Efectos del ruido. protección auditiva **Obra:** CBS 1141 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	LUIS Herrera	1042348012	Roys Corzo	op. Excavadora	
2.	Pedro wilcher Gonzalez	1081027024	Consorcio	Minero	Pedro wilchers
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 11/11/2025	**Lugar:** Punta Pacífica
Expositor: Jesus Pinto Hernandez	**Hora Inicio:** 7:00am **Hora Final:** 7:15am
Temas: ¿Qué es el ruido? Efectos del ruido, pro técnicas auditivas	**Obra:** CBSM - Cerro Negro

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Bernardo Ruiz	7053054	Pamesa	OP	
2.	Richard Wheatley	10819397	PHD	OP	
3.	Carlos Alfredo Barrera	100080507	Consorcio	Marino	
4.	Sinibaldo	1004171723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4	**Firma del Expositor (es):** Jesus Pinto Hernandez

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 11/11/2025	**Lugar:** Cox cultivo #1 C. Monte
Expositor: yesuby polo vocano	**Hora Inicio:** 1:30pm **Hora Final:** 1:45pm
Temas: ¿Que es el ruido? Efectos del ruido, protección auditiva	**Obra:** CBSMH- Cerro Monte

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jehondys Ortiz	10.429.850	Consorcio	Maniz	
2. FELIX VALENCIA	9.153.002	VYD	OP	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 2

Firma del Expositor (es): yesuby polo v

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código GH-R-007
		Versión 3
		Fecha 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 7/11/2025	**Lugar:** [illegible]	
Expositor: [illegible]	**Hora Inicio:** 7:00am	**Hora Final:** 10:15am
Temas: ¿Qué es el ruido? Efectos del ruido en [illegible] Técnica curativa	**Obra:** [illegible]	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	JULIS HERRERA	1042348[illegible]	Roys Corzo	OP. EXCAVADORA	
2.	Pedro miguel González	1081627027	Confored	Marino	Pedro miguel
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** [illegible]

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 11/11/2025	**Lugar:** Punto Base
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7am **Hora Final:** 7:15am
Temas: ¿Que es el ruido? Efectos del ruido. Protección auditiva.	**Obra:** CBSM - Canal Navalo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Arnaldo De Oro	7053035	Panamco	OF	
2. Richard Almeida	1001287?7	PAD	Op	
3. Carlos Alfredo Borrero	1010080507	Consorcio	Marino	
4. Sinibaldo	1004121773	Consorcio	Marino	Sinibaldo
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 4	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N.

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 14/11/2018	**Lugar:** Box culvert # 1 (Hombi	
Expositor: Yasmin Polo Valencia	**Hora Inicio:** 1:30 Pm	**Hora Final:** 1:45 Pm
Temas: ¿Que es el ruido? Efectos del ruido, protección auditiva	**Obra:** CB-114 - Canal Hombi	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. FELIX VALENCIA	9153002	VYD	OP	
2. Johendrys Orozco	1004298507	Consorcio	Marino	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):**

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 03/11/2020

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	✓	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			
Fecha: 4/11/2020				Lugar: Parque Bolívar Ha Nuevo	
Expositor: Yesenia Polo Valencia				Hora Inicio: 12:30 pm	Hora Final: 1:45 pm
Temas: ¿Qué es el ruido? Efectos del ruido, pausa activa.				Obra: CBN III - Santa Marta	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. FELIX VALENCIA	9.153.002	VYD	OP	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 1	Firma del Expositor (es): Yesenia Polo V.

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/11/2025	**Lugar:** Punto Base	
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:20am	**Hora Final:** 7:35am
Temas: Temas en los que las sustancias pueden ingresar	**Obra:** CGS114 - Centro Hospitalario	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Osmando Paz	1057204941	Duncan	OP	
2. Richard Hernandez	1081905927	JPD	OP	
3. Fran Evans	1079932676	V y D	OP	
4. Sinibaldo	1004621773	Consorcio	Marino	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 4	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/11/2025	**Lugar:** Box Culvert #4 C Hondo
Expositor: yesnitt polo vasconez	**Hora Inicio:** 11:10am **Hora Final:** 11:25am
Temas: Formas en las que las sustancias químicas ingresan	**Obra:** CB544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pedro vilchez G	1081029088	Consorcio	Marino	Pedro vilchez
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1	**Firma del Expositor (es):** yesnitt polo v

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/11/2025	**Lugar:** Box culvert #1 C. Hondo
Expositor: Jesuits Polo Navarro	**Hora Inicio:** 2:10pm **Hora Final:** 2:25 pm
Temas: Como en lo que las sustancias químicas nos ingresan	**Obra:** CB 1444 - Canal Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Felix Valencia P	9.153.002	V y D	Op	
2.	Jesuits Jose Javier	1004298507	Consorcio	Marino	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** Jesuits Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/11/2025	**Lugar:** Punta Pitre
Expositor: Yesenia Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:20am **Hora Final:** 7:35am
Temas: Formas en las que las Sustancias Químicas ingresan	**Obra:** CG544 - Centro Hospitalario

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Armando Ruiz	7498084	Bruno	QD	
2.	Richard Mendoza	1047957	PHD	OP	
3.	Juan Cervantes	1019932676	V y D	OP	
4.	Sinibaldo	1004121773	Consorcio	Marino	Sinibaldo
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4	**Firma del Expositor (es):** Yesenia Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 03/11/2020

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/11/2025	Lugar: Punto Base
Expositor: Yesuly Polo Navarro	Hora Inicio: 7:00am Hora Final: 7:30am
Temas: Formas en las que los sustancias	Obra: CBSU4- Coño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Fran Grants	1079932676	V4D	OP	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 7	Firma del Expositor (es): Yesuly Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código GH-R-007
		Versión 3
		Fecha 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/11/2025 **Lugar:** Box Culvert #1 C. Hondo

Expositor: Yesuth Pako Serrano **Hora Inicio:** 2:10 PM **Hora Final:** 2:35 PM

Temas: Formas en las que los sustancias qui mas ingresan **Obra:** CBC44 - Cruce Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	FELIX VALENCIA P	9.153.002	VYD	OP	
2.	Jonathan Orozco Fonseca	1004298507	Visitante	Marino	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Pako S

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 03/11/2020

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica		
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa		
Otro		¿Cuál?				
Fecha: 13/11/2025				Lugar: Box Culvert #1 C Hondo		
Expositor: yesuitt polo novano				Hora Inicio: 2:10 pm	Hora Final: 2:15 pm	
Temas: Formas en la que los sustancias quimicas ingresan				Obra: CP 344 - Caño Hondo		

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.					
2.	FELIX VALENCIA P	9.153.002	V y D	OP	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1	Firma del Expositor (es): yesuitt polo n

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica		
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa		
Otro		¿Cuál?				

Fecha: 14/11/2025		**Lugar:** Punto Bose	
Expositor: Yesuth Polo Navarro		**Hora Inicio:** 7:00am	**Hora Final:** 7:15am
Temas: Los tres R		**Obra:** CB344 - Casa Hondita	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Richard Alzola	1382[illegible]	PMO	OP	
2.	Ana [illegible]	7057[illegible]	a Proteger	OP	
3.	Juan Cuadrado	1079932616	V Y D	OP	
4.	Carlos Alfredo Barrera	1010040507	Consorcio	Marino	
5.	Sinibaldo	1004121723	consorcio	Marino	Sinibaldo
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 14/11/2025	**Lugar:** Box culvert #1 C Hondo	
Expositor: Yesid Polo Navarro	**Hora Inicio** 3:15 Pm	**Hora Final:** 3:30 pm
Temas: Las tres R	**Obra:** C6344 - Cuña Hondo	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Johandry Bosco F	1004798501	Consacio	Obrero	
2. FELIX VALENCIA P	9.153.002	V Y D	OP	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** Yesid Polo

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 14/11/2025 **Lugar:** Barcelveta #4 Chanto

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 11:40am **Hora Final:** 11:55am

Temas: Las 5 Rs **Obra:** CBSM4 - Canto Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pedro Wilches	1693028691	Consorcio	Marino	Pedro Wilches
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 14/11/2025	**Lugar:** Punto Base
Expositor: Yesuito Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:00am **Hora Final:** 7:15am
Temas: Las tres R	**Obra:** CBS44 - Canto Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Richard Alfaro	1081735713	PMD	OP	
2.	Arnaldo Pérez	7077054	Obrero	OP	
3.	Fran Evans	1079932676	VyD	OP	
4.	Carlos Alfredo Barrera	1010080507	Consorcio	Marino	
5.	Sinibaldo	1004194723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5

Firma del Expositor (es): Yesuito Polo N

Powered by CamScanner

VIAS & DRAGADOS S.A.S	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 03/11/2020

Capacitación/Entrenamiento		**Charla Seguridad**	X	**Charla Técnica**	
Re inducción		**Inducción**		**Reunión Informativa**	
Otro		**¿Cuál?**			

Fecha: 14/11/2025 **Lugar:** Punto Base

Expositor: Yesuith Polo Navarro **Hora Inicio:** 9:00am **Hora Final:** 7:17am

Temas: Los tres R **Obra:** CBSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Fran Givanto	1079932676	V y D	Operador	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1 **Firma del Expositor (es):** Yesuith Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión 3
		Fecha 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 14/11/2025 **Lugar:** Pozo calvert #1C Hondo

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 3:15 Pm **Hora Final:** 3:30 Pm

Temas: Las tres R **Obra:** CPS 414 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Johnny's Orozco G	1004798564	Consorcio	Marino	
2.	Elix Valencia P	9.159.002	V y O	OP	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 03/11/2020

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica		
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa		
Otro		¿Cuál?				

Fecha: 14/11/2025	Lugar: Box culvert #1 C/Hondo	
Expositor: Yesuly Polo Navarro	Hora Inicio: 3:15Pm	Hora Final: 3:30pm
Temas: Las tres R	Obra: CGSM4 - Cauce Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	FELIX VALENCIA P	9.153.002	V x D	OP	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1	Firma del Expositor (es): Yesuly Polo V.

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código GH-R-007 Versión 3 Fecha 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 14/11/2025 **Lugar:** Bx Calvert #4 C Hondo

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 11:00 am **Hora Final:** 11:30 am

Temas: Las tres R **Obra:** CGSM - Canal Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pedro Wilches	1081028029	Consorcio	Marino	Pedro Wilches
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	15/11/2025
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	yesuith polo navarro
TIPO DE EMERGENCIA	Simulacro de Incendio
PROYECTO:	CBS44 - Caño Hondo
EMBARCACION:	

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Sinibaldo	Consorcio	Sinibaldo
Carlos alfredo Barra	Consorcio	
Juan Cervantes	V Y D	

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?			✓	
¿Se dio la voz de alarma?			✓	
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?			✓	
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?			✓	
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?			✓	
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?			✓	

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?			✓	
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?			✓	
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?			✓	
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?			✓	
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?			✓	
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?			✓	
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?			✓	
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?			✓	
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?			✓	
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?			✓	

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta		
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona		
Salida de la última persona		
Llegada de la primera persona al punto de encuentro		
Llegada de la última persona al punto de encuentro		
Retorno a las instalaciones		

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 15/11/2025	**Lugar:** Punto Base
Expositor: Yesnitz Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:28am **Hora Final:** 7:43am
Temas: Simulacro de Tsunami	**Obra:** CBS44 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Sinibaldo	6041217713	Consorcio	Marino	Sinibaldo
2. Carlos Alfredo Barrera	1010080507	Consorcio	Marino	
3. Fran Cervantes	1099032676	V Y D	OP	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3	**Firma del Expositor (es):** Yesnitz Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 03/11/2020

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 15/11/2025	Lugar: Punto Base	
Expositor: Yesnitz Polo Navarro	Hora Inicio: 7:12am	Hora Final: 7:43am
Temas: Simulacro de Derrame	Obra: CBS44 - Caño Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Fran Cervantes	1049936876	V y D	OP	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1	Firma del Expositor (es): Yesnitz Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27/11/2025 — Lugar: Punto Base

Expositor: yesuith Polo Navarro — Hora Inicio: 7:15 am — Hora Final: 7:30 am

Temas: Importancia de las coberturas vegetales y como aportan a la sostenibilidad del medio ambiente — Obra: CGS114- Cañaveralejo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jaime Ruiz	7673054	Consorcio	OP	
2.	Carlos Alfredo Barrera	1010080207	Consorcio	Marino	
3.	Juan Cervantes	1049932676	V y D	OP	
4.	Alfonso Ibáñez	1.084.775093	V y D	OP	
5.	Sinibaldo	1004141723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 — Firma del Expositor (es): yesuith Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 21/11/2025	Lugar: Box culvert #4 C Hondo
Expositor: yesuit Polo Navarro	Hora Inicio: 11:05am Hora Final: 11:10am
Temas: Importancia de las Coberturas Vegetales y Co mo ayudan a la Sostenibilidad del medio ambi	Obra: CBSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pedro Wilcher Gonzalez	1091029029	Consorcio	Marino	Pedro Wilcher
2.	Luis Herrera	1042348012	Roy Corso	OP Excavadora	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	Firma del Expositor (es): yesuit Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha:	**Lugar:** Box culvert #1 C Hurtado
Expositor:	**Hora Inicio:** 3:30pm **Hora Final:** 3:45pm
Temas: Importancia de las coberturas vegetales y como ayudan a la sostenibilidad del medio subsuelo	**Obra:** CB514 - Cañaveralejo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jorato d pabl	1058047896	Asesor	Marino	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 1	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo V

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 21/11/2025 **Lugar:** Punta Base

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:15am **Hora Final:** 7:30 am

Temas: Importancia de las coberturas vegetales y como ayudan a la Sostenibilidad del medio ambiente **Obra:** CPS114 - Caño Mosquito

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Agustín Ba	7685709	Panamer	OP	
2.	Carlos Alfredo Carrero	1000080507	Consorcio	Marino	
3.	Fran Cervantes	1079993676	V y D	OP	
4.	Jonas Ibáñez	1085273573	V y D	OP	
5.	Ginibaldo	1004121723	Consorcio	Marino	Ginibaldo
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 03/11/2020

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27/11/2025	Lugar: Punto Base
Expositor: Yesuith Polo Navarro	Hora Inicio: 7:15 am / Hora Final: 7:30 am
Temas: Importancia de los cobertores vegetales y como ayudan a la sostenibilidad del medio ambiente	Obra: CGSM4- Caño Honda

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Fan Cervantes	1079932676	V Y D	OP	
2.	Alfonso Ibañez	1085738073	V y D	Op	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	Firma del Expositor (es): Yesuith Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 21/11/2025	**Lugar:** Box culvert #4 C Honda
Expositor: yesuitt Polo Navarro	**Hora Inicio:** 11:050m **Hora Final:** 11:10am
Temas: Importancia de los coberturas vegetales y como ayudan a la sostenibilidad del medio ambiente	**Obra:** C6 s114 - caño Honda

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pedro Wilches G	1011028028	Consorcio	Maximo	Pedro Wilches
2.	Luis Herrero	1042348012	Roy Cavo	OP. Excavadora	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2

Firma del Expositor (es): yesuitt Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27/11/2025	**Lugar:** Box Culvert #1 Cllondo
Expositor: yesuth polo navarro	**Hora Inicio:** 3:30pm **Hora Final:** 3:45 pm
Temas: Importancia de las coberturas vegetales y como ayudan a la Sostenibilidad del medio ambiente	**Obra:** CGSM4 - Cuñ Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Yesuth polo	1082045680	Consorcio	Ayud.	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 25/11/2025	**Lugar:** Punto Bose
Expositor: yesuth Polo Navano	**Hora Inicio:** 8:30am **Hora Final:** 7:45pm
Temas: ¿como actuar en situaciones de exposición de monoxido y golpicadura de sustancias quimicas?	**Obra:** CGSH4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. [illegible]	7e9304	Bamsa	op	
2. Richard Alvarado	1721723	PTP	Op	
3. Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Morino	Sinibaldo
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 23/11/2025	**Lugar:** Box Culvert #1
Expositor: yesuth Polo Navano	**Hora Inicio:** 10:50a.m **Hora Final:** 11:05a.m
Temas: ¿Cómo actuar en situaciones de peligro, derrames, ingesta y salpicaduras de sustancias químicas?	**Obra:** CBS44 - Canto Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pablo Alfaro	7312955?	HYD	operador	
2.	yesuth de paulo	1082026015	Consorcio	auxiliar	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 23/11/2025 **Lugar:** Punta Bosc

Expositor: Yesuith Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:30 am **Hora Final:** 7:45 am

Temas: ¿Cómo actuar en situaciones de inhalación, Jornales, ingesta y salpicaduras de sustancias? **Obra:** CGS44 - Canal Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Amanda Ruiz	7853098	Panamá	Ad	
2.	Richard Almeda	1047971773	PHD	Dp	
3.	Sinibaldo	1047171773	Consorcio	Marino	Sinibaldo
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):** Yesuith Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 23/11/2025 **Lugar:** Barcaza # 1

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 10:30am **Hora Final:** 11:05am

Temas: ¿Como actuar en situaciones de inhalación, derrames, ingesta y Soluciones de sustancias químicas **Obra:** CBSM4 - caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jonas de padilla	1082049686	Consor	ayud	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 28/11/2025 **Lugar:** Punto Base

Expositor: Yesuitt Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:10am **Hora Final:** 7:25am

Temas: Conservación ambiental **Obra:** CBSM4 - Coño Homito

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jhonatan Chas	7[illegible]	Pinson	O/S	Jhonatan Chas
2. Sinibaldo	1004411723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
3. Brayan Garnica	1004112831	consorcio	Ayudante obra	Brayan Garnica
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):** Yesuitt Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 28/11/2025 **Lugar:** Box Culvert #4

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 10:00am **Hora Final:** 10:15am

Temas: Conservación ambiental **Obra:** CGSM4 - Caño Honda

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Adolfo Bonett	5078310	RF	Oficial	
2.	Orlando Carrillo	85479895	RF	Maestro	
3.	Kevin Alvarez	1004 23282	RF	ayudante de obra	Kevin A
4.	Carlos Gómez	1083 572789	consorcio	Ayudante de obra	Carlos Gomez
5.	Edulfo Castillo	10799/6394	RF	Oficial	Edulfo. C.
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 28/11/2025	**Lugar:** Punto base
Expositor: Yesmith Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:10 am **Hora Final:** 7:25 am
Temas: Conservación ambiental	**Obra:** CB 5114 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Armando De Las	7.570.34[illegible]	Consorcio	Op	
2. Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Movino	Sinibaldo
3. Brayan Gomez	1004121831	consorcio	Ayudante obra	Brayan Gomez
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3	**Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

ANEXO 6

Informe Gestión social.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

CONTRATISTA:

CONTRATO No. LP-005-2023.

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME SOCIAL

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

Contenido

INTRODUCCIÓN 5

LOCALIZACIÓN GENERAL DE SECTOR A INTERVENIR 6

LOCALIZACIÓN GENERAL 6

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR A INTERVENIR 6

1. COMPONENTE LECTURA TERRITORIAL 8

1.1. IDENTIFICACIÓN AREA DE INFLUENCIA 8

1.2. DIRECTORIO DE ACTORES 9

1.3. IDENTITIFCACIÓN CONTROLES DE RIESGOS 9

2. COMPONENTE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 10

2.1. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PAC 10

2.2. DIVULGACIÓN COMUNITARIA 10

2.2.1. PIEZAS DE DIVULGACIÓN 10

2.2.2. VALLA INFORMATIVA 10

2.2.3. REUNIONES DE PARTICIPACIÓN 11

2.3. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES (P.Q.R.S.F) 13

2.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 13

2.4.1. ACTAS DE VECINDAD 13

3. COMPONENTE CAPACIDAD DE MANO DE OBRA EN LA ZONA 14

4. COMPONENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 15

TABLAS

Tabla 1 Cuadro de responsabilidades 4

Tabla 2 Identificación de impactos sociales 9

Tabla 3 Relación actas de vecindad..... 14

Tabla 4 Información personal contratado..... 15

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta 6

Ilustración 2 Caño Hondo, Localización general Tomado de Google Earth 2018 7

Ilustración 3 Valla informativa 11

Ilustración 4 Realización acta de vecindad Sr. Benjamín Snatos 11

Ilustración 5 Realización acta de vecindad Sr José Issa..... 12

Ilustración 6 Realización acta de vecindad Sr Arnulfo Acuña 12

Ilustración 7 Socialización construcción de box culvert #3..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 8 Realización acta de vecindad..... **¡Error! Marcador no definido.**

CUADRO DE RESPONSABILIDADES.




RESPONSABLE POR	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Lina Fuentes		
			
	Profesional Social Contratista		
Revisión	Ángel Vizcaino		
			
	Director de Obra.		
Aprobación			
			
	Profesional Social Interventoría		

Tabla 1 Cuadro de responsabilidades

INTRODUCCIÓN

Con el presente informe se dan a conocer las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025, actividades contempladas en el marco del proyecto **"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES". CONTRATO NO. LP-005-2023.** El componente social, continua en el desarrollo de estrategias que contribuyen a reducir y mitigar los impactos sociales negativos que pudieran ocasionar las actividades realizadas.

A continuación, se detallan cada una de las actividades con sus respectivos productos.

LOCALIZACIÓN GENERAL DE SECTOR A INTERVENIR

LOCALIZACIÓN GENERAL

La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al Norte del país en el extremo Noroccidental del Departamento del Magdalena, su área de influencia está comprendida entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio al Sur, el río Magdalena por el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con una extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe a través del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por intermedio de caños que permiten a su vez intercomunicación con el rio Magdalena



Ilustración 1 Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR A INTERVENIR

Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir con este proyecto se encuentra ubicada en el sector este donde se ubica Caño Hondo del

complejo lagunar, el cual se encuentran en la jurisdicción del municipio de Salamina, por tanto, los beneficiarios directos son los pobladores de los municipios de Salamina y Remolino. Ver figura No.2.

El municipio de Salamina es un municipio ubicado al norte del departamento del Magdalena, Colombia a escasos 50 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena. Funciona como punto de conexión de la Vía de la Cordialidad del Magdalena con el Corregimiento Puerto Giraldo en el Departamento del Atlántico. El desarrollo social y económico de la cabecera ha estado marcado, históricamente desde principios de siglo, por las actividades agropecuarias, fluvial y comercial, lo cual le representó un auge significativo durante los primeros cincuenta años del anterior siglo. Sin lugar a dudas, a ello contribuyó el efecto de sus fuertes vínculos con el comercio de Barranquilla y su importante y estratégica localización sobre el río Magdalena y el Departamento del Atlántico con relación a las poblaciones del interior del departamento del Magdalena, sobre las cuales debía configurarse un importante mercado regional.

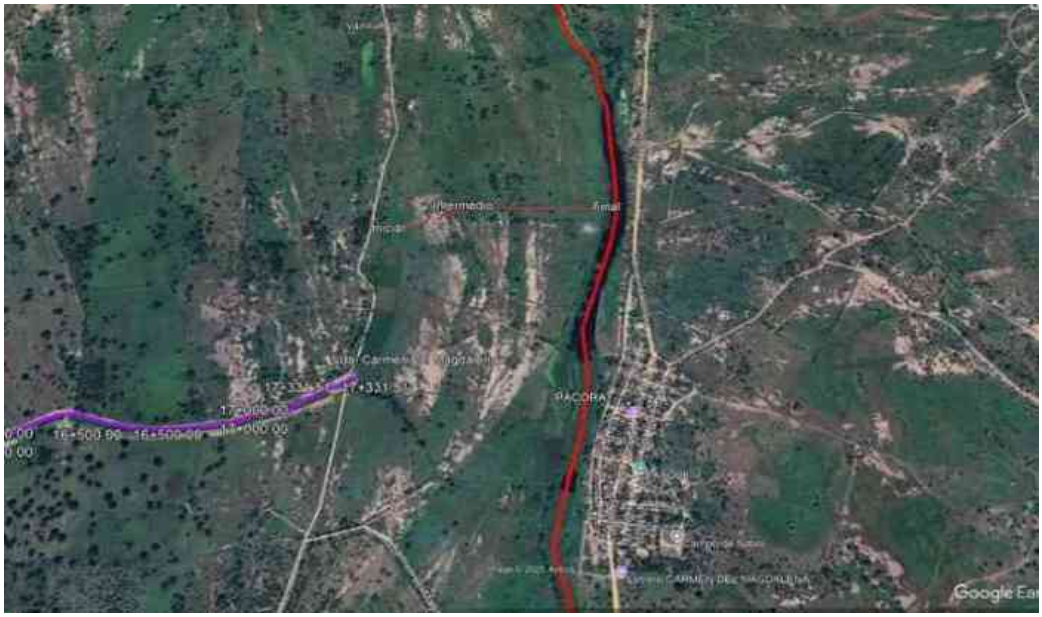


Ilustración 2 Caño Hondo, Localización general Tomado de Google Earth 2018

1. COMPONENTE LECTURA TERRITORIAL

1.1. IDENTIFICACIÓN AREA DE INFLUENCIA

Salamina, Magdalena

Salamina es un municipio ubicado al norte del departamento del Magdalena, Colombia a escasos 50 kilómetros a la desembocadura del rio Magdalena Funciona como punto de conexión de la Vía de la Cordialidad del Magdalena con el Corregimiento Puerto Giraldo en el Departamento del Atlántico. Con una población estimada en 12.500 habitantes, está constituida como uno de los municipios mas antiguos del departamento.

Como tal, cuenta con una significativa infraestructura urbana representada en un importante puerto fluvial, acueducto, alcantarillado, telefonía entre otros. Presenta como Límites generales los siguientes: por el norte limita con el municipio de Remolino, al Este limita con el municipio de Pivijay y de El Piñón, al Oeste limita con el río Magdalena y al Sur limita con el municipio de El Piñón.

División política

El municipio de Salamina tiene como cabecera municipal a SALAMINA y cuenta con un corregimiento y cinco veredas: Corregimiento Guaimaro y veredas El Salado, Julepe, Vainillal, Aserradero, La Loma.

Economía

El desarrollo social y económico de la cabecera ha estado marcado, históricamente desde principios de siglo, por las actividades agropecuarias, fluvial y comercial, lo cual le representó un auge significativo durante los primeros cincuenta años del anterior siglo. Sin lugar a duda, a ello contribuyó el efecto de sus fuertes vínculos con el comercio de Barranquilla y su importante y estratégica localización sobre el río Magdalena y el Departamento del Atlántico con relación a las poblaciones del interior del departamento del Magdalena, sobre las cuales debía configurarse un importante mercado regional.

1.2. DIRECTORIO DE ACTORES

El directorio de actores se convierte en una herramienta práctica, donde se recopila información como datos personales, contactos y ubicación de cada uno de los actores o de las partes interesadas, el cual es verificado y actualizado periódicamente en el desarrollo del contrato "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES". CONTRATO NO. LP-005-2023. Ver **Anexo No. 5.1** (Directorio de actores)

1.3. IDENTITIFCACIÓN CONTROLES DE RIESGOS

La identificación de los riesgos socioeconómicos, culturales, ambientales que pueden ser causados por la ejecución de actividades de dragado nos permite definir los impactos ya sean positivos o negativos y su efecto en las comunidades. Por este motivo es importante identificar las situaciones que puedan afectar el desarrollo y la sostenibilidad del proyecto durante su ejecución.

RIESGO	EVENTO	NIVEL DE IMPACTO
1	Conflictos con comunidades y entidades ubicadas en el área conflictivas – No dejan realizar actividades	Muy Alto – Negativo
2	Presencia y/o aumento de reasentamientos.	Muy Alto – Negativo
3	Atención de PQRSF por impactos generados de las actividades de dragado por parte de la comunidad y/o partes interesadas.	Muy Alto – Negativo
4	Contratación de Mano de Obra Local	Muy Alto - Positivo
5	Cambios en el tránsito de embarcaciones menores de pescadores que se encuentren en la zona de intervención.	Muy Alto – Negativo
6	Ubicación de equipos en áreas donde afecten cultivos de pan coger.	Muy Alto - Negativo

Tabla 2 Identificación de impactos sociales

2. COMPONENTE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

2.1. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PAC

En el punto de atención a la comunidad es un espacio donde la profesional social atiende de manera presencial y telefónica a todas las personas que deseen adquirir información o atención especializada sobre el proyecto. Sin embargo, para este periodo se realizó atención a la comunidad en el punto rodante en el que se encuentra el equipo interdisciplinario.

2.2. DIVULGACIÓN COMUNITARIA

2.2.1. PIEZAS DE DIVULGACIÓN

Se describe las piezas de divulgación e información utilizadas durante el periodo reportado, entre las cuales se encuentran (cartas de invitación o perifoneo a las diferentes reuniones de socialización o información de interés para las toda la comunidad y entes de los diferentes municipios). Para este periodo se enviaron piezas de divulgación como invitaciones para la Jornada lúdica, cultural y educativa ambiental mediante una feria de exposición de los resultados del componente de sensibilización y participación de la CGSM. Ver **Anexo No. 5.2** (Piezas de divulgación)

2.2.2. VALLA INFORMATIVA

La valla informativa es donde se contempla la información general de la obra. Se encuentra instalada en el predio del sr. Luis Pabón, donde actualmente se realizan actividades de dragado mecánico.



Ilustración 3 Valla informativa

2.2.3. REUNIONES DE PARTICIPACIÓN

- Los días 25 y 26 de noviembre se realizaron actas de vecindad y permiso de uso de predio para la ejecución de actividades de Rehabilitación Ecológica en el corregimiento Carmen del Magdalena.



Ilustración 4 Realización acta de vecindad Sr. Benjamín Snatos



Ilustración 5 Realización acta de vecindad Sr José Issa



Ilustración 6 Realización acta de vecindad Sr Arnulfo Acuña

- En el mes de noviembre desde el área de Gestión social se brindó apoyo en las “Estrategias de sensibilización y participación ambiental dirigidos a la comunidad” con cuatro comunidades:

  1. Institución Educativa Departamental San José (Nueva Venecia)
  2. Comunidad Mixta (Nueva Venecia)
  3. Institución Educativa Otilia Mena (Nueva Venecia)
  4. Asociación de mujeres emprendedoras del Carmen del Magdalena (Nueva Venecia)

  Durante este periodo se realizaron actividades como:

  ✓ Jornada lúdica, cultural y educativa ambiental mediante una feria de exposición de los resultados del componente de sensibilización y participación de la CGSM.

2.3. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES (P.Q.R.S.F)

Durante la ejecución del proyecto: **"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"** Durante este periodo se atendió un P.Q.R.S.F. a nombre del señor Eugenio Garcia dueño de predio de Caño Hondo quien solicitó la compensación por el valor de $1.000.000 de pesos por gastos asumidos a reparación de la cerca de su predio. Ver Anexos**:**

Anexo No. 5.3 (Consolidado P.Q.R.S.F)
Anexo No. 5.4 (Atención P.Q.R.S.F. y acta de conciliación)

2.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

2.4.1. ACTAS DE VECINDAD

Para la ejecución del proyecto es indispensable la realización de actas de vecindad en predios o viviendas que hacen parte de área de influencia directa del caño. Durante este periodo se realizaron 5 actas de vecindad Ver **Anexo No. 5.5** (Actas de vecindad)

Relacionadas de la siguiente manera:

NO.	NOMBRE	UBICACIÓN
1	José Nicolas Mosso	Box culvert 5 Aguas abajo
2	Benjamín Santos	Reforestación
3	Arnulfo Acuña	Reforestación
4	José Alejandro Issa	Reforestación
5	José Carlos Mena	Reforestación

Tabla 3 Relación actas de vecindad.

3. COMPONENTE CAPACIDAD DE MANO DE OBRA EN LA ZONA

Para el período en referencia se contempló la vinculación de mano de obra calificada y no calificada. Durante este período, el proyecto cuenta con un total de Veintitrés (23) personas, asignadas a los siguientes cargos:

NO.	NOMBRE	CARGO	RESIDENCIA
1	Jesús Daniel Palencia Guzmán	Topógrafo	La Loma
2	Pedro Wilches	Marino	La Loma
3	Carlos Barrera Martínez	Marino	La Loma
4	Sinibaldo Gómez Escorcia	Marino	Salamina
5	Daniel Maestre Charris	Marino	Salamina
6	Johendrys Orozco Ferreira	Marino	Salamina
7	Jonathan Padilla Ferreira	Marino	Salamina
8	Yesmith Polo	Vigía HSE	Salamina
9	Aroldo Rafael Castañeda	Marino	Remolino
10	Teovaldo Charris Bolaño	Marino	Remolino
11	Cristian David Gil Ortega	Ingeniero	Salamina
12	Carlos Álvarez Montenegro	Marino	Carmen del Magdalena
13	José Caballero	Marino	Carmen del Magdalena
14	José Camacho	Marino	Carmen del Magdalena
15	Eduardo Cantillo Carrillo	Marino	Carmen del Magdalena
16	Carlos Gámez Santodomingo	Marino	Carmen del Magdalena
17	Brayan David Gómez Ramírez	Marino	Carmen del Magdalena
18	José Guete Ojeda	Marino	Carmen del Magdalena
19	Heriberto Lara	Marino	Carmen del Magdalena
20	Jesús Manotas Gutiérrez	Marino	Carmen del Magdalena
21	Jesús Alberto Orozco Guete	Marino	Carmen del Magdalena
22	Cesar Santodomingo	Marino	Carmen del Magdalena
23	Kevin Álvarez Manga	Marino	Carmen del Magdalena

Tabla 4 Información personal contratado

También se tuvo en cuenta la contratación de bienes y servicios donde se promueve la economía local mediante compra de insumos en ferreterías, estación de servicios, alquiler de viviendas, locales y compra de alimentos.

4. COMPONENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Durante este periodo se realizaron informes semanales, adicional para cada actividad realizada se cuenta con el acompañamiento de la interventoría.

DIRECTORIO DE ACTORES CGSM4 VIGENCIA 2025

NO.	ENTIDAD	CARGO	NOMBRE	CONTACTO	CORREO
1	ALCALDÍA SALAMINA	ALCALDE	EDWIN PABÓN	NO INFORMA	contactenos@salamina-magdalena.gov.co
2		SECRETARIO DE PLANEACIÓN	FABIO ANDRES MONTENEGRO BUSTAMANTE	NO INFORMA	secretariadeplaneacion@salamina-magdalena.gov.co
3	ALCALDIA DE PIVIJAY	ALCALDE	JORGE IVAN SALAH ROPAIN	NO INFORMA	alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co
4		SECRETARIA DE PLANEACIÓN	LAURA CARPIO	3225150313	
5	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GANADEROS CARMEN DEL MAGDALENA - ASOPEGACAMAG	GERENTE	ARNULFO ACUÑA	3145593544	NO INFORMA
6	MUJERES CAMPESINAS . CARMEN DEL MAGDALENA	GERENTE	ZOILA OROZCO	3213453818	NO INFORMA
7	INSPECCIÓN DE POLICIA CARMEN DEL MAGDALENA	INSPECTORA	CRISTINA OROZCO	3128934556	NO INFORMA
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA OTILIA MENA	RECTOR	BENJAMIN DE LA CRUZ FONTALVO	3205435289	NO INFORMA
9		COORDINADOR	JAIDER MOYA	3135296712	NO INFORMA
10	ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CARMEN DEL MAGDALENA	PRESIDENTE	BIODILSA OROZCO	3113582414	NO INFORMA
11	LIDERES DE LA COMUNIDAS CARMEN DEL MAGDALENA	LIDER	ROSA SIERRA	3215962022	NO INFORMA
12		LIDER	ENA OROZCO	3135296712	NO INFORMA
13	CORPAMAG	SUPERVISORA DEL CONTRATO	KATY AMAYA BRIEVA	____	katty.amaya@corpamag.gov.co
14		SUBDIRECTORA TÉCNICA	ANGELICA RODRÍGUEZ	____	subdtecnica@corpamag.gov.co
15	INTERVENTORÍA INTERVENTORES E INGENIERÍA SAS	DIRECTOR	FRANCISCO FERNÁNDEZ	____	interventoriacienagagrandeiei@gmail.com
16		COORDINADORA	ANY ZAMBRANO	____	
17		INGENIERO CIVIL	FERNANDO MORRON	3023733631	_____
18		INGENIERA AMBIENTAL	MARIA CECILIA ESCORCIA	3014555226	_____
19	CONSORCIO CGSM4	DIRECTOR DE OBRA	ING. ÁNGEL VIZCAINO	3218484421	directorobra@panamerican.com.co
20		INGENIERO RESIDENTE	ING. EDILBERTO ROYS	3015744289	ingproyectos@panamerican.com.co
21		PROFESIONAL SST	ADRIANA GONZALEZ	3004664534	hse@panamerican.com.co
22		INGENIERO AMBIENTAL	YURANI ACEVEDO	3016712587	yurani.acevedo@panamerican.com.co
23		FRANCISCO BALLESTAS	VETERINARIO	3104220728	fmballestas@gmail.com
24		PROFESIONAL SOCIAL	LINA FUENTES	3003436183	lina.fuentes@panamerican.com.co



JORNADA DE CIERRE

LÚDICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CORPAMAG, a través del Consorcio CGSM4, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. LP 005 de 2023, tiene el placer de invitarles a participar en la feria de exposición de resultados del componente de sensibilización y participación ambiental.

Martes 18 de Noviembre



1:00 P.M

CANCHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE NUEVA VENECIA

¡TE ESPERAMOS!

CGSM4-177.

Barranquilla, 20 de noviembre de 2025.

Señor,
JAIDER MOYA
Coordinador
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA OTILIA MENA
Corregimiento Carmen del Magdalena, Pivijay.

Referencia: Contrato No. LP-005 -2023 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

Asunto: Invitación clausura Estrategias de sensibilización ambiental.

Cordial saludo,

El CONSORCIO CGSM4 se complace en invitarlos a la clausura de las Estrategias de sensibilización ambiental dirigida a la comunidad específicamente a la Asociación de mujeres emprendedoras y a grupo de estudiantes de la Institución Educativa Departamental Otilia Mena de Carmen del Magdalena.

Esta actividad se realizará el día 21 de noviembre de 2025 en la Institución Educativa Otilia Mena Álvarez, sede Bachillerato a partir de la 10:00 a.m.

Agradecemos su asistencia.

Cordialmente,

ÁNGEL M. VIZCAÍNO ESCOBAR.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO CGSM4.

CGSM4-177.

Barranquilla, 20 de noviembre de 2025.

Señor,
BENJAMÍN DE LA CRUZ FONTALVO
Rector
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA OTILIA MENA
TEL: 3205435289
benjamindelacruzfontalvo@gmail.com
Corregimiento Carmen del Magdalena, Pivijay.

Referencia: Contrato No. LP-005 -2023 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

Asunto: Invitación clausura Estrategias de sensibilización ambiental.

Cordial saludo,

El CONSORCIO CGSM4 se complace en invitarlos a la clausura de las Estrategias de sensibilización ambiental dirigida a la comunidad específicamente a la Asociación de mujeres emprendedoras y a grupo de estudiantes de la Institución Educativa Departamental Otilia Mena de Carmen del Magdalena.

Esta actividad se realizará el día 21 de noviembre de 2025 en la Institución Educativa Otilia Mena Álvarez, sede Bachillerato a partir de la 10:00 a.m.

Agradecemos su asistencia.

Cordialmente,

ANGEL M. VIZCAINO ESCOBAR.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO CGSM4.

PETICIÓN - QUEJA - RECLAMO - SUGERENCIA - FELICITACIONES										
"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"					,	MUNICIPIO: SALAMINA				
CONTRATO No. LP-005			CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4			INTERVENTORÍA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.				
FECHA DE RECIBO (DD-MM-AA)	NOMBRE PETICIONARIO	TELEFONO	TIPO DE PQRS	MOTIVO	MEDIO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN TOMADA/SOLUCIÓN	EL PETICIONARIO MANIFIESTA SATISFACCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Para el periodo comprenndido entre el 1 al 31 de julio de 2025 no se atendieron PQRSF.										
Para el periodo comprenndido entre el 1 al 31 de agosto de 2025 no se atendieron PQRSF.										
Para el periodo comprenndido entre el 1 al 30 de septiembre de 2025 no se atendieron PQRSF.										
Para el periodo comprenndido entre el 1 al 31 de octubre de 2025 no se atendieron PQRSF.										
24/11/2025	Eugenio Garcia	3007049908	Reclamo	Pago arreglo de cerca por afectaciones causadas.	Personal	El señor Eugenio informa que durante la ejecución de las actividades de drgado desarrolladas por el CONSORCIO PHDV 2020 se presentarion afectaciones en la cerca de su predio, dichos daños fueron asumidos por el. Por lo tanto en el marco de la solicitud del permiso de uso de predio para la construcción del Box Culvert #1 en Caño Hondo vigencia 2025 el señor manifiesta que requiere la compensación por un valor de $1,000,000 (Un millón de pesos) correspondientes a los gastos asumidos por la repacación mencionada.	Se realiza acta de conciliación con la explicación de los hechos y contenido sobre pago. El 11 de diciembre se realiza consignación a la sra Milagro Pabola Gonzalez quien fue autorizada por el sr Eugenio Garcia para recibir el dinero.	SI	11/12/2025	N/A

	ATENCION PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES	CODIGO	GS-R-001
		VERSION	1
		FECHA	15-08-2024

Proyecto: Mantenimiento y recuperación de las condiciones ambientales del complejo Delta Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta mediante la interacción de los cuerpos de agua y otras Estrategias Adicionales.

1. USUARIO/CLIENTE/COMUNIDAD QUE REALIZA LA SOLICITUD					
Fecha	24 / 11 / 2025.	Municipio	Salamina (Magdalena)		
Nombre	Eugenio García Escalante.			Organización	
Dirección	Salamina, Magdalena.	Barrio/Vereda		Teléfono	3007049908.

2. FUNCIONARIO QUE RECEPCIONA LA SOLICITUD			
Nombre:	Lina Fuentes Acosta	Cargo:	Profesional Social.

3. TIPO DE SOLICITUD									
Petición		Queja		Reclamo	X	Sugerencia		Felicitaciones	

4. FORMA DE SOLICITUD													
Personal	X	Escrito		Telefónico		E-mail		Otro		Con Anexos		N. de Folios	

5. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

El Señor Eugenio Informa que durante la ejecución de las actividades desarrolladas por el Contrato PHN 2020, se presentaron afectaciones en la cerca de su predio. Dichos daños fueron reparados por el propio Señor Con recursos personales, por lo anterior, y en el marco de la Solicitud de permiso para la construcción del Box Culvert # 1, en curso Vigencia 2025.

El por ello que el Señor manifiesta que requiere la compensación del valor de $ 1.000.000 correspondientes a los gastos asumidos por la reparación mencionada Con el Fin de dar por Solucionado el pendiente existente.

Eugenio García Escalante 5.094.414
Firma y cédula del ciudadano:

6. AREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN										
Ambiental		Social	X	Técnica		Administración		Otra		Cual:

7. TRATAMIENTO DE LA QUEJA O RECLAMO

Responsable: Lina María Fuentes Acosta.

Fecha programada	Acción a Implementar	Fecha de cierre
12/11/2025.	Se realiza acta de conciliación Con la explicación de los hechos y Contenido Sobre el pago.	11 Diciembre 2025.
	El 11 de diciembre se realiza Consignación a la Sra milagro Pabora Gonzalez quien fue Autorizada por el Sr Eugenio Garcia para recibir el dinero	

Nota: Una vez, transcurridos 30 días de haber dado respuesta a la queja, en caso de no recibir comentarios se dará por cerrado el tratamiento de esta.

Scanned with CamScanner

ACTA DE CONCILIACIÓN.

CARLOS GUERRERO ACOSTA, varón, mayor de edad, vecino de la ciudad de Barranquilla, identificado con la cedula de ciudadanía No. 92.276.057, en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO CGSM4 identificado con NIT, 901782967-1 por una parte y por la otra el señor EUGENIO MANUEL GARCÍA ESCALANTE igualmente mayor, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.094.414 de Salamina, Magdalena. Por este instrumento hacemos constar que hemos resuelto las diferencias surgidas en virtud de lo siguiente:

HECHOS:

PRIMERO: El señor EUGENIO GARCIA es el dueño del predio Villa Judith el cual se encuentra ubicado en Caño Hondo.

SEGUNDO: El señor **Eugenio García** informa que, durante la ejecución de las actividades desarrolladas por el **Consorcio PHDV 2020**, se presentaron afectaciones en la cerca de su predio. Dichos daños fueron reparados por el propio señor García con recursos personales. Por lo anterior, y en el marco de la solicitud de permiso para la construcción del **Box Culvert No. 1 en Caño Hondo**, contemplado en el proyecto **"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" – VIGENCIA 2025 – CAÑO HONDO**, el señor manifiesta que requiere la **compensación del valor de $1.000.000**, correspondiente a los gastos asumidos por la reparación mencionada, con el fin de dar por solucionado el pendiente existente.

TERCERO: El señor EUGENIO GARCIA autoriza de manera libre y voluntaria que el dinero correspondiente a la compensación que le corresponde sea consignado en la cuenta de la señora MILAGRO PABOLA GONZÁLEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.880.675 de Salamina (Magdalena).

CONCILIACIÓN:

1.- Que el señor EUGENIO GARCÍA, recibe como pago por las afectaciones realizadas en los predios enunciados en el numeral segundo, considerando la siguiente compensación:

La suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000), monto que será consignado en la cuenta bancaria de la señora **Milagro Pabola González**, según autorización expresa del señor García.

En Constancia de lo anterior, se firma la presenta Acta de Conciliación a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025, por los que en ella intervinieron.

Scanned with CamScanner

Eugenio García Escalante 5.094.414

EUGENIO MANUEL GARCÍA ESCALANTE
En representación del predio:
Villa Judith

MILAGRO PABOLA GONZÁLEZ
Representante autorizada para la recepción del dinero consignado.

CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA.
En representación de:
CONOSRCIO CGMS4

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

CONSORCIO CGSM4
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	MILAGRO PABOLA GONZALEZ	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	53242974		
Origen de los Fondos	CORPORATIVA SIN SOBREGIRO - 560024169995826		
Fecha de Creacion	11/12/2025	**Fecha de Pago**	11/12/2025 12:01
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.000.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.000.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
26880675	MILAGRO DEL SOCORRO PABOLA GONZALEZ	0000000000000890	Ahorros	471217224	BOGOTA	$ 1.000.000,00	Pendiente de Respuesta	

Scanned with CamScanner

	FORMATO PERMISO USO PREDIO	Codigo	GS-R-003
		Version	1
		Fecha	15/08/2024

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025.

No.	FECHA SOLICITUD DE PERMISO	ACTA DE VECINDAD		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO
		SI	NO		
7	25 Noviembre 2025	x		Ganadería y Agricultura.	Cano Hondo - Salamina

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO / ADMINISTRADOR DEL PREDIO	Jose Nicolas Mosso				
MOTIVO DEL PERMISO		AREA REQUERIDA DEL PREDIO (Ha,m2)	NO APLICA		
CONDICIONES ECONOMICAS POR USO DEL PREDIO (precio y forma de pago)	NO APLICA	TIEMPO OCUPACION DEL PREDIO	NO APLICA		
		REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE USARLO	SI	NO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL QUE TRAMITA EL PERMISO	Lina Fuentes Acosta.		x		
CONDICIONES DE ENTREGA DEL PREDIO	NO APLICA				

85.476.981	Lina Fuentes Acosta
FIRMA DEL PROPIETARIO/ADMINISTRADOR DEL PREDIO	FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL
Edilberto Reyes	Lina Fuentes A.
FIRMA INGENIERO RESIDENTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL

OBSERVACIONES:


Box Culvert #5 Aguas Abajo

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
B&P		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP-008-2023			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025
FECHA			
25	11	25	
DD	MM	AA	
ACTA No.:	7		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

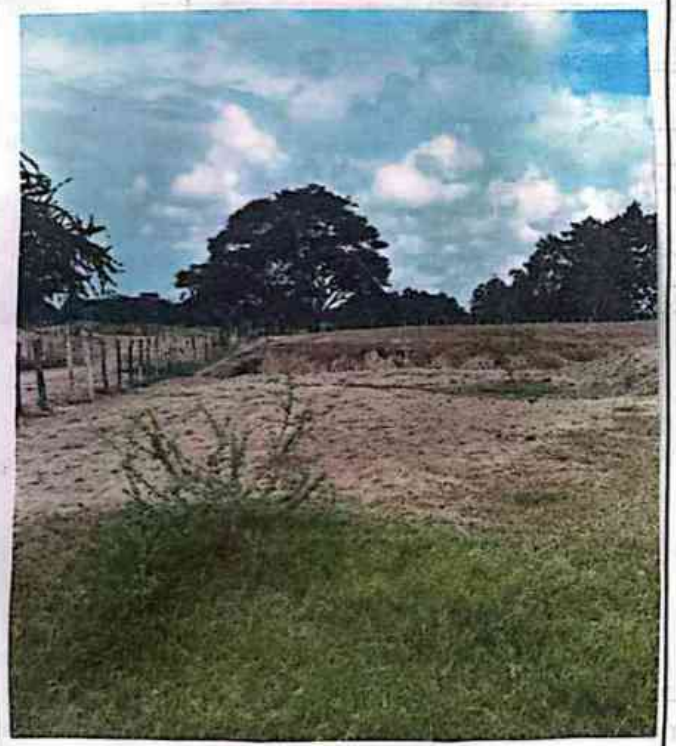

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: El Bleq

Tenencia ___ Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Jose Nicolas Mosso

Dirección: Cam Ubrio

Teléfono: 3147201422. No. de pisos: 0

Long. del frente (mts):

Abscisados Inicial:

Cédula catastral Final:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO				ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	1. Urbano
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	2. Rural
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐	¿Cuál? RURAL
4. Valor normal	☒	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Finca	☒	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cuál?		

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP-005-2023			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025
FECHA			
25	11	25	
DD	MM	AA	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No Aplica		GRIETAS Y FISURAS: No Aplica	
MUROS: No Aplica		HUMEDADES: No Aplica	
CUBIERTA: No Aplica		HUNDIMIENTO PISO: No Aplica	
PISOS: No Aplica		DESPLAZAMIENTOS: No Aplica	
FACHADA: No Aplica		OTRO: ¿Cuál? No Aplica.	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se realiza acta de vecindad y permiso uso de predio para la construcción de un Box Cuvert # 5 Aguas abajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO





FIRMAS

Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT. 85.470.981

Firma Director de Obra
Nombre ANGEL VIZCAINO
C.C. ó NIT. 73.475.172

Firma profesional Social
Nombre LINA FUENTES

Vo. Bo. Representante de la interventoria

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

Scanned with CamScanner

	FORMATO PERMISO USO PREDIO	Codigo	GS-R-003
		Version	1
		Fecha	15/08/2024

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025.

No.	FECHA SOLICITUD DE PERMISO	ACTA DE VECINDAD		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO
		SI	NO		
8	25 Noviembre 2025.	x		Ganadería.	Cano Hondo

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO / ADMINISTRADOR DEL PREDIO	Benjamin Santos Bolaño.			
MOTIVO DEL PERMISO	Reforestación / Rehabilitación Ecologica	**AREA REQUERIDA DEL PREDIO (Ha,m2)**	NO APLICA	
CONDICIONES ECONOMICAS POR USO DEL PREDIO (precio y forma de pago)	NO APLICA	**TIEMPO OCUPACION DEL PREDIO**	NO APLICA	
		REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE USARLO	**SI**	**NO**
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL QUE TRAMITA EL PERMISO	Lina María Fuentes Acosta		x	
CONDICIONES DE ENTREGA DEL PREDIO	NO APLICA			

	Jeferson Acuña Cotes
FIRMA DEL PROPIETARIO/ADMINISTRADOR DEL PREDIO	**FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL**
Edilberto Rojas	
FIRMA INGENIERO RESIDENTE	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**

OBSERVACIONES:

Reforestación más mantenimiento por 18 meses en 4 hectareas. → Vigencia 2025.

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP-005-2023			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025
FECHA			
25	11	2025	
DD	MM	AA	
ACTA No.:	9		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: La Tigra

Tenencia ___ Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?_____

Nombre del Propietario: Benjamin Santos Barros

Dirección: Cano Hondo

Teléfono: 3103253433 No. de pisos: 0

Long. del frente (mts): _____

Abscisados Inicial _____

Cédula catastral Final _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO				ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	1. Urbano
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	X Rural
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	X	Cuál? _____		¿Cuál? RURAL

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos _____
3. Industrial	☐	7. Finca	X	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO X
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cual? _____		

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP-005-2023			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025
FECHA			
25	11	2025.	
DD	MM	AA	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: N/A		GRIETAS Y FISURAS: N/A	
MUROS: N/A		HUMEDADES: N/A	
CUBIERTA: N/A		HUNDIMIENTO PISO: N/A	
PISOS: N/A		DESPLAZAMIENTOS: N/A	
FACHADA: N/A		OTRO: ¿Cuál? N/A.	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se realiza Acta de Vecindad y Permiso Uso de predio con el Señor Benjamín para realizar Reforestación en 4 Hectareas del predio la tigra incluyendo el mantenimiento de los mismos por 8 meses. de la Vigencia 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO





FIRMAS

Firma Propietario
Nombre Benjamín Sarda
C.C. ó NIT. 6.757.029.

Firma Director de Obra
Nombre ANGEL VIZCAINO
C.C. ó NIT. 73.575.172

Firma profesional Social
Nombre LINA FUENTES

Vo. Bo. Representante de la interventoría

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

Scanned with CamScanner

	FORMATO PERMISO USO PREDIO	Codigo	GS-R-003
		Version	1
		Fecha	15/08/2024

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025.

No.	FECHA SOLICITUD DE PERMISO	ACTA DE VECINDAD		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO
		SI	NO		
9	26 Noviembre 2025.	X		Agropecuario.	Camen Del Magdalena

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO / ADMINISTRADOR DEL PREDIO	Arnulfo Acuña Sanchez.			
MOTIVO DEL PERMISO	Rehabilitación Economica.	AREA REQUERIDA DEL PREDIO (Ha,m2)	NO APLICA	
CONDICIONES ECONOMICAS POR USO DEL PREDIO (precio y forma de pago)	NO APLICA	TIEMPO OCUPACION DEL PREDIO	NO APLICA	
		REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE USARLO	SI: x	NO:
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL QUE TRAMITA EL PERMISO	Luci Fuentes Acosta.			
CONDICIONES DE ENTREGA DEL PREDIO	NO APLICA			

FIRMA DEL PROPIETARIO/ADMINISTRADOR DEL PREDIO	FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL
Edilberto Rojas	
FIRMA INGENIERO RESIDENTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL

OBSERVACIONES:

Permiso uso de predio para 1 hectárea. → Rehabilitación Ecologica, Siembra y Mantenimiento por 20 meses.

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP-006-2023	PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025
FECHA: 26 (DD) / 11 (MM) / 2025 (AA)	
ACTA No.: 9	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Aurora Esperanza.

Tenencia ___ Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Amado Acuña Sanchez

Dirección: Carrera del magdalena.

Teléfono: 3145593544. No. de piezo: 1.

Long. del frente (mts): ___

Abscisados: Inicial ___

Cédula catastral: Final ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO				ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional		5. En construcción		1. Urbano
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar		2. Rural
3. Valor intermedio		7. Otro		¿Cuál? RURAL
4. Valor normal	X	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos
3. Industrial		7. Finca	X	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional		8. Otro ☐ Cuál?		

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP-005-2023			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025
FECHA			
DD	MM	AA	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Construcción en material.		GRIETAS Y FISURAS: No se evidencian.	
MUROS: Ladrillos.		HUMEDADES: No se evidencia.	
CUBIERTA: Eternit.		HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.	
PISOS: Cemento pulido.		DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.	
FACHADA: Normal Estado.		OTRO: ¿Cuál? N/A.	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se realiza acta de Vecindad y permiso uso de predio para realizar la actividad de rehabilitación ecológica en la que se utilizara 1 hectarea de este predio. Se informa que la Siembra de individuos es de 2 meses y que el mantenimiento es por 18 meses. Por lo tanto el propietario autoriza el permiso por 20 meses.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO





FIRMAS

Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma profesional Social
Nombre: LINA FUENTES

Firma Director de Obra
Nombre: ÁNGEL VIZCAINO
C.C. ó NIT. 73.475.172 / 73.475.172

Vo. Bo. Representante de la interventoría

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

Scanned with CamScanner

	FORMATO PERMISO USO PREDIO	Codigo	GS-R-003
		Version	1
		Fecha	15/08/2024

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025.

No.	FECHA SOLICITUD DE PERMISO	ACTA DE VECINDAD		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO
		SI	NO		
10	26 Noviembre 2025.	X		Agropecuaria.	Carmen Del magdalena.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO / ADMINISTRADOR DEL PREDIO	Jose Alejandro Issa Pumarejo.			
MOTIVO DEL PERMISO	Rehabilitación Ecologica.	AREA REQUERIDA DEL PREDIO (Ha,m2)	NO APLICA	
CONDICIONES ECONOMICAS POR USO DEL PREDIO (precio y forma de pago)	NO APLICA	TIEMPO OCUPACION DEL PREDIO	NO APLICA	
		REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE USARLO	SI: x	NO:
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL QUE TRAMITA EL PERMISO	Lina Fuente Acosta.			
CONDICIONES DE ENTREGA DEL PREDIO	NO APLICA			

Jose ISSA	Lina Fuente Acosta
FIRMA DEL PROPIETARIO/ADMINISTRADOR DEL PREDIO	FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL
Edilberto Roys	Lina Fuente A.
FIRMA INGENIERO RESIDENTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL


OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP-005-2023	PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025
FECHA: 26 (DD) / 11 (MM) / 2024 (AA)	
ACTA No.: 10	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

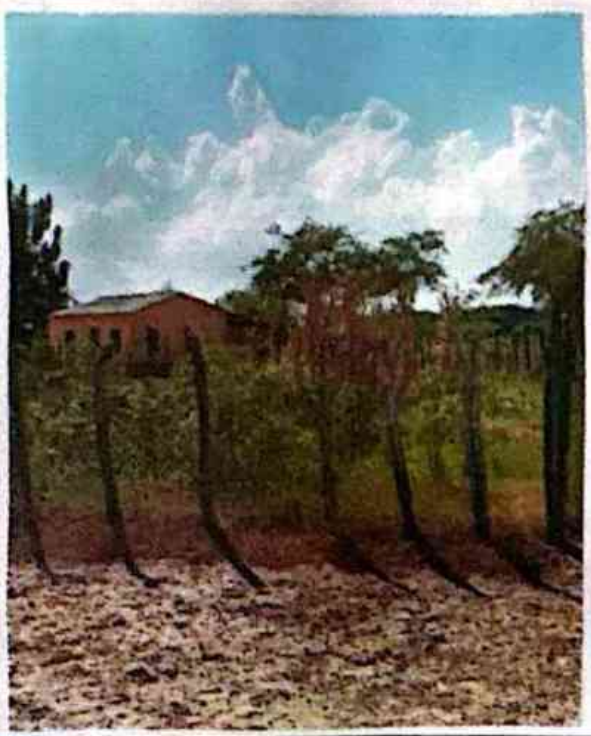

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: El Descanso

Tenencia ___ Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Jose Alejandro Tissa Amaya

Dirección: Camino Del Magdalena.

Teléfono: 3106509630 No. de pisos: A.

Long. del frente (mts): ___

Abscisado Inicial: ___

Cédula catastral Final: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua			
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO				ESPACIO GEOGRÁFICO	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	1. Urbano	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	2. Rural	☒
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐		
4. Valor normal	☒	Cuál?		¿Cuál? RURAL	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Finca	☒	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☒
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cuál?			

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
B&P		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP-005-2023			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025
FECHA			
26	11	2025	
DD	MM	AA	


3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Construcción en material.		GRIETAS Y FISURAS: NO	
MUROS: Ladrillos.		HUMEDADES: Sautre	
CUBIERTA: Eternit		HUNDIMIENTO PISO: NO	
PISOS: Cemento pulido		DESPLAZAMIENTOS: NO	
FACHADA: Normal Estado.		OTRO: ¿Cuál? N/A.	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se realiza permiso uso de predio para realizar Rehabilitación Ecologica en 1 hectarea de la propiedad. Siembra por 2 meses más 18 meses de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

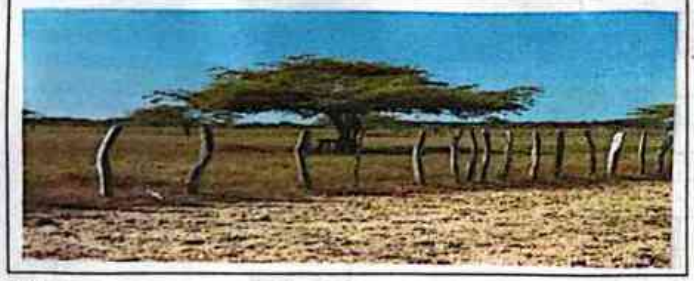

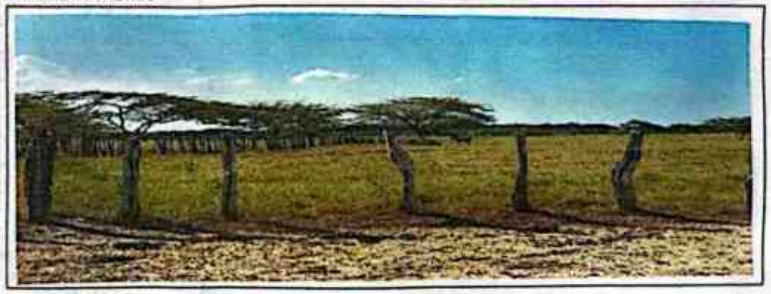

FIRMAS

Firma Propietario: José ISSA
Nombre:
C.C. ó NIT. 72277900

Firma profesional Social: Linci Fuentes Acosta.
Nombre: Linci Fuentes Acosta.

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

Firma Director de Obra: Andres Vergara
Nombre:
C.C. ó NIT. 73.475.172

Vo. Bo. Representante de la interventoría:

Scanned with CamScanner

	FORMATO PERMISO USO PREDIO	Codigo	GS-R-003
		Version	1
		Fecha	15/08/2024

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025.

No.	FECHA SOLICITUD DE PERMISO	ACTA DE VECINDAD		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO
		SI	NO		
11	26 noviembre 2025	X		Agropecuria.	Carmen del magdalena.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO / ADMINISTRADOR DEL PREDIO	José Carlos Meri Ortiz			
MOTIVO DEL PERMISO	Rehabilitación Ecologica	AREA REQUERIDA DEL PREDIO (Ha,m2)	NO APLICA	
CONDICIONES ECONOMICAS POR USO DEL PREDIO (precio y forma de pago)	NO APLICA	TIEMPO OCUPACION DEL PREDIO	NO APLICA	
		REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE USARLO	SI: x	NO:
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL QUE TRAMITA EL PERMISO	Lina Fuentes Acosta.			
CONDICIONES DE ENTREGA DEL PREDIO	NO APLICA			

Jose Carlos Mena O	Geronimo Acuña Ojeda
FIRMA DEL PROPIETARIO/ADMINISTRADOR DEL PREDIO	FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL
Edilberto Rojas	Lina Fuentes.
FIRMA INGENIERO RESIDENTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL


OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP-005-2023	PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025
FECHA: 26 (DD) / 11 (MM) / 2025 (AA)	
ACTA No.: 11	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

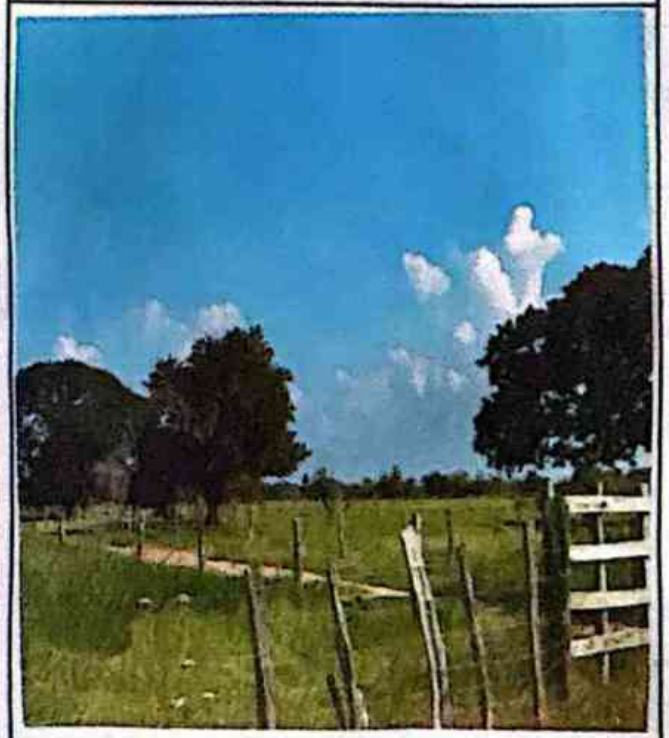

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: La India

Tenencia ___ Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: José Carlos Mena Ortiz

Dirección: Carrera del Magdalena.

Teléfono: ___ No. de pisos: 1.

Long. del frente (mts): ___

Abaciados: Inicial ___

Cédula catastral: Final ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO				ESPACIO GEOGRÁFICO	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	1. Urbano	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	2. Rural	☒
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐		
4. Valor normal	☒	Cuál?		¿Cuál? RURAL	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Finca	☒	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☒
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cuál?			

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
BeP		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP-005-2023		
FECHA		
26	11	2025
DD	MM	AA

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Construcción en material.	GRIETAS Y FISURAS	Si.
MUROS:	Ladrillos.	HUMEDADES:	No
CUBIERTA:	Eternit	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	Cemento pulido.	DESPLAZAMIENTOS:	NO
FACHADA:	Normal Estado	OTRO: ¿Cuál?	N/A

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR)

Se realizó acta de Vecindad y permiso uso de predio en Para la Rehabilitación ecologica en 2 hectareas de este predio. que contempla 2 meses desarrollo y los meses de mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO





FIRMAS

Firma Propietario Nombre C.C. ó NIT.	Jose Carlos Lora O José Carlos Lora Orozco 1039934736	Firma profesional Social Nombre	Linaet Fuentes A. Lina Fuentes Acosta.
Firma Director de Obra Nombre C.C. ó NIT.	Angel Hernandez 73 475 172	Vo. Bo. Representante de la interventoría	

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoría
Copia: para el contratista

Scanned with CamScanner

ANEXO 7

Planillas de seguridad social.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ADRIANA CRISTINA GONZALEZ VERGARA identificado(a) con CC 1010150262

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$2,500,000	16%	$400,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$2,500,000		$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$2,500,000		$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$2,500,000	4.35%	$108,800
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$2,500,000	4%	$100,000

Este certificado se expide el día 2025-12-16 a las 03:49.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGEL MARIA VIZCAINO ESCOBAR identificado(a) con CC 73475172

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$7,700,000	4%	$308,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$7,700,000	4.35%	$335,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$7,700,000	4%	$308,000

Este certificado se expide el día 2025-12-16 a las 09:31.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782967	1	CONSORCIO CGSM4	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CGSM4	CALLE 54 #76 - 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016552449	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2013538693	9496521111	E	2025/12/16	2025/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,594,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO CGSM4 (15 Afiliados)																						$26,793,866	$4,287,700			$26,793,866	$1,072,400			$26,793,866	$1,070,500			$26,793,866		$1,164,100		$0	$0		$7,594,700
Centro de Trabajo: INGENIERIA CIVIL RIESGO IV (15 Afiliados)																						$26,793,866	$4,287,700			$26,793,866	$1,072,400			$26,793,866	$1,070,500			$26,793,866		$1,164,100		$0	$0		$7,594,700
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (15 Afiliados)																						$26,793,866	$4,287,700			$26,793,866	$1,072,400			$26,793,866	$1,070,500			$26,793,866		$1,164,100		$0	$0		$7,594,700
1	CC	1079913769	ALVAREZ MONTENEGRO CARLOS ANDRES	X								X									230201	6	$666,000	$106,600	EPS041	6	$666,000	$26,700	CCF07	6	$666,000	$26,700	14-7	6	$666,000	4.350%	$29,000	6	$0	$0	Si	$189,000
2	CC	1143119327	BALLESTAS QUINTERO FRANCISCO MIGUEL		X																25-14	15	$1,337,500	$214,000	EPS005	15	$1,337,500	$53,500	CCF07	15	$1,337,500	$53,500	14-7	15	$1,337,500	4.350%	$58,200	15	$0	$0	Si	$379,200
3	CC	1010080507	BARRERA MARTINEZ CARLOS ALFREDO									X									230301	30	$2,601,436	$416,300	EPS041	30	$2,601,436	$104,100	CCF07	30	$2,601,436	$104,100	14-7	30	$2,601,436	4.350%	$113,200	30	$0	$0	Si	$737,700
4	CC	1079934636	CABALLERO CHARRIS JOSE LEONARDO	X																	230301	6	$296,000	$47,400	EPS042	6	$296,000	$11,900	CCF07	6	$296,000	$11,900	14-7	6	$296,000	4.350%	$12,900	6	$0	$0	Si	$84,100
5	CC	1081027709	CAMACHO CANTILLO JOSE GREGORIO									X									230301	30	$3,601,445	$576,300	ESSC24	30	$3,601,445	$144,100	CCF07	30	$3,601,445	$144,100	14-7	30	$3,601,445	4.350%	$156,700	30	$0	$0	Si	$1,021,200
6	CC	1004121831	GAMEZ RAMIREZ BRAYAN DAVID	X								X									230301	6	$473,263	$75,800	EPS002	6	$473,263	$19,000	CCF07	6	$473,263	$19,000	14-7	6	$473,263	4.350%	$20,600	6	$0	$0	Si	$134,400
7	CC	1083572789	GAMEZ SANTODOMINGO CARLOS SEGUNDO	X								X									230301	6	$329,636	$52,800	ESSC24	6	$329,636	$13,200	CCF07	6	$329,636	$13,200	14-7	6	$329,636	4.350%	$14,400	6	$0	$0	Si	$93,600
8	CC	1004121723	GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO JOSE									X									230301	30	$2,639,781	$422,400	ESSC24	30	$2,639,781	$105,600	CCF07	30	$2,639,781	$105,600	14-7	30	$2,639,781	4.350%	$114,900	30	$0	$0	Si	$748,500
9	CC	7598807	MAESTRE CHARRIS DANIEL ALBERTO									X									230201	30	$3,404,336	$544,700	ESSC24	30	$3,404,336	$136,200	CCF07	30	$3,404,336	$136,200	14-7	30	$3,404,336	4.350%	$148,100	30	$0	$0	Si	$965,200
10	CC	1079914724	MANOTAS GUTIERREZ JESUS DAVID	X																	230201	6	$296,000	$47,400	ESSC24	6	$296,000	$11,900	CCF07	6	$296,000	$11,900	14-7	6	$296,000	4.350%	$12,900	6	$0	$0	Si	$84,100
11	CC	1004298507	OROZCO FERREIRA JOHENDRYS									X									230301	30	$2,579,909	$412,800	ESSC07	30	$2,579,909	$103,200	CCF07	30	$2,579,909	$103,200	14-7	30	$2,579,909	4.350%	$112,300	30	$0	$0	Si	$731,500
12	CC	1082045696	PADILLA FERREIRA JONATAN ALBERTO									X									230201	30	$3,353,386	$536,600	ESSC24	30	$3,353,386	$134,200	CCF07	30	$3,353,386	$134,200	14-7	30	$3,353,386	4.350%	$145,900	30	$0	$0	Si	$950,900
13	CC	1082046517	POLO NAVARRO YESMITH VANESSA											X							230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF07	1	$47,450	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
14	CC	1082046517	POLO NAVARRO YESMITH VANESSA									X									230301	29	$2,071,497	$331,500	EPS005	29	$2,071,497	$82,900	CCF07	29	$2,071,497	$82,900	14-7	29	$2,071,497	4.350%	$90,200	29	$0	$0	Si	$587,500
15	CC	1079936122	SANTODOMINGO DE LA CRUZ CESAR ALFREDO	X																	230301	6	$296,000	$47,400	EPS041	6	$296,000	$11,900	CCF07	6	$296,000	$11,900	14-7	6	$296,000	4.350%	$12,900	6	$0	$0	Si	$84,100
16	CC	1081028028	WILCHES GONZALEZ PEDRO JOSE									X									230301	30	$2,800,227	$448,100	EPS037	30	$2,800,227	$112,100	CCF07	30	$2,800,227	$112,100	14-7	30	$2,800,227	4.350%	$121,900	30	$0	$0	Si	$794,200
Total			**Afiliados(15)**																			$26,793,866	$4,287,700			$26,793,866	$1,072,400			$26,793,866	$1,070,500			$26,793,866		$1,164,100		$0	$0		$7,594,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$4,287,700	$0	$0	$4,287,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$214,000	$0	$0	$214,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,838,400	$0	$0	$2,838,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,235,300	$0	$0	$1,235,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,164,100	$0	$0	$1,164,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	$1,164,100	$0	$0	$1,164,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,070,500	$0	$0	$1,070,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	15	$1,070,500	$0	$0	$1,070,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				15	$1,072,400	$0	$0	$1,072,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$11,900	$0	$0	$11,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$545,200	$0	$0	$545,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$103,200	$0	$0	$103,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$112,100	$0	$0	$112,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$142,700	$0	$0	$142,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$19,000	$0	$0	$19,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$138,300	$0	$0	$138,300
TOTAL				**15**	**$7,594,700**	**$0**	**$0**	**$7,594,700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84456544
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CHRISTIAN DARO LOPEZ CLAVIJO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	MZ 18 CASA 8 CISNE	TELÉFONO:	4000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4633171005**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994908461

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 300.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.800	$ 0	$ 300.800
SUBTOTALES:										**$ 300.800**	**$ 0**	**$ 300.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 235.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.000	$ 0	$ 0	$ 235.000
SUBTOTALES:													**$ 235.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 235.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 45.800	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 45.800
SUBTOTALES:									**$ 45.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 45.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 84456544	LOPEZ CLAVIJO CHRISTIAN DARIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.880.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.880.000	$ 300.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.880.000	$ 235.000	$ 0	$ 235.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.880.000	84456544	$ 45.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 581.600

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDILBERTO GREGORIO ROYS CORZO identificado(a) con CC 1118813194

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$5,500,000	4%	$220,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$5,500,000	16%	$880,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$5,500,000		$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$5,500,000		$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$5,500,000	4.35%	$239,300
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$5,500,000	4%	$220,000

Este certificado se expide el día 2025-12-17 a las 08:25.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para IVONNE STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL identificado(a) con CC 1031127390

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	$6,000,000	4%	$240,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$6,000,000	16%	$960,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																	$6,000,000		$30,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																	$6,000,000		$30,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																	$0	0%	$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																	$0	0%	$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$6,000,000	4.35%	$261,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	$6,000,000	4%	$240,000

Este certificado se expide el día 2025-12-16 a las 04:07.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VIAS Y DRAGADOS S.A.S identificado(a) con NI 901006746 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LINA MARIA FUENTES ACOSTA identificado(a) con CC 1108767049

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9496290654	2000173380	E	2025-12-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,100,000	4%	$84,000
9496290654	2000173380	E	2025-12-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$2,100,000	16%	$336,000
9496290654	2000173380	E	2025-12-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$2,100,000		$0
9496290654	2000173380	E	2025-12-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$2,100,000		$0
9496290654	2000173380	E	2025-12-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496290654	2000173380	E	2025-12-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496290654	2000173380	E	2025-12-11	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$2,100,000	4.35%	$91,400
9496290654	2000173380	E	2025-12-11	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$2,100,000	4%	$84,000

Este certificado se expide el día 2025-12-16 a las 04:20.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782967	1	CONSORCIO CGSM4	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CGSM4	CALLE 54 #76 - 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016552449	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2013549925	9496489616	Y	2025/12/16	2025/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$467,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO CGSM4 (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$467,800
Centro de Trabajo: INGENIERIA CIVIL RIESGO IV (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$467,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$467,800
1	CC	1085224296	MARTINEZ JIMENEZ MARIA AUXILIADORA																230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	0	$0	$0	No	$467,800
Total		**Afiliados(1)**																			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$467,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,000	$0	$0	$62,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$62,000	$0	$0	$62,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$467,800**	**$0**	**$0**	**$467,800**

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YURANI ANDREA ACEVEDO COLON identificado(a) con CC 1129578658

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$3,500,000	4%	$140,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$3,500,000	16%	$560,000
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$3,500,000		$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$3,500,000		$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$3,500,000	4.35%	$152,300
9496373857	2002596810	E	2025-12-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$3,500,000	4%	$140,000

Este certificado se expide el día 2025-12-16 a las 03:43.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-22, 11:02:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078165959

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 22/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EUGENIO JOSE PRADA DAZA		
Documento	CC19145528	**Dirección**	CL 76 #54 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6692364
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19145528	EUGENIO JOSE PRADA DAZA	57	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400	$ 2.700	$ 237.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 8

Informe Jornadas de sensibilización.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

CONTRATISTA:

Consorcio CGSM4
NIT. 901.782.967-1

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME MES DE NOVIEMBRE DE 2025

NOVIEMBRE 2025.


RESPONSABLE POR	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Bióloga.		
			
	María Auxiliadora Martínez		
Revisión.	Ingeniera Ambiental.		
			
	Yurani A. Acevedo Colón		
Aprobación	Director de obra		
			
	Ing. Ángel M. Vizcaíno Escobar		

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

OBJETIVO 5

Objetivos específicos. 5

COMUNIDADES FOCALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL – VIGENCIA 2025. 6

REGISTRO GRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVA AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MURALES. 7

CARMEN DEL MAGDALENA. 7

NUEVA VENECIA 10

REGISTRO GRAFICO DE LAS JORNADA LÚDICO, CULTURAL Y EDUCATIVA AMBIENTAL: FERIA DE EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DEL COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS TERRITORIO. 10

CARMEN DEL MAGDALENA. 11

NUEVA VENECIA 14

ENTREGAS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS EN NUEVA VENECIA Y CARMEN DEL MAGDALENA. 16

ANEXO 17

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el resultado del gran cierre de las actividades de sensibilización y participación ambiental dirigidos a las comunidades del área influencia del proyecto *Mantenimiento y Recuperación de las Condiciones Ambientales del Complejo Delta Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta mediante la Intervención de los Cuerpos de Agua y otras Estrategias Adicionales.*

Para la vigencia 2025, las comunidades de Nueva Venecia y Carmen del Magdalena fueron priorizadas para la ejecución de las actividades contempladas en las especificaciones técnicas del proyecto, definidas por la oficina de Subdirección Técnica de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena-CORPAMAG. Dichas estrategias fueron diseñadas a partir de los contextos locales, con el fin de garantizar la pertinencia y apropiación social.

Los objetivos propuestos se orientan al cumplimiento de las siguientes metas:

Meta 1: Siete (7) actividades de Sensibilización en temáticas para el cuidado y protección de los cuerpos de agua y de sus ecosistemas.

Meta 2: Dos (2) actividades de sensibilización que permitan la identificación de estrategias para la conservación de la restauración ambiental de los cuerpos de agua pertenecientes a la CGSM.

Meta 3: Realizar una (1) campaña educativo-ambiental, con seis (6) actividades, enfocadas en el cuidado y protección de los cuerpos de agua y el uso racional de los recursos naturales para la conservación de la CGSM.

OBJETIVO

Realizar actividades de Sensibilización Ambiental con las Instituciones Educativas, comunidades y gremios en general que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, con el fin de sensibilizar y fortalecer la cultura ambiental de las comunidades.

Objetivos específicos.

Sensibilizar en temáticas de conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos y pesqueros a las comunidades del área de influencia del proyecto.

Sensibilizar en temáticas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres a las comunidades del área de influencia del proyecto.

Realizar campañas educativas enfocadas en el uso racional de los recursos naturales, cambio climático y conservación de la CGSM del área de intervención por el proyecto.

COMUNIDADES FOCALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL – VIGENCIA 2025.

En la vigencia 2025, las actividades de sensibilización y participación ambiental se desarrollarán en cuatro comunidades ubicadas dentro del área de influencia directa de las intervenciones de recuperación hidrosedimentaria en los cuerpos de agua de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM). Estas comunidades han sido priorizadas por su cercanía a los ecosistemas intervenidos y por su relevancia sociocultural en la dinámica ambiental del complejo delta estuarino.

Como fase preliminar de la ejecución se realizaron visitas de acercamiento en cada una de las comunidades priorizadas. Estas visitas tuvieron como propósito principal la socialización de la estrategia, así como la generación de vínculos de colaboración con actores clave del territorio y la habilitación de espacios físicos adecuados para la realización de los encuentros, tales como salones comunales y aulas escolares. Durante estas jornadas, se sostuvo diálogo directo con líderes comunitarios, representantes de organizaciones locales, coordinadores y rectores de instituciones educativas.

Comunidades atendidas:

Corregimiento de Nueva Venecia, Municipio de Sitio Nuevo:

30 estudiantes de la Institución Educativa Departamental San José, sede Nueva Venecia y 30 miembros de la comunidad en general.

Corregimiento Carmen del Magdalena Municipio de Pivijay:

30 estudiantes de la Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Otilia Mena, de los grados de tercero a séptimo y los miembros de la Asociación de Mujeres emprendedoras de Carmen del Magdalena.

REGISTRO GRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE LAS CAMPAÑAS EDUCATIVA AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MURALES.

Los murales elaborados por los grupos atendidos constituyen un producto artístico y pedagógico que refleja la identidad ambiental y sociocultural de Nueva Venecia y Carmen del Magdalena. En ellos se consignan representaciones de la flora y fauna propias de los territorios, junto con escenas de actividades cotidianas que evidencian la relación directa entre las practicas diarias y el entorno natural. El proceso de diseño fue orientado por artistas locales, quienes; a partir de diálogos sostenidos con cada grupo, estructuraron las propuestas visuales de manera participativa. La ejecución de los murales contó con la intención activa de los asistentes; logrando con esto un ejercicio de construcción colectiva y de apropiación del mensaje ambiental.

CARMEN DEL MAGDALENA.
















Edificio World Trade Center: Calle 76 No. 54 – 11 Of. 712. Telefax: 385 9150
E-mail: consosrciocgsm4.2023@gmail.com
Barranquilla – Colombia







NUEVA VENECIA







REGISTRO GRAFICO DE LAS JORNADA LÚDICO, CULTURAL Y EDUCATIVA AMBIENTAL: FERIA DE EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DEL COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS TERRITORIO.

A continuación, se consolidan los registros fotográficos obtenidos los días 18 y 21 de noviembre, fechas en las que se llevó a cabo el cierre de las jornadas pedagógicas ambientales de la vigencia, en Nueva Venecia y Carmen del Magdalena, respectivamente. Esta recopilación constituye un insumo de verificación y seguimiento a la participación comunitaria y estudiantil de las comunidades atendidas.

La programación incluyó: entrega de reconocimientos a los estudiantes, a las mujeres emprendedoras de Carmen del Magdalena y a la comunidad en general de Nueva Venecia que a asistió a las jornadas. Distribución de bolsas ecológicas como resultados de las acciones para generar grandes cambios en la comunidad por la reducción de plásticos de un solo uso. Premiación de artesanías elaboradas a partir de residuos reciclables y taruya, evidenciando procesos de aprovechamiento creativo de estos materiales. Presentaciones culturales (danzas) realizadas por los grupos atendidos, integrando la dimensión artística como herramienta de sensibilización.

CARMEN DEL MAGDALENA.


















Edificio World Trade Center: Calle 76 No. 54 – 11 Of. 712. Telefax: 385 9150
E-mail: consosrciocgsm4.2023@gmail.com
Barranquilla – Colombia









Edificio World Trade Center: Calle 76 No. 54 – 11 Of. 712. Telefax: 385 9150
E-mail: consosrciocgsm4.2023@gmail.com
Barranquilla – Colombia





NUEVA VENECIA









Edificio World Trade Center: Calle 76 No. 54 – 11 Of. 712. Telefax: 385 9150
E-mail: consosrciocgsm4.2023@gmail.com
Barranquilla – Colombia













Edificio World Trade Center: Calle 76 No. 54 – 11 Of. 712. Telefax: 385 9150
E-mail: consosrciocgsm4.2023@gmail.com
Barranquilla – Colombia





ENTREGAS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS EN NUEVA VENECIA Y CARMEN DEL MAGDALENA.



En Nueva Venecia se realizó la entrega de un punto ecológico a la Institución Educativa Departamental San José, como estrategia para fortalecer la gestión de residuos sólidos y promover prácticas de separación en la fuente. De manera complementaria, se entregó un vivero organizado en una plataforma donde se mantiene las plántulas de mangle, sembradas con los estudiantes, como ejercicio orientado a la conservación y restauración de los ecosistemas asociados a la Ciénaga Grande de Santa Marta, constituyéndose en un recurso pedagógico y ambiental para la comunidad educativa.



En Carmen del Magdalena, se efectuó la entrega de vestuarios utilizados en las presentaciones de danza durante las jornadas de cierre. Estos fueron donados tanto a la Institución Educativa Otilia Mena como a la Asociación de Mujeres Emprendedoras. Los vestuarios fueron confeccionados por modistas locales, lo que permitió dinamizar la

economía comunitaria, además de fortalecer la identidad cultural vinculada a las actividades de sensibilización ambiental.



ANEXO

- Acta de entrega de vestuarios a la Institución Educativa Otilia Mena.
- Acta de entrega de vestuarios a la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Carmen del Magdalena.
- Acta de entrega de vivero a la Institución Educativa Departamental San José, sede Nueva Venecia.
- Acta de entrega de punto ecológico a la Institución Educativa Departamental San José, sede Nueva Venecia.

ANEXO 9

Acta y memoria de cantidades.

ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG

ACTA DE OBRA No. 20

FECHA CONTRATO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CONTRATO No.: LP-005-2023

HOJA: 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4

INTERVENTOR: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.

VALOR TOTAL CONTRATO	PLAZO INICIAL
$340.466.351.223,00	CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) MESES

VALOR ACTA DE COBRO:	$ 1.383.421.628,90	**VALOR ACTAS ACUMULADAS:**	$ 2.832.695.890,75
PORCENTAJE DE COBRO:	18,26%	**PORCENTAJE ACUMULADO:**	37,39%

AÑO 2024							ACTA DE OBRA No. 20		ACUMULADO		SALDOS	
ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA						**$ 58.531.860,00**		**$ 8.945.619,97**		**$ 58.531.859,83**		**$ 0,00**
		Mantenimiento al Material Vegetal Establecido	ha	20	$ 2.926.593,00	$ 58.531.860,00	3,056666905	$ 8.945.619,97	20,00	$ 58.531.859,83	0,00	$ 0,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 58.531.860,00**		**$ 8.945.619,97**		**$ 58.531.859,83**		**$ 0,00**
		Administración			23,00%	$ 13.462.328,00		$ 2.057.493,00		$ 13.462.328,00		$ 0,00
		Imprevistos			2,00%	$ 1.170.637,00		$ 178.912,00		$ 1.170.637,00		$ 0,00
		Utilidad			5,00%	$ 2.926.593,00		$ 447.281,00		$ 2.926.593,00		$ 0,00
		IVA (19%) sobre la Utilidad			19,00%	$ 556.052,00		$ 84.982,72		$ 556.052,00		$ 0,00
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 18.115.610,00**		**$ 2.768.668,72**		**$ 18.115.610,00**		**$ 0,00**
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				**$ 76.647.470,00**		**$ 11.714.288,69**		**$ 76.647.469,83**		**$ 0,00**

AÑO 2025							ACTA DE OBRA No. 20		ACUMULADO		SALDOS	
ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						**$ 49.999.844,00**		**$ 0,00**		**$ 24.999.922,00**		**$ 24.999.922,00**
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	2,0	$ 24.999.922,0	$ 49.999.844,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 24.999.922,00	1,00	$ 24.999.922,00
II. MANTENIMIENTO HIDRÁULICO						**$ 4.804.622.102,32**		**$ 953.105.148,51**		**$ 1.720.820.483,00**		**$ 3.083.801.619,32**
2.2	P - 2.2	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	113.159,10	$ 19.639,00	$ 2.222.331.531,00	48.490,0335	$ 952.295.767,91	87.498,97	$ 1.718.392.341,00	25.660,12	$ 503.939.190,00
OBRAS DURAS												
2.10	NP - 2.10	Localización, Trazado y Replanteo Topográfico	m2	937,00	$ 4.319,00	$ 4.046.903,00	187,40	$ 809.380,60	562,20	$ 2.428.142,00	374,80	$ 1.618.761,00
2.11	NP - 2.11	Excavación manual. Incluye: Cargue, Retiro y Explanación lateral del Material de Excavación	m3	522,65	$ 60.215,00	$ 31.471.370,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	522,65	$ 31.471.370,00
2.12	NP - 2.12	Concreto de F'c 3.000 PSI (21 Mpa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e = 0.05 m. Incluye transporte de materiales	m2	971,65	$ 66.533,00	$ 64.646.789,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	971,65	$ 64.646.789,00
2.13	NP - 2.13	Construcción de Box Culvert en Concreto Reforzado de 4.000 PSI (28 Mpa) Con Baja Permeabilidad (Incluye: Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo	m3	770,67	$ 2.313.980,00	$ 1.783.314.966,60	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	770,67	$ 1.783.314.966,60
2.14	NP - 2.14	Suministro, Corte, Figuración y armado de Acero de Refuerzo Grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 PSI). Incluye Transporte	kg	74.268,12	$ 8.956,00	$ 665.145.282,72	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	74.268,12	$ 665.145.282,72
2.15	NP - 2.15	Concreto de F'c 4.000 PSI (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre y Transporte de Materiales	m3	20,00	$ 1.683.263,00	$ 33.665.260,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 33.665.260,00

ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG

ACTA DE OBRA No. 20

FECHA CONTRATO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CONTRATO No.: LP-005-2023

HOJA: 2 de 2

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4

INTERVENTOR: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.

VALOR TOTAL CONTRATO	PLAZO INICIAL
$340.466.351.223,00	CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) MESES

VALOR ACTA DE COBRO:	$ 1.383.421.628,90	VALOR ACTAS ACUMULADAS:	$ 2.832.695.890,75

ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA						**$ 418.523.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 418.523.000,00**
3.1	P - 3.1	Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica	ha	20	$ 4.806.217,00	$ 96.124.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 96.124.340,00
3.2	P - 3.2	Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica	ha	20	$ 9.917.137,00	$ 198.342.740,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 198.342.740,00
3.3	P - 3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido	ha	40	$ 3.101.398,00	$ 124.055.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 124.055.920,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 5.331.676.806,00**		**$ 953.105.148,51**		**$ 1.745.820.405,00**		**$ 3.527.324.541,32**
		Administración			23,00%	$ 1.226.285.665,00		$ 219.214.184,15		$ 401.538.693,15		$ 824.746.971,85
		Imprevistos			2,00%	$ 106.633.536,00		$ 19.062.102,97		$ 34.916.408,00		$ 71.717.128,00
		Utilidad			5,00%	$ 266.583.840,00		$ 47.655.257,43		$ 87.291.020,25		$ 179.292.819,75
		IVA (19%) sobre la Utilidad			19,00%	$ 50.650.930,00		$ 9.054.498,91		$ 16.585.293,85		$ 34.065.636,15
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 1.650.153.971,00**		**$ 294.986.043,46**		**$ 540.331.415,25**		**$ 1.109.822.555,75**
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				**$ 6.981.830.777,00**		**$ 1.248.091.191,97**		**$ 2.286.151.820,25**		**$ 4.637.147.097,07**
IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						**$ 499.155.370,00**		**$ 103.879.116,17**		**$ 394.871.093,00**		**$ 104.284.277,00**
4.1	P - 4.1	Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	6,00	$ 19.004.991,00	$ 114.029.946,00	1,00	$ 19.004.991,00	3,50	$ 66.517.468,50	2,50	$ 47.512.477,50
4.2	P - 4.2	Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	1,00	$ 328.353.624,00	$ 328.353.624,00	0,258484	$ 84.874.125,17	1,0000	$ 328.353.624,00	0,00	$ 0,00
4.5	P - 4.5	Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo	und	4,00	$ 14.192.950,00	$ 56.771.800,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 56.771.800,00
		IVA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			19,00%	$ 94.839.520,00		$ 19.737.032,07		$ 75.025.507,67		$ 19.814.012,33
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON IVA				**$ 593.994.890,00**		**$ 123.616.148,24**		**$ 469.896.600,67**		**$ 124.098.289,33**
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				**$ 7.575.825.667,00**		**$ 1.371.707.340,21**		**$ 2.756.048.420,92**		**$ 4.761.245.386,40**
		VALOR TOTAL VIGENCIAS 2024 - 2025				**$ 7.575.825.667,00**		**$ 1.383.421.628,90**		**$ 2.832.695.890,75**		**$ 4.743.129.776,25**

VALOR PRESENTE ACTA: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 90/100 CENTAVOS.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra por los que en ella intervinieron a los 30 días del mes de noviembre de 2025:

ING. CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CGSM4

ING. FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**20**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT O C.C.**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT O C.C.**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico**	**UNIDAD**	**m3**









LOCALIZACION	LONGITUD	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN TOTAL
CAÑO EL SALADO				
0+000.000	25	0	0,00	0,00
0+025.000	25	29,25	365,67	365,67
0+050.000	25	30,97	752,85	1.118,52
0+075.000	25	33,75	809,05	1.927,57
0+100.000	25	36,6	879,34	2.806,91
0+125.000	25	37,44	925,50	3.732,41
0+150.000	25	39,64	963,52	4.695,93
0+175.000	25	41,81	1018,09	5.714,02
0+200.000	25	42,86	1058,31	6.772,33
0+225.000	25	44,32	1089,77	7.862,10
0+250.000	25	45,66	1125,69	8.987,79
0+275.000	25	47,33	1163,37	10.151,16
0+850.000	25	74,41	1968,36	12.119,52
0+875.000	25	77,35	1897,04	14.016,56
0+900.000	25	66,13	1793,53	15.810,09
0+925.000	25	63,19	1616,49	17.426,58
0+950.000	25	69,5	1658,59	19.085,17
0+975.000	25	74,34	1798,07	20.883,24
1+000.000	25	72,81	1839,43	22.722,67
1+025.000	25	70,48	1791,17	24.513,84
1+050.000	25	72,49	1787,16	26.301,00
1+075.000	25	67,69	1752,18	28.053,18
1+100.000	25	64,89	1657,21	29.710,39
1+125.000	25	61,05	1574,23	31.284,62

MEMORIA DE CANTIDADES



1+150.000	25	57,59	1483	32.767,62
2+825.000	25	25,11	313,83	33.081,45
2+850.000	25	118,18	1809,04	34.890,49
2+875.000	25	103,35	2769,16	37.659,65
2+900.000	25	101,74	2568,47	40.228,12
2+925.000	25	13,89	1445,42	41.673,54
2+950.000	25	0	173,65	41.847,19
Aleta box 1	25	224,13	996,082	42.843,27
10+650.000	25	41,58	522,81	43.366,08
10+675.000	25	95,91	1720,36	45.086,44
10+700.000	25	39,72	1684,27	46.770,71
10+725.000	25	15,83	694,38	47.465,09
10+750.000	25	0	197,98	47.663,07
Aleta box 4	25	224,13	826,962	48.490,03
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**87.498,97**
			FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**39.008,94**
			TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**48.490,03**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**20**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Localización, trazado y replanteo topográfico**	**UNIDAD**	**m2**



CAÑO HONDO	
Localización, trazado y replanteo topográfico de box	191,40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**562,20**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**370,80**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**191,40**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**20**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT O C.C.**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT O C.C.**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**	**ITEM**	**Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto.**	**UNIDAD**	**Und**









DESCRIPCIÓN		CANTIDAD TOTAL
Jornada ludica, cultural y educativa ambiental para el cierre de las actividades del Componente de Sensibilización y Participación Amebiental.	Comunidad mixta de Nueva Venecia	0,06462
	Institución Educativa Departamental San José	0,06462
	Asociación de mujeres del Carmen del Magdalena	0,06462
	Institución Educativa Otilia Mena	0,06462
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**1,0000**
	FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0,7415**
	TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**0,2585**

Firma _____
Nombre: ÁNGEL M. VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma _____
Nombre: YURANI ACEVEDO
INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO A. FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: IVANA LEYES MORA
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**20**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**	**ITEM**	**Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre**	**UNIDAD**	**Mes**



CAÑO HONDO	
Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**3,50**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**2,50**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1,00**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: YURANI ACEVEDO
INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: IVANA LEYES MORA
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".		**ACTA**	**20**	**PERIODO**	**NOVIEMBRE DE 2025**	
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1		**CONTRATO**	LP 005 DE 2023	
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6		**CONTRATO**	CM 008 DE 2023	

CAPÍTULO	**REHABILITACIÓN ECOLÓGICA**	**ITEM**	**Mantenimiento al material vegetal establecido**	**UNIDAD**	**Ha**





Mantenimiento siembra		3,06
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**20,00**
	FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**16,94**
	TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**3,06**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: YURANI ACEVEDO
INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA


Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: IVANA LEYES MORA
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA

ANEXO 10


Planos topográficos.

SECCIÓN 0+000.00




0+000.00	
Material Name	Ground Removal
Area	0.00
Volumen	0.00
Cum. Volumen	0.00

SECCIÓN 0+025.00




0+025.00	
Material Name	Ground Removal
Area	28.25
Volumen	365.67
Cum. Volumen	365.67

SECCIÓN 0+050.00




0+050.00	
Material Name	Ground Removal
Area	30.97
Volumen	752.85
Cum. Volumen	1118.52

SECCIÓN 0+075.00




0+075.00	
Material Name	Ground Removal
Area	33.76
Volumen	806.05
Cum. Volumen	1927.57

SECCIÓN 0+100.00



0+100.00	
Material Name	Ground Removal
Area	36.62
Volumen	879.34
Cum. Volumen	2806.91

SECCIÓN 0+125.00




0+125.00	
Material Name	Ground Removal
Area	37.44
Volumen	925.50
Cum. Volumen	3732.40

SECCIÓN 0+150.00




0+150.00	
Material Name	Ground Removal
Area	39.64
Volumen	963.52
Cum. Volumen	4695.93

SECCIÓN 0+175.00



0+175.00	
Material Name	Ground Removal
Area	41.81
Volumen	1018.66
Cum. Volumen	5714.59

SECCIÓN 0+200.00




0+200.00	
Material Name	Ground Removal
Area	42.86
Volumen	1058.31
Cum. Volumen	6772.72

SECCIÓN 0+225.00



0+225.00	
Material Name	Ground Removal
Area	44.32
Volumen	1089.77
Cum. Volumen	7862.09

SECCIÓN 0+250.00



0+250.00	
Material Name	Ground Removal
Area	45.66
Volumen	1125.62
Cum. Volumen	8987.70

SECCIÓN 0+275.00




0+275.00	
Material Name	Ground Removal
Area	47.33
Volumen	1163.37
Cum. Volumen	10151.10

SECCIÓN 0+800.00




0+800.00	
Material Name	Ground Removal
Area	77.35
Volumen	1847.04
Cum. Volumen	54223.78

SECCIÓN 0+900.00




0+900.00	
Material Name	Ground Removal
Area	80.13
Volumen	1793.53
Cum. Volumen	56017.32

SECCIÓN 0+925.00



0+925.00	
Material Name	Ground Removal
Area	83.19
Volumen	1915.49
Cum. Volumen	57932.80

SECCIÓN 0+950.00



0+950.00	
Material Name	Ground Removal
Area	68.50
Volumen	1858.58
Cum. Volumen	59791.39

SECCIÓN 0+975.00



0+975.00	
Material Name	Ground Removal
Area	74.34
Volumen	1768.07
Cum. Volumen	61559.46

SECCIÓN 1+000.00




1+000.00	
Material Name	Ground Removal
Area	72.81
Volumen	1826.43
Cum. Volumen	63929.88

SECCIÓN 1+025.00




1+025.00	
Material Name	Ground Removal
Area	70.48
Volumen	1791.17
Cum. Volumen	64721.05

SECCIÓN 0+825.00




0+825.00	
Material Name	Ground Removal
Area	83.05
Volumen	2051.69
Cum. Volumen	56358.38

SECCIÓN 1+050.00



1+050.00	
Material Name	Ground Removal
Area	70.48
Volumen	1760.16
Cum. Volumen	66506.21

SECCIÓN 1+075.00



1+075.00	
Material Name	Ground Removal
Area	67.69
Volumen	1752.18
Cum. Volumen	68260.39

SECCIÓN 1+100.00



1+100.00	
Material Name	Ground Removal
Area	64.89
Volumen	1657.31
Cum. Volumen	69917.69

SECCIÓN 1+125.00



1+125.00	
Material Name	Ground Removal
Area	61.05
Volumen	1574.23
Cum. Volumen	71491.93

SECCIÓN 1+150.00



1+150.00	
Material Name	Ground Removal
Area	57.58
Volumen	1483.50
Cum. Volumen	72974.93

CONVENCIONES

- TERRENO NATURAL
- COTA DE DISEÑO
- COTA EJECUCCIÓN
- CANAL PROYECTADO
- CANAL EXISTENTE
- SECCIONES TRANSVERSALES
- CURVAS DE NIVEL
- PUENTE
- ÁREA A INTERVENIR

CONTRATANTE : CORMAGDALENA

CONTRATISTA : B&P CONSTRUCCIONES

INTERVENTORIA : IEI INTERVENTORIA E INGENIERIA

LEVANTÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

REVISÓ :
ANGEL M. VIZCAINO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA
13202-273/18 BLV

DIBUJÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

APROBÓ :
FRANCISCO A. FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
T.P. 08202-187374 ATL

PROYECTO :

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP 005 DE 2023.
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESRATEGIAS"

CONTIENE :

CAÑO HONDO
SECCIONES TRANSVERSALES
EXVACACIÓN MECANICA
KM 0+000 - KM 0+275
KM 0+825 - KM 1+150

MODIFICACIONES :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESCALA : 1:200

CÓDIGO : HONDO-25

NOMBRE DE ARCHIVO : PDS DRAGADO

FECHA : NOVIEMBRE 2025

TIPO : PLANO DISEÑO HIDRAULICO

PLANO : 03 DE 03

PROYECTO : CAÑO HONDO

TERRITORIO COLOMBIANO



DPTO. MAGDALENA



MUNI. SALAMINA

LOCALIZACION GENERAL



PLANTA GENERAL
Esc. ---- 1: 1000

NOTAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

- Los levantamientos con GPS RTK, se instala el receptor Base (Receptor GPS de doble frecuencia) en una Placa GPS cuyas coordenadas son conocidas y determinadas en la primera etapa, creando el archivo con la configuración de coordenadas correspondiente con sistema de referencia MAGNA SIRGAS Colombia Origen Bogotá, se introducen las coordenadas del Punto Base o Punto de control del levantamiento y la altura de la antena desde el centro de la Placa hasta el centro de la antena, verificando posteriormente la recepción de señal de satélites. Si todo lo anteriormente mencionado, está dentro de los parámetros normales, el equipo genera un mensaje de Base iniciada correctamente que nos permite seguir con el procedimiento. Se inicia el Receptor GPS Móvil el cual está instalado en el bastón para tal fin, se hace la conexión, verificando la recepción exitosa de satélites; una vez el equipo está operativo, se hace conexión automática al receptor Punto base o de control el cual transmite corrección de coordenadas en tiempo real (GPS RTK) a través de señal UHF; una vez el equipo haya resuelto incertidumbres en la medición y la ubicación de satélites, buena recepción de señal entre otros parámetros le permitan obtener precisiones dentro del rango de 1cm en X, Y, y hasta 2cm en Z, en caso que esto no resulte en este promedio de precisión sencillamente no se captura el punto ya que no cumple con los parámetros permisibles.
- Carteras de GPS: incluye una hoja que muestra el listado de puntos con sus coordenadas Magna, cota e identificación del punto. Incluye también otra hoja con el cálculo de la precisión que hace el postproceso del Equipo GPS para darle información de la posición a cada punto.


COORDENADAS

id	Norte	Este	Origen
GP01	1654676.640	923903.293	Central
GP02	1653979.909	928325.372	Central
GP03	1655093.044	930759.717	Central
GP04	1656071.684	935426.815	Central
GP05	1663507.390	935004.845	Central
GP06	1659620.600	935103.938	Central
GP07	1652140.830	934904.127	Central
GP08	1649299.780	931295.934	Central
GP09	1663868.671	936393.942	Central
GP10	1666597.515	939526.058	Central
GP11	1667114.398	943781.202	Central
NP2TN2	1651627.066	921676.812	Central

RESULTADO DE LA NIVELACION

id	Altura Elipsoidal	Ondulación	Ortometrica	Altura Nivelada
GP01	-0.857	-5.7	4.843	5.45
GP02	-2.148	-5.6	3.452	4.059
GP03	-2.858	-5.6	2.742	3.349
GP04	-3.913	-5.5	1.587	2.194
GP05	-2.782	-5.6	2.818	3.425
GP06	-4.423	-5.5	1.077	1.684
GP07	-4.094	-5.4	1.306	1.913
GP08	-3.811	-5.4	1.589	2.196
GP09	-3.629	-5.6	1.971	2.578
GP10	-3.704	-5.5	1.796	2.403
GP11	-4.574	-5.4	0.826	1.433

PERFIL LONGITUDINAL
Esc. ---- 1: 1000



CONVENCIONES
- TERRENO NATURAL
- COTA DE DISEÑO
- COTA EJECUCCIÓN
- CANAL PROYECTADO
- CANAL EXISTENTE
- SECCIONES TRANSVERSALES
- CURVAS DE NIVEL
- PUENTE
- ÁREA A INTERVENIR

CONTRATANTE : CORPAMAG

CONTRATISTA : B&P CONSTRUCCIONES

INTERVENTORIA : IEI INTERVENTORES E INGENIERIA

LEVANTÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

REVISÓ :
ANGEL M. VIZCAINO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA
15002-27518 BLV

DIBUJÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

APROBÓ:
FRANCISCO A. FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
T.P. 08202-187374 ATL

PROYECTO :
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP 005 DE 2023.
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS"

CONTIENE :
CAÑO HONDO
EXCAVACIÓN MECANICA
KM 0+000 - KM 0+275

MODIFICACIONES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESCALA : INDICADAS

CÓDIGO : HONDO-25


NOMBRE DE ARCHIVO : POS DRAGADO

FECHA : NOVIEMBRE 2025

TIPO : PLANO DISEÑO HIDRAULICO

PLANO : 01 DE 03

PROYECTO : CAÑO HONDO

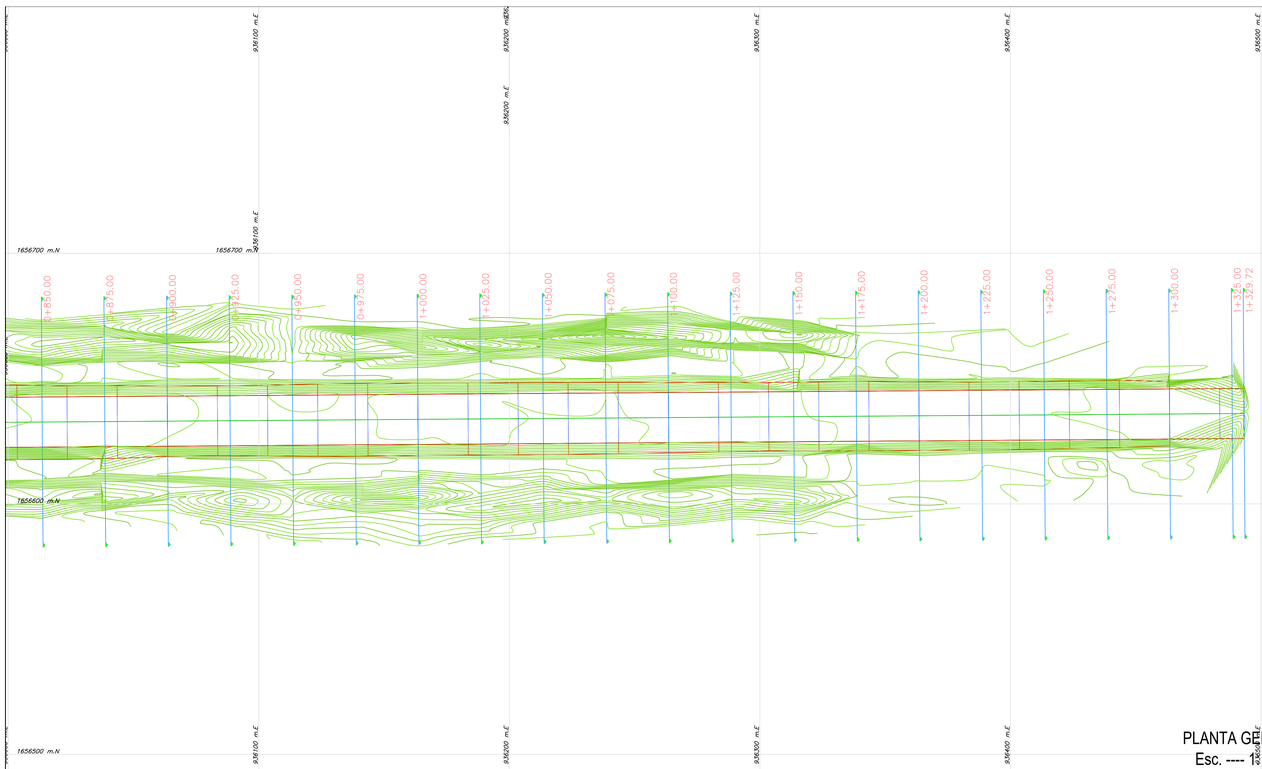

PLANTA GENERAL
Esc. ---- 1: 1000

TERRITORIO COLOMBIANO



DPTO. MAGDALENA




MUNI. SALAMINA

LOCALIZACION GENERAL



PERFIL LONGITUDINAL
Esc. ---- 1: 1000



NOTAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

- Los levantamientos con GPS RTK, se instala el receptor Base (Receptor GPS de doble frecuencia) en una Placa GPS cuyas coordenadas son conocidas y determinadas en la primera etapa, creando el archivo con la configuración de coordenadas correspondiente con sistema de referencia MAGNA SIRGAS Colombia Origen Bogotá, se introducen las coordenadas del Punto Base o Punto de control del levantamiento y la altura de la antena desde el centro de la Placa hasta el centro de la antena, verificando posteriormente la recepción de señal de satélites. Si todo lo anteriormente mencionado, está dentro de los parámetros normales, el equipo genera un mensaje de Base iniciada correctamente que nos permite seguir con el procedimiento. Se inicia el Receptor GPS Móvil el cual está instalado en el bastón para tal fin, se hace la conexión, verificando la recepción exitosa de satélites; una vez el equipo está operativo, se hace conexión automática al receptor Punto base o de control el cual transmite corrección de coordenadas en tiempo real (GPS RTK) a través de señal UHF; una vez el equipo haya resuelto incertidumbres en la medición y la ubicación de satélites, buena recepción de señal entre otros parámetros le permitan obtener precisiones dentro del rango de 1cm en X, Y, y hasta 2cm en Z, en caso que esto no resulte en este promedio de precisión sencillamente no se captura el punto ya que no cumple con los parámetros permisibles.
- Carteras de GPS: incluye una hoja que muestra el listado de puntos con sus coordenadas Magna, cota e identificación del punto. Incluye también otra hoja con el cálculo de la precisión que hace el postproceso del Equipo GPS para darle información de la posición a cada punto.

COORDENADAS

Id	Norte	Este	Origen
GP01	1654676.640	923909.293	Central
GP02	1653979.909	928325.372	Central
GP03	1655099.044	930759.717	Central
GP04	1656071.684	935426.815	Central
GP05	1661507.390	935004.845	Central
GP06	1659620.603	935103.938	Central
GP07	1652140.830	934304.127	Central
GP08	1649299.780	931295.934	Central
GP09	1663868.671	936393.942	Central
GP10	1668597.515	939526.058	Central
GP11	1667114.398	943781.202	Central
NP27N2	1651627.066	921676.812	Central

RESULTADO DE LA NIVELACION

Id	Altura Elipsoida	Ondulación	Ortometrica	Altura Nivelada
GP01	-0.857	-5.7	4.843	5.45
GP02	-2.148	-5.6	3.452	4.059
GP03	-2.858	-5.6	2.742	3.349
GP04	-3.913	-5.5	1.587	2.194
GP05	-2.782	-5.6	2.818	3.425
GP06	-4.423	-5.5	1.077	1.684
GP07	-4.094	-5.4	1.306	1.913
GP08	-3.811	-5.4	1.589	2.196
GP09	-3.629	-5.6	1.971	2.578
GP10	-3.704	-5.5	1.796	2.403
GP11	-4.574	-5.4	0.826	1.433

CONVENCIONES
- TERRENO NATURAL
- COTA DE DISEÑO
- COTA EJECUCCIÓN
- CANAL PROYECTADO
- CANAL EXISTENTE
- SECCIONES TRANSVERSALES
- CURVAS DE NIVEL
- PUENTE
- ÁREA A INTERVENIR

CONTRATANTE : CORMAGDALENA

CONTRATISTA : B&P Ingeniería Limitada

INTERVENTORIA : IEI INTERVENTORIAS E INGENIERIA

LEVANTÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

REVISÓ :
ANGEL M. VIZCAINO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA
13002-275 R.N.V.

DIBUJÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

APROBÓ:
FRANCISCO A. FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
T.P. 08202-187374 ATL

PROYECTO :

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP 005 DE 2023.
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESRATEGIAS"

CONTIENE :

CAÑO HONDO

EXVACACIÓN MECANICA
KM 0+825 - KM 1+150

MODIFICACIONES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESCALA : INDICADAS

CÓDIGO : HONDO-25

NOMBRE DE ARCHIVO : POS DRAGADO

FECHA : NOVIEMBRE 2025

TIPO : PLANO DISEÑO HIDRAULICO

PLANO : 02 DE 03


PROYECTO : CAÑO HONDO

BOXCULVERT 1


SECCIÓN 2+825.00




SECCIÓN 2+850.00




SECCIÓN 2+875.00



SECCIÓN 2+900.00



SECCIÓN 2+925.00



CUADRO DE VOLUMEN TOTAL


PROGRESIVA	AREA DE CORTE(m2)	VOLUMEN DE CORTE(m3)	VOL. ACUMULABLE DE CORTE(m3)
2+825.00	25.11	313.83	313.83
2+850.00	118.18	1809.04	2122.87
2+875.00	103.35	2769.16	4892.03
2+900.00	101.74	2568.47	7460.50
2+925.00	13.89	1445.42	8905.92
2+950.00	0.00	173.65	9079.57
2+975.00	0.00	0.00	9079.57

BOXCULVERT 4


SECCIÓN 10+650.00



SECCIÓN 10+675.00



SECCIÓN 10+700.00



SECCIÓN 10+725.00



CUADRO DE VOLUMEN TOTAL

PROGRESIVA	AREA DE CORTE(m2)	VOLUMEN DE CORTE(m3)	VOL. ACUMULABLE DE CORTE(m3)
10+650.00	41.58	522.81	18661.89
10+675.00	95.91	1720.36	20382.25
10+700.00	39.72	1684.27	22066.52
10+725.00	15.83	694.38	22760.91
10+750.00	0.00	197.98	22958.88

CONVENCIONES
- TERRENO NATURAL
- COTA DE DISEÑO
- COTA EJECUCCIÓN
- CANAL PROYECTADO
- CANAL EXISTENTE
- SECCIONES TRANSVERSALES
- CURVAS DE NIVEL
- PUENTE
- ÁREA A INTERVENIR

CONTRATANTE : CORPAMAG

CONTRATISTA : B&P

INTERVENTORIA : IEI INTERVENTORIA E INGENIERÍA

LEVANTÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

REVISÓ :
ANGEL M. VIZCAINO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA
13002-27518 BLV

DIBUJÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

APROBÓ:
FRANCISCO A. FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
T.P. 08202-197374 ATL

PROYECTO :
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP 005 DE 2023.
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESRATEGIAS"

CONTIENE :
CAÑO HONDO
BOX 1 - KM 2+825 - 2+925
BOX 4 - KM 10+650 - KM 10+725

MODIFICACIONES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESCALA : 1:200

CÓDIGO : HONDO-25


NOMBRE DE ARCHIVO : POS DRAGADO BOX CULVERT 1 Y 4

FECHA : NOVIEMBRE 2025

TIPO : PLANO DISEÑO HIDRAULICO

PLANO : 03 DE 03

PROYECTO : CAÑO HONDO

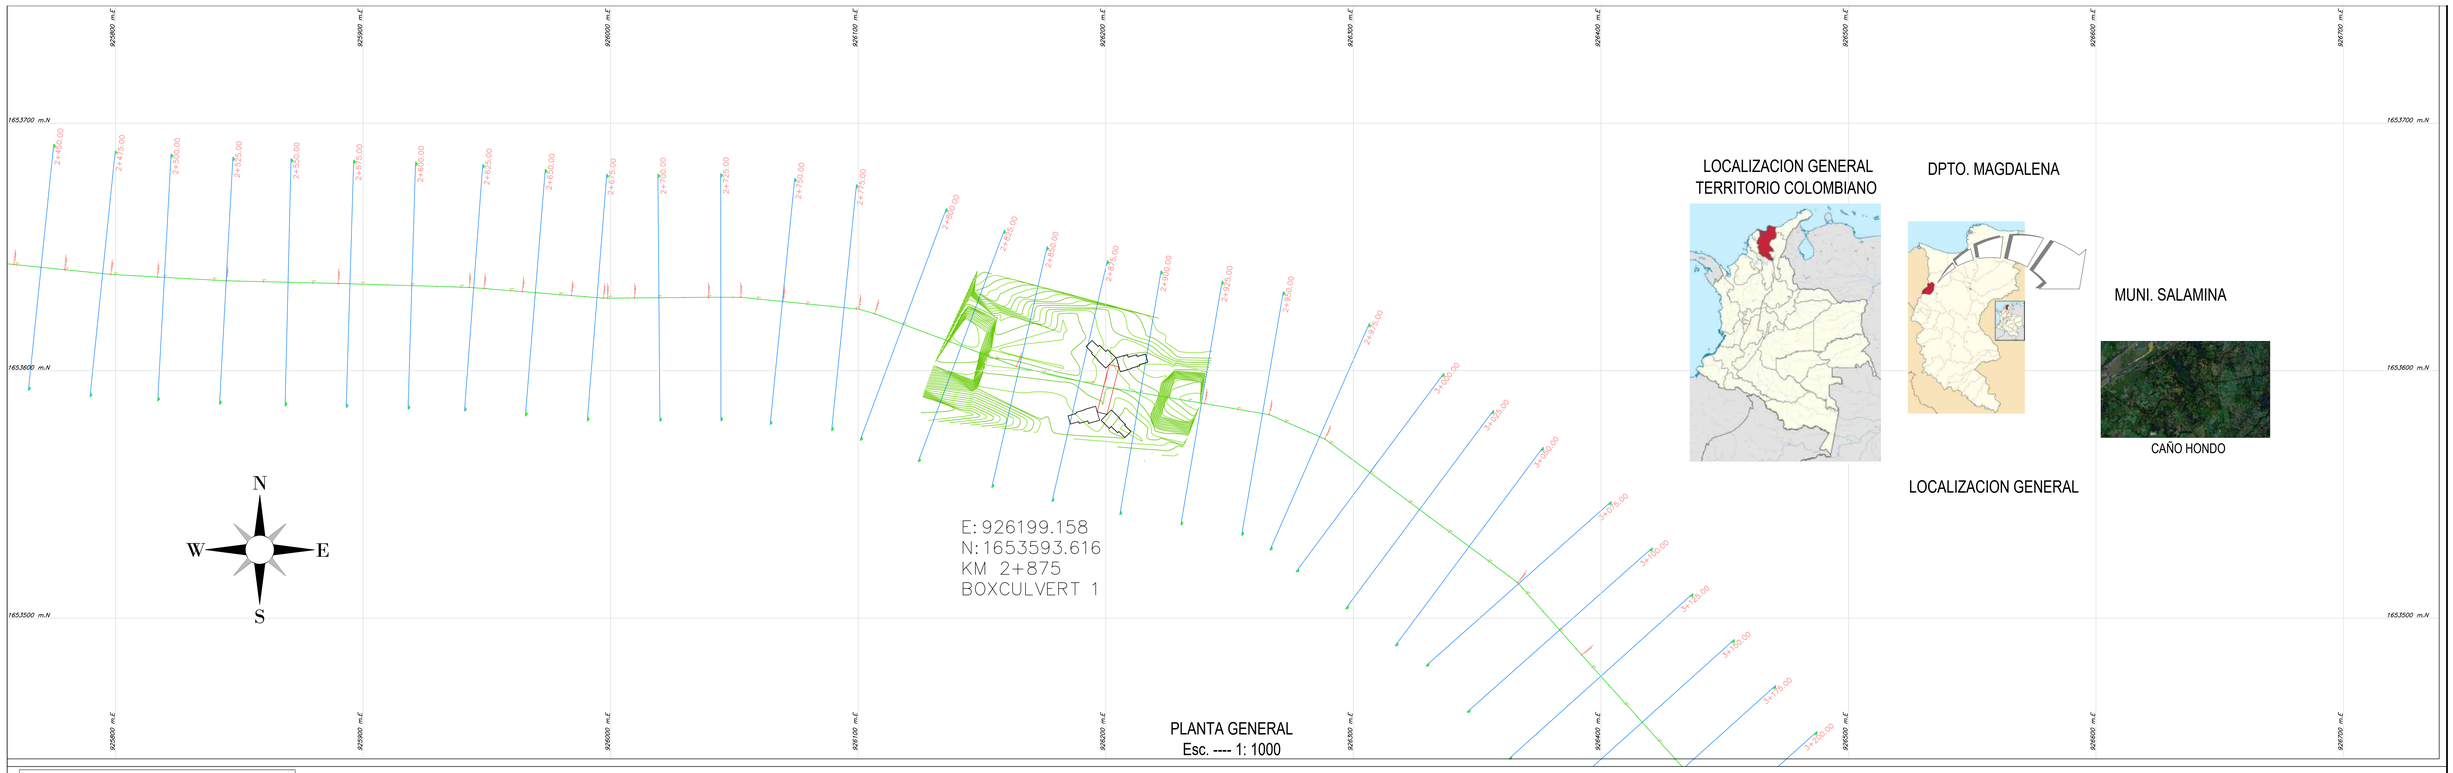

PLANTA GENERAL
Esc. ---- 1: 1000

LOCALIZACION GENERAL
TERRITORIO COLOMBIANO

DPTO. MAGDALENA

LOCALIZACION GENERAL

MUNI. SALAMINA

CAÑO HONDO

NOTAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

- Los levantamientos con GPS RTK, se instala el receptor Base (Receptor GPS de doble frecuencia) en una Placa GPS cuyas coordenadas son conocidas y determinadas en la primera etapa, creando el archivo con la configuración de coordenadas correspondiente con sistema de referencia MAGNA SIRGAS Colombia Origen Bogotá, se introducen las coordenadas del Punto Base o Punto de control del levantamiento y la altura de la antena desde el centro de la Placa hasta el centro de la antena, verificando posteriormente la recepción de señal de satélites. Si todo lo anteriormente mencionado, está dentro de los parámetros normales, el equipo genera un mensaje de Base iniciada correctamente que nos permite seguir con el procedimiento. Se inicia el Receptor GPS Móvil el cual está instalado en el bastón para tal fin, se hace la conexión, verificando la recepción exitosa de satélites; una vez el equipo está operativo, se hace conexión automática al receptor Punto base o de control el cual transmite corrección de coordenadas en tiempo real (GPS RTK) a través de señal UHF; una vez el equipo haya resuelto incertidumbres en la medición y la ubicación de satélites, buena recepción de señal entre otros parámetros le permitan obtener precisiones dentro del rango de 1cm en X, Y, y hasta 2cm en Z, en caso que esto no resulte en este promedio de precisión sencillamente no se captura el punto ya que no cumple con los parámetros permisibles.
- Carteras de GPS: incluye una hoja que muestra el listado de puntos con sus coordenadas Magna, cota e identificación del punto. Incluye también otra hoja con el cálculo de la precisión que hace el postproceso del Equipo GPS para darle información de la posición a cada punto.


COORDENADAS

Id	Norte	Este	Origen
GP01	1654676.640	923903.295	Central
GP02	1653979.909	928325.372	Central
GP03	1655093.044	930759.717	Central
GP04	1656071.684	935426.815	Central
GP05	1663507.390	935004.845	Central
GP06	1659620.600	935103.938	Central
GP07	1652140.830	934304.127	Central
GP08	1649299.783	931295.934	Central
GP09	1683868.671	936393.942	Central
GP10	1668597.515	939526.058	Central
GP11	1667114.398	943781.202	Central
NPZTN2	1651627.066	921676.812	Central

RESULTADO DE LA NIVELACION

Id	Altura Elipsoide	Ondulación	Ortometrica	Altura Nivelada
GP01	-0.857	-5.7	4.843	5.45
GP02	-2.148	-5.6	3.452	4.059
GP03	-2.858	-5.6	2.742	3.349
GP04	-3.913	-5.5	1.587	2.194
GP05	-2.782	-5.6	2.818	3.425
GP06	-4.423	-5.5	1.077	1.684
GP07	-4.094	-5.4	1.306	1.913
GP08	-3.811	-5.4	1.589	2.196
GP09	-3.829	-5.6	1.971	2.578
GP10	-3.704	-5.5	1.796	2.403
GP11	-4.574	-5.4	0.826	1.433

PERFIL LONGITUDINAL
Esc. ---- 1: 500

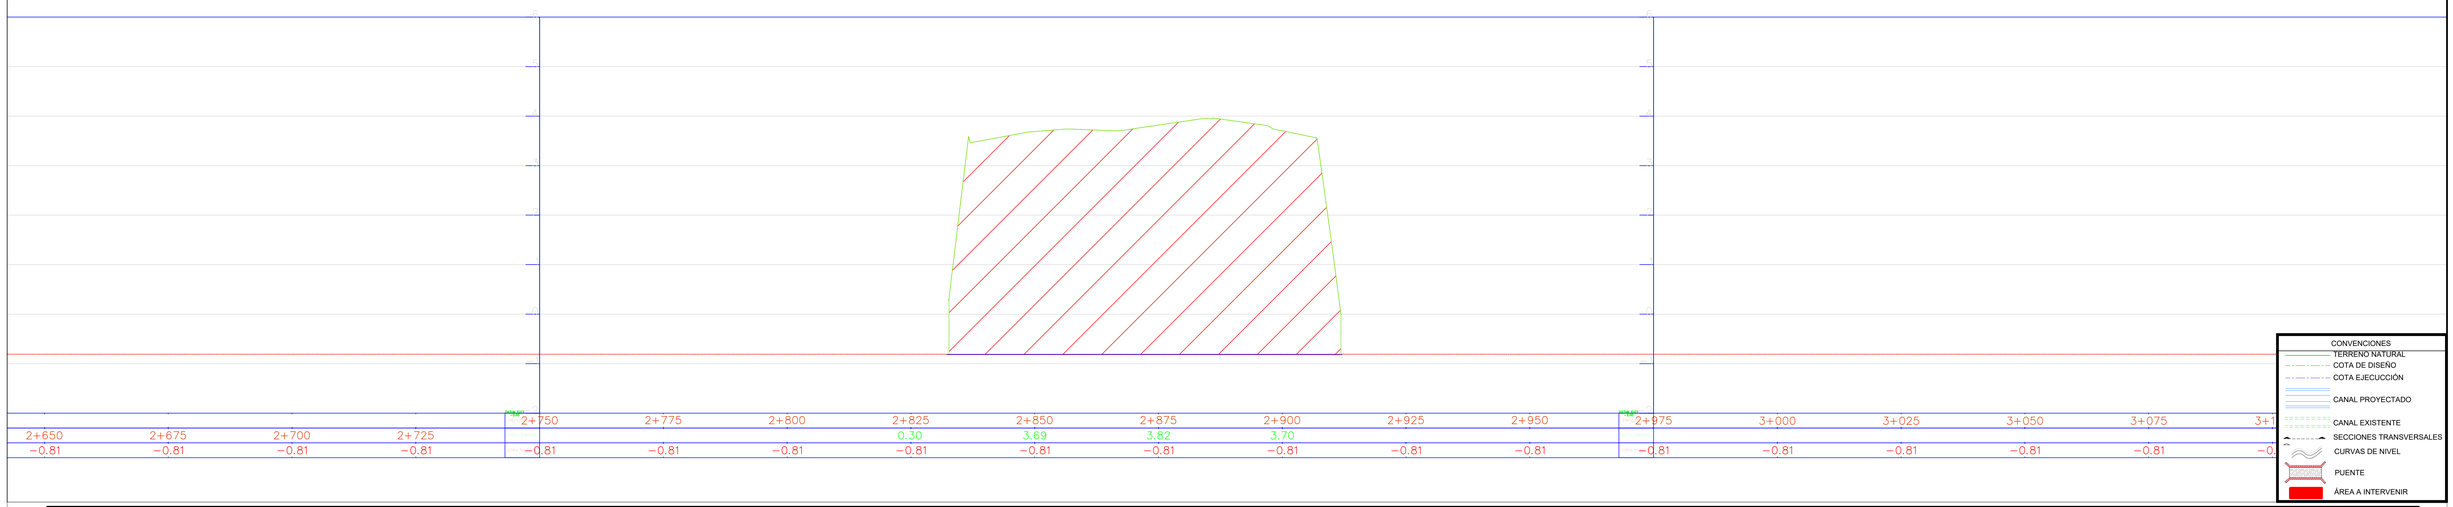

CONVENCIONES
- TERRENO NATURAL
- COTA DE DISEÑO
- COTA EJECUCCIÓN
- CANAL PROYECTADO
- CANAL EXISTENTE
- SECCIONES TRANSVERSALES
- CURVAS DE NIVEL
- PUENTE
- ÁREA A INTERVENIR

CONTRATANTE : CORPAMAG

CONTRATISTA : B&P INGENIEROS

INTERVENTORIA : IEI INTERVENTORIA E INGENIERIA

LEVANTÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 2533524091? CND

REVISÓ :
ANGEL M. VIZCAINO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA
13202-27518 BLV

DIBUJÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 2533524091? CND

APROBÓ:
FRANCISCO A. FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
T.P. 08202-18737 4 ATL

PROYECTO :
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP 005 DE 2023.
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESRATEGIAS"

CONTIENE :
CAÑO HONDO
BOXCULVERT 1
KM 2+825 - KM 2+925

MODIFICACIONES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESCALA : INDICADAS

CÓDIGO : HONDO-25


NOMBRE DE ARCHIVO : BOXCULVERT 1

FECHA : NOVIEMBRE 2025

TIPO : PLANO DISEÑO HIDRAULICO

PLANO : 01 DE 03

PROYECTO : CAÑO HONDO

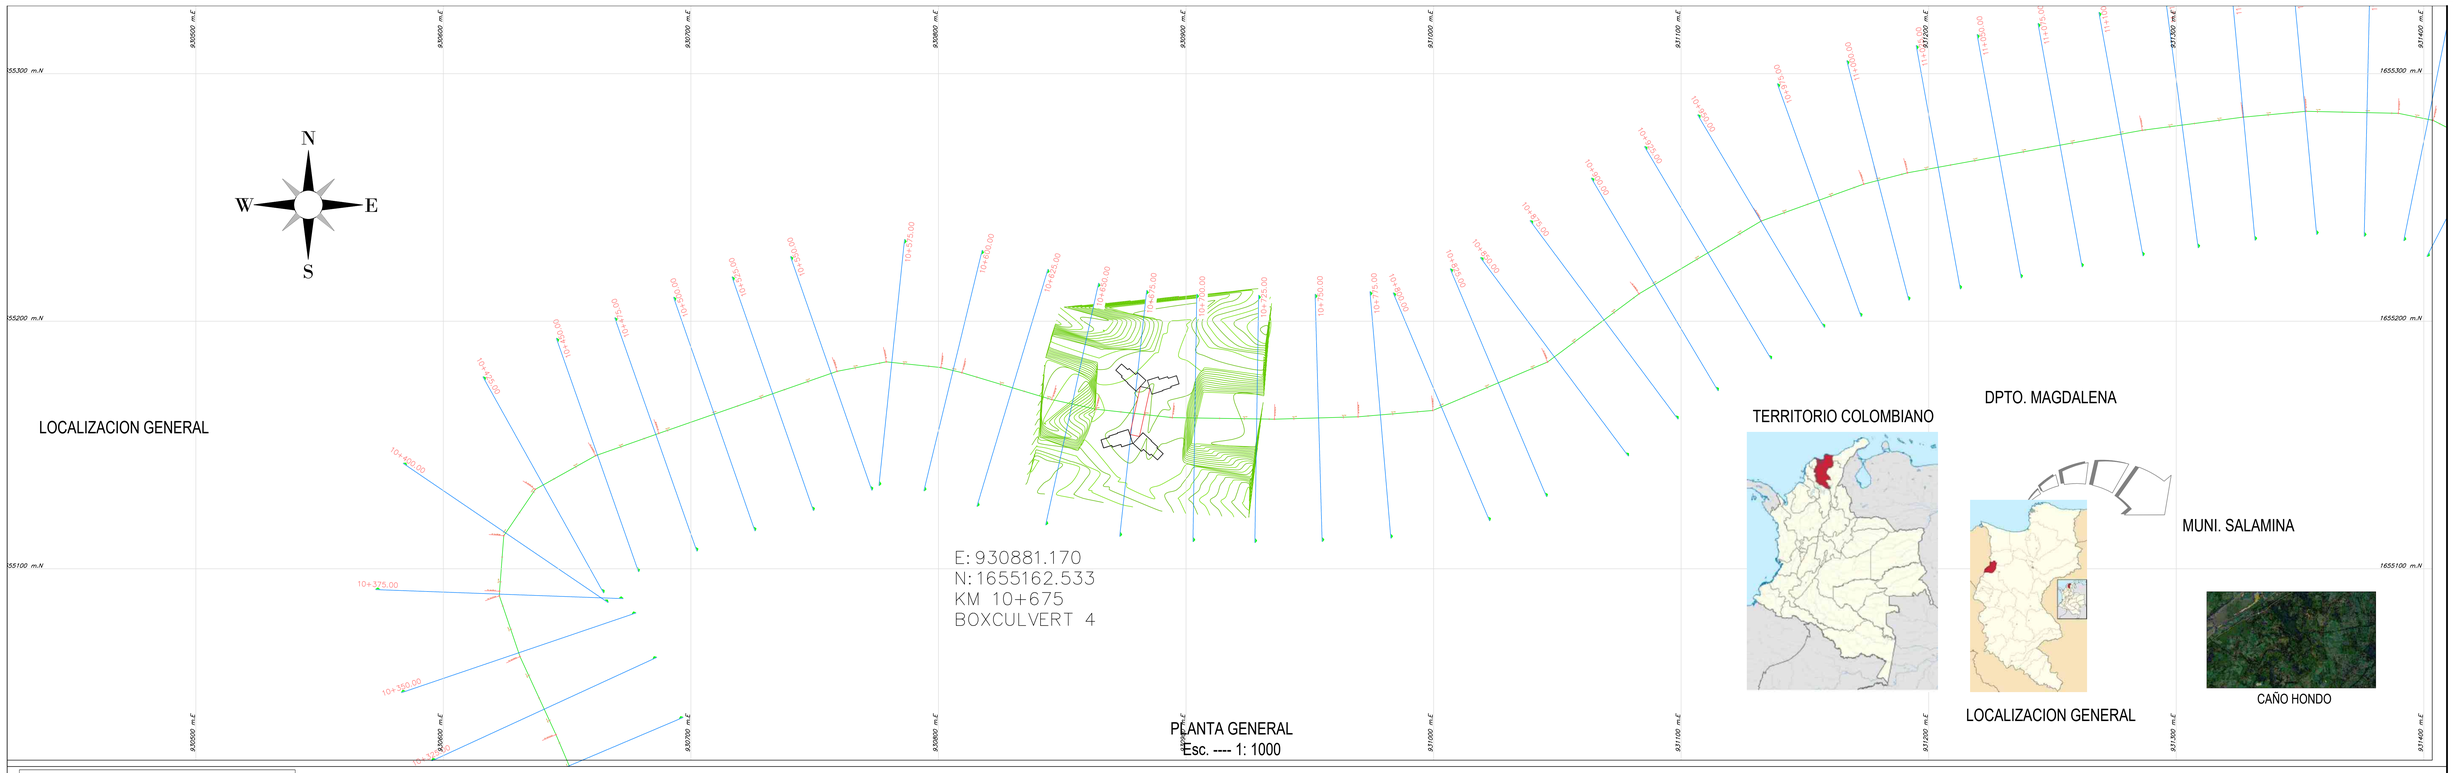

LOCALIZACION GENERAL

PLANTA GENERAL
Esc. ---- 1: 1000

TERRITORIO COLOMBIANO

DPTO. MAGDALENA

MUNI. SALAMINA

CAÑO HONDO

LOCALIZACION GENERAL

NOTAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

- Los levantamientos con GPS RTK, se instala el receptor Base (Receptor GPS de doble frecuencia) en una Placa GPS cuyas coordenadas son conocidas y determinadas en la primera etapa, creando el archivo con la configuración de coordenadas correspondiente con sistema de referencia MAGNA SIRGAS Colombia Origen Bogotá, se introducen las coordenadas del Punto Base o Punto de control del levantamiento y la altura de la antena desde el centro de la Placa hasta el centro de la antena, verificando posteriormente la recepción de señal de satélites. Si todo lo anteriormente mencionado, está dentro de los parámetros normales, el equipo genera un mensaje de Base iniciada correctamente que nos permite seguir con el procedimiento. Se inicia el Receptor GPS Móvil el cual está instalado en el bastón para tal fin, se hace la conexión, verificando la recepción exitosa de satélites; una vez el equipo está operativo, se hace conexión automática al receptor Punto base o de control el cual transmite corrección de coordenadas en tiempo real (GPS RTK) a través de señal UHF; una vez el equipo haya resuelto incertidumbres en la medición y la ubicación de satélites, buena recepción de señal entre otros parámetros le permitan obtener precisiones dentro del rango de 1cm en X, Y, y hasta 2cm en Z, en caso que esto no resulte en este promedio de precisión sencillamente no se captura el punto ya que no cumple con los parámetros permisibles.
- Carteras de GPS: incluye una hoja que muestra el listado de puntos con sus coordenadas Magna, cota e identificación del punto. Incluye también otra hoja con el cálculo de la precisión que hace el postproceso del Equipo GPS para darle información de la posición a cada punto.

COORDENADAS

Id	Norte	Este	Origen
GP01	1654676.640	929903.295	Central
GP02	1653979.909	928325.372	Central
GP03	1655093.044	930759.717	Central
GP04	1656071.684	935426.815	Central
GP05	1663507.390	935004.845	Central
GP06	1659620.600	935103.938	Central
GP07	1652140.830	934904.127	Central
GP08	1649299.780	931295.934	Central
GP09	1665868.671	936393.942	Central
GP10	1668697.519	939526.058	Central
GP11	1667114.398	943781.202	Central
NP2TN2	1651627.066	921676.812	Central

RESULTADO DE LA NIVELACION

Id	Altura Elipsoidal	Ondulación	Ortometrica	Altura Nivelada
GP01	-0.857	-5.7	4.843	5.45
GP02	-2.148	-5.6	3.452	4.059
GP03	-2.858	-5.6	2.742	3.349
GP04	-3.913	-5.5	1.587	2.194
GP05	-2.783	-5.6	2.818	3.425
GP06	-4.423	-5.5	1.077	1.684
GP07	-4.094	-5.4	1.306	1.913
GP08	-3.811	-5.4	1.589	2.196
GP09	-3.629	-5.6	1.971	2.578
GP10	-5.704	-5.5	1.796	2.403
GP11	-4.574	-5.4	0.826	1.433

PERFIL LONGITUDINAL
Esc. ---- 1: 500



CONTRATANTE : CORPAMAG

CONTRATISTA : B&P INGENIEROS

INTERVENTORIA : IEI INTERVENTORES E INGENIERIA

LEVANTÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

REVISÓ :
ANGEL M. VIZCAINO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA
13202-27518 BLV

DIBUJÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

APROBÓ :
FRANCISCO A. FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
T.P. 08202-18734 ATL

PROYECTO :
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP 005 DE 2023
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESRATEGIAS"

CONTIENE :
CAÑO HONDO
BOXCULVERT 4
KM 10+650 - KM 10+725

MODIFICACIONES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESCALA : INDICADAS
CÓDIGO : HONDO-25
NOMBRE DE ARCHIVO : BOXCULVERT 4
FECHA : NOVIEMBRE 2025

TIPO : PLANO DISEÑO HIDRAULICO
PLANO : 02 DE 03
PROYECTO : CAÑO HONDO

ANEXO 11

Informe de salvamento de fauna.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

CONTRATISTA:

Consorcio CGSM4
NIT. 901.782.967-1

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME MES DE NOVIEMBRE DE 2025

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Biólogo		
			
	Maria Auxiliadora Martínez Jiménez		
Revisión	Director de obra		
			
	Ing. Ángel M. Vizcaíno Escobar		

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN. 5
PROFESIONALES Y MATERIALES PARA EL AHUYENTAMIENTO Y RESCATE. 6
Grupo Técnico de Rescate y Manejo de Fauna Silvestre. 6
Herramientas e insumos veterinarios. 7
ESTABLECIMIENTO DE LA LINEA BASE. 8
Registros fotográficos monitoreo linea Base. 10
MEDIDAS DE PREVENCION. 11
Planificación y articulación de cronogramas. 11
Medidas para el ahuyentamiento de la fauna silvestre. 12
MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 14
ETAPA 1: Medidas preventivas. 14
ETAPA 2: Campamento. 14
ETAPA 4: Rescate en caliente. 15
ETAPA 5 y 6. Atención medica inmediata y transporte hacia el CAVFS por parte de un profesional en fauna silvestre. 15
ETAPA 7. Liberación inmediata en zonas destinadas por la autoridad ambiental. 15
ETAPA 8. Monitoreo biológico. 16
Metodología general. 16
Métodos para el muestreo de la fauna silvestre. 17
Anfibios y reptiles. 17
Aves. 17
Resultados. 17
Herpetos. 17
Aves. 18
Registro fotográficos aves - noviembre. 22
REFERENCIAS. 24

Lista de ilustraciones.

Ilustración 1. Planificación de obras de rehabilitación hidráulica del proyecto vigencia 2025 – caño hondo. Fuente consorcio cgsm4. 6
Ilustración 2. Ubicación espacial de los transectos monitoreados. Imagen tomada de google, modificada. 9

Ilustración 3. Transecto paralelo a la carretera y área de pastizales y suelos descubiertos con cobertura vegetal característica del bosque seco tropical. 10
Ilustración 4. Recorrido de acompañamiento y monitoreo de fauna silvestre con el equipo topográfico, caño hondo 2025.....11
Ilustración 5. Hesperoburhinus bistriatus registrado en caño hondo, junio 2025. 12
Ilustración 6. Tarea de ahuyentamiento de fauna silvestre, noviembre 2025..... 12
Ilustración 7. Avance dragado caño hondo, noviembre 2025. 13
Ilustración 8. Himantopus mexicanus, phimosus infuscatus y nannopterum brasilianum presentes en las áreas activas del dragado. Caño hondo, noviembre 2025..... 14
Ilustración 9. Herramientas y medicamentos para el manejo y atención de fauna silvestre presentes en el campamento de atención provisional del proyecto..... 15
Ilustración 12. Monitoreo de vertebrados etapa de ejecución, transecto 2 y 3. Caño hondo noviembre 2025. 16

Lista de gráficos.

Gráfico 1. Número de especies por órdenes registrados. Caño hondo noviembre 2025. . 19
Gráfico 2. Número de especies por familias registradas. Caño hondo noviembre 2025.. 19

Lista de tablas.

Tabla 1. Materiales del proyecto para ahuyentamiento, salvamento y monitoreo de fauna silvestre, caño hondo 2025. 7
Tabla 2. Insumos veterinarios para la atención primaria de fauna silvestre, caño hondo 2025. 8
Tabla 3. Especies mayormente ahuyentadas. Caño hondo, noviembre. 13
Tabla 4. Especies de reptiles registradas en caño hondo. Septiembre, octubre, noviembre 2025. 17
Tabla 5. Especies de aves registradas en caño hondo. Septiembre, octubre, noviembre 2025. 20

INTRODUCCIÓN.

En el presente informe se describen las actividades de salvamento, valoración, contención y reubicación de fauna silvestre asociadas al proyecto MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES, acorde a los lineamientos consignados en la Resolución 2064 de 2010 MAVDT, adaptado en el documento MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN MARCO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN HIDRO SEDIMENTOLÓGICA CGSM, presentado a la Corporación autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG; el cual propone un protocolo para el manejo y monitoreo del grupo vertebrado hallado en área de influencia del proyecto.

Para la VIGENCIA 2025 la zona de intervención se encuentra en el Municipio de Salamina, en el cuerpo de agua denominado Caño Hondo. Caño Hondo es uno de los cursos de agua que entregan desde el sur, agua dulce del Río Magdalena al complejo Delta Estuarino de la Ciénaga de Santa Marta. Sumergido en el bosque seco tropical, el tramo a intervenir cuenta con ronda hídrica destinadas a la ganadería, con una alta modificación paisajística propia del municipio en general, identificando potreros con árboles dispersos característicos del ecosistema, y pastos para alimentación del ganado en las extensiones de tierras de las fincas ganaderas y de monocultivos. Ilustración 1.

Los trabajos se extenderán hasta la conexión con el Caño Martinica, por lo que se proyecta la intervención del último tramo, con una longitud aproximada de 1.3 kilómetros. En esta área se registra avifauna asociada a zonas altamente intervenidas, como resultado del uso intensivo del suelo, la fragmentación del hábitat y la presencia de actividades antrópicas. Predominan especies generalistas con alta tolerancia a la perturbación, como *Ardea alba*, *Columbina talpacoti* y *Eupsittula pertinax*, lo que evidencia una baja representatividad de especies sensibles o especializadas. Esta caracterización resulta clave para orientar las medidas de manejo y conservación, priorizando el monitoreo, el ahuyentamiento y la restauración ecológica postintervención.



Ilustración 1. Planificación de obras de rehabilitación hidráulica del proyecto VIGENCIA 2025 – Caño Hondo. Fuente Consorcio CGSM4.

PROFESIONALES Y MATERIALES PARA EL AHUYENTAMIENTO Y RESCATE.

Grupo Técnico de Rescate y Manejo de Fauna Silvestre.

En el marco del proyecto de recuperación hidrosedimentaria, se ha conformado un equipo técnico interdisciplinario especializado en el manejo responsable de fauna silvestre, con el objetivo de garantizar la ejecución ética, segura y eficiente de las acciones de rescate, ahuyentamiento, valoración, atención, transporte y liberación de ejemplares que puedan verse afectados por las actividades del proyecto.

Un profesional en Biología, responsable de la identificación taxonómica de los ejemplares, evaluación ecológica del hábitat, registro de datos técnicos, elaboración de informes y coordinación de las acciones de rescate y liberación conforme a la Resolución 2064 de 2010 MAVDT.

Médico Veterinario, encargado de la valoración clínica, atención, estabilización y seguimiento sanitario de los ejemplares rescatados, quien define criterios de aptitud para el transporte y liberación, y supervisa el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y bienestar animal.

Dos auxiliares de campo, los cuales realizan diariamente ahuyentamiento y apoyan en la captura segura, manipulación, traslado y liberación de los animales capturaos en caliente. Este personal es oriundo del área de influencia del proyecto; con experiencia previa en uso de equipos de contención y aplicación de protocolos de rescate en ambientes acuáticos y terrestres, tal como los establece el PROTOCOLO

PARA EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE DRAGADO EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA CGSM – Establecido por CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

Herramientas e insumos veterinarios.

Para la ejecución segura de las acciones de ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre en el marco del proyecto, se dispone de un conjunto de materiales especializados que permiten minimizar el estrés animal y garantizar su integridad.

El equipamiento incluye dispositivos sonoros, como bocinas. Para el rescate en caliente, se cuenta con red nasa, pértiga, ganchos herpetológicos, guantes de protección, contenedores ventilados, además de un kit veterinario portátil para atención primaria.

Además, se cuenta con equipos para monitoreo de la fauna *in situ*, como cámaras para fototrampeo, binocular Simmons 8x42 mm y cámara fotográfica Canon EOS Rebel T7 con lente EF 75 – 300 mm f/4-5.6 III.

Tabla 1. Materiales del proyecto para ahuyentamiento, salvamento y monitoreo de fauna silvestre, Caño Hondo 2025.

Descripción	Cantidad
Cámaras trampa Protección contra chorros directos de alta presión IP66 de 32 MP	4
baterías Alcalinas X 68 x caja de 48 baterías	2
Pinza para el Manejo de Serpientes (Long. Minima 1.20m)	1
Pértiga para el Manejo de Mamíferos y Herpetos (Long. Minima 1.20m)	1
Guacal plástico rígido Para Perro #300 (talla L) 81 Cms De Largo	1
Guacal Nacional, plástico rígido, Viaje - Pequeño #100 60X40	1
Cajas plásticas transparentes con broches grandes Wenbox 40x31x66 cm 61 Lt Transparente	1
Cajas plasticas transparentes Set x2 Cajas Organizadoras Con Broches 20 Litros	1
Nasa de control	2
Guantes reforzados, largos de carnaza	6
Guantes blandos X20 pares	1
Poli sombra X 100 m	2

Machete con vaina Juego de 6 Limas 6Pulg Con Mango	6
Bocinas y vuvuzelas (Ruido)	2
Sillas y mesa plástica para campamento	2

Tabla 2. Insumos veterinarios para la atención primaria de fauna silvestre, Caño Hondo 2025.

Insumos Veterinarios.	Cantidad.
Caja de guantes quirúrgicos	1
Botiquin primeros auxilios	1
Clorhexidina liquida	1
Productos antisepticos curacion fauna *Dermosyn	1
Suero fisiológico	2
Analgesicos fauna* Meloxicam	1
Antidiarrheicos fauna	5
Kit peque;a cirugia y sutura	1
rollo de algodón	2
jeringas 10 ml	5
jeringas insulina	5
sales de rehidratación oral X caja	5
rollo de papel secante	2
pañitos húmedos X 100	1
Platos alimentación animales	1
Atomizadores de agua	1

ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE.

Cómo línea base en el proyecto se realizó descripción inicial de la clase aves, este grupo de vertebrados es ampliamente utilizado como indicador del estado de los ecosistemas dado su sensibilidad a cambios de hábitat y su capacidad de reflejar el estado funcional de un área determinada (Villarreal et al., 2004). Los resultados del desarrollo de este ejercicio fueron consignados en el informe del periodo septiembre.

Los recorridos visuales y auditivos de aves *ad libitum,* permitieron realizar registros de frecuencias de avifauna en tres transectos aplicando técnicas de monitoreo propuestas por Aguilar (2015).

La actividad se realizó en el mes de junio de 2025, entre las 7 y 10 am, con desplazamientos de único observador (Ilustración 2):

Transecto 1: área paralela a la carretera. Reservorio con platas acuáticas y pastizales. Coordenada. 10°31'44.3"N 74°40'00.8".

Transecto 2: área dentro de las fincas. Con árboles dispersos, pastizales y suelos descubiertos. Coordenada. 10.534, -74.667

Transecto 3: área con conexión a caño Martinica, Reservorio con platas acuáticas, pastizales y arboles dispersos. 10.532, -74.663.



Ilustración 2. Ubicación espacial de los transectos monitoreados. Imagen tomada de Google, modificada.

Para la identificación de algunas especies se utilizó guía de campo Aves del Caribe Colombiano de Milles McMuller 2021 y la Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana de Fernando Ayerbe Quiñones 2022.

El esfuerzo de muestreo alcanzó un 83% de efectividad según la curva de acumulación lograda a partir del software estadísticos Estimete9, lo que indica una aproximación confiable al número real de especies presentes en el área.

Se identificaron 54 especies distribuidas en 20 familias y 15 órdenes, con predominancia del orden Passeriformes (48%), conformado por aves pequeñas de dieta generalista, y del orden Pelecaniformes (9%), vinculado a ambientes acuáticos. La presencia de este último grupo, a pesar del bajo caudal del caño, sugiere disponibilidad de recursos alimenticios como peces, invertebrados y reptiles, lo que confirma la funcionalidad ecológica del tramo monitoreado.

Destaca la alta abundancia de *Eupsittula pertinax* (cotorra carisucia), especie gregaria y altamente adaptable a paisajes intervenidos, cuya presencia dominante en los tres transectos evidencia condiciones favorables para especies tolerantes a la perturbación.





Ilustración 3. Transecto paralelo a la carretera y área de pastizales y suelos descubiertos con cobertura vegetal característica del Bosque Seco Tropical.

Los registros obtenidos son consignados en una planilla Excel estructurada con elementos del estándar Darwin Core (DwC), con el fin de documentar listas de chequeo sobre la biodiversidad en Colombia. Este archivo se actualiza periódicamente con los datos recolectados en los monitoreos realizados durante las fases de operación del proyecto, manteniendo la delimitación de los tres transectos definidos para la caracterización de la avifauna presente en el área de intervención. Ver Anexo 1.

Registros fotográficos monitoreo línea Base.



Dendrocygna



Pyrocephalus rubinus



Certhiaxis cinnamomeus



Icterus nigrogularis



Crotophaga sulcirostris

MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

Planificación y articulación de cronogramas.

Se realizó acompañamiento al equipo encargado del levantamiento tipográfico en el tramo de Caño Hondo a intervenir en esta vigencia, para realizar monitoreos previos de fauna silvestre en la zona, definir transectos para el seguimiento y para establecer direccionar acorde a las especies presentes, el protocolo de ahuyentamiento y salvamento de fauna que se realizara diariamente (Ilustración 4).





Ilustración 4. Recorrido de acompañamiento y monitoreo de fauna silvestre con el equipo topográfico, Caño Hondo 2025.



Ilustración 5. Hesperoburhinus bistriatus registrado en Caño Hondo, junio 2025.

De acuerdo a lo anterior, en el área se registraron individuos de *Hesperoburhinus bistriatus* y *Vanellus chilensis,* estos habitan pastizales, bancos y márgenes de ríos, manglares, áreas abiertas con poca vegetación y áreas perturbadas y su nidos son poco elaborados puestos al ras del suelo (Mena-Valenzuela, 2018), lo que sugiere una inspección minuciosa por parte del auxiliar de fauna dado que los huevos se pueden confundir con su entorno.

Medidas para el ahuyentamiento de la fauna silvestre.

Diariamente y previo a la intervención de las maquinas en el proyecto, se realizaron ahuyentamiento sonoros e inspecciones mecánicas por parte de personal asignado cómo auxiliar de fauna silvestre. Con el fin de verificar y garantizar la protección de los animales rezagados o de movilidad reducida, el uso de la vuvuzela fue alternado con caminadas para inspeccionar el área a intervenir.



Ilustración 6. Tarea de ahuyentamiento de fauna silvestre, noviembre 2025.

Sigue siendo la familia Teiidae la de mayor actividad diurna en las áreas circundantes al desarrollo de las actividades de dragado. Estas especies son frecuentes en ambientes intervenidos, caracterizados por suelos descubiertos, bordes de caminos y alta radiación solar, condiciones que favorecen su actividad diurna y termorregulación (Hernández et al., 2018).

Dado el avance del gradado, se observa escasa vegetación en las orillas del tramo de Caño Hondo intervenido; no obstante, el canal ya dragado evidencia un nivel de agua significativo. En estos espacios se realizaron acciones de ahuyentamiento de individuos de la clase Aves, característicos de los cuerpos de agua. Es importante resaltar la presencia de aves limícolas migratorias, considerando que corresponde al periodo de migración 2025–2026.



Ilustración 7. Avance Dragado Caño Hondo, noviembre 2025.

Tabla 3. Especies mayormente ahuyentadas. Caño Hondo, noviembre.

Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Reptilia	Squamata	Teiidae	Ameiva	*Ameiva praesignis*
Reptilia	Squamata	Teiidae	Cnemidophorus	*Cnemidophorus sp*
Aves	Charadriiformes	Jacanidae	Jacana	*Jacana jacana*
Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Tringa	*Tringa solitaria*
Aves	Charadriiformes	Scolopacidae	Actitis	*Actitis macularius*
Aves	Charadriiformes	Recurvirostridae	Himantopus	*Himantopus mexicanus*
Aves	Charadriiformes	Charadridae	Vanellus	*Vanellus chilensis*
Aves	Charadriiformes	Charadriidae	Anarhynchus	*Anarhynchus collaris*
Aves	Suliformes	Phalacrocoracidae	*Nannopterum*	*Nannopterum brasilianum*
Aves	Pelecaniformes	Threskiornithidae	Phimosus	*Phimosus infuscatus*
Aves	Pelecaniformes	Ardeidae	Ardea	*Ardea alba*
Aves	Pelecaniformes	Ardeidae	Egretta	*Egretta thula*
Aves	Accipitriformes	Accipitridae	Rostrhamus	*Rostrhamus sociabilis*
Aves	Coraciiformes	Alcedinidae	Chloroceryle	*Chloroceryle americana*
Aves	Passeriformes	Furnariidae	Certhiaxis	*Certhiaxis cinnamomeus*
Aves	Passeriformes	Tyrannidae	Fluvicola	*Fluvicola pica*



Ilustración 8. Himantopus mexicanus, Phimosus infuscatus y Nannopterum brasilianum presentes en las áreas activas del dragado. Caño Hondo, noviembre 2025.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN.

Las activades de manejo de fauna silvestre en el proyecto están direccionadas por el PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SALVAMENTO DE FAUNA ACUÁTICA Y TERRESTRE CGSM4 para el Manejo de Fauna Silvestre en Marco de las Obras De Rehabilitación Hidrosedimentológica CGSM.

ETAPA 1: Medidas preventivas.

Se implementaron medidas preventivas para mitigar las posibles afectaciones a la fauna silvestre presente en la zona de desarrollo de las actividades correspondientes a este periodo, en concordancia con el Plan de Manejo de Fauna Silvestre en el marco de las Obras de Rehabilitación Hidrosedimentológica del CGSM, propuesto por el consorcio y ajustado a los lineamientos establecidos en la Resolución 2064 de 2010 del MAVDT.

Tal como se mencionó anteriormente en el presente documento, se han venido implementando acciones de ahuyentamiento de fauna silvestre como medida preventiva en las zonas de intervención. Estas acciones, ya descritas en detalle en apartados previos, estas reflejan inspecciones mecánicas y recorridos diarios por parte del equipo de auxiliares de fauna, con el fin de reforzar la protección de ejemplares ante el inicio de actividades operativas.

ETAPA 2: Campamento.

El proyecto cuenta con un espacio destinado para la atención y valoración de ejemplares de fauna silvestre que resulten heridos durante la ejecución de las actividades de maquinaria realizadas en el periodo. Este sitio está dotado con las herramientas e insumos veterinarios descritos anteriormente, tales como guacales, perdigones, pinzas tipo red Nasa, kit de primeros auxilios, guantes, medicamentos,

entre otros elementos (Ilustración 9), que garantizan la atención primaria de los ejemplares capturados en caliente que requieran intervención veterinaria inmediata.



Ilustración 9. Herramientas y medicamentos para el manejo y atención de fauna silvestre presentes en el campamento de atención provisional del proyecto.

ETAPA 4: Rescate en caliente.

Durante el periodo, no se realizaron capturas en caliente de fauna silvestre en el marco de las actividades operativas del proyecto. Esta ausencia de eventos críticos sugiere que las medidas preventivas implementadas —ahuyentamiento, inspecciones mecánicas previas y los recorridos diarios por parte del equipo de auxiliares de fauna— fueron efectivas para disuadir la presencia de ejemplares en áreas de riesgo inmediato.

ETAPA 5 y 6. Atención medica inmediata y transporte hacia el CAVFS por parte de un profesional en fauna silvestre.

En el periodo, no fue necesario realizar atención médica, ni efectuar el traslado de fauna silvestre hacia el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVFS) por parte del Grupo Técnico de Rescate y Manejo de Fauna Silvestre.

ETAPA 7. Liberación inmediata en zonas destinadas por la autoridad ambiental.

En el periodo, no fue necesario realizar atención médica, ni efectuar el traslado de fauna silvestre hacia el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVFS) por parte del Grupo Técnico de Rescate y Manejo de Fauna Silvestre.

ETAPA 8. Monitoreo biológico.

Metodología general.

Con transectos definidos en el establecimiento de la línea base, para el desarrollo de los monitoreos biológicos durante la ejecución de las actividades programadas para la vigencia, se realizarán recorridos para identificación del grupo vertebrado en estas mismas áreas.

Para este periodo se efectuaron recorridos de identificación de vertebrados en los transectos 2 y 3, caracterizados por la presencia de árboles de dosel disperso y áreas explanadas producto de las actividades del proyecto. Las observaciones se realizaron en horario diurno, entre las 10:30 a. m. y las 12:00 m., permitiendo registrar la dinámica de especies adaptadas a ambientes abiertos y fragmentados.



Ilustración 10. Monitoreo de vertebrados etapa de ejecución, transecto 2 y 3. Caño Hondo noviembre 2025.

Métodos para el muestreo de la fauna silvestre.

Anfibios y reptiles.

Durante los recorridos se registraron todos anfibios y reptiles encontrados a lo largo de los transectos delimitados.

Algunos individuos encontrados dentro del transecto fueron fotografiados e identificados hasta especie utilizando literatura especializada con claves dicotómicas para su identificación hasta el nivel de especie.

Aves.

Se realizaron registros visuales y auditivos de las especies de aves presentes en los transectos 2 y 3, considerando la abundancia relativa de cada una. Para lograr, un consolidado del tramo que permita caracterizar la composición específica en la unidad del muestreo.

Análisis de los datos: en este informe, únicamente se reportarán los registros obtenidos del monitoreo de cada grupo de vertebrados presentes en el área de influencia directa del proyecto correspondiente a la Vigencia 2025. El análisis estadístico de estos datos se realizará una vez se consolide el total de registros acumulados durante la etapa de ejecución.

Resultados.

Herpetos.

En el área de estudio se realizó el registro de los anfibios y reptiles a partir de observaciones ocasionales que no representan un muestreo exhaustivo debido a que las horas de muestreo apropiadas para estos grupos de vertebrados incluye un horario de búsqueda nocturno (Angulo et al. 2006).

Reptiles: sólo se registraron individuos de los géneros Cnemidophorus y Ameiva (específicamente *Ameiva praesignis*), estos reptiles se registran con alta recurrencia en área. Este patrón coincide con lo esperado en ambientes perturbados o modificados por actividades humanas, ya que muchas especies de Teiidae (familia de estos géneros) son reconocidas por su plasticidad ecológica y capacidad de colonizar hábitats abiertos o intervenidos (Pastrana, 2015).

Tabla 4. Especies de reptiles registradas en Caño Hondo. Septiembre, octubre, noviembre 2025.

Orden	Familia	Especie	Trans2	Trans3	Trans1	Trans2	Trans3
			Sep-2025	Sep-2025	Oct-2025	Nov-2025	Nov-2025
Testudines	Emydidae	*Trachemys callirostris*			1		

Crocodylia	Alligatoridae	*Caiman crocodilus fuscus*			1		
Squamata	Teiidae	*Ameiva praesignis*	4	3	3	1	2
		Cnemidophorus sp	8	5	5		3

Aves.

Los registros obtenidos para el periodo corresponden a los tramos 2 y 3 de las áreas de monitoreo propuestas para esta vigencia. En el transecto 2 se identificaron 9 órdenes, 16 familias y un total de 25 especies, mientras que en el transecto 3 se registraron 10 órdenes, 17 familias y 28 especies. Estos resultados ubican al transecto 3 como el sector con mayor riqueza específica del muestreo, evidenciando una ligera diferencia con respecto al transecto 2, aunque no lo suficientemente amplia para considerarse una variación marcada en la composición faunística.

Si bien el tramo 2 presenta un mayor nivel de intervención debido a las actividades de dragado y tránsito de maquinaria, se esperaba encontrar una disminución más evidente de la riqueza de aves. Sin embargo, la diferencia observada entre ambos transectos es relativamente baja, lo que podría demostrar que la fauna registrada mantiene aún una capacidad de permanencia en áreas con intervención alta intervención. Por otro lado, el tramo 3, con vegetación más conservada y mayor cobertura estructural, puede estar actuando como un refugio o zona de amortiguamiento, ofreciendo mayor disponibilidad de recursos como alimento, perchas, sitios de refugio y condiciones micro ambientales más estables.

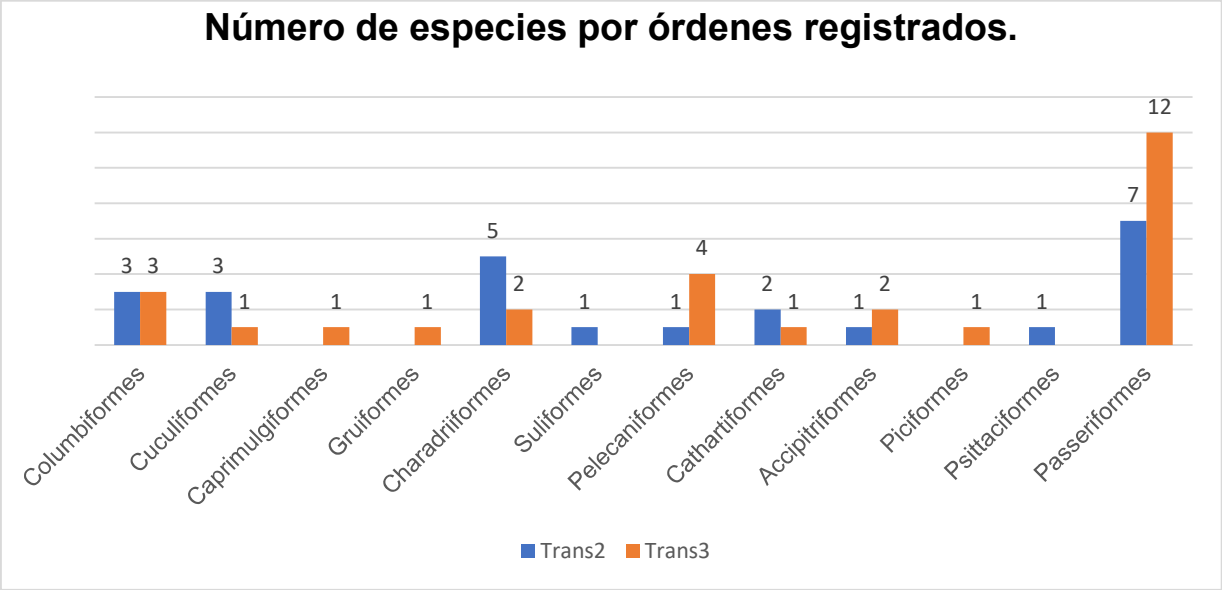


Gráfico 1. Número de especies por órdenes registrados. Caño Hondo noviembre 2025.

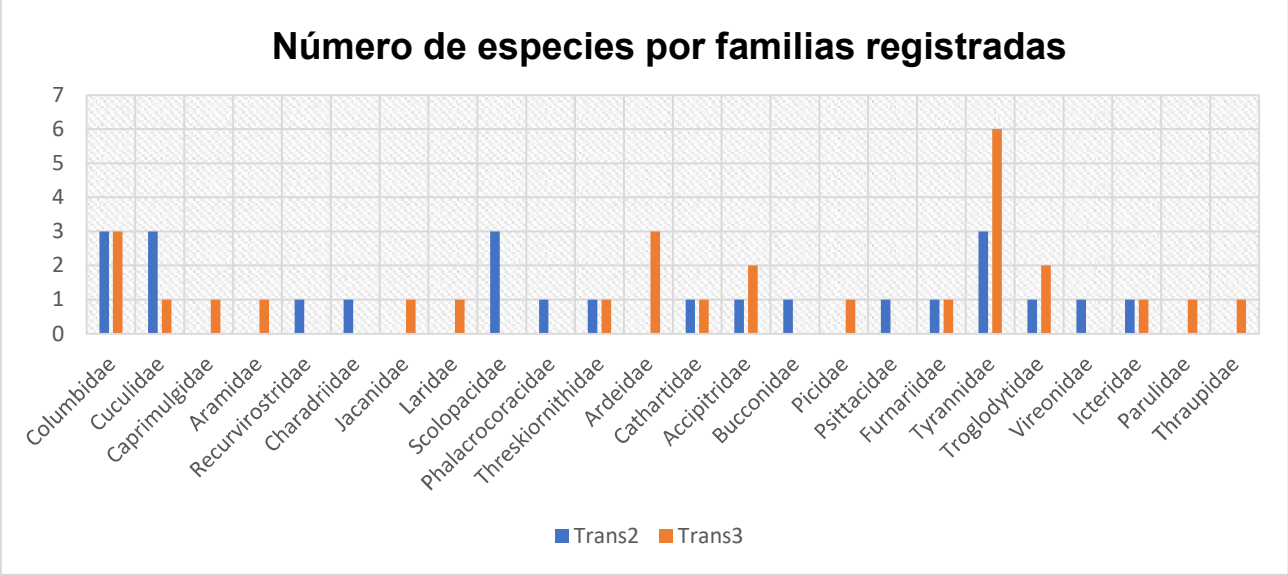


Gráfico 2. Número de especies por familias registradas. Caño Hondo noviembre 2025.

Tabla 5. Especies de aves registradas en Caño Hondo. Septiembre, octubre, noviembre 2025.

			Trans2	Trans3	Trans1	Trans2	Trans3
Orden	**Familia**	**Especie**	**sep-25**	**sep-25**	**Oct-25**	**Nov-25**	**Nov-25**
Anseriformes	Anhimidae	*Chauna chavaria*			2		
	Anatidae	*Dendrocygna autumnalis*	*5*	7	4		
Columbiformes	Columbidae	*Columbina talpacoti*	7	3	4	3	2
		Columbina squammata	10	2	6	3	2
		Leptotila verreauxi		3		2	
		Zenaida auriculata		1			2
Cuculiformes	Cuculidae	*Crotophaga ani*	16	7	6	6	7
		Crotophaga major				4	
		Crotophaga sulcirostris	*15*	1		3	
		Tapera naevia	*1*				
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	*Nyctidromus albicollis*					2
Trochilidae	Apodiformes	*Chrysuronia goudoti*	4				
Gruiformes	Aramidae	*Aramus guarauna*	*2*	5			1
Charadriiformes	Recurvirostridae	*Himantopus mexicanus*	*1*			3	
	Charadriidae	*Vanellus chilensis*	2		3	2	
	Jacanidae	*Jacana jacana*	6		5		1
	Laridae	*Phaetusa simplex*					15
	Scolopacidae	*Actitis macularius*	6		1	2	
		Anarhynchus collaris				7	
		Tringa solitaria	2	2	3	6	
Suliformes	Phalacrocoracidae	*Nannopterum brasilianum*				1	
Pelecaniformes	Threskiornithidae	*Phimosus infuscatus*	2	5	4	1	
		Mesembrinibis cayennensis					1
	Ardeidae	*Tigrisoma lineatum*			1		
		Butorides striata					1
		Egretta thula	1				
		Ardea ibis	*1*				
		Ardea alba	6	4			1
		Ardea cocoi					1
Cathartiformes	Cathartidae	*Cathartes burrovianus*	1		1	2	
		Coragyps atratus				4	
		Cathartes aura					7
Accipitriformes	Accipitridae	*Geranospiza caerulescens*			1		

		Rupornis magnirostris					1
		Rostrhamus sociabilis			4		
		Busarellus nigricollis		1		3	1
		Buteogallus meridionalis		2			
Strigiformes	Strigidae	*Bubo virginianus*	1				
		Glaucidium brasilianum	*1*				
Coraciiformes	Alcedinidae	*Megaceryle torquata*	*1*				
		Chloroceryle americana	*1*		1		
Galbuliformes	Bucconidae	*Hypnelus ruficollis*	*3*			3	
Piciformes	Picidae	*Melanerpes rubricapillus*	2				1
Psittaciformes	Psittacidae	*Eupsittula pertinax*	8			8	
Passeriformes	Furnariidae	*Certhiaxis cinnamomeus*	*1*		5	5	1
		Furnarius longirostris			4		
		Synallaxis albescens			1		
	Tyrannidae	*Todirostrum cinereum*	4	2			1
		Empidonax traillii			2		
		Tyrannulus elatus					1
		Elaenia flavogaster					1
		Pyrocephalus rubinus	3	1	1		1
		Fluvicola pica	*1*		2		1
		Arundinicola leucocephala	2				
		Machetornis rixosa	*2*				
		Pitangus sulphuratus	11	6	3	5	
		Megarynchus pitangua	1				
		Tyrannus melancholicus	6	2	4	3	
		Tyrannus dominicensis	*4*			2	1
	Hirundinidae	*Progne tapera*		30	5		
		Progne chalybea			4		
		Hirundo rustica	3				
		Pygochelidon cyanoleuca			3		
	Troglodytidae	*Troglodytes musculus*	*4*	3	4		
		Campylorhynchus nuchalis	*1*			3	3
		Campylorhynchus griseus		2	2		2
	Vireonidae	*Cyclarhis gujanensis*	2			1	
	Icteridae	*Quiscalus mexicanus*			3		
		Quiscalus lugubris					5

		Chrysomus icterocephalus		2			
		Icterus nigrogularis	7	2		2	
	Parulidae	*Protonotaria citrea*	1				
		Setophaga petechia	3	2			1
	Thraupidae	*Sicalis flaveola*	*1*		3		
		Volatinia jacarina	*3*	2	5		
		Thraupis palmarum			1		
		Thraupis episcopus					1
		Saltator olivascens		1			

Registro fotográficos aves - noviembre.



Hypnelus ruficollis




Tyrannus dominicensis



Anarhynchus collaris



Melanerpes rubricapillus

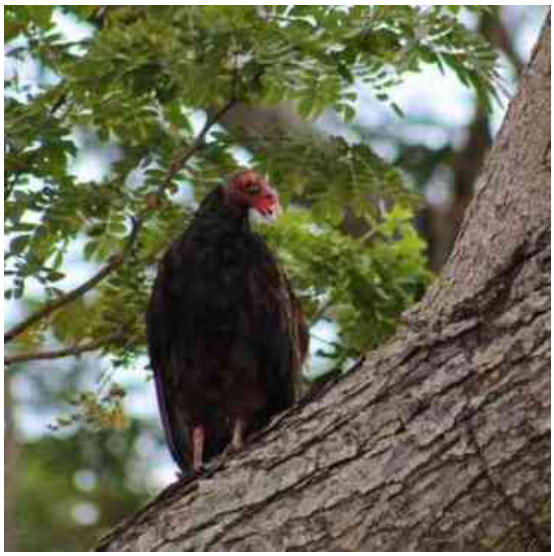

Cathartes aura



Pitangus sulphuratus

REFERENCIAS.

Angulo A., et al. (2006). Técnicas para el inventario y monitoreo para los anfibios de la región tropical Andina. Conservación Internacional Serie Manuales de Campo. 299 p.

Consorcio CGSM4. (2024). Manejo de fauna silvestre en marco de las obras de rehabilitación hidro sedimentológica CGSM. Contrato de obra lp-005-2023. “Mantenimiento y recuperación de las condiciones ambientales del complejo delta estuarino ciénaga grande de santa marta mediante la intervención de los cuerpos de agua y otras estrategias adicionales”. 19 P.

CORPAMAG (2021). Protocolo para el manejo de fauna silvestre en el marco de los proyectos de dragado en la Ciénaga Grande de Santa Marta-CGSM. 14p.

Gutiérrez-Pineda, K. M., Méndez-Carvajal, P. G., Gutiérrez-Pineda, K. M., & Méndez-Carvajal, P. G. (2021). Diversidad ecológica de aves en un hábitat fragmentado en la comunidad de Rincón Largo, Chiriquí, Panamá. *Huitzil*, *22*(1). https://doi.org/10.28947/hrmo.2021.22.1.492

Orias, J. V. (2010). *Uso de hábitat diferencial de aves playeras migratorias (Charadriiformes) en la costa oeste de la península de Nicoya, Costa Rica*.

Pastrana, A. A. (2015). *EQUIPO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE HIDRÁULICA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 0133*.

Villarreal, H., Umaña, A. M., Mendoza, H., & Gast, F. (2004). *MANUAL DE MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD*.

ANEXO 12

Informe de siembra.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATISTA:

Consorcio CGSM4
NIT. 901.782.967-1




CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME DE ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

NOVIEMBRE 2025.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Yurani Acevedo C.		
			
	Residente Ambiental		
Revisión	Ing. Yurani Acevedo C.		
			
	Residente Ambiental		
Aprobación	Ing. Ángel Vizcaino Escobar		
			
	Director de Proyecto		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e Ingeniería S.A.S	1		

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 4
2.1 Localización 4
2.2 Localización especifica 5
3. ACTIVIDADES EN CAMPO 6
4. HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS 9

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, suscribió con CONSORCIO CGSM4 el Contrato de Obra No. LP-005-2023 para realizar las obras de "*MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES*" Igualmente, celebró el Contrato de interventoría No. CM-008-2023 con INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S., para realizar la Interventoría al presente proyecto.

Dentro del alcance del contrato, se encuentra contemplado el "Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica", que contempla la siembra de individuos arbóreos en una extensión de 20 hectáreas. La actividad de siembra se realizará en la zona de intervención de la presente vigencia del contrato, específicamente en Caño Hondo, municipio de Pivijay, corregimiento de Carmen del Magdalena.

Esta estrategia implica la plantación de árboles y se utiliza principalmente cuando la sucesión natural de la vegetación se ve obstaculizada por ciertos factores, lo que requiere un apoyo o aceleración de este proceso. Entre los elementos que pueden dificultar el desarrollo de la sucesión vegetal se encuentran: la disponibilidad de agua, la distancia a fuentes de semillas, el uso histórico del suelo, la falta de fauna dispersora, entre otros. Por esta razón, la restauración activa mediante la plantación de árboles puede omitir algunas etapas del proceso sucesional, ayudando a recuperar gradualmente las funciones que el ecosistema tenía antes de las perturbaciones.

La restauración activa no se basa en plantar árboles de manera aleatoria, sino que es fundamental seleccionar adecuadamente las especies, la distancia de siembra, las condiciones del terreno y las prácticas silvícolas que se apliquen para asegurar el éxito del proceso. Las especies elegidas deben ser nativas y autóctonas de la región, ya que estas tienen una mejor adaptación. Además, la selección debe realizarse a partir del estudio de los ecosistemas de referencia cercanos, considerando las características particulares del lugar donde se realizará la siembra.

2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

2.1 Localización

La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), es el complejo lagunar más grande de Colombia con un área aproximada de 3.487 km2 de los cuales 73 corresponden al espejo de agua. Dentro de esta área se encuentran localizados la vía - Parque Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna. La CGSM está ubicada en el extremo noroccidental del Departamento del Magdalena, al norte del país y esta globalmente

comprendido entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio por el Sur, el río Magdalena por el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta. *(Estudios previos)*



Ilustración 1. Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta.

2.2 Localización especifica

Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir durante la vigencia del año 2025 es el Caño Hondo, localizado en inmediaciones del Municipio de Salamina (Magdalena).

El municipio de Salamina se localiza en Colombia, en el Departamento del Magdalena, pertenece a la región geográfica de la ciénaga Grande del Magdalena, fue fundado en 1765, se encuentra ubicado al Centro del departamento del Magdalena, localizado a los 10° 29`25" de latitud norte y 74° 47`38" de longitud al oeste de Greenwich, comprende una extensión de 175 Km2 que equivale al 0.75% del área departamental y al 0.015% del total nacional, su altura sobre el nivel del mar es de 3m, dista 173.3 Km con la ciudad de Santa Marta (Capital del Departamento) y a 75.5 Km del distrito de Barranquilla. Su relieve está caracterizado por poseer un territorio bajo plano y cenagoso, bañado por algunos caños convirtiéndose en una inmensa llanura de inundaciones que contienen depósitos de terraza aluvial generándose una terraza ligeramente inclinada.

Las actividades del componente de rehabilitación ecológica se llevarán a cabo en distintos predios del corregimiento de Carmen del Magdalena listados a continuación:

- La Tigra
- Betania
- Pasalobo
- Tosnovan
- La India 1
- La India 2
- El Descanso
- La Esmeralda
- Nueva Esperanza
- Monterrey

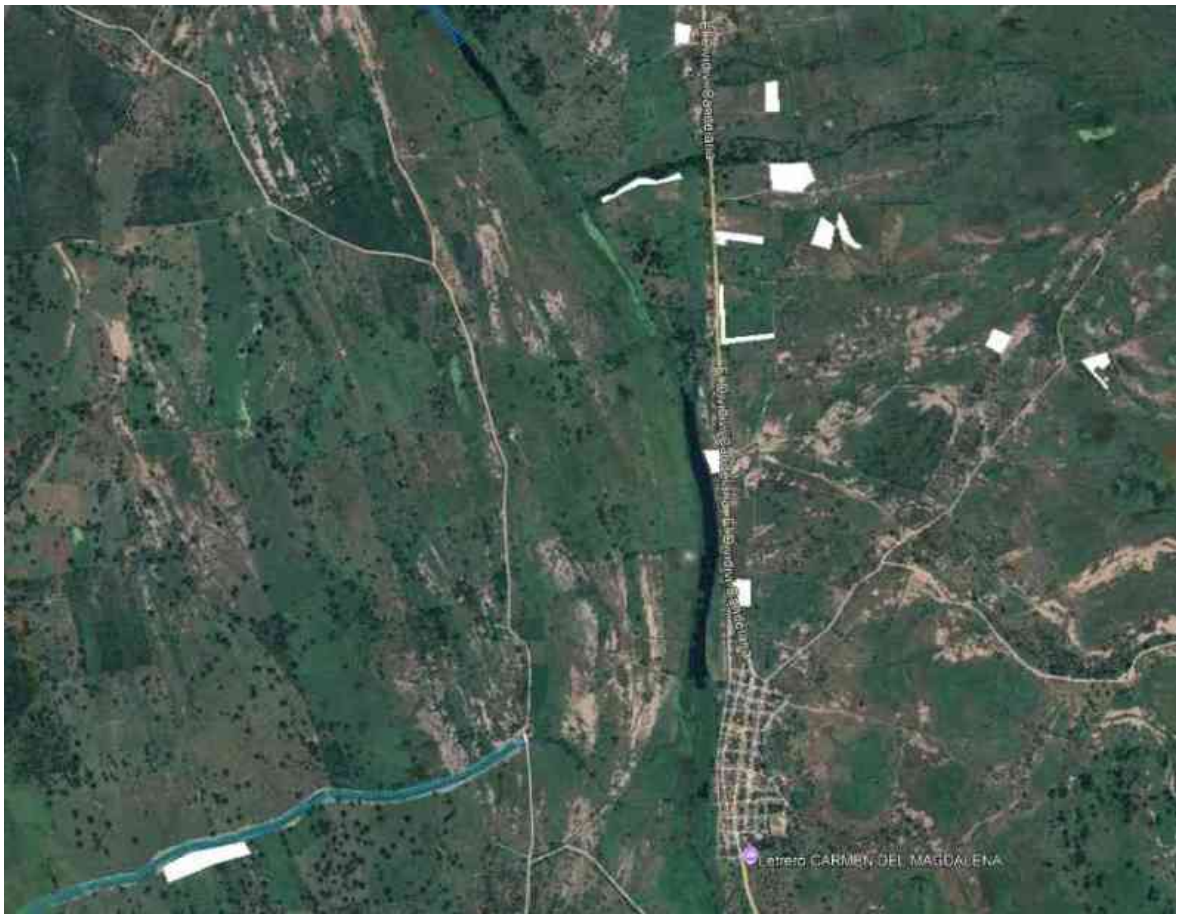


Ilustración 2. Polígonos seleccionados para la restauración ecológica

3. ACTIVIDADES EN CAMPO

Durante el periodo del mes de noviembre de 2025, el consorcio CGSM4 realizó las siguientes labores:

- ***Visita a predios:*** Se realizó visita a los predios para determinar el área del

cercado, también se estableció la manera como cada finca va a realizar el riego quedando encargados de esta labor el equipo de mantenimiento y el suministro del recurso hídrico por parte de los propietarios de cada finca.









- ***Actas de vecindad:*** se realiza acompañamiento al equipo de gestión social para la realización de las actas de vecindad y documentos pertinentes para formalizar el inicio de las actividades en cada finca.

- Material vegetal: se recibió material vegetal de las especies listadas a continuación, se reciben 3.486 especímenes en buen estado vegetativo,

altura superior a 50 cm y excelente condición fitosanitaria, se realizó labor de descargue de arboles en la finca La India 1. Adicionalmente se reciben 44 bultos de abono orgánico de 50 kg y 100 kg de hidroretenedor.

- Roble morado
- Cañahuate
- Campano
- Camajón
- Caracolí
- Bonga
- Ceiba blanca









4. HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS

Para el mes de noviembre se utilizaron las siguientes herramientas, insumos y equipos:

- Cinta métrica
- Material vegetal
- Abono orgánico
- Hidroretenedor
