MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME MENSUAL DE OBRA (FINAL)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 064-2025

OBJETO: “RECUPERACIÓN DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

CONTRATISTA:
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE CVS

PERIODO
29 DE NOVIEMBRE A 29 DE DICIEMBRE DE 2025

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades ejecutadas en el marco del proyecto que plantea obras de control de erosión basadas en la naturaleza en puntos críticos de la rivera del Rio Sinú que se adelanta en el municipio de Montería, Córdoba, cuyo objeto es el **"RECUPERACIÓN DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**. Esta intervención tiene como finalidad optimizar las condiciones de proyecto que plantea que se mejorarán las condiciones ambientales del sector, se mitigarán los eventos de inundación y se coadyuvará en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Montería específicamente en localizado entre los 8° 46' 10.899" y 75° 52' 45.971" de latitud norte, y los 8° 46' 10.451"y 75° 52' 31.850" de longitud oeste.

Con su ejecución, se espera optimizar la erosión fluvial en un punto crítico de erosión, mediante la rehabilitación de 1,1 hectáreas en bosque de galería equivalentes a 500 metros lineales.

Durante el periodo que abarca este informe, se ejecutaron las actividades de obra programadas conforme al cronograma establecido y en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Entre las principales labores desarrolladas, se resalta la recuperación de taludes con una primera línea de pasto vetiver (Chrysopogon zizanioides) con un promedio de 22.5 líneas, dentro de un área de 0,35, todo debidamente realizado según el diseño aprobado.

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de recuperación ambiental se llevará a cabo en el Municipio de Montería, localizado en la región Caribe de Colombia, dentro de la subregión de las Sabanas del departamento de Córdoba. El Municipio de Montería se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería, y en la misma vía a 9 kilómetros se encuentra el aeropuerto ‘’Los Garzones’’.

El municipio de Montería es la capital del departamento de Córdoba ubicada en el valle del río Sinú, uno de los territorios más fértiles del mundo; tiene una extensión de 3.043 km2, que representa el 12% del área del departamento. Su área rural (99% del municipio) se encuentra distribuida en 29 corregimientos y 168 veredas, mientras el área urbana la componen 9 comunas con 207 barrios1 . En materia de producción, es el municipio más representativo del departamento, su principal actividad económica es la ganadería bovina seguida por la agroindustria y la prestación de servicios.

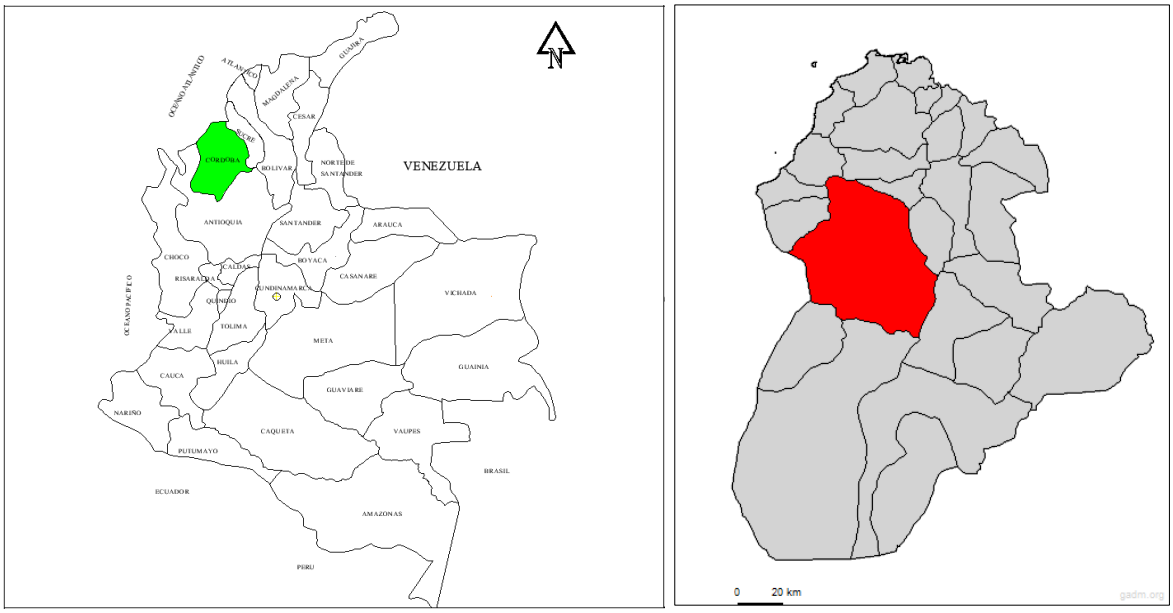


Ilustración 1 Localización general del proyecto.

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

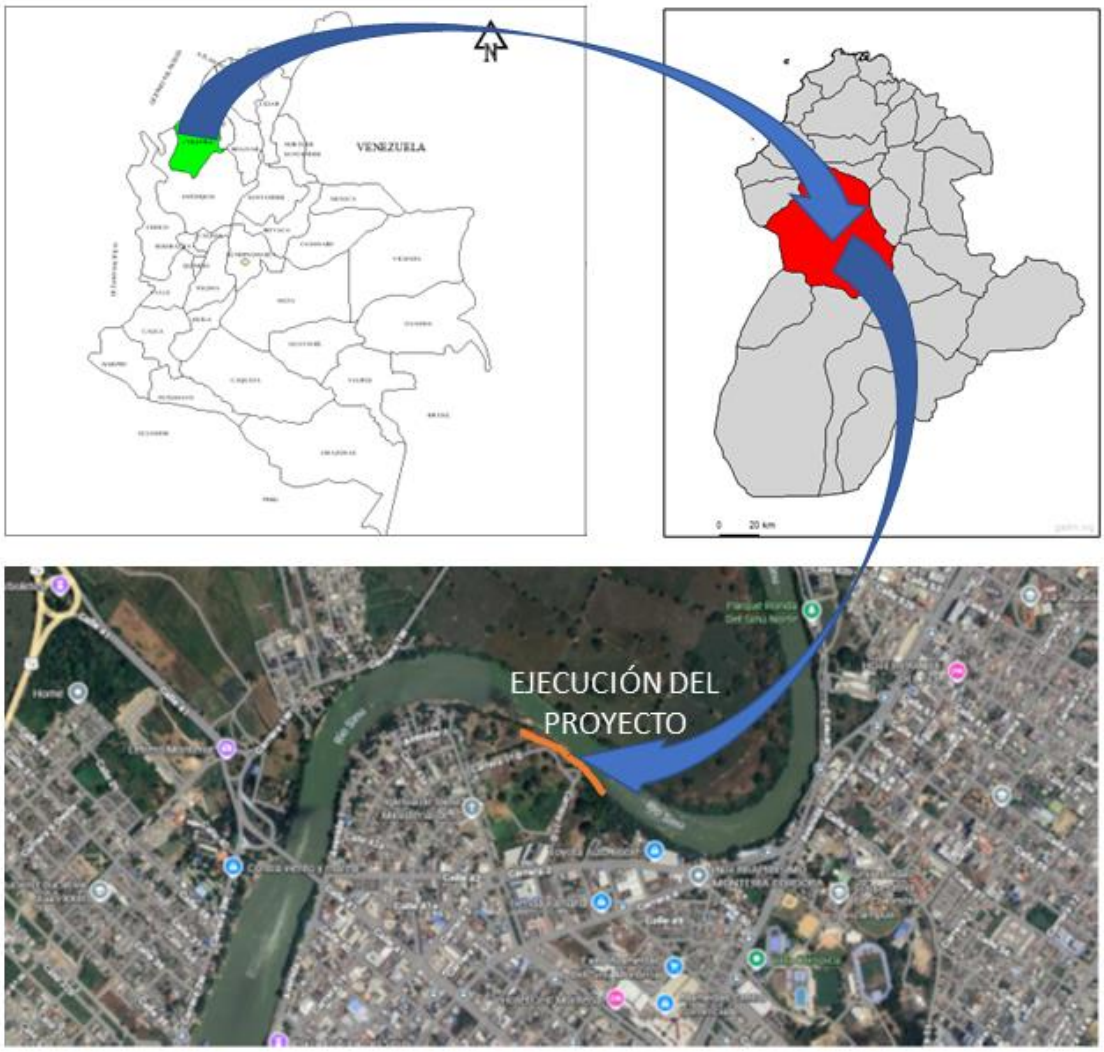


Ilustración 2 Localización especifica del proyecto.

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

ALCANCE DEL PROYECTO

Las tramos para intervenir con medidas para el control de la erosión fluvial en un punto crítico de erosión, mediante la rehabilitación de 1,1 hectáreas en bosque de galería equivalentes a 500 metros lineales, se muestra un resumen del alcance del proyecto de pavimentación a ejecutar.

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

Durante el mes de ejecución del proyecto, se logró la finalización en las actividades de obra contempladas en el cronograma, consolidando progresos importantes en la línea de pasto vetiver (Chrysopogon zizanioides) con un promedio de 22.5 líneas, dentro de un área de 0,35, Entre las labores más destacadas de este periodo se encuentran la siembra de esta plántula, actividad clave para asegurar la capacidad de soporte y estabilidad de la taludes.

Se realizo el establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Recuperación de taludes sobre la ladera de la margen derecha del rio Sinú en el barrio sucre en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba.

CONSERVACIÓN DE SUELOS

Esto se debe a que las raíces del vetiver crecen exclusivamente de manera vertical y alcanzan una profundidad de hasta 4 metros; con una resistencia a la tensión promedio de 75MPa = 765 Kgs/cm2, lo cual le convierte en un excelente estabilizador de bordes y terrazas, incrementando la resistencia al corte del suelo hasta en un 40%.

CONSERVACIÓN DE LAS AGUAS

Las raíces de vetiver al penetrar en el suelo, permiten que el agua sea más permeable; y penetre en los depósitos subterráneos para así conservarse y no perderse por escorrentía. Adicional a esto en sus raíces pueden crecer bacterias en condiciones aeróbicas y anaeróbicas que degradan la materia orgánica y descomponen los agentes contaminantes permitiendo estar disponibles a las raíces, el vetiver también se utiliza para la descontaminación de aguas industriales y domésticas, o en embalses mediante estructuras flotantes, recuperando así aguas servidas y evitando la contaminación.

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

El objeto del proyecto, se logrará mediante la recuperación de taludes sobre la ladera de la margen derecha del rio Sinú.

- Evitar inundaciones y el avance de la erosión hacia el área próxima al río.
- Incrementar la cultura ambiental de las comunidades.
- Busca aportar al desarrollo económico-social, al desarrollo sostenible y a fortalecer la gobernanza alrededor del agua, mediante la planificación territorial lo que permita construir comunidades más educadas, menos vulnerables y más resilientes que minimicen la creación de nuevas condiciones de riesgo y usos inadecuados de la tierra

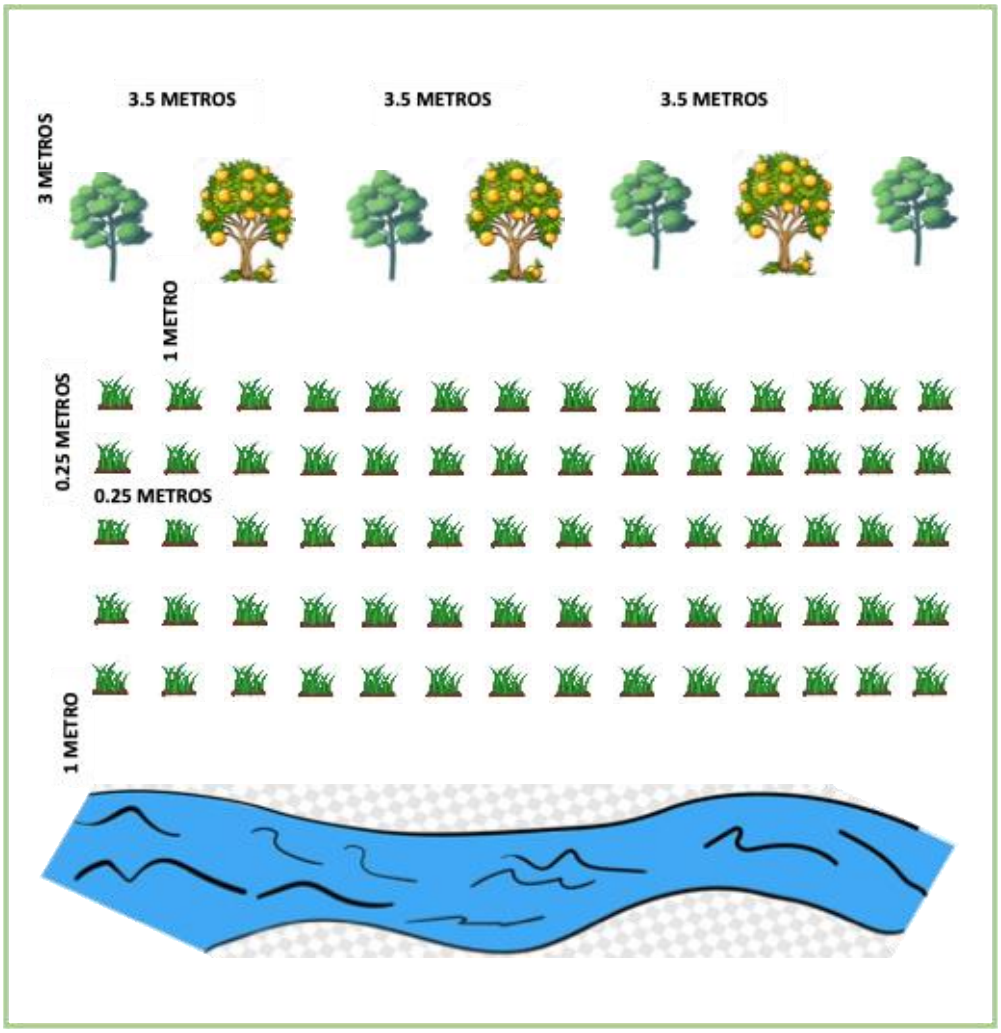


Ilustración 3 Diseño esquema del proyecto

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

PRESUPUESTO DE OBRA Y ACTIVIDADES A EJECUTAR

A continuación, se presentan las actividades a ejecutar en el proyecto de "**RECUPERACIÓN DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** son las siguientes:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Total
1	Realizar establecimiento de franjas protectoras de pasto Vetiver para la estabilización de talud a mediano plazo	Und	44.000,0	1.182,0	52.008.000,0
2	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	Und	160,0	5.019,0	803.040,0
3	Realizar establecimiento de árboles frutales, para el amortiguamiento y atracción de fauna Silvestre	Und	160,0	29.835,0	4.773.600,0
3	Realizar aislamiento del arreglo de bioingeniería - SbN	m	500,0	35.250,0	17.625.000,0

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

- **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

CONTRATO No:	***064 DE 2025.***
OBJETO:	*RECUPERACIÓN DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.*
VALOR:	*NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE ($98.487.024)*
PLAZO DE EJECUCIÒN:	*DOS (02) MESES*
CONTRATANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE – CVS*
CONTRATISTA:	*MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.*
FECHA DE INICIO	*29 DE OCTUBRE DE 2025*

Tabla 3 Información general del contrato

- **RELACIÓN DEL PERSONAL**

A continuación, se presenta el personal profesional del contratista, relacionados exigido para la ejecución del proyecto de acuerdo con los pliegos de condiciones entregados por la entidad contratante:

DESCIPCION	NOMBRE	DEDICACIÓN
RESIDENTE DE OBRA	JHORNAL PAOL PADILLA BAUTISTA	100%
AYUDANDE DE OBRA	JORGE LUIS ORTIZ TABORDA	100%
AYUDANDE DE OBRA	YAMITH VASQUEZ VIDAL ANTONIO	100%

Tabla 4 Relación de personal

GARANTIAS DEL CONTRATO

- **GARANTIA SEGÚN CONTRATO DE OBRA**

A continuación, se relaciona las pólizas expedidas de acuerdo con las exigencias del contrato de obra:

N° de póliza	Cumplimiento	5344101041407	
	Responsabilidad civil extracontractual	5340101013598	
Riesgo	**Valor Asegurado**	**Vigencia DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$ 9.848.702,40	28/10/2025	01/07/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$39.394.809,60	28/10/2025	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	$ 9.848.702,40	28/10/2025	30/12/2028
Estabilidad y calidad de las obras	$ 9.848.702,40	Vigencia de2 años 0 Meses 0 Dias.	
Responsabilidad civil extracontractual	$ 284.700.000	28/10/2025	31/12/2025
Daño emergente y lucro cesante	$ 284.700.000	28/10/2025	31/12/2025

Perjuicios extrapatrimoniales	$ 284.700.000	28/10/2025	31/12/2025

Tabla 5 Pólizas según contrato de obra

- **GARANTIA SEGÚN ACTA DE INICIO**

A continuación, se relaciona las pólizas expedidas de acuerdo con las exigencias del contrato de obra:

N° de póliza	Cumplimiento	5344101041407	
	Responsabilidad civil extracontractual	5340101013598	
Riesgo	**Valor Asegurado**	**Vigencia DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$ 9.848.702,40	29/10/2025	02/07/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$39.394.809,60	29/10/2025	01/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	$ 9.848.702,40	29/10/2025	01/01/2029
Estabilidad y calidad de las obras	$ 9.848.702,40	Vigencia de2 años 0 Meses 0 Dias.	
Responsabilidad civil extracontractual	$ 284.700.000	29/10/2025	01/01/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 284.700.000	29/10/2025	01/01/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 284.700.000	29/10/2025	01/01/2026

Tabla 5 Pólizas según acta de incio

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

CRONOGRAMA DE OBRA

A continuación, se presenta la programación para la ejecución de las actividades contempladas para el presente proyecto:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES											
Item	Descripción	SEMANAS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	SEMENAS	%
1	Realizar establecimiento de franjas protectoras de pasto Vetiver para la estabilización de talud a mediano plazo									5	38,46
2	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería									3	23,08
3	Realizar establecimiento de árboles frutales, para el amortiguamiento y atracción de fauna Silvestre									3	23,08
4	Realizar aislamiento del arreglo de bioingeniería - SbN									2	15,38
									TOTAL:	13	100,00

AVANCE DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre Al 29 de diciembre, el contratista ejecuto el **100%** de avance representado financieramente en **$ 98.487.024** se presentan a continuación las actividades ejecutadas:


- **LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO**

se procede a realizar el trazado para, verificar que cumpla con las cotas, pendientes especificadas en los documentos del proyecto. Posteriormente, se procedió con la

- **RECUPERACIÓN DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

Limpieza y siembra del establecimiento de franjas protectoras de pasto Vetiver para la estabilización de talud a mediano plazo.
Siembra de arboles maderables y frutales
Antes de intervenir se realizan:
Retiro de vegetación, maleza y arbustos.
Extracción de basura, escombros y sedimentos sueltos.
Retiro de obstrucciones naturales (troncos, ramas, piedras).
Delimitar con cerramiento.
Objetivo: permitir el acceso y definir el trazo para la siembra de vetiver.
Objetivo hidráulico:
Obtener un flujo más uniforme.
Reducir pérdidas por fricción.
Evitar socavaciones locales y deslizamientos.

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

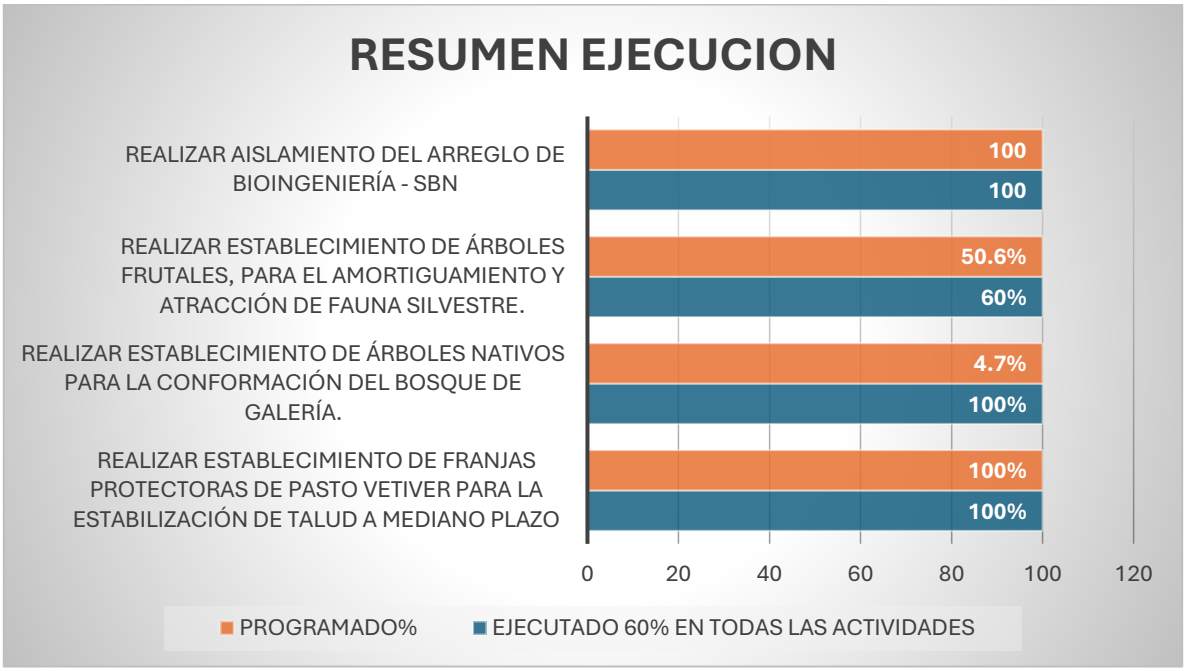

INDICADORES DE SEGUIMIENTO PERIODO

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S







Ilustración 1 antes de la intervención

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S





MGD CONSTRUCCIONES S.A.S





MGD CONSTRUCCIONES S.A.S





MGD CONSTRUCCIONES S.A.S





MGD CONSTRUCCIONES S.A.S





MGD CONSTRUCCIONES S.A.S



Ilustración 2 durante la intervención

MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

CONCLUSIONES

- El día 29 de Octubre de 2025 se realizó suscripción del acta de inicio, de esta manera iniciando el proyecto de mejoramiento.
- Nos encontramos al día con el pago de la planilla de seguridad social del personal.
- En la semana 1 después del inicio del proyecto se arrancó con la demarcación y cerramiento del proyecto en cerca de alambre de púas.
- En la semana 2 se hizo el establecimiento de franjas protectoras de pasto Vetiver en un tramo de 200 mtos lineales.
- En la semana 3 se continuo con el establecimiento de franjas protectoras de pasto Vetiver hasta alcanzar un área de 400 mts lineales.
- En la semana 4 se terminaron de instalar el establecimiento de franjas protectoras de pasto Vetiver y se inició con la demarcación para la siembra de árboles nativos para la conformación y de árboles frutales, para el amortiguamiento y atracción de fauna Silvestre.
- Se finalizo con la actividad de siembra de vetiver.
- En la semana 5 se dio inicio con la siembra de árboles nativos para la conformación y de árboles frutales, para el amortiguamiento y atracción de fauna Silvestre.
- En la semana 6 se finalizó la siembra de árboles nativos para la conformación y de árboles frutales y se precede con la finalización y organización de aislamiento del arreglo de bioingeniería .
- Avance de obra del **100%** de avance representado financieramente en **$ 98.487.024**

FIRMA: 

Nombre del proponente o de su Representante Legal: DIANA CAROLINA VIEIRA CANO
C. C. No. 50.937.471 de Montería – Córdoba.
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit: 901715611-8

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901715611	8	MGD CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	CL 71 NO 3-63	MONTERIA-CORDOBA	3133915241	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1000000717	9497875254	E	2025/12/03	2026/01/14	BANCO DE BOGOTA	41	$151,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SEDE CVS 2 (2 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,200		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE CVS 2 (2 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,200		$0	$0
1	CC	1063277913 ORTIZ TABORDA JORGE LUIS	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
2	CC	72428757 VIDAL VASQUEZ YAMITH ANTONIO	230301	5	$237,250	$38,000	EPS010	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
Total Afiliados(2)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$76,000	$2,000	$0	$78,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$76,000	$2,000	$0	$78,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$33,200	$900	$0	$34,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$33,200	$900	$0	$34,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$19,000	$500	$0	$19,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$19,000	$500	$0	$19,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$19,000	$600	$0	$19,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$9,500	$300	$0	$9,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$9,500	$300	$0	$9,800
TOTAL				**2**	**$147,200**	**$4,000**	**$0**	**$151,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901715611	8	MGD CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	CL 71 NO 3-63	MONTERIA-CORDOBA	3133915241	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SEDE CVS 2 (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$174,000		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE CVS 2 (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$174,000		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$174,000		$0	$0
1	CC	78032383 PADILLA BAUTISTA JHORNAL PAOL	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS041	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$174,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2002964082	9496319678	E	2025/12/03	2025/12/12	NEQUI	9	$778,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$2,300	$0	$402,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$2,300	$0	$402,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$174,000	$1,000	$0	$175,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$174,000	$1,000	$0	$175,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,000	$600	$0	$100,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$100,000	$600	$0	$100,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,000	$600	$0	$100,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$600	$0	$100,600
TOTAL				**1**	**$774,000**	**$4,500**	**$0**	**$778,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901715611	8	MGD CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	CL 71 NO 3-63	MONTERIA-CORDOBA	3133915241	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	1000000323	9497896389	E	2026/01/06	2026/01/15	BANCO DE BOGOTA	9	$148,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SEDE CVS 2 (2 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,200		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE CVS 2 (2 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,200		$0	$0
1	CC	1063277913 ORTIZ JORGE	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
2	CC	72428757 VIDAL YAMITH	230301	5	$237,250	$38,000	EPS010	5	$237,250	$9,500	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
Total Afiliados(2)					$474,500	$76,000			$474,500	$19,000			$474,500	$19,000			$474,500	$33,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$76,000	$500	$0	$76,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$76,000	$500	$0	$76,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$33,200	$200	$0	$33,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$33,200	$200	$0	$33,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$19,000	$200	$0	$19,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$19,000	$200	$0	$19,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$19,000	$200	$0	$19,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$9,500	$100	$0	$9,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$9,500	$100	$0	$9,600
TOTAL				**2**	**$147,200**	**$1,100**	**$0**	**$148,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901715611	8	MGD CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	CL 71 NO 3-63	MONTERIA-CORDOBA	3133915241	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SEDE CVS 2 (1 Afiliados)					$916,667	$146,700			$916,667	$36,700			$916,667	$36,700			$916,667	$63,900		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE CVS 2 (1 Afiliados)					$916,667	$146,700			$916,667	$36,700			$916,667	$36,700			$916,667	$63,900		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$916,667	$146,700			$916,667	$36,700			$916,667	$36,700			$916,667	$63,900		$0	$0
1	CC 78032383	PADILLA BAUTISTA JHORNAL PAOL	230301	11	$916,667	$146,700	EPS041	11	$916,667	$36,700	CCF16	11	$916,667	$36,700	14-11	11	$916,667	$63,900	11	$0	$0
Total Afiliados(1)					$916,667	$146,700			$916,667	$36,700			$916,667	$36,700			$916,667	$63,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2012740558	9496427723	E	2026/01/06	2025/12/16	NEQUI	0	$284,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$146,700	$0	$0	$146,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$146,700	$0	$0	$146,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,900	$0	$0	$63,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$63,900	$0	$0	$63,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,700	$0	$0	$36,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$36,700	$0	$0	$36,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,700	$0	$0	$36,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,700	$0	$0	$36,700
TOTAL				**1**	**$284,000**	**$0**	**$0**	**$284,000**

CONTRATO No:	064 DE 2025.
OBJETO:	RECUPERACIÓN DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR:	NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE ($98.487.024)
PLAZO DE EJECUCIÒN:	DOS (02) MESES
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE – CVS
CONTRATISTA:	MGD CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	KARLA TATIANA FRANCO USTA
REGISTRO PRESUPUESTAL:	591 DE 28 DE OCTUBRE DE 2025
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLIZAS:	1312 DE 29 DE OCTUBRE DE 2025
PORCENTAJE ANTICIPO:	CUARENTA POR CIENTO (40%)
VALOR DEL ANTICIPO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($39.394.809)
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO	NO APLICA
FECHA DE INICIO	29 DE OCTUBRE DE 2025

En Montería, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: **DIANA CAROLINA VIEIRA CANO**, identificada con CC. No 50.937.471 quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **MGD CONSTRUCCIONES S.A.S** y **KARLA TATIANA FRANCO USTA**, identificada con CC. No 25.878.797, quien actúa en calidad de supervisora, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y efectiva del contrato de la referencia.

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
ANTICIPO	28/10/2025	30/06/2026	$39.394.809,60
CUMPLIMIENTO	28/10/2025	01/07/2026	$9.848.702,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	28/10/2025	31/12/2028	$9.848.702,40
ESTABILIDAD DE OBRA	28/12/2025	28/12/2027	$9.848.702,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/10/2025	31/12/2025	$284.700.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	N.A.	N.A.	N.A.
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	N.A.	N.A.	N.A.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Diana C. Vieira Ca.

DIANA CAROLINA VIEIRA CANO
Rep. Legal MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

KARLA TATIANA FRANCO USTA
Supervisora CVS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Item	Descripción	SEMANAS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	SEMENAS	%
1	Realizar establecimiento de franjas protectoras de pasto Vetiver para la estabilización de talud a mediano plazo									5	38,46
2	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería									3	23,08
3	Realizar establecimiento de árboles frutales, para el amortiguamiento y atracción de fauna Silvestre									3	23,08
4	Realizar aislamiento del arreglo de bioingeniería - SbN									2	15,38
									TOTAL:	13	100,00

CUADRO DE CADENA DE VALOR DE PROYECTO - CONTRATO DE OBRA 064 DE 2025

OBJETO: RECUPERACIÓN DE PUNTO CRITICO DE EROSIÓN FLUVIAL EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ, MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	**CONTRATANTE:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS
CONTRATISTA: MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.	**INCIO DE OBRA:** 29 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO						CANTIDADES EJECUTADAS A 31 DE OCTUBRE DE 2025	% AVANCE POR ACTIVIDAD
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**V. Unitario**	**V. Total**	**Valor**	**%**
1	Realizar establecimiento de franjas protectoras de pasto Vetiver para la estabilización de talud a mediano plazo	Und	44.000,0	1.182,0	52.008.000,0	0,00	0%
2	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	Und	160,0	5.019,0	803.040,0	0,00	0%
3	Realizar establecimiento de árboles frutales, para el amortiguamiento y atracción de fauna Silvestre	Und	160,0	29.835,0	4.773.600,0	0,00	0%
4	Realizar aislamiento del arreglo de bioingeniería - SbN	m	500,0	35.250,0	17.625.000,0	0,00	0%
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**75.209.640,0**		
				ADMINISTRACION **24%**	**18.050.314,0**		
				IMPREVISTO **1%**	**752.096,0**		
				UTILIDAD **5%**	**3.760.482,0**		
				IVA SOBRE UTILIDAD	**714.492,0**		
				TOTAL OBRAS	**98.487.024,0**	**% DE AVANCE GLOBAL**	**0%**

CVS	**ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD**	**MGD CONSTRUCCIONES S.A.S**

CONTRATO No:	**064 DE 2025.**
OBJETO:	**"RECUPERACIÓN DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.".**
VALOR:	**NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE ($98.487.024)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOS (2) MESES.**
CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS.**
CONTRATISTA:	**MGD CONSTRUCCIONES S.A.S**
SUPERVISOR:	**KARLA TATIANA FRANCO**
FECHA DE INICIO:	**29 DE OCTUBRE DE 2025.**

En el municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los 11 días del mes de Diciembre de 2025, siendo las 02:00 pm horas, se reúne la comunidad beneficiaria, autoridades locales y los responsables de la ejecución del proyecto, con el fin de formalizar la entrega de la obra titulada **" RECUPERACIÓN DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA "**, que se ha ejecutado dentro del marco del contrato N° 064-2025

1. Descripción de la obra

El objeto de la obra consistió en la ejecución de trabajos de recuperación ambiental y restauración ecosistémica de un tramo del rio Sinú, ubicado en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba. Esta intervención incluyó actividades de Limpieza y siembra del establecimiento de franjas protectoras de pasto Vetiver para la estabilización de talud a mediano plazo, Siembra de árboles maderables y frutales.

2. Cumplimiento de plazos y actividades

La obra fue ejecutada dentro de los plazos establecidos en el contrato, iniciando el 24 de octubre de 2025 y finalizando satisfactoriamente el 10 de diciembre de 2025. Durante este período, se llevaron a cabo todas las actividades contempladas en el proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y condiciones establecidas, garantizando así el cumplimiento total del contrato y la calidad de la obra.

3. Recepción por la comunidad

Una vez finalizados los trabajos de recuperación ambiental, se procede a la entrega oficial de la obra a la comunidad, la cual ha sido debidamente informada y consultada sobre el desarrollo y los resultados de la misma. Los miembros de la comunidad, presentes en este acto, expresan su satisfacción con los trabajos realizados, confirmando que las intervenciones ejecutadas cumplen con sus expectativas y benefician directamente al entorno natural y a las condiciones ambientales de la región.

4. Conclusiones

Conforme a lo anterior, se deja constancia de que la obra se ha entregado de manera satisfactoria a la comunidad, quedando oficialmente culminada y operativa. La comunidad se compromete a cuidar y preservar las acciones de Recuperación de taludes sobre la ladera de la margen derecha del rio Sinú en el barrio sucre en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, con el apoyo de las autoridades locales y el seguimiento continuo a las condiciones ambientales del área.

La presente acta se firma a los once (11) días del mes de Diciembre 2025.

CVS	**ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD**	**MGD CONSTRUCCIONES S.A.S**

Diana C. Vieira Ca.

DIANA CAROLINA VIEIRA CANO
Representante legal
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista

COMUNIDAD

NOMBRE	Roberto Cuzo Perez
CC	50 920 374
FIRMA	
CARGO	Presidente Vocal.

NOMBRE	Manuel Suarez Suarez
CC	78.709.013
FIRMA	
CARGO	Delegado Principal Vocal.

CVS	ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD	MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE	Saskia Barrera González
CC	1067952469
FIRMA	Saskia Barrera
CARGO	

NOMBRE	Cecilia Mejía H.
CC	34923395
FIRMA	
CARGO	

NOMBRE	Yanine Díaz Gaviria
CC	1002998435
FIRMA	Yanine Díaz
CARGO	

NOMBRE	Delver Barrera Durango
CC	78715107.
FIRMA	
CARGO	

NOMBRE	Brandon Barrera G
CC	100 33 98 325
FIRMA	Brandon BG
CARGO	

NOMBRE	Luis Cases
CC	1067943842
FIRMA	Luis Cases
CARGO	

NOMBRE	Yaci Díaz García
CC	1067941749.
FIRMA	Yaci Díaz G.
CARGO	

NOMBRE	Aurora Díaz
CC	50.891.825
FIRMA	Aurora Díaz
CARGO	

NOMBRE	Josua Barrera González
CC	1003049361
FIRMA	
CARGO	

NOMBRE	Ana chaguer espitia
CC	34962286
FIRMA	Ana chaguer
CARGO	

CVS	ACTA DE RECIBO DE LA COMUNIDAD	MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE	Yeison Navarro Arrieta
CC	1099993466
FIRMA	Yeison Navarro
CARGO	

NOMBRE	
CC	
FIRMA	
CARGO	

NOMBRE	Yina Gaviria Cavavera
CC	1067842959
FIRMA	YINA GAVIRIA
CARGO	

NOMBRE	
CC	
FIRMA	
CARGO	

NOMBRE	Dayanis Diaz Garcia
CC	1067938156
FIRMA	Dayanis Diaz
CARGO	

NOMBRE	
CC	
FIRMA	
CARGO	

NOMBRE	Fernando Diaz Pineda
CC	1003400208
FIRMA	
CARGO	

NOMBRE	
CC	
FIRMA	
CARGO	

NOMBRE	YURANIS Melendez
CC	1069474431
FIRMA	Yuranis Melendez.
CARGO	

NOMBRE	
CC	
FIRMA	
CARGO	

NOMBRE	
CC	
FIRMA	
CARGO	

NOMBRE	
CC	
FIRMA	
CARGO	

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101041407	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	10	2025	28	10	2025	00:00	31	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT: 901.715.611-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 71 NRO. 3 - 63	MONTERIA, CORDOBA	3163915241

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION	NIT: 891.000.627-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	MONTERIA, CORDOBA	7829950

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A RECUPERACION DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA NO. 064 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS Y MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/10/2025	01/07/2026	$9,848,702.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	28/10/2025	30/06/2026	$39,394,809.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/10/2025	31/12/2028	$9,848,702.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$9,848,702.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****213,601.00	$ *******8,000.00	$ ******42,104.00	$ **********263,705.00	$ *******68,940,916.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101041407

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Diana C. Vivaco

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 64037353

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	29/10/2025	174376	AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA

Tomador:	MGD CONSTRUCCIONES S.A.S	**NIT/CC** 901715611
Suma de:	CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.******	
Pagador:	LEVIS CORDERO	**NIT/CC** 1066737813
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #809193424	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
53-AGENCIA MONTERIA-40-RCE CONTRATOS-101013598-0-1	$124.800,00	$3.000,00	$24.282,00	$0,00	$152.082,00
53-AGENCIA MONTERIA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101041407-0-1	$213.601,20	$8.000,00	$42.104,23	$0,00	$263.705,43

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$415.787,00
APROVECHAMIENTOS	$-0,43

Forma de pago		
AHORRO	**Ahorro:**	$415.787,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 17625047	**Total:**	**$415.787,00**
	Cajero:	PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101013598	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	10	2025	28	10	2025	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT: 901.715.611-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 71 NRO. 3 - 63	MONTERIA, CORDOBA	3163915241

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION	NIT: 891.000.627-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	MONTERIA, CORDOBA	7829950

BENEFICIARIO: 891000627 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A RECUPERACION DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA NO. 064 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS Y MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.

ASEGURADOS: MGD CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT: 901.715.611-8 Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE -CVS-, NIT: 891.000.627-0.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE -CVS-, NIT: 891.000.627-0.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****124,800.00	$ *******3,000.00	$ ******24,282.00	$ ***********152,082.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101013598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Diana C. Vicuña

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101013598	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	10	2025	28	10	2025	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MGD CONSTRUCCIONES S.A.S		**NIT: 901.715.611-8**
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 3 - 63	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3163915241

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION		**NIT: 891.000.627-0**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7829950

BENEFICIARIO: 891000627 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/10/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101013598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Diana C. Vivaco

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 64037353

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	29/10/2025	174376	AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA

Tomador:	MGD CONSTRUCCIONES S.A.S	**NIT/CC** 901715611
Suma de:	CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.******	
Pagador:	LEVIS CORDERO	**NIT/CC** 1066737813
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #809193424	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
53-AGENCIA MONTERIA-40-RCE CONTRATOS-101013598-0-1	$124.800,00	$3.000,00	$24.282,00	$0,00	$152.082,00
53-AGENCIA MONTERIA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101041407-0-1	$213.601,20	$8.000,00	$42.104,23	$0,00	$263.705,43

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$415.787,00
APROVECHAMIENTOS	$-0,43

Forma de pago		
AHORRO	**Ahorro:**	$415.787,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 17625047	**Total:**	**$415.787,00**
	Cajero:	PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101041407	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	12	2025	29	10	2025	00:00	01	01	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MGD CONSTRUCCIONES S.A.S		NIT: 901.715.611-8
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 3 - 63	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO: 3163915241

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION		NIT: 891.000.627-0
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO 7829950

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A RECUPERACION DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA NO. 064 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS Y MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2025	02/07/2026	$9,848,702.40	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	29/10/2025	01/07/2026	$39,394,809.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2025	01/01/2029	$9,848,702.40	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y -1 DÍAS ***		$9,848,702.40	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS CITADAS, SEGUN ACTA DE INICIO DE 29 DE OCTUBRE DE 2025.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****213,601.00	$ *******8,000.00	$ ******42,104.00	$ **********263,705.00	$ *******68,940,916.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101041407

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Diana C. Vigiaco

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101041407	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	12	2025	29	10	2025	00:00	01	01	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S			**NIT: 901.715.611-8**
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 3 - 63	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3163915241

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION			**NIT: 891.000.627-0**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7829950

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101041407

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101013598	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	12	2025	29	10	2025	00:00	01	01	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MGD CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT: 901.715.611-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 71 NRO. 3 - 63	MONTERIA, CORDOBA	3163915241

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION	NIT: 891.000.627-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	MONTERIA, CORDOBA	7829950

BENEFICIARIO: 891000627 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A RECUPERACION DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SINU EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA NO. 064 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS Y MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.

ASEGURADOS: MGD CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT: 901.715.611-8 Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE -CVS-, NIT: 891.000.627-0.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE -CVS-, NIT: 891.000.627-0.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/10/2025**	**01/01/2026**	**$284,700,000.00**	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/10/2025**	**01/01/2026**	**$284,700,000.00**	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**29/10/2025**	**01/01/2026**	**$284,700,000.00**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS CITADAS, SEGUN ACTA DE INICIO DE 29 DE OCTUBRE DE 2025.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****124,800.00	$ *******3,000.00	$ ******24,282.00	$ ***********152,082.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101013598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Diana C. Vizcaíno

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101013598	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	12	2025	29	10	2025	00:00	01	01	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MGD CONSTRUCCIONES S.A.S		**NIT: 901.715.611-8**
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 3 - 63	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3163915241

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION		**NIT: 891.000.627-0**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7829950

BENEFICIARIO: 891000627 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2025	01/01/2026	$284,700,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2025	01/01/2026	$284,700,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2025	01/01/2026	$284,700,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101013598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101013598	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	12	2025	29	10	2025	00:00	01	01	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MGD CONSTRUCCIONES S.A.S		**NIT: 901.715.611-8**
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 3 - 63	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3163915241

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION		**NIT: 891.000.627-0**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7829950

BENEFICIARIO: 891000627 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101013598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
