	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA 16/07/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO — ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [x]

POR CONTRATO ADICIONAL [ ] No. ____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS — PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024 — FECHA DE VENC ACTUAL: 31/07/2026

FECHA DE SUSPENSION: N.A — FECHA DE REANUDACION: N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 — VALOR ADIC (incl IVA)(B): $26.702.325.739,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 197.300.514.579,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4 - Periodo: Junio de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 2			PRESENTES						
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	150,00	$ 489.701,00	$ 73.455.150,00	+	150,03	$ 73.469.841,00			$ -	-	$ -	150,03	$ 73.469.841,00
2	200.2.1P	11601		200.2.1P	Limpieza a mano de alcantarillas	m	1.820,00	$ 27.347,00	$ 49.771.540,00	+	1.820,00	$ 49.771.540,00			$ -	-	$ -	1.820,00	$ 49.771.540,00
3	201.7	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	1.567,00	$ 187.085,00	$ 293.162.195,00	+	1.733,30	$ 324.274.431,00			$ -	272,00	$ 50.887.120,00	1.733,30	$ 324.274.431,00
4	201.15	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	1.017,00	$ 95.882,00	$ 97.511.994,00	+	1.017,00	$ 97.511.994,00			$ -	16,80	$ 1.610.818,00	1.017,00	$ 97.511.994,00
5	201.16	11601	201 - 22		Remoción de cercas de alambre	m	20.515,00	$ 2.618,00	$ 53.708.270,00	+	20.515,00	$ 53.708.270,00			$ -	-	$ -	20.515,00	$ 53.708.270,00
6	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	22.480,00	$ 57.148,00	$ 1.284.687.040,00	+	42.480,00	$ 2.427.647.040,00			$ -	-	$ -	42.480,00	$ 2.427.647.040,00
7	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	228.389,00	$ 15.722,00	$ 3.590.731.858,00	+	628.389,00	$ 9.879.531.858,00			$ -	13.307,00	$ 209.212.654,00	628.389,00	$ 9.879.531.858,00
8	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	69.337,00	$ 17.674,00	$ 1.225.462.138,00	+	102.612,00	$ 1.813.564.488,00	-	(112,00)	-$ 1.979.488,00	23.711,00	$ 419.068.214,00	102.500,00	$ 1.811.585.000,00
9	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	50.366,00	$ 17.711,00	$ 892.032.226,00	+	50.366,00	$ 892.032.226,00			$ -	-	$ -	50.366,00	$ 892.032.226,00
10	230.1P	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, incluye el suministro y transporte del material de mejoramiento	m3	10.810,00	$ 162.014,00	$ 1.751.371.340,00	+	10.810,00	$ 1.751.371.340,00			$ -	2.144,40	$ 347.422.822,00	10.810,00	$ 1.751.371.340,00
11	231.1.2	11601	231 - 22		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	67.519,00	$ 10.806,00	$ 729.610.314,00	+	67.519,00	$ 729.610.314,00			$ -	-	$ -	67.519,00	$ 729.610.314,00
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 10.041.504.065,00**		-	**$ 18.092.493.342,00**			**($ 1.979.488,00)**		**$ 1.028.201.628,00**	-	**$ 18.090.513.854,00**
12	310.1	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	$ 1.591,00	$ 55.685.000,00	+	35.000,00	$ 55.685.000,00			$ -	2.495,00	$ 3.969.545,00	35.000,00	$ 55.685.000,00
13	311.1	11602	311 - 22		Afirmado	m3	16.216,00	$ 176.694,00	$ 2.865.269.904,00	+	16.216,00	$ 2.865.269.904,00			$ -	588,20	$ 103.931.411,00	16.216,00	$ 2.865.269.904,00
14	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	11.500,00	$ 218.897,00	$ 2.517.315.500,00	+	12.307,20	$ 2.694.009.158,00	-	(3.000,00)	-$ 656.691.000,00	4.405,00	$ 964.241.285,00	9.307,20	$ 2.037.318.158,00
15	330.1.1	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	12.000,00	$ 224.932,00	$ 2.699.184.000,00	+	12.491,20	$ 2.809.670.598,00	-	(4.447,00)	-$ 1.000.272.604,00	-	$ -	8.044,20	$ 1.809.397.994,00
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8.137.454.404,00**			**$ 8.424.634.660,00**			**($ 1.656.963.604,00)**		**$ 1.072.142.241,00**		**$ 6.767.671.056,00**
16	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	84.000,00	$ 4.447,00	$ 373.548.000,00	+	190.810,00	$ 848.532.070,00	-	(2.433,03)	-$ 10.819.684,00	87.578,00	$ 389.459.366,00	188.376,97	$ 837.712.386,00
17	420.1P	11603		420.1P	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	m2	52.500,00	$ 7.782,00	$ 408.555.000,00	+	52.635,00	$ 409.605.570,00			$ -	4.192,00	$ 32.622.144,00	52.635,00	$ 409.605.570,00
18	450.2P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	6.720,00	$ 1.350.660,00	$ 9.076.435.200,00	+	8.238,80	$ 11.127.817.608,00	-	(4.930,00)	-$ 6.658.753.800,00	2.644,00	$ 3.571.145.040,00	3.308,80	$ 4.469.063.808,00
19	450.4P	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	6.720,00	$ 1.199.993,00	$ 8.063.952.960,00	+	8.976,60	$ 10.771.857.164,00	-	(3.976,60)	-$ 4.771.892.164,00	4.650,00	$ 5.579.967.450,00	5.000,00	$ 5.999.965.000,00
20	450.14P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	2.250,00	$ 1.363.708,00	$ 3.068.343.000,00	+	2.250,00	$ 3.068.343.000,00	-	(1.000,00)	-$ 1.363.708.000,00	-	$ -	1.250,00	$ 1.704.635.000,00
21	460.1P	11603		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.960,00	$ 84.670,00	$ 165.953.200,00	+	2.710,00	$ 229.455.700,00	+	3.200,00	$ 270.944.000,00	1.954,00	$ 165.445.180,00	5.910,00	$ 500.399.700,00
22	465.1	11603	465 - 22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	5.600,00	$ 88.857,00	$ 497.599.200,00	+	5.981,60	$ 531.507.031,00			$ -	-	$ -	5.981,60	$ 531.507.031,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 21.654.386.560,00**		-	**$ 26.987.118.143,00**			**($ 12.534.229.648,00)**	-	**$ 9.738.639.180,00**	-	**$ 14.452.888.495,00**
23	5	11603	500.1		Pavimento de concreto hidráulico	m3	12.100,00	$ 1.124.429,00	$ 13.605.590.900,00	+	12.100,00	$ 13.605.590.900,00			$ -	1.380,20	$ 1.551.936.906,00	12.100,00	$ 13.605.590.900,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 13.605.590.900,00**			**$ 13.605.590.900,00**			**$ 0,00**	-	**$ 1.551.936.906,00**	-	**$ 13.605.590.900,00**

FECHA 16/07/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

ACTA No.: 3 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [x]

POR CONTRATO ADICIONAL [ ] No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/12/2024

FECHA DE SUSPENSION: N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 197.300.514.579,00

PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS

FECHA DE VENC ACTUAL: 31/07/2026

FECHA DE REANUDACION: N.A

VALOR ADIC (incl IVA)(B): $26.702.325.739,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4 - Período: Junio de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.1 del del 4 de febrero de 2025			PRESENTES						
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
24	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21.118,00	$ 79.613,00	$ 1.681.267.334,00	+	22.283,80	$ 1.774.080.169,00			$ -	4,40	$ 350.297,00	22.283,80	$ 1.774.080.169,00
25	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	50.831,00	$ 23.748,00	$ 1.207.134.588,00	+	72.098,70	$ 1.712.199.928,00			$ -	3.071,20	$ 72.934.858,00	72.098,70	$ 1.712.199.928,00
26	600.2.4	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	45.834,00	$ 28.099,00	$ 1.287.889.566,00	+	45.834,00	$ 1.287.889.566,00			$ -	-	$ -	45.834,00	$ 1.287.889.566,00
27	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	11.585,00	$ 36.047,00	$ 417.604.495,00	+	11.585,00	$ 417.604.495,00			$ -	677,30	$ 24.414.633,00	11.585,00	$ 417.604.495,00
28	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	15.099,00	$ 214.097,00	$ 3.232.650.603,00	+	15.475,50	$ 3.313.258.124,00			$ -	339,70	$ 72.728.751,00	15.475,50	$ 3.313.258.124,00
29	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	1.197,00	$ 2.723.863,00	$ 3.260.464.011,00	+	1.551,30	$ 4.225.528.672,00	-	(900,00)	-$ 2.451.476.700,00	117,80	$ 320.871.062,00	651,30	$ 1.774.051.972,00
30	623.1	11604	623 - 22		Anclaje activo con cuatro (4) cables o torones de 1/2"	m	10.274,00	$ 434.289,00	$ 4.461.885.186,00	+	13.394,00	$ 5.816.866.866,00			$ -	750,00	$ 325.716.750,00	13.394,00	$ 5.816.866.866,00
31	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	4.578,00	$ 1.428.596,00	$ 6.540.112.488,00	+	5.928,00	$ 8.468.717.088,00			$ -	-	$ -	5.928,00	$ 8.468.717.088,00
32	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	2.813,00	$ 1.162.993,00	$ 3.271.499.309,00	+	3.500,70	$ 4.071.289.595,00			$ -	147,10	$ 171.076.271,00	3.500,70	$ 4.071.289.595,00
33	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	1.717,00	$ 1.098.592,00	$ 1.886.282.464,00	+	3.213,60	$ 3.530.435.251,00			$ -	57,20	$ 62.839.462,00	3.213,60	$ 3.530.435.251,00
34	630.3.7	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para barrera tipo 'New Jersey' unidireccional	m3	73,00	$ 1.175.768,00	$ 85.831.064,00	+	199,00	$ 233.977.832,00			$ -	-	$ -	199,00	$ 233.977.832,00
35	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	2.650,00	$ 1.011.713,00	$ 2.681.039.450,00	+	2.690,30	$ 2.721.811.484,00			$ -	33,00	$ 33.386.529,00	2.690,30	$ 2.721.811.484,00
36	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	1.331,00	$ 762.380,00	$ 1.014.727.780,00	+	1.331,00	$ 1.014.727.780,00			$ -	16,00	$ 12.198.080,00	1.331,00	$ 1.014.727.780,00
37	630.7	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3	1.208,00	$ 565.884,00	$ 683.587.872,00	+	2.582,00	$ 1.461.112.488,00	+	500,00	$ 282.942.000,00	489,80	$ 277.169.983,00	3.082,00	$ 1.744.054.488,00
38	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	780.459,00	$ 7.407,00	$ 5.780.859.813,00	+	1.025.183,10	$ 7.593.531.222,00			$ -	81.644,00	$ 604.737.108,00	1.025.183,10	$ 7.593.531.222,00
39	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	403.011,00	$ 2.017,00	$ 812.873.187,00	+	319.787,40	$ 645.011.186,00			$ -	-	$ -	319.787,40	$ 645.011.186,00
40	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	276,00	$ 1.094.469,00	$ 302.073.444,00	+	283,00	$ 309.734.727,00			$ -	-	$ -	283,00	$ 309.734.727,00
41	642.2.1	14103	642 - 22		Sello para juntas para puentes	m	38,00	$ 1.541.440,00	$ 58.574.720,00	+	98,00	$ 151.061.120,00			$ -	-	$ -	98,00	$ 151.061.120,00
42	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica	kg	34.821,00	$ 20.661,00	$ 719.436.681,00	+	34.821,00	$ 719.436.681,00			$ -	-	$ -	34.821,00	$ 719.436.681,00
43	650.1P.2	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	21.090,00	$ 20.661,00	$ 435.740.490,00	+	21.090,00	$ 435.740.490,00			$ -	-	$ -	21.090,00	$ 435.740.490,00
44	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	878,00	$ 898.110,00	$ 788.540.580,00	+	886,00	$ 795.725.460,00			$ -	26,60	$ 23.889.726,00	886,00	$ 795.725.460,00
45	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	601,00	$ 27.977,00	$ 16.814.177,00	+	7.403,00	$ 207.113.731,00	+	800,00	$ 22.381.600,00	1.062,00	$ 29.711.574,00	8.203,00	$ 229.495.331,00
46	663.3	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 900 mm (36")	m	2.356,00	$ 1.444.090,00	$ 3.402.276.040,00	+	2.356,00	$ 3.402.276.040,00			$ -	13,80	$ 19.928.442,00	2.356,00	$ 3.402.276.040,00
47	663.4	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 315 mm (12")	m	610,00	$ 191.763,00	$ 116.975.430,00	+	610,00	$ 116.975.430,00			$ -	-	$ -	610,00	$ 116.975.430,00
48	670.2	11604	670 - 11		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación ZN-5A1-MM	m3	2.760,00	$ 342.286,00	$ 944.709.360,00	+	2.760,00	$ 944.709.360,00			$ -	-	$ -	2.760,00	$ 944.709.360,00
49	671.3	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m3	1.470,00	$ 931.142,00	$ 1.368.778.740,00	+	1.787,80	$ 1.664.695.668,00			$ -	137,50	$ 128.032.025,00	1.787,80	$ 1.664.695.668,00
50	672.3	11604	672 - 22		Bordillo de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m	28.908,00	$ 72.367,00	$ 2.091.985.236,00	+	28.908,00	$ 2.091.985.236,00	-	(7.963,00)	-$ 576.258.421,00	793,30	$ 57.408.741,00	20.945,00	$ 1.515.726.815,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva) | POR CANTIDADES DE OBRA: X | POR CONTRATO ADICIONAL: ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS | PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/12/2024 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31/07/2026
FECHA DE SUSPENSION: N.A | FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $26.702.325.739,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 197.300.514.579,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4 - Período: Junio de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.1 del del 4 de febrero de 2025			PRESENTES						
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
51	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	58.807,00	$ 11.269,00	$ 662.696.083,00	+	62.608,00	$ 705.529.552,00			$ -	18.127,00	$ 204.273.163,00	62.608,00	$ 705.529.552,00
52	673.2	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	28.234,00	$ 189.612,00	$ 5.353.505.208,00	+	28.877,50	$ 5.475.520.530,00			$ -	3.515,00	$ 666.486.180,00	28.877,50	$ 5.475.520.530,00
53	673.3	11604	673 - 22		Material cobertura tipo SBG	m3	13.970,00	$ 212.650,00	$ 2.970.720.500,00	+	14.006,00	$ 2.978.375.900,00			$ -	507,00	$ 107.813.550,00	14.006,00	$ 2.978.375.900,00
54	674.2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	3.420,00	$ 251.952,00	$ 861.675.840,00	+	11.338,80	$ 2.856.833.338,00			$ -	890,40	$ 224.338.061,00	11.338,80	$ 2.856.833.338,00
55	681.1	11606	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	22.342,00	$ 333.742,00	$ 7.456.463.764,00	+	10.880,00	$ 3.631.112.960,00	-	(6.247,00)	-$ 2.084.886.274,00	6,10	$ 2.035.826,00	4.633,00	$ 1.546.226.686,00
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 65.856.675.503,00**			**$ 74.774.867.969,00**			**-$ 4.807.297.795,00**		**$ 3.442.341.072,00**		**$ 69.967.570.174,00**
56	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	120.000,00	$ 2.773,00	$ 332.760.000,00	+	209.290,00	$ 580.361.170,00			$ -	110.718,00	$ 307.021.014,00	209.290,00	$ 580.361.170,00
57	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	102,00	$ 41.301,00	$ 4.212.702,00	+	113,40	$ 4.683.533,00			$ -	103,10	$ 4.258.133,00	113,40	$ 4.683.533,00
58	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	1.528,00	$ 9.500,00	$ 14.516.000,00	+	1.578,00	$ 14.991.000,00			$ -	-	$ -	1.578,00	$ 14.991.000,00
59	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	212,00	$ 678.456,00	$ 143.832.672,00	+	256,00	$ 173.684.736,00			$ -	20,00	$ 13.569.120,00	256,00	$ 173.684.736,00
60	710.1.4	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (Poste de referencia)	u	30,00	$ 694.558,00	$ 20.836.740,00	+	31,00	$ 21.531.298,00			$ -	-	$ -	31,00	$ 21.531.298,00
61	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	3.777,00	$ 431.754,00	$ 1.630.734.858,00	+	4.197,00	$ 1.812.071.538,00			$ -	300,00	$ 129.526.200,00	4.197,00	$ 1.812.071.538,00
62	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u	320,00	$ 79.480,00	$ 25.433.600,00	+	355,00	$ 28.215.400,00			$ -	10,00	$ 794.800,00	355,00	$ 28.215.400,00
63	740.1	11607	740 - 22		Captafaros	u	1.550,00	$ 14.467,00	$ 22.423.850,00	+	1.692,00	$ 24.478.164,00			$ -	-	$ -	1.692,00	$ 24.478.164,00
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 2.194.750.422,00**			**$ 2.660.016.839,00**			**$ -**		**$ 455.169.267,00**		**$ 2.660.016.839,00**
64	800.2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	29.428,00	$ 35.385,00	$ 1.041.309.780,00	+	29.428,00	$ 1.041.309.780,00			$ -		$ -	29.428,00	$ 1.041.309.780,00
65	810.1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	250.500,00	$ 18.874,00	$ 4.727.937.000,00	+	250.500,00	$ 4.727.937.000,00			$ -		$ -	250.500,00	$ 4.727.937.000,00
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 5.769.246.780,00**			**$ 5.769.246.780,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 5.769.246.780,00**
66	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3.193.035,00	$ 1.555,00	$ 4.965.169.425,00	+	4.385.356,60	$ 6.819.229.513,00			$ -	42.684,30	$ 66.374.087,00	4.385.356,60	$ 6.819.229.513,00
67	900.3	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	1.040.055,00	$ 1.789,00	$ 1.860.658.395,00	+	1.155.450,20	$ 2.067.100.408,00	-	(1.247,00)	-$ 2.230.883,00	221.188,20	$ 395.705.690,00	1.154.203,20	$ 2.064.869.525,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 6.825.827.820,00**			**$ 8.886.329.921,00**			**-$ 2.230.883,00**		**$ 462.079.777,00**		**$ 8.884.099.038,00**
68	421.3P	11603		421.3P	Riego de liga con emulsión asfáltica modificada con polímeros CRR-1m	m2		$ 3.362,00					+	182.168,00	$ 612.448.816,00			182.168,00	$ 612.448.816,00
69	450.2P.1	11603		450.2P.1	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR34-PR38 - (PUEBLO RICO - APIA)	m3		$ 1.502.807,00					+	3.150,00	$ 4.733.842.050,00			3.150,00	$ 4.733.842.050,00
70	450.2P.2	11603		450.2P.2	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3		$ 1.859.941,00					+	2.813,00	$ 5.232.014.033,00			2.813,00	$ 5.232.014.033,00
71	450.1.2P	11603		450.1.2P	Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-25 - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3		$ 1.638.421,00					+	3.900,00	$ 6.389.841.900,00			3.900,00	$ 6.389.841.900,00
72	465.3P	11603		465.3P	Corte de pavimento flexible con disco.	m		$ 5.741,00					+	9.000,00	$ 51.669.000,00			9.000,00	$ 51.669.000,00
73	621.1P.2	11606		621.1P.2	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.2 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		$ 2.118.727,00					+	204,00	$ 432.220.308,00			204,00	$ 432.220.308,00
74	700.1P	11607		700.1P	Línea de demarcación con pintura acrilica en base solvente	m		$ 3.267,00					+	16.000,00	$ 52.272.000,00			16.000,00	$ 52.272.000,00
75	700.2P	11607		700.2P	Suministro e instalacion de Imprimante para demarcación de pavimentos rigidos	m		$ 2.106,00					+	88.000,00	$ 185.328.000,00			88.000,00	$ 185.328.000,00
76	NP1	11602		NP1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento) - Tramo PR83-PR85 - (YUTO)	m3		$ 134.589,00					+	3.000,00	$ 403.767.000,00			3.000,00	$ 403.767.000,00
77	NP1.1	11602		NP1.1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento))- Tramo PR76-PR78 - (YUTO)	m3		$ 192.790,00					+	3.000,00	$ 578.370.000,00			3.000,00	$ 578.370.000,00
78	NP2	11603		NP2	Geomalla de fibra de vidrio o equivalente para reforzamiento de capas asfalticas	m2		$ 7.711,00					+	39.500,00	$ 304.584.500,00			39.500,00	$ 304.584.500,00
79	NP3	11603		NP3	Sello de fisuras existentes usando asfalto modificado con polímeros o equivalente sin ruteador	m		$ 14.050,00					+	1.875,00	$ 26.343.750,00			1.875,00	$ 26.343.750,00
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS										**$ 19.002.701.357,00**				**$ 19.002.701.357,00**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**			**$136,00**			**$ 61,00**				**$ 197,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 4

FECHA 16/07/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [x]

POR CONTRATO ADICIONAL [ ] No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/12/2024

FECHA DE SUSPENSION: N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 197.300.514.579,00

PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS

FECHA DE VENC ACTUAL: 31/07/2026

FECHA DE REANUDACION: N.A

VALOR ADIC (incl IVA)(B): $26.702.325.739,00

*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 134.085.436.454,00	$ 159.200.298.690,00	$ -	$ 17.750.510.071,00	$ 159.200.298.690,00
*	IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)	$ 979.855.113,00	$ 1.163.386.799,00	$ -	$ 129.715.266,00	$ 1.163.386.799,00
*	TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)	$ 135.065.291.567,00	$ 160.363.685.489,00	$ -	$ 17.880.225.337,00	$ 160.363.685.489,00
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)	$ 4.955.800.803,00	$ 4.955.800.803,00			$ 4.955.800.803,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	$ 13.083.446.470,00	$ 13.842.398.287,00	$ -	$ 259.420.301,00	$ 13.842.398.287,00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00			$ 500.000.000,00
*	VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D	$ 153.604.538.840,00	$ 179.661.884.579,00	$ -	$ 18.139.645.638,00	$ 179.661.884.579,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)	$ 835.000.000,00	$ 835.000.000,00			$ 835.000.000,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$ 158.650.000,00	$ 158.650.000,00		$ -	$ 158.650.000,00
*	TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) = E + F	$ 993.650.000,00	$ 993.650.000,00		$ -	$ 993.650.000,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES ATÍPICOS (MONTO AGOTABLE)		$ 542.000.000,00			$ 542.000.000,00
	IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES ATÍPICOS (MONTO AGOTABLE)		$ 102.980.000,00			$ 102.980.000,00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES ATÍPICOS (MONTO AGOTABLE)		$ 644.980.000,00			$ 644.980.000,00
*	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	$ 16.000.000.000,00	$ 16.000.000.000,00			$ 16.000.000.000,00
*	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 170.598.188.840,00	$ 197.300.514.579,00	$ -	$ 18.139.645.638,00	$ 197.300.514.579,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Se realiza la presente acta de modificacion de cantidades, de acuerdo con la modificacion N°3 de 16 de julio de 2025, con la inclusion de los Items No Previstos de: Riego de liga con emulsión asfáltica modificada con polímeros CRR-1m,Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc -19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR34-PR38 - (PUEBLO RICO - APIA),Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO),Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-25 - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO),Corte de pavimento flexible con disco.Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.2 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo,Línea de demarcación con pintura acrilica en base solvente,Suministro e instalacion de Imprimante para demarcación de pavimentos rígidos ,Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento) - Tramo PR83-PR85 - (YUTO),Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento))- Tramo PR76-PR78 - (YUTO),Geomalla de fibra de vidrio o equivalente para reforzamiento de capas asfálticas, Sello de fisuras existentes usando asfalto modificado con polímeros o equivalente sin ruteado, asi mismo mayores y menores contidades, las cantidades que se indican con reducción en esta modificacion corresponden a ajustes realizados con el fin de balancear el valor total del contrato, manteniéndolo dentro del monto originalmente pactado. Estas reducciones no afectan la funcionalidad, calidad ni el cumplimiento del objeto contractual, y se realizan conforme a las necesidades del proyecto y al avance real de obra: Subbase Granular clase A,Base Granular clase A, Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57,Mezcla densa en caliente tipo MDC-19,Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25,Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos,Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo,Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado), Transporte de materiales provenientes de derrrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
ING CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT .

Firma:
ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
MP:01110-1030 CPITV

Karol Roca Pacheco
Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL

Firma:
KAROL ROCA PACHECO
TITULAR GERENCIA -GRUPO SUR OCCIDENTE
MAT PROF 13202115547 BLV

Karol Roca Pacheco
Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL

Firma:
KAROL ROCA PACHECO
JEFE UNIDAD EJECUTORA -SMCN
MAT PROF 13202115547 BLV

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría
Nombre:ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.No.2520242708 CND
Firma (Suscribe según su competencia)
Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Director Territorial
Nombre:ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula Profesional No.:No.2520242708 CND
Firma (Suscribe según su competencia)
Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre:VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
Matricula No. 17202-124682 CLD
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/07/2025


PROGRAMA DE INVERSIONES [X]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO
REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Indicar con una X)
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO DE OBRA No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024
FECHA DE SUSPENSION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $170.598.188.840,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $197.300.514.579,00
PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $26.702.325.739,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA N° / MES	0 Diciembre de 2024	1 Enero de 2025	2 Febrero de 2023	3 Marzo de 2024	4 Abril de 2025	5 Mayo de 2025	6 Junio de 2025	7 Julio de 2025	8 Agosto de 2025	9 Septiembre de 2025	10 Octubre de 2025	11 Noviembre de 2025	12 Diciembre de 2025
EXPLANACIONES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	($ 10.041.504,07)	(7,49%)	0,77%	%P		0,30%	0,70%	1,18%	1,53%	1,93%	2,23%	2,43%	2,83%	3,13%	3,63%	4,13%	4,63%	6,24%
				$P		$402.256,3	$938.599,06	$1.577.750,71	$2.047.049,74	$2.583.391,48	$2.965.647,79	$3.253.818,67	$0.160,41	$4.192.416,72	$4.862.843,90	$5.533.273,09	$6.203.698,27	$8.370.779,18
	$ 18.090.513,85	(13,49%)	1.028.201,63	$E		$419.068,2	$21.701,86	$0,00	$51.487,91	$28.915,12	$449.192,88	$57.835,64	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,31%	0,02%	0,00%	0,04%	0,02%	0,34%	0,04%	0,00%					
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO 12,13,14,15 76,77	($ 8.137.454,40)	(6,07%)	0,80%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	0,95%	1,35%	1,63%	2,03%	2,43%	3,43%	3,83%	4,33%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$734.496,24	$1.270.837,99	$1.807.179,73	$2.618,96	$2.718.360,70	$3.255.302,45	$4.596.158,81	$5.132.498,56	$5.802.925,74
	$ 7.749.808,06	(5,78%)	1.072.142,24	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$560.328,98	$96.314,68	$264.066,52	$151.432,06	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,07%	0,20%	0,11%	0,00%					
PAVIMENTO ASFALTICO 16,17,18,19,20,21,22	($ 21.654.386,56)	(16,15%)	7,26%	%P		0,93%	0,55%	0,55%	0,90%	1,35%	1,87%	2,37%	2,87%	3,12%	3,52%	4,12%	6,12%	8,62%
				$P		$710.770,0	$737.587,17	$737.587,17	$1.206.886,20	$1.810.270,66	$2.507.514,93	$3.177.842,11	$0.198,42	$4.189.223,66	$4.725.565,41	$5.530.078,02	$8.213.786,75	$11.563.922,66
	$ 31.803.632,54	(23,72%)	9.738.639,18	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$1.615.274,08	$2.490.776,86	$1.979.878,67	$3.652.709,57	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	1,86%	1,48%	2,72%	0,00%					
PAVIMENTO CONCRETO 23	($ 13.605.590,90)	(10,15%)	1,16%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,65%	1,05%	1,45%	1,75%	1,95%	2,35%	3,35%	4,85%	6,45%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$335.313,59	$871.555,34	$1.407.897,08	$1.944.238,83	$6.495,14	$2.614.666,01	$3.151.007,76	$4.491.862,12	$6.503.343,67	$8.646.510,65
	$ 13.605.590,90	(10,15%)	1.551.936,91	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$318.325,85	$459.779,02	$237.529,18	$535.902,86	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,34%	0,18%	0,40%	0,00%					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 ,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,505 1,52,53,54,55 68,69,70,71,72,78,79	($ 65.856.675,50)	(49,12%)	2,57%	%P		0,20%	0,69%	1,37%	2,33%	3,43%	4,78%	6,35%	7,27%	8,16%	8,76%	12,98%	17,10%	25,73%
				$P		$268.170,8	$928.728,31	$1.842.113,93	$3.120.487,96	$4.599.139,40	$6.412.174,25	$8.509.099,87	$3.540,52	$10.935.687,50	$11.751.094,11	$17.399.869,56	$22.932.143,82	$47.902.765,13
	$ 70.399.790,48	53%	3.442.341,07	$E		$0,00	$99.770,79	$226.690,78	$601.355,19	$993.117,00	$797.601,78	$723.805,55	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,07%	0,17%	0,45%	0,74%	0,59%	0,54%	0,00%					
SEÑALIZACION 56,57,58,59,60,61,62,63 74,75	($ 2.194.750,42)	(1,64%)	0,34%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
	$ 2.897.616,84	2,16%	455.169,27	$E		$143.890,1	$0,00	$0,00	$118.124,25	$0,00	$193.154,89	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,11%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%					
OBRAS VARIAS 64,65,73	($ 5.769.246,78)	(4,30%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,22%	0,34%	0,46%	0,58%	0,70%	1,27%	1,50%	1,73%	1,96%
				$P		$0,00	$0,00	$134.085,44	$294.987,96	$455.890,48	$616.793,01	$774.695,53	$95.092,04	$1.394.488,54	$1.702.885,04	$2.011.281,55	$2.319.678,05	$2.628.074,55
	$ 5.769.246,78	4,30%	0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E														
TRANSPORTES 66,67	($ 6.825.827,82)	(5,09%)	0,34%	%P		0,30%	0,60%	0,70%	0,90%	1,14%	1,34%	1,54%	1,74%	1,94%	2,24%	2,66%	3,08%	4,77%
				$P		$402.256,3	$802.005,87	$938.599,06	$1.204.262,18	$1.524.667,23	$1.794.238,10	$2.062.408,98	$0.579,85	$2.598.750,72	$3.001.007,03	$3.564.165,86	$4.127.324,70	$6.400.983,53
	$ 8.884.099,04	6,63%	462.079,78	$E		$395.705,0	$0,00	$0,00	$15.062,54	$7.536,62	$33.853,13	$11.321,80	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,29%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 134.085.436,45)	(100,00%)	13,24%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 159.200.298,49	118,73%	17.750.510,07															

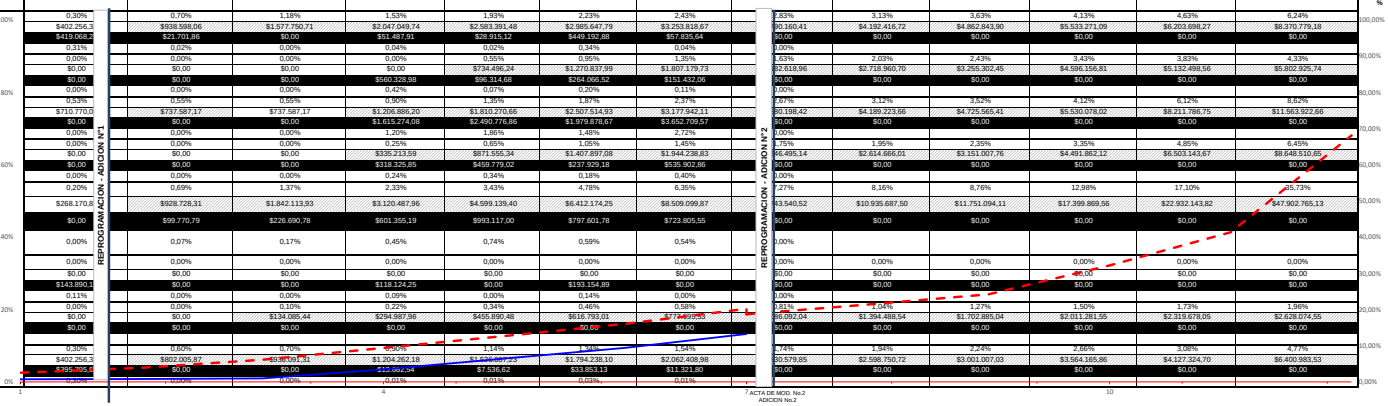

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,33%	1,21%	1,36%	2,22%	3,26%	3,29%	3,38%	2,63%	2,67%	2,84%	7,96%	9,18%	26,76%
	VALOR (Miles de Pesos)	1.783.453,57	1.623.465,83	1.820.709,15	2.981.259,07	4.371.923,21	4.414.292,32	4.537.280,56	3.527.301,61	3.584.508,53	3.805.511,84	10.676.979,31	12.303.588,81	35.887.687,63
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,33%	2,54%	3,90%	6,12%	9,38%	12,67%	16,06%	18,69%	21,36%	24,20%	32,16%	41,34%	68,10%
	VALOR (Miles de Pesos)	1.783.453,57	3.406.919,40	5.227.628,55	8.208.887,63	12.580.810,84	16.995.103,16	21.532.383,72	25.059.685,33	28.644.193,86	32.449.705,70	43.126.685,01	55.430.273,82	91.317.961,45
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,71%	0,09%	0,17%	2,45%	3,04%	2,95%	3,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	958.664,02	121.472,65	226.690,78	3.278.558,81	4.078.439,29	3.955.677,03	5.133.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,71%	0,81%	0,97%	3,42%	6,46%	9,41%	13,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	958.664,02	1.080.136,67	1.306.827,45	4.585.386,27	8.661.825,56	12.617.502,59	17.750.510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
La presente reprogramación del Programa de Inversiones corresponde a un ajuste en la distribución interna de actividades y/o recursos, sin que ello implique modificación alguna en los plazos contractuales establecidos originalmente. Los tiempos contractuales de ejecución continúan vigentes conforme a lo pactado en el contrato principal, sin afectación en la fecha de inicio ni en la fecha de terminación del mismo. Este ajuste se realiza con el fin de optimizar la gestión operativa y financiera del proyecto, en concordancia con el avance real de ejecución

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA IVA DE OBRA,	$979.855,11 / **$1.163.386,80**	$129.715,27	11,150%
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$4.955.800,80 / **$4.955.800,80**		0,00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES,	$13.083.446,47 / **$13.842.398,29**	$259.420,30	1,874%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$500.000,00 / **$500.000,00**		0,00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$835.000,00 / **$835.000,00**		0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y	$158.650,00 / **$158.650,00**		0,00%
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS (MONTO AGOTABLE)	$542.000.000,00 / **$542.000,00**		0,00%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS (MONTO AGOTABLE)	$102.980.000,00 / **$102.980,00**		0,00%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	$16.000.000,00 / **$16.000.000,00**		0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS. (S)	$681.492.752,39 / **$38.100.215,89**		0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$815.578.188,84		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$197.300.514,58**	$18.139.645,64	13,02%

Firma:
ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Aprueba:
ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
MP.01110-1030 CPITV

Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL
Firma:
KAROL ROCA PACHECO
TITULAR GERENCIA - GRUPO SUR OCCIDENTE
MAT PROF 13202115547 BLV

Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL
Revisó:
KAROL ROCA PACHECO
JEFE UNIDAD EJECUTORA -SMCN
MAT PROF 13202115547 BLV

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO
Revisó
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
MAT. PROF. 25202-103081 CND
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO
Revisó
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
DIRECTOR TERRITORIAL
MAT. PROF.25202-42708 CND

Revisó
ING VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. 17202-124362 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: 16-Jul-25

PROGRAMA DE INVERSIONES [X]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO


REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Indicar con una X)
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO DE OBRA No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4328 DE 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024
FECHA DE SUSPENSION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $170.598.188.840,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $197.300.514.579,00

PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B $26.702.325.739,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA N° / MES	13 Enero de 2026	14 Febrero de 2026	15 Marzo de 2026	16 Abril de 2026	17 Mayo de 2026	18 Junio de 2026	19 Julio de 2026	%
EXPLANACIONES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	($ 10.041.504,07)	(7,49%)	0,77%	%P		6,54%	7,14%	8,40%	8,70%	10,70%	11,70%	13,49%	
	$8.773.035,49	$9.577.569,11	$11.259.256,84	$SP		$8.773.035,49	$9.577.569,11	$11.259.256,84	$11.661.513,15	$14.343.221,88	$15.684.076,24	$18.092.499,34	
	$ 18.090.513,85	**13,49%**	1.028.201,63	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%					
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO 12,13,14,15	($ 8.137.454,40)	(6,07%)	0,80%	%P		4,41%	4,56%	4,76%	4,96%	5,59%	6,16%	6,28%	
	$5.910.194,09	$6.111.322,24	$6.378.493,12	$SP		$5.910.194,09	$6.111.322,24	$6.378.493,12	$6.647.663,99	$7.494.809,92	$8.259.096,91	$8.424.634,66	
	$ 7.749.808,06	**5,78%**	1.072.142,24	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%					
PAVIMENTO ASFALTICO 16,17,18,19,20,21,22	($ 21.654.386,56)	(16,15%)	7,26%	%P		8,69%	8,89%	9,09%	9,39%	12,39%	15,89%	20,13%	
	$11.857.792,47	$11.925.963,34	$12.194.134,22	$SP		$11.857.792,47	$11.925.963,34	$12.194.134,22	$12.596.380,53	$16.618.943,62	$21.311.933,90	$26.987.138,14	
	$ 31.803.632,54	**23,72%**	9.738.639,18	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%					
PAVIMENTO CONCRETO 23	($ 13.605.590,90)	(10,15%)	1,16%	%P		6,51%	6,67%	6,91%	7,21%	8,01%	9,85%	10,15%	
	$8.731.108,54	$8.937.877,47	$9.259.294,91	$SP		$8.731.108,54	$8.937.877,47	$9.259.294,91	$9.661.583,22	$10.734.234,77	$13.203.334,59	$13.605.590,90	
	$ 13.605.590,90	**10,15%**	1.551.936,91	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5051,52,53,54,55	($ 65.856.675,50)	(49,12%)	2,57%	%P		35,76%	35,94%	35,94%	36,86%	38,67%	42,43%	55,77%	
	$47.073.043,45	$48.196.638,88	$48.196.638,88	$SP		$47.073.043,45	$48.196.638,88	$48.196.638,88	$49.405.922,63	$51.857.017,39	$56.897.315,15	$74.774.867,97	
	$ 70.399.790,48	**52,50%**	3.442.341,07	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%					
SEÑALIZACION 56,57,58,59,60,61,62,63	($ 2.194.750,42)	(1,64%)	0,34%	%P		0,11%	0,26%	0,44%	0,62%	0,80%	1,38%	1,98%	
	$143.471,42	$344.599,57	$588.460,73	$SP		$143.471,42	$344.599,57	$588.460,73	$832.321,89	$1.076.183,05	$1.850.499,52	$2.660.016,84	
	$ 2.897.616,84	**2,16%**	455.169,27	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%					
OBRAS VARIAS 64,65	($ 5.769.246,78)	(4,30%)	0,00%	%P		2,06%	2,26%	2,54%	2,79%	3,92%	4,25%	4,30%	
	$2.762.168,99	$3.030.330,86	$3.405.770,09	$SP		$2.762.168,99	$3.030.330,86	$3.405.770,09	$3.744.556,69	$5.259.722,12	$5.702.204,06	$5.769.246,78	
	$ 5.769.246,78	**4,30%**	0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E									
TRANSPORTES 66,67	($ 6.825.827,82)	(5,09%)	0,34%	%P		4,87%	5,07%	5,32%	5,57%	6,08%	6,43%	6,63%	
	$6.535.068,97	$6.803.239,84	$7.138.453,43	$SP		$6.535.068,97	$6.803.239,84	$7.138.453,43	$7.473.667,02	$8.148.860,02	$8.618.159,05	$8.886.329,92	
	$ 8.884.099,04	**6,63%**	462.079,78	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 134.085.436,45)	(100,00%)	13,24%										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 159.200.298,49	118,73%	17.750.510,07										

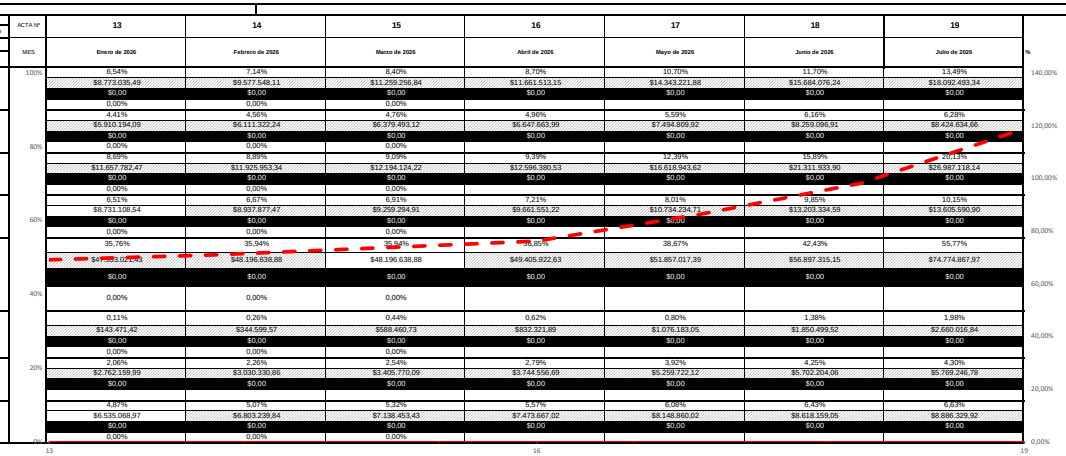

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,86%	1,84%	2,61%	2,69%	10,08%	11,93%	20,64%
	VALOR (Miles de Pesos)	1.147.880,95	2.461.667,92	3.493.981,89	3.602.084,90	13.509.415,59	15.993.626,71	27.673.679,14
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	68,96%	70,7963%	73,40%	76,09%	86,16%	98,09%	118,73%
	VALOR (Miles de Pesos)	92.465.842,40	94.927.510,32	98.421.492,21	102.023.577,11	115.532.992,70	131.526.619,42	159.200.298,55
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA IVA DE OBRA,	$979.855,11 / **$1.163.386,80**	$129.715,27	11,150%
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$4.955.800,80 / **$4.955.800,80**		0,00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES,	$13.083.446,47 / **$13.842.398,29**	$259.420,30	1,87%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DARIAS, 7 DIAS DE LA SEMANA	$500.000,00 / **$500.000,00**		0,00%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$835.000,00 / **$835.000,00**		0,00%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y	$158.650,00 / **$158.650,00**		0,00%
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES ATÍPICOS (MONTO AGOTABLE)			
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS Y ESTRUCTURALES ATÍPICOS (MONTO AGOTABLE)			
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	$16.000.000,00 / **$16.000.000,00**		0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$681.492.752,39		0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	**$38.100.215,89**		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$815.578.188,84		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$197.300.514,58**	$18.139.645,64	13,02%

OBSERVACIONES: La presente reprogramación del Programa de Inversiones corresponde a un ajuste en la distribución interna de actividades y/o recursos, sin que ello implique modificación alguna en los plazos contractuales establecidos originalmente. Los tiempos contractuales de ejecución continúan vigentes conforme a lo pactado en el contrato principal, sin afectación en la fecha de inicio ni en la fecha de terminación del mismo. Este ajuste se realiza con el fin de optimizar la gestión operativa y financiera del proyecto, en concordancia con el avance real de ejecución

Firma:
ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Aprueba:
ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
MP:01110-1030 CPITV

Karol Roca Pacheco Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL
Firma:
KAROL ROCA PACHECO
TITULAR GERENCIA - GRUPO SUR OCCIDENTE
MAT PROF 13202115547 BLV

Karol Roca Pacheco Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL
Revisó:
KAROL ROCA PACHECO
JEFE UNIDAD EJECUTORA -SMCN
MAT PROF 13202115547 BLV

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO
Revisó
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
MAT. PROF. 25202-103081 CND
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO
Revisó
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
DIRECTOR TERRITORIAL
MAT. PROF.25202-42708 CND

Revisó
ING VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. 17202-124982 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial
