

		Nombre	Modo de tarea: actual	Modo de tarea: anterior	Modo de tarea: dif	Duración: actual	Duración: anterior	Duración: dif	Comienzo: actual	Comienzo: dif	Fin: actual	Fin: dif	% completado actual
1		**SENA KENNEDY'CON**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**121,13 día**	**121,13 día**	**0d**	**vie 30/05/**	**0d**	**mar 25/1**	**0d**	**10**
2		**FASE 1**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**39 días**	**39 días**	**0d**	**vie 30/05/**	**0d**	**vie 25/07/**	**0d**	**100**
3		**ENTREGA 1 - AJU**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**30,13 días**	**30,13 días**	**0d**	**vie 30/05/**	**0d**	**lun 14/07**	**0d**	**100**
4		Hojas de vida	Programa	Programa	Igual	22,75 días	22,75 días	0d	vie 30/05/	0d	vie 4/07/2	0d	100
5		Cronograma d	Programa	Programa	Igual	13 días	13 días	0d	lun 7/07/2	0d	vie 25/07/	0d	100
6		Acta de inicio	Programa	Programa	Igual	1 día	1 día	0d	jue 24/07/	0d	jue 24/07/	0d	100
7		Plan de calida	Programa	Programa	Igual	30 días	30 días	0d	vie 30/05/	0d	lun 14/07/	0d	100
8		Informe prelir	Programa	Programa	Igual	5 días	5 días	0d	vie 18/07/	0d	jue 24/07/	0d	100
9		Anteproyecto	Programa	Programa	Igual	7 días	7 días	0d	jue 17/07/	0d	vie 25/07/	0d	100
10		**FASE 2**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**72 días**	**72 días**	**0d**	**vie 30/05/**	**0d**	**vie 12/09/**	**0d**	**11**
11		**ENTREGA 2 - PR**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**72 días**	**72 días**	**0d**	**vie 30/05/**	**0d**	**vie 12/09/**	**0d**	**11**
12		**GEOTÉCNIA**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**15 días**	**15 días**	**0d**	**lun 14/07**	**0d**	**vie 1/08/**	**0,13d**	**98**
13		Estudio det	Programa	Programa	Igual	15 días	15 días	0d	lun 14/07/	0d	vie 1/08/2	0,13d	98
14		**ESTRUCTURA**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**43 días**	**43 días**	**0d**	**lun 14/07**	**0d**	**vie 12/09/**	**0,13d**	**28**
15		Predimensi	Programa	Programa	Igual	15 días	15 días	0d	lun 14/07/	0d	vie 1/08/2	0,13d	100
16		Proyecto es	Programa	Programa	Igual	38 días	38 días	0d	lun 21/07/	0d	vie 12/09/	0,13d	0
17		**ARQUITECTUI**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**72,13 días**	**72,13 días**	**0d**	**vie 30/05/**	**0d**	**vie 12/09/**	**0d**	**20**
18		A000 - LOC/	Programa	Programa	Igual	15 días	15 días	0d	lun 28/07/	0d	mar 19/08	0d	20
19		A100 - PLAI	Programa	Programa	Igual	20 días	20 días	0d	lun 21/07/	0d	mar 19/08	0d	20
20		A200 - SEC(	Programa	Programa	Igual	38 días	38 días	0d	lun 21/07/	0d	vie 12/09/	0d	20
21		A300 - ALZ/	Programa	Programa	Igual	10 días	10 días	0d	lun 1/09/2	0d	vie 12/09/	0,13d	20
22		**ANTEPROYEC**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**43 días**	**43 días**	**0d**	**lun 14/07**	**0d**	**vie 12/09/**	**0d**	**0**

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 9/12/25




		Nombre	Modo de tarea: actual	Modo de tarea: anterior	Modo de tarea: dif	Duración: actual	Duración: anterior	Duración: dif	Comienzo: actual	Comienzo: dif	Fin: actual	Fin: dif	% completado actual
23		Anteproyec	Programa	Programa	Igual	28 días	28 días	0d	lun 14/07/	0d	vie 22/08/	0,13d	0
24		Anteproyec	Programa	Programa	Igual	28 días	28 días	0d	lun 14/07/	0d	vie 22/08/	0,13d	0
25		Anteproyec	Programa	Programa	Igual	28 días	28 días	0d	lun 14/07/	0d	vie 22/08/	0,13d	0
26		Anteproyec	Programa	Programa	Igual	28 días	28 días	0d	lun 28/07/	0d	vie 5/09/2	0d	0
27		Anteproyec	Programa	Programa	Igual	28 días	28 días	0d	lun 28/07/	0d	vie 5/09/2	0d	0
28		Anteproyec	Programa	Programa	Igual	28 días	28 días	0d	lun 28/07/	0d	vie 5/09/2	0d	0
29		Anteproyec	Programa	Programa	Igual	28 días	28 días	0d	lun 28/07/	0d	vie 5/09/2	0d	0
30		Anteproyec	Programa	Programa	Igual	28 días	28 días	0d	lun 28/07/	0d	vie 5/09/2	0d	0
31		Anteproyec	Programa	Programa	Igual	27,13 días	27,13 días	0d	lun 4/08/2	0d	jue 11/09/	0d	0
32		Disponibilic	Programa	Programa	Igual	15,13 días	15,13 días	0d	lun 14/07/	0d	vie 1/08/2	0d	0
33		Certificado	Programa	Programa	Igual	5,13 días	5,13 días	0d	lun 8/09/2	0d	vie 12/09/	0d	0
34		**FASE 3 (30%) - PRC**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**176 días**	**176 días**	**0d**	**vie 12/09/**	**0d**	**vie 22/05/**	**0d**	**0**
35		**ENTREGA DE PR**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**176 días**	**176 días**	**0d**	**vie 12/09/**	**0d**	**vie 22/05/**	**0d**	**0**
36		**ARQUITECTUI**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**50 días**	**50 días**	**0d**	**vie 12/09/**	**0d**	**mar 25/1**	**0,13d**	**0**
37		ARQ0900 _	Programa	Programa	Igual	6 días	6 días	0d	vie 12/09/	0d	vie 19/09/	0,13d	0
38		ARQ1000 _	Programa	Programa	Igual	15 días	15 días	0d	lun 22/09/	0d	vie 10/10/	0d	0
39		ARQ2000 _	Programa	Programa	Igual	6 días	6 días	0d	vie 19/09/	0d	vie 26/09/	0,13d	0
40		ARQ3000 _	Programa	Programa	Igual	10 días	10 días	0d	lun 29/09/	0d	vie 10/10/	0d	0
41		ARQ4000 _	Programa	Programa	Igual	11 días	11 días	0d	vie 12/09/	0d	vie 26/09/	0d	0
42		ARQ4200 _	Programa	Programa	Igual	10 días	10 días	0d	lun 20/10/	0d	lun 3/11/2	1,13d	0
43		ARQ4400 _	Programa	Programa	Igual	5 días	5 días	0d	lun 27/10/	0d	vie 31/10/	0,13d	0
44		ARQ4600 _	Programa	Programa	Igual	4 días	4 días	0d	mar 4/11/	0d	vie 7/11/2	0,13d	0

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 9/12/25




		Nombre	Modo de tarea: actual	Modo de tarea: anterior	Modo de tarea: dif	Duración: actual	Duración: anterior	Duración: dif	Comienzo: actual	Comienzo: dif	Fin: actual	Fin: dif	% completado actual
45		ARQ5000 _	Programa	Programa	Igual	5 días	5 días	0d	lun 15/09/	0d	vie 19/09/	0d	0
46		ARQ5200 _	Programa	Programa	Igual	10 días	10 días	0d	lun 22/09/	0d	vie 3/10/2	0,13d	0
47		ARQ5400 _	Programa	Programa	Igual	9 días	9 días	0d	lun 6/10/2	0d	vie 17/10/	0d	0
48		ARQ5600 _	Programa	Programa	Igual	10 días	10 días	0d	lun 20/10/	0d	vie 31/10/	0d	0
49		ARQ5800 _	Programa	Programa	Igual	15 días	15 días	0d	mar 4/11/	0d	mar 25/11	0,13d	0
50		ARQ6000 _	Programa	Programa	Igual	11 días	11 días	0d	lun 10/11/	0d	mar 25/11	0,13d	0
51		ARQ7000 _	Programa	Programa	Igual	15 días	15 días	0d	mar 4/11/	0d	mar 25/11	0,13d	0
52		TXT0000 _	Programa	Programa	Igual	14 días	14 días	0d	mar 14/1(	0d	vie 31/10/	0d	0
53		**PROYECTO TE**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**49 días**	**49 días**	**0d**	**lun 15/09**	**0d**	**mar 25/1**	**0,13d**	**0**
54		Iluminación	Programa	Programa	Igual	26 días	26 días	0d	jue 25/09/	0d	vie 31/10/	0,13d	0
55		seguridad h	Programa	Programa	Igual	26 días	26 días	0d	jue 25/09/	0d	vie 31/10/	0,13d	0
56		Electrico	Programa	Programa	Igual	26 días	26 días	0d	jue 25/09/	0d	vie 31/10/	0,13d	0
57		Hidraulico y	Programa	Programa	Igual	26 días	26 días	0d	jue 25/09/	0d	vie 31/10/	0,13d	0
58		Bioclimatic	Programa	Programa	Igual	26 días	26 días	0d	jue 25/09/	0d	vie 31/10/	0,13d	0
59		Coordinacic	Programa	Programa	Igual	26 días	26 días	0d	jue 25/09/	0d	vie 31/10/	0,13d	0
60		Acustico	Programa	Programa	Igual	26 días	26 días	0d	jue 25/09/	0d	vie 31/10/	0,13d	0
61		Aire acondi	Programa	Programa	Igual	26 días	26 días	0d	jue 25/09/	0d	vie 31/10/	0,13d	0
62		Presupuest	Programa	Programa	Igual	49 días	49 días	0d	lun 15/09/	0d	mar 25/11	0,13d	0
63		**APROBACIÓN**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**175 días**	**175 días**	**0d**	**lun 15/09**	**0d**	**vie 22/05/**	**0d**	**0**
64		**Aprobacior**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**130 días**	**130 días**	**0d**	**lun 15/09**	**0d**	**vie 20/03/**	**0d**	**0**
65		Revisión	Programa	Programa	Igual	49 días	49 días	0d	lun 15/09/	0d	mar 25/11	0,13d	0
66		Ajuste ob	Programa	Programa	Igual	26 días	26 días	0d	mar 25/1	0d	jue 1/01/2	0d	0

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 9/12/25




		Nombre	Modo de tarea: actual	Modo de tarea: anterior	Modo de tarea: dif	Duración: actual	Duración: anterior	Duración: dif	Comienzo: actual	Comienzo: dif	Fin: actual	Fin: dif	% completado actual
67		Revisión	Programa	Programa	Igual	15 días	15 días	0d	lun 5/01/2	0d	vie 23/01/	0d	0
68		Ajuste ob	Programa	Programa	Igual	15 días	15 días	0d	lun 26/01/	0d	vie 13/02/	0d	0
69		Aprobaci	Programa	Programa	Igual	5 días	5 días	0d	lun 16/02/	0d	vie 20/02/	0d	0
70		pago exp	Programa	Programa	Igual	15 días	15 días	0d	lun 23/02/	0d	vie 13/03/	0d	0
71		Resolucio	Programa	Programa	Igual	5 días	5 días	0d	lun 16/03/	0d	vie 20/03/	0d	0
72		**Aprobacior**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**174 días**	**174 días**	**0d**	**mar 16/0**	**0d**	**vie 22/05/**	**0d**	**0**
73		Radicacio	Programa	Programa	Igual	5 días	5 días	0d	lun 23/03/	0d	vie 27/03/	0d	0
74		revision (	Programa	Programa	Igual	16 días	16 días	0d	vie 27/03/	0d	vie 17/04/	0d	0
75		Ajuste ob	Programa	Programa	Igual	5 días	5 días	0d	lun 20/04/	0d	vie 24/04/	0d	0
76		tiempo d	Programa	Programa	Igual	15 días	15 días	0d	lun 27/04/	0d	vie 15/05/	0d	0
77		Aprobaci	Programa	Programa	Igual	4 días	4 días	0d	lun 18/05/	0d	jue 21/05/	0d	0
78		Suscripci	Programa	Programa	Igual	174 días	174 días	0d	mar 16/0	0d	vie 22/05/	0d	0
79		**ETAPA 4 -LIQUIDA**	**Programa**	**Programa**	**Igual**	**20 días**	**20 días**	**0d**	**lun 25/05**	**0d**	**vie 19/06/**	**0d**	**0**
80		Acta de Liquidac	Programa	Programa	Igual	20 días	20 días	0d	lun 25/05/	0d	vie 19/06/	0d	0

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 9/12/25




% completado anterior	% completado dif	Predecesor actual
79	**-69**	
100	**0**	
100	**0**	
100	0	
100	0	
100	0	
100	0	
100	0	
100	0	
99	**-88**	
100	**-89**	
100	**-2**	
100	-2	
100	**-72**	
100	0	
100	-100	
100	**-80**	
100	-80	9
100	-80	18CC-5d
100	-80	18CC-5d
100	-80	18CC-5d
100	**-100**	

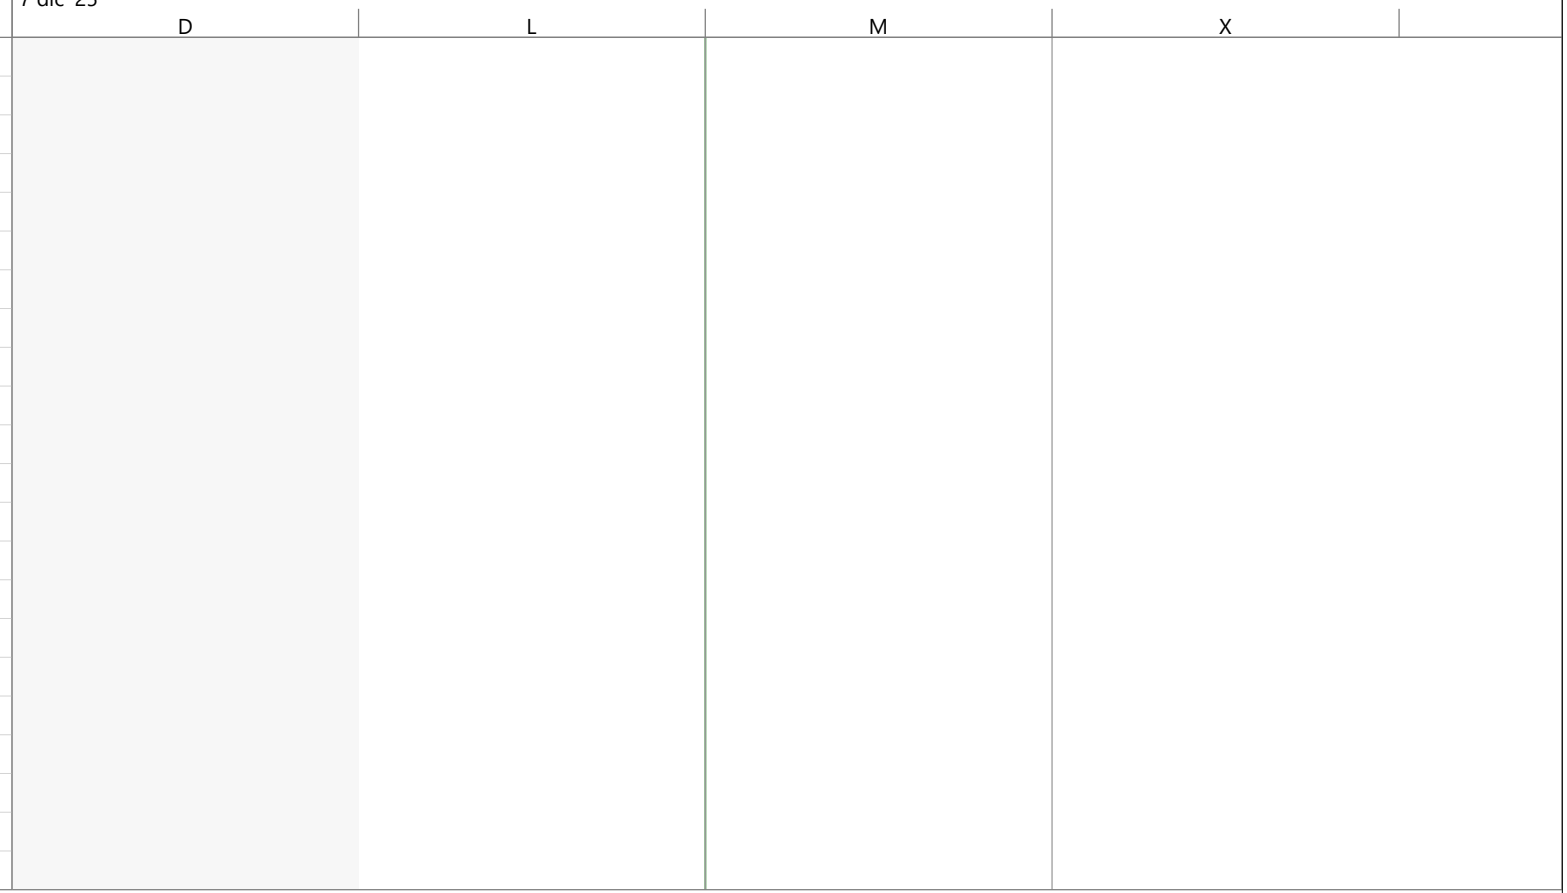

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 9/12/25

Tarea: anterior
Tarea: actual
Hito: anterior
Hito: actual
Resumen: anterior
Resumen: actual
Marcador de posición, duración: anterior
Marcador de posición, duración: actual
Marcador de posición, comienzo: anterior
Marcador de posición, comienzo: actual
Marcador de posición, fin: anterior
Marcador de posición, fin: actual
Tarea inactiva: anterior
Tarea inactiva: actual
Hito inactivo: anterior
Hito inactivo: actual
Resumen inactivo: anterior
Resumen inactivo: actual


% completado anterior	% completado dif	Predecesor actual
100	-100	
100	-100	
100	-100	
100	-100	9
100	-100	9
100	-100	9
100	-100	9
100	-100	9
100	-100	9
100	-100	9
100	-100	9
68	**-68**	
68	**-68**	
100	**-100**	
100	-100	
100	-100	37
100	-100	
100	-100	39
100	-100	
100	-100	41
100	-100	
100	-100	

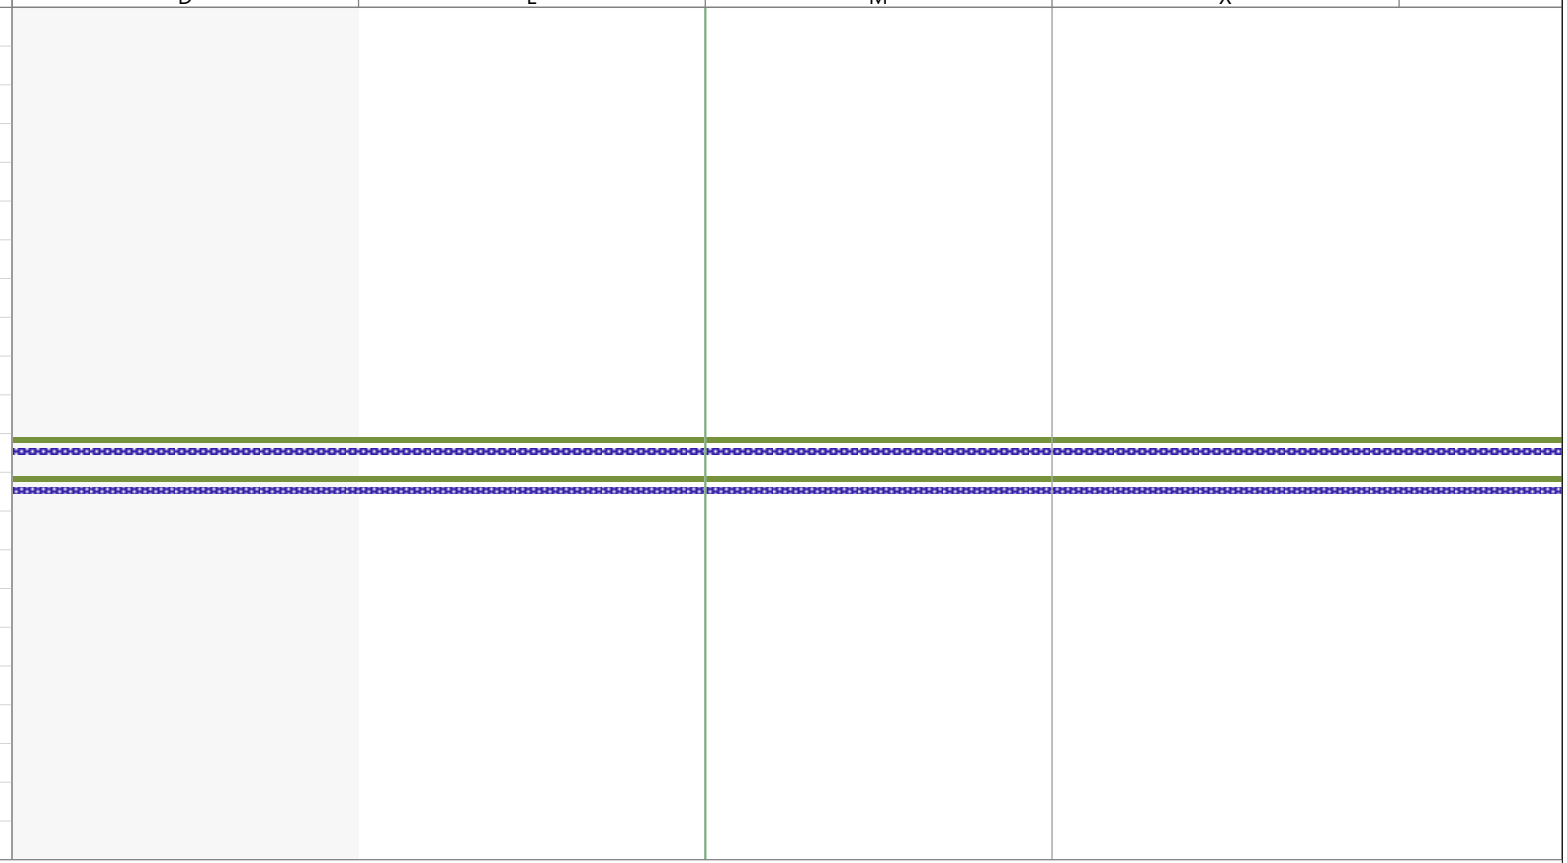

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 9/12/25

Tarea: anterior
Tarea: actual
Hito: anterior
Hito: actual
Resumen: anterior
Resumen: actual
Marcador de posición, duración: anterior
Marcador de posición, duración: actual
Marcador de posición, comienzo: anterior
Marcador de posición, comienzo: actual
Marcador de posición, fin: anterior
Marcador de posición, fin: actual
Tarea inactiva: anterior
Tarea inactiva: actual
Hito inactivo: anterior
Hito inactivo: actual
Resumen inactivo: anterior
Resumen inactivo: actual


% completado anterior	% completado dif	Predecesor actual
100	-100	
100	-100	
100	-100	46
100	-100	47
100	-100	
100	-100	
100	-100	52
100	-100	40
100	**-100**	
100	-100	
100	-100	
100	-100	
100	-100	
100	-100	
100	-100	
100	-100	
100	-100	
100	-100	
30	**-30**	
41	**-41**	
100	-100	
15	-15	

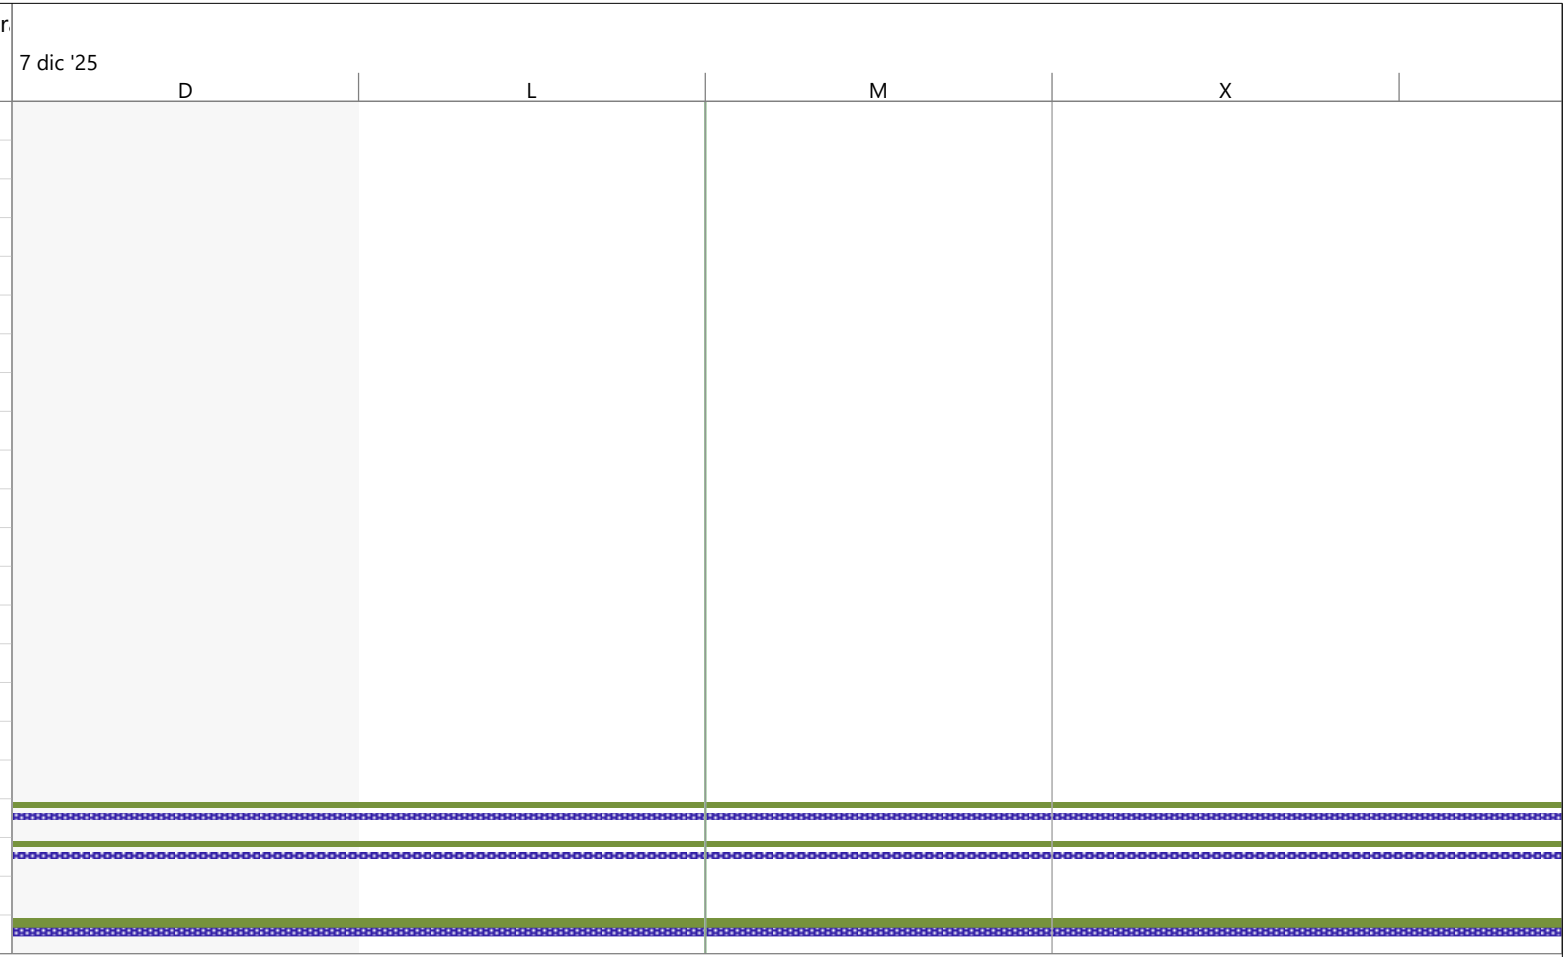

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 9/12/25

Tarea: anterior
Tarea: actual
Hito: anterior
Hito: actual
Resumen: anterior
Resumen: actual
Marcador de posición, duración: anterior
Marcador de posición, duración: actual
Marcador de posición, comienzo: anterior
Marcador de posición, comienzo: actual
Marcador de posición, fin: anterior
Marcador de posición, fin: actual
Tarea inactiva: anterior
Tarea inactiva: actual
Hito inactivo: anterior
Hito inactivo: actual
Resumen inactivo: anterior
Resumen inactivo: actual

% completado anterior	% completado dif	Predecesor actual
0	0	
0	0	67
0	0	
0	0	
0	0	70
23	**-23**	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	76
29	-29	
0	**0**	
0	0	

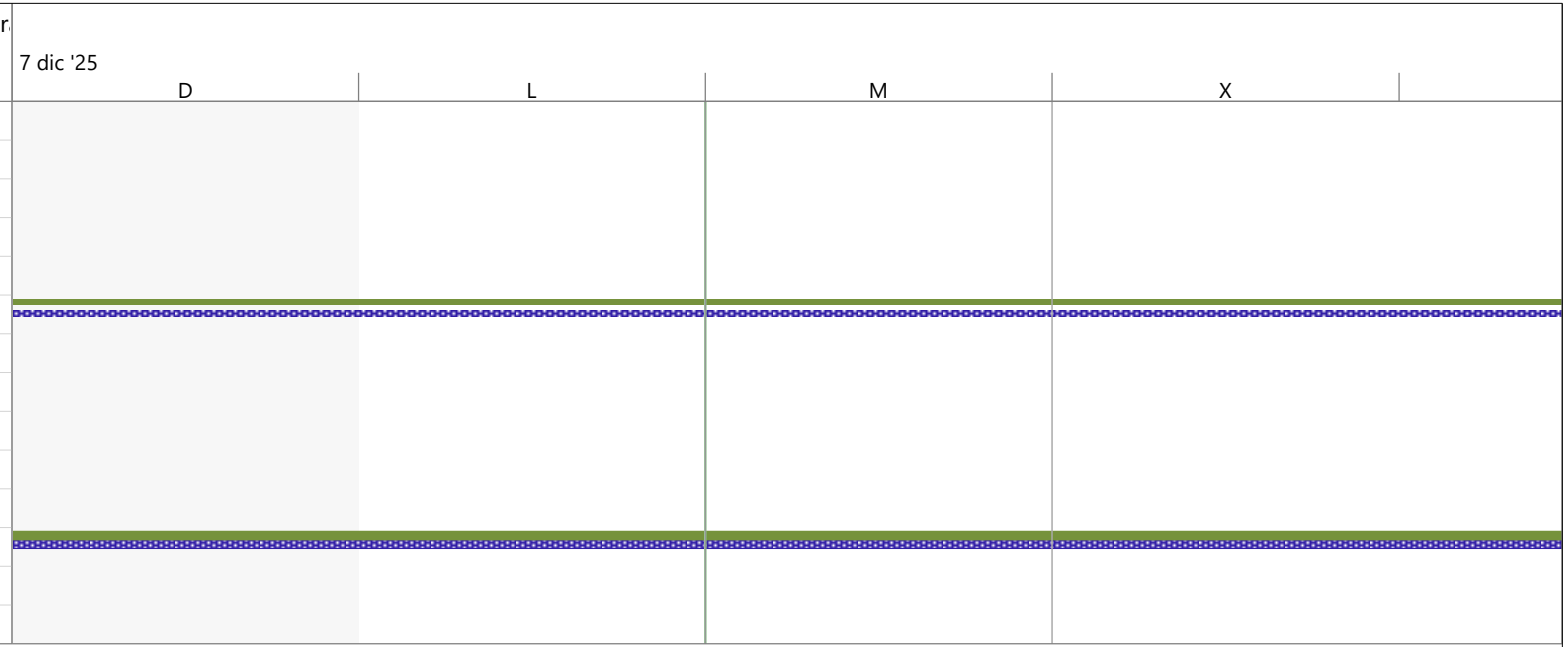

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 9/12/25

Tarea: anterior	Marcador de posición, comienzo: actual
Tarea: actual	Marcador de posición, fin: anterior
Hito: anterior	Marcador de posición, fin: actual
Hito: actual	Tarea inactiva: anterior
Resumen: anterior	Tarea inactiva: actual
Resumen: actual	Hito inactivo: anterior
Marcador de posición, duración: anterior	Hito inactivo: actual
Marcador de posición, duración: actual	Resumen inactivo: anterior
Marcador de posición, comienzo: anterior	Resumen inactivo: actual
