República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
Dirección de Infraestructura

MEMORANDO

720- 0283

Leticia 16 FEB. 2026

Departamento del Amazonas

16 FEB 2026

Oficina Asesora Jurídica

Sandra

10:28

PARA: WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

DE: ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de infraestructura departamental

Asunto: Solicitud Visto Bueno Otro sí No 02 al contrato de obra No 1868-2025

Por medio de la presente y teniendo en cuenta que el Departamento del Amazonas en aras de cumplir con los compromisos y normal funcionamiento de la Administración, y así mismo que el área de la Dirección de Infraestructura de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial requiere realizar una modificación al contrato de obra **1868-2025** cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA. La modificación se centra en prorrogar el plazo del contrato de obra por (2.5) meses que comprende entre el 17 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 02 MAYO DE 2026 y adicionar el valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 266.567.985,91). teniendo en cuenta el aval entregado por la interventoría y la justificación entregada por la supervisión a cargo de la Dirección de Infraestructura

Por lo anterior, solicito respetuosamente Visto Bueno y autorización para adelantar los trámites correspondientes al proceso administrativo.

Cordialmente,

ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de infraestructura

Vo. Bo. WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

Proyecto: Ing Johanna Andrea Perez Perez – PU – DI
Revisó: Marcela Rodriguez – PE –SPDT- DI

Actividad
Según
Secop 2

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
Dirección de Infraestructura

MEMORANDO

720- 0256

Leticia 13 FEB. 2026

Departamento del Amazonas
13 FEB 2026
Sandra
Oficina Asesora Jurídica
4:01 p

PARA: WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

DE: ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de infraestructura departamental

Asunto: Solicitud Visto Bueno Otro sí No 02 al contrato de obra No 1868-2025

Por medio de la presente y teniendo en cuenta que el Departamento del Amazonas en aras de cumplir con los compromisos y normal funcionamiento de la Administración, y así mismo que el área de la Dirección de Infraestructura de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial requiere realizar una modificación al contrato de obra **1868-2025** cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA. La modificación se centra en prorrogar el plazo del contrato de obra por (2.5) meses que comprende entre el 14 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2026 y adicionar el valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 266.567.985,91). teniendo en cuenta el aval entregado por la interventoría y la justificación entregada por la supervisión a cargo de la Dirección de Infraestructura

Por lo anterior, solicito respetuosamente Visto Bueno y autorización para adelantar los trámites correspondientes al proceso administrativo.

Cordialmente,

ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de infraestructura

Vo. Bo. WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

Proyecto: Ing Johanna Andrea Perez Perez – PU – DI
Revisó: Marcela Rodriguez – PE –SPDT- DI

OTROSÍ No. 02 DE PRORROGA, ADICIÓN PRESUPUESTAL Y BALANCE DE MAYORES DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO DE OBRA No. 01868 DEL 21 DE JULIO DEL 2025

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
NIT Nro. 899.999.336-9

CONTRATISTA: VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
NIT Nro. 900.560.635-3
REPRESENTANTE LEGAL: KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO
CC. 1.093.141.680

OBJETO: "CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA".

VALOR INICIAL: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($4.574.004.535,19).

VALOR ACTUAL: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($4.574.004.535,19).

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: CINCO (05) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL: CINCO (05) MESES

Entre los suscritos a saber **WILSON ELIZALDE MUR,** identificado con cédula de ciudadanía No.,**19.335.258** en calidad de Secretario de Desarrollo Institucional con funciones delegadas de ordenador del Gasto, según decreto 0017 del 10 de enero de 2025, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE** y, **VIETTA CONSTRUCCIONES SAS** con **NIT No. 900.560.635-3** representado Legalmente por, **KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO** identificada con cedula de ciudadanía **C.C C No 1.093.141.680 de Bogotá**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** acordamos con observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y reglamentarias, celebrar el presente **OTROSÍ No. 01 de PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL** al contrato de obra No. 01868 del 21 de julio del 2025, previa las siguientes consideraciones:

MODIFICACIÓN ACTUAL	
PRORROGA	**DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES** CONTADOS A PARTIR DEL 18 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 03 DE MAYO DE 2026.
ADICIÓN PRESUPUESTAL	Adicionar al contrato la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 266.567.985,91).

De acuerdo al balance de mayores y menores cantidades el presupuesto del contrato queda de la siguiente manera:

Proyecto	Abg SANTIAGO BOHORQUEZ	Cargo: PU - DIRECCIÓ N DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Aprobó	HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND	Cargo: Asesor con funciones delegadas en Contratación Estatal	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de las partes.			

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.931,00	10.326,73	50.921.089,62		-25,18	4.905,82	50.661.062,64
2,0	DEMOLICIÓN MANUAL DE EXTRUCTURAS EXISTENTE	M3	114,00	345.776,24	39.418.490,92		-29,08	84,92	29.363.317,98
3,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M3	449,00	155.830,03	69.967.685,52	521,24		970,24	151.192.532,73
4,0	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES	M2	4.931,00	15.961,14	78.704.362,00		-224,16	4.706,84	75.126.513,74
5,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	367,00	2.058.728,68	755.553.424,65		-7,64	359,36	739.824.737,55
6,0	ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5	KL	5.875,00	38.663,35	227.147.168,89	370,03		6.245,03	241.453.767,51
7,0	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	M3	293,00	3.163.935,95	927.033.233,27	5,13		298,13	943.264.224,69
8,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.448,00	110.022,60	379.357.917,04	18,00		3.466,00	381.338.323,79
9,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.448,00	293.515,41	1.012.041.116,62	18,00		3.466,00	1.017.324.393,91
10,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.483,00	289.756,11	1.009.220.525,87		-134,58	3.348,42	970.225.148,79
11,0	DILATACIÓN DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)	ML	1.724,00	14.292,07	24.639.520,79			1.724,00	24.639.520,79
	ÍTEMS NO PREVISTOS								
NP-01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION) Y CEMENTO	M3		578.840,39	-	329,09		329,09	190.490.583,95
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 6"	ML		190.102,16	-	33,00		33,00	6.273.371,28
NP-03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	M3		217.857,41	-	51,72		51,72	11.267.585,25
NP-04	DREN TIPO FRANCES (DIMENSIONES 0.5M X 0.7M)	ML		451.524,25	-	18,00		18,00	8.127.436,50
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**4.574.004.535,19**				**4.840.572.521,10**
DISCRIMINACIÓN DEL AIU.									
VALOR BASICO					**3.353.214.514,55**				**3.548.636.192,12**
ADMINISTRACIÓN				**29,41%**	**986.065.004,61**				**1.043.531.795,52**
IMPREVISTOS				**1,00%**	**33.532.145,16**				**35.486.361,92**
UTILIDAD				**6,00%**	**201.192.870,87**				**212.918.171,53**
TOTAL A.I.U.				**36,41%**	**1.220.790.020,64**				**1.291.936.328,97**
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS									**266.567.985,91**

Proyecto	Abg SANTIAGO BOHORQUEZ	Cargo: PU - DIRECCIÓ N DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Aprobó	HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND	Cargo: Asesor con funciones delegadas en Contratación Estatal	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de las partes.			

CONSIDERACIONES	
1.	El día veintiuno (21) de agosto de 2025 entre la Gobernación Departamental del Amazonas y VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S, Representada Legalmente por KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO, se suscribió el Contrato de obra No. 1868 de 2025, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA.
2.	Que el día cinco (05) de agosto de 2025 entre la Gobernación Departamental del Amazonas y VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S, Representada Legalmente por KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra No. 1868 de 2025. Teniendo como plazo de ejecución 05 meses contados a partir de la firma de la presente y hasta el 31 de diciembre de 2025.
3.	Que el día veintiséis (26) de diciembre de 2025 se suscribe el acta de SUSPENSIÓN No.01 por un periodo de cuarenta y cinco (45) días, justificada en la escasez de materiales y la revisión el balance de obra por parte de la interventoría, por ende, se tomara este tiempo para la realización de mesas técnicas, con el fin de contar con la aprobación definitiva de los componentes a evaluar y realizar los ajustes técnicos y jurídicos según corresponda.
4.	Que el día trece (13) de febrero de 2026, se suscribe el acta de REINICIO N°01- NOTA ACLARATORIA, con fecha actualizada de terminación del contrato el 17 de febrero de 2026.
Que una vez revisada la solicitud hecha por el contratista de obra VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S y estudiado el aval de la interventoría CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025, emitido mediante oficio CSP-055-049, la supervisión del contrato delegada por la Gobernación del Amazonas considera viable la prórroga del contrato por un término de (2.5) meses contados a partir de a partir del 18 de febrero de 2026 hasta el 03 de mayo de 2026.	

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES	
CLAUSULA PRIMERA:	**PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato de obra 1868-2025 por dos punto cinco **(2.5)** meses contados a partir del 18 de febrero de 2026 hasta el 03 de mayo de 2026.
CLAUSULA SEGUNDA:	Adicionar al contrato la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 266.567.985,91).
CLAUSULA TERCERA:	**GARANTÍAS DEL CONTRATO**. El contratista se obliga a ampliar las garantías del contrato principal de conformidad con las estipulaciones iniciales
CLAUSULA CUARTA:	**VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas y condiciones del contrato principal no sufren ninguna modificación.
CLAUSULA QUINTA:	Hacen parte de la presente prórroga y adición presupuestal los documentos enunciados en los considerandos y los demás que durante el desarrollo del mismo se susciten
CLAUSULA SEXTA:	El presente documento requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes.
CLAUSULA SEPTIMA:	El presente documento deberá ser publicado por el SECOP.2

Proyecto	Abg SANTIAGO BOHORQUEZ	Cargo: PU - DIRECCIÓ N DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Aprobó	HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND	Cargo: Asesor con funciones delegadas en Contratación Estatal	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de las partes.			

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en constancia se firma en el municipio de Leticia, a los 13 días del mes de febrero del año 2026.	
(Firma) WILSON ELIZALDE MUR C.C. 19.335.258 SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CON FUNCIONES DELEGADAS DE ORDENADOR DEL GASTO	(Firma) VIETTA CONSTRUCCIONES SAS Contratista R/LEGAL KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO No 1.093.141.680

Proyecto	Abg SANTIAGO BOHORQUEZ	Cargo: PU - DIRECCIÓ N DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Aprobó	HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND	Cargo: Asesor con funciones delegadas en Contratación Estatal	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de las partes.			

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	**JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO** DEPENDENCIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL- DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

JUSTIFICACIÓN OTROSÍ No. 02 DE PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO No 001868 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS Y VIETTA CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN AMAZONAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE JULIO DE 2025
No. DE CONTRATO	1868 DE 2025
OBJETO	"CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA".
CONTRATISTA	VIETTA CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.560.635-3
REPRESENTANTE LEGAL	KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO CC. 1.093.141.680
INTERVENTOR	CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025 NIT. 901.968.878-2
REPRESENTANTE LEGAL	BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO CC.: 10.768.196
SUPERVISOR	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL	CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($4.574.004.535,19)
VALOR ACTUAL	CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($4.574.004.535,19)
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	05 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN N 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2025 45 DÍAS
PLAZO ACTUAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	13 DE FEBRERO DE 2026

CONSIDERACIONES Y MODIFICACIONES ANTERIORES	
1	El día veintiuno (21) de julio de 2025 entre la Gobernación Departamental del Amazonas y VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S, Representada Legalmente por KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO, se suscribió el Contrato de obra No. 1868 de 2025, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA

Proyectó:	Ing. JOHANNA ANDREA PEREZ PEREZ	Cargo: PU – DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Revisó:	MARCELA RODRIGUEZ	Cargo: PE– SPDT	Firma:
Revisó:	Abg SANTIAGO BOHORQUEZ	Cargo: PU – DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Aprobó:	Ing. ROBIN CARDENAS PAREDES	Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	Firma:

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	**JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO** DEPENDENCIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL- DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

2	Que el día cinco (05) de agosto de 2025 entre la Gobernación Departamental del Amazonas y VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S, Representada Legalmente por KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra No. 1868 de 2025. Teniendo como plazo de ejecución 05 meses contados a partir de la firma de la presente y hasta el 31 de diciembre de 2025.
3	Que el día veintiséis (26) de diciembre de 2025 se suscribe el acta de SUSPENSIÓN No.01 por un periodo de cuarenta y cinco (45) días, justificada en la escasez de materiales y la revisión el balance de obra por parte de la interventoría, por ende, se tomara este tiempo para la realización de mesas técnicas, con el fin de contar con la aprobación definitiva de los componentes a evaluar y realizar los ajustes técnicos y jurídicos según corresponda.
4	Que el día trece (13) de febrero de 2026, se suscribe el acta de REINICIO N°01- NOTA ACLARATORIA, con fecha actualizada de terminación del contrato el 03 de mayo de 2026.

MODIFICACIÓN ACTUAL	
PRORROGA	DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 03 DE MAYO DE 2026
ADICIÓN PRESUPUESTAL	Adicionar al contrato la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 266.567.985,91).

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Que, en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra No. 1868 de 2025, el contratista de obra adelantó la revisión técnica integral de las condiciones constructivas evidenciadas en campo, así como la validación de las cantidades de obra efectivamente requeridas para la materialización del objeto contractual.

Que como resultado de dicho análisis técnico se identificó la necesidad de efectuar ajustes de mayores y menores cantidades de obra, así como la incorporación de ítems no previstos (NP), indispensables para garantizar la estabilidad, funcionalidad, durabilidad y adecuado desempeño de las soluciones constructivas adoptadas en obra.

Que la inclusión de los ítems no previstos obedece a condiciones técnicas verificadas durante la ejecución, las cuales no pudieron ser determinadas con precisión en la etapa de planeación, y cuya intervención resulta necesaria para asegurar el comportamiento estructural e hidráulico de las áreas intervenidas. En términos técnicos, la pertinencia de los NP se sustenta en lo siguiente:

- **NP-1. Mejoramiento de la subrasante con suelo–cemento.**

Se requiere en sectores donde se evidenció capacidad portante inferior a la prevista, siendo necesaria la estabilización del estrato de soporte para garantizar una plataforma estructuralmente competente y prevenir patologías prematuras.

- **NP-2. Suministro e instalación de tubería Novafort.**

Corresponde a la optimización del manejo hidráulico del corredor intervenido, permitiendo la adecuada conducción de escorrentías y la mitigación de riesgos asociados a saturación del suelo y procesos erosivos.

- **NP-3. Relleno con material seleccionado y compactado.**

Actividad necesaria para restituir condiciones geométricas, asegurar el confinamiento estructural y estabilizar bordes, evitando la generación de vacíos y pérdidas de soporte.

- **NP-4. Construcción de dren tipo francés.**

Intervención requerida en tramos con presencia de humedad permanente y flujos subsuperficiales, orientada a preservar la capacidad portante, la estabilidad y la vida útil de la infraestructura.

Proyectó:	Ing. JOHANNA ANDREA PEREZ PEREZ	Cargo: PU – DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Revisó:	MARCELA RODRIGUEZ	Cargo: PE– SPDT	Firma:
Revisó:	Abg SANTIAGO BOHORQUEZ	Cargo: PU – DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Aprobó:	Ing. ROBIN CARDENAS PAREDES	Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	Firma:

Que los referidos ajustes técnicos fueron objeto de evaluación y validación por parte de la Interventoría, determinándose que las modificaciones en cantidades de obra y la incorporación de los ítems no previstos generan un impacto económico por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 266.567.985,91).

Que, en concordancia con la naturaleza, alcance y volumen de las actividades adicionales aprobadas, se hace igualmente necesaria la adición en tiempo del contrato por dos punto cinco (2.5) meses, plazo requerido para garantizar la ejecución integral de los ítems incorporados, mantener la secuencia técnica de obra y asegurar el cumplimiento del objeto contractual bajo condiciones de calidad; el presupuesto del contrato de obra queda de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.931,00	10.326,73	50.921.089,62	4.905,82	50.661.062,64
2,0	DEMOLICIÓN MANUAL DE EXTRUCTURAS EXISTENTE	M3	114,00	345.776,24	39.418.490,92	84,92	29.363.317,98
3,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M3	449,00	155.830,03	69.967.685,52	970,24	151.192.532,73
4,0	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES	M2	4.931,00	15.961,14	78.704.362,00	4.706,84	75.126.513,74
5,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	367,00	2.058.728,68	755.553.424,65	359,36	739.824.737,55
6,0	ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5	KL	5.875,00	38.663,35	227.147.168,89	6.245,03	241.453.767,51
7,0	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	M3	293,00	3.163.935,95	927.033.233,27	298,13	943.264.224,69
8,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.448,00	110.022,60	379.357.917,04	3.466,00	381.338.323,79
9,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.448,00	293.515,41	1.012.041.116,62	3.466,00	1.017.324.393,91
10,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.483,00	289.756,11	1.009.220.525,87	3.348,42	970.225.148,79
11,0	DILATACIÓN DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)	ML	1.724,00	14.292,07	24.639.520,79	1.724,00	24.639.520,79
	ÍTEMS NO PREVISTOS						
NP-01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION) Y CEMENTO	M3		578.840,39	-	329,09	190.490.583,95
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 6"	ML		190.102,16	-	33,00	6.273.371,28
NP-03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	M3		217.857,41	-	51,72	11.267.585,25
NP-04	DREN TIPO FRANCES (DIMENSIONES 0.5M X 0.7M)	ML		451.524,25	-	18,00	8.127.436,50
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**4.574.004.535,19**		**4.840.572.521,10**

Que teniendo en cuenta la información y una vez revisada la solicitud hecha por el contratista de obra VIETTA CONSTRUCCIONES SAS y estudiado el aval de la interventoría CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025, emitido mediante el oficio CSP-055-049 del 9 de febrero de 2026, la supervisión del contrato delegada por la Gobernación del Amazonas, considera **viable la prórroga-**

Que ya se cuenta con el ajuste del proyecto para la adición de los recursos aprobado mediante:

- Oficio 700-0246, emitido por la secretaria de Planeación y desarrollo territorial a través de su oficina de Banco de proyectos, cuyo asunto es CONCEPTO FAVORABLE – AJUSTE CON TRAMITE PRESUPUESTAL

Que para la adición de recursos se cuenta con el certificado de disponibilidad CDP del No 2146 del 12 DE FEBRERO 2026

Dicho lo anterior, la supervisión solicita a la Oficina Jurídica la realización del OTROSÍ No. 02 de PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL al contrato de obra No 1868-2025

Proyectó:	Ing. JOHANNA ANDREA PEREZ PEREZ	Cargo: PU – DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Revisó:	MARCELA RODRIGUEZ	Cargo: PE– SPDT	Firma:
Revisó:	Abg.SANTIAGO BOHORQUEZ	Cargo: PU – DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Aprobó:	Ing. ROBIN CARDENAS PAREDES	Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	Firma:

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	**JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO** DEPENDENCIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL- DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ANEXOS	1. Informe de contratista de obra 2. Informe de aval de interventoría 3. Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos 4. Memorias de cantidades 5. Planos de diseño geométrico 6. Acta de fijación de precios no previstos 7. Análisis de Precios Unitarios y cotizaciones 8. Especificaciones técnicas de ítems no previstos 9. Cronograma de obra actualizado 10. CDP No 2146 del 12 DE FEBRERO 2026

Para constancia se firma a los 13 días del mes de febrero del año 2026.

FIRMA LA SOLICITUD:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Proyectó:	Ing. JOHANNA ANDREA PEREZ PEREZ	Cargo: PU – DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Revisó:	MARCELA RODRIGUEZ	Cargo: PE– SPDT	Firma:
Revisó:	Abg SANTIAGO BOHORQUEZ	Cargo: PU – DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Firma:
Aprobó:	Ing. ROBIN CARDENAS PAREDES	Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	Firma:

Departamento de Amazonas

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **2146**
Fecha de Vencimiento 13/05/2026
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 **Fecha de Expedición:** 12 feb. 2026

Objeto: OTROSÍ No. 02 DE PRÓRROGA, ADICIÓN PRESUPUESTAL Y BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO DE OBRA No. 01868 DEL 21 DE JULIO DEL 2025.
Solicitante: SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 0224 - 2.3.2.24.02.007 - 114	Vías peatonales para la vida **Recurso Propio**-Libre Destinación Superavit - recurso propio	233.398.000,00
0224 - 2.3.2.24.02.007 - 214	Vías peatonales para la vida **Recurso de la Nacion**-Libre Destinación Retiros FONPET	33.169.985,91
	TOTAL CERTIFICADO	266.567.985,91

NATALY PEÑA PINTO
Jefe de Oficina de Presupuesto Dptal

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO:

	ACTA DE REINICIO	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 2026	0.1	FGB - 003	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 1868 / 2025
		13	2	2026	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE REINICIO N° 01 - NOTA ACLARATORIA

INTERVENTORIA ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☑

CONTRATO No 1868 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando dias y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA.

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO **5 MESES**

(Indique en este espacio el número de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 5 (Dia) **DE** 8 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 4.574.004.535,19**

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS.

CONTRATISTA VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ROBIN CARDENAS PAREDES - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
OTRO SÍ NO 1	1/08/2025- Aclaratorio Rubros

	ACTA DE REINICIO	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 2026	0.1	FGB - 003	2 DE 3	

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 1868 / 2025
		13	2	2026	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE REINICIO N° 01 - NOTA ACLARATORIA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
Acta No 01 INICIO	05/08/2025	148,00
Acta No 01 SUSPENSIÓN	26/12/2025	45,00

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 26 (Día) **DE** Diciembre (Mes) **DE** 2025 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especifique meses y días según sea necesario)

FECHA DE REINICIACIÓN 13 (Día) **DE** Febrero (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR ACTUAL CONTRATO **$ 4.574.004.535,19**

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS.

En Leticia ; el trece de Febrero de 2026

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO representante legal

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

del contratista, BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO representante legal de la interventoria, y _____

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES Supervisor, con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado.

(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato)

	ACTA DE REINICIO	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 2026	0.1	FGB - 002	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 1868 / 2025
		13	2	2026	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE REINICIO N° 01 - NOTA ACLARATORIA

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. MATRICULA
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	DAVID LEONARDO ROZO	25202-249536 CND

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
MAESTRO OBRA	1
AYUDANTES DE OBRA	16
SISOMA	1
TOPOGRAFO	1

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
DUMPER	THWAITES MACH 570	1	EQUIPO EN REPARACION
RANAS	MAESCON	2	OPERATIVO
DRAGA		2	OPERATIVO
MOTOCARRO	GENERICO	1	OPERATIVO

El contratista (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto de contrato No. 1868 (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplia la suspensión) de 2025 en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el trece (Dia en letras) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de finalización)

NOTA ACLARATORIA: Se aclara que la fecha de reinicio del contrato 1868-2025, es el dia 13 de febrero de 2026, deacuerdo a lo publicado en Secop II; por ende la nueva fecha de terminación del contrato es el dia 17 de febrero de 2026.

Firma:
Nombre: VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO
Contratista

Firma:
Nombre:ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor Designado

Firma: Boris Cassab B.
Nombre: CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025
R/L BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO
Interventoría

Original Oficina Juridica
1ora copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

VIETTA
CONSTRUCCIONES

NIT. 900.560.635-3

Leticia, 9 de febrero de 2026

VC-1868-2025-016

Señores:
CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025
BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO
R/L INTERVENTORÍA

REFERENCIA: Contrato 1868 de 2025 - CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA.

Cordial saludo,

La suscrita representante legal de VIETTA CONSTRUCCIONES SAS en referencia al contrato 1868 de 2025 "CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA", me permito remitir la documentación correspondiente para la solicitud de adición y prórroga al mismo con el fin de cumplir con el objeto contractual, se relacionan:

1. Informe de ajuste y adición al contrato
2. Balance de mayores y menores cantidades
3. Memorias de cantidades
4. Planos de diseño geométrico
5. Acta de fijación de precios no previstos
6. APU's no previstos con cotizaciones
7. Especificaciones técnicas no previstas
8. Cronograma actualizado con prórroga y suspensión

Agradecemos su atención

Cordialmente,

VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.560.635-3
R/L KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO
CC 1.093.141.680 de Bochalema

VIETTA
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.560.635-3

INFORME AJUSTES TÉCNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS REALIZADOS AL PROYECTO:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
NÚMERO DE CONTRATO:	1868 de 2025.	
DATOS DEL CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS.	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	
OBJETO DE CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA	
DATOS DEL CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
	SUSCRITO CONTRATO – REPRESENTANTE LEGAL:	KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP 1953 - 2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$4.574.004.535,19	
FECHA DE CONTRATO:	21 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	05 DE AGOSTO DE 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	05 MESES	
SUSPENSIÓN N 1	26 DE DICIEMBRE DE 2025 (45 DÍAS)	
REINICIO N 1	9 DE FEBRERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE FEBRERO DE 2026	

Chorrera, febrero de 2026

VIETTA
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.560.635-3

INTRODUCCIÓN.

LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS en cumplimiento del objeto contractual del Contrato No. 1868 del 2025, adelantó el proceso de selección, de acuerdo con lo ordenado en el NUMERAL 7 Y 12 del ARTÍCULO 25 del ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL y por el DECRETO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 1 párrafo primero, con el fin de contratar al ejecutor de las actividades para el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA", mediante licitación de obra pública GOB-AMA-LP-003-2025, se seleccionó al proponente VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Por otro lado, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA", se requiere un ajuste de carácter presupuestal ante aspectos técnicos particulares por condiciones existentes de la vía y su estructura.

Aspectos técnicos para considerar:

1. De acuerdo con el levantamiento topográfico y la visita técnica realizada al inicio de las obras, y en acuerdo con la comunidad se evidenció que la longitud a intervenir corresponde a 1788 ml para cumplir el 100% de los tramos a intervenir y contractualmente se tienen contratados 1724 ml, por lo cual se presenta un diferencial en cantidades de 64 ml.
2. Conforme a los informes técnicos reportados el 29 de agosto de 2025 y el 26 de septiembre de 2025, teniendo en cuenta la topografía del terreno se deben realizar ajustes en la construcción de las cunetas, lo que implica una reducción en algunos tramos, así mismo se deben construir pases de tubería para el control de aguas y construcción de cajas de inspección.
3. De acuerdo con la ejecución de las obras, se han encontrado fallos en el terreno, lo que conlleva a la necesidad de realizar un mejoramiento en suelo cemento para estabilizar la subrasante y evitar deformaciones de las placas a futuro.
4. Por otra parte, en la construcción de las cunetas se evidenció que se requiere de relleno lateral con material de sitio para su confinamiento y evitar futuras socavaciones y daños en las placas de concreto.

Conforme con las actividades a desarrollar se solicita una prórroga de dos meses y medio con el fin de cumplir con el objeto contractual incluido el metraje adicional si fuese aprobado, este tiempo se solicita basándose en la ejecución actual de las obras y el rendimiento del personal de mano de obra no calificada, así mismo es de considerar que se tomó más de un mes en la logística y trasiego de materiales al sitio de obra y no se consigue suficiente personal de mano de obra no calificada en la comunidad, adicional a esto los niveles del rio no bajaron como se tenía pronosticado, lo cual no permitió la extracción de materiales por más de una semana por parte de la comunidad; se solicitó permiso para realizar dragado, el cual demoro en darse por parte de la comunidad y el proveedor que lo realiza solo tiene una maquina en funcionamiento, lo que ha causado retrasos para la disponibilidad del material en obras.

VIETTA
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.560.635-3

JUSTIFICACIÓN

El departamento de la Amazonia carece de un flujo continuo de malla vial en las zonas rurales, que impiden el óptimo desarrollo socio económico de la región, limitando el aprovechamiento de la riqueza agrícola, turística y social, producto de la gran diversidad de recursos naturales, comunidades indígenas y puntos estratégicos socio recreativos que la zona posee.

LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS busca de mejorar la accesibilidad hacia diferentes comunidades localizadas en áreas no municipalizadas, a razón de garantizar la conectividad terrestre con la construcción y/o mejoramiento de la malla vial, en procura de generar facilidades de acceso a servicios de comercio, salud, recreacionismo y educación a las poblaciones étnicas de la región.

Atendiendo a esta problemática se propone bajo el objeto contractual 1868 de 2025 la construcción de andenes peatonales en la comunidad de la Chorrera, la cual por su geometría reduce la libre movilidad vehicular continua, restricción de paso simultaneo, limitación de ingreso vehicular y demás aspectos que condicionan la seguridad vial y el libre tránsito vehicular.

La construcción de andenes peatonales en la Chorrera es una inversión significativa para la Gobernación del Amazonas como para la población de la Chorrera, pues ha sido una prioridad en el sector social, cultural y económico de la zona rural por ser una población con amplia diversidad étnica, agrónoma y turística.

En el desarrollo del ejercicio técnico en el replanteo y levantamiento topográfico sumado a las visitas técnicas en campo se identificaron que la longitud a intervenir corresponde a 1788 ml para cumplir el 100% de los tramos a intervenir y contractualmente se tienen contratados 1724 ml, así mismo aspectos técnicos adicionales que se requieren para la estabilidad y ejecución de las obras.

Ante la primicia de lo mencionado, y dado que el presupuesto vigente no cuenta con ítems que permitan el desarrollo de actividades para el mejoramiento de la subrasante, control de aguas y confinamiento de obras construidas, el Contratista de obra socializa en comités técnicos esta novedad, planteando alternativas frente a los hallazgos evidenciados.

De conformidad con lo anterior, se requiere ajustes al presupuesto vigente, en referencia a variables de cantidades e inclusión de ítems no previstos que modificarán las condiciones presupuestales iniciales que demandarán un análisis de carácter administrativo realizando un balance de mayores y menores en las cantidades definidas para la construcción de andenes peatonales en la Chorrera.

VIETTA
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.560.635-3

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

Mediante la resolución No. 1618 del 15 de mayo del 2025, se realizó el proceso de contratación mediante LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. 003 - 2025, que derivó en la selección y adjudicación del contratista VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S, con quien se suscribió el número de contrato 1868-2025 el pasado 21 de julio de 2025.

VIETTA CONSTRUCCIONES SAS en función de Contratista de Obra considera según lo establecido en las cláusulas contractuales manifestar lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula *NOVENA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA*: quien, *se compromete a cumplir además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en documentos aprobación de proyecto Ministerio de Transporte, vigente durante la ejecución del contrato. Así mismo, se consideran obligaciones específicas del CONTRATISTA las siguientes:*

En el marco de lo anterior, EL CONTRATISTA tendrá en específico, las siguientes obligaciones:

Obligación considerada en el numeral 11, el cual reza: *Presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por parte de la Interventoría y/o supervisor del contrato.*

Obligación considerada en el numeral 16, el cual reza: *Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de este contrato.*

De conformidad a lo establecido en la ley no procederá el ajuste de un proyecto cuando este implique modificaciones que cambien su alcance, para el proyecto de la referencia se define su alcance en la construcción de senderos peatonales en concreto estampado en la cabecera corregimental de la chorrera con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades en las zonas del departamento del Amazonas,, además de facilitar la comodidad y el aspecto urbano, teniendo en cuenta las necesidades de los sectores a intervenir de conformidad con lo estipulado en el plan de desarrollo departamental y velar por el bienestar de la comunidad.

Por lo anterior, El Contratista propone la inclusión de ítems no previstos que permita garantizar la estabilidad de la obra y a su vez conceptuar conforme a un balance de mayores y menores cantidades, las actividades de obra que se han visto ajustando a las condiciones y necesidades reales del proyecto. Es importante aclarar que, en ningún caso, este balance atenta o modifique el objeto contractual vigente.

VIETTA
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.560.635-3

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Se presenta a continuación la información que relaciona como se ejecutarán los diferentes tramos de acuerdo con las condiciones específicas para la tipología del terreno encontradas en los tramos.

Abscisa k0+290 hasta K0+302.46:
En este tramo se debe construir una caja para pase de agua y descole en tubería de 6", hay un filo de peña, con una pendiente pronunciada lo que incrementaría el costo para hacer una estabilización del terreno en ese punto, por lo que no llevaría cuneta por el costado derecho 2m hacia mayores y menores. A continuación, se presenta la planta y el perfil para el tramo.

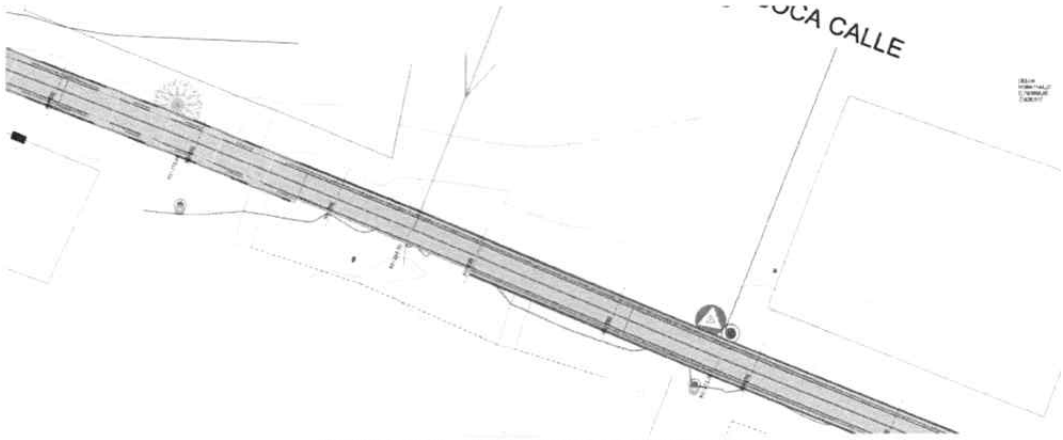


Ilustración 1 - Planta de Tramo a Intervenir.

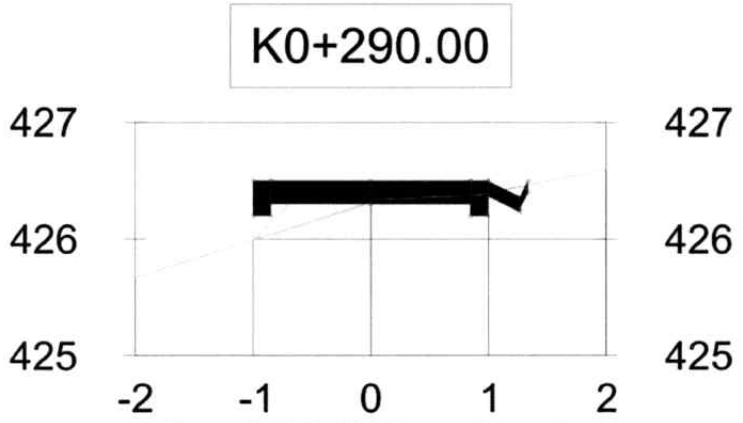


Ilustración 2 - Perfil de Tramo a Intervenir.


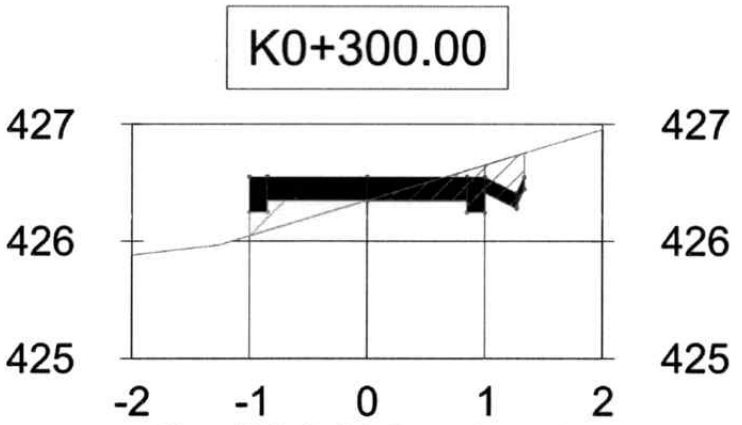


Ilustración 3 - Perfil de Tramo a Intervenir.

VIETTA
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.560.635-3

Registro fotográfico del tramo:

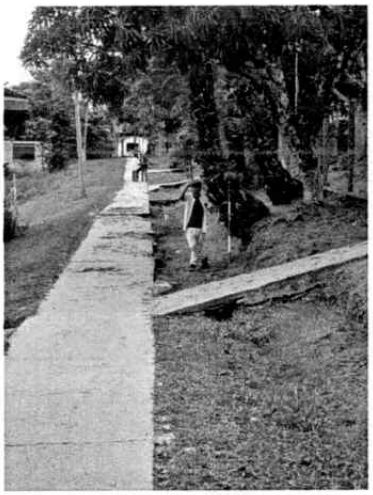

Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4

Abscisa K0+447.50 hasta K0+461.25:
En este tramo no se hará cuneta en el costado derecho porque tenemos estructuras en concreto que no es necesario afectar. A continuación, se presenta la planta y el perfil para el tramo.

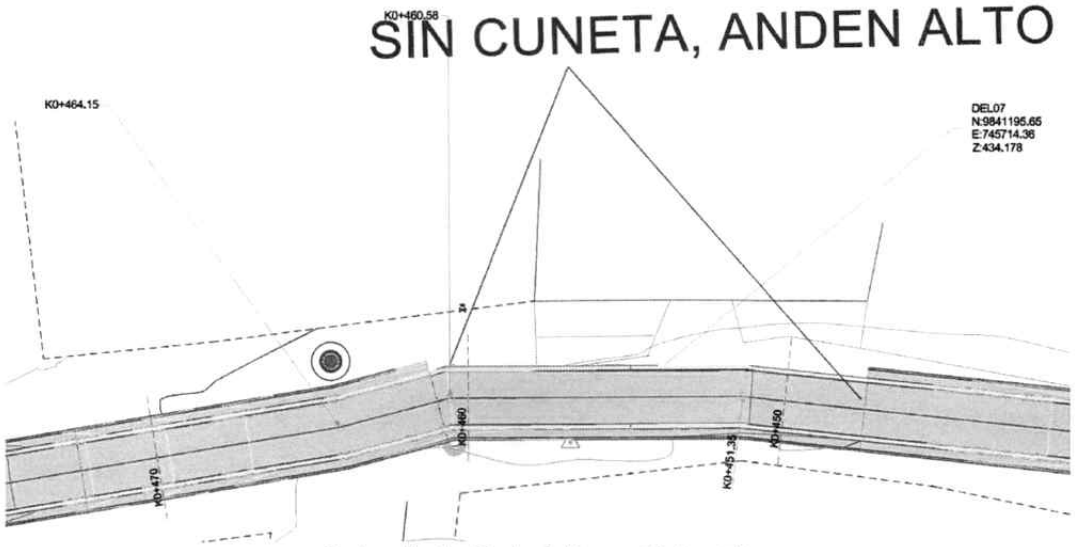


Ilustración 4 - Planta de Tramo a Intervenir.

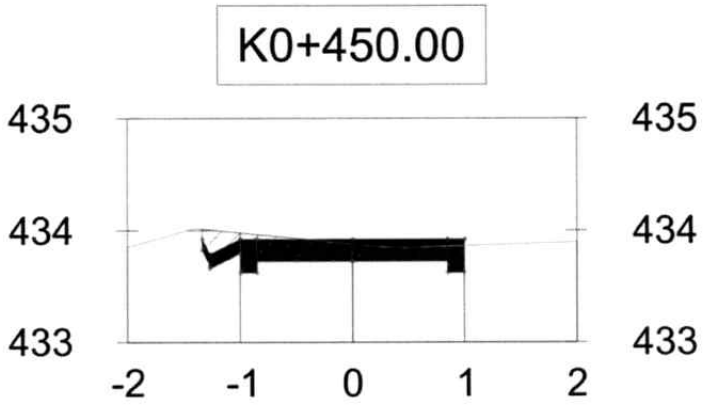


Ilustración 5 - Perfil de Tramo a Intervenir.

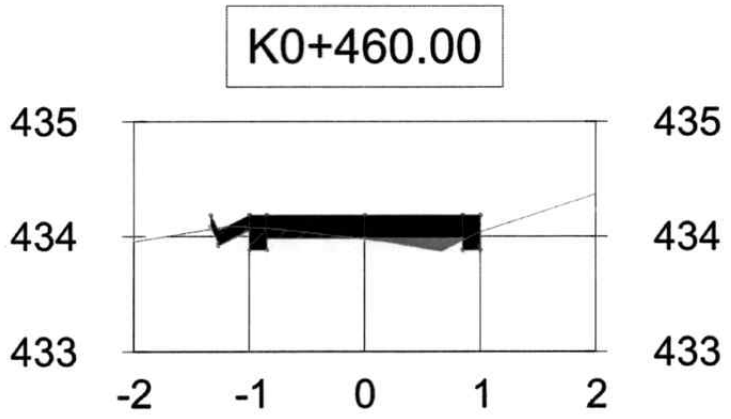


Ilustración 6 - Perfil de Tramo a Intervenir.

Registro fotográfico del tramo:



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 8

Abscisa K0+506 hasta K0+527.61:
En este tramo no se hará cuneta en el costado izquierdo porque tenemos estructuras en concreto que no es necesario afectar. A continuación, se presenta la planta y el perfil para el tramo.

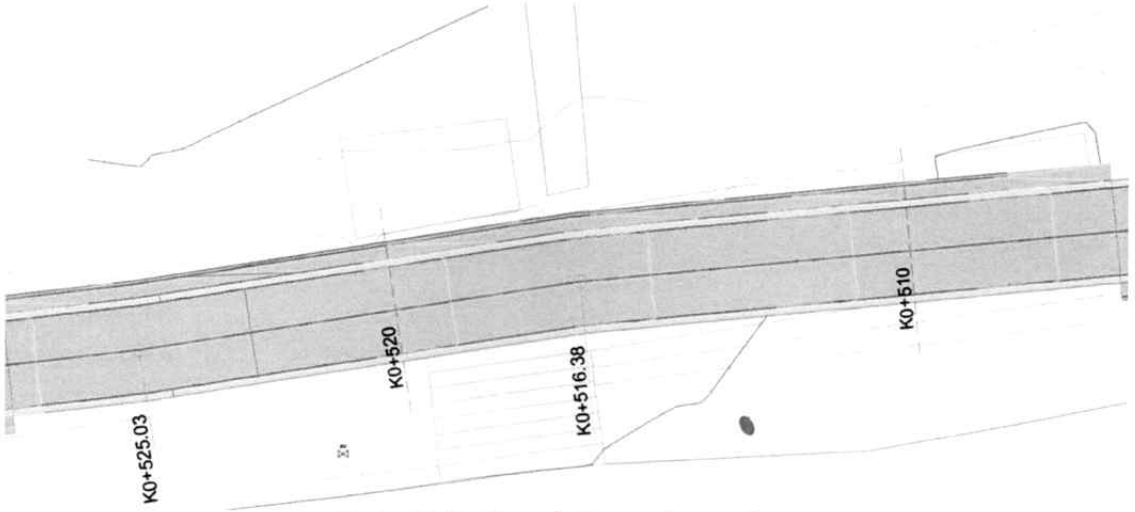


Ilustración 7 - Planta de Tramo a Intervenir.


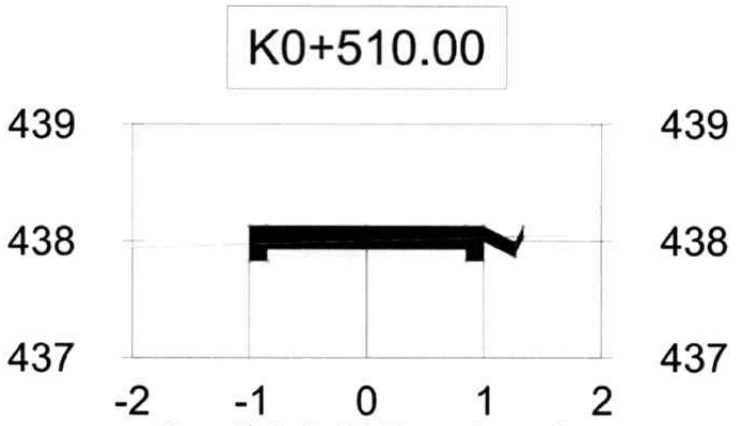


Ilustración 8 - Perfil de Tramo a Intervenir.



Fotografía 9 - Perfil de Tramo a Intervenir.

Registro fotográfico del tramo:

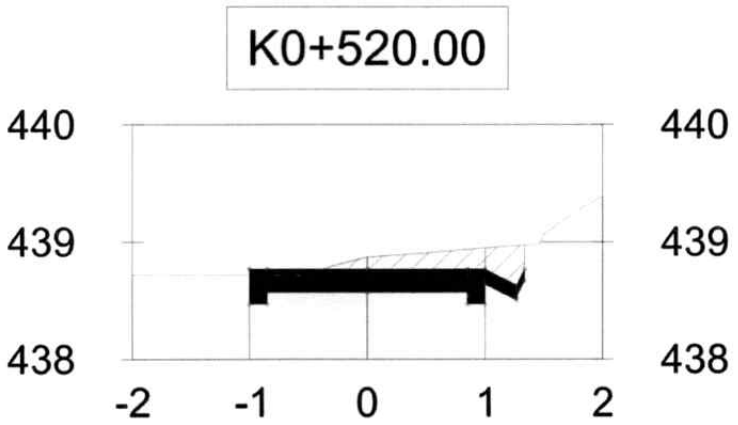

Fotografía 10



Fotografía 11

Abscisa K0+552.59 hasta K0+558.08:
En este tramo no se hará cuneta en el costado izquierdo porque está el tanque, esta estructura de concreto limita el espacio y no es posible demolerlo puesto que incrementaría los costos de inversión en el tramo.

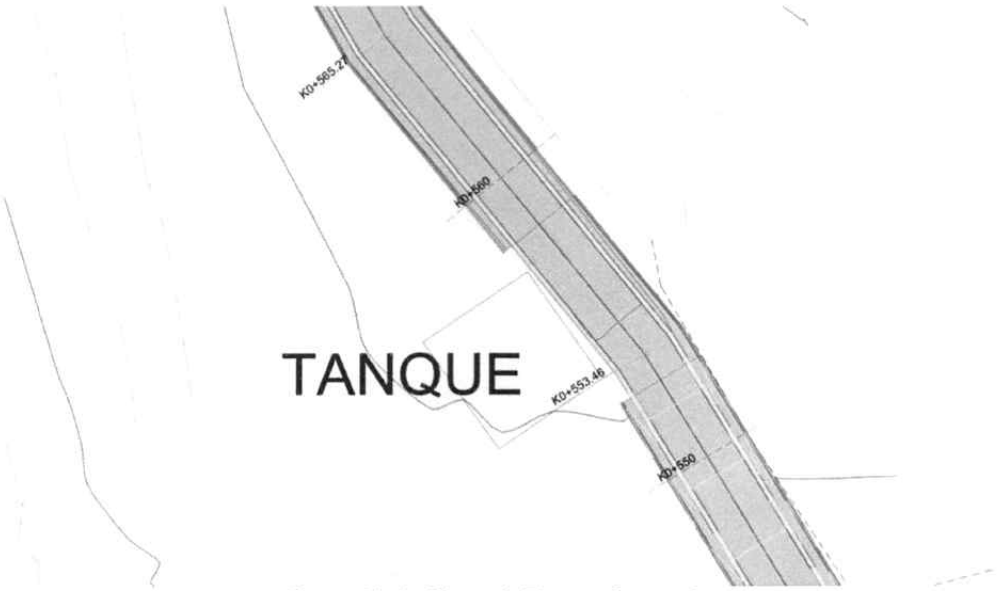


Ilustración 9 - Planta de Tramo a Intervenir.

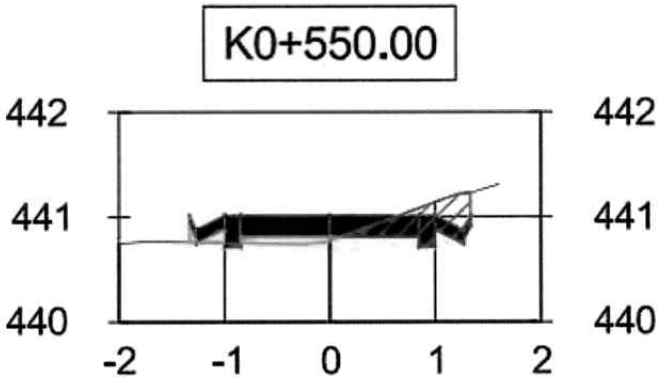


Ilustración 10 - Perfil de Tramo a Intervenir.

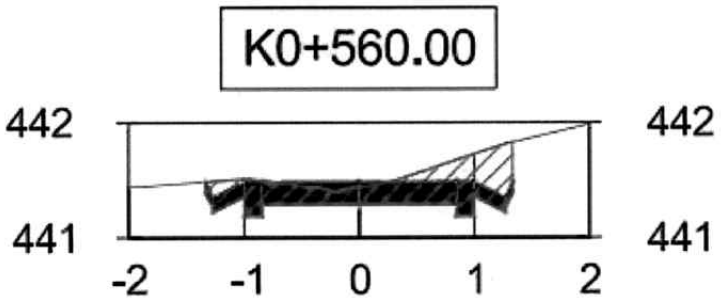


Ilustración 11 - Perfil de Tramo a Intervenir.

Registro fotográfico del tramo:



Fotografía 12



Fotografía 13

Abscisa K0+580.00 hasta K0+614.99:
En este tramo no se hará cuneta en el costado izquierdo porque es una zona que presenta una caída condición donde hay un filo de peña, con una pendiente pronunciada lo que incrementaría el costo para hacer una estabilización del terreno en ese punto.

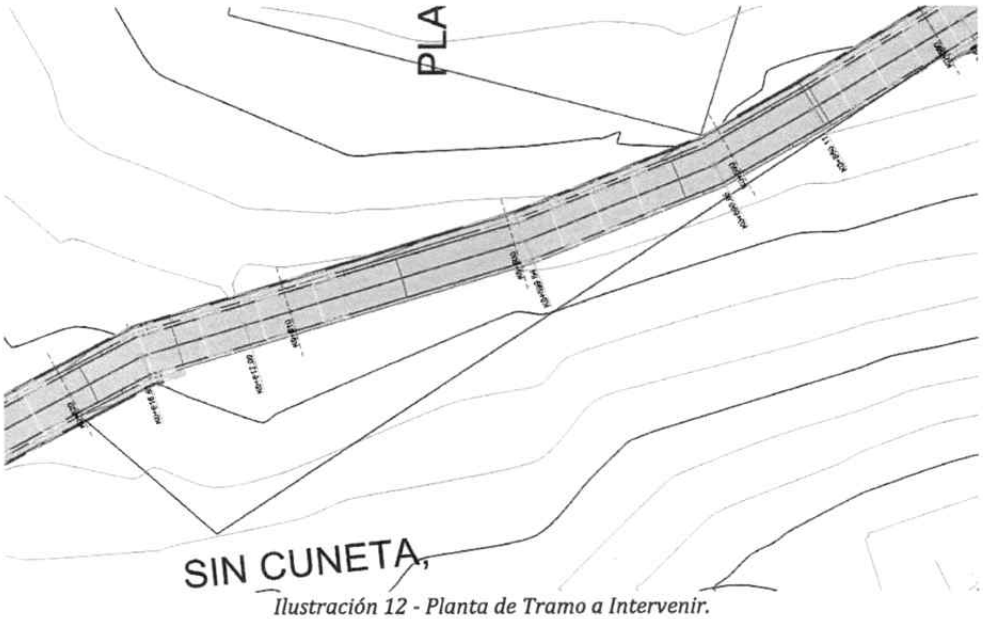


Ilustración 12 - Planta de Tramo a Intervenir.

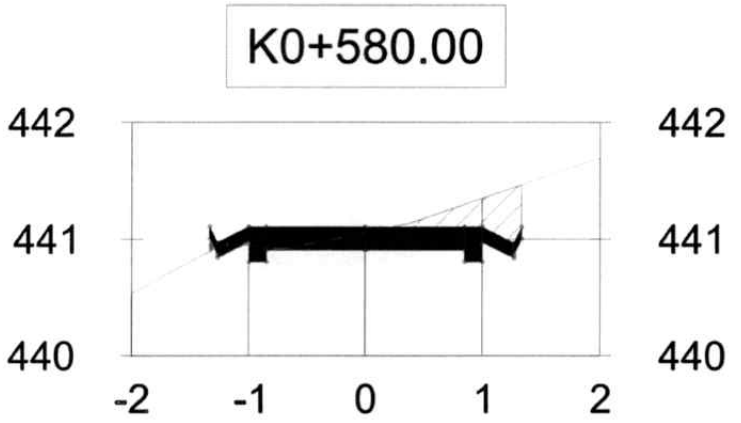


Ilustración 13 - Perfil de Tramo a Intervenir.

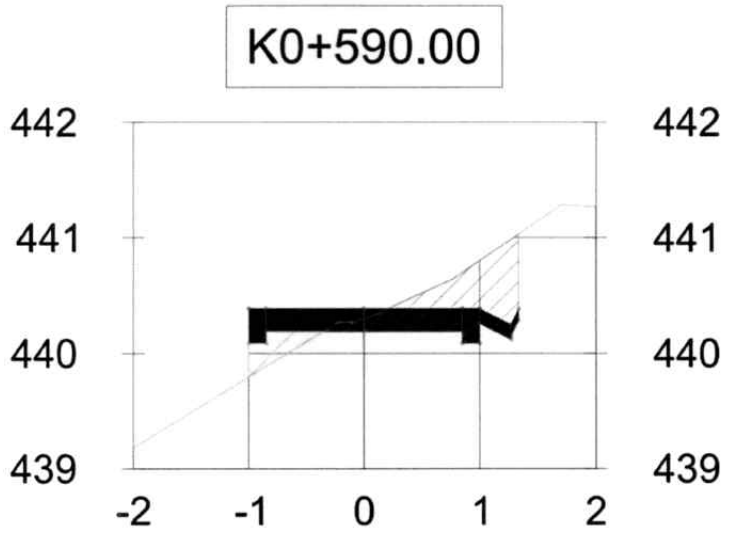


Ilustración 14 - Perfil de Tramo a Intervenir.

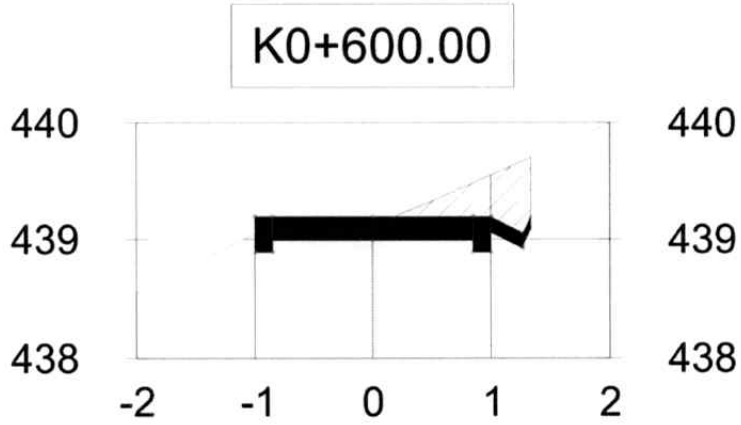


Ilustración 15 - Perfil de Tramo a Intervenir.

VIETTA
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.560.635-3

K0+610.00




Ilustración 16 - Perfil de Tramo a Intervenir.

Registro fotográfico del tramo:



Fotografía 14



Fotografía 15



Fotografía 16



Fotografía 17

Basándonos en los aspectos y consideraciones técnicas mencionadas anteriormente, se precisó un balance presupuestal arrojando ítems con diferencias representativas en cantidades contractuales frente cantidades estimadas en obras complementarias para la correcta ejecución del proyecto.

De acuerdo con la visita técnica realizada y en acuerdo con la comunidad se tiene que la meta física tiene un total de 1788 ml para cumplir el 100% de los tramos a intervenir, cabe resaltar que contractualmente se tienen contratados 1724 ml, por lo cual hacen falta 64m para cumplir la meta.

Para ello, se presenta la descripción de los ajustes realizados a los diseños del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA", que, de acuerdo con los hallazgos en obra, se hace preciso desarrollar un balance soportado en CANTIDADES MAYORES y MENORES e inclusión de los siguientes ítems no previstos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) Y CEMENTO	M3

De acuerdo con la ejecución de las obras, se han encontrado fallos en el terreno, lo que conlleva a la necesidad de realizar un mejoramiento en suelo cemento para estabilizar la subrasante y evitar deformaciones de las placas a futuro.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT DE 6"	ML

Teniendo en cuenta la topografía del terreno se deben realizar ajustes en la construcción de las cunetas, lo que implica una reducción en algunos tramos, así mismo se deben construir pases de tubería para el control de aguas y construcción de cajas de inspección.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	M3

En la construcción de las cunetas se evidenció que se requiere de relleno lateral con material de sitio para su confinamiento y evitar futuras socavaciones y daños en las placas de concreto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-04	DREN TIPO FRANCES (DIMENSIONES 0.5M X 0.7M)	ML

Se evidenció flujo permanente de aguan en varios tramos, por lo que es necesario realizar estos drenes, para garantizar la estabilidad de la estructura.

VIETTA
CONSTRUCCIONES

NIT. 900.560.635-3

BALANCE GENERAL DE OBRAS

Teniendo en cuenta la meta física contractual de 1724 ml se presenta a continuación el balance:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.931,00	10.326,73	50.921.089,62		-25,18	4.905,82	$50.661.062,64
2,0	DEMOLICIÓN MANUAL DE EXTRUCTURAS EXISTENTE	M3	114,00	345.776,24	39.418.490,92		-29,08	84,92	$29.363.317,98
3,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M3	449,00	155.830,03	69.967.685,52	521,24		970,24	$151.192.532,73
4,0	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES	M2	4.931,00	15.961,14	78.704.362,00		-224,16	4.706,84	$75.126.513,74
5,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	367,00	2.058.728,68	755.553.424,65	-7,64		359,36	$739.824.737,55
6,0	ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5	KL	5.875,00	38.663,35	227.147.168,89	370,03		6.245,03	$241.453.767,51
7,0	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	M3	293,00	3.163.935,95	927.033.233,27	5,13		298,13	$943.264.224,69
8,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.448,00	110.022,60	379.357.917,04		18,00	3.466,00	$381.338.323,79
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
9,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.448,00	293.515,41	1.012.041.116,62		18,00	3.466,00	1.017.324.393,91
10,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.483,00	289.756,11	1.009.220.525,87		-134,58	3.348,42	970.225.148,79
11,0	DILATACIÓN DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)	ML	1.724,00	14.292,07	24.639.520,79		0,00	1.724,00	24.639.520,79
	ÍTEMS NO PREVISTOS								
NP-01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION) Y CEMENTO	M3		578.840,39	-	329,09		329,09	$190.490.583,95
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 6"	ML		190.102,16	-	33,00		33,00	6.273.371,28
NP-03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	M3		217.857,41	-	51,72		51,72	$11.267.585,25
NP-04	DREN TIPO FRANCES (DIMENSIONES 0.5M X 0.7M)	ML		451.524,25	-	18,00		18,00	8.127.436,50
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**4.574.004.535,19**				**4.840.572.521,10**
DISCRIMINACIÓN DEL AIU.									

VIETTA
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.560.635-3

VALOR BASICO				3.353.214.514,55				3.548.636.192,12
ADMINISTRACIÓN			29,41%	986.065.004,61				1.043.531.795,52
IMPREVISTOS			1,00%	33.532.145,16				35.486.361,93
UTILIDAD			6,00%	201.192.870,87				212.918.171,53
TOTAL A.I.U.			36,41%	1.220.790.020,64				1.291.936.328,98
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS								266.567.985,91

Teniendo en cuenta el presupuesto presentado es necesaria una adición al contrato de obra por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($266.567.985,91). Con estos recursos se ejecutarán las actividades descritas para un total de 1724 ml contractuales que brindarán un óptimo funcionamiento, garantía y seguridad vial del tramo.

VIETTA
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.560.635-3

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

Los ajustes del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA", financieramente está representado en una redistribución de costos entre las actividades y la modificación de cantidades, representado en un balance de mayores y menores cantidades, e inclusión de actividades nuevas NP-01 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) Y CEMENTO, NP-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT DE 6", NP-03 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) y NP-04 DREN TIPO FRANCES (DIMENSIONES 0.5M X 0.7M). Lo anterior, modifica el valor total del proyecto.

Teniendo en cuenta que, para la presente solicitud de adición en valor al contrato de la referencia, se contemplan el aumento y disminución de cantidades de obras contractuales e ítems de obra no previstos, del cual se anexa cotización de los materiales no incluidos inicialmente, pero los demás precios unitarios corresponden a la vigencia en la cual el contrato fue suscrito.

Así mismo, vale la pena resaltar que la solicitud de adición corresponde a:
1724 ML $266.567.985,91

Teniendo en cuenta que esta es una obra que ya está en ejecución y que la necesidad presentada conlleva a la terminación y puesta en funcionamiento de esta obra con los alcances puntuales previstos en el objeto contractual, tenemos que la alternativa de solución para esta necesidad sea la ejecución de las mayores y menores cantidades de obra que fueron cuantificadas por el contratista, verificadas y autorizadas por la interventoría y puestas a consideración de la supervisión.

Dichas modificaciones son presentadas por VIETTA CONSTRUCCIONES SAS a la interventoría con sus respectivos soportes técnicos y consignados dentro de unas cantidades de obra con memorias de cálculo, planos y presupuesto.

KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.560.635-3


CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025
Nit: 901.968.878-2

INFORME TECNICO, FINANCERO Y JURIDICO

SOLICITUD ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 1868-2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1820-2025

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA"

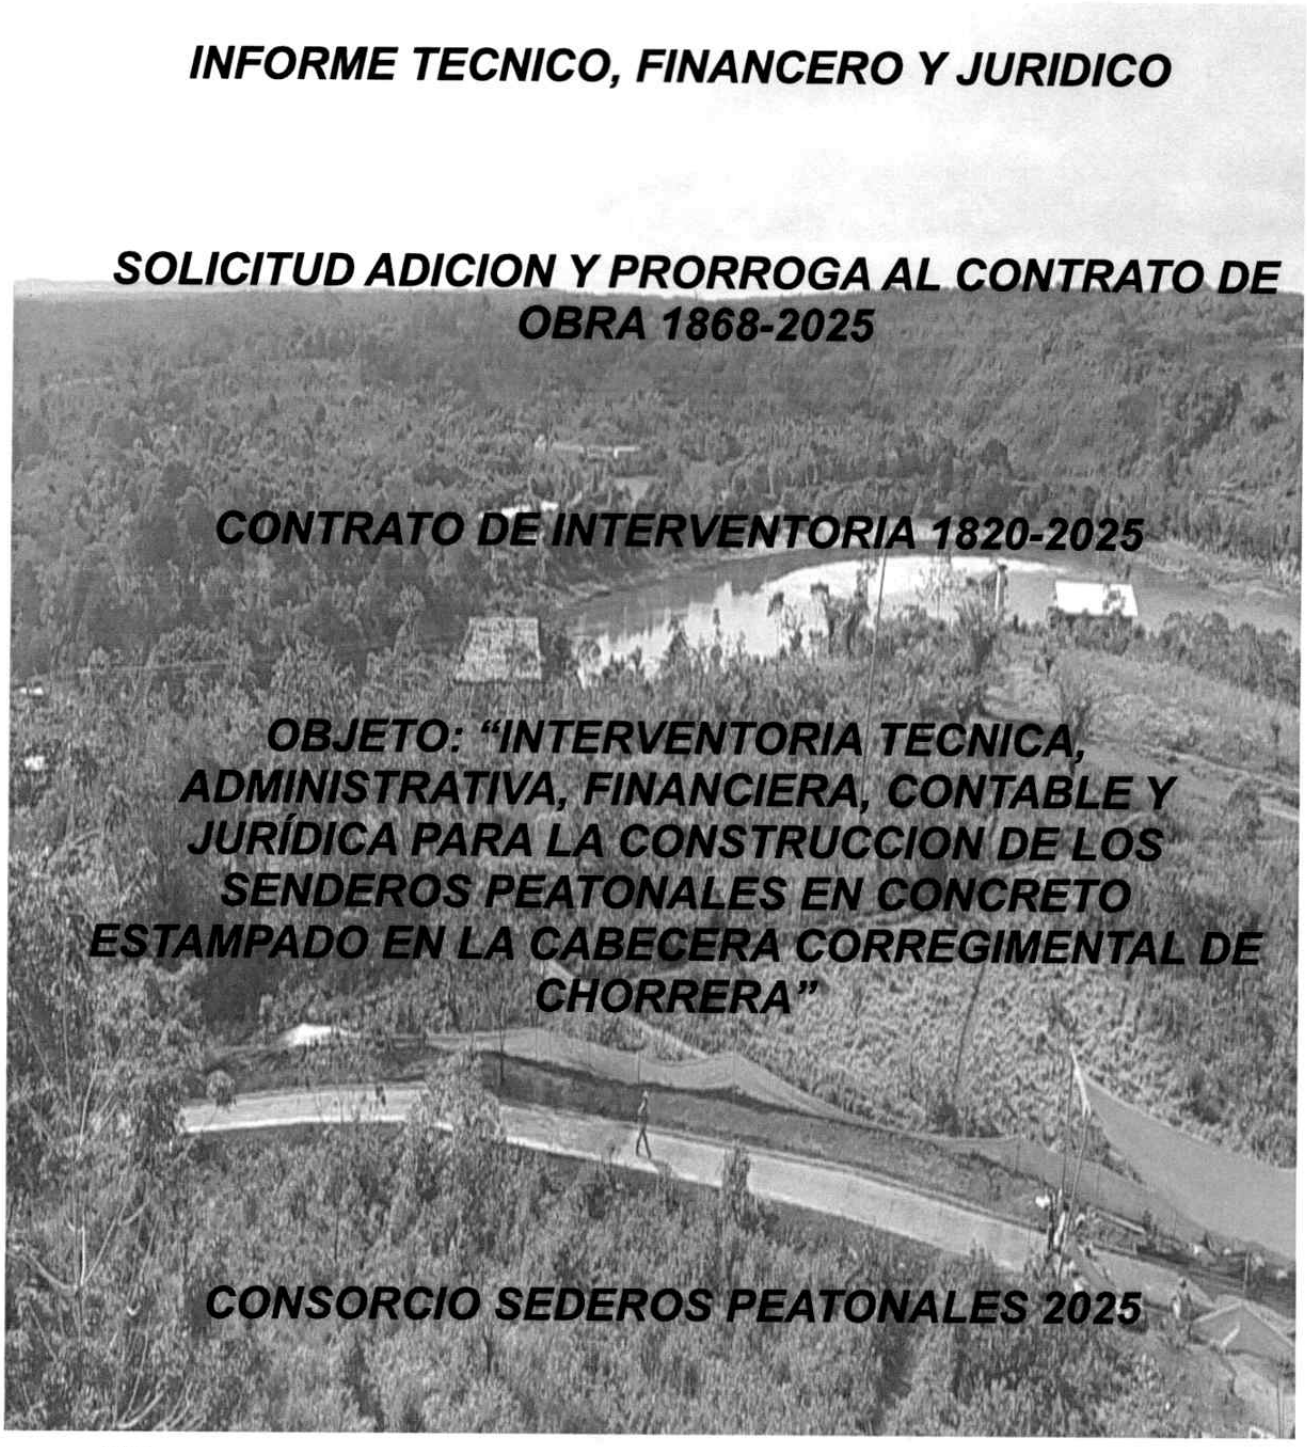

CONSORCIO SEDEROS PEATONALES 2025

"Este documento y sus anexos ha sido impreso en papel con el Sello Ambiental Colombiano, en apoyo a los procesos de producción limpia y eficiencia en el uso de recursos"

Calle 58 No.11-92 Of. 201-Edificio Florencia B/La Castellana – Montería - Córdoba; Tel: (4) 7866175
Correo electrónico: inter.senderospeatonales@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL 3
1.1 CONTRATO DE OBRA 3
1.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 3
2. ANTECEDENTES 4
3. REVISIÓN Y CONCEPTO TÉCNICO 5
3.1 Análisis de las condiciones de obra 5
3.2 Evaluación de los ítems no previstos 5
4. REVISIÓN Y CONCEPTO JURÍDICO 7
5. REVISIÓN Y CONCEPTO FINANCIERO 8
5.1 Análisis del balance presupuestal 8
5.2 Evaluación del AIU 8
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8
7.1 CONCLUSIONES 8
7.2 RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD CONTRATANTE 9

1. INFORMACION GENERAL

1.1 CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	1868-2025
CONTRATISTA:	VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit: 900.560.635-3 Representante Legal: Karen Dayana Caicedo Patiño
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	5/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025
SUSPENSION No 1	26/12/2025
Tiempo suspensión No 1	45 días calendarios
Fecha Reinicio No 1	9/02/2026
FECHA DE TERMNINACION ACTUAL	14/02/2026
PLAZO ACTUAL (*incluido prorrogas*)**:**	CINCO (5) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	CIENTO CUARENTA (140) DIAS
VALOR INICIAL:	$ 4.574.004.535,19
VALOR ADICIONES:	N/A
ANTICIPO:	$ 2.287.002.267,60
VALOR ACTUAL (*Incluido adiciones*)**:**	$ 4.574.004.535,19

1.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	1820-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
FECHA DE INICIO:	5/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025
SUSPENSION No 1	26/12/2025
Tiempo suspensión No 1	45 días calendarios
Fecha Reinicio No 1	9/02/2026
FECHA DE TERMNINACION ACTUAL	14/02/2026
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*)**:**	CINCO (5) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	CIENTO CUARENTA (140) DIAS
VALOR INICIAL:	$ 276.631.970,97
VALOR ADICIONES:	N/A
ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*)**:**	$ 276.631.970,97

2. ANTECEDENTES

El 19 de diciembre de 2025, el Contratista de Obra presentó a la Interventoría informe mediante el cual solicita el análisis y aval de ajustes técnicos, jurídicos y financieros al proyecto, los cuales incluyen:

- Modificación de cantidades de obra (mayores y menores cantidades).
- Inclusión de ítems no previstos.
- Solicitud de prórroga del plazo contractual.
- Solicitud de adición presupuestal, planteada bajo dos escenarios: ejecución de 1.724 ml (meta contractual) y ejecución de 1.788 ml (meta física total identificada en campo).
- Del 20 al 22 de enero de 2026, se realiza entre las partes visita al sitio del proyecto con el fin de evaluar las necesidades de mayores cantidades e item no previstos requeridos en el proyecto y presentados en el balance de obra presentado por el contratista y aprobado por la interventoría.
- De acuerdo a la disponibilidad presupuestal informada por la entidad contratante se define considerar el balance con meta física 1724ml conforme a la meta contractual.

La Interventoría, en cumplimiento de sus funciones contractuales y legales, procede a realizar la revisión técnica, jurídica y financiera del documento presentado.

3. REVISIÓN Y CONCEPTO TÉCNICO

3.1 Análisis de las condiciones de obra

De la revisión del documento y de los soportes técnicos presentados, la Interventoría evidencia que los ajustes solicitados se fundamentan en condiciones reales encontradas durante la ejecución, entre ellas:

- Condiciones topográficas y geotécnicas no previsibles al momento de la estructuración contractual, tales como fallos del terreno, presencia de afloramientos rocosos, pendientes pronunciadas y flujos permanentes de agua.
- Necesidad de optimizar el sistema de drenaje mediante pases de tubería, cajas de inspección y drenes tipo francés.
- Requerimiento de mejoramiento de la subrasante para garantizar la estabilidad estructural de las placas de concreto y la durabilidad de la obra.

3.2 Evaluación de los ítems no previstos

La Interventoría revisó los ítems no previstos propuestos por el Contratista, concluyendo lo siguiente:

- NP-01 Mejoramiento de la subrasante con suelo-cemento: Técnicamente procedente, dada la evidencia de fallos del terreno y la necesidad de asegurar la capacidad portante de la subrasante.
- NP-02 Suministro e instalación de tubería Novafort de 6": Justificado para el control hidráulico y la adecuada evacuación de aguas superficiales y subterráneas.
- NP-03 Relleno con material seleccionado y compactado: Requerido para el confinamiento lateral de cunetas y prevención de socavaciones.
- NP-04 Dren tipo francés: Técnicamente necesario en los tramos con presencia de flujo permanente de agua.


Los ítems no previstos no modifican el objeto contractual, sino que lo complementan para garantizar su correcta ejecución y funcionalidad.

Adicional a lo anterior, en comité de seguimiento realizado el 26 de noviembre de 2025, el contratista de obra expone ante la entidad contratante e interventoría con fotos y videos, los soportes de las situaciones técnicas surgidas en el proyecto que originan la realización del balance de mayores, menores e item no previstos, situación que ha venido siendo informada por esta interventoría a la entidad mediante informes semanales y mensuales.





Se requeire construir pases de agua en tuberia de acuerdo a las condiciones de redes existentes y manejo de aguas

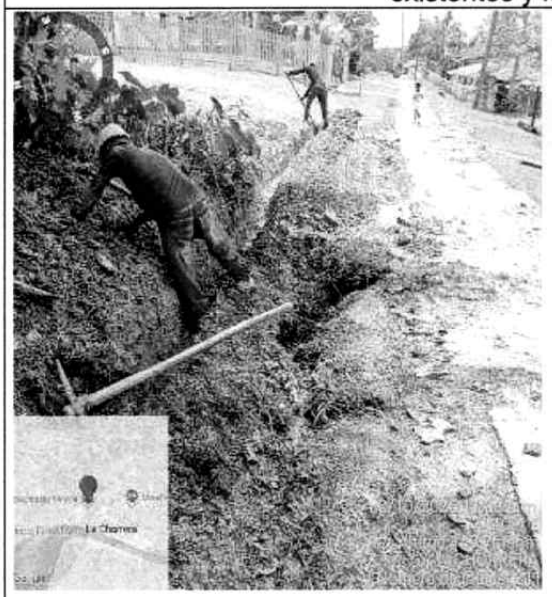



Se requiere de mejoramientos de la subrasante en suelo cemento debido a fallos encontrados en el terreno que deben ser retirados para estabilidad de la estructura, lo que genero mayores cantidades de excavación y obra adicional de mejoramiento suelo – cemento.




Se requeriré de relleno lateral de cunetas con material de sitio para confinamiento y evitar futuras socavaciones y daños en las placas de concreto





Se evidenció flujo permanente de agua en varios tramos, por lo que es necesario realizar estos drenes, para garantizar la estabilidad de la estructura

4. REVISIÓN Y CONCEPTO JURÍDICO

La Interventoría analizó la solicitud a la luz del marco normativo aplicable, particularmente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, así como las cláusulas contractuales vigentes.

Se concluye lo siguiente:

- Las modificaciones propuestas corresponden a ajustes por mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, figuras permitidas dentro de la ejecución contractual, siempre que no se altere el objeto del contrato.
- El objeto contractual se mantiene inalterado, dado que las actividades adicionales están directamente relacionadas con la construcción de senderos peatonales en

concreto estampado.

- La solicitud de prórroga se encuentra motivada en causas técnicas, logísticas y sociales debidamente expuestas, las cuales no son atribuibles exclusivamente al Contratista.
- La adición presupuestal solicitada se enmarca en los límites legales, condicionada a la disponibilidad presupuestal y a la aprobación por parte de la entidad contratante.

5. REVISIÓN Y CONCEPTO FINANCIERO

5.1 Análisis del balance presupuestal

La Interventoría revisó los presupuestos presentados por el Contratista, verificando:

- Correcta aplicación de los precios unitarios contractuales vigentes.
- Inclusión de nuevos precios unitarios debidamente soportados mediante cotizacio nes.
- Coherencia entre cantidades ejecutadas, cantidades ajustadas y memorias de cál culo.

El escenario financiero presentado es el siguiente:

- 1.724 ml: Adición presupuestal de $266.567.985,91.

5.2 Evaluación del AIU

La estructura del AIU aplicada en los ajustes mantiene los porcentajes contractuales apr obados inicialmente, sin evidenciar incrementos injustificados en administración, imprevi stos o utilidad.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Desde el punto de vista técnico, la Interventoría considera que los ajustes planteados por el Contratista se encuentran debidamente justificados, se soportan en condiciones reales de obra y son necesarios para asegurar la estabilidad, funcionalidad y vida útil de los senderos peatonales.

desde el punto de vista jurídico, la Interventoría considera viable la tramitación de la mo dificación contractual solicitada, previo cumplimiento de los requisitos legales y administ rativos correspondientes.

Desde el punto de vista financiero, la Interventoría considera que los valores solicitados se encuentran debidamente sustentados, corresponden a necesidades reales del proye cto y guardan proporcionalidad con los ajustes técnicos propuestos.

7.2 RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD CONTRATANTE

Con fundamento en la revisión técnica, jurídica y financiera realizada al documento pres entado por el Contratista de Obra, la Interventoría formula las siguientes recomendacion es a la Gobernación del Amazonas, en su calidad de Entidad Contratante:

1. Avalar la procedencia técnica de los ajustes solicitados, toda vez que estos responden a condiciones reales identificadas durante la ejecución del proyecto y resultan necesarios para garantizar la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de los senderos peatonales.
2. Considerar el balance presupuestal que arroja un adición de $266.567.985,91 correspondiente a los 1.724 ml contractuales, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal.
3. Autorizar la inclusión de los ítems no previstos (NP-01, NP-02, NP-03 y NP-04), dado que estos no modifican el objeto contractual y se encuentran debidamente justificados técnica y financieramente.
4. Tramitar la adición presupuestal correspondiente, previo certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y cumplimiento de los requisitos administrativos, financieros y legales exigidos por la normativa vigente.
5. Aprobar la prórroga del plazo contractual solicitada de 2.5 meses, condicionada conforme al cronograma de obra ajustado, que contempla de manera realista los rendimientos, las condiciones logísticas del territorio y la disponibilidad de mano de obra local.
6. Formalizar las modificaciones contractuales mediante otrosí, en el cual se incorporen de manera expresa las mayores y menores cantidades, los ítems no previstos, el nuevo valor contractual y el plazo ajustado.

Atentamente,

Boris Cassab B.

Boris Nicolás Cassab Barreto
Director Interventoría

VIETTA CONSTRUCCIONES

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS

BALANCE No. 1 **TIPO DE CONTRATO:** OBRA.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

CONTRATISTA : VIETTA CONSTRUCCIONES SAS **CONTRATO No.** CONTRATO DE OBRA 1868 de 2025.

INTERVENTOR: CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025 **CONTRATO No.** CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1820 de 2025.

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.931,00	10.326,73	50.921.089,62		-25,18	-	-260.026,98	4.905,82	50.661.062,64
2,0	DEMOLICIÓN MANUAL DE EXTRUCTURAS EXISTENTE	M3	114,00	345.776,24	39.418.490,92		-29,08	-	-10.055.172,95	84,92	29.363.317,98
3,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M3	449,00	155.830,03	69.967.685,52	521,24		81.224.847,22	-	970,24	151.192.532,73
4,0	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES	M2	4.931,00	15.961,14	78.704.362,00		-224,16	-	-3.577.848,26	4.706,84	75.126.513,74
5,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	367,00	2.058.728,68	755.553.424,65		-7,64	-	-15.728.687,10	359,36	739.824.737,55
6,0	ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5	KL	5.875,00	38.663,35	227.147.168,89	370,03		14.306.598,62	-	6.245,03	241.453.767,51
7,0	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	M3	293,00	3.163.935,95	927.033.233,27	5,13		16.230.991,42	-	298,13	943.264.224,69
8,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.448,00	110.022,60	379.357.917,04	18,00		1.980.406,76	-	3.466,00	381.338.323,79
9,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.448,00	293.515,41	1.012.041.116,62	18,00		5.283.277,29	-	3.466,00	1.017.324.393,91
10,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.483,00	289.756,11	1.009.220.525,87		-134,58	-	-38.995.377,08	3.348,42	970.225.148,79
11,0	DILATACIÓN DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)	ML	1.724,00	14.292,07	24.639.520,79			-	-	1.724,00	24.639.520,79
	ÍTEMS NO PREVISTOS										
NP-01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION) Y CEMENTO	M3		578.840,39	-	329,09		190.490.583,95	-	329,09	190.490.583,95
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 6"	ML		190.102,16	-	33,00		6.273.371,28	-	33,00	6.273.371,28
NP-03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	M3		217.857,41	-	51,72		11.267.585,25	-	51,72	11.267.585,25
NP-04	DREN TIPO FRANCES (DIMENSIONES 0.5M X 0.7M)	ML		451.524,25	-	18,00		8.127.436,50	-	18,00	8.127.436,50
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**4.574.004.535,19**			**335.185.098,28**	**-68.617.112,37**		**4.840.572.521,10**
DISCRIMINACIÓN DEL AIU.											
VALOR BASICO					**3.353.214.514,55**						**3.548.636.192,12**
ADMINISTRACIÓN				**29,41%**	**986.065.004,61**						**1.043.531.795,52**
IMPREVISTOS				**1,00%**	**33.532.145,16**						**35.486.361,93**
UTILIDAD				**6,00%**	**201.192.870,87**						**212.918.171,53**
TOTAL A.I.U.				**36,41%**	**1.220.790.020,64**						**1.291.936.328,98**

DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS **266.567.985,91**

NOTA : La Interventoría revisa y valida el balance de mayores y menores cantidades actualizadas y los ítems no previstos de la presente acta, lo anterior para tramite ante la entidad.

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: David Leonardo Rozo Gasca
DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: Boris Nicolas Cassab
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD
1		M2



Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM	1.596,00	2,86		1,00	4.564,56
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL AL INTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA TERESITA	128,00	2,86		1,00	366,08
DESCUENTO CUNETAS					
ABS K0+290 A K0+302,46 (IZQUIERDA)	12,46	0,43		-1,00	-5,36
ABS K0+448,14 A K0+461,25 (DERECHA)	13,11	0,43		-1,00	-5,64
ABS K0+506 A ABS K0+527,61 (IZQUIERDA)	21,61	0,43		-1,00	-9,29
ABS K0+552,59 A K0+570 (IZQUIERDA)	17,41	0,43		-1,00	-7,49
ABS K0+580 A K0+614,99 (IZQUIERDA)	34,99	0,43		-1,00	-15,05
Bocacalles					
ABS K0+000 A K0+002 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	2,00		2,00	2,00
ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+192 A K0+194 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	2,00		2,00	2,00
ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+350 A K0+352 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	2,00		2,00	2,00
ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+842 A K0+844 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	2,00		2,00	2,00
ABS K0+1420 A K0+1444 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	2,00		2,00	2,00
TOTAL					**4.905,82**


Elaboro	Firma
David Leonardo Rozo Gasca Director de Obra	

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item		UNIDAD
2	DEMOLICIÓN MANUAL DE EXTRUCTURAS EXISTENTE	M3

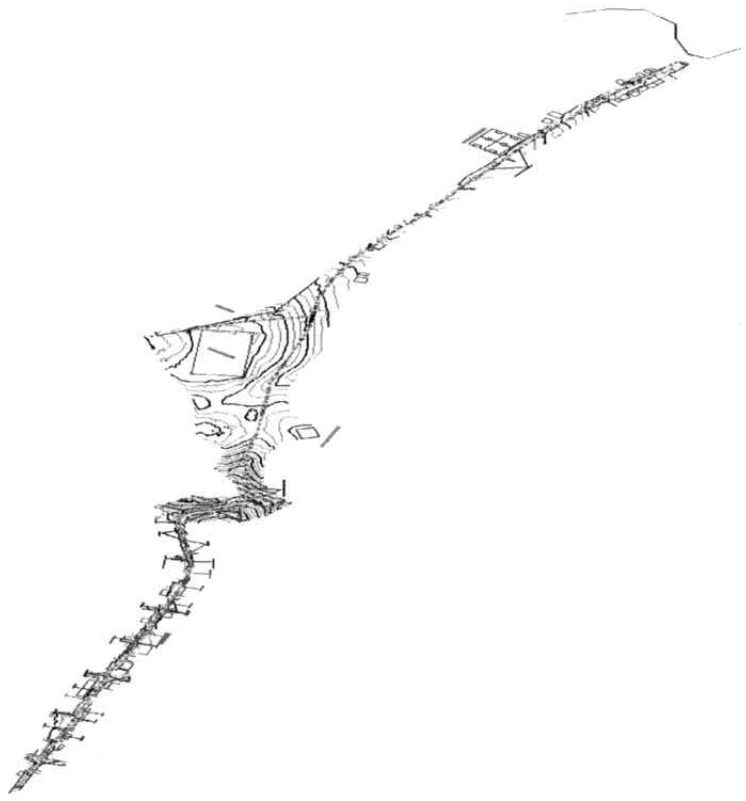

Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
K0+000 A K0+190 (PLACA)	190,00	1,50	0,10	1,00	28,50
K0+350 A K0+390 (PLACA)	40,00	1,50	0,10	1,00	6,00
K0+360 A K0+365 (VIGA)	5,00	0,20	0,20	2,00	0,40
K0+360 A K0+365 (COLUMNAS)	0,20	0,20	1,50	4,00	0,24
K0+360 A K0+365 (ZAPATAS)	0,20	0,20	0,40	4,00	0,06
K0+345 A K0+350 (PLACA)	5,00	1,10	0,18	1,00	0,99
K0+190 A K0+345 (PLACA)	155,00	1,50	0,10	1,00	23,25
K0+390 A K0+420 (PLACA)	30,00	1,50	0,16	1,00	7,20
K0+420 A K0+540 (PLACA)	120,00	1,50	0,10	1,00	18,00
K0+506 a K0+520	14,00	0,20	0,10	1,00	0,28
TOTAL					84,92


Elaboro	Firma
David Leonardo Rozo Gasca Director de Obra	

VIETTA CONSTRUCCIONES


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS	UNIDAD
3		M3

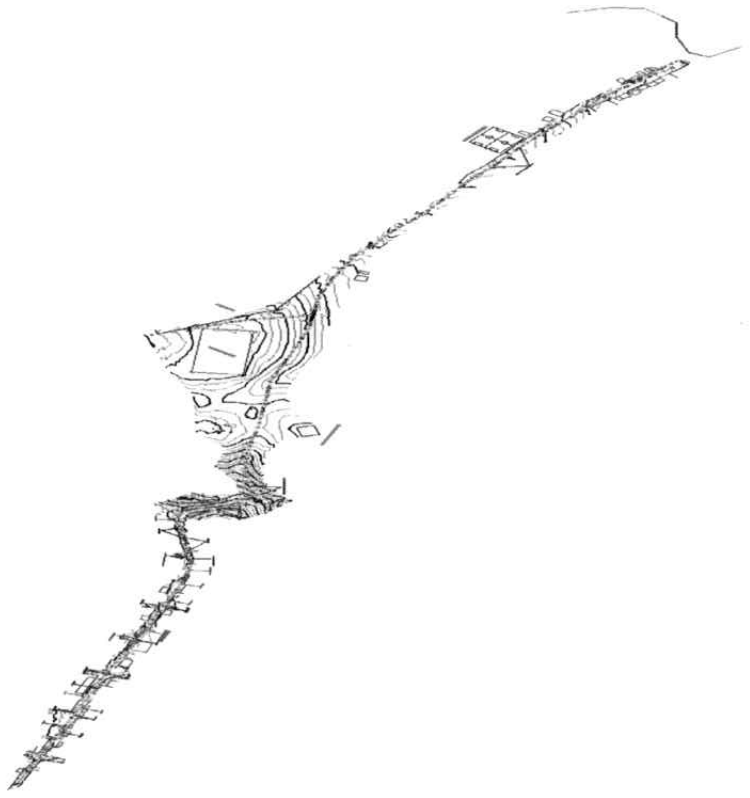

Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
CARTERA	1.596,00			799,52	799,52
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL AL INTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA TERESITA					
CARTERA	128,00			75,98	75,98
FALLOS					
K0+290 A K0+340 (MARGEN DERECHA FALLO)	50,00	1,00	0,40	1,00	20,00
K0+365 A K0+367 (MARGEN DERECHA FALLO)	2,00	2,30	1,70	1,00	7,82
K0+367 A K0+377 (MARGEN DERECHA FALLO)	10,00	1,80	0,60	1,00	10,80
K0+629 A K0+632 (FALLO)	3,00	2,86	0,50	1,00	4,29
K0+645 A K0+650 (FILTROS)	0,50	5,00	0,70	1,00	1,75
K0+645 A K0+650 (FILTROS)	0,50	6,00	0,70	1,00	2,10
K0+645 A K0+650 (FILTROS)	0,50	7,00	0,70	1,00	2,45
K0+840 A K0+860 (FALLO)	20,00	1,70	0,15	1,00	5,10
K1+060 A K1+080 (FALLO)	20,00	1,70	0,15	1,00	5,10
K1+120 A K1+130 (FALLO RAIZ ARBOL)	10,00	3,00	0,60	1,00	18,00
K0+430 A K0+436 (FALLO) MEJORAMIENTO	6,00	2,86	0,40	1,00	6,86
Excavacion de Cajas de Inspeccion	0,80	0,80	0,80	11,00	5,63
Cajas de 80x80 completa proyectadas	0,80	0,10	0,80	3,00	0,96
Bocacalles Placa					
ABS K0+000 A K0+002 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,20	2,00	0,34
ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA)	0,50	1,70	0,20	1,00	0,17
ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA)	0,50	1,70	0,20	1,00	0,17
ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,20	1,00	0,17
ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,20	1,00	0,17
ABS K0+192 A K0+194 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,20	2,00	0,34
ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,20	1,00	0,17
ABS K0+350 A K0+352 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,20	2,00	0,34
ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,20	1,00	0,17
ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,20	1,00	0,17
ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA)	0,50	1,70	0,20	1,00	0,17
ABS K0+842 A K0+844 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,20	2,00	0,34
ABS K0+1420 A K0+1444 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,20	2,00	0,34



Bocacalles bordillos de confinamiento					
ABS K0+000 A K0+002 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	0,15	0,30	4,00	0,09
ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA)	0,50	0,15	0,30	2,00	0,05
ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA)	0,50	0,15	0,30	2,00	0,05
ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA)	0,50	0,15	0,30	2,00	0,05
ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA)	0,50	0,15	0,30	2,00	0,05
ABS K0+192 A K0+194 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	0,15	0,30	4,00	0,09
ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA)	0,50	0,15	0,30	2,00	0,05
ABS K0+350 A K0+352 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	0,15	0,30	4,00	0,09
ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA)	0,50	0,15	0,30	2,00	0,05
ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA)	0,50	0,15	0,30	2,00	0,05
ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA)	0,50	0,15	0,30	2,00	0,05
ABS K0+842 A K0+844 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	0,15	0,30	4,00	0,09
ABS K0+1420 A K0+1444 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	0,15	0,30	4,00	0,09
TOTAL					**970,24**

Elaboro	**Firma**
David Leonardo Rozo Gasca Director de Obra	

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Ítem	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES	UNIDAD
4		M2



Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
PLACA	1.596,00	1,70		1,00	2.713,20
BORDILLO	1.596,00	0,15		2,00	478,80
CUNETA	1.596,00	0,37		2,00	1.181,04
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL AL INTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA TERESITA					
PLACA	128,00	1,70		1,00	217,60
BORDILLO	128,00	0,15		2,00	38,40
CUNETA	128,00	0,37		2,00	94,72
TRAMO ADICIONAL					
PLACA					
BORDILLO					
CUNETA					
DESCUENTO CUNETAS					
ABS K0+290 A K0+302,46 (IZQUIERDA)	12,46	0,37		-1,00	-4,61
ABS K0+448,14 A K0+461,25 (DERECHA)	13,11	0,37		-1,00	-4,85
ABS K0+506 A ABS K0+527,61 (IZQUIERDA)	21,61	0,37		-1,00	-8,00
ABS K0+552,59 A K0+570 (IZQUIERDA)	17,41	0,37		-1,00	-6,44
ABS K0+580 A K0+614,99 (IZQUIERDA)	34,99	0,37		-1,00	-12,95
Bocacalles					
ABS K0+000 A K0+002 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70		2,00	1,70
ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA)	0,50	1,70		1,00	0,85
ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA)	0,50	1,70		1,00	0,85
ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA)	0,50	1,70		1,00	0,85
ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA)	0,50	1,70		1,00	0,85
ABS K0+192 A K0+194 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70		2,00	1,70
ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA)	0,50	1,70		1,00	0,85
ABS K0+350 A K0+352 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70		2,00	1,70
ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA)	0,50	1,70		1,00	0,85
ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA)	0,50	1,70		1,00	0,85
ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA)	0,50	1,70		1,00	0,85
ABS K0+842 A K0+844 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70		2,00	1,70
ABS K0+1420 A K0+1444 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70		2,00	1,70
Bocacalles bordillos de confinamiento					
K0+001	2,20	0,15		2,00	0,66

K0+98	2,20	0,15		1,00	0,33
K0+103	2,20	0,15		1,00	0,33
K0+161	2,20	0,15		1,00	0,33
K0+192	2,20	0,15		2,00	0,66
K0+350	2,20	0,15		1,00	0,33
K0+350	2,20	0,15		1,00	0,33
K0+463	2,20	0,15		1,00	0,33
K0+543	2,20	0,15		1,00	0,33
K0+830	2,20	0,15		2,00	0,66
K1+040	2,20	0,15		1,00	0,33
TOTAL					**4.706,84**

Elaboro David Leonardo Rozo Gasca Director de Obra	**Firma**

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	UNIDAD
5		M3



Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
PLACA	1.596,00	1,70	0,10	1,00	271,32
CUNETA	1.596,00	0,37	0,05	2,00	59,05
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL AL INTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA TERESITA					
PLACA	128,00	1,70	0,10	1,00	21,76
CUNETA	128,00	0,37	0,05	2,00	4,74
TRAMO ADICIONAL					
PLACA					
CUNETA					
DESCUENTO CUNETAS					
ABS K0+290 A K0+302,46 (IZQUIERDA)	12,46	0,37	0,05	-1,00	-0,23
ABS K0+448,14 A K0+461,25 (DERECHA)	13,11	0,37	0,05	-1,00	-0,24
ABS K0+506 A ABS K0+527,61 (IZQUIERDA)	21,61	0,37	0,05	-1,00	-0,40
ABS K0+552,59 A K0+570 (IZQUIERDA)	17,41	0,37	0,05	-1,00	-0,32
ABS K0+580 A K0+614,99 (IZQUIERDA)	34,99	0,37	0,05	-1,00	-0,65
Bocacalles					
ABS K0+000 A K0+002 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,10	2,00	0,17
ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+192 A K0+194 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,10	2,00	0,17
ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+350 A K0+352 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,10	2,00	0,17
ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+842 A K0+844 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,10	2,00	0,17
ABS K0+1420 A K0+1444 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,10	2,00	0,17
Bocacalles bordillos de confinamiento					
K0+001	2,00	0,50	0,10	2,00	0,20
K0+98	2,00	0,50	0,10	1,00	0,10
K0+103	2,00	0,50	0,10	1,00	0,10
K0+161	2,05	1,47	0,10	1,00	0,30

K0+192	2,00	0,50	0,10	2,00	0,20
K0+350	2,00	0,50	0,10	1,00	0,10
K0+350	2,00	1,83	0,10	1,00	0,37
K0+463	2,00	0,50	0,10	1,00	0,10
K0+543	5,20	2,00	0,10	1,00	1,04
K0+830	2,00	0,50	0,10	2,00	0,20
K1+040	2,00	0,50	0,10	1,00	0,10
TOTAL					**359,36**


Elaboro David Leonardo Rozo Gasca Director de Obra	**Firma**

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item	ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5	UNIDAD
6		KL

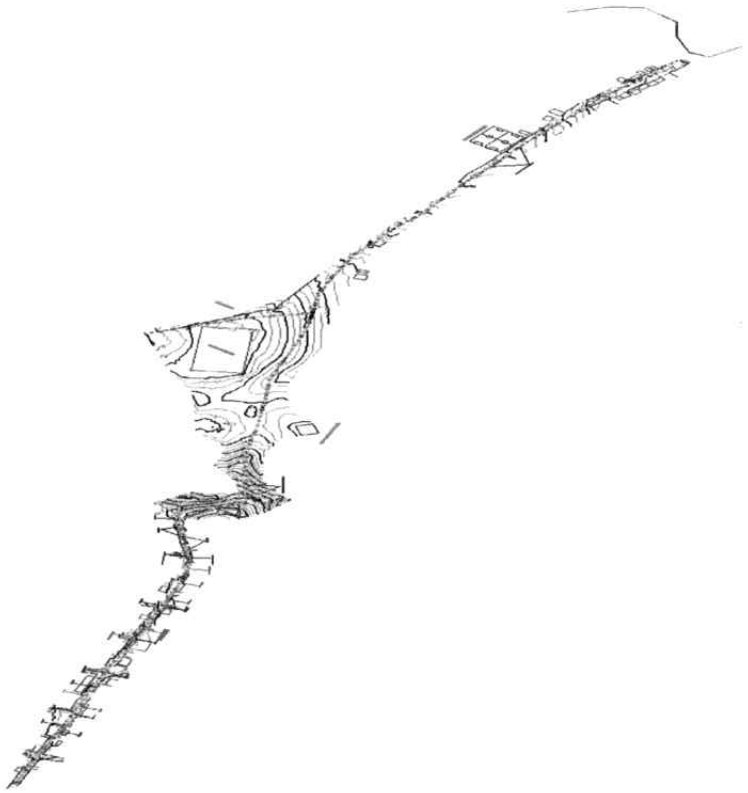

Descripción	Largo	Ancho	Peso (kg/m2	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
PLACA	1.596,00	1,70	2,08	1,00	5.643,46
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL AL INTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA TERESITA					
PLACA	128,00	1,70	2,08	1,00	452,61
TRAMO ADICIONAL					
PLACA					
Malla para cajas de inspección	3,20	1,60	2,08	11,00	117,15
Bocacalles					
ABS K0+000 A K0+002 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	2,08	2,00	3,54
ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA)	0,50	1,70	2,08	1,00	1,77
ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA)	0,50	1,70	2,08	1,00	1,77
ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	2,08	1,00	1,77
ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	2,08	1,00	1,77
ABS K0+192 A K0+194 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	2,08	2,00	3,54
ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	2,08	1,00	1,77
ABS K0+350 A K0+352 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	2,08	2,00	3,54
ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	2,08	1,00	1,77
ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	2,08	1,00	1,77
ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA)	0,50	1,70	2,08	1,00	1,77
ABS K0+842 A K0+844 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	2,08	2,00	3,54
ABS K0+1420 A K0+1444 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	2,08	2,00	3,54
TOTAL					**6.245,03**

Elaboro	Firma
David Leonardo Rozo Gasca Director de Obra	


VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item		UNIDAD
7	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	M3





Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
PLACA	1.596,00	1,70	0,10	1,00	271,32
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL AL INTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA TERESITA					
PLACA	128,00	1,70	0,10	1,00	21,76
TRAMO ADICIONAL					
PLACA					
Cajas de 80x80 completa 135 274 403 466	0,80	0,10	0,80	4,00	1,28
Cajas en V k0+348	0,80	0,10	0,80	1,00	0,32
Cajas de 80x80 sin tapa 294 403 436	0,80	0,10	0,80	3,00	0,96
Cajas de 80x80 completa proyectadas	0,80	0,10	0,80	3,00	0,96
Bocacalles					
ABS K0+000 A K0+002 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,10	2,00	0,17
ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+192 A K0+194 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,10	2,00	0,17
ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+350 A K0+352 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,10	2,00	0,17
ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA)	0,50	1,70	0,10	1,00	0,09
ABS K0+842 A K0+844 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,10	2,00	0,17
ABS K0+1420 A K0+1444 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	1,70	0,10	2,00	0,17
TOTAL					**298,13**

Elaboro

David Leonardo Rozo Gasca
Director de Obra


Firma

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	UNIDAD
8		M2

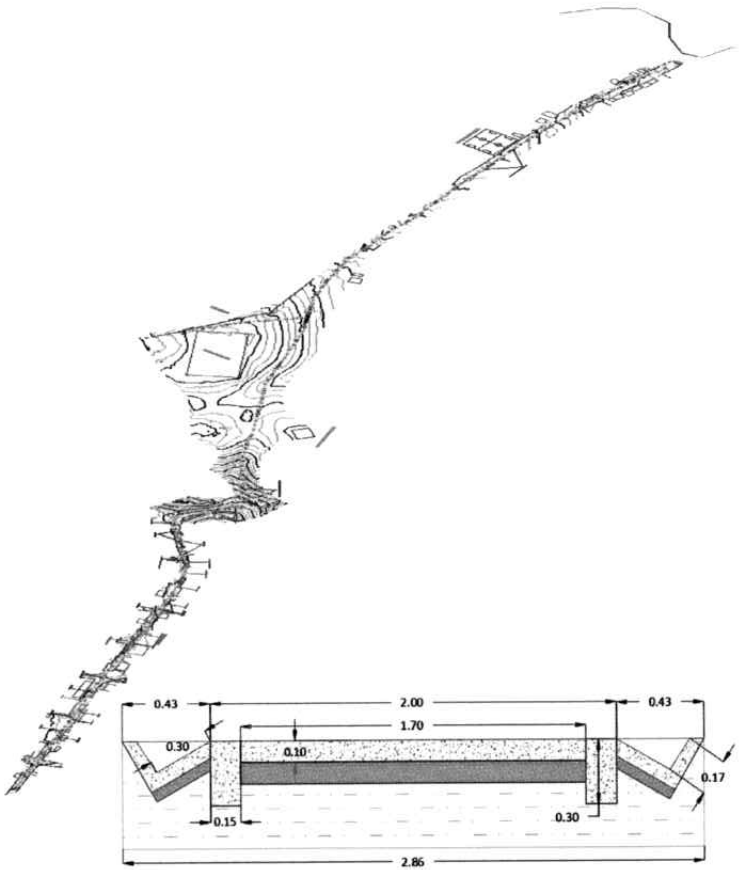

Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
PLACA	1.596,00	2,00		1,00	3.192,00
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL AL INTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA TERESITA					0,00
PLACA	128,00	2,00		1,00	256,00
TRAMO ADICIONAL					0,00
PLACA					
Bocacalles					
ABS K0+000 A K0+002 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	2,00		2,00	2,00
ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+192 A K0+194 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	2,00		2,00	2,00
ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+350 A K0+352 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	2,00		2,00	2,00
ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA)	0,50	2,00		1,00	1,00
ABS K0+842 A K0+844 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	2,00		2,00	2,00
ABS K0+1420 A K0+1444 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50	2,00		2,00	2,00
TOTAL					**3.466,00**


Elaboro	Firma
David Leonardo Rozo Gasca Director de Obra	

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	UNIDAD
9		ML

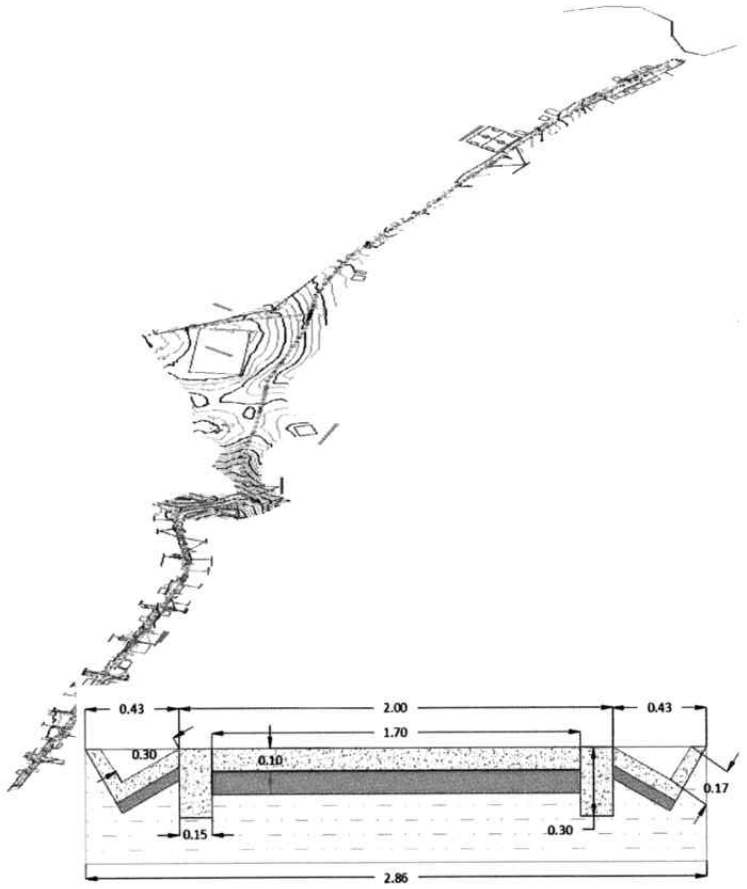

Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
BORDILLO	1.596,00			2,00	3.192,00
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL AL INTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA TERESITA					
BORDILLO	128,00			2,00	256,00
TRAMO ADICIONAL					
BORDILLO					
Bocacalles					
ABS K0+000 A K0+002 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50			4,00	2,00
ABS K0+056 A K0+058 (DERECHA)	0,50			2,00	1,00
ABS K0+096 A K0+098 (DERECHA)	0,50			2,00	1,00
ABS K0+102 A K0+104 (IZQUIERDA)	0,50			2,00	1,00
ABS K0+160 A K0+162 (IZQUIERDA)	0,50			2,00	1,00
ABS K0+192 A K0+194 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50			4,00	2,00
ABS K0+271 A K0+273 (IZQUIERDA)	0,50			2,00	1,00
ABS K0+350 A K0+352 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50			4,00	2,00
ABS K0+463 A K0+465 (IZQUIERDA)	0,50			2,00	1,00
ABS K0+540 A K0+542 (IZQUIERDA)	0,50			2,00	1,00
ABS K0+554 A K0+556 (DERECHA)	0,50			2,00	1,00
ABS K0+842 A K0+844 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50			4,00	2,00
ABS K0+1420 A K0+1444 (IZQUIERDA Y DERECHA)	0,50			4,00	2,00
TOTAL					**3.466,00**


Elaboro	Firma
David Leonardo Rozo Gasca Director de Obra	

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	UNIDAD
10		ML

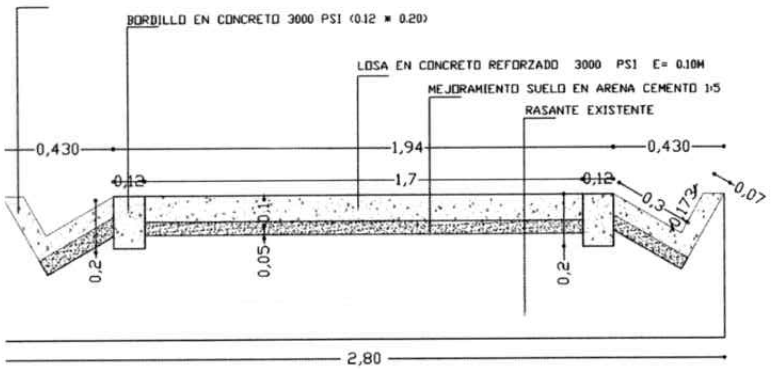

SECCION TRANSVERSAL SENDERO

Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
CUNETA	1.596,00			2,00	3.192,00
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL AL INTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA TERESITA					
CUNETA	128,00			2,00	256,00
TRAMO ADICIONAL					
CUNETA					
DESCUENTO CUNETAS					
ABS K0+290 A K0+302,46 (IZQUIERDA)	12,46			-1,00	-12,46
ABS K0+448,14 A K0+461,25 (DERECHA)	13,11			-1,00	-13,11
ABS K0+506 A ABS K0+527,61 (IZQUIERDA)	21,61			-1,00	-21,61
ABS K0+552,59 A K0+570 (IZQUIERDA)	17,41			-1,00	-17,41
ABS K0+580 A K0+614,99 (IZQUIERDA)	34,99			-1,00	-34,99
TOTAL					**3.348,42**


Elaboro	Firma
David Leonardo Rozo Gasca Director de Obra	

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item	DILATACIÓN DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)	UNIDAD
11		ML

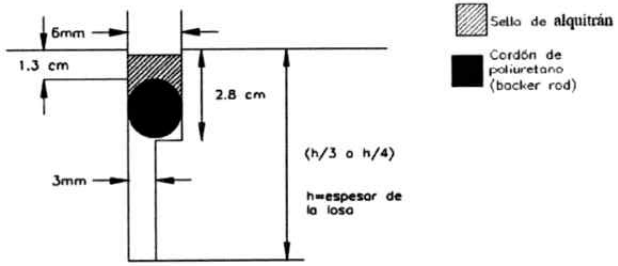

Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
CUNETA	1.596,00	2,00		798,00	1.596,00
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL AL INTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA TERESITA					
CUNETA	128,00	2,00		64,00	128,00
TRAMO ADICIONAL					
CUNETA					

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION) Y CEMENTO	UNIDAD
NP-1		M3









Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
FALLOS					
K0+290 A K0+340 (MARGEN DERECHA FALLO)	50,00	1,00	0,40	1,00	20,00
K0+365 A K0+367 (MARGEN DERECHA FALLO)	2,00	2,30	1,70	1,00	7,82
K0+367 A K0+377 (MARGEN DERECHA FALLO)	10,00	1,80	0,60	1,00	10,80
K0+629 A K0+632 (FALLO)	3,00	2,86	0,50	1,00	4,29
K0+645 A K0+650 (FILTROS)	0,50	5,00	0,70	1,00	1,75
K0+645 A K0+650 (FILTROS)	0,50	6,00	0,70	1,00	2,10
K0+645 A K0+650 (FILTROS)	0,50	7,00	0,70	1,00	2,45
K0+840 A K0+860 (FALLO)	20,00	1,70	0,15	1,00	5,10
K1+060 A K1+080 (FALLO)	20,00	1,70	0,15	1,00	5,10
K1+120 A K1+130 (FALLO RAIZ ARBOL)	10,00	3,00	0,60	1,00	18,00
Relleno mejoramiento tramo k1+070 a k1+180	110,00	2,86	0,80	1,00	251,68
TOTAL					**329,09**

Elaboro

David Leonardo Rozo Gasca
Director de Obra

Firma

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Item		UNIDAD
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 6"	ML







Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
K0+294,70	3,00			1,00	3,00
K0+348,52	3,00			1,00	3,00
K0+364	3,00			1,00	3,00
K0+403,84	3,00			1,00	3,00
K0+432	3,00			1,00	3,00
KO+436	3,00			1,00	3,00
pasos de tubería proyectados	3,00			5,00	15,00
TOTAL					33,00

Elaboro

David Leonardo Rozo Gasca
Director de Obra

Firma

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Ítem		UNIDAD
NP-3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	M3







Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
PLACA	1.596,00	0,20	0,15	1,00	47,88
VIA INTERSECCION DE ACCESO PEATONAL AL INTERNADO DEPARTAMENTAL SANTA TERESITA					
PLACA	128,00	0,20	0,15	1,00	3,84
TOTAL					**51,72**

Elaboro

David Leonardo Rozo Gasca
Director de Obra

Firma

VIETTA CONSTRUCCIONES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA

Ítem	DREN TIPO FRANCES (DIMENSIONES 0.5M X 0.7M)	UNIDAD
NP-4		ML







Descripción	Largo	Ancho	Alto	Cantidad	Subtotal
VIA PEATONAL DESDE LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA HASTA LA COMUNIDAD DE VEGSAM					
K0+645 A K0+645,5 (FILTROS)	5,00			1,00	5,00
K0+647 A K0+647,5 (FILTROS)	6,00			1,00	6,00
K0+699,5 A K0+650 (FILTROS)	7,00			1,00	7,00

Alienación: ANDEN CHORRERA
Grupo de líneas de muestreo: SEC ANDEN
P.K. inicial: 0+000.00
P.K. final: 1+702.39

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Volumen reutilizable (Metros cúbicos)	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)	Vol. reutilizable acumul. (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)	Vol. neto acumul. (Metros cúbicos)
0+000.00	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0
0+010.00	0,69	4,96	4,96	0	0	4,96	0	0	4,95
0+020.00	1,02	8,56	8,56	0	0	13,52	0	0	13,52
0+030.00	1,25	11,32	11,32	0	0	24,84	0	0	24,84
0+040.00	0,76	10,03	10,03	0	0	34,88	0	0	34,87
0+050.00	1,07	9,17	9,17	0	0	44,04	0	0	44,04
0+060.00	0,65	8,59	8,59	0	0,01	52,63	0,01	0,01	52,62
0+070.00	0,27	4,59	4,59	0,01	0,04	57,22	0,05	0,05	57,17
0+080.00	0,59	4,33	4,33	0	0,04	61,55	0,09	0,09	61,46
0+090.00	0,38	4,88	4,88	0	0	66,43	0,09	0,09	66,34
0+100.00	0,58	4,83	4,83	0	0	71,26	0,09	0,09	71,17
0+110.00	0,35	4,68	4,68	0	0	75,94	0,09	0,09	75,85
0+120.00	0,27	3,13	3,13	0	0	79,07	0,1	0,1	78,97
0+130.00	0,31	2,94	2,94	0,01	0,06	82,01	0,16	0,16	81,85
0+140.00	0,44	3,75	3,75	0	0,07	85,76	0,23	0,23	85,53
0+150.00	0,69	5,65	5,65	0	0,01	91,41	0,24	0,24	91,17
0+160.00	0,1	3,98	3,98	0,06	0,28	95,38	0,52	0,52	94,86
0+170.00	0,31	2,05	2,05	0	0,28	97,43	0,8	0,8	96,63
0+180.00	0,37	3,39	3,39	0	0,01	100,82	0,8	0,8	100,01
0+190.00	0,71	5,4	5,4	0	0,01	106,21	0,81	0,81	105,4
0+200.00	0,6	6,57	6,57	0	0,02	112,79	0,83	0,83	111,96
0+210.00	0,68	6,41	6,41	0	0,02	119,19	0,85	0,85	118,35
0+220.00	1	8,4	8,4	0	0	127,6	0,85	0,85	126,75
0+230.00	0,93	9,66	9,66	0	0	137,25	0,85	0,85	136,41
0+240.00	0,35	6,39	6,39	0	0,01	143,65	0,86	0,86	142,79
0+250.00	0,31	3,27	3,27	0,01	0,04	146,92	0,89	0,89	146,03
0+260.00	0,41	3,57	3,57	0	0,04	150,49	0,93	0,93	149,56
0+270.00	1,09	7,48	7,48	0	0,01	157,97	0,95	0,95	157,02
0+280.00	1,02	10,53	10,53	0	0	168,5	0,95	0,95	167,55
0+290.00	0,44	7,28	7,28	0,01	0,06	175,79	1,01	1,01	174,78
0+300.00	0,4	4,17	4,17	0,09	0,51	179,96	1,52	1,52	178,43
0+310.00	0,09	2,42	2,42	0,31	2,01	182,37	3,54	3,54	178,84
0+320.00	0,03	0,59	0,59	0,23	2,7	182,96	6,24	6,24	176,72
0+330.00	0	0,15	0,15	0,91	5,69	183,11	11,92	11,92	171,19
0+340.00	0,16	0,79	0,79	0,14	5,25	183,9	17,18	17,18	166,73
0+350.00	0,53	3,46	3,46	0	0,72	187,36	17,9	17,9	169,47
0+360.00	0,37	4,52	4,52	0	0,02	191,89	17,92	17,92	173,97
0+370.00	0	1,88	1,88	0,51	2,56	193,77	20,48	20,48	173,29
0+380.00	0,86	4,32	4,32	0	2,55	198,09	23,03	23,03	175,05
0+390.00	0,23	5,45	5,45	0,01	0,07	203,54	23,11	23,11	180,43
0+400.00	0,19	2,12	2,12	0,08	0,48	205,66	23,58	23,58	182,08
0+410.00	1,35	7,72	7,72	0	0,4	213,38	23,98	23,98	189,39
0+420.00	0,86	11,04	11,04	0	0	224,42	23,98	23,98	200,44
0+430.00	0,24	5,54	5,54	0	0	229,96	23,98	23,98	205,98
0+440.00	0,24	2,43	2,43	0,01	0,03	232,39	24,01	24,01	208,38
0+450.00	0,4	3,22	3,22	0	0,03	235,61	24,04	24,04	211,57
0+460.00	0,17	2,86	2,86	0,02	0,12	238,48	24,16	24,16	214,32
0+470.00	0,63	4,06	4,06	0,04	0,33	242,54	24,49	24,49	218,05
0+480.00	0,98	8,06	8,06	0,01	0,29	250,59	24,77	24,77	225,82
0+490.00	0,85	9,15	9,15	0,01	0,11	259,74	24,88	24,88	234,86
0+500.00	0,58	7,12	7,12	0	0,03	266,86	24,91	24,91	241,95
0+510.00	0	2,89	2,89	0,25	1,27	269,75	26,18	26,18	243,56
0+520.00	0,78	3,93	3,93	0	1,27	273,67	27,46	27,46	246,22
0+530.00	1,91	13,45	13,45	0	0	287,12	27,46	27,46	259,67
0+540.00	0,11	10,01	10,01	0,32	1,61	297,14	29,07	29,07	268,07
0+550.00	1,17	6,16	6,16	0	1,67	303,3	30,74	30,74	272,55
0+560.00	0,35	7,63	7,63	0	0,01	310,92	30,76	30,76	280,17
0+570.00	0,96	6,54	6,54	0	0,01	317,46	30,77	30,77	286,69
0+580.00	0,45	7,08	7,08	0,04	0,2	324,54	30,98	30,98	293,57
0+590.00	1,93	11,88	11,88	0	0,2	336,43	31,18	31,18	305,25
0+600.00	0,7	12,95	12,95	0	0	349,38	31,18	31,18	318,2
0+610.00	0,71	7,07	7,07	0	0	356,45	31,18	31,18	325,27
0+620.00	0,57	6,39	6,39	0	0	362,84	31,18	31,18	331,66
0+629.03	0,27	3,75	3,75	0,05	0,22	366,6	31,4	31,4	335,2
0+630.00	0,17	1,77	1,77	0,02	0,28	368,37	31,68	31,68	336,68
0+640.00	0,89	5,57	5,57	0	0,1	373,94	31,78	31,78	342,15
0+650.00	0,57	7,28	7,28	0,01	0,04	381,22	31,82	31,82	349,39
0+660.00	0,66	6,15	6,15	0,01	0,08	387,37	31,9	31,9	355,46
0+670.00	1,83	12,37	12,37	0	0,04	399,73	31,95	31,95	367,79
0+680.00	2,32	20,75	20,75	0,03	0,14	420,49	32,09	32,09	388,4
0+690.00	0,94	16,31	16,31	0,34	1,82	436,8	33,91	33,91	402,89
0+700.00	1,73	13,13	13,13	0	1,75	449,93	35,66	35,66	414,27
0+710.00	0,98	13,55	13,55	0,05	0,23	463,48	35,89	35,89	427,59
0+720.00	0,22	5,97	5,97	0,36	2,01	469,45	37,9	37,9	431,55
0+730.00	0,36	2,89	2,89	0,01	1,83	472,35	39,73	39,73	432,61
0+740.00	0,36	3,61	3,61	0	0,05	475,96	39,78	39,78	436,17
0+750.00	0,3	3,29	3,29	0	0	479,25	39,78	39,78	439,46

Alienación: ANDEN CHORRERA
Grupo de líneas de muestreo: SEC ANDEN
P.K. inicial: 0+000.00
P.K. final: 1+702.39

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Volumen reutilizable (Metros cúbicos)	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)	Vol. reutilizable acumul. (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)	Vol. neto acumul. (Metros cúbicos)
0+760.00	0,51	4,05	4,05	0	0	483,3	39,78	39,78	443,51
0+770.00	0,25	3,82	3,82	0	0,01	487,12	39,79	39,79	447,33
0+780.00	1,14	6,95	6,95	0	0,01	494,07	39,8	39,8	454,28
0+790.00	0,27	7,02	7,02	0,01	0,03	501,09	39,83	39,83	461,26
0+800.00	0,36	3,14	3,14	0	0,05	504,24	39,88	39,88	464,36
0+810.00	0,19	2,76	2,76	0,04	0,2	506,99	40,08	40,08	466,92
0+820.00	0,46	3,24	3,24	0,01	0,22	510,23	40,3	40,3	469,94
0+830.00	0,55	5,05	5,05	0	0,04	515,29	40,33	40,33	474,95
0+840.00	0,57	5,63	5,63	0	0	520,92	40,33	40,33	480,59
0+850.00	1,14	8,55	8,55	0	0	529,47	40,33	40,33	489,14
0+860.00	3,52	23,29	23,29	0	0	552,76	40,33	40,33	512,43
0+870.00	1,87	26,95	26,95	0	0	579,71	40,33	40,33	539,37
0+880.00	0,43	11,51	11,51	0	0	591,22	40,33	40,33	550,88
0+890.00	0,34	3,89	3,89	0	0	595,1	40,33	40,33	554,77
0+900.00	0,32	3,33	3,33	0	0,02	598,43	40,35	40,35	558,08
0+910.00	0,62	4,72	4,72	0	0,02	603,15	40,37	40,37	562,78
0+920.00	0,71	6,68	6,68	0,12	0,61	609,83	40,98	40,98	568,85
0+930.00	0,79	7,51	7,51	0,12	1,19	617,34	42,17	42,17	575,17
0+940.00	1,56	11,74	11,74	0	0,58	629,08	42,75	42,75	586,33
0+950.00	1,27	14,17	14,17	0	0	643,25	42,75	42,75	600,5
0+960.00	1	11,36	11,36	0	0	654,6	42,75	42,75	611,86
0+970.00	0,57	7,85	7,85	0	0	662,46	42,75	42,75	619,71
0+980.00	0,44	5,08	5,08	0,01	0,04	667,54	42,79	42,79	624,75
0+990.00	0,22	3,34	3,34	0,02	0,15	670,88	42,94	42,94	627,94
1+000.00	0,04	1,3	1,3	0,33	1,75	672,18	44,69	44,69	627,49
1+010.00	0	0,18	0,18	0,72	5,24	672,36	49,93	49,93	622,43
1+020.00	0	0	0	0,75	7,33	672,36	57,26	57,26	615,11
1+030.00	0	0	0	0,25	5	672,36	62,25	62,25	610,11
1+040.00	0,1	0,48	0,48	0,07	1,61	672,85	63,86	63,86	608,99
1+050.00	0	0,48	0,48	0,34	2,07	673,33	65,93	65,93	607,4
1+060.00	0,9	4,48	4,48	0	1,71	677,81	67,63	67,63	610,17
1+070.00	0,88	8,86	8,86	0	0	686,67	67,63	67,63	619,04
1+080.00	0,4	6,39	6,39	0,11	0,56	693,05	68,2	68,2	624,86
1+090.00	0,29	3,49	3,49	0,11	1,14	696,54	69,33	69,33	627,21
1+100.00	0,18	2,36	2,36	0,6	3,55	698,9	72,89	72,89	626,02
1+110.00	0,64	4,11	4,11	0	2,98	703,01	75,86	75,86	627,15
1+120.00	0	3,22	3,22	0,81	4,04	706,24	79,9	79,9	626,34
1+130.00	0,05	0,27	0,27	0,6	7,02	706,51	86,92	86,92	619,59
1+140.00	0,21	1,3	1,3	0,29	4,44	707,81	91,36	91,36	616,45
1+150.00	0,02	1,14	1,14	0,7	4,96	708,95	96,32	96,32	612,63
1+160.00	0,19	1,04	1,04	0,25	4,75	709,98	101,07	101,07	608,91
1+170.00	0	0,94	0,94	0,8	5,27	710,92	106,34	106,34	604,58
1+180.00	0,06	0,31	0,31	0,33	5,66	711,24	112	112	599,23
1+190.00	0,09	0,76	0,76	0,2	2,61	712	114,61	114,61	597,38
1+200.00	0,11	0,99	0,99	0,03	1,14	712,98	115,76	115,76	597,22
1+210.00	0,06	0,87	0,87	0,27	1,53	713,85	117,29	117,29	596,56
1+220.00	0,17	1,18	1,18	0	1,37	715,03	118,65	118,65	596,38
1+230.00	0,03	1	1	0,69	3,47	716,02	122,12	122,12	593,9
1+240.00	0,31	1,7	1,7	0,01	3,51	717,73	125,63	125,63	592,09
1+250.00	0,48	3,96	3,96	0	0,03	721,68	125,66	125,66	596,03
1+260.00	0,28	3,78	3,78	0	0	725,46	125,66	125,66	599,8
1+270.00	0,03	1,53	1,53	0,15	0,77	727	126,42	126,42	600,57
1+280.00	0,1	0,65	0,65	0,03	0,92	727,65	127,35	127,35	600,3
1+290.00	0,19	1,48	1,48	0,02	0,25	729,13	127,59	127,59	601,54
1+300.00	0,23	2,15	2,15	0,03	0,25	731,29	127,85	127,85	603,44
1+310.00	0,14	1,85	1,85	0,01	0,21	733,14	128,06	128,06	605,08
1+320.00	0,26	1,96	1,96	0,02	0,13	735,1	128,19	128,19	606,91
1+330.00	0,41	3,34	3,34	0	0,09	738,44	128,28	128,28	610,16
1+340.00	0,4	4,08	4,08	0	0	742,52	128,28	128,28	614,24
1+350.00	0,38	3,93	3,93	0	0	746,45	128,28	128,28	618,17
1+360.00	0,55	4,66	4,66	0	0	751,11	128,28	128,28	622,83
1+370.00	0,05	2,97	2,97	0,11	0,56	754,08	128,84	128,84	625,24
1+380.00	0,13	0,86	0,86	0,01	0,61	754,95	129,45	129,45	625,5
1+390.00	0,17	1,48	1,48	0,01	0,09	756,43	129,53	129,53	626,89
1+400.00	0,14	1,54	1,54	0,28	1,45	757,96	130,99	130,99	626,98
1+410.00	0,08	1,07	1,07	0,14	2,09	759,03	133,08	133,08	625,95
1+420.00	0,07	0,73	0,73	0,12	1,29	759,76	134,36	134,36	625,4
1+430.00	0,12	0,94	0,94	0,06	0,89	760,7	135,25	135,25	625,44
1+440.00	0,14	1,3	1,3	0,06	0,57	761,99	135,82	135,82	626,17
1+450.00	0,21	1,78	1,78	0,01	0,35	763,78	136,18	136,18	627,6
1+460.00	0,16	1,88	1,88	0,06	0,38	765,66	136,56	136,56	629,1
1+470.00	0,19	1,79	1,79	0,1	0,81	767,45	137,37	137,37	630,08
1+480.00	0,29	2,42	2,42	0	0,5	769,87	137,87	137,87	631,99
1+490.00	0,44	3,66	3,66	0	0,01	773,53	137,88	137,88	635,65
1+500.00	0,28	3,6	3,6	0	0,02	777,13	137,91	137,91	639,23
1+510.00	0,15	2,15	2,15	0,02	0,11	779,28	138,02	138,02	641,26
1+520.00	0,04	0,98	0,98	0,07	0,42	780,26	138,44	138,44	641,82

Alienación: ANDEN CHORRERA
Grupo de líneas de muestreo: SEC ANDEN
P.K. inicial: 0+000.00
P.K. final: 1+702.39

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Volumen reutilizable (Metros cúbicos)	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)	Vol. reutilizable acumul. (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)	Vol. neto acumul. (Metros cúbicos)
1+530.00	0,24	1,41	1,41	0,03	0,48	781,66	138,92	138,92	642,74
1+540.00	0,02	1,29	1,29	0,12	0,74	782,96	139,66	139,66	643,29
1+550.00	0,24	1,28	1,28	0	0,6	784,24	140,26	140,26	643,98
1+560.00	0,5	3,65	3,65	0	0,02	787,89	140,28	140,28	647,61
1+570.00	0,44	4,69	4,69	0	0	792,58	140,28	140,28	652,3
1+580.00	0,11	2,73	2,73	0,11	0,56	795,31	140,84	140,84	654,47
1+590.00	0,74	4,21	4,21	0	0,56	799,52	141,39	141,39	658,12
1+600.00	0,01	3,71	3,71	0,32	1,61	803,22	143	143	660,22
1+610.00	0,23	1,14	1,14	0,07	1,97	804,37	144,97	144,97	659,39
1+620.00	0,75	4,88	4,88	0	0,36	809,24	145,34	145,34	663,9
1+630.00	0,19	4,68	4,68	0	0,02	813,92	145,36	145,36	668,56
1+640.00	0,01	1,01	1,01	0,17	0,85	814,93	146,21	146,21	668,72
1+650.00	0,18	0,97	0,97	0	0,84	815,9	147,05	147,05	668,85
1+660.00	0,37	2,75	2,75	0	0,01	818,65	147,07	147,07	671,58
1+670.00	0,1	2,33	2,33	0,02	0,11	820,97	147,18	147,18	673,79
1+680.00	0,32	2,12	2,12	0,02	0,2	823,09	147,38	147,38	675,71
1+690.00	0,92	6,2	6,2	0	0,09	829,29	147,47	147,47	681,82
1+700.00	0	4,58	4,58	0,85	4,23	833,87	151,7	151,7	682,17
1+702.14	0,07	0,08	0,08	0,11	1,02	833,95	152,72	152,72	681,22

HUGO ALEXANDER SANCHEZ SOTO
TOPOGRAFO

Alienación: INTERNADO

P.K. inicial: 0+000.00


P.K. final: 0+128.50

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Volumen reutilizable (Metros cúbicos)	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)	Vol. reutilizable acumul. (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)	Vol. neto acumul. (Metros cúbicos)
0+000.00	0,29	0	0	0,02	0	0	0	0	0
0+010.00	0,69	4,91	4,91	0	0,11	4,91	0,11	0,11	4,81
0+020.00	0,67	6,8	6,8	0	0	11,71	0,11	0,11	11,61
0+030.00	0,61	6,38	6,38	0	0	18,09	0,11	0,11	17,99
0+040.00	0,56	5,83	5,83	0	0	23,92	0,11	0,11	23,81
0+050.00	0,54	5,5	5,5	0	0,02	29,42	0,13	0,13	29,29
0+060.00	0,6	5,72	5,72	0	0,02	35,14	0,15	0,15	34,99
0+070.00	0,57	5,85	5,85	0	0	41	0,15	0,15	40,85
0+080.00	0,56	5,65	5,65	0	0	46,85	0,15	0,15	46,5
0+090.00	0,62	5,89	5,89	0	0	52,54	0,15	0,15	52,39
0+100.00	0,58	6,02	6,02	0	0	58,57	0,15	0,15	58,42
0+110.00	0,74	6,62	6,62	0	0	65,18	0,15	0,15	65,03
0+120.00	0,49	6,14	6,14	0	0	71,32	0,15	0,15	71,17
0+128.50	0,61	4,67	4,67	0	0	75,98	0,15	0,15	75,84




HUGO ALEXANDER SANCHEZ SOTO

TOPOGRAFO

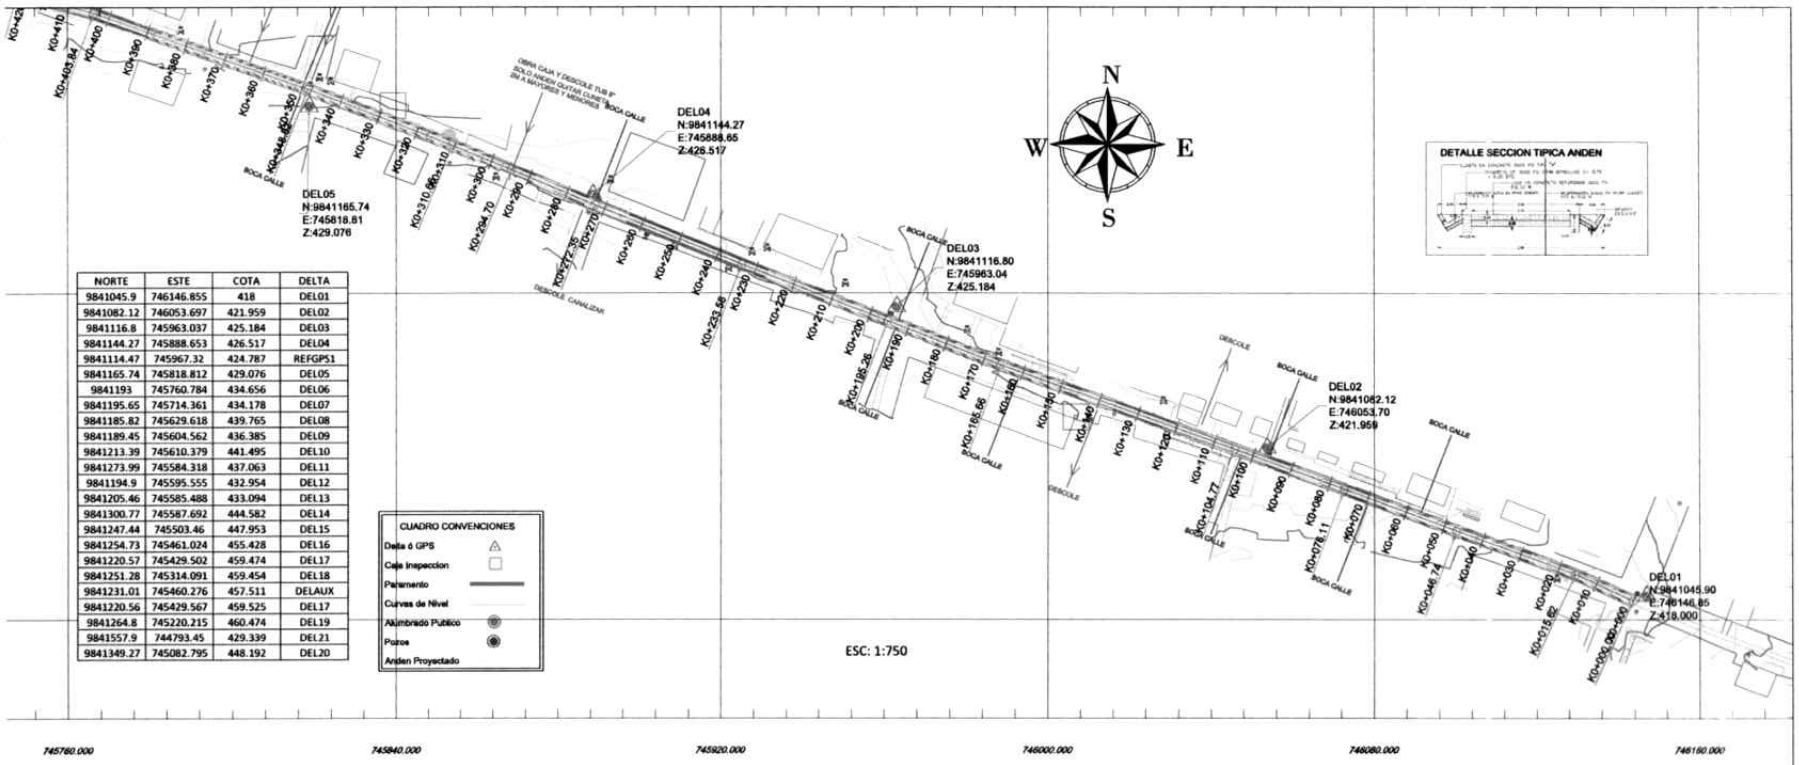

NORTE	ESTE	COTA	DELTA
9841045.9	746146.855	418	DEL01
9841082.12	746053.697	421.959	DEL02
9841116.8	745963.037	425.184	DEL03
9841144.27	745888.653	426.517	DEL04
9841114.47	745967.32	424.787	REFGPS1
9841165.74	745818.812	429.076	DEL05
9841193	745760.784	434.656	DEL06
9841195.65	745714.361	434.178	DEL07
9841185.82	745629.618	439.765	DEL08
9841189.45	745604.562	436.385	DEL09
9841213.39	745610.379	441.495	DEL10
9841273.99	745584.318	437.063	DEL11
9841194.9	745595.555	432.954	DEL12
9841205.46	745585.488	433.094	DEL13
9841300.77	745587.692	444.582	DEL14
9841247.44	745503.46	447.953	DEL15
9841254.73	745461.024	455.428	DEL16
9841220.57	745429.502	459.474	DEL17
9841251.28	745314.091	459.454	DEL18
9841231.01	745460.276	457.511	DELAUX
9841220.56	745429.567	459.525	DEL17
9841264.8	745220.215	460.474	DEL19
9841557.9	744793.45	429.339	DEL21
9841349.27	745082.795	448.192	DEL20

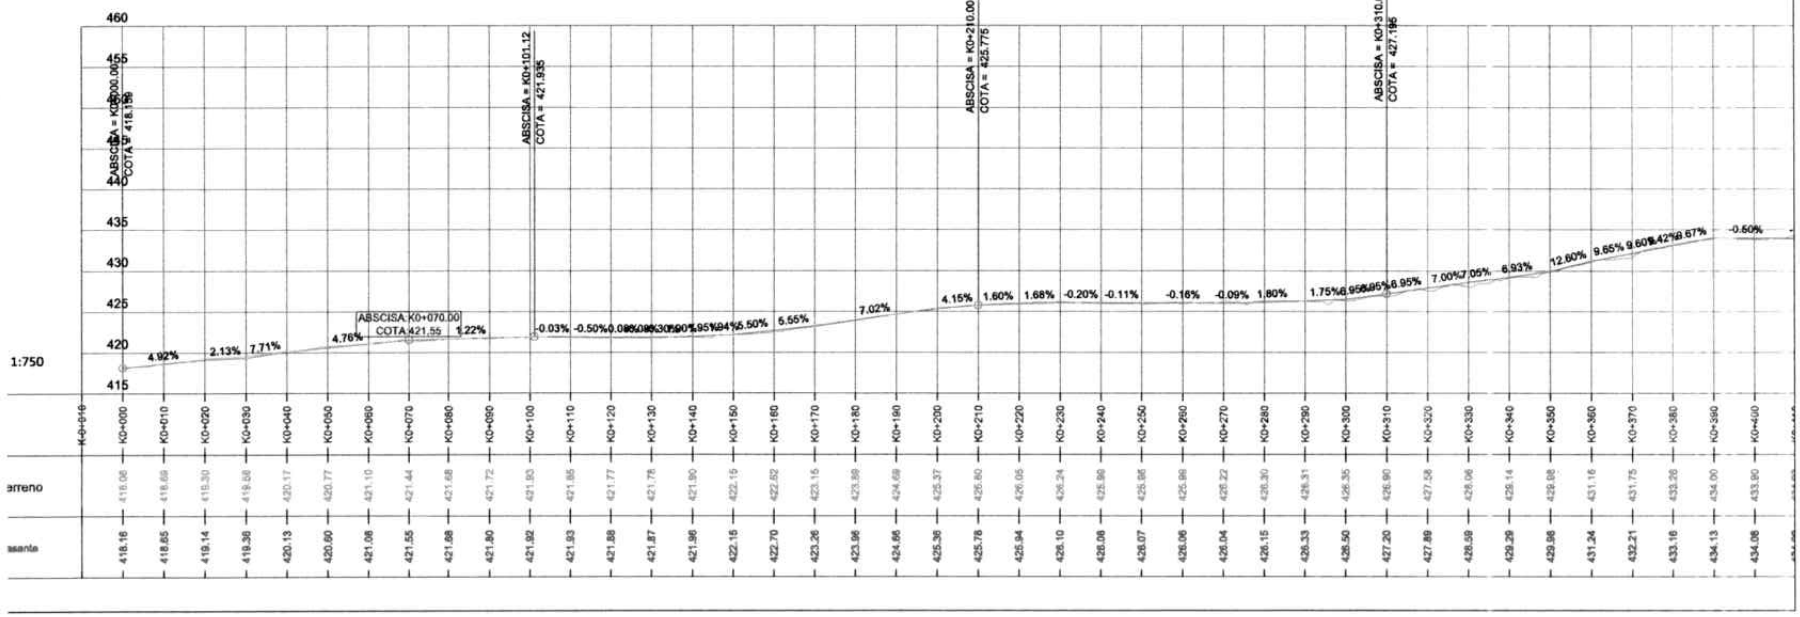

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

8841120.000

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:
CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

8841040.000

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)


CONTIENE:

DISEÑO GEOMETRICO EN PLANTA Y PERFIL, CORREDOR CON SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA


FECHA: NOVIEMBRE/2025

ESCALA: INDICADAS

PLANO: 01 /15

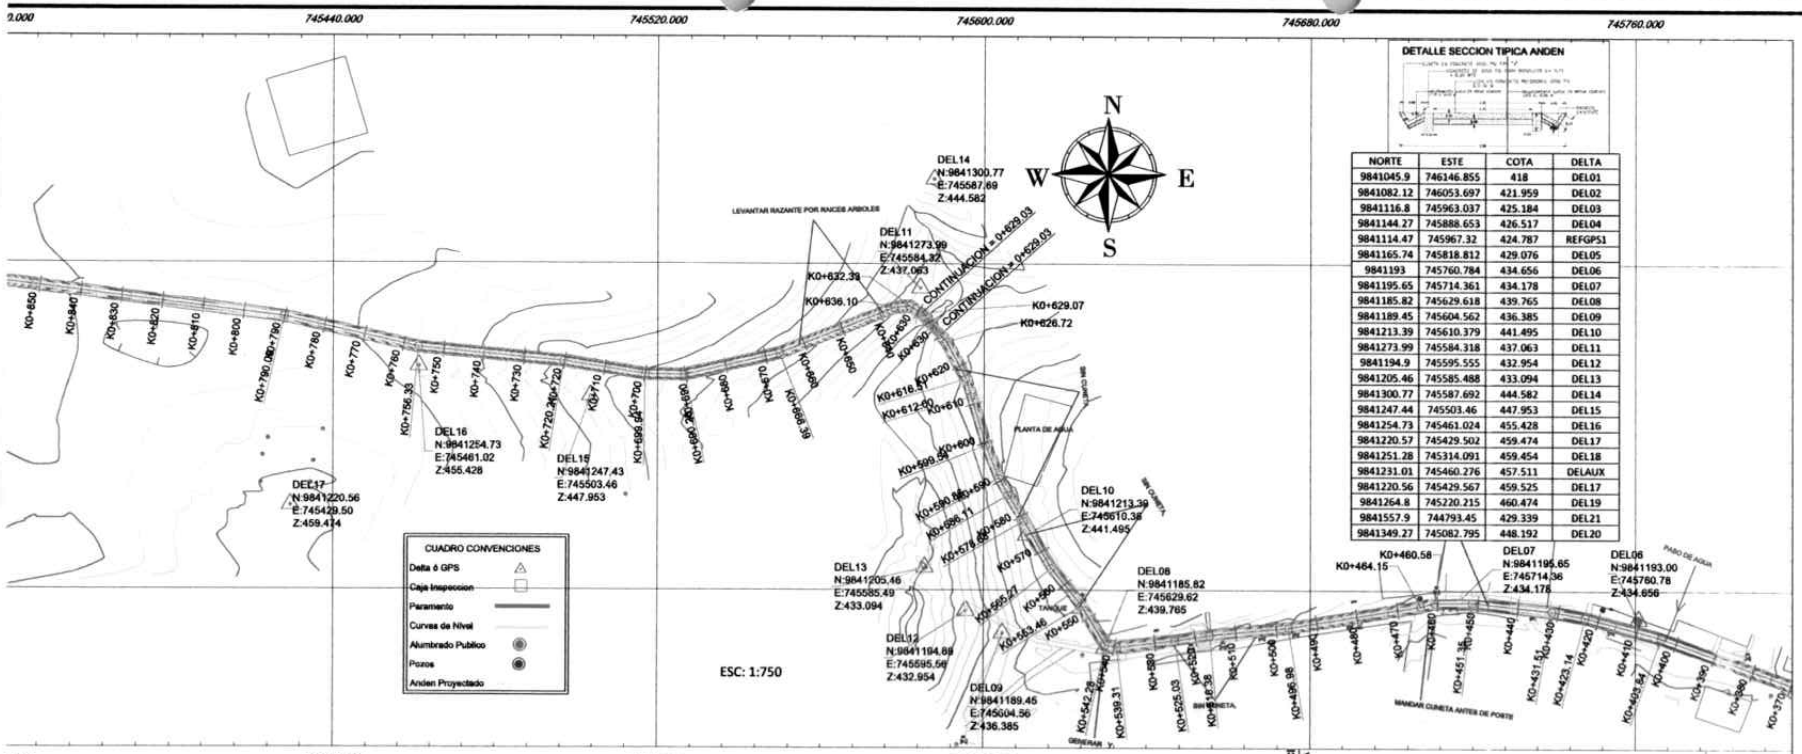

NORTE	ESTE	COTA	DELTA
9841045.9	746146.855	418	DEL01
9841082.12	746053.697	421.959	DEL02
9841116.8	745963.037	425.184	DEL03
9841144.27	745888.653	426.517	DEL04
9841114.47	745967.32	424.787	REFGPS1
9841165.74	745818.812	429.076	DEL05
9841193	745760.784	434.656	DEL06
9841195.65	745714.361	434.178	DEL07
9841185.82	745629.618	439.765	DEL08
9841189.45	745604.562	436.385	DEL09
9841213.39	745610.379	441.495	DEL10
9841273.99	745584.318	437.063	DEL11
9841194.9	745595.555	432.954	DEL12
9841205.46	745585.488	433.094	DEL13
9841300.77	745587.692	444.582	DEL14
9841247.44	745503.46	447.953	DEL15
9841254.73	745461.024	455.428	DEL16
9841220.57	745429.502	459.474	DEL17
9841251.28	745314.091	459.454	DEL18
9841231.01	745460.276	457.511	DELAUX
9841220.56	745429.567	459.525	DEL17
9841264.8	745220.215	460.474	DEL19
9841557.9	744793.45	429.339	DEL21
9841349.27	745082.795	448.192	DEL20

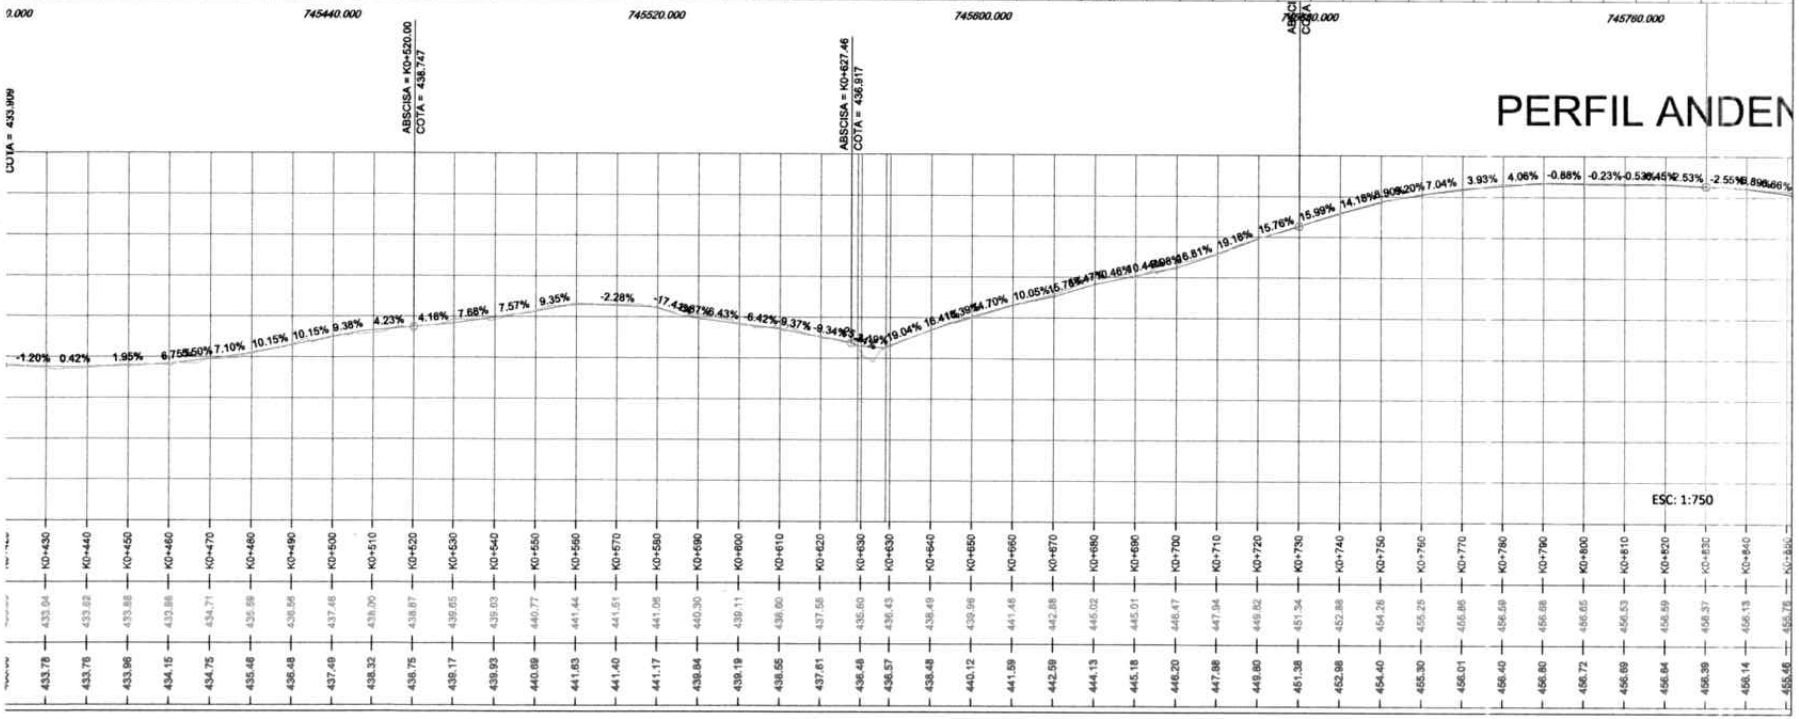

SUPERVISIÓN:

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:
CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS


OBSERVACIONES:
TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:
DISEÑO GEOMETRICO EN PLANTA Y PERFIL, CORREDOR CON SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025


PLANO: 02 /15

ESCALA: INDICADAS

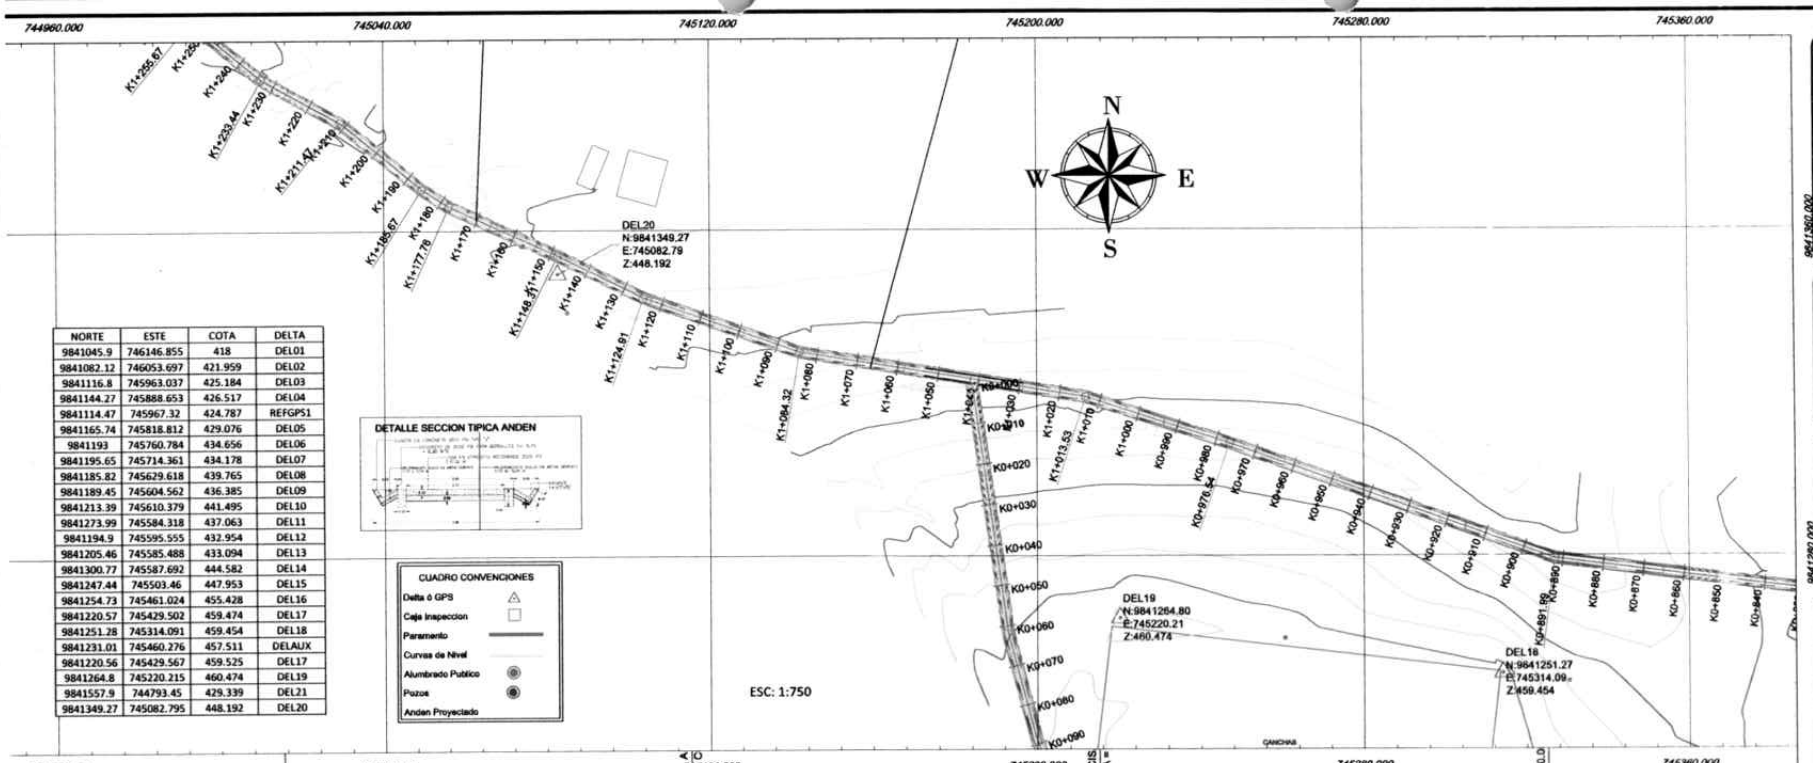

NORTE	ESTE	COTA	DELTA
9841045.9	746146.855	418	DEL01
9841082.12	746053.697	421.959	DEL02
9841116.8	745963.037	425.184	DEL03
9841144.27	745888.653	426.517	DEL04
9841114.47	745967.32	424.787	REFGPS1
9841165.74	745818.812	429.076	DEL05
9841193	745760.784	434.656	DEL06
9841195.65	745714.361	434.178	DEL07
9841185.82	745629.618	439.765	DEL08
9841189.45	745604.562	436.385	DEL09
9841213.39	745610.379	441.495	DEL10
9841273.99	745584.318	437.063	DEL11
9841194.9	745595.555	432.954	DEL12
9841205.46	745585.488	433.094	DEL13
9841300.77	745587.692	444.582	DEL14
9841247.44	745503.46	447.953	DEL15
9841254.73	745461.024	455.428	DEL16
9841220.57	745429.502	459.474	DEL17
9841251.28	745314.091	459.454	DEL18
9841231.01	745460.276	457.511	DELAUX
9841220.56	745429.567	459.525	DEL17
9841264.8	745220.215	460.474	DEL19
9841557.9	744793.45	429.339	DEL21
9841349.27	745082.795	448.192	DEL20

CHORRERA

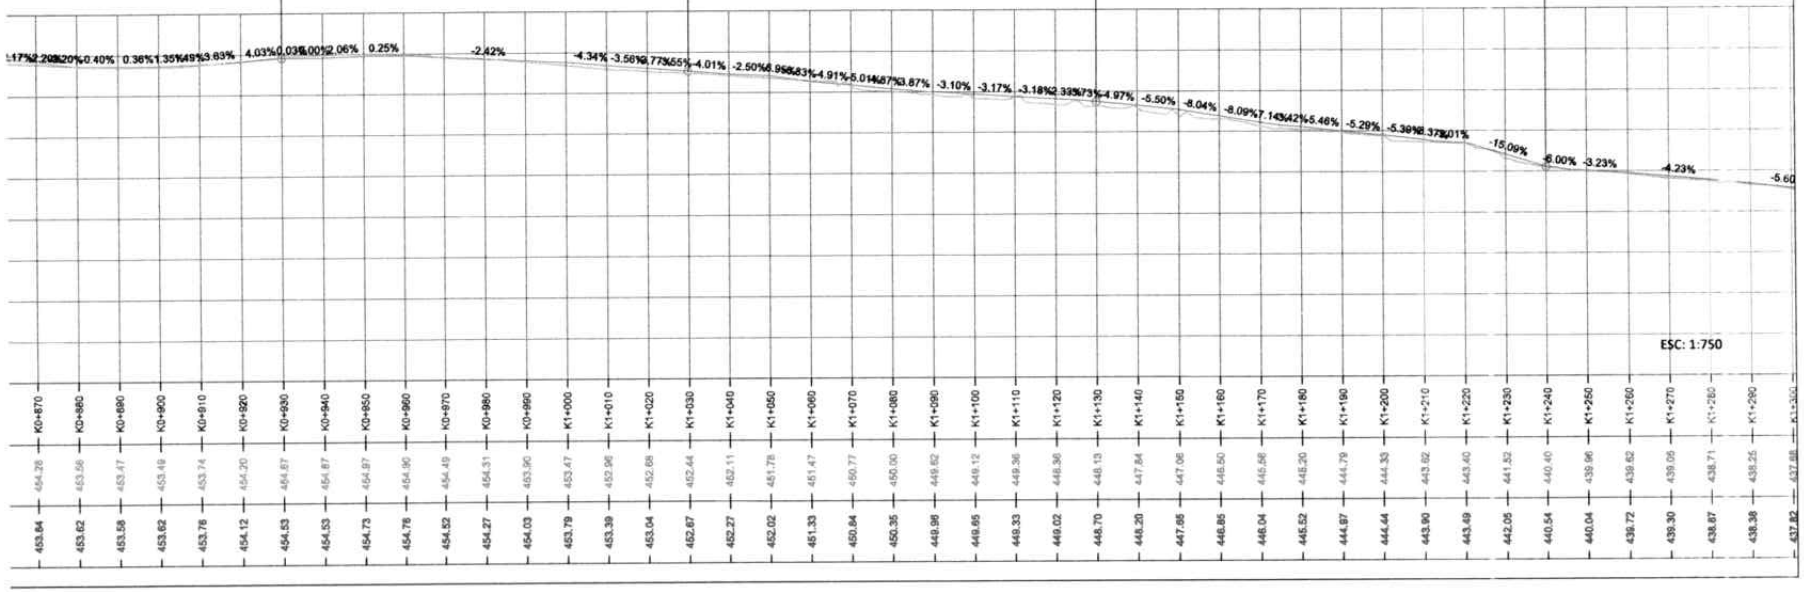

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:
CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)


CONTIENE:

DISEÑO GEOMETRICO EN PLANTA Y PERFIL, CORREDOR CON SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA


FECHA: NOVIEMBRE/2025

ESCALA: INDICADAS

PLANO: 03 /15

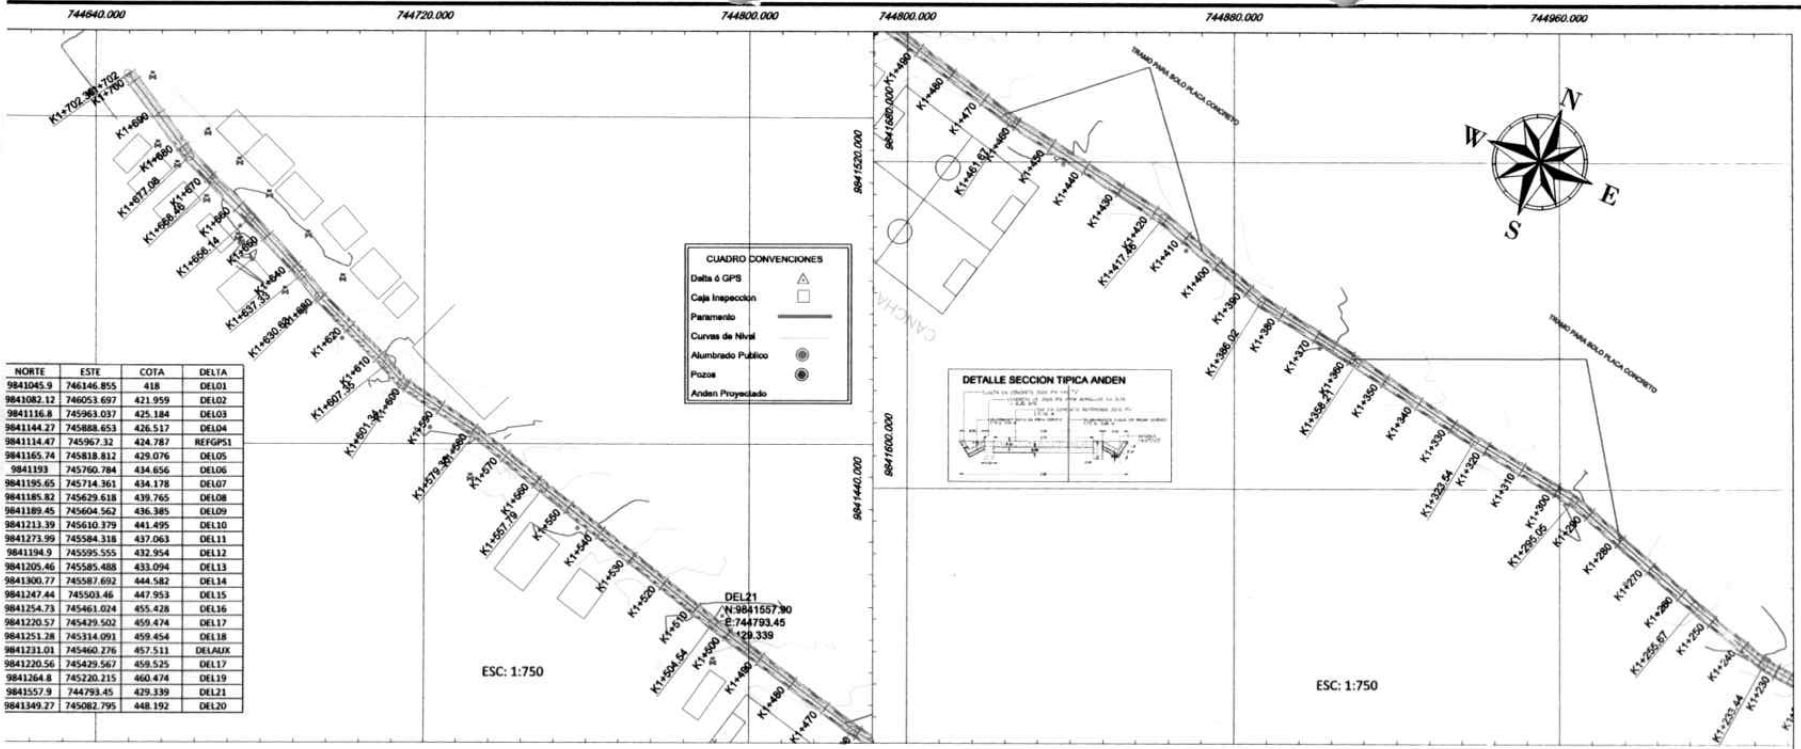

NORTE	ESTE	COTA	DELTA
9841045.9	746146.855	418	DEL01
9841082.12	746053.697	421.959	DEL02
9841116.8	745963.037	425.184	DEL03
9841144.27	745888.653	426.517	DEL04
9841114.47	745967.32	424.787	REFGPS1
9841165.74	745818.812	429.076	DEL05
9841193	745760.784	434.656	DEL06
9841195.65	745714.361	434.178	DEL07
9841185.82	745629.618	439.765	DEL08
9841189.45	745604.562	436.385	DEL09
9841213.39	745610.379	441.495	DEL10
9841273.99	745584.318	437.063	DEL11
9841194.9	745595.555	432.954	DEL12
9841205.46	745585.488	433.094	DEL13
9841300.77	745587.692	444.582	DEL14
9841247.44	745503.46	447.953	DEL15
9841254.73	745461.024	455.428	DEL16
9841220.57	745429.502	459.474	DEL17
9841251.28	745314.091	459.454	DEL18
9841231.01	745460.276	457.511	DELAUX
9841220.56	745429.567	459.525	DEL17
9841264.8	745220.215	460.474	DEL19
9841557.9	744793.45	429.339	DEL21
9841349.27	745082.795	448.192	DEL20

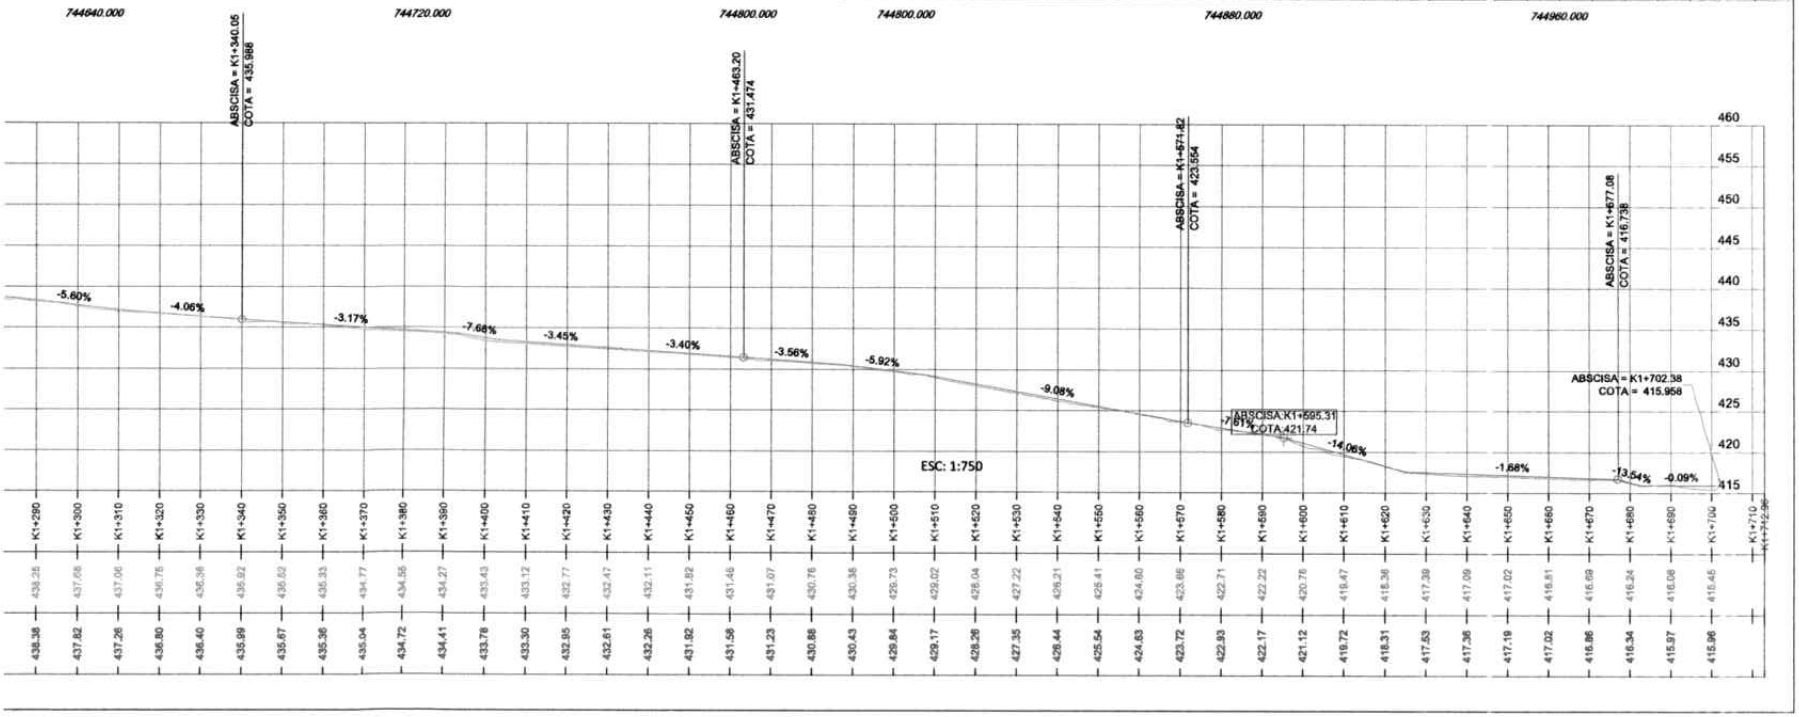

SUPERVISIÓN:

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:
CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA
CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)


CONTIENE:

DISEÑO GEOMETRICO EN PLANTA Y PERFIL, CORREDOR CON SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025


ESCALA: INDICADAS

PLANO: 04 /15

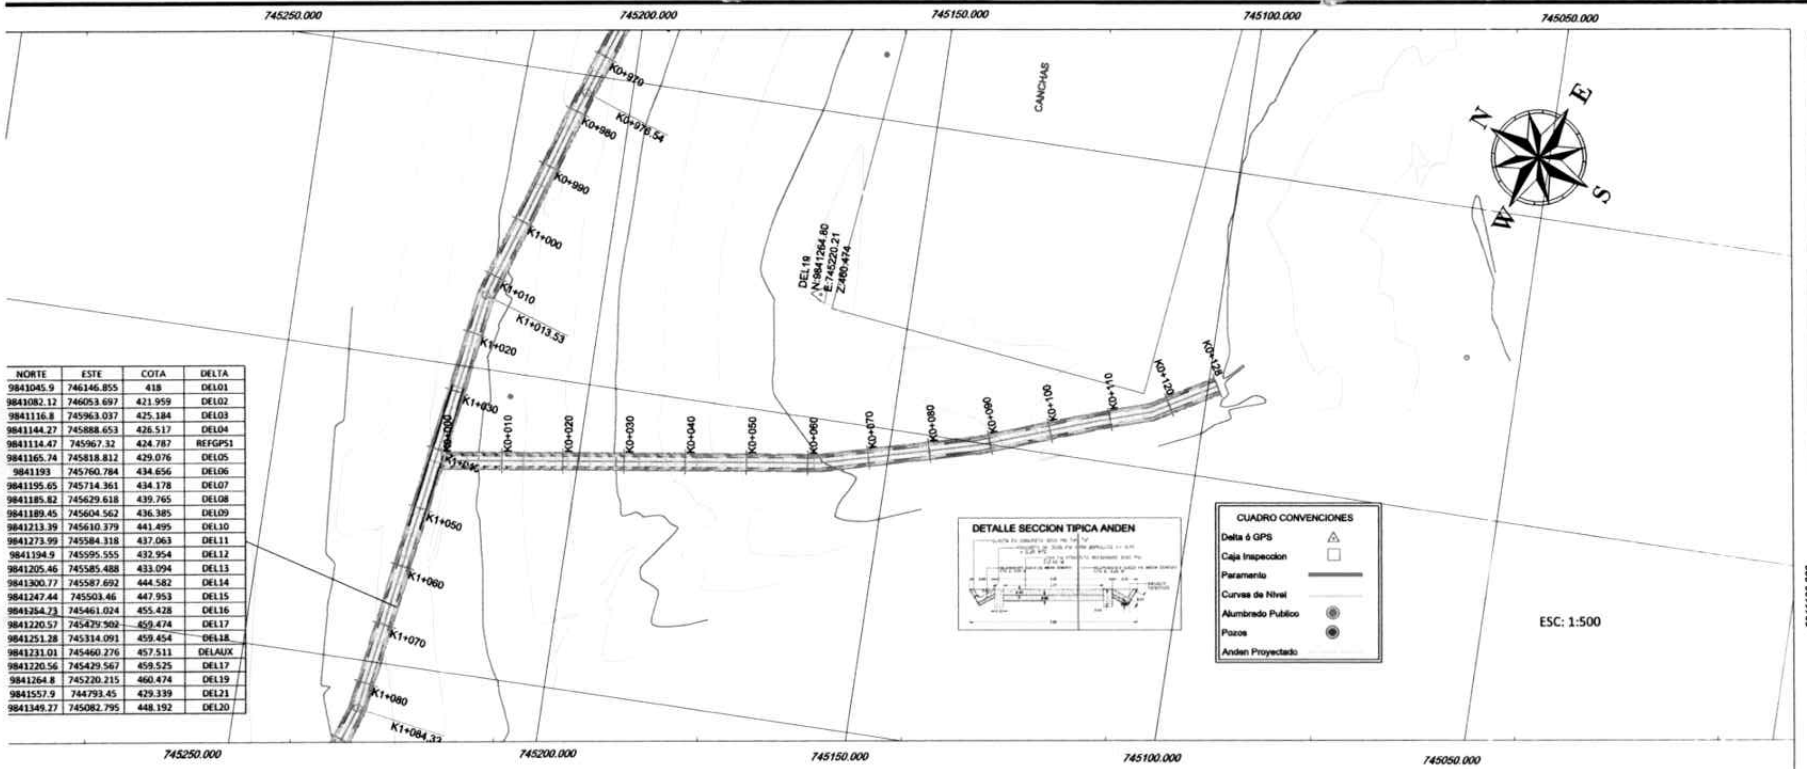

NORTE	ESTE	COTA	DELTA
9841045.9	746146.855	418	DEL01
9841082.12	746053.697	421.959	DEL02
9841116.8	745963.037	425.184	DEL03
9841144.27	745888.653	426.517	DEL04
9841114.47	745967.32	424.787	REFGPS1
9841165.74	745818.812	429.076	DEL05
9841193	745760.784	434.656	DEL06
9841195.65	745714.361	434.178	DEL07
9841185.82	745629.618	439.765	DEL08
9841189.45	745604.562	436.385	DEL09
9841213.39	745610.379	441.495	DEL10
9841273.99	745584.318	437.063	DEL11
9841194.9	745595.555	432.954	DEL12
9841205.46	745585.488	433.094	DEL13
9841300.77	745587.692	444.582	DEL14
9841247.44	745503.46	447.953	DEL15
9841254.73	745461.024	455.428	DEL16
9841220.57	745479.502	459.474	DEL17
9841251.28	745314.091	459.454	DEL18
9841231.01	745460.276	457.511	DELAUX
9841220.56	745429.567	459.525	DEL17
9841264.8	745220.215	460.474	DEL19
9841557.9	744793.45	429.339	DEL21
9841349.27	745082.795	448.192	DEL20

PERFIL ANDEN INTERNADO



Abscisa	K0+010	K0+000	K0+010	K0+020	K0+030	K0+040	K0+050	K0+060	K0+070	K0+080	K0+090	K0+100	K0+110	K0+120	K0+130	K0+140
Cota Terreno		452.01	453.51	454.86	456.13	457.38	458.30	458.87	458.39	458.75	459.84	459.91	458.56	458.40		
Cota Rasante		452.12	453.48	454.83	456.13	457.40	458.29	458.89	458.40	458.75	458.94	458.93	458.56	458.41		
Altura Corte		0.11	-0.04	-0.03	0.01	0.01	-0.01	0.02	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.01		
Altura Relleno		-0.11	0.04	0.03	-0.01	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01		

ESC: 1:500

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:
CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:
TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:
DISEÑO GEOMETRICO EN PLANTA Y PERFIL, CORREDOR CON SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025

PLANO: 14 /15

ESCALA: INDICADAS

K0+000.00



Tabla de Volumenes K0+000.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.30	0.00	0.00
RELLENO	0.00	0.00	0.00

K0+010.00




Tabla de Volumenes K0+010.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.69	4.96	4.96
RELLENO	0.00	0.00	0.00

K0+020.00




Tabla de Volumenes K0+020.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.02	8.56	13.52
RELLENO	0.00	0.00	0.00

K0+030.00




Tabla de Volumenes K0+030.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.25	11.32	24.84
RELLENO	0.00	0.00	0.00

K0+040.00




Tabla de Volumenes K0+040.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.76	10.03	34.86
RELLENO	0.00	0.00	0.00

K0+050.00




Tabla de Volumenes K0+050.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.07	9.17	44.04
RELLENO	0.00	0.00	0.00

K0+060.00




Tabla de Volumenes K0+060.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.65	8.59	52.63
RELLENO	0.00	0.01	0.01

K0+070.00



Tabla de Volumenes K0+070.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.27	4.59	57.22
RELLENO	0.01	0.04	0.05

K0+080.00




Tabla de Volumenes K0+080.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.59	4.33	61.55
RELLENO	0.00	0.04	0.09

K0+090.00




Tabla de Volumenes K0+090.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.38	4.86	66.43
RELLENO	0.00	0.00	0.09

K0+100.00




Tabla de Volumenes K0+100.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.58	4.83	71.26
RELLENO	0.00	0.00	0.09

K0+110.00




Tabla de Volumenes K0+110.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.35	4.68	75.94
RELLENO	0.00	0.00	0.09

K0+120.00




Tabla de Volumenes K0+120.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.27	3.13	79.07
RELLENO	0.00	0.00	0.10

K0+130.00




Tabla de Volumenes K0+130.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.31	2.94	82.01
RELLENO	0.01	0.06	0.16

K0+140.00




Tabla de Volumenes K0+140.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.44	3.75	85.76
RELLENO	0.00	0.07	0.23

K0+150.00




Tabla de Volumenes K0+150.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.69	5.65	91.41
RELLENO	0.00	0.01	0.24

K0+160.00




Tabla de Volumenes K0+160.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.10	3.98	95.38
RELLENO	0.06	0.28	0.52

K0+170.00




Tabla de Volumenes K0+170.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.31	2.05	97.43
RELLENO	0.00	0.28	0.80

K0+180.00




Tabla de Volumenes K0+180.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.37	3.39	100.82
RELLENO	0.00	0.01	0.80

K0+190.00




Tabla de Volumenes K0+190.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.71	5.40	106.21
RELLENO	0.00	0.01	0.81

K0+200.00




Tabla de Volumenes K0+200.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.60	6.57	112.79
RELLENO	0.00	0.02	0.83

ESC: 1:100

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:

SECCIONES TRANSVERSALES DE DISEÑO GEOMETRICO, Y CALCULO DE VOLUMENES SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025

ESCALA: INDICADAS

PLANO: 05/15

K0+210.00




Tabla de Volumenes K0+210.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.68	6.41	119.19
RELLENO	0.00	0.02	0.86

K0+220.00




Tabla de Volumenes K0+220.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.00	8.40	127.80
RELLENO	0.00	0.00	0.86

K0+230.00




Tabla de Volumenes K0+230.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.93	9.66	137.25
RELLENO	0.00	0.00	0.86

K0+240.00




Tabla de Volumenes K0+240.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.35	6.39	143.65
RELLENO	0.00	0.01	0.86

K0+250.00




Tabla de Volumenes K0+250.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.31	3.27	146.92
RELLENO	0.01	0.04	0.89

K0+260.00




Tabla de Volumenes K0+260.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.41	3.57	150.49
RELLENO	0.00	0.04	0.93

K0+270.00




Tabla de Volumenes K0+270.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.09	7.48	157.97
RELLENO	0.00	0.01	0.95

K0+280.00




Tabla de Volumenes K0+280.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.02	10.53	168.50
RELLENO	0.00	0.00	0.95

K0+290.00




Tabla de Volumenes K0+290.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.44	7.28	175.79
RELLENO	0.01	0.06	1.01

K0+300.00




Tabla de Volumenes K0+300.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.40	4.17	179.96
RELLENO	0.09	0.51	1.52

K0+310.00




Tabla de Volumenes K0+310.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.09	2.42	182.37
RELLENO	0.31	2.01	3.54

K0+320.00




Tabla de Volumenes K0+320.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.03	0.59	182.96
RELLENO	0.23	2.70	6.24

K0+330.00




Tabla de Volumenes K0+330.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.00	0.15	183.11
RELLENO	0.91	5.89	11.92

K0+340.00




Tabla de Volumenes K0+340.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.16	0.79	183.90
RELLENO	0.14	5.25	17.18

K0+350.00




Tabla de Volumenes K0+350.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.53	3.46	187.36
RELLENO	0.00	0.72	17.90

K0+360.00




Tabla de Volumenes K0+360.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.37	4.52	191.89
RELLENO	0.00	0.02	17.92

K0+370.00




Tabla de Volumenes K0+370.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.00	1.88	193.77
RELLENO	0.51	2.56	20.48

K0+380.00




Tabla de Volumenes K0+380.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.56	4.32	198.09
RELLENO	0.00	2.55	23.03

K0+390.00




Tabla de Volumenes K0+390.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.23	5.45	203.54
RELLENO	0.01	0.07	23.11

K0+400.00




Tabla de Volumenes K0+400.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.19	2.12	205.66
RELLENO	0.08	0.48	23.58

K0+410.00




Tabla de Volumenes K0+410.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.35	7.72	213.38
RELLENO	0.00	0.40	23.98

ESC: 1:100

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:

SECCIONES TRANSVERSALES DE DISEÑO GEOMETRICO, Y CALCULO DE VOLUMENES SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025

PLANO: 06/15

ESCALA: INDICADAS

K0+420.00




Tabla de Volumenes K0+420.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.88	11.04	224.42
RELLENO	0.00	0.00	23.98

K0+430.00




Tabla de Volumenes K0+430.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.24	5.54	229.96
RELLENO	0.00	0.00	23.98

K0+440.00




Tabla de Volumenes K0+440.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.24	2.43	232.39
RELLENO	0.01	0.03	24.01

K0+450.00




Tabla de Volumenes K0+450.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.40	3.22	235.61
RELLENO	0.00	0.03	24.04

K0+460.00




Tabla de Volumenes K0+460.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.17	2.86	238.48
RELLENO	0.02	0.12	24.16

K0+470.00




Tabla de Volumenes K0+470.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.63	4.06	242.54
RELLENO	0.04	0.33	24.49

K0+480.00




Tabla de Volumenes K0+480.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.96	8.06	250.59
RELLENO	0.01	0.29	24.77

K0+490.00




Tabla de Volumenes K0+490.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.85	9.15	259.74
RELLENO	0.01	0.11	24.88

K0+500.00




Tabla de Volumenes K0+500.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.58	7.12	266.86
RELLENO	0.00	0.03	24.91

K0+510.00




Tabla de Volumenes K0+510.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.00	2.89	269.75
RELLENO	0.25	1.27	26.18

K0+520.00




Tabla de Volumenes K0+520.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.78	3.93	273.67
RELLENO	0.00	1.27	27.46

K0+530.00




Tabla de Volumenes K0+530.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.91	13.45	287.12
RELLENO	0.00	0.00	27.46

K0+540.00




Tabla de Volumenes K0+540.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.11	10.01	297.14
RELLENO	0.32	1.81	29.07

K0+550.00




Tabla de Volumenes K0+550.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.17	6.18	303.30
RELLENO	0.00	1.67	30.74

K0+560.00




Tabla de Volumenes K0+560.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.35	7.83	310.92
RELLENO	0.00	0.01	30.76

ESC: 1:100

K0+570.00




Tabla de Volumenes K0+570.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.96	6.54	317.46
RELLENO	0.00	0.01	30.77

K0+580.00




Tabla de Volumenes K0+580.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.45	7.08	324.54
RELLENO	0.04	0.20	30.96

K0+590.00



Tabla de Volumenes K0+590.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.93	11.68	336.43
RELLENO	0.00	0.20	31.16

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:

SECCIONES TRANSVERSALES DE DISEÑO GEOMETRICO, Y CALCULO DE VOLUMENES SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025

PLANO: 07/15

ESCALA: INDICADAS

K0+600.00




Tabla de Volumenes K0+600.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.70	12.95	349.38
RELLENO	0.00	0.00	31.16

K0+610.00




Tabla de Volumenes K0+610.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.71	7.07	356.45
RELLENO	0.00	0.00	31.16

K0+620.00




Tabla de Volumenes K0+620.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.57	6.39	362.84
RELLENO	0.00	0.00	31.16

K0+629.03




Tabla de Volumenes K0+629.03			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.27	3.75	366.60
RELLENO	0.05	0.22	31.40

K0+630.00




Tabla de Volumenes K0+630.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.17	1.77	368.37
RELLENO	0.02	0.28	31.68

K0+640.00




Tabla de Volumenes K0+640.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.89	5.57	373.94
RELLENO	0.00	0.10	31.78

K0+650.00




Tabla de Volumenes K0+650.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.57	7.28	381.22
RELLENO	0.01	0.04	31.82

K0+660.00




Tabla de Volumenes K0+660.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.68	6.15	387.37
RELLENO	0.01	0.08	31.90

K0+670.00




Tabla de Volumenes K0+670.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.83	12.37	399.73
RELLENO	0.00	0.04	31.95

K0+680.00




Tabla de Volumenes K0+680.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	2.32	20.75	420.49
RELLENO	0.03	0.14	32.09

K0+690.00




Tabla de Volumenes K0+690.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.94	16.31	436.80
RELLENO	0.34	1.82	33.91

K0+700.00




Tabla de Volumenes K0+700.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.73	13.13	449.93
RELLENO	0.00	1.75	35.66

K0+710.00




Tabla de Volumenes K0+710.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.98	13.55	463.48
RELLENO	0.05	0.23	35.89

K0+720.00




Tabla de Volumenes K0+720.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.22	6.97	469.45
RELLENO	0.36	2.01	37.90

K0+730.00




Tabla de Volumenes K0+730.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.36	2.89	472.35
RELLENO	0.01	1.83	39.73

K0+740.00




Tabla de Volumenes K0+740.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.36	3.61	475.96
RELLENO	0.00	0.05	39.78

K0+750.00




Tabla de Volumenes K0+750.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.30	3.29	479.25
RELLENO	0.00	0.00	39.78

K0+760.00




Tabla de Volumenes K0+760.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.51	4.05	483.30
RELLENO	0.00	0.00	39.78

ESC: 1:100

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:

SECCIONES TRANSVERSALES DE DISEÑO GEOMETRICO, Y CALCULO DE VOLUMENES SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025

ESCALA: INDICADAS

PLANO: 08/15

K0+770.00




Tabla de Volumenes K0+770.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.25	3.82	487.12
RELLENO	0.00	0.01	39.79

K0+780.00




Tabla de Volumenes K0+780.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.14	6.95	494.07
RELLENO	0.00	0.01	39.80

K0+790.00




Tabla de Volumenes K0+790.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.27	7.02	501.09
RELLENO	0.01	0.03	39.83

K0+800.00




Tabla de Volumenes K0+800.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.36	3.14	504.24
RELLENO	0.00	0.05	39.88

K0+810.00




Tabla de Volumenes K0+810.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.19	2.76	506.99
RELLENO	0.04	0.20	40.08

K0+820.00




Tabla de Volumenes K0+820.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.46	3.24	510.23
RELLENO	0.01	0.22	40.30

K0+830.00




Tabla de Volumenes K0+830.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.55	5.05	515.29
RELLENO	0.00	0.04	40.33

K0+840.00



Tabla de Volumenes K0+840.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.57	5.63	520.92
RELLENO	0.00	0.00	40.33

K0+850.00




Tabla de Volumenes K0+850.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.14	8.55	529.47
RELLENO	0.00	0.00	40.33

K0+860.00




Tabla de Volumenes K0+860.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	3.52	23.29	552.76
RELLENO	0.00	0.00	40.33

K0+870.00




Tabla de Volumenes K0+870.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.87	26.95	579.71
RELLENO	0.00	0.00	40.33

K0+880.00




Tabla de Volumenes K0+880.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.43	11.51	591.22
RELLENO	0.00	0.00	40.33

K0+890.00




Tabla de Volumenes K0+890.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.34	3.89	596.10
RELLENO	0.00	0.00	40.33

K0+900.00




Tabla de Volumenes K0+900.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.32	3.33	598.43
RELLENO	0.00	0.02	40.35

K0+910.00




Tabla de Volumenes K0+910.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.62	4.72	603.15
RELLENO	0.00	0.02	40.37

K0+920.00




Tabla de Volumenes K0+920.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.71	6.68	609.83
RELLENO	0.12	0.61	40.98

K0+930.00




Tabla de Volumenes K0+930.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.79	7.51	617.34
RELLENO	0.12	1.19	42.17

K0+940.00




Tabla de Volumenes K0+940.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.56	11.74	629.08
RELLENO	0.00	0.58	42.75

K0+950.00




Tabla de Volumenes K0+950.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.27	14.17	643.25
RELLENO	0.00	0.00	42.75

K0+960.00




Tabla de Volumenes K0+960.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	1.00	11.36	654.60
RELLENO	0.00	0.00	42.75

K0+970.00




Tabla de Volumenes K0+970.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.57	7.85	662.45
RELLENO	0.00	0.00	42.75

ESC: 1:100

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:

SECCIONES TRANSVERSALES DE DISEÑO GEOMETRICO, Y CALCULO DE VOLUMENES SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025

PLANO: 09/15

ESCALA: INDICADAS

K0+980.00




Tabla de Volumenes
K0+980.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.44	5.08	667.54
RELLENO	0.01	0.04	42.79

K0+990.00




Tabla de Volumenes
K0+990.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.22	3.34	670.88
RELLENO	0.02	0.15	42.94

K1+000.00




Tabla de Volumenes
K1+000.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.04	1.30	672.16
RELLENO	0.33	1.75	44.69

K1+010.00




Tabla de Volumenes
K1+010.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.00	0.18	672.36
RELLENO	0.72	5.24	49.93

K1+020.00




Tabla de Volumenes
K1+020.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.00	0.00	672.36
RELLENO	0.75	7.33	57.26

K1+030.00




Tabla de Volumenes
K1+030.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.00	0.00	672.36
RELLENO	0.25	5.00	62.25

K1+040.00




Tabla de Volumenes
K1+040.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.10	0.48	672.85
RELLENO	0.07	1.61	63.86

K1+050.00




Tabla de Volumenes
K1+050.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.00	0.48	673.33
RELLENO	0.34	2.07	65.93

K1+060.00




Tabla de Volumenes
K1+060.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.90	4.48	677.81
RELLENO	0.00	1.71	67.63

K1+070.00




Tabla de Volumenes
K1+070.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.68	8.86	686.67
RELLENO	0.00	0.00	67.63

K1+080.00




Tabla de Volumenes
K1+080.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.40	6.39	693.06
RELLENO	0.11	0.56	68.20

K1+090.00




Tabla de Volumenes
K1+090.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.29	3.49	696.54
RELLENO	0.11	1.14	69.33

K1+100.00




Tabla de Volumenes
K1+100.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.18	2.36	696.90
RELLENO	0.60	3.55	72.89

K1+110.00




Tabla de Volumenes
K1+110.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.04	4.11	703.01
RELLENO	0.00	2.98	75.86

K1+120.00




Tabla de Volumenes
K1+120.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.00	3.22	706.24
RELLENO	0.81	4.04	79.90

K1+130.00




Tabla de Volumenes
K1+130.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.05	0.27	706.51
RELLENO	0.60	7.02	86.92

K1+140.00




Tabla de Volumenes
K1+140.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.21	1.30	707.81
RELLENO	0.29	4.44	91.36

K1+150.00




Tabla de Volumenes
K1+150.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.02	1.14	708.95
RELLENO	0.70	4.96	96.32

K1+160.00




Tabla de Volumenes
K1+160.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.19	1.04	709.98
RELLENO	0.25	4.75	101.07

K1+170.00




Tabla de Volumenes
K1+170.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.00	0.94	710.92
RELLENO	0.80	5.27	106.34

K1+180.00




Tabla de Volumenes
K1+180.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.06	0.31	711.24
RELLENO	0.33	5.66	112.00

ESC: 1:100

SUPERVISIÓN:

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:

SECCIONES TRANSVERSALES DE DISEÑO GEOMETRICO, Y CALCULO DE VOLUMENES SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025

ESCALA: INDICADAS

PLANO: 10/15

K1+190.00




Tabla de Volumenes K1+190.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.09	0.76	712.00
RELLENO	0.20	2.61	114.61

K1+200.00




Tabla de Volumenes K1+200.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.11	0.99	712.98
RELLENO	0.03	1.14	115.76

K1+210.00




Tabla de Volumenes K1+210.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.06	0.87	713.85
RELLENO	0.27	1.53	117.29

K1+220.00




Tabla de Volumenes K1+220.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.17	1.18	715.03
RELLENO	0.00	1.37	118.66

K1+230.00




Tabla de Volumenes K1+230.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.03	1.00	716.02
RELLENO	0.69	3.47	122.12

K1+240.00




Tabla de Volumenes K1+240.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.31	1.70	717.73
RELLENO	0.01	3.61	125.63

K1+250.00




Tabla de Volumenes K1+250.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.48	3.96	721.68
RELLENO	0.00	0.03	125.66

K1+260.00




Tabla de Volumenes K1+260.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.28	3.78	725.46
RELLENO	0.00	0.00	125.66

K1+270.00



Tabla de Volumenes K1+270.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.03	1.53	727.00
RELLENO	0.15	0.77	126.42

K1+280.00




Tabla de Volumenes K1+280.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.10	0.65	727.65
RELLENO	0.03	0.92	127.35

K1+290.00




Tabla de Volumenes K1+290.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.19	1.48	729.13
RELLENO	0.02	0.25	127.59

K1+300.00




Tabla de Volumenes K1+300.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.23	2.15	731.29
RELLENO	0.03	0.25	127.85

K1+310.00




Tabla de Volumenes K1+310.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.14	1.85	733.14
RELLENO	0.01	0.21	128.06

K1+320.00




Tabla de Volumenes K1+320.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.26	1.96	736.10
RELLENO	0.02	0.13	128.19

K1+330.00




Tabla de Volumenes K1+330.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.41	3.34	738.44
RELLENO	0.00	0.09	128.28

K1+340.00




Tabla de Volumenes K1+340.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.40	4.08	742.52
RELLENO	0.00	0.00	128.28

K1+350.00




Tabla de Volumenes K1+350.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.38	3.93	746.45
RELLENO	0.00	0.00	128.28

K1+360.00




Tabla de Volumenes K1+360.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.66	4.66	751.11
RELLENO	0.00	0.00	128.28

K1+370.00



Tabla de Volumenes K1+370.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.05	2.97	754.08
RELLENO	0.11	0.56	128.84

K1+380.00




Tabla de Volumenes K1+380.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.13	0.86	754.95
RELLENO	0.01	0.61	129.45

K1+390.00




Tabla de Volumenes K1+390.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.17	1.48	756.43
RELLENO	0.01	0.09	129.53

ESC: 1:100

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:

SECCIONES TRANSVERSALES DE DISEÑO GEOMETRICO, Y CALCULO DE VOLUMENES SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025

ESCALA: INDICADAS

PLANO: 11/15

K1+400.00




Tabla de Volumenes K1+400.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.14	1.54	757.96
RELLENO	0.28	1.45	130.99

K1+410.00




Tabla de Volumenes K1+410.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.08	1.07	759.03
RELLENO	0.14	2.09	133.08

K1+420.00




Tabla de Volumenes K1+420.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.07	0.73	759.76
RELLENO	0.12	1.29	134.36

K1+430.00




Tabla de Volumenes K1+430.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.12	0.94	760.70
RELLENO	0.06	0.89	136.25

K1+440.00




Tabla de Volumenes K1+440.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.14	1.30	761.99
RELLENO	0.06	0.57	135.82

K1+450.00




Tabla de Volumenes K1+450.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.21	1.78	763.78
RELLENO	0.01	0.35	136.18

K1+460.00




Tabla de Volumenes K1+460.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.18	1.66	765.66
RELLENO	0.06	0.38	136.56

K1+470.00




Tabla de Volumenes K1+470.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.19	1.79	767.45
RELLENO	0.10	0.81	137.37

K1+480.00




Tabla de Volumenes K1+480.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.29	2.42	769.87
RELLENO	0.00	0.50	137.87

K1+490.00




Tabla de Volumenes K1+490.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.44	3.66	773.53
RELLENO	0.00	0.01	137.88

K1+500.00




Tabla de Volumenes K1+500.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.28	3.60	777.13
RELLENO	0.00	0.02	137.91

K1+510.00




Tabla de Volumenes K1+510.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.15	2.15	779.28
RELLENO	0.02	0.11	138.02

K1+520.00




Tabla de Volumenes K1+520.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.04	0.98	780.26
RELLENO	0.07	0.42	138.44

K1+530.00




Tabla de Volumenes K1+530.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.24	1.41	781.66
RELLENO	0.03	0.48	138.92

K1+540.00




Tabla de Volumenes K1+540.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.02	1.29	782.96
RELLENO	0.12	0.74	139.66

ESC: 1:100

K1+550.00




Tabla de Volumenes K1+550.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.24	1.28	784.24
RELLENO	0.00	0.60	140.26

K1+560.00




Tabla de Volumenes K1+560.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.50	3.65	787.89
RELLENO	0.00	0.02	140.28

K1+570.00




Tabla de Volumenes K1+570.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.44	4.69	792.58
RELLENO	0.00	0.00	140.28

K1+580.00




Tabla de Volumenes K1+580.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.11	2.73	795.31
RELLENO	0.11	0.56	140.84

K1+590.00




Tabla de Volumenes K1+590.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.74	4.21	799.52
RELLENO	0.00	0.56	141.39

K1+600.00




Tabla de Volumenes K1+600.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.01	3.71	803.22
RELLENO	0.32	1.81	143.00

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:

SECCIONES TRANSVERSALES DE DISEÑO GEOMETRICO, Y CALCULO DE VOLUMENES SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025

ESCALA: INDICADAS

PLANO: 12/15

K1+610.00




Tabla de Volumenes
K1+610.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.23	1.14	804.37
RELLENO	0.07	1.97	144.97

K1+620.00




Tabla de Volumenes
K1+620.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.75	4.88	809.24
RELLENO	0.00	0.36	145.34

K1+630.00




Tabla de Volumenes
K1+630.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.19	4.68	813.92
RELLENO	0.00	0.02	145.36

K1+640.00




Tabla de Volumenes
K1+640.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.01	1.01	814.93
RELLENO	0.17	0.85	146.21

K1+650.00




Tabla de Volumenes
K1+650.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.18	0.97	815.90
RELLENO	0.00	0.84	147.05

K1+660.00




Tabla de Volumenes
K1+660.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.37	2.75	818.65
RELLENO	0.00	0.01	147.07

K1+670.00




Tabla de Volumenes
K1+670.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.10	2.33	820.97
RELLENO	0.02	0.11	147.18

K1+680.00




Tabla de Volumenes
K1+680.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.32	2.12	823.09
RELLENO	0.02	0.20	147.38

K1+690.00




Tabla de Volumenes
K1+690.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.92	6.20	829.29
RELLENO	0.00	0.09	147.47

K1+700.00




Tabla de Volumenes
K1+700.00

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.00	4.58	833.87
RELLENO	0.85	4.23	151.70

K1+702.14




Tabla de Volumenes
K1+702.14

Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.07	0.08	833.95
RELLENO	0.11	1.02	152.72

ESC: 1:100

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:

SECCIONES TRANSVERSALES DE DISEÑO GEOMETRICO, Y CALCULO DE VOLUMENES SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025

ESCALA: INDICADAS

PLANO: 13/15

SECCIONES TRANSVERSALES INTERNADO

K0+000.00




Tabla de Volumenes K0+000.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.29	0.00	0.00
RELLENO	0.02	0.00	0.00

K0+010.00




Tabla de Volumenes K0+010.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.59	4.91	4.91
RELLENO	0.00	0.11	0.11

K0+020.00




Tabla de Volumenes K0+020.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.67	6.80	11.71
RELLENO	0.00	0.00	0.11

K0+030.00




Tabla de Volumenes K0+030.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.61	6.38	18.09
RELLENO	0.00	0.00	0.11

K0+040.00




Tabla de Volumenes K0+040.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.56	5.83	23.92
RELLENO	0.00	0.00	0.11

K0+050.00




Tabla de Volumenes K0+050.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.54	5.50	29.42
RELLENO	0.00	0.02	0.13

K0+060.00




Tabla de Volumenes K0+060.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.60	5.72	35.14
RELLENO	0.00	0.02	0.15

K0+070.00




Tabla de Volumenes K0+070.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.57	5.85	41.00
RELLENO	0.00	0.00	0.15

K0+080.00




Tabla de Volumenes K0+080.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.56	5.65	46.65
RELLENO	0.00	0.00	0.15

K0+090.00




Tabla de Volumenes K0+090.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.52	5.89	52.54
RELLENO	0.00	0.00	0.15

K0+100.00




Tabla de Volumenes K0+100.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.56	6.02	58.57
RELLENO	0.00	0.00	0.15

K0+110.00




Tabla de Volumenes K0+110.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.74	6.62	65.18
RELLENO	0.00	0.00	0.15

K0+120.00




Tabla de Volumenes K0+120.00			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.49	6.14	71.32
RELLENO	0.00	0.00	0.15

K0+128.50




Tabla de Volumenes K0+128.50			
Tipo	Área	Volumen	Vol. Acumulado
CORTE	0.81	4.67	75.98
RELLENO	0.00	0.00	0.15

ESC: 1:100

SUPERVISIÓN:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA:

VIETTA CONSTRUCCIONES

OBJETO:

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA CONTRATO 1868-2025

INTERVENTORIA:

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

REALIZO:

ING. JUAN SEBASTIAN GONZALEZ
M.P. 161037-0574812 TLM

V°B°:

ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

OBSERVACIONES:

TODAS LAS MEDIDAS EN METROS (m)

CONTIENE:

SECCIONES TRANSVERSALES DE DISEÑO GEOMETRICO, Y CALCULO DE VOLUMENES SENDEROS PEATONALES LA CHORRERA

FECHA: NOVIEMBRE/2025

ESCALA: INDICADAS

PLANO: 15/15

	ACTA DE FIJACION DE PRECIOS DE NO PREVISTOS	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 011	1 DE 2	

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 0 0 1 8 6 8
		9	2	2026	

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO No. 1868 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025 (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☑

CONTRATACION DIRECTA ☐ LP-003-2025 (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SIETE (7) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 5 (Día) DE 8 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 4.574.004.535,19** (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 28 (Día) DE 4 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 4.840.506.122,77** (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA VIETTA CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025 (Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES (Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

SECRETARIO DE PLANEACION JHONY FERNEY PINTO SERAFIN (Escriba el nombre del Secretario de Despacho o Director de Planeación o Director ente descentralizado según sea el caso)

	ACTA DE FIJACION DE PRECIOS DE NO PREVISTOS	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 011	1 DE 2	

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 0 0 1 5 4 4
		9	2	2026	

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

En Leticia ; a los NUEVE dias del mes FEBRERO de 2026

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números)

se reunieron KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO Representante Legal

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

del contratista, BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO Representante Legal de la Interventoría, y

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES en calidad de Supervisor,

Con el fin de pactar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la Interventoria.

A continuación se relacionan dichos precios unitarios pactados a precios del mercado actual indicando los items correspondientes y cantidades estimadas de obra de los mismos.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD APROX	PRECIO UNITARIO
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS - COMPONENTE DE SANEAMIENTO BASICO (RECURSOS SGR) - REVISADOS POR MULTIPROYEC GROUP S.A.S.			
NP-01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION) Y	M3	329,09	$ 578.840,39
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 6"	ML	33,00	$ 190.102,16
NP-03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	M3	51,72	$ 217.857,41
NP-04	DREN TIPO FRANCES (DIMENSIONES 0.5M X 0.7M)	ML	18,00	$ 451.524,25

Se anexa y hace parte de la presente acta el cuadro de evaluacion económica del contrato teniendo en los precios no previstos del contrato anteriormente mencionado y los analisis de precios unitarios de dichos items.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los NUEVE días del mes de FEBRERO 2026

(Dia en que se firma el (Dia en letras) (Año de finalización)

Firma

Nombre: KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO
VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
Contratista

Firma

Nombre: BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO
CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025
Interventor

Firma

Nombre: ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES
Supervisor Gobernación del Amazonas
Responsable Dependencia

Original Oficina Jurídica:
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA	VIETTA CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA 1 DE 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION) Y CEMENTO	M3	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	(10%) MANO DE OBRA	$ 204.265,80	10%	$ 20.426,58
ALQUILER PLATAFORMA VIBRATORIA TIPO RANA	DIA	$ 150.000,00	0,182	$ 27.300,00
			SUBTOTAL $	$ 47.726,58

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CEMENTO	KG	72,00	$ 1.450,00	$ 104.400,00
AGUA	L	24	$ 500,00	$ 12.000,00
			SUBTOTAL $	116.400,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE FLUVIAL - INCLUYE TRASIEGO DEL CEMENTO - HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	0,072		TON	$ 750.000,00	$ 54.000,00
TRANSPORTE O ACARREO DE MATERIAL EN OBRA	0,515		M3	$ 3.800,00	$ 1.957,00
				SUBTOTAL $	$ 55.957,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 07; 1O+2A	$ 186.076,00	$ 154.367,00	$ 340.443,00	0,600	204.265,80
				SUBTOTAL $	$ 204.265,80
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 424.349,38

V. COSTOS INDIRECTOS

Administración	29,41%	$ 124.786,55
Imprevistos	1,00%	$ 4.243,49
Utilidad	6,00%	$ 25.460,96
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 154.491,01
PRECIO UNITARIO TOTAL		$ 578.840,39

KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO
VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.560.635-3

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA	VIETTA CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA 1 DE 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 6"	ML	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	(10%) MANO DE OBRA	$ 77.311,73	10%	$ 7.731,17
			SUBTOTAL $	$ 7.731,17

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBERIA NOVAFORT DE 6"	ML	1,05	$ 27.950,00	$ 29.347,50
LUBRICANTE TUBERIA UNION MECANICA	KG	0,06	$ 49.733,00	$ 2.983,98
ARENA DE LA REGION	M3	0,021	$ 250.000,00	$ 5.250,00
			SUBTOTAL $	37.581,48

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL BOGOTA A SITIO DE OBRA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	1,80		KG	$ 5.500,00	$ 9.900,00
TRANSPORTE O ACARREO DE MATERIAL EN OBRA	1,80		KG	$ 3.800,00	$ 6.840,00
				SUBTOTAL $	$ 16.740,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14; 1O+4A	$ 294.310,00	$ 242.577,00	$ 536.887,00	0,144	77.311,73
				SUBTOTAL $	$ 77.311,73
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 139.364,38

V. COSTOS INDIRECTOS

Administración	29,41%	$ 40.982,27
Imprevistos	1,00%	$ 1.393,64
Utilidad	6,00%	$ 8.361,86
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 50.737,78
PRECIO UNITARIO TOTAL		$ 190.102,16

KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO
VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.560.635-3

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA	VIETTA CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA 1 DE 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	M3	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	(10%) MANO DE OBRA	$ 85.110,75	10%	$ 8.511,08
ALQUILER PLATAFORMA VIBRATORIA TIPO RANA	DIA	$ 150.000,00	0,182	$ 27.300,00
			SUBTOTAL $	$ 35.811,08

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr. UNITARIO
MANUAL TERRESTRE	0,862		M3	$ 45.000,00	$ 38.790,00
				SUBTOTAL $	$ 38.790,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 07; 1O+2A	$ 186.076,00	$ 154.367,00	$ 340.443,00	0,250	85.110,75
				SUBTOTAL $	$ 85.110,75
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 159.711,83

V. COSTOS INDIRECTOS

Administración	29,41%	$ 46.965,75
Imprevistos	1,00%	$ 1.597,12
Utilidad	6,00%	$ 9.582,71
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 58.145,58
PRECIO UNITARIO TOTAL		$ 217.857,41

KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO
VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.560.635-3

CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA	VIETTA CONSTRUCCIONES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA 1 DE 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-04	DREN TIPO FRANCES (DIMENSIONES 0.5M X 0.7M)	ML	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	(10%) MANO DE OBRA	$ 260.438,90	10%	$ 26.043,89
			SUBTOTAL $	$ 26.043,89

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
GEOTEXTIL NO TEJIDO FIBERTEX F25	M2	2,52	$ 4.665,00	$ 11.755,80
			SUBTOTAL $	11.755,80

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr. UNITARIO
MANUAL TERRESTRE	0,515		M3	$ 45.000,00	$ 23.175,00
TRANSPORTE AÉREO BOGOTÁ - LETICIA	0,8		KG	$ 12.000,00	$ 9.600,00
				SUBTOTAL $	$ 32.775,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA 07; 1O+2A	$ 186.076,00	$ 154.367,00	$ 340.443,00	0,765	260.438,90
				SUBTOTAL $	$ 260.438,90
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 331.013,59

V. COSTOS INDIRECTOS

Administración	29,41%	$ 97.339,71
Imprevistos	1,00%	$ 3.310,14
Utilidad	6,00%	$ 19.860,82
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 120.510,66
PRECIO UNITARIO TOTAL		$ 451.524,25

KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO
VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.560.635-3

DISEÑO BASE CEMENTANTE
SUELO – CEMENTO
(PARA MEJORAMIENTO)

NORMAS RESPECTIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ARTÍCULO 341.

DISEÑOS PARA LAS VIAS DE LA COMUNIDAD CHORRERA.

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

NOVIEMBRE 2025

Calle 10a No. 8 - 65, Barrio Centro – Cel: 322 335 79 57
Leticia - Amazonas – Colombia – *labgeuz@hotmail.com*

DISEÑO SUELO CEMENTO (PARA MEJORAMIENTO)

De acuerdo con los ensayos de laboratorio obtenidos se llegó a la conclusión de adicionar 60 Kilogramos de cemento a un metro cubico (1 m^3) del material suelto, esto equivale al 4,0% de cemento por m^3, ya que este cumple con las especificaciones y normas del Instituto Nacional de Vías.

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

1. CEMENTO – Marca CAMPEON
   - Peso específico del cemento: 3.034 tipo 1

2. LIMO ARCILLOSO – Procedente Vía Chorrera.
   - Color Amarillo con vetas grises
   - Peso unitario suelto: 1.460 kg
   - Peso unitario compacto: 1.527 kg
   - Humedad natural de la arena: 39,4 %

ENSAYOS DE LABORATORIO

En el laboratorio de suelos se realizaron los siguientes ensayos a las arenas:

- Granulometría.
- Límites de consistencia.
- Peso unitario suelto.
- Peso unitario compacto.
- Humedad Natural.

Dando cumplimiento al artículo 341 del Instituto Nacional de Vías se procedió a mezclar 40 Kilogramos de cemento por metro cubico (1 m^3) del material existente; al obtener una mezcla homogénea se procedió a realizar los siguientes ensayos:

- INV E – 141: Relación de humedad masa unitaria seca de la mezcla (ensayo normal de compactación).
- INV E – 142: Relación de humedad masa unitaria seca en los suelos (ensayo modificado de compactación).
  INV E – 806: Relación de humedad masa unitaria humedad de la mezcla de arena – cemento.
- INV E – 808: Preparación y curado de briquetas de arena cemento para pruebas de compresión en el laboratorio.

- INV E – 809: Resistencia a la comprensión de briquetas elaboradas base ceméntate.

DISEÑO

En laboratorio se elaboraron diferentes briquetas y luego de realizar los ensayos pertinentes a la compresión se optó por hacer el diseño con el 4.0% de cemento, ya que los resultados obtenidos están por encima de las especificaciones y normas de INVIAS, por ello se desarrolló el siguiente diseño que cumple con las mismas.

Cemento: 4,0% = 60 kg por m³ del material existente.
Arena: Un metro cubico de material (Limos) suelto (1 m³) = 1,460 kg.
Arena: Un metro cubico de materia existente suelto más 60 Kg de cemento = 1.520 Kg/m³.
Peso unitario suelto de mezcla de limo y cemento (base cementante) = 1.520 Kg/m³.
Peso unitario compacto de mezcla del material y cemento (suelo cemento) = 1,779 Kg/m³.
Factor de compactación = 17 %.
Humedad natural del Material =39,4 %.

Cantidades en peso por metro cubico suelto de suelo cemento
Material (Limos arcillosos): 1.460 Kg/m³
Cemento: 60 Kg/m³

Cantidades en peso por metro cubico compacto de suelo cemento
Material (Limos arcillosos): 1779 Kg/m³
Cemento: 72 Kg/m³

RECOMENDACIONES

De acuerdo con el anterior diseño se recomienda lo siguiente para el correcto desarrollo de la obra:

- Descalificar el suelo existente (Subrasante), aplicar o extender el cemento haciendo aproximaciones por metro cubico, y/o por metro cuadrado.

Nota: Se anexa: ensayos de laboratorio del diseño

GERMAN GUTIERREZ BAEZ

TÉCNICO LABORATORISTA.


LABORATORIO DE SUELOS E INGENIERIA CIVIL	*FORMATO DE LABORATORIO*	Hoja Nº.: 1	De: 1
	CLASIFICACIÓN DE SUELOS Y AGREGADOS	Fecha Formato Oct/10/09	Versión: 01

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL COMUNIDAD VIA CHORRERA
LOCALIZACIÓN: COMUNIDAD INDIGENA VIA CHORRERA.
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
SECTOR:
DESCR MATERIAL: LIMO DE COMPRENSIBILIDAD MEDIA COLOR GRIS CLARO CON VETAS AMARILLAS

SONDEO Nº.:
MUESTRA Nº DOS (2)
PROFUNDIDAD:
FECHA RECIBIDO: 28-oct-25
FECHA ENSAYO: 2-nov-25


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO INV E - 213 - 07

PTS=	*485,9*	PTSL=	*416,6*			
Tamiz	P Retenido	% Retenido	% Ret Acum	% Pasa	LIM. INF.	LIM. SUP.
Nº 20	**0,0**	0,0	0,0	100,0		
Nº 40	**0,0**	0,0	0,0	100,0		
Nº 200	**69,3**	14,3	14,3	85,7		
FONDO	**416,6**	85,7	**100,0**	**0,0**		
TOTAL	***485,9***	***100,0***				

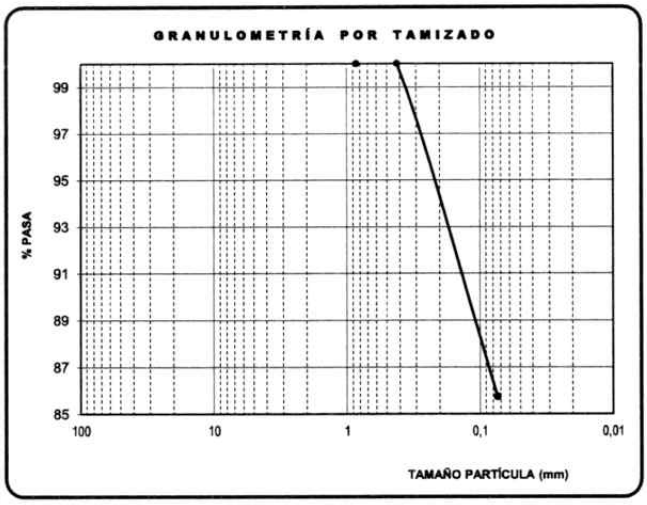

LIMITE LIQUIDO INV E- 125 - 07

Nº. De Golpes	34	24	14
Recipiente Nº	31	22	19
P1 Peso SH+Rec (g)	51,31	49,06	45,67
P2 Peso SS+Rec (g)	36,90	34,76	31,96
P3 Peso Rec (g)	7,55	7,41	7,21
% Humedad	49,1	52,3	55,4

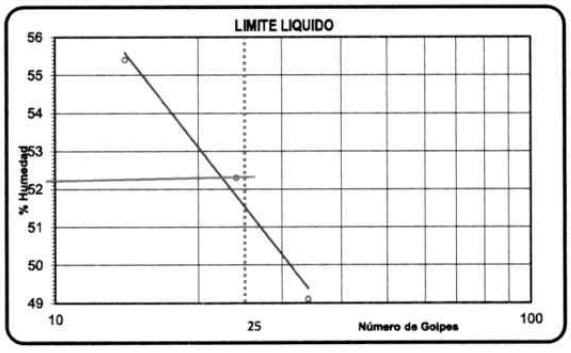

LIMITE PLASTICO INV E- 126 - 07			HUM. NAT.
Recipiente Nº	26	15	11
P1 Peso SH+Rec (g)	25,66	27,12	261,1
P2 Peso SS+Rec (g)	21,12	22,15	209,2
P3 Peso Rec (g)	7,30	7,12	72,2
% Humedad	32,9	33,1	37,9

LIMITES DE CONSISTENCIA		
Límite Líquido	(%)	52
Límite Plástico	(%)	33
Índice Plasticidad	(%)	19
Humedad Natural	(%)	38
Gravedad Específica	(g/cm³)	
CLASIFICACIÓN		
Clasificación U. S. C.		MH
Clasificación AASHTO		A - 7 - 5

Grava	(%)	0,0
Arena	(%)	14,3
Finos	(%)	85,7
Total	(%)	100,0

ESPECIFICACIÓN		
Límite Líquido	(%) máx.	52
Índice Plasticidad	(%) máx.	19

* Los resultados mostrados en éste informe, hacen referencia únicamente a la muestra ensayada relacionada. Estos ensayos se efectuaron según la norma establecida vigente.
Se prohíbe la reproducción total o parcial sin autorización del Geotecnólogo de laboratorio.

OBSERVACIONES:

FIRMA:
GERMÁN GUTIERREZ BAEZ
Laboratorista
Ejecutó

FIRMA:
Laboratorio de suelos e ingeniería civil
RICCI YESENIA DORIA C.
AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SUELOS E INGENIERIA CIVIL	*FORMATO DE LABORATORIO*	Hoja No.: 1	De: 1
	GRANULOMETRÍAS Y PESOS UNITARIOS	Fecha Formato Oct/10/08	
		Versión: 00	

PROYECTO: MUESTRA TOMADA PARA DISEÑOS DE VIAS DE LA COMUNIDAD VIA CHORRERA
SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
LOCALIZACION:
SECTOR:
DESCR MATERIAL: LIMO COLOR GRIS CLARO CON VETAS CARMELITAS Y AMARILLAS.

REF. N°.: UNO (1)
MUESTRA N° UNO (1)
ABSCISA/PROF(m):
FECHA RECIBIDO: 28-oct-25
FECHA ENSAYO: 2-nov-25

GRANULOMETRÍAS Y PESOS UNITARIOS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO INV E - 213 - 07

PTS=	*589,6*	PTSL=	*513,3*			
Tamiz	P Retenido	% Retenido	% Ret Acum	% Pasa	LIM. INF.	LIM. SUP.
		0,0	0,0	0,0		
		0,0	0,0	0,0		
		0,0	0,0	0,0		
		0,0	0,0	0,0		
		0,0	0,0	0,0		
N0 4		0,0	0,0	0,0		
No 8		0,0	0,0	0,0		
No 12		0,0	0,0	0,0		
N° 20		0,0	0,0	100,0		
N° 30	0,0	0,0	0,0	100,0		
N° 50	0,0	0,0	0,0	100,0		
N° 100	0,0	0,0	0,0	100,0		
N° 200	76,3	12,9	12,9	87,1		
FONDO	513,3	87,1	100,0	0,0		
TOTAL	*589,6*	*100,0*				

% Grava = 00 % Arena = 12,9 % Finos = 87,1

HUMEDAD	
Recipiente #	5
P1 (gr)	304,5
P2 (gr)	234,1
P3 (gr)	55,5
%W	39,4%

PROBETA	
DIMENSION INICIAL	
Diámetro superior (cm)	12,30
Diámetro medio (cm)	12,30
Diámetro inferior (cm)	12,30
Diámetro promedio (cm)	12,30
Altura en cm	15,00
Area en cm^2	118,82
Peso en gramos	2611,0
Volumen en cm^3	1782,35
Humedad %	39,4%

TIPO DE MATERIAL	
Suelo	X

PESO UNITARIO (kN/m^3)	
Humedo	1,46
Seco	1,05

OBSERVACIONI LIMO DE CONSISTENCIA BLANDA A FIRME COLOR GRIS CLARO CON VETAS AMARILLAS Y CARMELITAS
Humedad natural 39,4 %. - Peso unitario humedo 1,46 kg/cm3. - Peso unitario seco 1,05. kg/cm3. - % Grava 0,00. - % Arena 12,9 % Finos 87,1 %.

FIRMA: Laboratorio de suelos e ingeniería civil
RICCI YESENIA DORIA CAHUACHI.
Auxiliar de Laboratorio.

FIRMA:
GERMAN [illegible]
Tecnico Laboratorista.

LABORATORIO DE SUELOS E INGENIERIA CIVIL

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRIQUETAS 12 Kg/Cm2

OBRA: COSTRUCCION MALLA VIAL COMUNIDAD VIA CHORRERA	
MATERIAL:MATERIAL EXISTENTE LIMO ESTABILIZADO CON EL 4% DE CEMENTO	
DESCIPCIONDELI MATERIAL: LIMO COLOR GRIS CLARO	
FUENTE:	

RESISTENCIA A LA COMPRESION	12 Kg /cm2
FORMATO BRC	1
FECHA	7-nov.-25

% CEMENTO	Briqueta		FECHA DE TOMA	Localización	Margen	Fecha de Rotura	EDAD - DIAS	Diamet.(cm)	Altura(cm)	PESO (gr)	Densidad (gr/cm3)	CARGA (KN)	Area (cm2)	Resisten (kg/cm2)	Volumen (cm3)	Promedio de Resisitencia	Porcentaje de Resistencia
Material existente, limo estabilizado con el 2 % de cemento	D. JKS 05	A	3-mar.-24	LABORATORIO		7-mar.-24	4	10,2	12,5	1961,3	1,92	5,2	81,71	6,49	1021,4		
		B	3-mar.-24			7-mar.-24	4	10,2	12,4	1957,7	1,93	4,9	81,71	6,12	1013,2		
		C	3-mar.-24			7-mar.-24	4	10,2	12,6	2004,4	1,95	5,4	81,71	6,74	1029,6	6,45	53,8
Material existente, limo estabilizado con el 3 % de cemento	D. JKS 06	A	3-mar.-24	LABORATORIO		7-mar.-24	4	10,2	12,6	1810,2	1,76	6,9	81,71	8,62	1029,6		
		B	3-mar.-24			7-mar.-24	4	10,2	12,0	1790,8	1,83	7,3	81,71	9,12	980,52		
		C	3-mar.-24			7-mar.-24	4	10,2	12,3	1802,2	1,79	7,8	81,71	9,74	1005	9,16	76,3
Material existente, limo estabilizado con el 4 % de cemento	D. JKS 07	A	4-mar.-24	LABORATORIO		7-mar.-24	3	10,3	12,5	1841,1	1,77	9,1	83,32	11,14	1041,5		
		B	4-mar.-24			7-mar.-24	3	10,2	12,1	1820,3	1,84	9,2	81,71	11,49	988,69		
		C	4-mar.-24			7-mar.-24	3	10,1	12,6	1851,4	1,83	8,9	80,12	11,34	1009,5	11,32	94,4

OBSERVACIONES

GERMAN GUTIERREZ BAEZ
Laboratorista
CEL. 3138712935
T.P 1104-T

Laboratorio de suelos e ingenieria civil

RICCI YESENIA DORIA C.
AUXILIAR DE LABORATORIO

AF&C SOLUCIONES S.A.S.

ASESORÍA, FERRETERÍA & CONSTRUCCIONES

Nit: 900698792-5
IVA Regimen Comun

COTIZACION C13 - 3388

Cliente	VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S	Fecha Emision:	Nov-04-2025
NIT. o CC.	NIT 900560635-3	Fecha de vencimiento	Nov-04-2025
Direccion	CALLE 74 15-80 IN 1 OF 413		
Telefono Cliente	6015228507		

REFERENCIA	CANT,	DETALLE	VR/UNITARIO ANTES DE IVA	VR/TOTAL ANTES DE IVA	%IVA
2019235	10	TUBO ALCANTARILLADO 6" S4 UND	265,043.00	2,650,430.00	19
2019236	10	TUBO ALCANTARILLADO 8" S4 UND	378,880.00	3,788,800.00	19

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS mcte.

_7A20IWSJV

SUBTOTAL	6,439,230.00
IVA	1,223,454.00
TOTAL	7,662,684.00

OBSERVACIONES:

IMPORTANTE:

1. Para los pedidos cuyo peso total sea menor o igual a 30 Kg., el valor del transporte será asumido por el cliente.
2. La solicitud de cancelación de pedidos por parte del cliente debe realizarse por escrito en un plazo máximo de dos (2) días calendario después de enviada la orden de compra y confirmación de recibido por parte del comercial.
3. Todo pedido admite despachos según disponibilidad de inventario y pagos parciales.
4. Es responsabilidad del cliente vericar la mercancía en cuanto a estado y cantidades antes de recibirla a satisfacción y firmar la guía de entrega (remisión).
5. Para clientes con crédito asignado, en caso que existan facturas con vencimiento mayor a 30 días, automáticamente se suspenderán los despachos hasta tanto el cliente esté al día en sus pagos.
6. Plazo de entrega: Según disponibilidad del producto y consolidación de la entrega. Después de $800.000 el envio es gratuito en el perimetro urbano de la ciudad.
7. Toda devolución de mercancia por error del cliente en el trámite de su pedido causará un cobro equivalente al 10% del valor del material.
8. AF&C SOLUCIONES no recibirá sin previa autorización mercancía con fletes al cobro por devolución, revisiones o garantías.
9. En productos de fabricación especial no se acepta devolución.

AF&C SOLUCIONES LO INVITA A VERIFICAR Y CONFIRMAR QUE LA COTIZACION ESTE ACORDE A SU SOLICITUD

Elaboro: ARCILA CASTRILLON ANDRES FELIPE **Celular:** 3102285145 **Correo:** felipearcila_19@hotmail.com

TRIAL MODE - Click here for more information

Activa

GEOMATRIX S.A.S.
NIT 800.021.390-1 IVA RÉGIMEN COMÚN
Calle 15 No. 72 - 72
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
Teléfono: 57 (601) 4249999
Servicio al cliente: 57 (601) 4249996
servicioalcliente@geomatrix.com.co
www.geomatrix.co

COTIZACIÓN PROFORMA No. COT-79475-FFHP

FECHA:	10/12/2025

EMPRESA:	VIETTA CONSTRUCCIONES SAS	**NIT/RUC:**	900560635
CONTACTO:	KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO CAICEDO	**CELULAR:**	3132166020
TELÉFONO:	3030594	**CORREO:**	admon@viettaconstrucciones.com
DIRECCIÓN:	CL 55 A SUR 70 63	**CIUDAD:**	Leticia

En atención a su solicitud relacionamos los precios y condiciones para el suministro de materiales:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
FIBERTEX F25 Geotextil no tejido elaborado con fibras vírgenes de polipropileno. (PP). Ancho: 4,0 m ; Longitud: 100 m	400,00	M2	$ 6.860,00	$ 2.744.000,00

SON:	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA	**TOTAL:**	$ 2.744.000,00
		I.V.A:	$ 521.360,00
		TOTAL CON I.V.A:	$ 3.265.360,00

OBSERVACIONES:
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE OFERTA SON DE REFERENCIA
NO INCLUYE VALOR DE ENVÍO

Forma de pago: Anticipado
Formalización del pedido: orden de compra dirigida a GEOMATRIX S.A.S. NIT: 800021390-1.
Disponibilidad: de acuerdo a verificación de inventario.
Vigencia de la oferta: 30 DÍAS

Alexander Neira Conde
Asesor Experto Geosintéticos.
Bogotá D.C., Colombia
Tel: 6014249999 Ext. 3740
Cel: 57 3177467848
aneira@geomatrix.com.co

Activa



GEOMATRIX S.A.S.
NIT 800.021.390-1 IVA RÉGIMEN COMÚN
Calle 15 No. 72 - 72
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA
Teléfono: 57 (601) 4249999
Servicio al cliente: 57 (601) 4249996
servicioalcliente@geomatrix.com.co
www.geomatrix.co

NOTA: Somos Grandes Contribuyentes, somos régimen común. Favor no efectuar retención a título de renta, somos autoretenedores en el impuesto de renta y complementarios Resolución DIAN No. 007241 de 2009/07/10.
Favor no efectuar retención a título de impuesto sobre las ventas, somos agentes de retención del impuesto sobre las ventas Resolución DIAN No. 008207 de 2009/08/04, la cual entra en vigencia a partir del 1 de Septiembre de 2009.

Si efectúa pago por consignación bancaria hacerlo a nombre de Geomatrix S.A. NIT. 800.021.390-1 en:
Davivienda Cuenta de Ahorros No. 007200654270
Bancolombia Cuenta Corriente No. 03135192667
Favor enviar consignación al Fax: 57 (1) 4110980

GEOMATRIX S.A.S. se reserva el derecho de cobrar intereses de mora, si el pago se hace después de la factura.

Alexander Neira Conde
Asesor Experto Geosintéticos.
Bogotá D.C., Colombia
Tel: 6014249999 Ext. 3740
Cel: 57 3177467848
aneira@geomatrix.com.co



Guardar en Mis listas

Pavco Wavin

Geotextil NT 1600S 1mt Largo X 3.5mt Ancho

Código 149167



$12.900 und

$3.685,71 metro cuadrado.

− 1 + Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo : Aislantes geotextil y geomembrana
- Características : Alta durabilidad, no se degrada, fácil instalación, hecho en Colombia
- Rendimiento : Según tipo de obra
- Garantía : 1 año

Ver más especificaciones

VIETTA
CONSTRUCCIONES

NIT. 900.560.635-3

ÍTEM:	NP-1	DESCRIPCIÓN:	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) Y CEMENTO	UNIDAD:	M3

DESCRIPCIÓN

El mejoramiento de la subrasante mediante la adición de cemento como agente estabilizante, produce el incremento de la resistencia. de acuerdo con las dimensiones, alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

1. En la fase de experimentación, el Constructor realizará ensayos con secciones definidas para probar equipos y métodos, ajustándose a los requisitos del Interventor. Este evaluará muestras y exigirá ajustes si no se cumplen las especificaciones.

2. En la pulverización, se prepara el suelo con equipo adecuado, limitando el área tratada a lo que pueda compactarse en dos días.

3. La aplicación del cemento puede hacerse en polvo o en lechada, según lo aprobado, respetando los niveles de humedad definidos y limitando el trabajo diario a lo que pueda completarse en la jornada.

4. La mezcla debe garantizar homogeneidad con los equipos aprobados y respetar los niveles de humedad del diseño, mientras que la compactación debe finalizar en un máximo de dos horas desde la mezcla.

5. Se deben cuidar las juntas de trabajo, proteger la capa compactada con un curado de al menos siete días, y realizar las actividades bajo condiciones climáticas adecuadas. Si llueve o la mezcla es afectada, debe reconstruirse sin costos adicionales.

6. El Constructor deberá conservar la capa de subrasante estabilizada con cemento en perfectas condiciones, hasta que se construya la capa superior prevista en los documentos del proyecto.

ENSAYOS PARA REALIZAR

- · Norma INV E - 121.
- · Norma INV E - 123.
- · Norma INV E - 125.
- · Norma INV E - 235.

MATERIALES

- Cemento Portland.
- Agua.

EQUIPO

- Considera todos aquellos elementos que hacen necesaria la operación como Bulldozer, retroexcavadora, bombas, cilindros compactadores, niveladoras, coches, herramienta menor etc.

DESPERDICIOS	Incluidos SI: X NO:	MANO DE OBRA	Incluida SI: X NO:

VIETTA
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.560.635-3

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al entero, de mezcla colocada y compactada, a satisfacción del Interventor, de acuerdo esta especificación. El volumen se determinará utilizando la longitud real medida a lo largo del eje de la vía y las secciones transversales establecidas en los planos del proyecto, previa verificación de que su anchura y espesor se encuentren conformes con dichos planos.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES.
- Planos de Levantamiento topográfico.

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ÍTEM:	NP-2	**DESCRIPCIÓN:**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT DE 6"	**UNIDAD:**	ML

DESCRIPCIÓN
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, y tuberías, necesarios para la instalación de redes - sanitarias.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
1. Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias.
2. Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la RAS
3. Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
4. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
5. Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos - Sanitarios y descritos en las cantidades de obra.
6. Revisión, pruebas y aceptación.

ENSAYOS PARA REALIZAR
- Prueba de flujo.
- Prueba de desagües.

MATERIALES
- Tubería Novafort de 6".
- Lubricante tubería unión mecánica.
- Arena de la región.

EQUIPO
- Considera todos aquellos elementos que hacen necesaria la operación como Bulldozer, retroexcavadora, bombas, cilindros compactadores, niveladoras, coches, herramienta menor etc.

DESPERDICIOS	Incluidos **SI:** X **NO:**	**MANO DE OBRA**	Incluida **SI:** X **NO:**

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La unidad de medida será el metro lineal (ml), aproximado al entero, de • Tubería Novafort de 6" entregada a satisfacción del Interventor, de acuerdo esta especificación. La longitud se determinará utilizando la longitud real medida a lo largo del eje del andén y las secciones transversales establecidas en los planos del proyecto, conformes con dichos planos.

VIETTA
CONSTRUCCIONES
NIT. 900.560.635-3

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES.

- Planos de Levantamiento topográfico.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ÍTEM:	NP-3	DESCRIPCIÓN:	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	UNIDAD:	M3

DESCRIPCIÓN

El ítem relleno en tierra seleccionada contempla, la selección del material de excavación, extensión, compactación a la humedad óptima con equipo de compactación con compactador de impacto (canguro) o rana en capas máximo de 15cm y se utilizará en los aproches de las cunetas, los trabajos se recibirán a satisfacción del interventor, excluyendo material orgánico en los rellenos y colchones por saturación del material compactado.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

1. Los trabajos conformación de sitios de disposición de sobrantes provenientes de la explanación, excavación, derrumbes, demoliciones, fresados, entre otros, se realizarán a cielo abierto y en condiciones de luz solar. Eventualmente, si las condiciones del proyecto lo exigen y a juicio de la Interventoría, podría autorizarse el trabajo nocturno en la zona de depósito previa disposición en el lugar de la infraestructura requerida para que, mediante iluminación artificial, se propicien las condiciones para que la actividad pueda desarrollarse en condiciones de seguridad y confiabilidad.
2. Una vez el material se halla transportado hasta la zona del depósito, El material de cobertura se descargará en un lugar previamente escogido y autorizado por el Interventor. Luego, el material se extenderá cuidadosamente.
3. El material de relleno se compactará con el equipo adecuado, hasta lograr el grado de compactación exigido para el material en la especificación respectiva o el solicitado por el Interventor, antes de dar paso al tráfico temporal sobre el andén o comenzar las labores de colocación de la siguiente capa. El relleno se llevará a cabo hasta la cota indicada en los planos o la ordenada por el Interventor.

ENSAYOS PARA REALIZAR

- · Norma INV E - 121.
- · Norma INV E - 123.
- · Norma INV E - 125.
- · Norma INV E - 235.

MATERIALES

- Material de excavación.
- Agua.

EQUIPO • Considera todos aquellos elementos que hacen necesaria la operación como Bulldozer, retroexcavadora, bombas, cilindros compactadores, niveladoras, coches, herramienta menor etc.

DESPERDICIOS	Incluidos **SI:** X **NO:**	**MANO DE OBRA**	Incluida **SI:** X **NO:**

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. El relleno con material seleccionado se cuantifica por metro cúbico(M3) compacto recibido a satisfacción del interventor aproximado al entero superior cuando la décima corresponde entre 6 y 9 e inferior cuando corresponde a la décima de 1 a 4 del cubicaje cuantificado
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. • Planos de Levantamiento topográfico.
NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ÍTEM:	NP-4	**DESCRIPCIÓN:**	DREN TIPO FRANCES (DIMENSIONES 0.5M X 0.7M)	**UNIDAD:**	ML

DESCRIPCIÓN El ítem dren tipo francés contempla la construcción de filtros de control de aguas superficiales para su conducción, se utilizará en los tramos donde sea necesario la evacuación de aguas que afecten la estabilidad de los andenes construidos evitando la socavación, los trabajos se recibirán a satisfacción del interventor.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 1. Se realizará excavación de la zona donde se deba construir el filtro para retirar el exceso de materiales de rellenos, dejando un espacio de 0.5 m x 0.7 m. 2. Se realizará la instalación de geotextil en el área señalada, luego se rellenará con material tipo grava que permita la permeabilidad y transito del agua que será recolectada. 3. Se cubrirá el material tipo grava con el geotextil y se amarrará para evitar que este material se salga, luego se rellena con material de sitio la zona a nivel.
ENSAYOS PARA REALIZAR • · Norma INV E - 121. • · Norma INV E - 123. • · Norma INV E - 125. • · Norma INV E - 235.
MATERIALES • Geotextil no tejido fibertex F25 • Grava de relleno
EQUIPO • Considera todos aquellos elementos que hacen necesaria la operación como herramienta menor etc.

VIETTA
CONSTRUCCIONES

NIT. 900.560.635-3

DESPERDICIOS	Incluidos **SI:** X **NO:**	**MANO DE OBRA**	Incluida **SI:** X **NO:**

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

El dren tipo francés se cuantifica por metro lineal (ML) construido y recibido a satisfacción del interventor aproximado al entero.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES.

- Planos de Levantamiento topográfico.


NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.560.635-3

DAVID LEONARDO ROZO GASCA
DIRECTOR DE OBRA
VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.560.635-3

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1	**CONTRATO DE OBRA 1868 DE 2025**	**236 días**	**mar 5/08/25**	**mar 28/04/26**	**$ 4.790.373.899,33**
2	LOGISTICA PARA SUMINISTRO DE MATERIALES	30 días	mar 5/08/25	mar 2/09/25	$ 0,00
3	SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD	0 días	jue 28/08/25	jue 28/08/25	$ 0,00
4	**OBRA**	**206 días**	**mié 3/09/25**	**mar 28/04/2**	**$ 4.790.373.899,33**
5	LOCALIZACION Y REPLANTEO	45 días	mié 3/09/25	mar 14/10/25	$ 50.921.089,62
6	DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	45 días	vie 12/09/25	vie 24/10/25	$ 39.418.490,92
7	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0.50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS	90 días	sáb 6/09/25	vie 28/11/25	$ 69.967.685,52
8	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES	65 días	lun 24/11/25	lun 9/03/26	$ 78.704.362,00
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E= 0.10 MTS	100 días	mié 3/12/25	lun 20/04/26	$ 755.553.424,65
10	ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA # 5	77 días	jue 12/02/26	vie 24/04/26	$ 227.147.168,89
11	CONCRETO DE 300 PSI PARA ANDENES	77 días	vie 13/02/26	sáb 25/04/26	$ 927.033.233,27
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	77 días	vie 13/02/26	sáb 25/04/26	$ 379.357.917,04
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E= 0.15*0.30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	77 días	vie 13/02/26	sáb 25/04/26	$ 1.012.041.116,62
14	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E=0.07 MTS	51 días	mié 11/03/26	lun 27/04/26	$ 1.009.220.525,87
15	DILATACION DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)	30 días	mar 31/03/26	mar 28/04/26	$ 24.639.520,79
16	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION) Y CEMENTO	45 días	mar 17/03/26	mar 28/04/26	$ 190.490.583,09
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 6"	12 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26	$ 6.465.268,31
18	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	25 días	dom 5/04/26	mar 28/04/26	$ 11.267.585,33
19	DREN TIPO FRANCES	12 días	vie 17/04/26	mar 28/04/2	$ 8.145.927,41

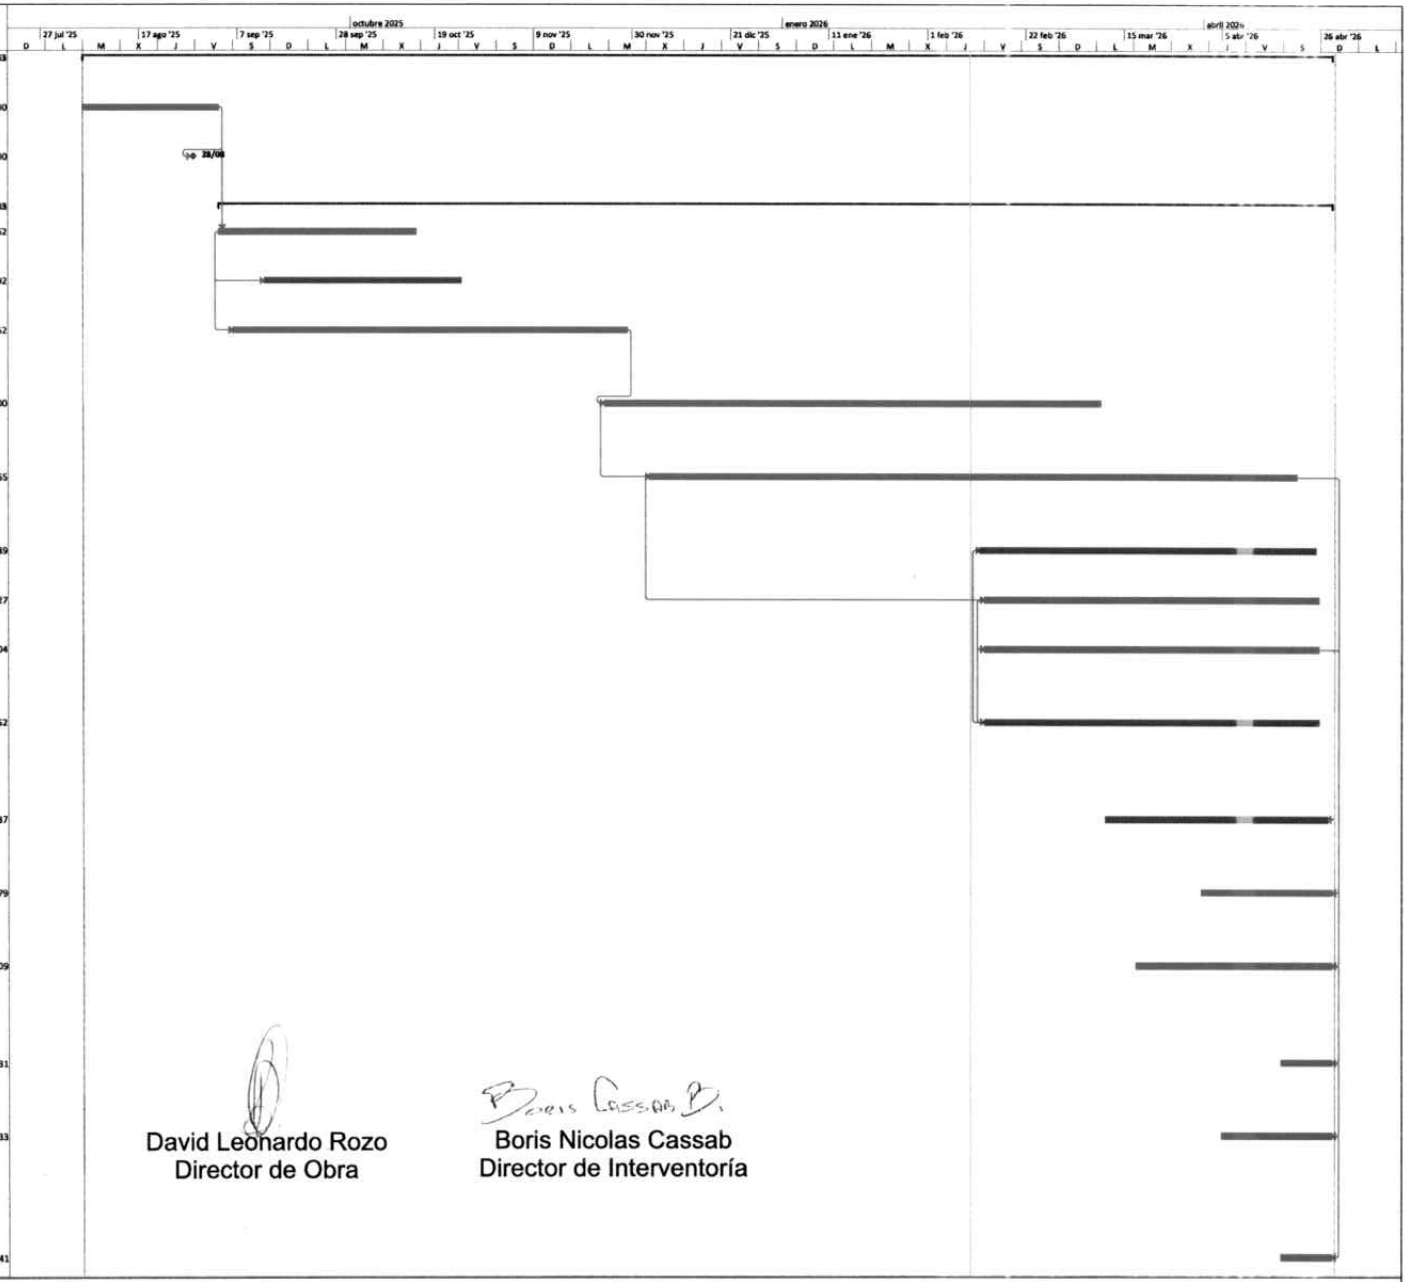

David Leonardo Rozo
Director de Obra

Boris Nicolas Cassab
Director de Interventoría

Proyecto: CRONOGRAMA PRORROGA CHOR

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso
