Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código: PM-FT-01** **Versión: 05** Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				**Acta de Seguimiento**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	9:00 am	**Hora de finalización**	10:00 pm
	24	09	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Carlos Andrés Vasquez	Fundación Pies Descalzos
Juan Andrés Lemus	Director Financiero y de Infraestructura educativa - Fundación Pies Descalzos
Claudia Arzayús	Oficina Infraestructura Educativa Ministerio Educación Nacional
Gina Acosta Abril	Apoyo Administrativo y Financiero Fundación Pies Descalzos

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento convenio de Asociación CO1.PCCNTR 6493103 con la Fundación de Pies Descalzos para “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de la infraestructura educativa”, que van dirigidos a los departamentos de La Guajira y Norte de Santander.

No verificado

TEMAS TRATADOS	
1	Las sedes que están siendo atendidas el convenio y los respectivos alcances definidos: **I.E. Villa Fátima sede principal**, ubicada en el corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, matrícula de 559 estudiantes para los estudiantes de 5 a 11 grado, se requieren 22 aulas, baterías sanitarias, aula múltiple (comedor), cocina y dotación. Institución educativa que esta en un compromiso de Regiones de Presidencia. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, corregimiento de Villa Fátima en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 240 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple (comedor), cocina, dotación y pozo de agua profunda. **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi, corregimiento de Villa Parashi**, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 696 estudiantes, se requieren 15 aulas adicionales, aula múltiple (comerdor), cocina y dotación. **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, corregimiento de Villa Parashi, en la Alta Guajira a 6 horas de casco Urbano de Uribia, tiene matrícula 350 estudiantes, se requiere 8 aulas adicionales, aula múltiple (comedor), cocina y dotación. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, zona rural, tiene matrícula 2.300 estudiantes, se requiere 46 aulas, dotación y baterías sanitarias. **I.E. Norberto Iguaran nuevo lote** en la pista para preescolar en el municipio de Maicao I.E. para preescolar. 6 aulas, baterías sanitas, un aula multiuso (Comedor) con cocina y sala profesores. **I.E. Simón Bolívar**, en el municipio de Belén de Bajirá, 6 aulas, baterías sanitarias 1 aula

	multiuso, dotación y zona administrativa **IE colegio nuevo Tibú** : 14 aulas Básica media, 12 aulas Básica Primaria, 6 aulas preescolar, 7 baterías sanitarias, 1 Comedor, 1Cocina, 1 Biblioteca, 1 Laboratorio Física, 1 Laboratorio Química, 2 aulas de tecnología2 aulas polivalentes, 1 sala profesores, 1 Área administrativa, 1 Enfermería, Áreas recreativas, Parqueaderos y Dotación de todos los espacios con mobiliario y dotación cocina. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana** de Nortechón del municipio de Uribia. Alcance, Dos (2) áreas recreativas, de las cuales una lleva cubierta (Cancha multiuso). **Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua**, Matrícula de 730 estudiantes. Alcance: 24 aulas, 7 espacios para alojamiento,1 Aula Taller Lectura, 1 Administración y Enfermería, Baterías Sanitarias, comedor cocina y dotación.
2	**Avances de los proyectos:** **IE colegio nuevo Tibú**, vereda la Cuatro, el porcentaje de avance ejecución **100%**, Finalizó el 31 de agosto 2025. **I.E. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain** del municipio de Uribia, este proyecto se está ejecutando por etapas para que se pueda continuar prestando el servicio, el porcentaje de avance ejecución **95%**, se estima finalizar en el mes de octubre 2025. Estamos en fase II. **I.E. Villa Fátima sede principal**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, se estima finalización en el mes de septiembre 2025. **I.E Villa Fátima sede Taguaira**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, está en etapa de finalización de mampostería, 6 bloques de aulas, finalizó en el mes de julio 2025. Se está finalizando el pozo de agua profunda. **I.E. Centro Educativo Rural Valle del Parashi**, **el p**orcentaje de avance ejecución **85 %**, están en etapa de cubiertas, se estima finalización en el mes de octubre 2025. **I.E. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana**, el porcentaje de avance ejecución **100%**, levantamiento de muros, se estima finalización en el mes de agosto 2025. **I.E. Norberto Iguaran municipio de Maicao**, el porcentaje de avance ejecución **50%**, en epata de cimentación , se estima finalizar en el mes de octubre 2025. **I.E. Simón Bolívar, Belén de Bajirá** el porcentaje de avance ejecución **60%**, terminado armado de vigas y empiezan a fundir vías aéreas, se estima finalizar en el mes de noviembre 2025. **Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechón** del municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución **35%**, la cubierta para instalar llega a mediado de septiembre, se estima finalizar en el mes de octubre 2025. **Institución Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua**, Alta Guajira Municipio de Uribia, el porcentaje de avance ejecución 5**%,** están en replanteo, excavaciones, fundiendo vigas de cimentación y las primeras placas, se estima fecha de terminación febrero

	2026. No se ha avanzado en el tema de la armada y se están revisando los temas de proveedores, inicialmente en Uribia y si la armada logra llevar materiales se van con proveedores de Barranquilla que tienes mejores precios. **En estudios y diseños:** **Municipio Uribia** • I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana, se enviaron documentos para la licencies a la Secretaría de Educación de Uribia, quien la tramita. Radicado licencia • Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Mapuain, se enviaron documentos para la licencies a la Secretaría de Educación de Uribia, quien la tramita. Se viene avanzando con la comunidade, se han avanzado com los câmbios para la implantación, pidoeron um ajuste se los bloques en la parte superior. Se estima iniciar entre la ultima semana de septiembre y la primera de octubre 2025.Radicado Licencia • Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu, se enviaron documentos para la licencies a la Secretaría de Educación de Uribia, quien la tramita. Radicado Licencia. Inicio obras noviembre- diciembre **Municipio Rioacha:** • Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal Inicio obras noviembre- diciembre • Institución Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero Inicio obras noviembre-diciembre **Municipio Fonseca:** • Institución Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez Inicio obras noviembre- diciembre **Quibdó – Chocó:** • IE Antonio Ricaurte sede principal, se está revisando el tema de licencias y alcance del proyecto, este es menor al prediseñado, comedor cocina, biblioteca, zona administrativa y dos aulas polivalentes, para varios usos. Se estima iniciar en el mes de octubre y se esta revisando el tema de las licencias, revisar dinamina de cada territorio. Inicio obra noviembre
3	Juan Andres informa que los proyectos que se están finalizando están siendo entregados a la comunidad con acta para ser puestas de uso de manera inmediata y poder aprovechas estas infraestructuras. Se solicita que estas actas sean firmadas también por la ETC de Uribia.
4	Nos informan que ya la dotación está en Uribia y que esta semana será distribuida en las sedes de la Alta Guajira.
5	Se informa a Juan Andres que el viaje a Tibú lo acompañara la Jefe de la Oficina de Infraestructura y la Subdirectora de Acceso.
6	Se establece programar visita de seguimiento a la Guajira seria para la semana del 14 al 17 de

No Clasificada

	octubre de 2025
7	Se solicita enviar los informes de agosto 2025, y los formatos de seguimiento financieros, actas de entrega y acta de socialización de los proyectos.
8	Se continua a la espera de que el Despacho informe la fecha del acto protocolario el acto protocolario de Villa Fátima sede principal, Villa Fátima sede Taguaira y Centro Etnoeducativo Integral Rural Valle de Parashi.
9	Se recomienda el tema de pago en el mes de octubre ya se solicitó PAC.
10	

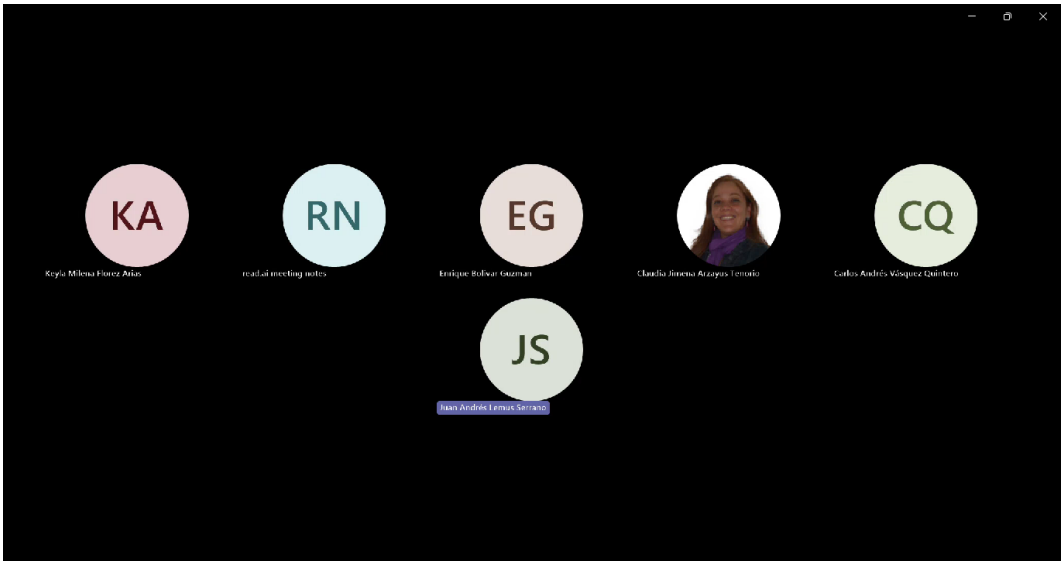
CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se está en trámite de licencia para el proyecto de las tres proyectos (I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana, Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Mapuain y Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu del municipio de Uribia)
2	Se solicita enviar informe del mes de Septiembre 2025 y los formatos financieros
3	Pendientes que el Despacho defina la fecha del acto protocolario de La Guajira, se estima para finales de octubre.
4	Se programa próximo comité técnico para el 7-10-2025
5	Se está programando visita de seguimiento a los proyectos de la Guajira en la semana del 14 al 17 de octubre de 2025 y posiblemente se visite el proyecto de Carasua que ya inició.
6	

Uso Clasificado

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se establece informe mensual de avance físico y financiero del proyecto del mes de septiembre 2025	30-10-2025	La Fundación
Licencias tres (3) proyectos (I.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana, Institución Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Mapuain y Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu del municipio de Uribia)	30-10-2025	La Fundación y la ETC Uribia

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	NOMBRE2	DOCUMEI	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRÓNI	CELULAR
1	9/24/25 9:54:51	9/24/25 9:55:59	Keyla Milena Florez Ar	49784307	MEN	Contratista - DIE	kflorez@mineducacio	3159252051
2	9/24/25 9:57:14	9/24/25 9:57:56	JUAN ANDRES LEMUS	13542371	FUNDACION PIES DESC	DIR FINANCIERO	juanandres@fpd.ong	3175130552
3	9/24/25 9:59:04	9/24/25 10:02:23	Carlos Andrés Vásque	79797289	Fundación Pies Descal	Arquitecto	carlosv@carlosvasque	3204938181
4	9/24/25 10:03:13	9/24/25 10:03:55	CLAUDIA ARZAYUS	38655368	MEN	OFICINA INFRAESTRUC	carzayus@mineducaci	3164417801
5	9/24/25 10:03:13	9/24/25 10:03:55	ENRIQUE BOLIVAR		MEN	OFICINA INFRAESTRUC	ebolivar@mineducaci	3167486156



No Clasificado

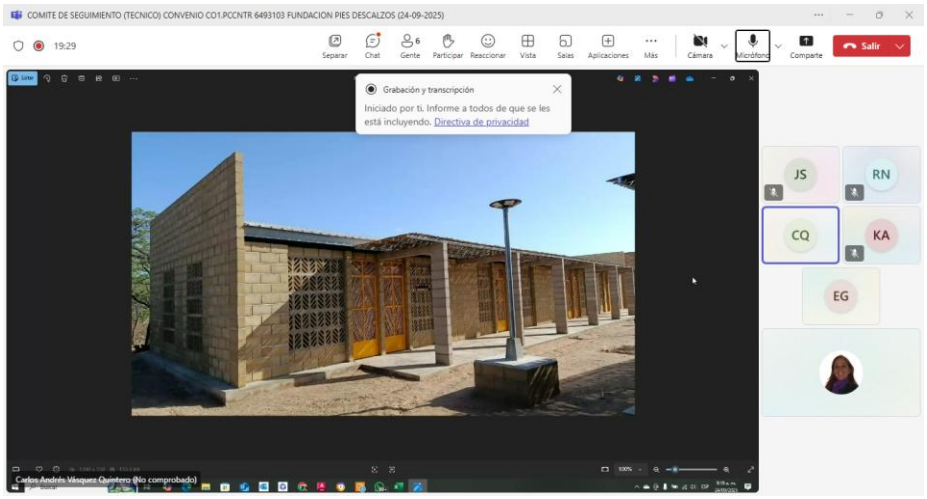
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)
N/A

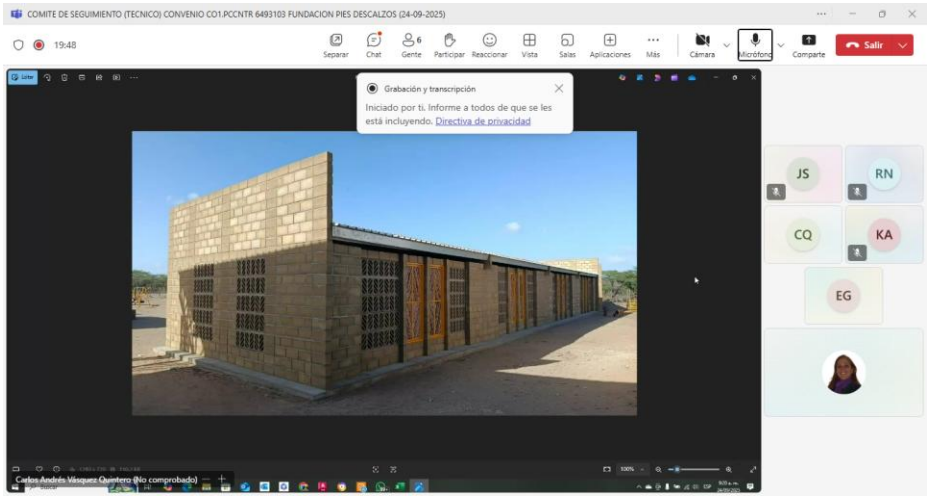
Se está programando visita de seguimiento la semana del 14 al 17 de octubre de 2025 y posiblemente se visite el proyecto de Carasua que ya inició.	17-10-2025	MEN, ETC Uribia y La Fundación

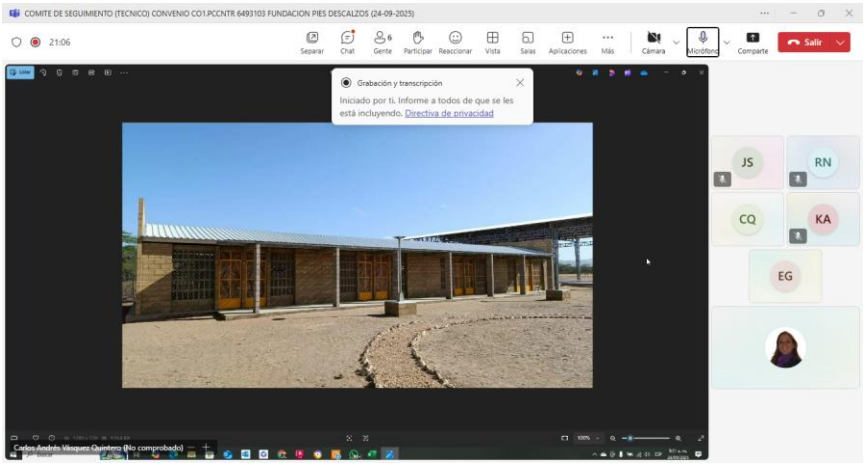
ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

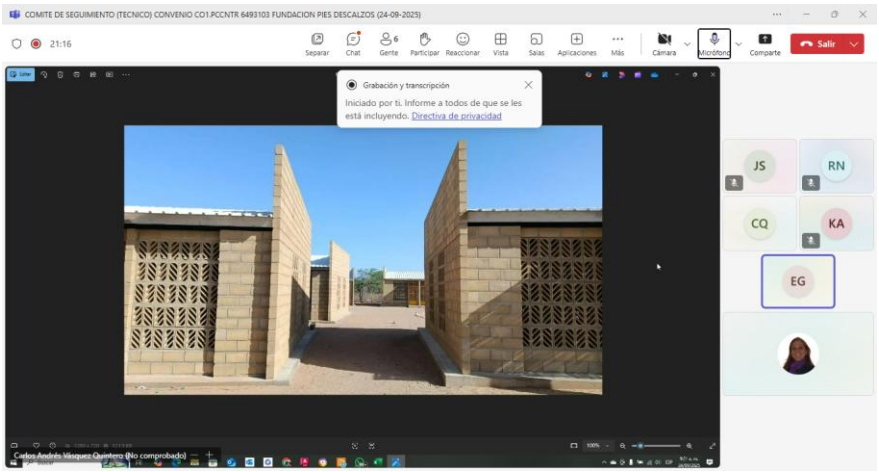
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

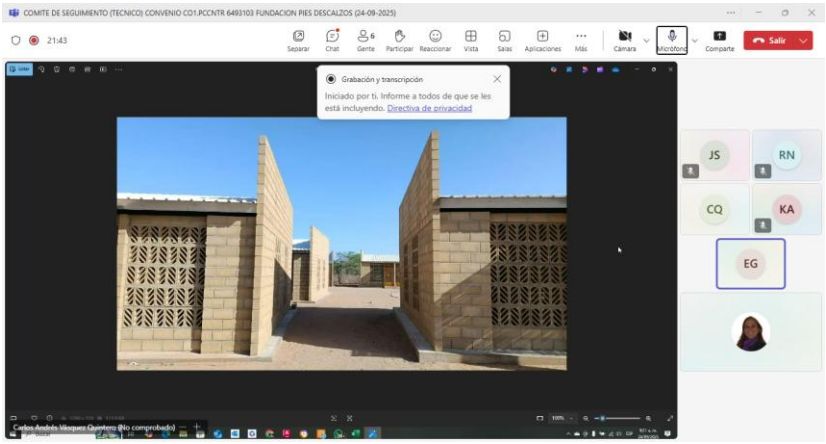
Villa Fátima sede Principal

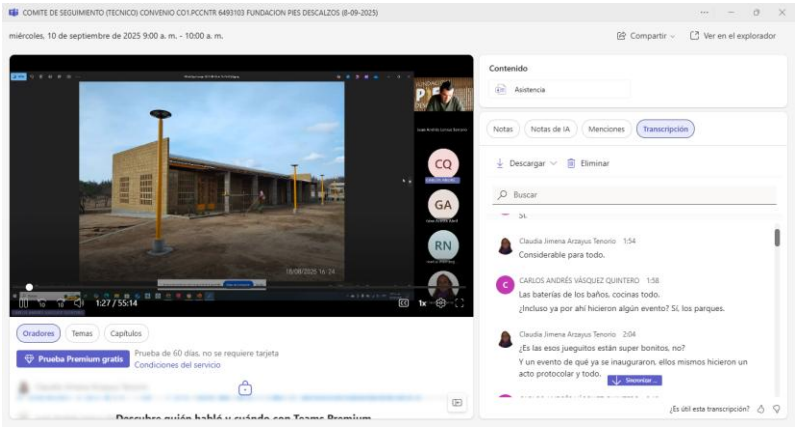


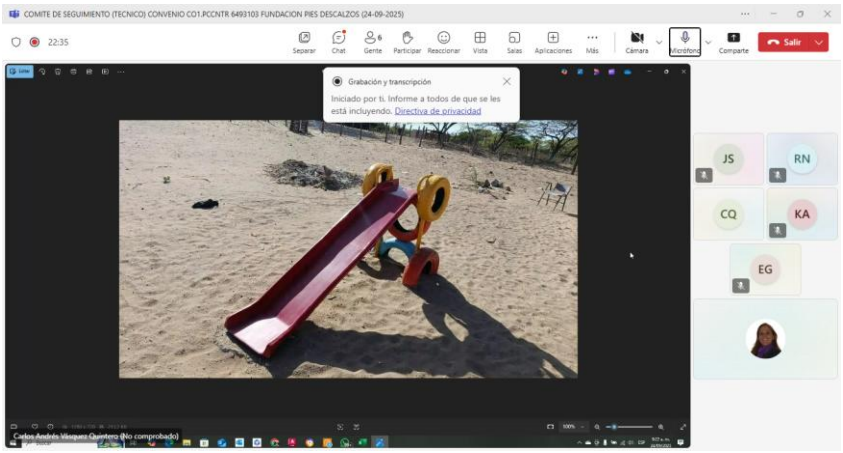


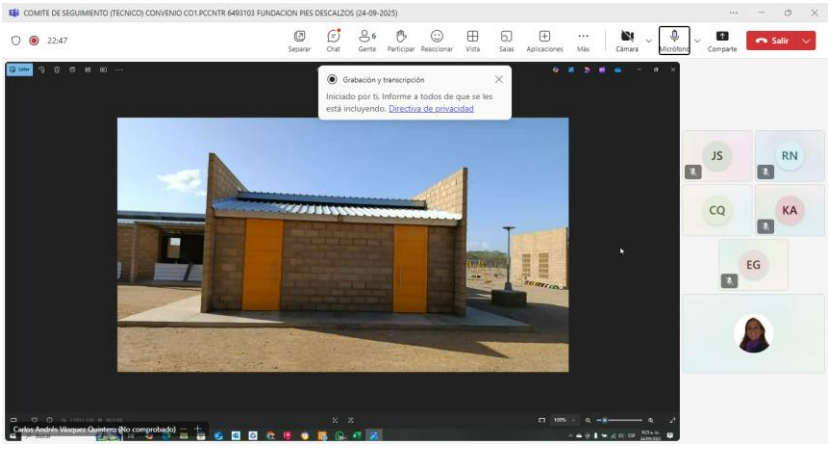

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
21:06
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
JS
RN
CQ
KA
EG

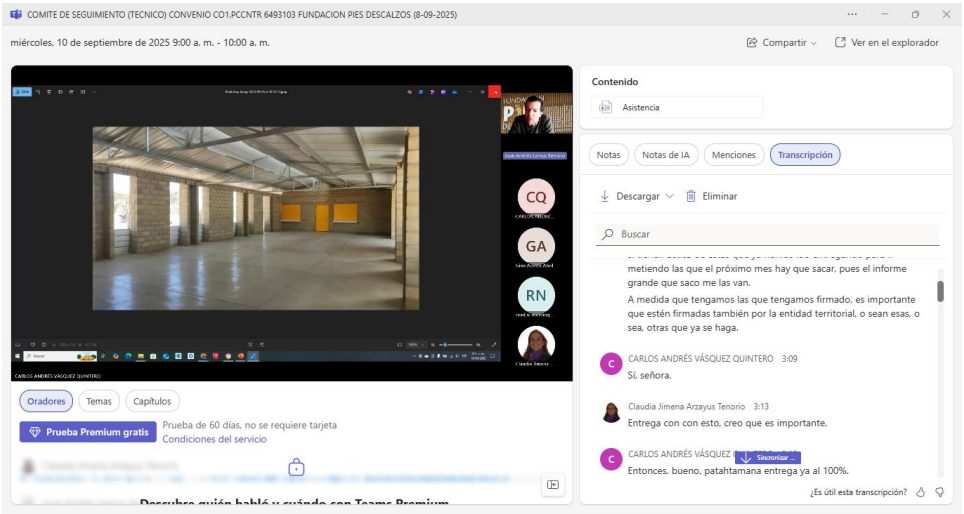

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
21:16
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
JS
RN
CQ
KA
EG

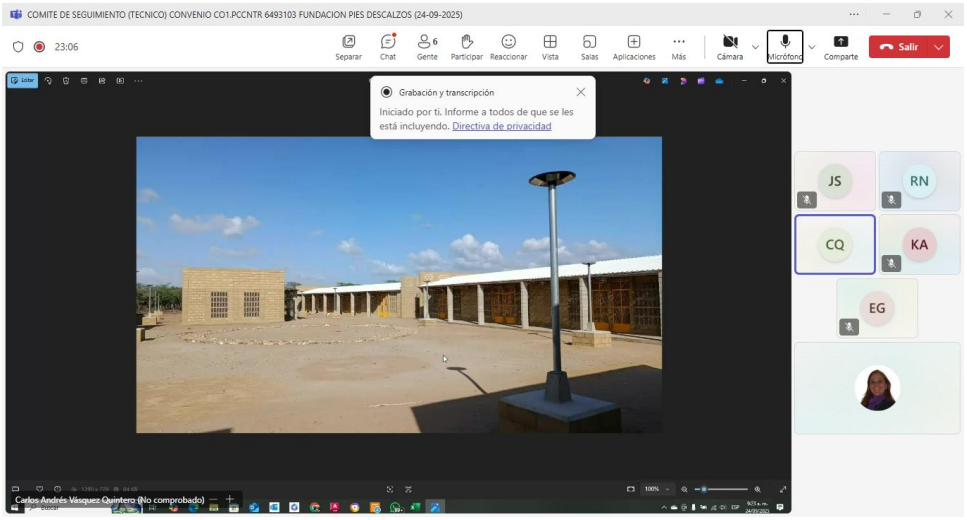

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
21:43
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
JS
RN
CQ
KA
EG


COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (8-09-2025)
miércoles, 10 de septiembre de 2025 9:00 a. m. - 10:00 a. m.
Compartir
Ver en el explorador
Contenido
Asistencia
Notas
Notas de IA
Menciones
Transcripción
Descargar
Eliminar
Buscar
Claudia Jimena Arzayus Tenorio 1:54
Considerable para todo.
CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ QUINTERO 1:58
Las baterías de los baños, cocinas todo.
¿Incluso ya por ahí hicieron algún evento? Sí, los parques.
Claudia Jimena Arzayus Tenorio 2:04
¿Es las esos juguitos están super bonitos, no?
Y un evento de qué ya se inauguraron, ellos mismos hicieron un acto protocolar y todo.
Oradores
Temas
Capítulos
Prueba Premium gratis
Prueba de 60 días, no se requiere tarjeta
Condiciones del servicio
¿Es útil esta transcripción?

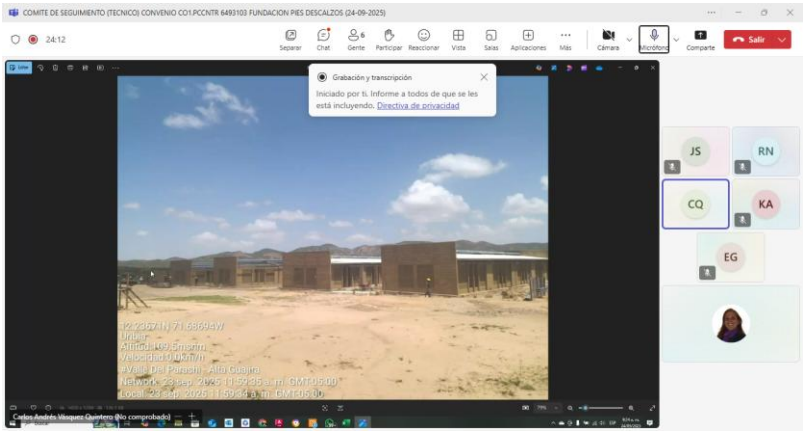

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
22:35
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
JS
RN
CQ
KA
EG

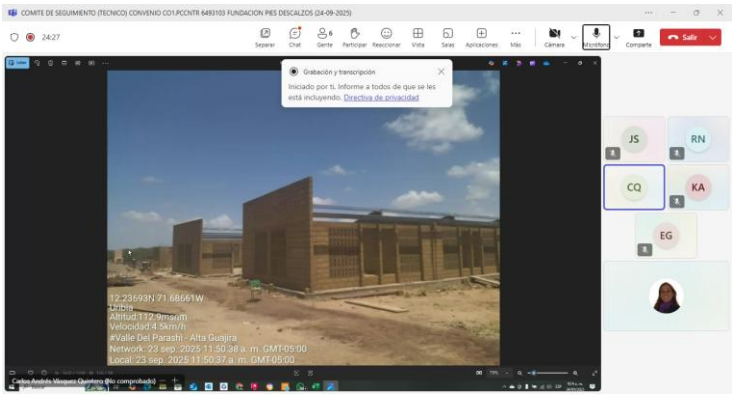

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
22:47
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
JS
RN
CQ
KA
EG

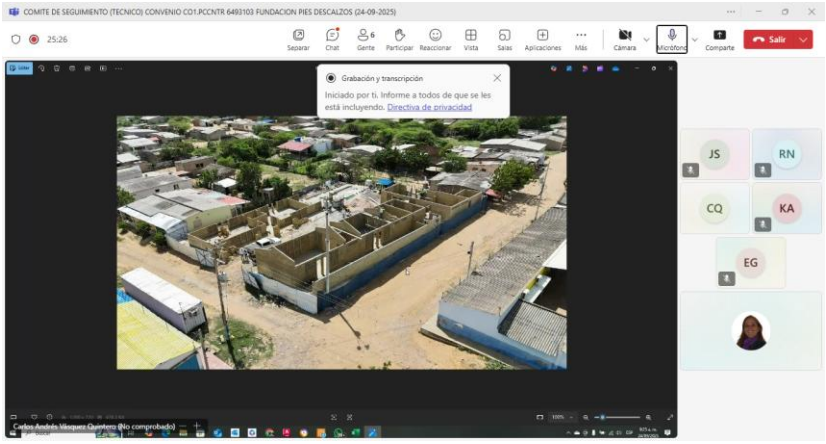

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (8-09-2025)
miércoles, 10 de septiembre de 2025 9:00 a. m. - 10:00 a. m.
Compartir
Ver en el explorador
Contenido
Asistencia
Notas
Notas de IA
Menciones
Transcripción
Descargar
Eliminar
Buscar
metiendo las que el próximo mes hay que sacar, pues el informe grande que saco me las van.
A medida que tengamos las que tengamos firmado, es importante que estén firmadas también por la entidad territorial, o sean esas, o sea, otras que ya se haga.
CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ QUINTERO 3:09
Sí, señora.
Claudia Jimena Arzayus Tenorio 3:13
Entrega con con esto, creo que es importante.
CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ
Sincronizar
Entonces, bueno, patahtamana entrega ya al 100%.
¿Es útil esta transcripción?
CQ
GA
RN
Oradores
Temas
Capítulos
Prueba Premium gratis
Prueba de 60 días, no se requiere tarjeta
Condiciones del servicio

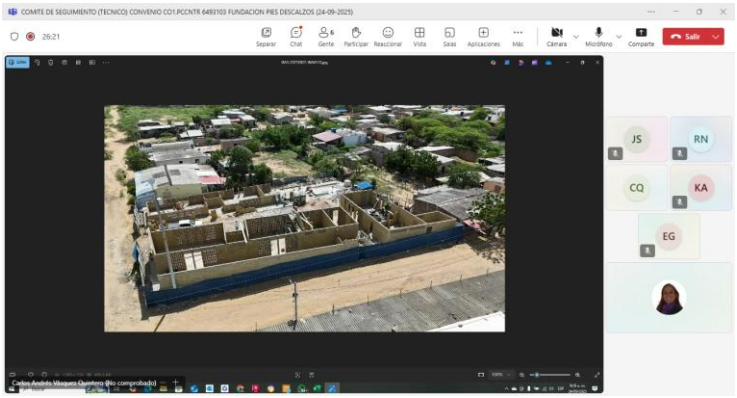

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
23:06
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
JS
RN
CQ
KA
EG
Carlos Andrés Vásquez Quintero (No comprobado)

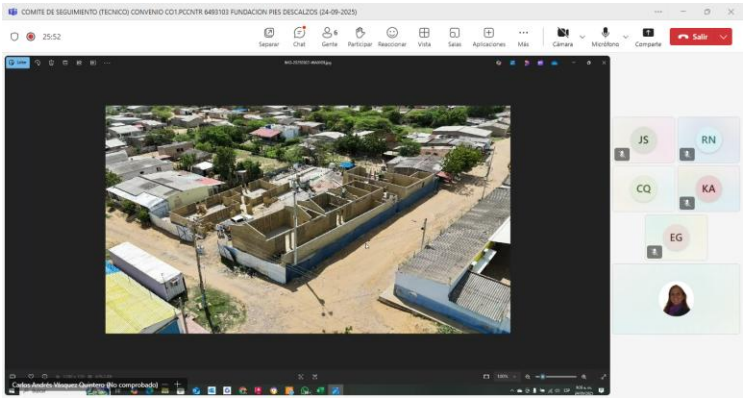
Parashi

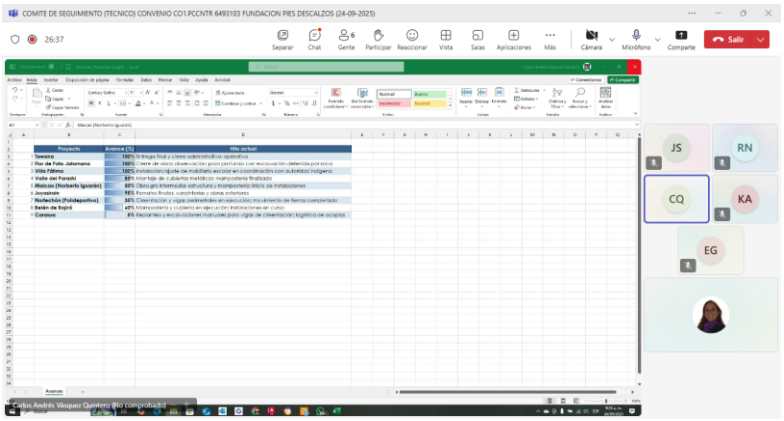

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
24:12
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
JS
RN
CQ
KA
EG
Carlos Andrés Vásquez Quintero (No comprobado)

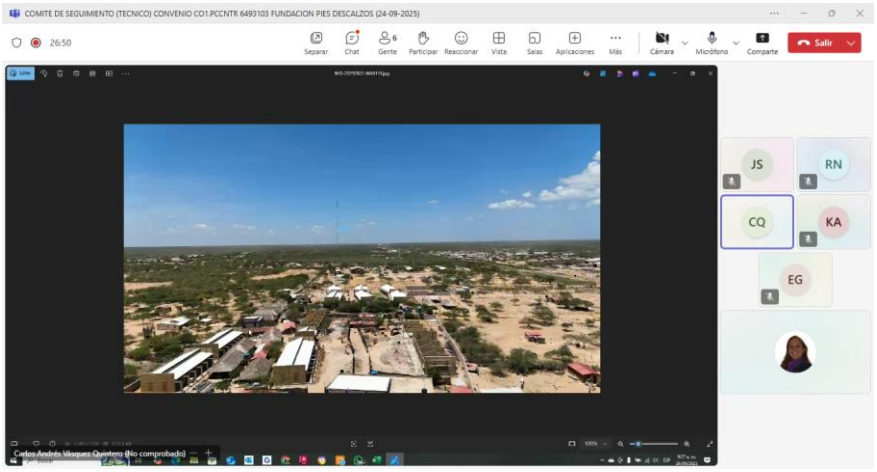

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
24:27
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
12.23693N 71.68661W
Uribia
Altitud:12.9msnm
Velocidad:4.5km/h
#Valle Del Parashi - Alta Guajira
Network: 23 sep. 2025 11:50:38 a. m. GMT-05:00
Local: 23 sep. 2025 11:50:37 a. m. GMT-05:00
JS
RN
CQ
KA
EG
Carlos Andrés Vásquez Quintero (No comprobado)

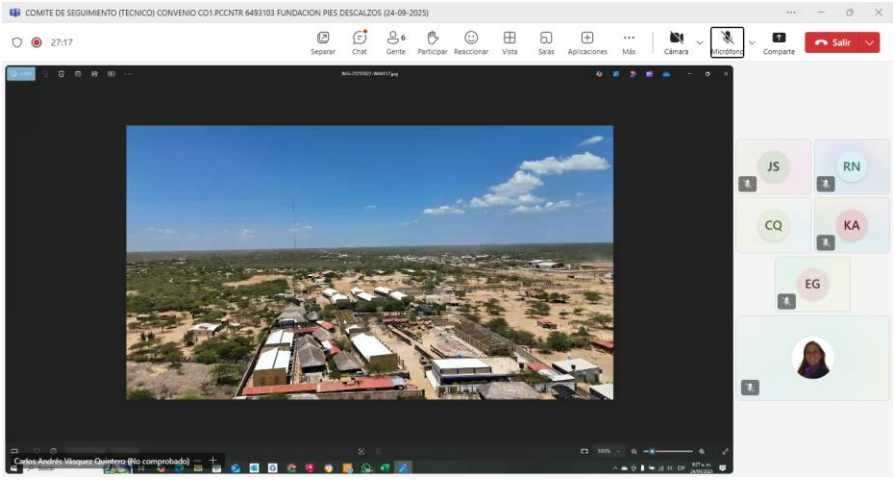

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
25:26
Salir
Grabación y transcripción
Iniciado por ti. Informe a todos de que se les está incluyendo. Directiva de privacidad
JS
RN
CQ
KA
EG
Carlos Andrés Vásquez Quintero (No comprobado)

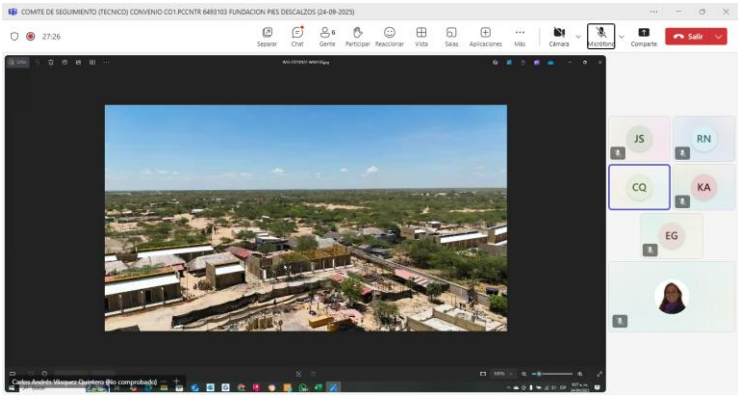

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
26:21
Salir
JS
RN
CQ
KA
EG

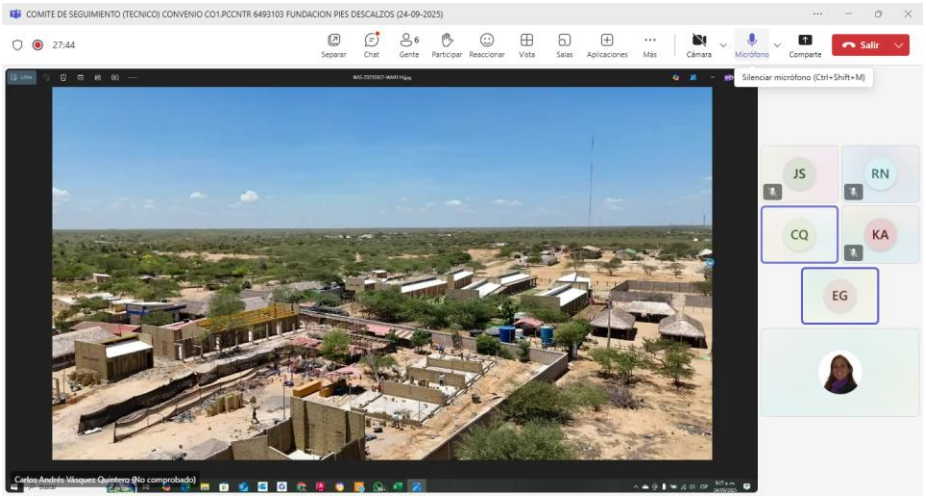

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
25:52
Salir
JS
RN
CQ
KA
EG

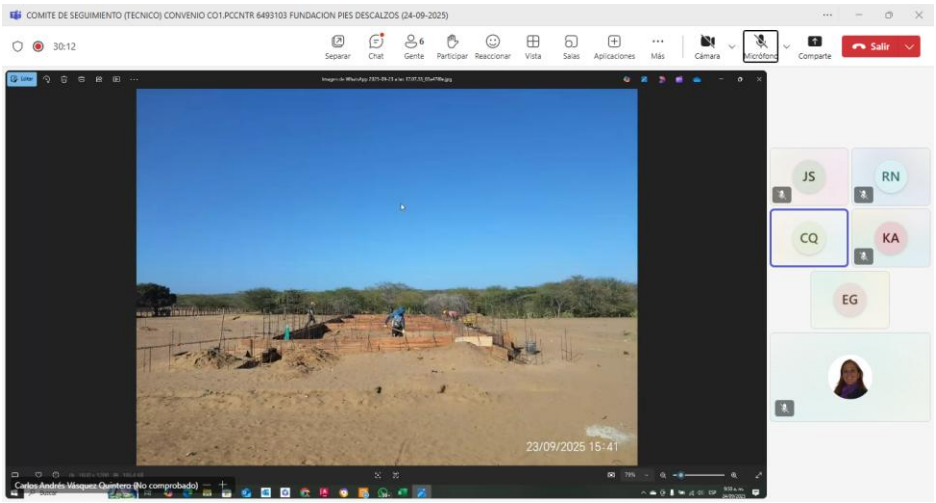

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
26:37
Salir
JS
RN
CQ
KA
EG

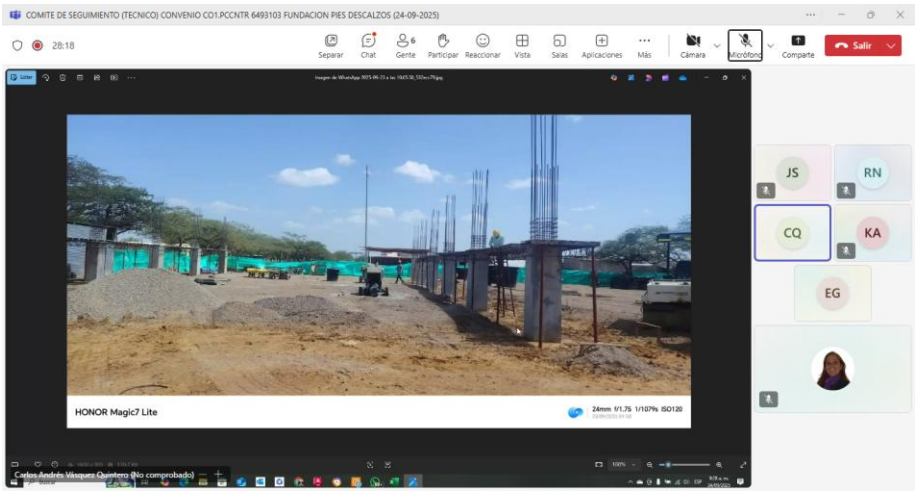

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
26:50
Salir
JS
RN
CQ
KA
EG

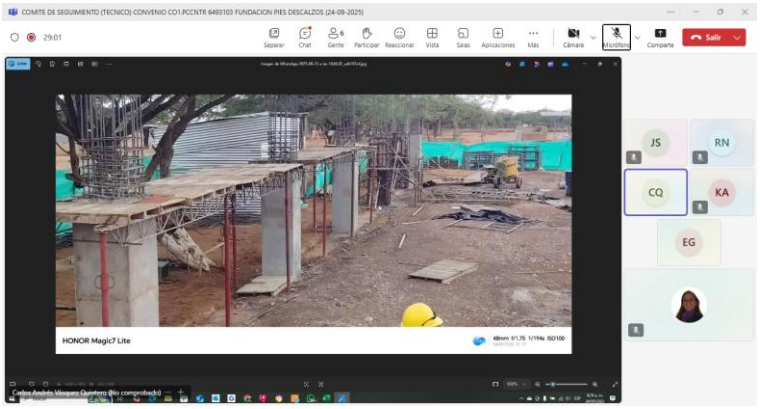

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
27:17
Salir
JS
RN
CQ
KA
EG

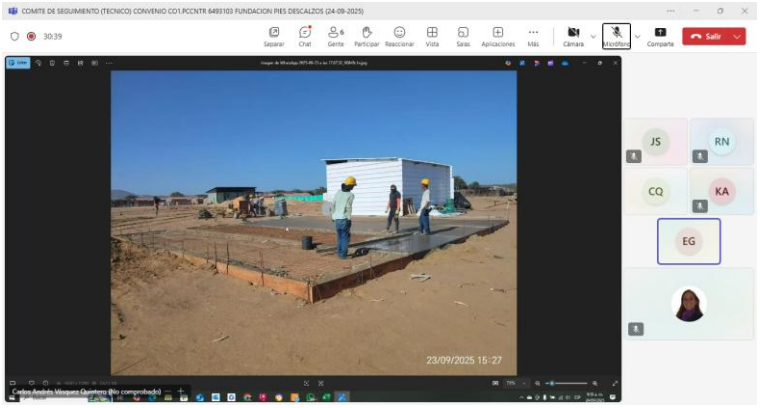

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
27:26
Salir
JS
RN
CQ
KA
EG

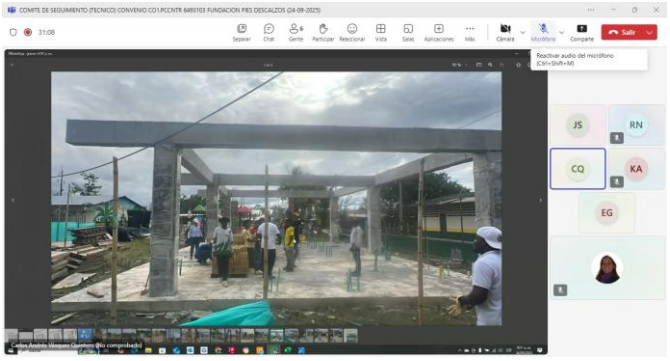

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
27:44
Salir
Silenciar micrófono (Ctrl+Shift+M)
JS
RN
CQ
KA
EG
Carlos Andrés Vásquez Quintero (No comprobado)

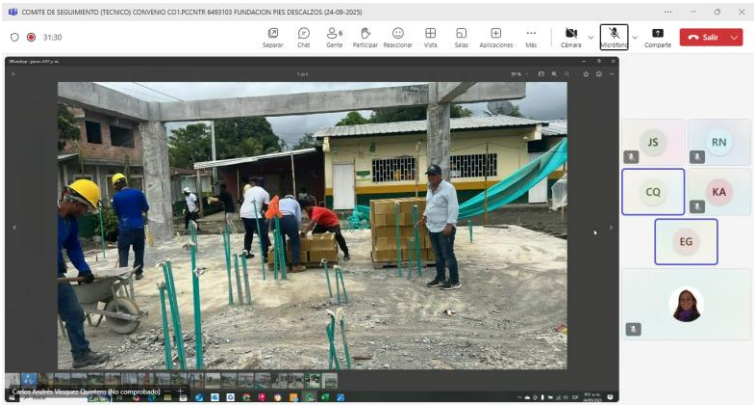

COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
30:12
Salir
23/09/2025 15:41
JS
RN
CQ
KA
EG
Carlos Andrés Vásquez Quintero (No comprobado)


COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
28:18
Salir
HONOR Magic7 Lite
JS
RN
CQ
KA
EG
Carlos Andrés Vásquez Quintero (No comprobado)


COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
29:01
Salir
JS
RN
CQ
KA
EG
HONOR Magic7 Lite


COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
30:39
Salir
JS
RN
CQ
KA
EG
23/09/2025 15:27


COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
31:08
Salir
JS
RN
CQ
KA
EG


COMITE DE SEGUIMIENTO (TECNICO) CONVENIO CO1.PCCNTR 6493103 FUNDACION PIES DESCALZOS (24-09-2025)
31:30
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
JS
RN
CQ
KA
EG

No Ci
