Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA, LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA CONCEPTUAL, ESTUDIOS DE CARGAS CALORÍFICAS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS - DETEC**	**78 días?**	**vie 5/12/25**	**sáb 7/03/26**
2	**ACTA DE INICIO**	1 día	vie 5/12/25	vie 5/12/25
3	**Etapa 1 - Diagnóstico de la Situación Actual**	**78,25 días?**	**vie 5/12/25**	**sáb 7/03/26**
4	**Estudios Preliminares**	**78 días?**	**vie 5/12/25**	**sáb 7/03/26**
5	Recopilación de la Información existente - información de entrada	7,88 días	vie 5/12/25	lun 15/12/25
6	Reunión de socialización	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25
7	Visita técnica - Caracterización de las Edificaciones, levantamiento de información previa (planos existentes)	2 días	lun 15/12/25	mar 16/12/25
8	Elaboracion de informe "Ingenieria Conceptual" + registro fotográfico	3,38 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25
9	Entrega a supervisión	1 día	lun 22/12/25	lun 22/12/25
10	Revisión supervisión	3 días	lun 22/12/25	jue 25/12/25
11	Ajustes consultor	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25
12	Aprobación supervisión	0 días	lun 29/12/25	lun 29/12/25
13	**SUSPENSIÓN**	2,25 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26
14	REINICIO	1 día	mar 27/01/26	mar 27/01/26
15	**PRÓRROGA**	29,13 días?	mar 3/02/26	sáb 7/03/26
16	**Etapa 2 - Diseños del sistema de Detección y Extinción de incendios**	**32,13 días?**	**dom 1/02/26**	**sáb 7/03/26**
17	Actualización y ajustes de planos arquitectónicos	7 días	dom 1/02/26	lun 9/02/26
18	Elaboración memorias de cálculo	4 días	mar 10/02/26	vie 13/02/26
19	Planos RCI – Detección	4 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
20	Planos RCI – Extinción	4 días	vie 13/02/26	jue 19/02/26
21	Presupuestos finales detallados (equipos, accesorios, mano de obra)	7 días	vie 20/02/26	sáb 28/02/26
22	Modelados 2D y 3D	4 días	dom 1/02/26	mié 4/02/26
23	Entrega	1 día	sáb 28/02/26	sáb 28/02/26
24	Revision supervisión	3 días	lun 2/03/26	mié 4/03/26
25	Ajustes consultor	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26
26	Aprobacion Supervisión	1 día	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26
27	**FIN CONSULTORIA**	1 día	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26

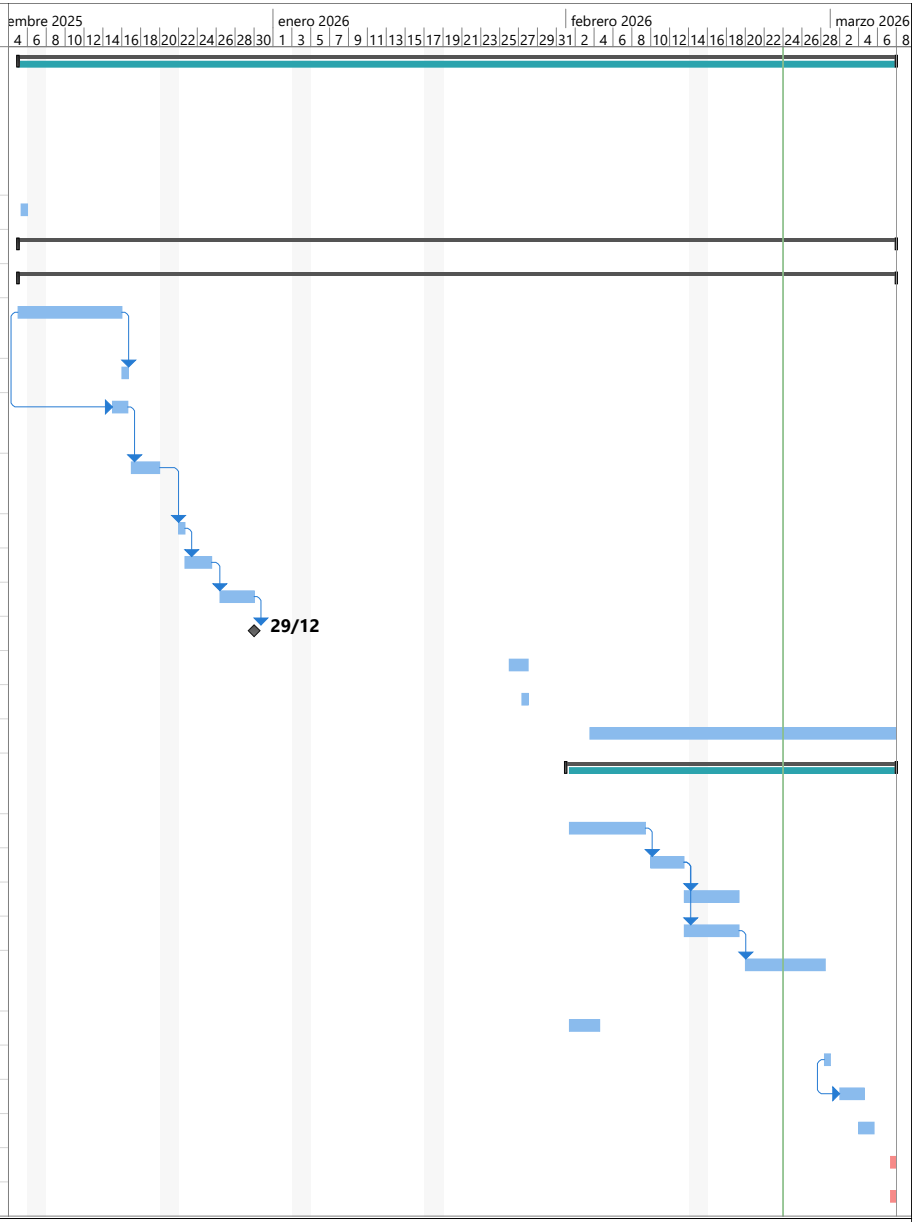

Proyecto: Programa - CRONOG
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

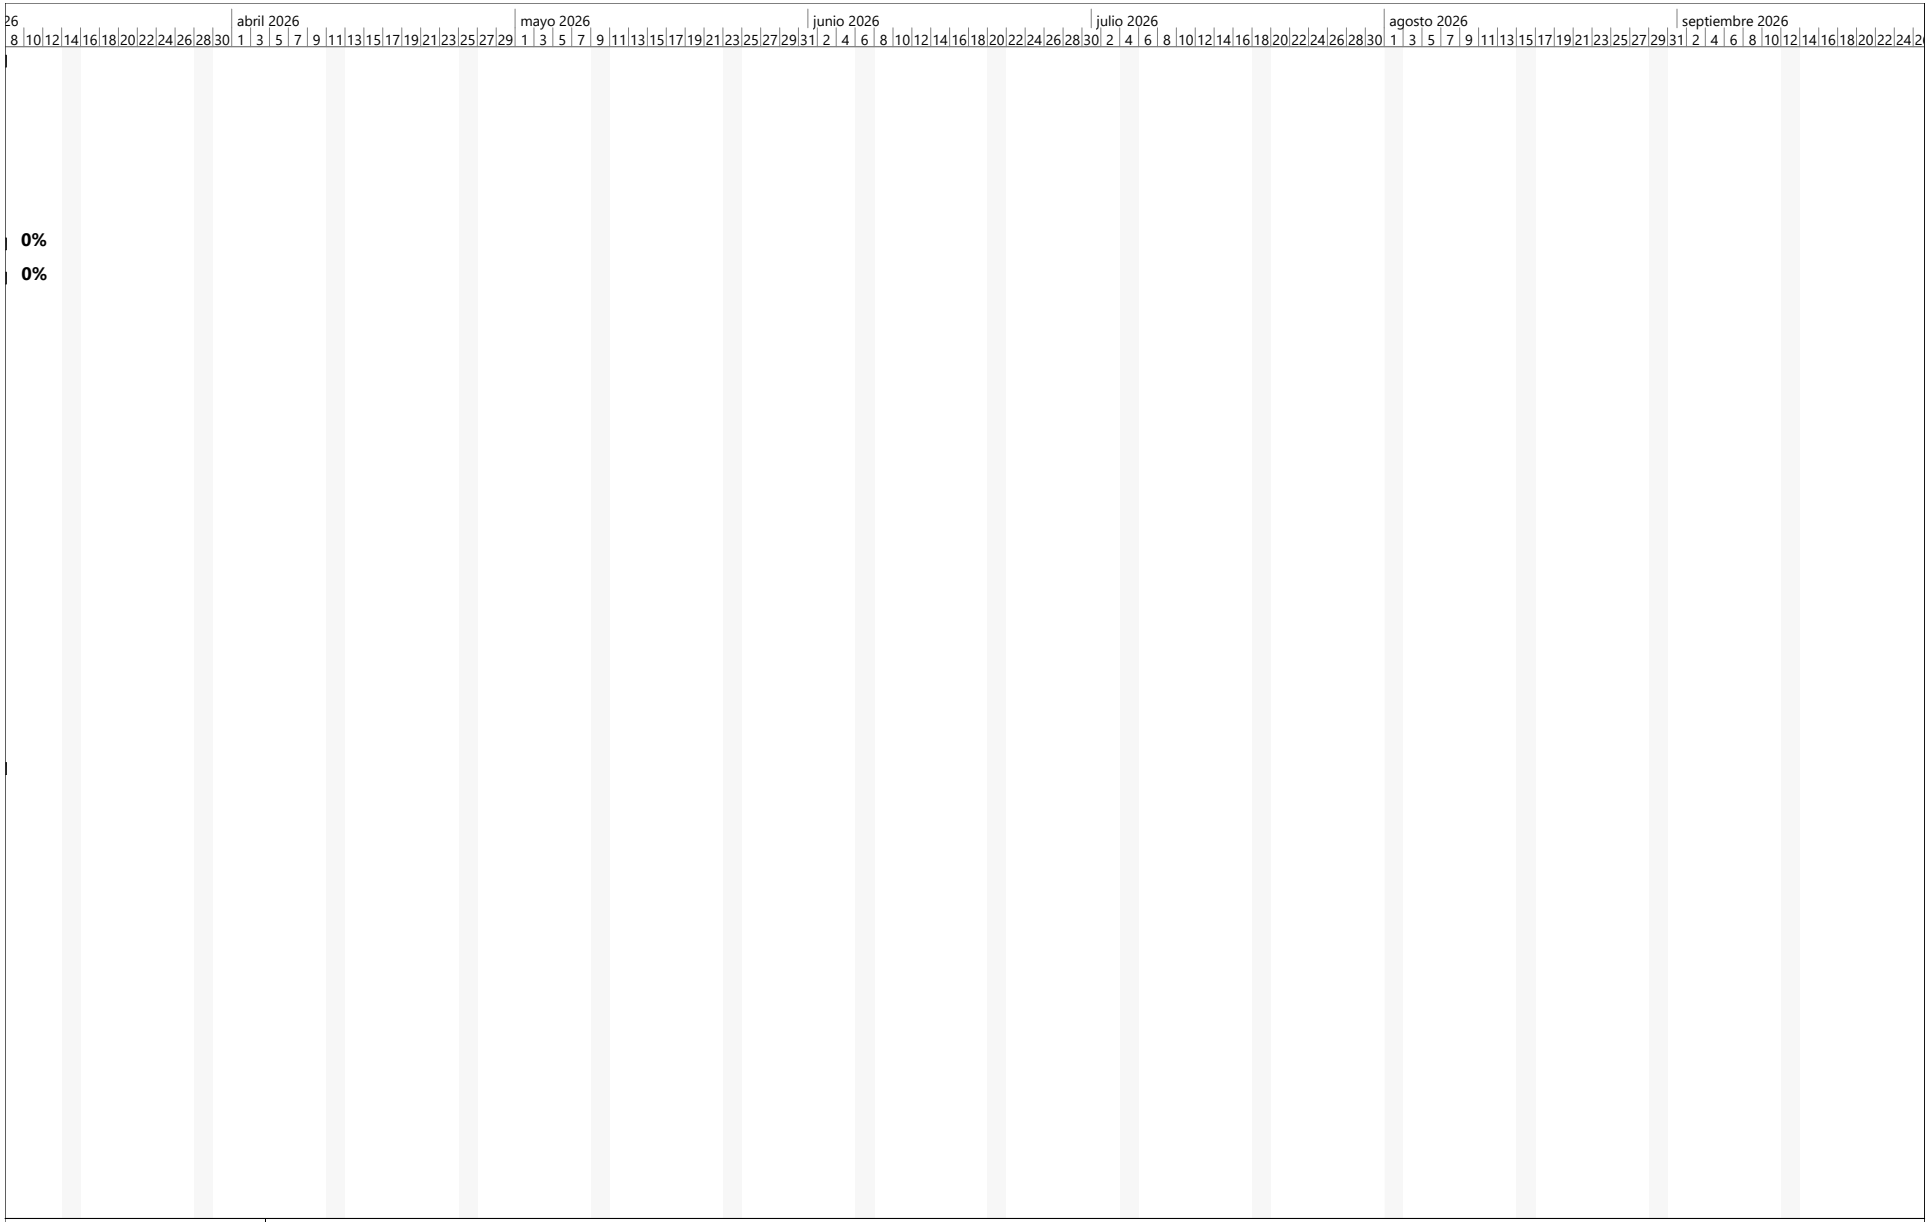

Proyecto: Programa - CRONOG
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	
