

Id	Nombre de tarea	Duraci	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	**Proyecto De Fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental del Consejo Nacional Electoral - Vigencia 2025**	167 d	67%	jue 9/10/25	vie 29/05/26	
2	*Hito de Inicio*	1 d	100%	jue 9/10/25	jue 9/10/25	
3	**FASE I - INICIO**	**1 d**	**100%**	**jue 9/10/25**	**jue 9/10/25**	
4	FASE I - INICIO	1 d	100%	jue 9/10/25	jue 9/10/25	
5	Emisión y Perfeccionamiento del Contrato con las pólizas	1 d	100%	jue 9/10/25	jue 9/10/25	
6	Acta de inicio	1 d	100%	jue 9/10/25	jue 9/10/25	
7	*Hito: contrato firmado, acta inicio del contrato firmada, pólizas firmadas*	0 d	0%	jue 9/10/25	jue 9/10/25	
8	**FASE II - PLANEACIÓN**	**3 d**	**100%**	**vie 3/10/25**	**mar 7/10/25**	
9	Elaboración Plan de Dirección del Proyecto	1 d	100%	vie 3/10/25	vie 3/10/25	
10	Elaboración Cronograma	1 d	100%	lun 6/10/25	lun 6/10/25	
11	Elaboración Matriz de Riesgos	1 d	100%	mar 7/10/25	mar 7/10/25	
12	*Hito: Entrega Plan Dirección del Proyecto, Cronograma, y Riesgos*	0 d	100%	mar 7/10/25	mar 7/10/25	
13	Elaboración Plan de Trabajo Prorroga N° 1	1 d	100%	jue 11/12/25	jue 11/12/25	
14	Elaboración Cronograma	1 d	100%	jue 11/12/25	jue 11/12/25	
15	Elaboración Matriz de Riesgos	1 d	100%	jue 11/12/25	jue 11/12/25	
16	*Hito: Entrega Plan de Trabajo Prorróga N° 1 , Cronograma, y Riesgos*	0 d	0%	mié 31/12/25	mié 31/12/25	
17	Elaboración Plan de Trabajo Prorroga N° 2	1 d	100%	lun 23/02/26	lun 23/02/26	

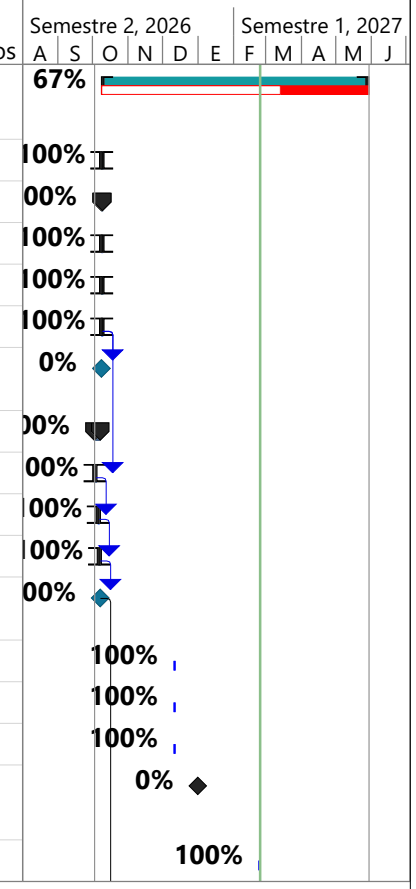

Proyecto: Cronograma Proyecto
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Hito resumido	Tarea manual
Progreso de tarea	Resumen de línea base	solo duración
División	Línea base resumida	Informe de resumen manual
Hito	Hito de línea base resumida	Resumen manual
Hito de línea base	Progreso resumido	solo el comienzo
Resumen	Tareas externas	solo fin
Resumen del proyecto	Hito externo	Fecha límite
Agrupar por síntesis	Tarea inactiva	Línea base
Tarea resumida	Hito inactivo	Tarea crítica
Tarea crítica resumida	Resumen inactivo	Progreso de tarea crítica


Id	Nombre de tarea	Duraci	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
18	Elaboración Cronograma	1 d	100%	lun 23/02/26	lun 23/02/26	
19	Elaboración Matriz de Riesgos	1 d?	0%	mar 24/02/26	mar 24/02/26	
20	*Hito: Entrega Plan de Trabajo Prórroga N° 2, Cronograma y Riesgos*	0 d	0%	mar 24/02/26	mar 24/02/26	
21	**FASE III - EJECUCIÓN**	**167 d**	**57%**	**jue 9/10/25**	**vie 29/05/26**	
22	**Realización del Kick Off**	1 d	100%	jue 9/10/25	jue 9/10/25	
23	**Recepción, Punteo y Traslado (9366 cajas de archivo)**	19 d	**100%**	**jue 9/10/25**	**mar 4/11/25**	
24	Recepción, Punteo y Traslado día 1 (500 cajas)	**1 d**	100%	jue 9/10/25	jue 9/10/25	
25	Recepción, Punteo y Traslado día 2 (501 cajas)	1 d	100%	vie 10/10/25	vie 10/10/25	
26	Recepción, Punteo y Traslado día 3 (1000 cajas)	1 d	100%	jue 16/10/25	jue 16/10/25	
27	Recepción, Punteo y Traslado día 4 (1000 cajas)	1 d	100%	vie 17/10/25	vie 17/10/25	
28	Recepción, Punteo y Traslado día 5 (1000 cajas)	1 d	100%	lun 20/10/25	lun 20/10/25	
29	Recepción, Punteo y Traslado día 6 (1000 cajas)	1 d	100%	mar 21/10/25	mar 21/10/25	
30	Recepción, Punteo y Traslado día 7 (1000 cajas)	1 d	100%	mié 22/10/25	mié 22/10/25	
31	Recepción, Punteo y Traslado día 8 (1200 cajas)	1 d	100%	jue 23/10/25	jue 23/10/25	
32	Recepción, Punteo y Traslado día 9 (800 cajas)	1 d	100%	vie 24/10/25	vie 24/10/25	
33	Recepción, Punteo y Traslado día 10 (700 cajas)	1 d	100%	lun 27/10/25	lun 27/10/25	
34	Recepción, Punteo y Traslado día 11 (390 cajas)	1 d	100%	mar 28/10/25	mar 28/10/25	
35	Recepción, Punteo y Traslado día 12 (87 cajas)	1 d	100%	mié 5/11/25	mié 5/11/25	

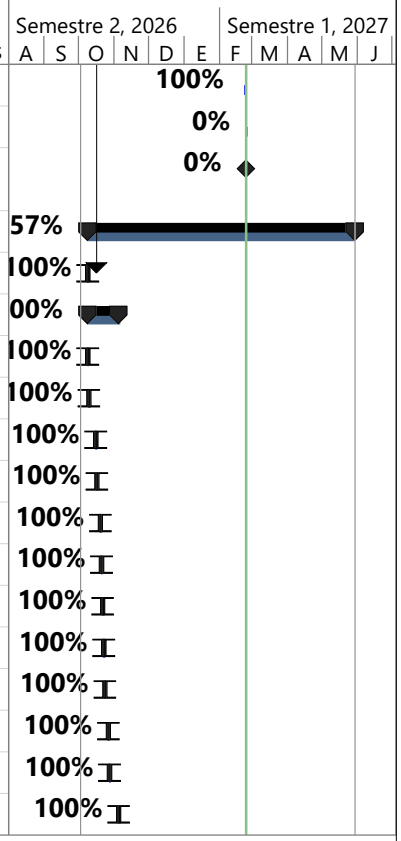

Proyecto: Cronograma Proyecto
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Hito resumido	Tarea manual
Progreso de tarea	Resumen de línea base	solo duración
División	Línea base resumida	Informe de resumen manual
Hito	Hito de línea base resumida	Resumen manual
Hito de línea base	Progreso resumido	solo el comienzo
Resumen	Tareas externas	solo fin
Resumen del proyecto	Hito externo	Fecha límite
Agrupar por síntesis	Tarea inactiva	Línea base
Tarea resumida	Hito inactivo	Tarea crítica
Tarea crítica resumida	Resumen inactivo	Progreso de tarea crítica


Id	Nombre de tarea	Duraci	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
36	*Hito: Informe consolidado recepción, punteo y traslado de 9181 cajas X200 y X300*	0 d	100%	jue 6/11/25	jue 6/11/25	
37	**Administración y Custodia Caja mes**	165 d	**70%**	**vie 10/10/25**	**jue 28/05/26**	
38	Préstamos y Consultas Mes 1 (Octubte)	17 d	100%	jue 9/10/25	vie 31/10/25	
39	Préstamos y Consultas Mes 2 (Noviembre)	21 d	100%	lun 3/11/25	dom 30/11/25	
40	Préstamos y Consultas Mes 3 (Diciembre)	23 d	100%	lun 1/12/25	mié 31/12/25	
41	Préstamos y Consultas Mes 4 (Enero)	21 d	60%	vie 2/01/26	jue 5/03/26	
42	Préstamos y Consultas Mes 5 (Febrero)	20 d?	0%	vie 30/01/26	vie 27/02/26	
43	Préstamos y Consultas Mes 6 (Marzo)	1 d?	0%	jue 28/05/26	jue 28/05/26	
44	Préstamos y Consultas Mes 7 (Abril)	1 d?	0%	jue 28/05/26	jue 28/05/26	
45	Préstamos y Consultas Mes 8 (Mayo)	1 d?	0%	jue 28/05/26	jue 28/05/26	
46	*Hito: Informe Consolidado de Administración y Custodia*	0 d	0%	mar 26/05/2(	mar 26/05/26	
47	**Organización Física y Técnica Acervo Documental 2000 mts**	**134 d?**	**54%**	**mar 11/11/25**	**vie 15/05/26**	
48	Organización Física y Técnica (666 Mts lineales) y Control Calidad Mes Noviembre	17 d	100%	vie 7/11/25	dom 30/11/25	
49	Organización Física y Técnica (666 Mts lineales) y Control Calidad Mes Diciembre	23 d	100%	lun 1/12/25	mié 31/12/25	
50	Organización Física y Técnica (75 Mts lineales) y Control de Calidad Mes Enero - Febrero	26 d	85%	lun 19/01/26	lun 23/02/26	
51	Organización Fisica y Tecnica (250 Mts Lineales) febrero	20 d	0%	lun 2/02/26	vie 27/02/26	

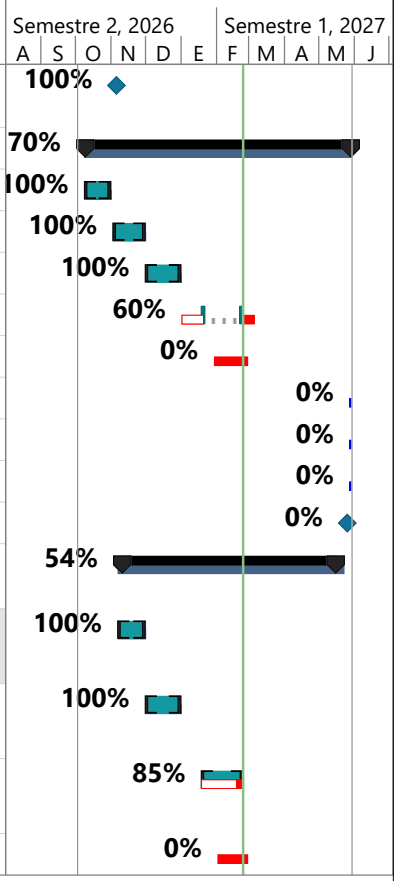

Proyecto: Cronograma Proyecto
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Hito resumido	Tarea manual
Progreso de tarea	Resumen de línea base	solo duración
División	Línea base resumida	Informe de resumen manual
Hito	Hito de línea base resumida	Resumen manual
Hito de línea base	Progreso resumido	solo el comienzo
Resumen	Tareas externas	solo fin
Resumen del proyecto	Hito externo	Fecha límite
Agrupar por síntesis	Tarea inactiva	Línea base
Tarea resumida	Hito inactivo	Tarea crítica
Tarea crítica resumida	Resumen inactivo	Progreso de tarea crítica


Id	Nombre de tarea	Duraci	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
52	Organización Física y Técnica (443 Mts Lineales) marzo	21 d	0%	mar 3/03/26	mar 31/03/26	
53	Control de Calidad Organización y rotulación (abril)	22 d	0%	mié 1/04/26	jue 30/04/26	
54	Devolución acervo documental organizado a instalaciones de CNE	15 d	100%	lun 4/05/26	vie 22/05/26	
55	*Hito: Informe consolidado de Organización física y técnica y control de calidad de 2000 mts lineales de archivo*	0 d	0%	lun 2/02/26	lun 2/02/26	
56	**Digitalización según método oferta (11.513.000 imagene**	**121 d**	**49%**	**lun 1/12/25**	**lun 18/05/26**	
57	Alistamiento y Digitalización 2000000 imágenes (diciem	23 d	100%	lun 1/12/25	mié 31/12/25	
58	Alistamiento y Digitalización 500.000 imágenes (enero)	25,57	100%	vie 2/01/26	vie 6/02/26	
59	Alistamiento y Digitalización 500.000 imágenes (febrero	23 d	100%	lun 1/12/25	mié 31/12/25	
60	Alistamiento y Digitalización 3.000.000 imágenes (marzo	1 d?	0%	lun 18/05/26	lun 18/05/26	
61	Alistamiento y Digitalización 3.000.000 imágenes (abril)	1 d?	0%	lun 18/05/26	lun 18/05/26	
62	Alistamiento y Digitalización 1.513.500 imágenes (mayo	13 d	0%	sáb 2/05/26	mié 20/05/26	
63	Control de Calidad Digitalización	118 d	25%	mié 10/12/25	vie 22/05/26	
64	*Hito: Informe consolidado de Digitalización*	0 d	100%	mar 30/12/25	mar 30/12/25	
65	*Hito: Cierre Fase III*	0 d	0%	mié 31/12/25	mié 31/12/25	
66	**FASE IV - MONITOREO Y CONTROL**	**145 d**	**50%**	**vie 7/11/25**	**jue 28/05/26**	
67	Informes de de Actividades mensual octubre	1 d	100%	vie 31/10/25	vie 31/10/25	
68	Informe de Actividad Mensual Noviembre	1 d	100%	vie 28/11/25	vie 28/11/25	
69	Informe de Actividad Mensual Diciembre	1 d	100%	mié 31/12/25	mié 31/12/25	

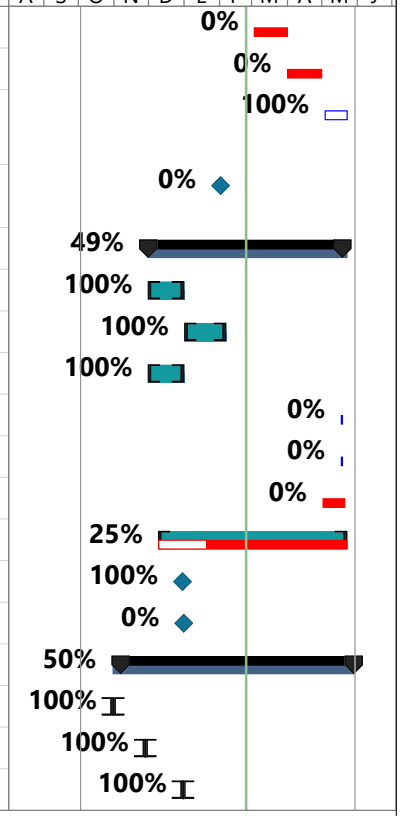

Proyecto: Cronograma Proyecto
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Hito resumido	Tarea manual
Progreso de tarea	Resumen de línea base	solo duración
División	Línea base resumida	Informe de resumen manual
Hito	Hito de línea base resumida	Resumen manual
Hito de línea base	Progreso resumido	solo el comienzo
Resumen	Tareas externas	solo fin
Resumen del proyecto	Hito externo	Fecha límite
Agrupar por síntesis	Tarea inactiva	Línea base
Tarea resumida	Hito inactivo	Tarea crítica
Tarea crítica resumida	Resumen inactivo	Progreso de tarea crítica

Id	Nombre de tarea	Duraci	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
70	Informe de Actividad Mensual Enero	1 d?	100%	mié 11/02/26	mié 11/02/26	
71	Informe de Actividad Mensual Febrero	1 d?	0%	vie 27/02/26	vie 27/02/26	
72	Informe de Actividad Mensual Marzo	1 d?	0%	lun 30/03/26	lun 30/03/26	
73	Informe de Actividad Mensual Abril	1 d?	0%	jue 30/04/26	jue 30/04/26	
74	Informe de Actividad Mensual Mayo	1 d?	0%	jue 28/05/26	jue 28/05/26	
75	*Hito de entrega de Informes de Actividades Mensual*	0 d	0%	jue 28/05/26	jue 28/05/26	
76	**FASE V - CIERRE**	**1 d**	**0%**	**jue 28/05/26**	**vie 29/05/26**	
77	Elaboración y entrega de Informe final del proyecto	1 d	0%	jue 28/05/26	vie 29/05/26	
78	Aprobación y firma informe final del proyecto	1 d	0%	jue 28/05/26	vie 29/05/26	
79	Trámite acta de Terminacion Ejecucion	1 d	0%	jue 28/05/26	vie 29/05/26	
80	*Hito: Acta de Terminacion Contrato - FIRMADA*	0 d	0%	vie 29/05/26	vie 29/05/26	

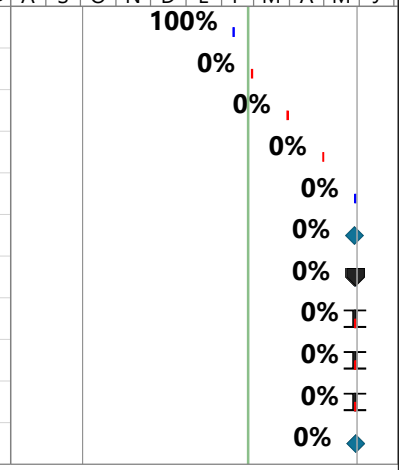

Proyecto: Cronograma Proyecto
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Hito resumido	Tarea manual
Progreso de tarea	Resumen de línea base	solo duración
División	Línea base resumida	Informe de resumen manual
Hito	Hito de línea base resumida	Resumen manual
Hito de línea base	Progreso resumido	solo el comienzo
Resumen	Tareas externas	solo fin
Resumen del proyecto	Hito externo	Fecha límite
Agrupar por síntesis	Tarea inactiva	Línea base
Tarea resumida	Hito inactivo	Tarea crítica
Tarea crítica resumida	Resumen inactivo	Progreso de tarea crítica
