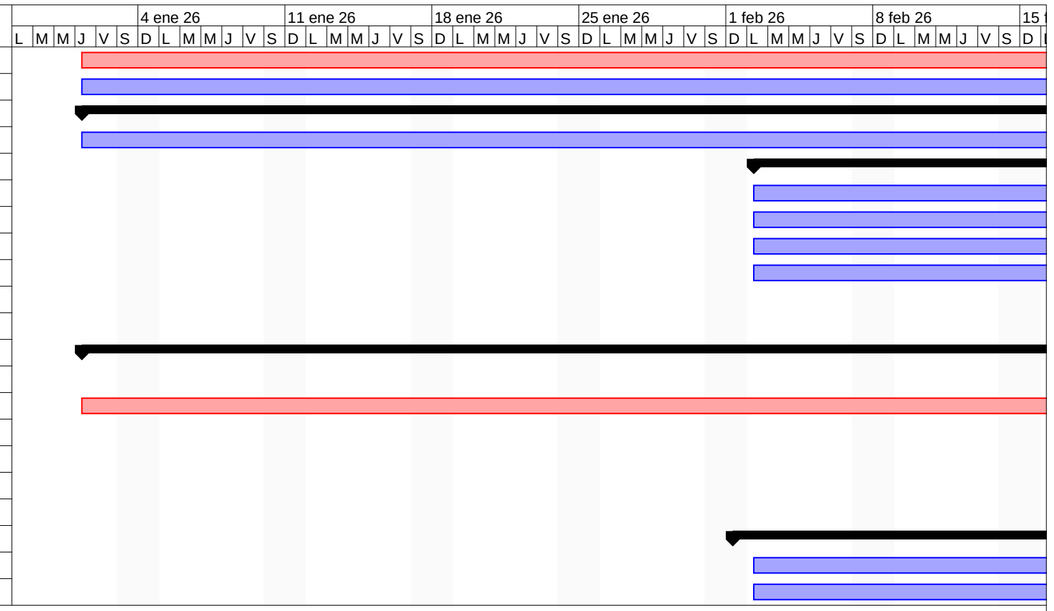
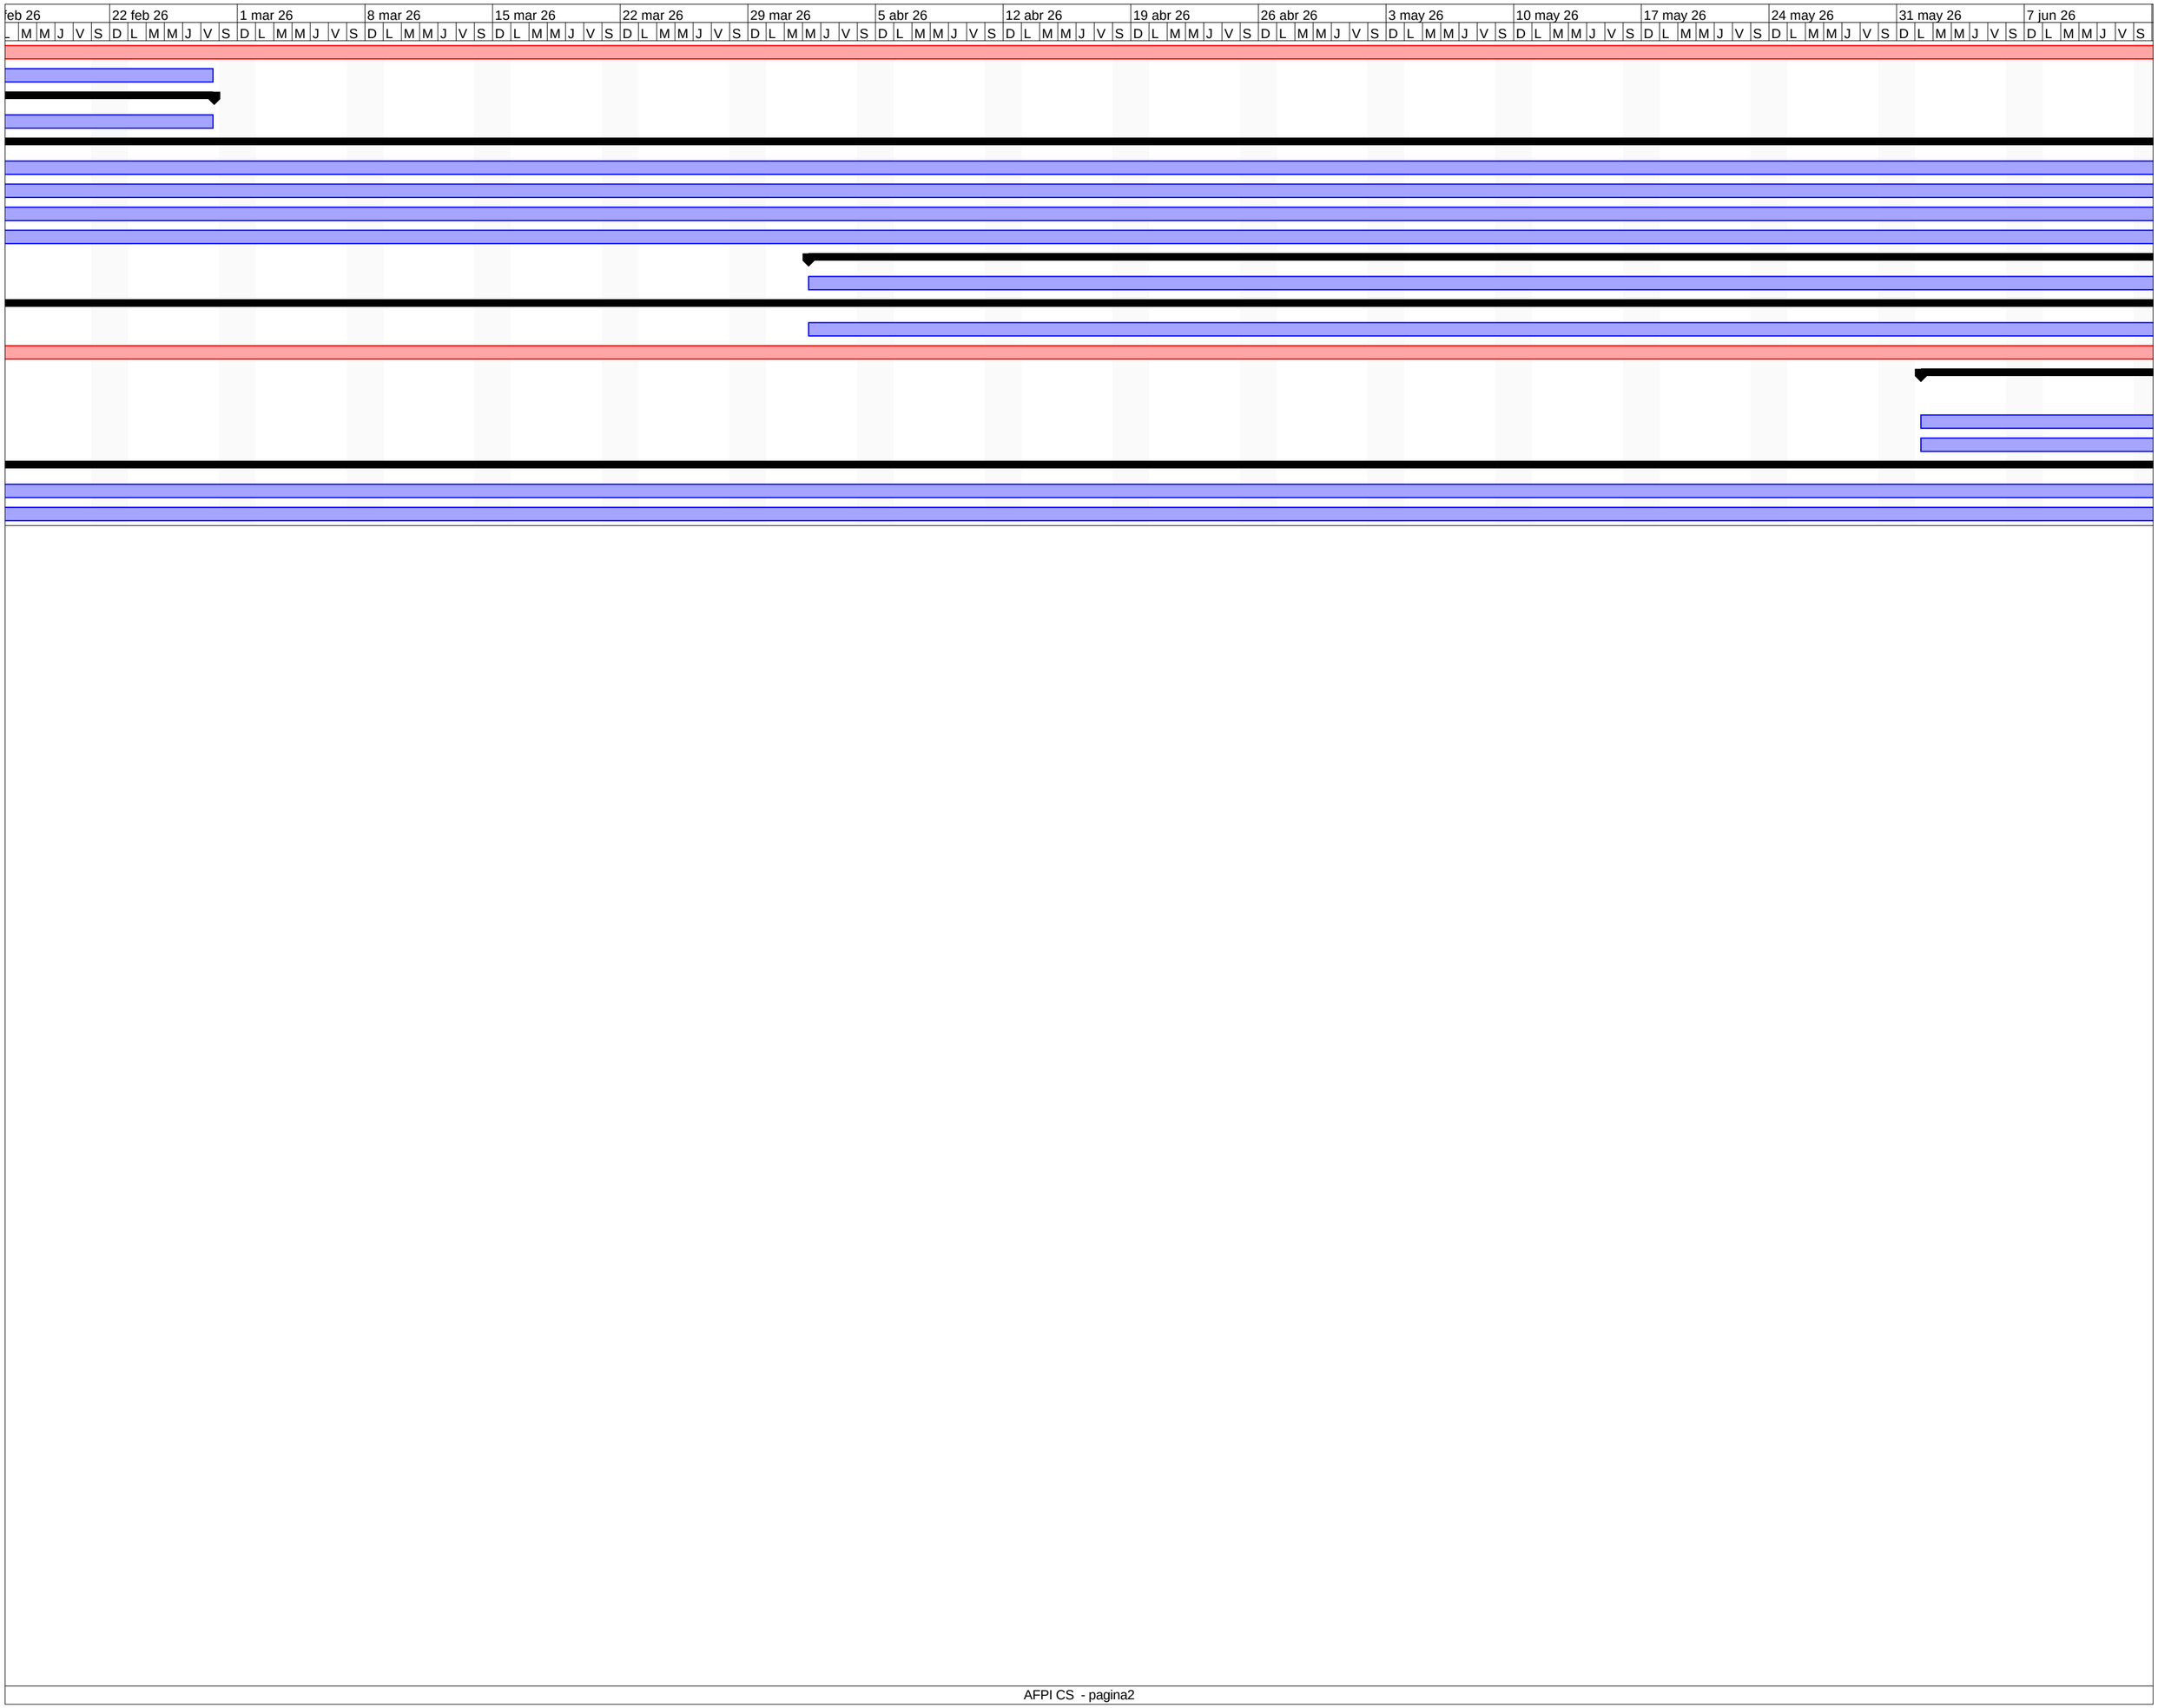
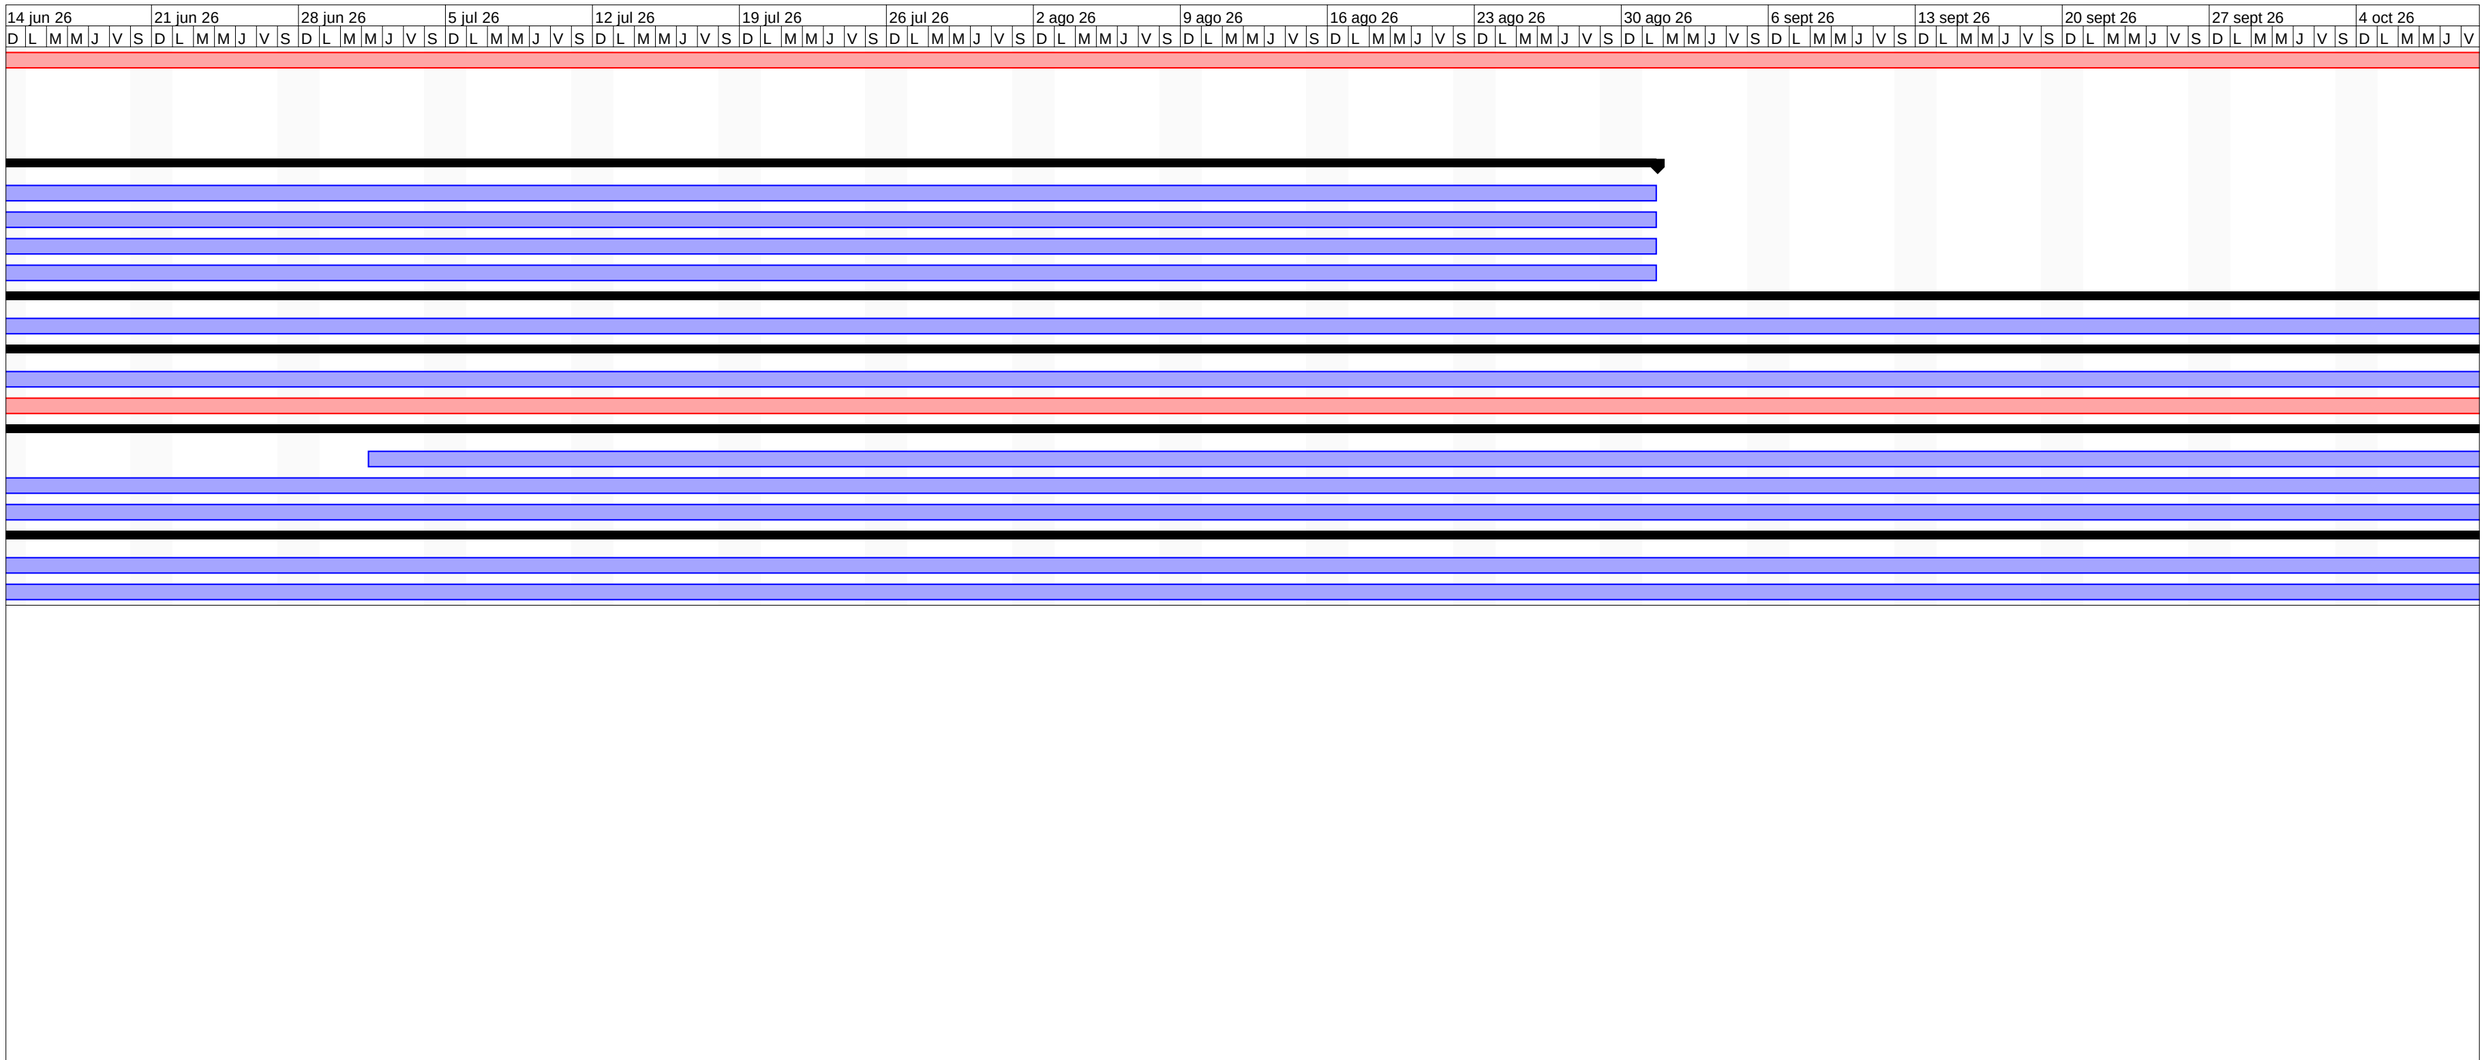
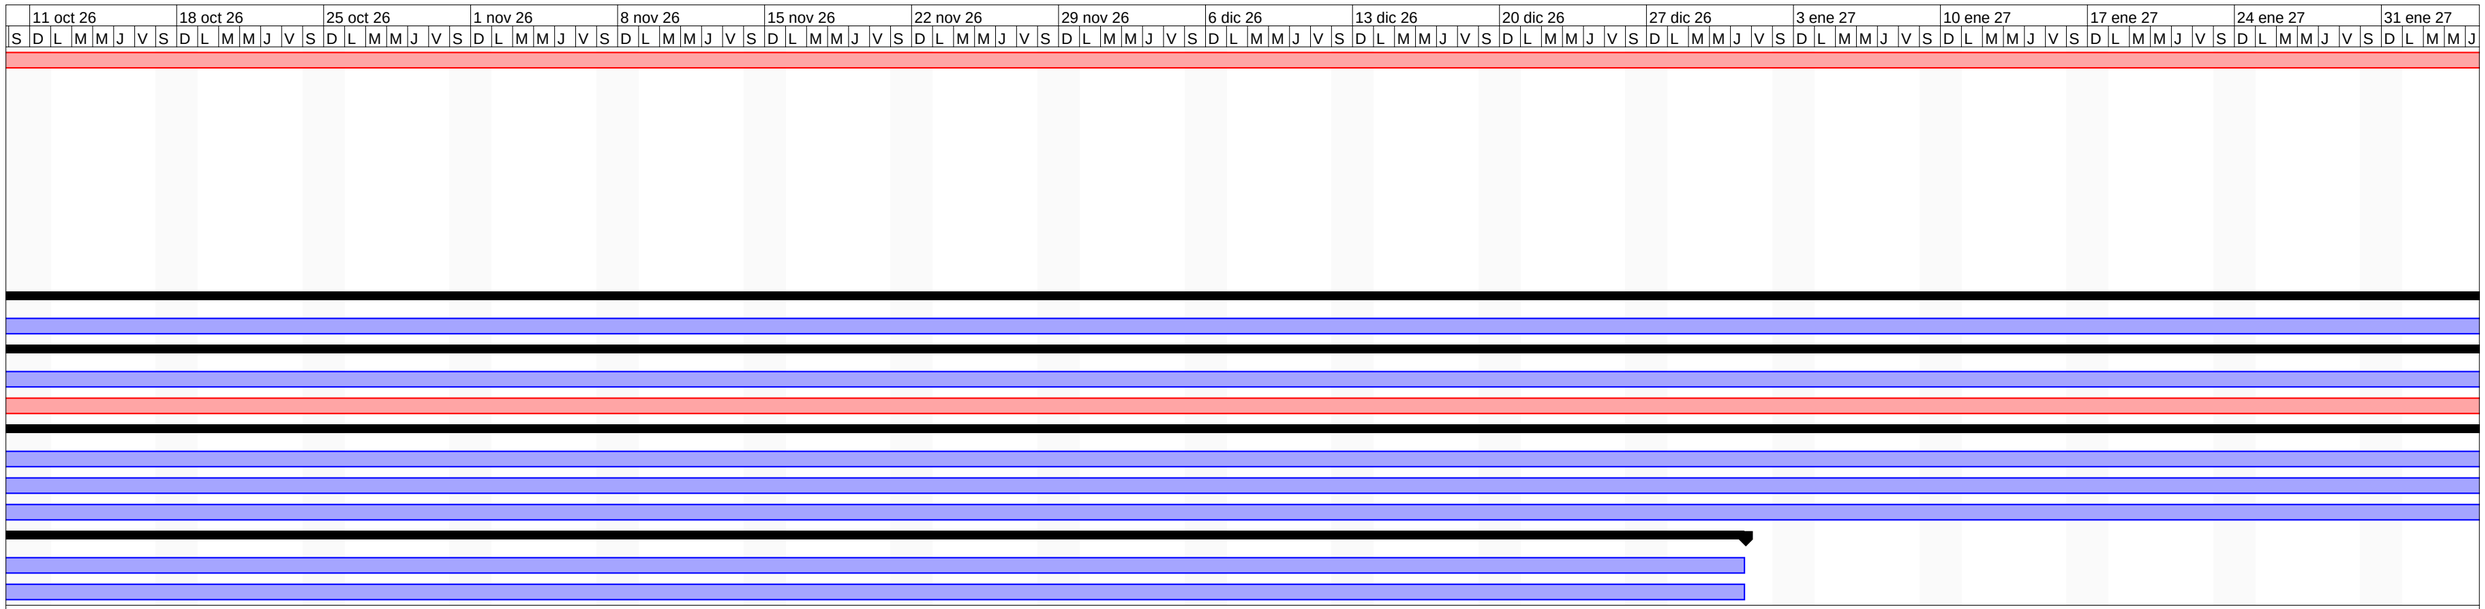
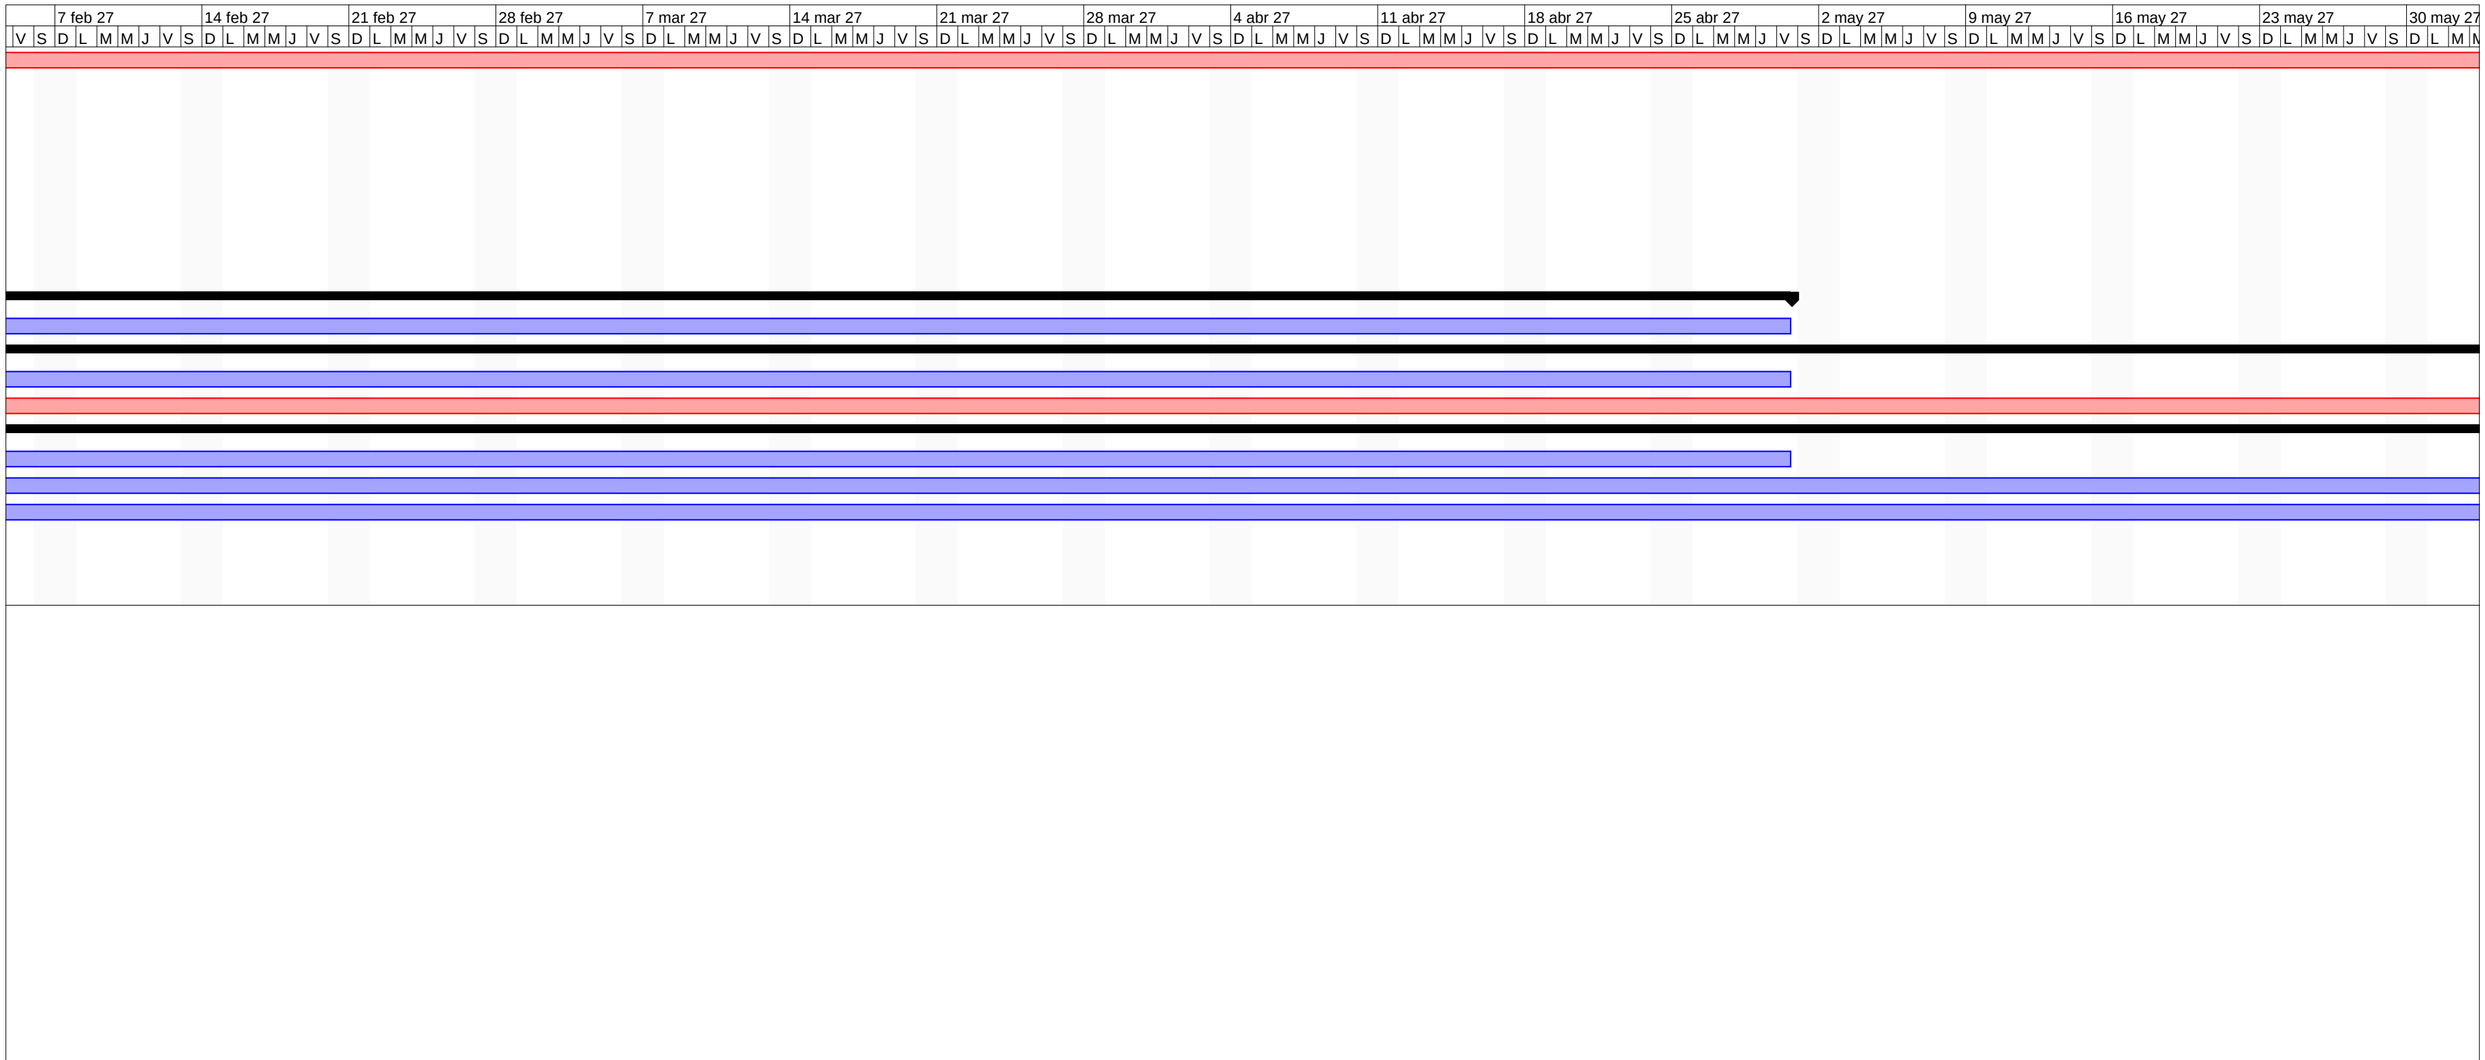
	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
1	CRONOGRAMA DE EJECUCION AFPEI -IMPLEMENTACION PROGRAMA COLOMBIA SOLAR- FENOGE	587 days	1/01/26, 8:00a.m.	31/03/28, 5:00p.m.
2	Componente 1. Focalización	42 days	1/01/26, 8:00a.m.	27/02/26, 5:00p.m.
3	**Componente 2. Fase de diagnostico de mercado**	**42 days**	**1/01/26, 8:00a.m.**	**27/02/26, 5:00p.m.**
4	2.1. Sondeos de mercado	42 days	1/01/26, 8:00a.m.	27/02/26, 5:00p.m.
5	**Componente 3. Caracterización de usuarios**	**151 days**	**2/02/26, 8:00a.m.**	**31/08/26, 5:00p.m.**
6	3.3. Caracterización predial	151 days	2/02/26, 8:00a.m.	31/08/26, 5:00p.m.
7	3.2. Caracterización ambiental de los proyectos	151 days	2/02/26, 8:00a.m.	31/08/26, 5:00p.m.
8	3.1. Caracterización y diagnostico social de beneficiarios	151 days	2/02/26, 8:00a.m.	31/08/26, 5:00p.m.
9	Componente 4. Evaluación y determinación de los usuarios beneficiarios y tipo de solución	151 days	2/02/26, 8:00a.m.	31/08/26, 5:00p.m.
10	**Componente 5. Implementación de las soluciones solares fotovoltaicas**	**283 days**	**1/04/26, 8:00a.m.**	**30/04/27, 5:00p.m.**
11	5.1 Factibilidad, ingeniería de detalle, procura, construcción y puesta en marcha de las soluciones de autogeneración	283 days	1/04/26, 8:00a.m.	30/04/27, 5:00p.m.
12	**Componente 6. Seguimiento a la ejecución de los contratos derivados del convenio.**	**587 days**	**1/01/26, 8:00a.m.**	**31/03/28, 5:00p.m.**
13	6.1 Interventoría	283 days	1/04/26, 8:00a.m.	30/04/27, 5:00p.m.
14	6.2 Supervisión y apoyo a la supervisión	587 days	1/01/26, 8:00a.m.	31/03/28, 5:00p.m.
15	**Componente 7. Transferencia de activos, AOM y Monitoreo**	**415 days**	**1/06/26, 8:00a.m.**	**31/12/27, 5:00p.m.**
16	7.1 Transferencia de Activos	218 days	1/07/26, 8:00a.m.	30/04/27, 5:00p.m.
17	7.2 AOM (1 año)	415 days	1/06/26, 8:00a.m.	31/12/27, 5:00p.m.
18	7.3 Monitoreo del AOM (1 año)	415 days	1/06/26, 8:00a.m.	31/12/27, 5:00p.m.
19	**Componente 8. Sensibilizaciones, socializaciones, capacitaciones y divulgación.**	**239 days**	**1/02/26, 8:00a.m.**	**31/12/26, 5:00p.m.**
20	8.1 Sensibilización, socialización y capacitación	239 days	1/02/26, 8:00a.m.	31/12/26, 5:00p.m.
21	8.2 Divulgación	239 days	1/02/26, 8:00a.m.	31/12/26, 5:00p.m.

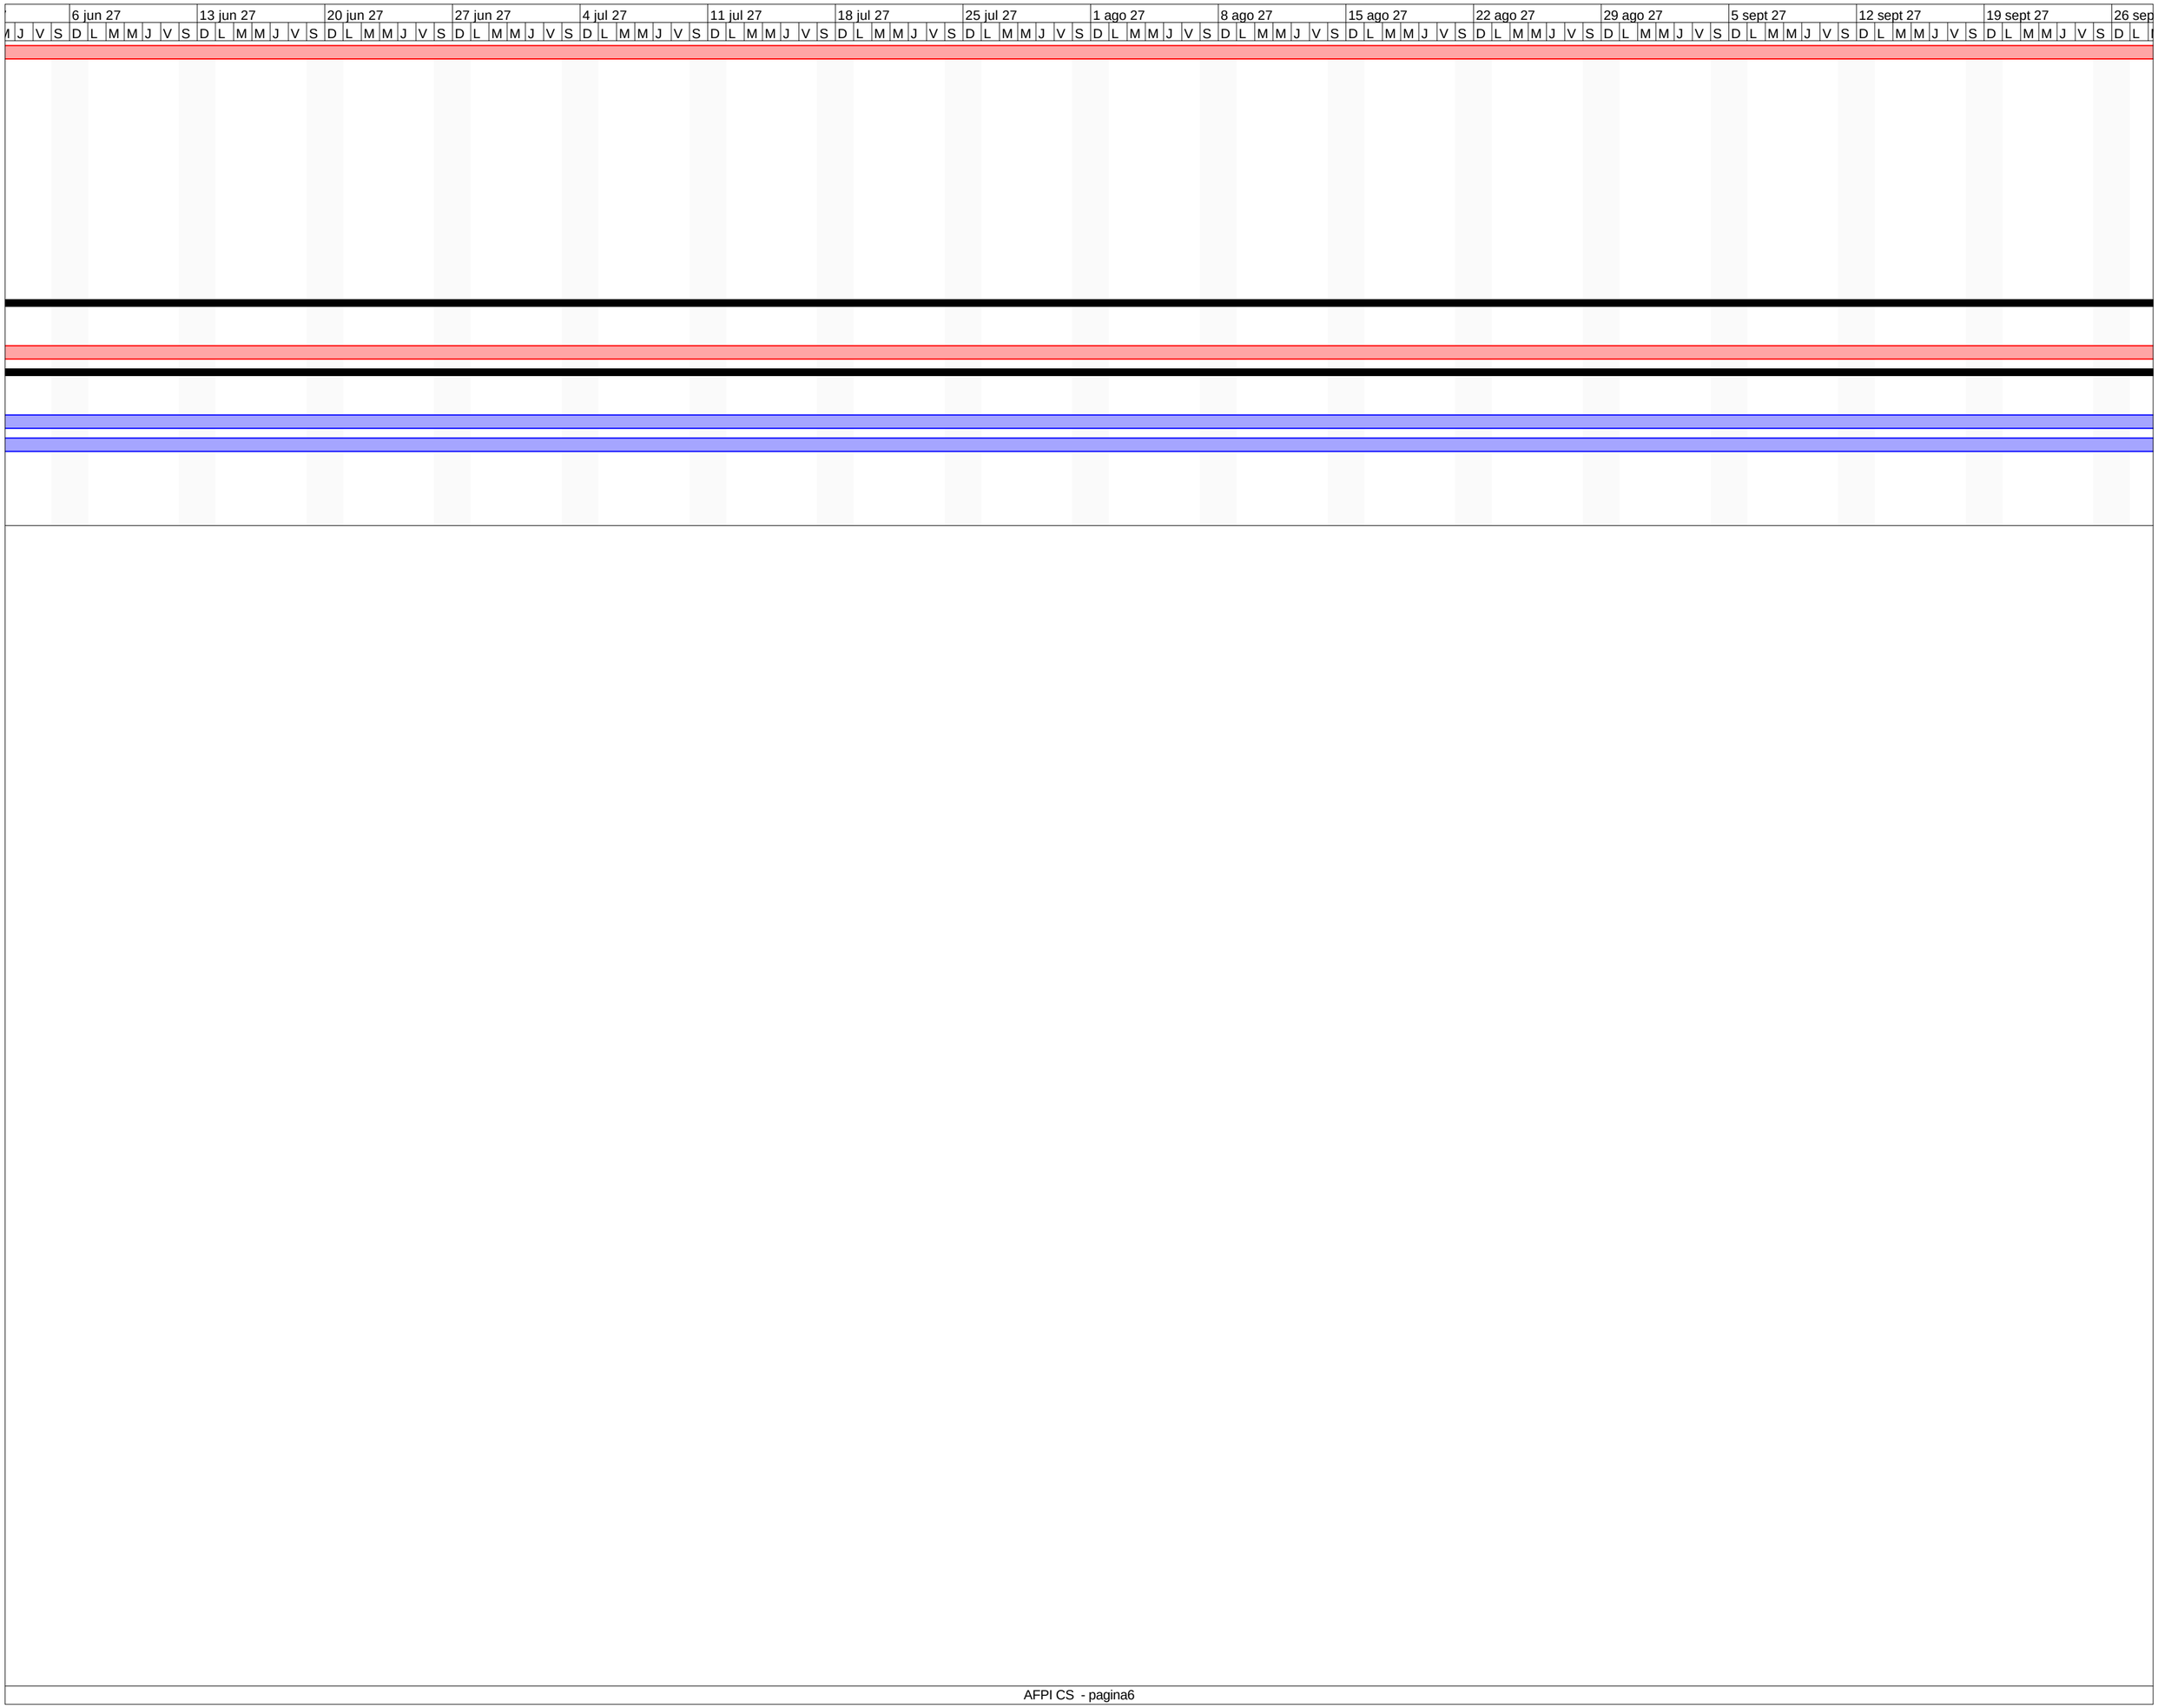


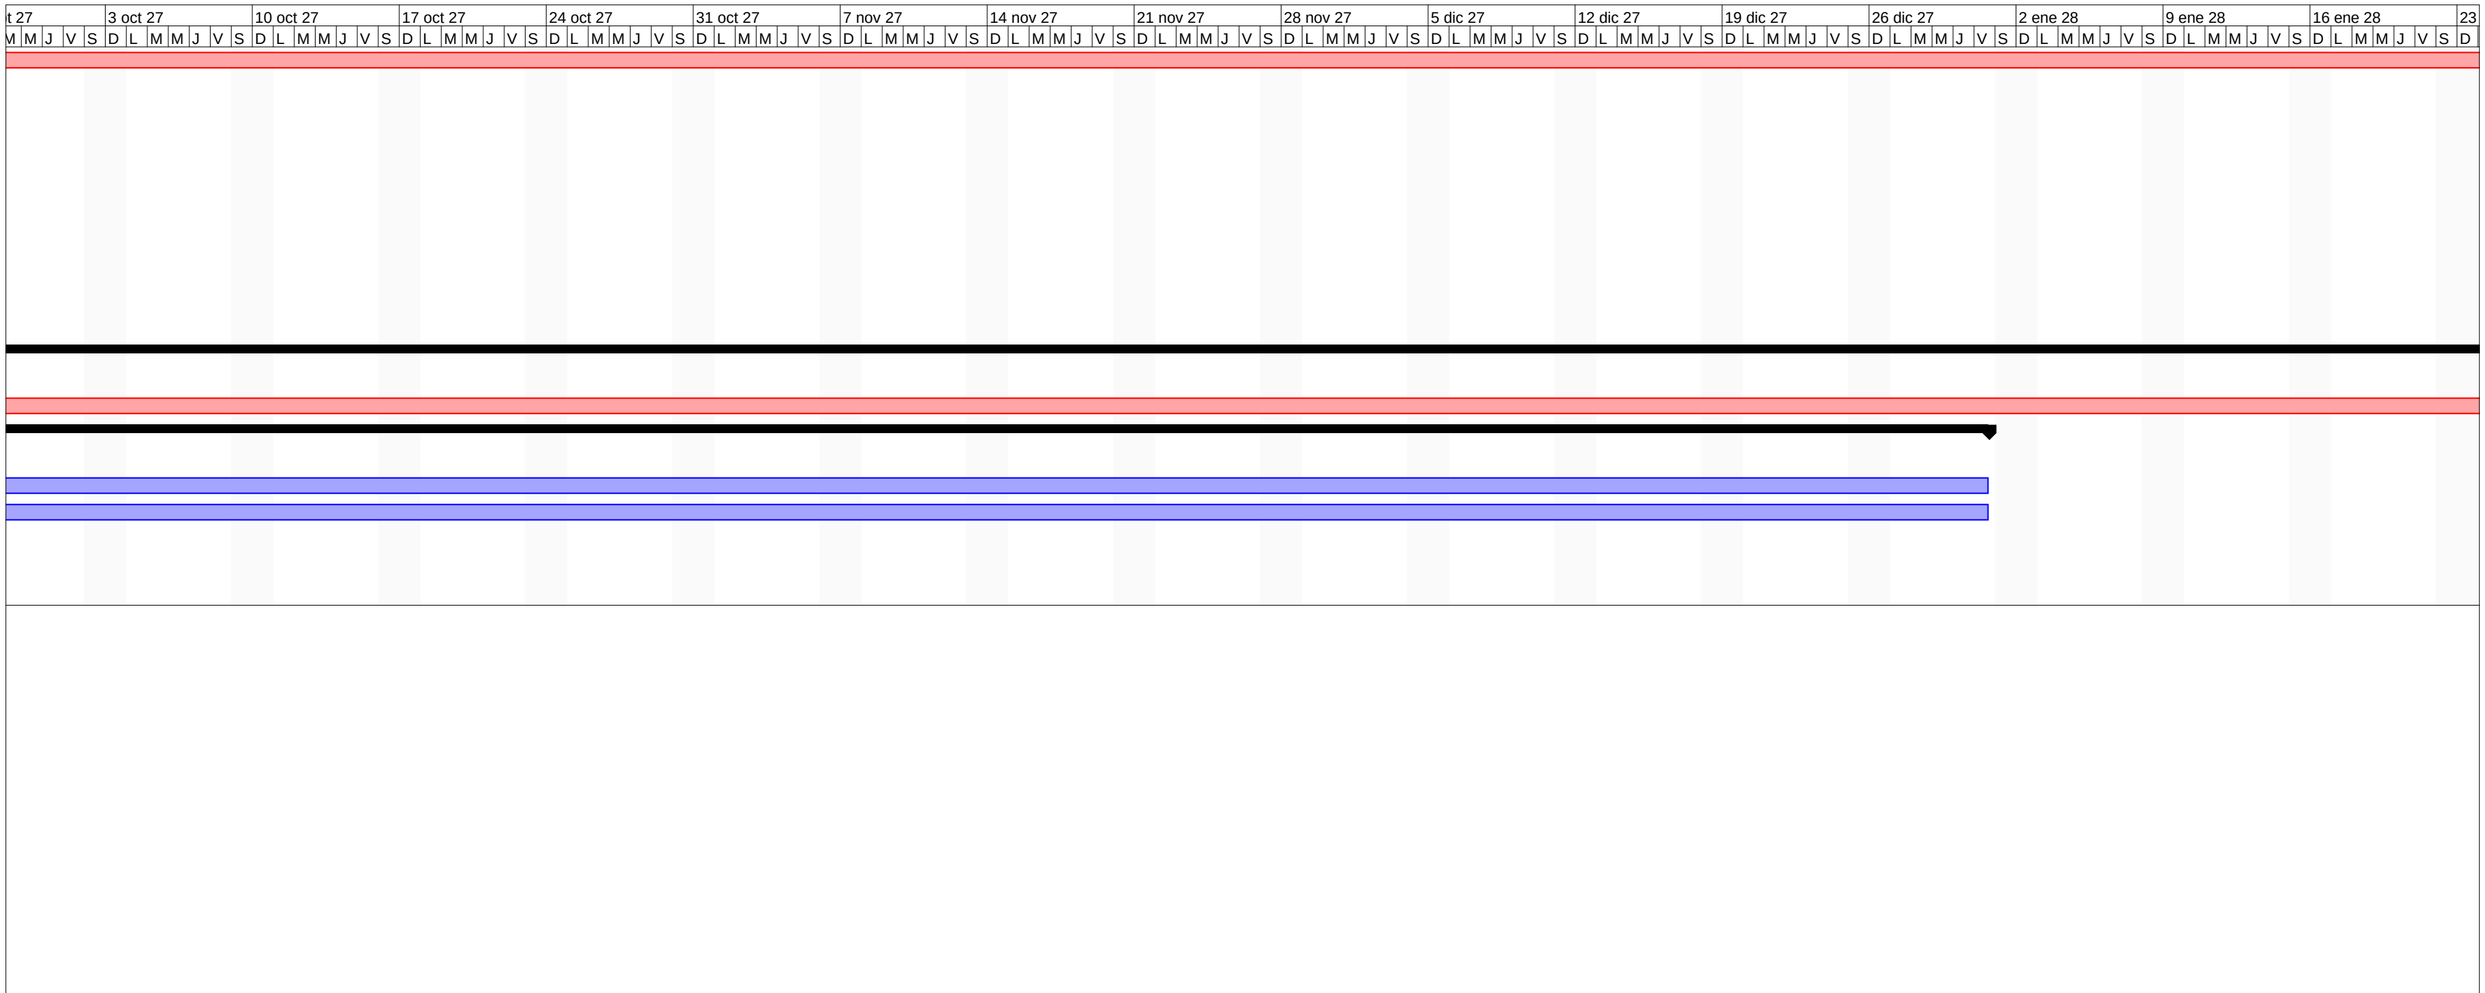

feb 26
22 feb 26
1 mar 26
8 mar 26
15 mar 26
22 mar 26
29 mar 26
5 abr 26
12 abr 26
19 abr 26
26 abr 26
3 may 26
10 may 26
17 may 26
24 may 26
31 may 26
7 jun 26

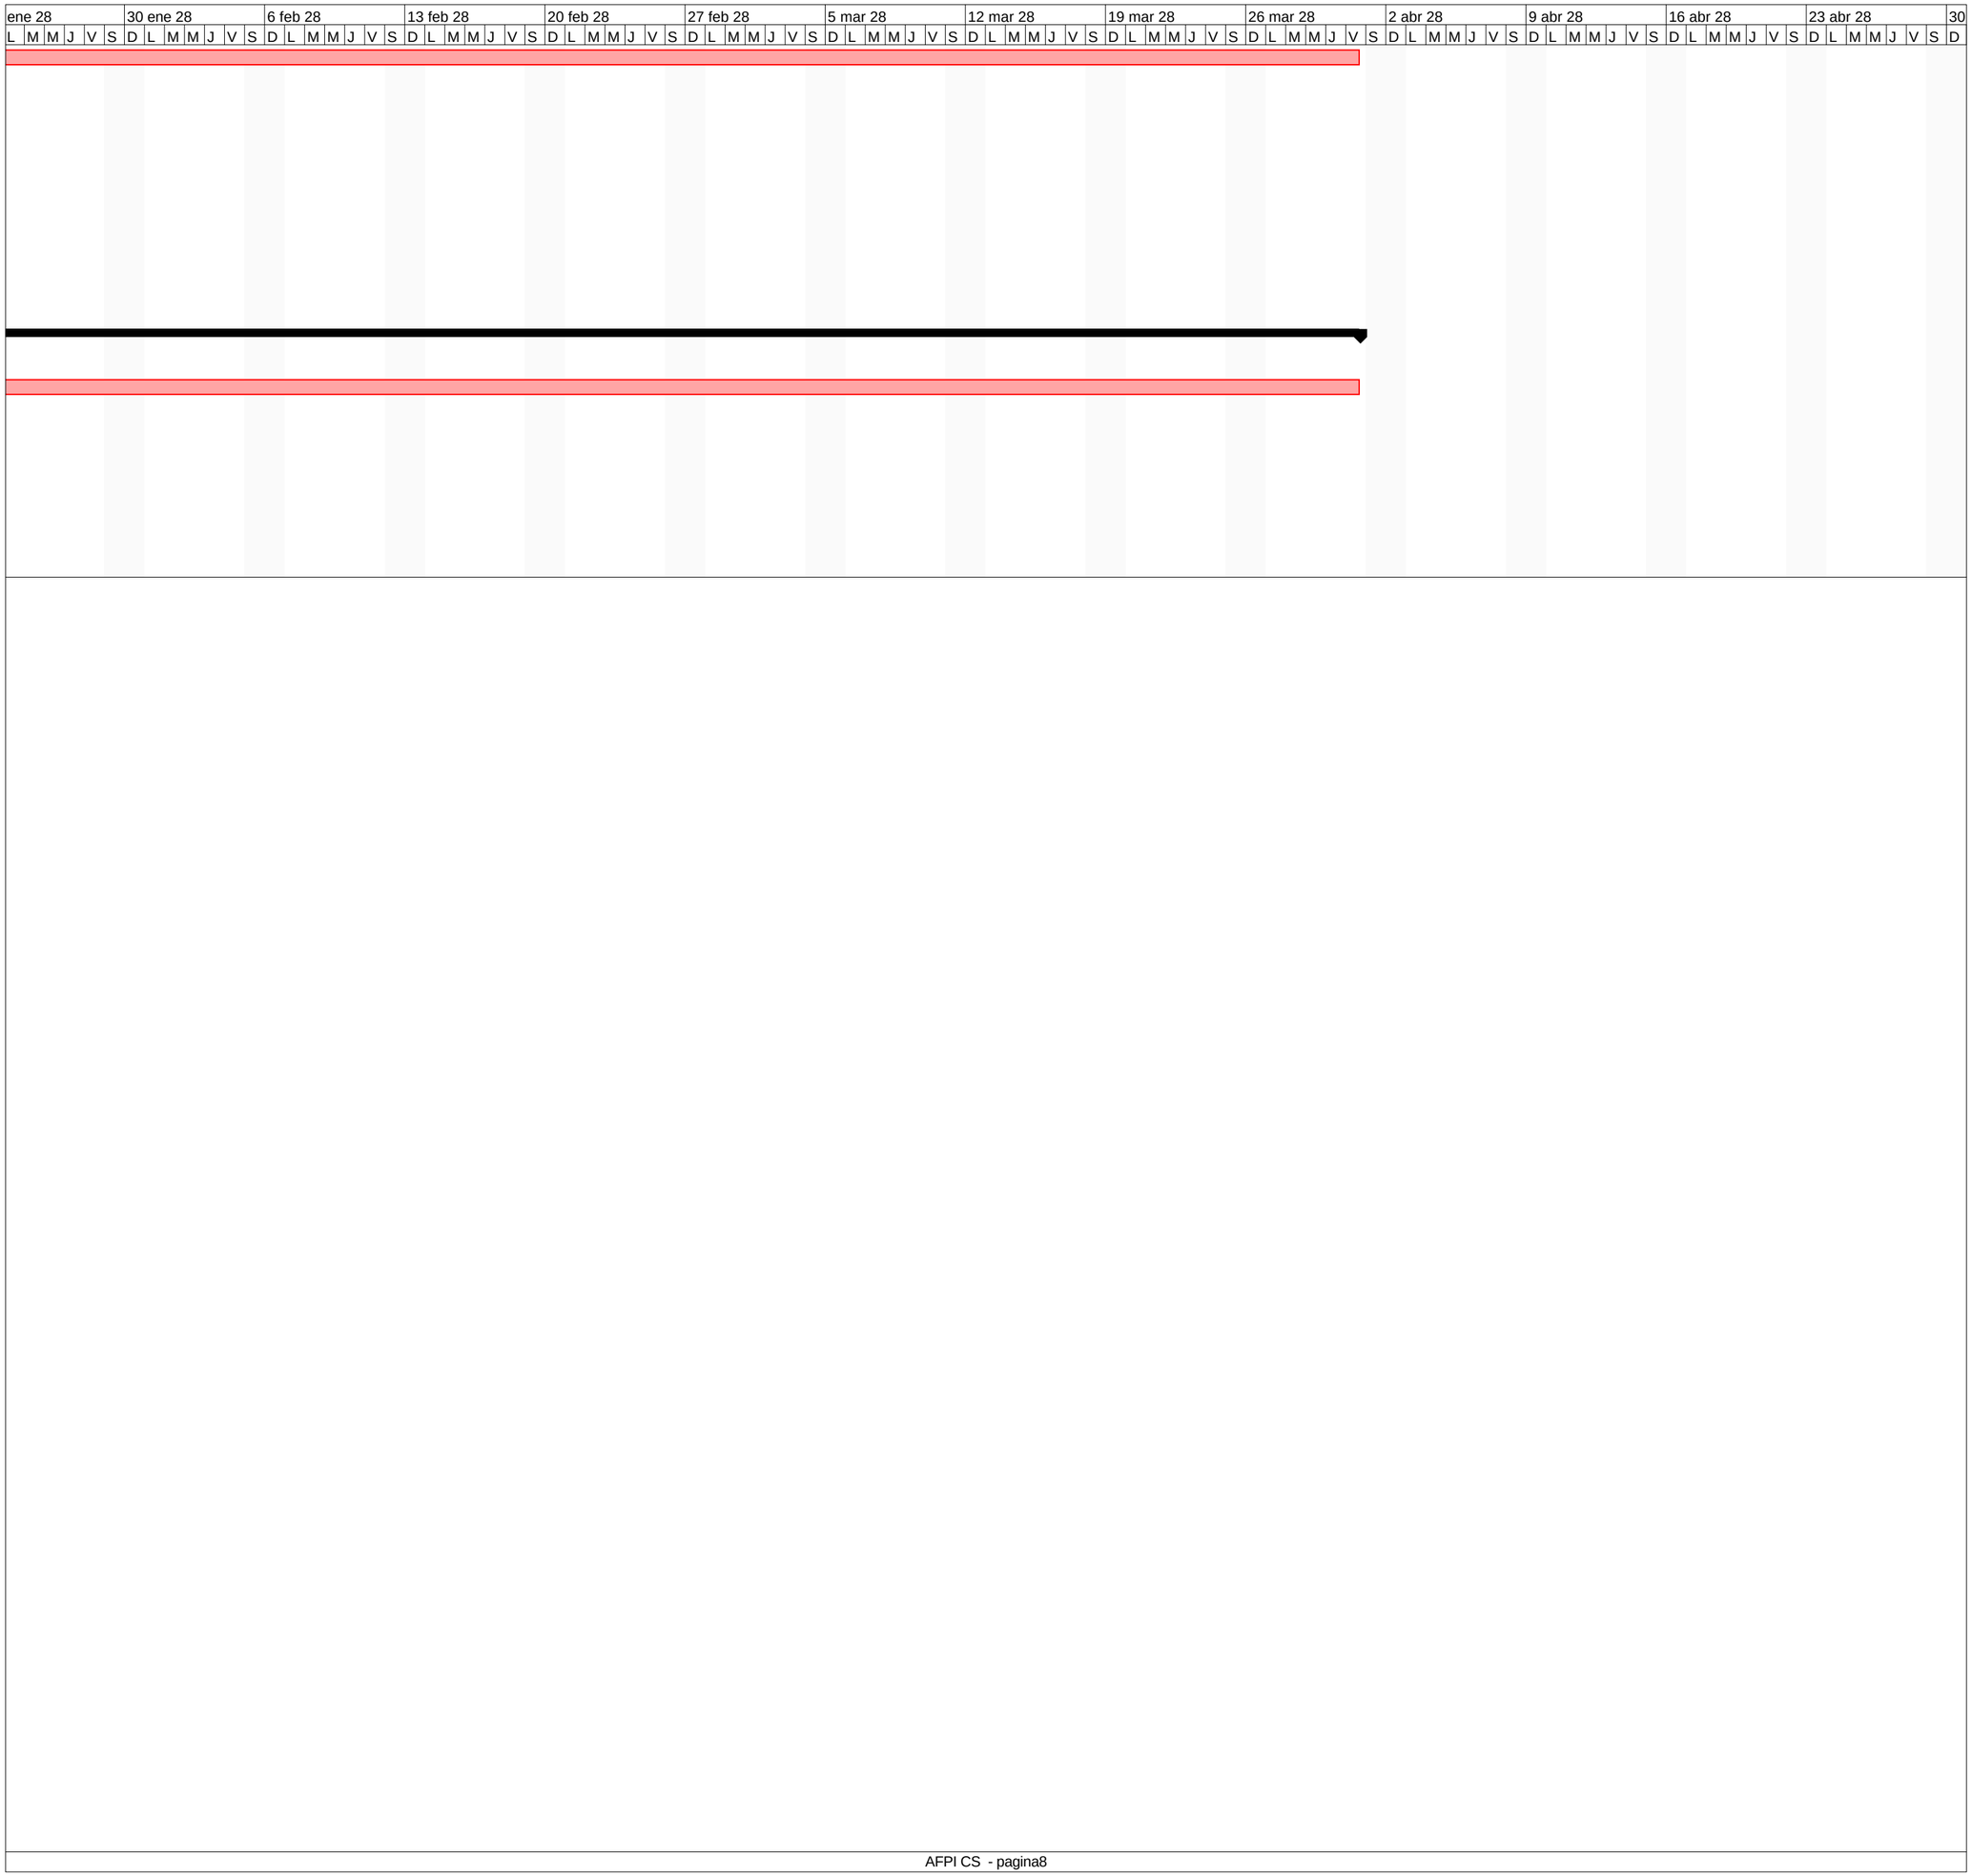

14 jun 26
21 jun 26
28 jun 26
5 jul 26
12 jul 26
19 jul 26
26 jul 26
2 ago 26
9 ago 26
16 ago 26
23 ago 26
30 ago 26
6 sept 26
13 sept 26
20 sept 26
27 sept 26
4 oct 26
D L M M J V S


11 oct 26
18 oct 26
25 oct 26
1 nov 26
8 nov 26
15 nov 26
22 nov 26
29 nov 26
6 dic 26
13 dic 26
20 dic 26
27 dic 26
3 ene 27
10 ene 27
17 ene 27
24 ene 27
31 ene 27
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V


7 feb 27
14 feb 27
21 feb 27
28 feb 27
7 mar 27
14 mar 27
21 mar 27
28 mar 27
4 abr 27
11 abr 27
18 abr 27
25 abr 27
2 may 27
9 may 27
16 may 27
23 may 27
30 may 27
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J


6 jun 27
13 jun 27
20 jun 27
27 jun 27
4 jul 27
11 jul 27
18 jul 27
25 jul 27
1 ago 27
8 ago 27
15 ago 27
22 ago 27
29 ago 27
5 sept 27
12 sept 27
19 sept 27
26 sep
D L M M J V S


t 27
3 oct 27
10 oct 27
17 oct 27
24 oct 27
31 oct 27
7 nov 27
14 nov 27
21 nov 27
28 nov 27
5 dic 27
12 dic 27
19 dic 27
26 dic 27
2 ene 28
9 ene 28
16 ene 28
23
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L


ene 28
30 ene 28
6 feb 28
13 feb 28
20 feb 28
27 feb 28
5 mar 28
12 mar 28
19 mar 28
26 mar 28
2 abr 28
9 abr 28
16 abr 28
23 abr 28
30
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
