Rad N°: 202542100799232 - Fecha rad: 2025-11-10 14:39:21
Usu Radicador: FABIAN GARCIA
Dep: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Remitente: Dominguez Moreno Sas
Asunto: Cuenta de Cobro n° 04

TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GCT-F11
		Versión: 03
		Actualización:26/05/2025

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO

Informe No:	4 - Final	**Contrato No:**	LP-001-2025
Nombre del Supervisor:	Juan Carlos Redondo	**Cargo:**	Profesional Universitario
Periodo de Informe:	16/10/2025 - 7/11/2025 - Factura DMOR 21		

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre del Contratista:	DOMÍNGUEZ MORENO SAS		
N° de Identificación del Contratista:	900270022-4		
Tipo de Contrato:	OBRA	**Fecha de Suscripción del Contrato:**	25/07/2025
Objeto del Contrato:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN EN VÍAS Y MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO, DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Valor del Contrato ($):	$ 472.666.311	**Plazo:**	Cuatro (4) Meses -Del 31/07/2025 Hasta 30/11/2025
N° CDP:	2025.TRA.01.000224	**Fecha CDP:**	7/03/2025
N° RP:	2025.TRA.01.000537	**Fecha RP:**	25/07/2025
N° CDP ADICIÓN:	2025.TRA.01.000537	**Fecha CDP:**	6/10/2025
N° RP ADICIÓN:	2025.TRA.01.000733	**Fecha RP:**	8/10/2025
Fecha de Inicio: (día/mes/año)	31/07/2025	**Fecha de Terminación:** (día/mes/año)	30/11/2025
Fecha de Suspensión: (día/mes/año)		**Fecha de Reinicio:** (día/mes/año)	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Valor	Tiempo	Fecha
Adiciones	236.302.000,00	0	8/10/2025
Prórroga	-	-	-
Otros	-	-	-
Valor Final del Contrato	**$ 708.968.311,00**	-	-

4. PAGO IMPUESTOS DISTRITALES - DEPARTAMENTALES - NACIONALES

Tipo de Impuesto	SI	N/A	Valor		Fecha y No. de Pago
			Valor Base	Valor Pagado	
Autorización para el Descuento de Estampillas		X			
Estampilla pro desarrollo	X		472.666.311	4.727.000	20250385709-12/08/2025
Estampilla pro desarrollo (Adición)	X		236.302.000	2.363.000	20251206362-14/10/2025
Estampilla pro Ciudadela Universitaria	X		472.666.311	8.508.000	20250385709-12/08/2025
Estampilla pro Ciudadela Universitaria (Adición)	X		236.302.000	4.253.000	20251206362-14/10/2025
Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor	X		472.666.311	2.363.000	20250385709-12/08/2025
Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor (Adición)	X		236.302.000	1.182.000	20251206362-14/10/2025
Estampilla Pro-Cultura (Mayor a 10 SMLV)	X		472.666.311	4.727.000	20250385709-12/08/2025
Estampilla Pro-Cultura (Mayor a 10 SMLV) (Adición)	X		236.302.000	2.363.000	20251206362-14/10/2025
Estampilla Pro-Electrificación Rural	X		472.666.311	9.453.000	20250385709-12/08/2025
Estampilla Pro-Electrificación Rural (Adición)	X		236.302.000	4.726.000	20251206362-14/10/2025
Estampilla Pro-Hospital 1 y 2 Nivel	X		472.666.311	8.035.000	20250385709-12/08/2025
Estampilla Pro-Hospital 1 y 2 Nivel (Adición)	X		236.302.000	4.017.000	20251206362-14/10/2025
Estampilla pro Hospital Univ. Cari ESE	X		472.666.311	4.727.000	20250385709-12/08/2025
Estampilla pro Hospital Univ. Cari ESE (Adición)	X		236.302.000	2.363.000	20251206362-14/10/2025
Estampilla ITSA	X		472.666.311	1.418.000	20250069515-08/08/2025
Estampilla ITSA (Adición)	X		236.302.000	709.000	20250092138-14/10/2025
Bono de Coldeportes		X			
Timbre		X			
Otros (Especifique Cuales) Intereses por mora (ITSA)	X				
Otros (Especifique Cuales) Intereses por mora (ITSA) (Adición)	X				
Otros (Especifique Cuales) Intereses por mora (Departamento)	X		472.666.311	27.000	20250385709-12/08/2025

5. ACREDITACION PAGO APORTES

No. De Planilla	79866064391
Base 40%	

5.1 PERSONA NATURAL	%	IBC	MES COTIZADO
Salud	12,50%	$ 0	
Pensión	16,00%	$ 0	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO. ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL GERENTE GENERAL

TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GCT-F11
		Versión: 03
		Actualización:26/05/2025

FSP (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Solidaridad	-	-	-
Fs (Mayor a 4 SMLV) Fondo de Subsistencia	-	-	-
ARL (Tener en cuenta el Tipo de Riesgo)	0,520%	$ 0	

5.2 PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN	SI	N/A	FECHA (dia/mes/año):
Aportes Parafiscales y Seguridad Social Representante Legal/Revisor Fiscal.	x		4/11/2025

6. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101139608 ✓	25/07/2025 - 24/03/2026	47.266.631,1
Cumplimiento del Contrato (Adición)			31/07/2025 - 30/03/2026 ✓	70.899.831,1 ✓
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101139608 ✓	25/07/2025 - 24/11/2028	94.533.262,2
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones (Adición)			31/07/2025 - 30/11/2028 ✓	141.799.662,2 ✓
Calidad y estabilidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101139608 ✓	25/07/2025 - 24/11/2030	141.799.893,3
Calidad y estabilidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción. (Adición)			31/07/2025 - 30/11/2030 ✓	212.699.493,3 ✓
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101064425 ✓	25/07/2025 - 24/11/2025	284.700.000,0
Responsabilidad Civil Extracontractual (Adición)			31/07/2025 - 30/11/2025	✓ 284.700.000,0 ✓
Otros (Especifique cuales)	-	-	-	-

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Pago de acta de obra Final equivalente a 35% del contrato por valor de $251.920.583 de acuerdo al Parágrafo 1 de la Clausula 3 del contrato LC-01-2025.

8. PAGO APROBADO

Pago anticipo	Valor:		
Pago anticipado	Valor:	$ -	
Pago parcial o mensual	Valor:	$ 251.920.583,00 ✓	
Pago Total	Valor:	$ 251.920.583,00 ✓	

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

No. de Pago	Fecha de Pago	No. de Orden de Pago	Valor de Pago	Valor Saldo por Pagar
1	27/08/2025 ✓	2025,TRA,01,001249 ✓	$ 113.142.392,00 ✓	$ 595.825.919,00
2	18/09/2025 ✓	2025,TRA,01,001425 ✓	$ 136.285.350,00 ✓	$ 459.540.569,00
3	28/10/2025 ✓	2025,TRA,01,001672 ✓	$ 207.619.996,00 ✓	$ 251.920.573,00
4				
5				
6				

9. DOCUMENTOS ANEXOS REQUERIDOS

No.	Nombre de Documento	SI	N/A
1	Cuenta de Cobro y/o Factura	X	
2	Copia de Contrato (Solo primera cuenta)	X	
3	Consolidación del Secop 2 (Solo primera cuenta)	X	
4	Registro Presupuestal (Solo primera cuenta)	X	
5	Pago Estampilla Gobernación o Carta de Autorizacion para el Descuento de las Estampillas (Solo primera cuenta)	X	
6	Pago Estampilla Alcaldía Distrital (Solo primera cuenta)	X	
7	Pago de Seguridad Social o Parafiscales	X	
8	Afiliación ARL (Solo primera cuenta)		X
9	Certificación Bancaria (Solo Primera cuenta)		X
10	Certificado de Orfeo		X
11	Registro Unico Tributario (Solo Primera cuenta)		X
12	Aprobación de Garantías en contrato estata l -Polizas (Si aplica-Solo primera cuenta)	X	
13	Informe de actividades	X	

10. CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

Con el presente documento certifico: a) que el contratista ha cumplido con el objeto contractactual durante el periodo facturado; b) que los datos suministrados en este documento los he verificado de acuerdo a los archivos que reposan en la entidad y a los documentos suministrados por el contratista; c) que el contratista aportó los soportes de pago de los impuestos, los cuales fueron liquidados por la autoridad correspondiente y los soportes de pago de la seguridad social.

FIRMA DEL SUPERVISOR	[signature]	FIRMA DEL CONTRATISTA	Rubiela Dominguez M.
Identificación:	80.852.786	Identificación:	48.775.404
Teléfono:	3507101828	Teléfono:	6053011616
Dirección:	Carrera 45 No.69-84	Dirección	CR 59 N° 64 - 257
Fecha de Aprobación:	6 de noviembre de 2025		

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO. ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL DIRIGENTE GENERAL

DOMINGUEZ MORENO S.A.S
NIT: 900270022-4
Cra. 59 No 64-257
TEL: 6053011616
BARRANQUILLA

Regimen Comun. Actividad ICA- 4290 Tarifa 12.5 x Mil

Res.Dian No.18764095468530 de fecha 10/07/2025 desde 16 a 500 vence 10/07/2026

Cliente: **INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO**
Nit/Cedula: **800115102**
Direccion: **CL 40 CR 45**
Telefono: **3700804**
Vendedor: **DOMINGUEZ MORENO RUBIELA MARIA**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DMOR 21
Fecha Factura: 05.nov./2025
Vencimiento: 13/11/2025 12:00:00 a.
Condiciones: 8 DIAS
OTI N° :

Documento validado por la DIAN 11/05/2025 09:19:02 generado por: Software Proplo DOMINGUEZ MORENO S.A.S Nit: 900270022-4

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTA FINAL CONTRATO LP 001-2025 OBJETO: REALIZACION DE OBRAS DE SEÑALIZACION EN VIAS Y MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	ZZ	1.00	189,413,972.00	189,413,972.00

Total Items: 1 Cant Articulos: 1

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M.L.

OBS : ACTA FINAL CONTRATO LP-001-2025

Vr. Bruto		189,413,972.00
Vr. Descuento		0.00
Vr Administracion	26 %	49,247,633.00
Vr. Imprevisto	2 %	3,788,279.00
Vr. Utilidad	5 %	9,470,699.00
Vr. Subtotal		251,920,583.00
Vr. IVA		0.00
Vr. IVA Ret.		0.00
Vr. Rte Fuente		0.00
Vr. Rte ICA		0.00
Total Factura		251,920,583.00

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a LA LETRA DE CAMBIO, segun el articulo 779 del codigo de comercio Y TIENE CARACTER DE TITULO VALOR QUE SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008. Version: 02 fecha de Aprobacion 12 / 10 /17

Elaborado por ERP FOMPLUS.NET

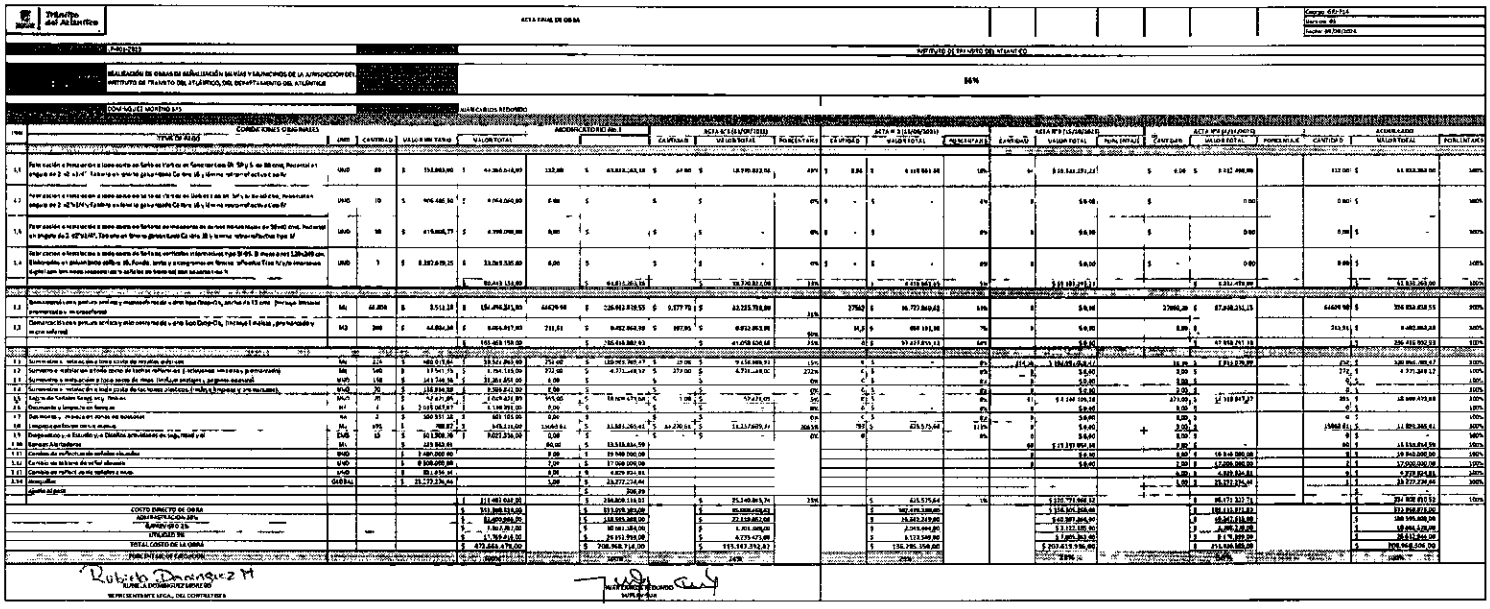
atencionalcliente@gmail.com

AUTORIZADA POR _____

RECIBIDO POR: _____

Developed by Fomplus

6ecc02a09bd61af12b3ec51ab24a606c9bee3fe1aa9116ee1d18afda30cf79eb11b4e05655433f2a500ee523eb81f796



Tránsito del Atlántico	ACTA FINAL DE OBRA	Codigo: GRI-F14 Version: 05 Fecha: 09/09/2025

	LP-001-2025		INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
	REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN EN VÍAS Y MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO, DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		(4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. Parágrafo 1. Las partes podrán pactar ampliaciones de plazo o suspenderlo, cuando así lo acuerden y con base en la normatividad vigente. Parágrafo 2. Las partes
	DOMINGUEZ MORENO SAS		JUAN CARLOS REDONDO

PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL DE OBRAS MANTENIMIENTOS TRANSITO

LUGAR	ACTA 4 CANTIDAD TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA	VALOR	VALOR CONTRATO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	36%	4/11/2025	$ 189.413.972	
COSTO DIRECTO	36%	4/11/2025	$ 189.413.972	
ADMINISTRACION 26%			$ 49.247.633	
IMPREVISTO 2%			$ 3.788.279	$ 708.968.311
UTILIDAD 5%			$ 9.470.699	
TOTAL COSTO DE OBRA			$ 251.920.583	
ACTA DEL 29% EJECUTADO VALOR A PAGAR	**36%**	**4/11/2025**	**$ 251.920.583**	

Rubiela Dominguez M.

RUBIELA DOMINGUEZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

JUAN CARLOS REDONDO
SUPERVISOR

TRÁNSITO
DEL ATLÁNTICO

MEMORANDO

Para: CARLOS MARIO GRANADOS
Director
Instituto de Tránsito del Atlántico

De: JUAN CARLOS REDONDO MAESTRE
Supervisor del Contrato LP-001-2025

Asunto: Aval técnico para la solicitud de adición presupuestal del contrato LP-001-2025

Fecha: 03 de octubre de 2025

En cumplimiento de mis funciones como supervisor del contrato LP-001-2025, cuyo objeto es la realización de obras de señalización en vías y municipios de la jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico, suscrito con el contratista DOMÍNGUEZ MORENO S.A.S., por un valor inicial de $472.666.311 y con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses contados a partir del 31 de julio de 2025, he evaluado la necesidad de una adición presupuestal derivada de la realización del Giro de Rigo 2025, evento ciclístico nacional que se desarrollará en el departamento del Atlántico el día 2 de noviembre de 2025.

Justificación Técnica

El recorrido oficial del evento abarca vías que se encuentran bajo la jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico. Se estima que aproximadamente 90.000 metros lineales del trayecto total corresponden a este ámbito de responsabilidad.

Sin embargo, de acuerdo con las condiciones técnicas y presupuestales, es posible ejecutar labores de demarcación únicamente sobre un tramo de 50.600 metros lineales, priorizados en aquellos sectores del recorrido que presentan mayor necesidad de intervención para garantizar la seguridad vial de los participantes y la comunidad en general.

De conformidad con los precios unitarios establecidos en el contrato, el valor unitario de esta actividad es de $4.670 por metro lineal, lo que genera un valor total de:

50.600 ml × $4.670 = $236.302.000

Este monto adicional resulta indispensable para atender los requerimientos específicos del evento, cuya fecha de realización es inminente (2 de noviembre de 2025). La intervención garantizará que el recorrido se encuentre debidamente demarcado antes del inicio del evento, contribuyendo a la correcta señalización preventiva, la canalización y la guía para los ciclistas, reduciendo riesgos de siniestralidad y mejorando la movilidad durante su desarrollo.

Recomendaciones y Solicitud

Con base en lo anterior, me permito avalar técnicamente la necesidad de la adición presupuestal y recomendar lo siguiente:

- Aprobación de la adición presupuestal: Incluir la suma de $236.302.000 al contrato LP-001-2025, suscrito con el contratista DOMÍNGUEZ MORENO S.A.S., asegurando así los recursos necesarios para la ejecución de las actividades de demarcación vial en el marco del Giro de Rigo 2025.

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Solicitar a la Dirección Financiera la expedición del CDP correspondiente, con el fin de garantizar la viabilidad financiera de la adición.

La adición solicitada permitirá no solo fortalecer la seguridad vial y la organización del Giro de Rigo 2025, sino también dejar a disposición de la comunidad vías mejor demarcadas que seguirán beneficiando la movilidad y reduciendo riesgos de siniestros después del evento.

Atentamente

JUAN CARLOS REDONDO MAESTRE
Supervisor Contrato No. LP-001-2025
Instituto de Tránsito del Atlántico

TRÁNSITO
DEL ATLÁNTICO

MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP 01-2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO Y DOMINGUEZ MORENO S.A.S.

Entre los suscritos **CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGO** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanía número 79.801.453, quien en su calidad de Director General actúa en nombre y representación legal del **INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO**, nombrada mediante Decreto No.0004 de 2024 en adelante EL ITA, **DOMINGUEZ MORENO S.A.S**, identificado con **NIT. 900.270.022-4**, hemos decidido celebrar la siguiente Modificación 1 al contrato de obra pública No. LP 01-2025, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables al campo de la Contratación Estatal, Ley 80/93, Ley 1150/07 y decretos reglamentarios, y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: 1.- Que, el día veinticinco (25) de julio de 2025, el Instituto de Tránsito de Atlántico suscribió el contrato de prestación de servicios No. LP 01-2025, cuyo objeto es: "**REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN EN VÍAS Y MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO, DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**", por un valor de **CUANTROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L ($472.666.311)**; con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, es decir desde el 31 DE JULIO 2025 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. **2.** Que, el día tres (3) de octubre de 2025, el Profesional Universitario de la subdirección de Seguridad Vial del ITA - supervisor del contrato en mención solicita la modificación del contrato, en virtud de "*la necesidad de una adición presupuestal derivada de la realización del Giro de Rigo 2025, evento ciclístico nacional que se desarrollará en el departamento del Atlántico el día 2 de noviembre de 2025. El recorrido oficial del evento abarca vías que se encuentran bajo la jurisdicción del Instituto de Tránsito del Atlántico. Se estima que aproximadamente 90.000 metros lineales del trayecto total corresponden a este ámbito de responsabilidad. Sin embargo, de acuerdo con las condiciones técnicas y presupuestales, es posible ejecutar labores de demarcación únicamente sobre un tramo de 50.600 metros lineales, priorizados en aquellos sectores del recorrido que presentan mayor necesidad de intervención para garantizar la seguridad vial de los participantes y la comunidad en general. De conformidad con los precios unitarios establecidos en el contrato, el valor unitario de esta actividad es de $4.670 por metro lineal, lo que genera un valor total de: 50.600 ml × $4.670 = $236.302.000. Este monto adicional resulta indispensable para atender los requerimientos específicos del evento, cuya fecha de realización es inminente (2 de noviembre de 2025). La intervención garantizará que el recorrido se encuentre debidamente demarcado antes del inicio del evento, contribuyendo a la correcta señalización preventiva, la canalización y la guía para los ciclistas, reduciendo riesgos de siniestralidad y mejorando la movilidad durante su desarrollo.*" **3.** Que, la Dirección del Instituto, considera viable la solicitud del Profesional Universitario de la subdirección de Seguridad Vial del ITA - supervisor del contrato de obra pública No. LP 01-2025. **4.** Que, en consideración de lo anteriormente expuesto, previa verificación del expediente contractual y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las Partes Acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR** al valor estipulado en la CLAUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA, del contrato No. LP 01-2025 la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS M/L ($236.302.000) IVA INCLUIDO, en virtud de lo anterior, las partes acuerdan: **PARÁGRAFO PRIMERO:** La presente adición se encuentra respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2025.TRA.01.000537 del 6 de octubrebre de 2025. **PARAGRAFO SEGUNDO: EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL** ATLÁNTICO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante la presentación de factura, previo recibo a satisfacción expedido por el supervisor del Contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. **PARAGRAFO TERCERO**: El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar con

MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP 01-2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO Y DOMINGUEZ MORENO S.A.S.

ocasión de la presente modificación. **CLÁUSULA SEGUNDA: TRIBUTOS** - El contratista se compromete al pago de los tributos que se generen con ocasión a la presente adición. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato principal no modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLAUSULA CUARTA: EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO**: La presente modificación no afecta el equilibrio económico del Contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. **CLÁUSULA QUINTA: CLÁUSULA:** El contratista se obliga a realizar la ampliación y/o modificación de las garantías contractuales a que haya lugar. **CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La suscripción de esta Acta se realizará a través del uso de la plataforma SECOP II y mediante la firma electrónica de las partes, conforme los lineamientos de uso de la plataforma emitidos por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012. De la suscripción se dejará constancia en el expediente mediante la impresión de la constancia de firma electrónica descargada directamente de la plataforma.

Revisó: *Cynthia Mercado Gámez - Profesional Especializado área de contratación.*
Proyectó: *Pedro Pablo Acosta - Contratista.*



1 Modificación del contrato
2 Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información de Ejecución
Estado del contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Modificación pendiente

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Justificación de la modificación	
CO1.CTRMOD.20455567	Modificar el contrato	8/10/2025 12:12 PM	MODIFICACIÓN 1 AL	Detalle

VER MODIFICACIÓN

Cancelar

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 2 - - fue agregado.
- Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- Campo 2 - MODIFICACIÓN 1 - Descripción valor ha cambiado para MODIFICACIÓN 1.
- Campo 2 - MODIFICACIÓN 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 2 - MODIFICACIÓN 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 2 - MODIFICACIÓN 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 236.302.000,00.
- Campo 2 - MODIFICACIÓN 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 236.302.000,00.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 24/11/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/11/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 6
- El documento 29. MODIFICACION 1 - LP 01-2025.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) fue cambiado desde 472.666.311,00 hasta 708.968.311,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 202501000537.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 472.666.311,00 hasta 708.968.311,00

Reconocido por el proveedor *Rubiela Dominguez 08-10-2025 12:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGO 08-10-2025 12:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Modificación del contrato
2 Información general
Condiciones
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Modificación pendiente

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Justificación de la modificacion	
CO1.CTRMOD.20459557	Modificar el contrato	8/10/2025 12:17 PM	MODIFICACIÓN 1 AL	Detalle

VER MODIFICACIÓN

Cancelar

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.20459557
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.15451259
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	56 minutos de tiempo transcurrido *(8/10/2025 12:21:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	MODIFICACIÓN 1 AL CONTRATO LP 01-2025

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
28. SOLICITUD DE ADICION 1 - LP 01-2025.pdf	28. SOLICITUD DE ADICION 1 - LP 01-2025.pdf	(detalle)
29. MODIFICACION 1 - LP 01-2025.pdf	29. MODIFICACION 1 - LP 01-2025.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

✚ Campo 2 - - fue agregado.

✎ Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO

DIRECCION GENERAL

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

INFORMACION GENERAL DE LA SOLICITUD DE INVERSIÓN	
NUMERO DE SOLICITUD	2025.TRA.01.000537
FECHA DE EXPEDICIÓN	OCT.03.2025
SOLICITANTE	GRANADOS BUITRAGO CARLOS MARIO - DIRECTOR GENERAL
A QUIEN SE DIRIGE	HERNANDEZ CORTES JAIRO ALONSO - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROYECTO DE INVERSION	
SECCION	DG-DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA	DG-1-DIRECCION GENERAL
SECTOR	DG-1-24-TRANSPORTE
PROGRAMA	DG-1-2409-SEGURIDAD DE TRANSPORTE (2409)
SUBPROGRAMA	DG-1-2409-0600-INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
NUMERO DE PROYECTO	2025000005 - SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, SEMAFORIZACIÓN VIAL Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS METÁLICAS- 24 - TRANSPORTE- 2409 - SEGURIDAD DE TRANSPORTE (2409)

DETALLE DE LA SOLICITUD
ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO LP 001 2025 CUYO OBJETO: "REALIZACION DE OBRAS DE SEÑALIZACION EN VIAS Y MUNICIPIOS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO"

NOTA: *LA INFORMACION TRASLADADA A ESTE ITEM CORRESPONDERA AL CONCEPTO DEL CDP.*

DETALLE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO		
TOTAL SOLICITUD	$ 236.302.000,00	SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

OBJETO DEL GASTO	
FUENTE O RECURSO	
PRODUCTO MGA	
PRODUCTO CPC	
VALOR FUENTE	

SECRETARIA/AREA RESPONSABLE
GRANADOS BUITRAGO CARLOS MARIO DIRECTOR GENERAL

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO

DIRECCION GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

INFORMACION GENERAL DEL CDP DE INVERSION	
NÚMERO DE CDP	2025.TRA.01.000537
FECHA DE EXPEDICIÓN	OCT.06.2025 — FECHA DE VENCIMIENTO: NOV.30.2025
CONCEPTO	ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO LP 001 2025 CUYO OBJETO: "REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN EN VIAS Y MUNICIPIOS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO"
VALOR TOTAL DEL CDP	$ 236.302.000,00 SON, DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

PROYECTO DE INVERSION	
SECCION	DG-DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA	DG-1-DIRECCION GENERAL
SECTOR	DG-1-24-TRANSPORTE
PROGRAMA	DG-1-2409-SEGURIDAD DE TRANSPORTE (2409)
SUBPROGRAMA	DG-1-2409-0600-INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
NUMERO DE PROYECTO	202500005 - SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, SEMAFORIZACIÓN VIAL Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS METÁLICAS-24 - TRANSPORTE- 2409 - SEGURIDAD DE TRANSPORTE (2409)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
FUENTE O RECURSO	03 - OTRAS MULTAS
PRODUCTO MGA	2409013 - INCLUYE LA REALIZACIÓN DE OBRAS FÍSICAS E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DE DISPOSITIVOS PARA LA SEGURIDAD VIAL.
PRODUCTO CPC	83323 - SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE TRANSPORTE
VALOR FUENTE	$ 236.302.000,00

HACEMOS CONSTAR QUE:

El presente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, se realizó de acuerdo al presupuesto de gastos de la (del) **INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO - ATLANTICO** correspondiente a la entidad **TRANSITO DEL ATLANTICO** en la vigencia 2025. Certificando que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) rubro (s), fuente (s) y cantidad (es) aquí descritas."

FIRMA RESPONSABLE	NOTA
HERNANDEZ CORTES JAIRO ALONSO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

FECHA IMPRESIÓN: OCT 7 2025 — IP: 132.255.194.158 — IMPRIMIÓ: LGONZALEZ — ELABORÓ: LGONZALEZ

DEPARTAMENTO ATLANTICO

INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO

DIRECCION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2025

INFORMACION GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO DE REGISTRO	2025.TRA.01.000733	FECHA DE EXPEDICIÓN	08 DE OCTUBRE DEL 2025
NÚMERO DE CDP	2025.TRA.01.000537	FECHA DE EMISIÓN	06 DE OCTUBRE DEL 2025
DOCUMENTO DE CONTROL	0001 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	NUMERO CONTRATO	LP-01-2025
BENEFICIARIO	900.270.022 - DOMINGUEZ MORENO S.A.S.		
CONCEPTO DEL REGISTRO	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO LP 001 2025 CUYO OBJETO: "REALIZACION DE OBRAS DE SEÑALIZACION EN VIAS Y MUNICIPIOS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO"		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	$ 236.302.000,00	SON. DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

PROYECTO DE INVERSION

SECCION	DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA	DIRECCION GENERAL
SECTOR	TRANSPORTE
PROGRAMA	SEGURIDAD DE TRANSPORTE (2409)
SUBPROGRAMA	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO	202500005 - SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, SEMAFORIZACIÓN VIAL Y MANTENIMIENTO D DEFENSAS METÁLICAS- 24 - TRANSPORTE- 2409 - SEGURIDAD DE TRANSPORTE (2409)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
FUENTE O RECURSO	03-OTRAS MULTAS
PRODUCTO MGA	2409013 - INCLUYE LA REALIZACIÓN DE OBRAS FÍSICAS E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DE DISPOSITIVOS PARA LA SEGURIDAD VIAL.
PRODUCTO CPC	83323 - SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE TRANSPORTE
VALOR FUENTE	$ 236.302.000,00

HACEMOS CONSTAR QUE:

Hacemos Constar que se ha hécho el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al Presupuesto de Rentas y Gastos del (la) INSTITUTO DE TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO; VIGENCIA FISCAL - 2025.

FIRMA RESPONSABLE	NOTA
HERNANDEZ CORTES JAIRO ALONSO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

FECHA IMPRESIÓN: OCT.8.2025 IP: 152.200.194.158 IMPRIMIÓ: LGONZÁLEZ ELABORÓ:

República de Colombia

Departamento del Atlántico

Secretaría de Hacienda Departamental

Bono de Pago de Estampillas Departamentales

Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS
Clase Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS DEPARTAMENTALES

1. DATOS

Nro DE LIQUIDACION: 20250098927			
FECHA DE PAGO: 12/08/2025	**BASE GRAVABLE:** 472666311		**REFERENCIA DE PAGO:** 20250385709
CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ MORENO S.A.S.		**CEDULA O NIT:** 900270022	
ENTIDAD CONTRATANTE: TRANSITO DEPARTAMENTAL	**N° DE CONTRATO:** LP 01-2025	**FECHA SUSCRIPCION:** 25/07/2025	

PAGADO

2. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	VALOR
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 2.363.000
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA	$ 8.508.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	$ 4.727.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 4.727.000
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$ 4.727.000
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	$ 9.453.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	$ 8.035.000
MORA RENTAS VARIAS	$ 27.000
Total a Pagar	**$ 42.567.000**

PAGADO

CONTRIBUYENTE

12/08/2025

20250385709

Este documento debe ser verificado por la entidad responsable de exigir su pago en la página web de la gobernación www.atlantico.gov.co en el link impuestos departamentales

GOBERNACIÓN

20250385709

ACTO Y/O HECHO GENERADOR: CONTRATOS Y CONVENIOS		
CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ MORENO S.A.S.		**CEDULA O NIT:** 900270022
FECHA LIQUIDACIÓN: 12/08/2025	**Nro DE LIQUIDACION:** 20250098927	**TOTAL:** $ 42.567.000

BANCO

20250385709

Nro DE ACTO Y/O HECHO GENERADOR: CONTRATOS Y CONVENIOS		
CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ MORENO S.A.S.		**CEDULA O NIT:** 900270022
FECHA LIQUIDACIÓN: 12/08/2025	**Nro DE LIQUIDACION:** 20250098927	**TOTAL:** $ 42.567.000

República de Colombia

Departamento del Atlántico

Secretaría de Hacienda Departamental

Bono de Pago de Estampillas Departamentales

Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS
Clase Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS DEPARTAMENTALES

1. DATOS

Nro DE LIQUIDACION: 20250409648			**REFERENCIA DE PAGO:** 20251206362
FECHA DE PAGO: 14/10/2025	**BASE GRAVABLE:** 236302000		
CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ MORENO S.A.S.		**CEDULA O NIT:** 900270022	
ENTIDAD CONTRATANTE: TRANSITO DEPARTAMENTAL	**N° DE CONTRATO:** MODIFICACION 1 AL CONTRATO LP 01-2025		**FECHA SUSCRIPCION:** 08/10/2025

2. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	VALOR
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 1.182.000
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA	$ 4.253.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO	$ 2.363.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 2.363.000
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$ 2.363.000
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	$ 4.726.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	$ 4.017.000
Total a Pagar	**$ 21.267.000**

CONTRIBUYENTE

14/10/2025

20251206362

PAGADO

Este documento debe ser verificado por la entidad responsable de exigir su pago en la página web de la gobernación www.atlantico.gov.co en el link impuestos departamentales

GOBERNACIÓN

20251206362

ACTO Y/O HECHO GENERADOR: CONTRATOS Y CONVENIOS		
CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ MORENO S.A.S.		**CEDULA O NIT:** 900270022
FECHA LIQUIDACIÓN: 14/10/2025	**Nro DE LIQUIDACION:** 20250409648	**TOTAL:** $ 21.267.000

BANCO

20251206362

Nro DE ACTO Y/O HECHO GENERADOR: CONTRATOS Y CONVENIOS		
CONTRIBUYENTE: DOMINGUEZ MORENO S.A.S.		**CEDULA O NIT:** 900270022
FECHA LIQUIDACIÓN: 14/10/2025	**Nro DE LIQUIDACION:** 20250409648	**TOTAL:** $ 21.267.000

Comprobante Transacción

Razón Social:Alcaldía Distrital de Barranquilla

NIT:890102018-1

Estado:APROBADA

Motivo:00 - Aprobada

Franquicia:Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)

Fecha y Hora:2025-10-14 16:04:35

Banco:BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

Autorización / CUS:1851110824

Recibo:1705249169

Referencia Pago:20250092138

Moneda:COP

Valor Pagado:709000

Descripción:ESTAMPILLA ITSA

Cliente:Dominguez Moreno

Email:atencionalcliente.dm@gmail.com

IP Cliente:10.10.103.217

Si tiene alguna inquietud contáctenos al teléfono (57)(5)3399124 o vía email pagoselectronicos@barranquilla.gov.co

Datos Basicos del Recibo de Pago

No. Documento: 202500092138

Fecha Emision: 14/10/2025

Identificación: 900270022

Declarante: DOMINGUEZ MORENOS SAS

Vigencia: 2025

Periodo Liquidacion: 1

Impuesto: ESTAMPILLA ITSA

Acto: ESTAMPILLA ITSA

Base Gravable: $ 235.302.000

Fecha Pago: 14/10/2025

Monto Pagado: $ 709.000

Banco Recaudador: BANCO DE OCCIDENTE

No. de Soporte: MODIFICACIÓN N°1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP-001-2025, CONTRATO SECOP I 001 SLCNTR-15451259

Asociada Entidad: TRANSITO DEPARTAMENTAL

Estado: VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO

Proceso LP 01-2025

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Rubiela Domínguez Moreno identificada con cédula de ciudadanía No. 49.775.404 en mi condición de Representante Legal de Domínguez Moreno SAS identificada con NIT 900.270.022-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 04 dias del mes de noviembre de 2025

Rubiela Dominguez M.

RUBIELA DOMINGUEZ MORENO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900270022
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DOMINGUEZ MORENO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 59 # 64-257	TELÉFONO:	3705023
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA





NÚMERO PLANILLA:	**7986064391**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1822873625

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 698.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.822.500
		SUBTOTAL:	9	**$ 2.521.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 80.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 216.900
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 68.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 265.400
		SUBTOTAL:	9	**$ 630.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8901019949	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	9	$ 599.700
		SUBTOTAL:	9	**$ 599.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	9	$ 538.100
		SUBTOTAL:	9	**$ 538.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.289.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.289.400**

MEMORIA SEÑALIZACION VERTICAL




FECHA	UBICACIÓN		TIPO DE SEÑAL	INSTALACION	RETIRO	REGISTRO FOTOGRAFICO SEÑAL VERTICAL
	SOBRE	CON				
28/10/2025	MANATI		SP 25A	1		
29/10/2025	MANATI		SP 25	1		
29/10/2025	MANATI		SP 25	1		
29/10/2025	LURUACO		SP 25A	1		
29/10/2025	LURUACO		SP 25A	1		
28/10/2025	MANATI		SP 25	1		

Rubiela Dominguez M.

RUBIELA DOMINGUEZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

JUAN CARLOS REDONDO
SUPERVISOR

MEMORIA RESALTOS


FECHA	UBICACIÓN		TIPO DE SEÑAL	INSTALACION	RETIRO	REGISTRO FOTOGRAFICO SEÑAL VERTICAL
	SOBRE	CON				
28/10/2025	MANATI		RESALTOS PLASTICOS	5,4ml		
28/10/2025	MANATI		RESALTOS PLASTICOS	3,96		
29/10/2025	LURUACO		RESALTOS PLASTICOS	4,68		
29/10/2025	LURUACO		RESALTOS PLASTICOS	4,32		

Rubiela Dominguez M.

RUBIELA DOMINGUEZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

JUAN CARLOS REDONDO
SUPERVISOR

MEMORIA CAMBIO DE REFLECTIVOS EN SEÑALES A NIVEL




FECHA	UBICACIÓN		TIPO DE SEÑAL	INSTALACION	RETIRO	REGISTRO FOTOGRAFICO SEÑAL VERTICAL
	SOBRE	CON				
27/10/2025	BARANOA		CAMBIO STICKERS	1		
27/10/2025	USIACURI		CAMBIO STICKERS	1		
27/10/2025	USIACURI		CAMBIO STICKERS	1		
27/10/2025	PIOJO		CAMBIO STICKERS	1		
27/10/2025	VIA AL MAR- PIOJO		CAMBIO STICKERS	1		
27/10/2025	CUATRO BOCAS		CAMBIO STICKERS	1		

Rubiela Dominguez M.



RUBIELA DOMINGUEZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

JUAN CARLOS REDONDO
SUPERVISOR

MEMORIA REFLECTIVO DE ELEVADAS

FECHA	UBICACION SOBRE	UBICACION CON	TIPO DE SEÑAL	INSTALACION	RETIRO	REGISTRO FOTOGRAFICO SEÑAL VERTICAL
24/10/2025	SABANALARGA		BANDERA ELEVADA	1	1	
23/10/2025	JUAN DE ACOSTA		STICKERS PASAVIAS	1		
22/10/2025	JUAN DE ACOSTA		STICKERS PASAVIAS	1		
22/10/2025	REPELON		STICKERS PASAVIAS	1		
22/10/2025	REPELON		STICKERS PASAVIAS	1		

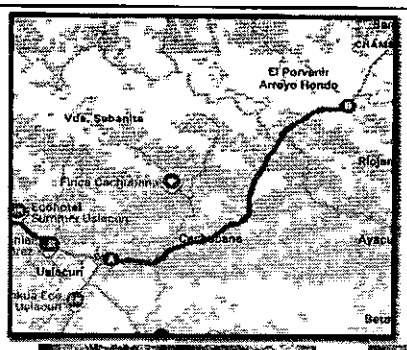
MEMORIA FOTOGRAFICA DE SEÑALES

FECHA	UBICACION		TIPO DE SEÑAL	INSTALACION	RETIRO	REGISTRO FOTOGRAFICO SEÑAL VERTICAL
	SOBRE	CON				
21/10/2025	SABANALARGA		STICKERS PASAVIAS	1		
21/10/2025	SABANALARGA		STICKERS PASAVIAS	1		
20/10/2025	SANTO TOMAS		STICKERS PASAVIAS	1		
20/10/2025	SANTO TOMAS		STICKERS PASAVIAS	1		


Rubiela Dominguez M.

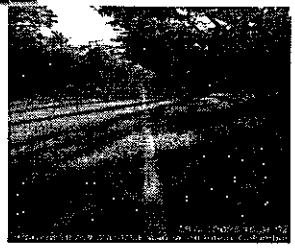


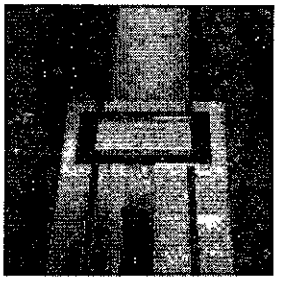
RUBIELA DOMINGUEZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

JUAN CARLOS REDONDO
SUPERVISOR



TRAMO 3- BARANOA- USIACURI			
7200 ML	8,400	PINTURA BASE SOLVENT	
PROYECTADO	EJECUTADO	FECHA	28/10/2025

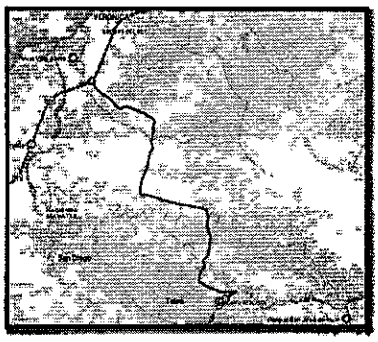



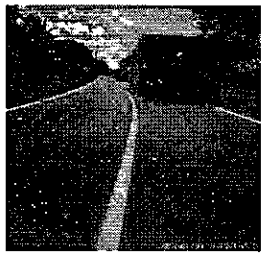
Rubiela Dominguez M.

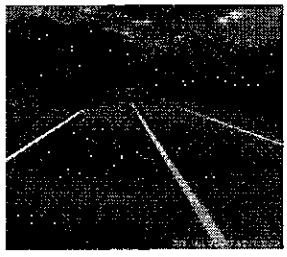
RUBIELA DOMINGUEZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA


JUAN CARLOS REDONDO
SUPERVISOR





TRAMO 5- PIOJO- VIA AL MAR			
39300	42400	PINTURA BASE SOLVENT	
PROYECTADO	EJECUTADO	FECHA	28/10/2025




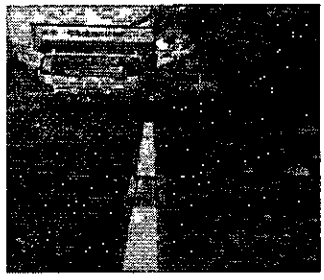












RUBIELA DOMINGUEZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

JUAN CARLOS REDONDO
SUPERVISOR

Dominguez Moreno S.A.S.	DOMINGUEZ MORENO S.A.S.	
Página 1 de 1	REMISION DE ENTREGA	
	VERSIÓN N° 01	FECHA DE APROBACIÓN: 21-07-25

Fecha: 27/10/2025
Cliente: Instituto De Transito Del Atlantico
Requerido por: Ing. Juan Carlos Redondo
Orden de Contrato N°: LP-01-2025
Ciudad: BARRANQUILLA
Numero OTI: No.351

REMISION No.

ITEM	DESCRIPCION	CANT
11	Retiro de Señales Sencillas y Dobles	285

Observaciones: Se hace entrega de elementos retirados al Instituto de Transito Depatamental del Atlantico.

QUIEN ENTREGA:

DOMINGUEZ MORENO S.A.S

QUIEN RECIBE:

CLIENTE:
Ing. Juan Carlos Redondo Maestre

IMPORTANTE:
Favor acusar por favor tan pronto quien cese en cargo de recibir y/o autorización debe hacerlo por escrito mediante el siguiente vía correo electrónico lo anterior con la finalidad de generar una respuesta EFICIENTE, EFICAZ Y EFECTIVA a su solicitud. Muchas Gracias.

TRÁNSITO
DEL ATLÁNTICO

APROBACIÓN DE GARANTÍAS EN CONTRATO ESTATAL

De conformidad con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Director del Instituto de Tránsito del Atlántico se permite aprobar las garantías aportadas por **DOMINGUEZ MORENO S.A.S,** identificado con **NIT. 900.270.022-4**, para el contrato de obra LP 01-2025.

DETALLES

CONTRATO	LP 01-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE JULIO DE 2025
OBJETO	REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN EN VÍAS Y MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO, DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES	**SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L ($708.968.311) IVA INCLUIDO.**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
No. PÓLIZA	85-44-101139608 ANEXO 2	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN	25 DE AGOSTO DE 2025.		
TOMADOR	**DOMINGUEZ MORENO S.A.S.**		
ASEGURADO	Instituto de Tránsito del Atlántico.		
BENEFICIARIO	Instituto de Tránsito del Atlántico.		

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIAS DESDE**	**VIGENCIAS HASTA**
Cumplimiento del contrato.	$ 70.896.831,10	31/07/2025	30/03/2026
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnización.	$ 141.793.662,20	31/07/2025	30/11/2028
Calidad y estabilidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	$ 212.690.493,30	31/07/2025	30/11/2030

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
No. PÓLIZA	85-40-101064425 ANEXO 3	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN	8 DE OCTUBRE DE 2025.		
TOMADOR	**DOMINGUEZ MORENO S.A.S.**		
ASEGURADO	Instituto de Tránsito del Atlántico.		
BENEFICIARIO	Instituto de Tránsito del Atlántico / Terceros afectados.		

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIAS DESDE**	**VIGENCIAS HASTA**
Predios Labores y Operaciones	$ 284.700.000	31/07/2025	30/11/2025

En constancia de lo anterior, se suscribe en la ciudad de Barranquilla a los ocho (8) días del mes de octubre de 2025.

CARLOS MARIO GRANADOS BUITRAGO
DIRECTOR GENERAL

Proyectó: Pedro Acosta – Contratista.
Revisó: Cynthia Mercado Gámez – Profesional Especializado área de contratación.

Dominguez Moreno S.A.S

Carrera 59 No. 64 - 257 - Telefax: 3705023
E-mail: atencionalcliente.DM@gmail.com

Nit. 900.270.022-4

011-ITA- 2025

Barranquilla, 04 de noviembre de 2025

Señores:
INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO - ITA
Atn: Ing. **Juan Carlos Redondo Maestre**
Profesional Universitario Grado I
Supervisor

Referencia: REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACION EN VIAS Y MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Asunto: **ENTREGA DOCUMENTO ACTA 4**

Cordial Saludo

Por medio de la presente se hace entrega de documentos Acta Final

ACTA FINAL
PORCENTAJE DE AVANCE ACTA NO. 4

1. FACTURA NO. 21
2. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL O PARAFISCALES
3. INFORME DE ACTIVIDADES
4. APROBACION DE POLIZAS
5. ACTA DE SUPERVISOR

Atentamente,

Rubiela Dominguez M.

Rubiela Domínguez
Gerente General
