La Estrella, 3 de febrero 2026

Señores

MUNICIPIO DE PEREIRA

Secretaría de Infraestructura

Dra. Diana Yaneth Osorio Bernal

Secretaria de Infraestructura

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo contractual – Contrato de Compraventa No. 3995-2025

En atención al Contrato No. 3995 de 2025, cuyo objeto corresponde a ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALES NUEVOS PARA LA OPERACIÓN DEL DISTRITO DE PARQUES Y EQUIPOS PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LOS DISTRITOS DE MAQUINARIA PERMANENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, de la manera más atenta y cordial nos permitimos solicitar la prórroga del plazo de ejecución hasta el día once (11) de mayo de 2026, de conformidad con los siguientes hechos:

La presente solicitud se fundamenta en circunstancias externas, imprevisibles y ajenas a la voluntad del contratista, debidamente soportadas en la comunicación remitida por el proveedor logístico GEODIS Colombia, fechado el 03 de febrero de 2026, en la cual se informa la modificación del ETD del proceso identificado con referencia 22409-HAMS26575533, derivado de afectaciones en la infraestructura ferroviaria en Hamburgo, Alemania, tales como el descarrilamiento de un tren, fallas en la caja de señales del puerto de Hamburgo y daños en equipos operativos, situaciones que han generado la suspensión del proceso de importación y retrasos en la llegada de los equipos necesarios para la ejecución contractual.

Dichos eventos constituyen hechos no imputables al contratista, configurándose como circunstancias que alteran el normal desarrollo del cronograma contractual. En concordancia con lo anterior, y conforme al cronograma actualizado del proyecto, se evidencia la necesidad técnica y operativa de extender el plazo contractual hasta el 11 de mayo de 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contratado.

En ese sentido, solicitamos respetuosamente se evalúe y apruebe la prórroga requerida, manteniendo las demás condiciones contractuales vigentes y sin modificación alguna, salvo en lo referente al plazo de ejecución.

Adjuntamos como soporte la comunicación del proveedor, el informe y el cronograma actualizado del proyecto.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios y aprobación.

Cordialmente,

MARIA DORIS MESA BETANCUR

Representante Legal

ACCESORIOS Y SISTEMAS SA

ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

800.042.522–5

INFORME PERIÓDICO
VEHÍCULOS ESPECIALES
25VM006-10

ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

Coordinación Gestión Proyectos.

La Estrella (ANT) - Colombia: Cra 50 No. 80 Sur 80 Tel.: (574) 448 25 99 Fax: 279 38 89

ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

800.042.522–5


INFORME PERIÓDICO DE PROYECTO			
Ingeniero	Jhonatan Cordoba		
Proyecto	Canasta	**Lote**	25VM006
Proyecto	Chipeadora	**Lote**	25VM007
Proyecto	Podador	**Lote**	25VM008
Proyecto	Cisterna	**Lote**	25VM009
Proyecto	Planchon	**Lote**	25VM010
Plazo de entrega	150 días	**Fecha Corte del Informe**	03/02/2026

- **ENTREGABLE 3 – AVANCE DEL PROYECTO GENERAL**

% Avance planeado	***55%***	**% Avance real del vehículo**	***40,48 %***

GRAFICO AVANCE GENERAL Y POR PROYECTO



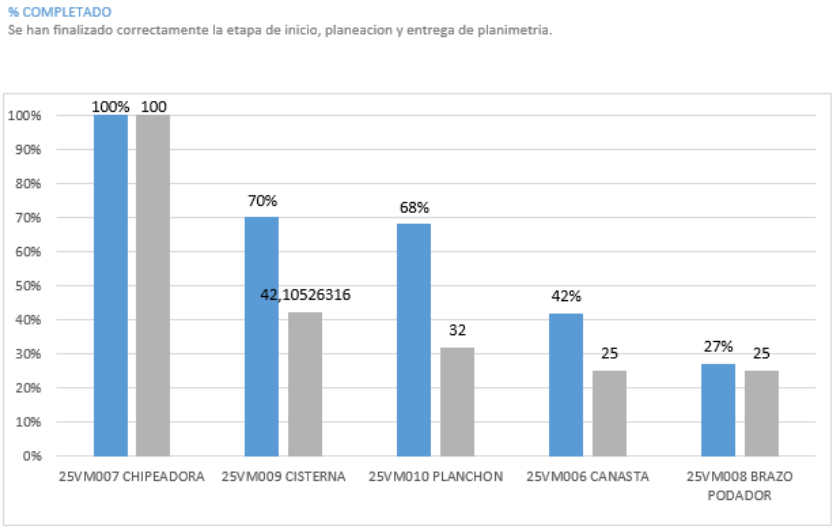

La Estrella (ANT) - Colombia: Cra 50 No. 80 Sur 80 Tel.: (574) 448 25 99 Fax: 279 38 89

- **SEGUIMIENTO Y CONTROL - HITOS Y TAREAS**

25VM006 Canasta: De acuerdo con el cronograma establecido, la fecha de entrega estimada era el 28 de Febrero de 2026. Sin embargo, a pesar de haber realizado oportunamente todas las gestiones correspondientes con nuestro proveedor (incluyendo órdenes de compra, pagos y coordinaciones logística), este se encontraba de vacaciones de verano en Europa, lo que ocasionó un retraso en el proceso. Como medida correctiva, trabajaremos con el proveedor con el fin de disminuir los tiempos de ejecución y adelantar al máximo la entrega. Informado en su momento que la fecha de entrega sería la primera semana de enero de 2026, y se esperaba que la importación finalice durante la primera semana de febrero de 2026, sin embargo recibimos información que esta no se finalizó en la primera semana de enero sino en la primera semana de febrero lo que estaría llegando a la empresa el 16 de Marzo de 2026.

También trabajaremos en pro del proyecto de tal manera que permita disminuir los tiempos de ensamble sobre el chasis y así no impactar desfavorablemente en tiempo la entrega.

25VM007 chipeadora: Finaliza y lista para ser entregada en Pereira

25VM008 Brazo podador: De acuerdo con el cronograma establecido, la fecha de entrega estimada era el 26 de febrero de 2026. Como se informó desde el inicio de la ejecución del proyecto en la reunión de preconstrucion en compañía de nuestra área comercial, este equipo es importado y su tiempo de fabricación. A la fecha viene con una ejecución sin mayor novedades

25VM009 cisterna: Actualmente, el proveedor del chasis aún no ha despachado el vehículo, a pesar de que, por nuestra parte, se realizaron oportunamente todas las gestiones necesarias, incluyendo órdenes de compra y pagos. El proveedor nos ha informado que, al momento, no cuentan con unidades disponibles en stock y que están a la espera de la llegada de un buque con los vehículos para poder programar el despacho.

Mientras tanto, los trabajos correspondientes a la fabricación del tanque y demás componentes de la cisterna continúan ejecutándose con normalidad. Sin embargo, la no disponibilidad del chasis impacta directamente en la fecha de entrega final del proyecto.


Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, y trabajamos de forma activa con el proveedor para asegurar que el despacho se realice lo antes posible. Nuestro objetivo sigue siendo cumplir con la entrega máxima del **16 de marzo 2026.**

25VM010 Planchón: El planchón presenta una desviación grande el cronograma vs el real, sin embargo trabajamos con el objetivo en desatascar el proyecto Nuestro objetivo sigue siendo cumplir con la entrega máxima del **16 de marzo 2026.**

Es importante resaltar que nuestro proveedor se retrasó en la entrega y envió del planchón.

La Estrella (ANT) - Colombia: Cra 50 No. 80 Sur 80 Tel.: (574) 448 25 99 Fax: 279 38 89

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

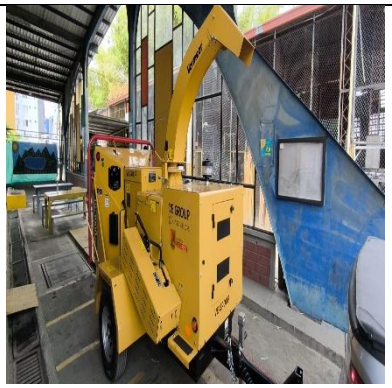		
FOTOGRAFIA 1. Entrega en Sitio 25VM007.Chipeadora	**FOTOGRAFIA 2. Entrega en Sitio 25VM007.Chipeadora.**	**FOTOGRAFIA 3. Capacitación 25VM007.Chipeadora.**
		
FOTOGRAFIA 4. Fabricación tanque 25VM009 Cisterna	**FOTOGRAFIA 5. Fabricación tanque 25VM009 Cisterna**	**FOTOGRAFIA 6. Fabricación tanque 25VM009 Cisterna**
		
FOTOGRAFIA 7. Descargue importación planchón **25VM010 planchón**	**FOTOGRAFIA 8. Descargue importación planchón** **25VM010 planchón**	**FOTOGRAFIA 9. Descargue importación planchón** **25VM010 planchón**

La Estrella (ANT) - Colombia: Cra 50 No. 80 Sur 80 Tel.: (574) 448 25 99 Fax: 279 38 89

ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.

800.042.522–5

NOVEDADES

- A la fecha, el proyecto presenta un retraso del 14,52% respecto al cronograma planeado; Adicionalmente, como medida de contingencia, se incrementó la mano de obra asignada, contando actualmente con personal dedicado de manera exclusiva al proyecto, Con el objetivo de realizar la entrega del planchón y la cisterna para la fecha del contrato 16 de marzo 2026.

CONCLUSIÓN


De acuerdo con el análisis del estado actual del proyecto, se evidencia un retraso acumulado del 14,52% frente al cronograma inicialmente aprobado, el cual obedece principalmente a factores externos asociados a proveedores, en especial a la disponibilidad y tiempos de importación de equipos y chasis, situaciones que han sido gestionadas oportunamente por nuestra parte mediante órdenes de compra, pagos anticipados y coordinaciones logísticas.

Es importante resaltar que, como acción de mitigación, se incrementó la mano de obra asignada al proyecto, destinando personal de forma exclusiva, con el fin de recuperar tiempos y minimizar el impacto en la fecha contractual, manteniendo como objetivo la entrega del planchón y la cisterna para el 16 de marzo de 2026.

Elaborado por: Ing. Jhonatan Cordoba
Responsable: Jonny López
ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.
Fecha de elaboración: 03 de febrero de 2026

La Estrella (ANT) - Colombia: Cra 50 No. 80 Sur 80 Tel.: (574) 448 25 99 Fax: 279 38 89

Id		Nivel de esquema	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
1		1		**PEREIRA**	**281,38 días**	**lun 1/09/25**	**sáb 9/05/26**		**13%**
2	✓	2		**25VM007 CHIPEADORA**	**33 días**	**lun 1/09/25**	**mar 30/09/25**		**100%**
23		2		**25VM008 CISTERNA**	**153,75 días**	**vie 31/10/25**	**lun 16/03/26**		**4%**
24		3		**PLANEACION**	**21 días**	**vie 31/10/25**	**mar 18/11/25**		**23%**
25	✓	4		DISEÑO 2D	5 días	vie 31/10/25	mar 4/11/25		100%
26		4		DISEÑO 3D	15 días	mar 4/11/25	lun 17/11/25	25	0%
27		4		SOLICITUD DE BOMBA	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	26	0%
28		4		SOLICITUDES ANTICIPADAS	1 día	mar 18/11/25	mar 18/11/25	26	0%
29		3		**ENTREGA PLANIMETRIA**	**90,75 días**	**dom 23/11/25**	**mié 11/02/26**		**0%**
30		4		PLANOS ELECTRICO	1 día	dom 23/11/25	lun 24/11/25	28FC+5 días	0%
31		4		PLANOS DE CORTE Y DOBLES	1 día	dom 23/11/25	lun 24/11/25	28FC+5 días	0%
32		4		PLANOS DE ENSAMBLE	1 día	dom 23/11/25	lun 24/11/25	28FC+5 días	0%
33	⚠	4		**ENTREGA DE CHASIS CHEVROLET (Proveedor sin unidades disponibles, vehiculo 100% pagado a la espera de entrega, aun pendiente de**	26,75 días	lun 19/01/26	mié 11/02/26		0%
34		3		**EJECUCION**	**20 días**	**mié 11/02/26**	**dom 1/03/26**		**0%**
35		4		**CARROCERIA**	**8 días**	**mié 11/02/26**	**jue 19/02/26**		**0%**
36		5		INGRESO DE MATERIAL	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26	28FC+10 días;33	0%
37		5		CORTE Y DOBLEZ CARROCERIA	2 días	jue 12/02/26	vie 13/02/26	31;36	0%
38		5		FABRICACION DE CARROCERIA	5 días	vie 13/02/26	mié 18/02/26	37	0%
39		5		PRUEBAS CARROCERIA	1 día	mié 18/02/26	jue 19/02/26	38	0%
40		4		**PINTURA CARROCERIA**	**10 días**	**jue 19/02/26**	**vie 27/02/26**		**0%**
41		5		PREPARACION DE SUPERFICIE	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	39	0%
42		5		MASILLADO	1 día	vie 20/02/26	sáb 21/02/26	41	0%
43		5		PINTURA BASE	3 días	sáb 21/02/26	mar 24/02/26	42	0%
44		5		PINTURA ACABADO	3 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	43	0%
45		5		PRUEBA CALIDAD DE PINTURA	1 día	vie 27/02/26	vie 27/02/26	44	0%
46		4		**TANQUE**	**20 días**	**jue 12/02/26**	**dom 1/03/26**		**0%**
47		5		CORTE Y DOBLEZ TANQUE	10 días	jue 12/02/26	vie 20/02/26	31;36	0%
48		5		FABRICACION DE TANQUE	9 días	vie 20/02/26	sáb 28/02/26	47	0%
49		5		PRUEBAS TANQUE	1 día	sáb 28/02/26	dom 1/03/26	48	0%
50		3		**INTEGRACION EQUIPO BOMBA, CARROCERIA Y ELECTRICO**	**25 días**	**vie 20/02/26**	**dom 15/03/26**		**0%**
51		4		**SISTEMA HIDRAULICO**	**12 días**	**dom 1/03/26**	**jue 12/03/26**	**49**	**0%**
52		5		INSTALACION DE CARROCERIA EN CHASIS	2 días	dom 1/03/26	mar 3/03/26		0%
53		5		INSTALACION DE TANQUE DE AGUA	3 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	49;52	0%
54		5		INSTALACION DE VALVULAS	3 días	vie 6/03/26	dom 8/03/26	53	0%
55		5		INSTALACION DE BOMBA	3 días	dom 8/03/26	mié 11/03/26	54	0%
56		5		PRUEBAS SISTEMA HIDRAULICO	1 día	mié 11/03/26	jue 12/03/26	55	0%
57		4		**SISTEMA ELECTRICO**	**21 días**	**vie 20/02/26**	**mié 11/03/26**		**0%**
58		5		INSTALACION DE RAMAL ELECTRICO BOMBA	3 días	dom 8/03/26	mié 11/03/26	30;36;54	0%
59		5		INSTALACION DE PDM	4 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	30FC+10 días;36FC+10 días	0%
60		5		INSTALACION DE RAMAL ELECTRICO	2 días	mar 24/02/26	jue 26/02/26	59	0%
61		5		INSTALACION DE LUCES	5 días	jue 26/02/26	lun 2/03/26	60	0%
62		4		**OTROS**	**3 días**	**jue 12/03/26**	**dom 15/03/26**		**0%**
63		3		**PRUEBAS EQUIPO**	**2 días**	**jue 12/03/26**	**sáb 14/03/26**		**0%**
66		4		PRUEBAS ELECTRICAS	1 día	jue 12/03/26	vie 13/03/26	56	0%
67		4		PRUEBAS RENDIMIENTO BOMBA	1 día	vie 13/03/26	sáb 14/03/26	66	0%
68		3		**CIERRE**	**2 días**	**dom 15/03/26**	**lun 16/03/26**		**0%**
69		4		ENTREGA INTERNA	1 día	dom 15/03/26	dom 15/03/26	64	0%
70		4		MOVILIZACION	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	69	0%
71		4		ENTREGA CLIENTE	0 días	dom 15/03/26	dom 15/03/26	69	0%
72		4		CAPACITACION	0 días	dom 15/03/26	dom 15/03/26	69	0%
73		4		FACTURA FINAL	0 días	dom 15/03/26	dom 15/03/26	69	0%
74		2		**25VM010 PLANCHON**	**150,5 días**	**mié 29/10/25**	**mié 11/03/26**		**7%**
75		3		**PLANEACION**	**105,5 días**	**mié 29/10/25**	**vie 30/01/26**		**14%**
76	✓	4		DISEÑO 2D	5 días	mié 29/10/25	dom 2/11/25		100%
77		4		DISEÑO 3D	15 días	dom 2/11/25	sáb 15/11/25	76	0%
78		4		SOLICITUD DE PLANCHON	1 día	dom 16/11/25	dom 16/11/25	77	0%
79		4		SOLICITUDES ANTICIPADAS	1 día	dom 16/11/25	dom 16/11/25	77	0%
80	⚠	4		**ENTREGA DE PLANCHON (fabricacion en estados unidos entrega estimada para el 27/12/2025, mas tramito en importacion)**	13,25 días	lun 19/01/26	vie 30/01/26		0%
81		3		**ENTREGA PLANIMETRIA**	**80,5 días**	**vie 21/11/25**	**sáb 31/01/26**		**0%**
82		4		PLANOS ELECTRICO	1 día	sáb 31/01/26	sáb 31/01/26	79FC+5 días;80	0%
83		4		PLANOS DE ENSAMBLE	1 día	vie 21/11/25	sáb 22/11/25	79FC+5 días	0%
84		3		**EJECUCION**	**5 días**	**mar 17/02/26**	**dom 22/02/26**		**0%**
85		4		**CARROCERIA**	**5 días**	**mar 17/02/26**	**dom 22/02/26**		**0%**
86		5		INGRESO DE PLANCHON	0 días	mar 17/02/26	mar 17/02/26	80FC+20 días	0%
87		5		MODIFICACION DE CHASIS	5 días	mar 17/02/26	dom 22/02/26	86	0%
88		3		**INTEGRACION EQUIPO BOMBA, CARROCERIA Y ELECTRICO**	**17 días**	**dom 22/02/26**	**lun 9/03/26**		**0%**
89		4		**SISTEMA HIDRAULICO**	**17 días**	**dom 22/02/26**	**lun 9/03/26**		**0%**
90		5		INSTALACION DE PLANCHON EN CHASIS	5 días	dom 22/02/26	jue 26/02/26	87	0%
91		5		INSTALACION DE TANQUE DE ACEITE	2 días	jue 26/02/26	sáb 28/02/26	90	0%
92		5		INSTALACION DE VALVULAS	4 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	91	0%
93		5		INSTALACION DE BOMBA	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	92	0%
94		5		PRUEBAS SISTEMA HIDRAULICO	3 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	93	0%
95		4		**SISTEMA ELECTRICO**	**9 días**	**jue 26/02/26**	**vie 6/03/26**		**0%**
96		5		INSTALACION DE RAMAL ELECTRICO BOMBA	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	82;86;92	0%
97		5		INSTALACION DE PDM	4 días	jue 26/02/26	lun 2/03/26	82FC+10 días;86FC+10 días	0%
98		5		INSTALACION DE RAMAL ELECTRICO	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	97	0%
99		5		INSTALACION DE LUCES	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	98	0%
100		3		**PRUEBAS EQUIPO**	**4 días**	**vie 6/03/26**	**mar 10/03/26**		**0%**
101		4		PRUEBAS ELECTRICAS	1 día	vie 6/03/26	sáb 7/03/26	99	0%
102		4		PRUEBAS RENDIMIENTO PLANCHON	1 día	lun 9/03/26	mar 10/03/26	94	0%
103		3		**CIERRE**	**2 días**	**mar 10/03/26**	**mié 11/03/26**		**0%**
104		4		ENTREGA INTERNA	1 día	mar 10/03/26	mié 11/03/26	102	0%
105		4		MOVILIZACION	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	104	0%
106		4		ENTREGA CLIENTE	0 días	mié 11/03/26	mié 11/03/26	104	0%
107		4		CAPACITACION	0 días	mié 11/03/26	mié 11/03/26	104	0%
108		4		FACTURA FINAL	0 días	mié 11/03/26	mié 11/03/26	104	0%
109		2		**25VM006 CANASTA**	**262,38 días**	**lun 1/09/25**	**mié 22/04/26**		**0%**
110		3		**PLANEACION**	**76,13 días**	**lun 1/09/25**	**vie 7/11/25**		**0%**
111	⚠	4		DISEÑO 2D	5 días	lun 20/10/25	vie 24/10/25		0%
112		4		DISEÑO 3D	15 días	vie 24/10/25	jue 6/11/25	111	0%
113		4		SOLICITUD DE CANASTA	1 día	vie 7/11/25	vie 7/11/25	112	0%
114		4		SOLICITUDES ANTICIPADAS	1 día	lun 1/09/25	mar 2/09/25		0%
115		3		**ENTREGA PLANIMETRIA**	**1 día**	**mié 12/11/25**	**jue 13/11/25**		**0%**
116		4		PLANOS ELECTRICO	1 día	mié 12/11/25	jue 13/11/25	113FC+5 días	0%
117		4		PLANOS DE ENSAMBLE	1 día	mié 12/11/25	jue 13/11/25	113FC+5 días	0%
118		3		**EJECUCION**	**64,5 días**	**vie 23/01/26**	**sáb 21/03/26**		**0%**
119		4		**CARROCERIA**	**64,5 días**	**vie 23/01/26**	**sáb 21/03/26**		**0%**
120	⚠	5		**INGRESO DE CANASTA (Fabricacion en Italia fecha estimada 21/12/2025 sujeta entrega por el proveedor, mas tramito de importacion)**	59,5 días	vie 23/01/26	lun 16/03/26	114FC+90 días	0%
121		5		MODIFICACION DE CHASIS	5 días	mar 17/03/26	sáb 21/03/26	120	0%
122		3		**INTEGRACION EQUIPO BOMBA, CARROCERIA Y ELECTRICO**	**32 días**	**sáb 21/03/26**	**sáb 18/04/26**		**0%**
123		4		**SISTEMA HIDRAULICO**	**32 días**	**sáb 21/03/26**	**sáb 18/04/26**		**0%**
124		5		INSTALACION DE CANASTA EN CHASIS	15 días	sáb 21/03/26	vie 3/04/26	121	0%
125		5		INSTALACION DE TANQUE DE ACEITE	3 días	vie 3/04/26	lun 6/04/26	124	0%
126		5		INSTALACION DE VALVULAS	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	125	0%
127		5		INSTALACION DE BOMBA	5 días	vie 10/04/26	mié 15/04/26	126	0%
128		5		PRUEBAS SISTEMA HIDRAULICO	4 días	mié 15/04/26	sáb 18/04/26	127	0%
129		4		**SISTEMA ELECTRICO**	**21 días**	**mié 25/03/26**	**lun 13/04/26**		**0%**
130		5		INSTALACION DE RAMAL ELECTRICO BOMBA	3 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26	116;120;126	0%
131		5		INSTALACION DE PDM	3 días	mié 25/03/26	sáb 28/03/26	116FC+10 días;120FC+10 días	0%
132		5		INSTALACION DE RAMAL ELECTRICO	3 días	sáb 28/03/26	mar 31/03/26	131	0%
133		5		INSTALACION DE LUCES	5 días	mar 31/03/26	sáb 4/04/26	132	0%
134		3		**PRUEBAS EQUIPO**	**18 días**	**sáb 4/04/26**	**lun 20/04/26**		**0%**
135		4		PRUEBAS ELECTRICAS	2 días	sáb 4/04/26	lun 6/04/26	133	0%
136		4		PRUEBAS RENDIMIENTO PLANCHON	2 días	sáb 18/04/26	lun 20/04/26	128	0%
137		3		**CIERRE**	**2 días**	**lun 20/04/26**	**mié 22/04/26**		**0%**
138		4		ENTREGA INTERNA	1 día	lun 20/04/26	mar 21/04/26	136	0%
139		4		MOVILIZACION	1 día	mar 21/04/26	mié 22/04/26	138	0%
140		4		ENTREGA CLIENTE	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	138	0%
141		4		CAPACITACION	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	138	0%
142		4		FACTURA FINAL	0 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26	138	0%
143		2		**25VM008 BRAZO PODADOR**	**281,38 días**	**lun 1/09/25**	**sáb 9/05/26**		**15%**
144	✓	3		**PLANEACION**	**54,75 días**	**lun 1/09/25**	**dom 19/10/25**		**100%**
145	✓	4		DISEÑO 2D	5 días	mié 1/10/25	dom 5/10/25		100%
146	✓	4		DISEÑO 3D	15 días	dom 5/10/25	sáb 18/10/25	145	100%
147	✓	4		SOLICITUD DE CANASTA	1 día	dom 19/10/25	dom 19/10/25	146	100%
148	✓	4		SOLICITUDES ANTICIPADAS	1 día	lun 1/09/25	mar 2/09/25		100%
149	✓	3		**ENTREGA PLANIMETRIA**	**1 día**	**vie 24/10/25**	**sáb 25/10/25**		**100%**
150	✓	4		PLANOS ELECTRICO	1 día	vie 24/10/25	sáb 25/10/25	147FC+5 días	100%
151	✓	4		PLANOS DE ENSAMBLE	1 día	vie 24/10/25	sáb 25/10/25	147FC+5 días	100%
152		3		**EJECUCION**	**70,25 días**	**vie 30/01/26**	**jue 2/04/26**		**0%**
153		4		**CARROCERIA**	**70,25 días**	**vie 30/01/26**	**jue 2/04/26**		**0%**
154	⚠	5		**INGRESO DE BRAZO (sujeto a entrega proveedor**	60,25 días	vie 30/01/26	mié 24/03/26	148FC+150 días	0%
155		5		MODIFICACION DE CHASIS	10 días	mié 25/03/26	jue 2/04/26	154	0%
156		3		**INTEGRACION EQUIPO BOMBA, CARROCERIA Y ELECTRICO**	**37 días**	**jue 2/04/26**	**mar 5/05/26**		**0%**
157		4		**SISTEMA HIDRAULICO**	**37 días**	**jue 2/04/26**	**mar 5/05/26**		**0%**
158		5		INSTALACION DE BRAZO EN CHASIS	15 días	jue 2/04/26	jue 16/04/26	155	0%
159		5		INSTALACION DE TANQUE DE ACEITE	5 días	jue 16/04/26	lun 20/04/26	158	0%
160		5		INSTALACION DE VALVULAS	10 días	lun 20/04/26	mié 29/04/26	159	0%
161		5		INSTALACION DE BOMBA	5 días	mié 29/04/26	dom 3/05/26	160	0%
162		5		PRUEBAS SISTEMA HIDRAULICO	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26	161	0%
163		4		**SISTEMA ELECTRICO**	**35 días**	**jue 2/04/26**	**dom 3/05/26**		**0%**
164		5		INSTALACION DE RAMAL ELECTRICO BOMBA	5 días	mié 29/04/26	dom 3/05/26	150;154;160	0%
165		5		INSTALACION DE PDM	5 días	jue 2/04/26	mar 7/04/26	150FC+10 días;154FC+10 días	0%
166		5		INSTALACION DE RAMAL ELECTRICO	5 días	mar 7/04/26	sáb 11/04/26	165	0%
167		5		INSTALACION DE LUCES	5 días	sáb 11/04/26	jue 16/04/26	166	0%
168		3		**PRUEBAS EQUIPO**	**24 días**	**jue 16/04/26**	**jue 7/05/26**		**0%**
169		4		PRUEBAS ELECTRICAS	2 días	jue 16/04/26	vie 17/04/26	167	0%
170		4		PRUEBAS RENDIMIENTO PLANCHON	2 días	mar 5/05/26	jue 7/05/26	162	0%
171		3		**CIERRE**	**2 días**	**jue 7/05/26**	**sáb 9/05/26**		**0%**
172		4		ENTREGA INTERNA	1 día	jue 7/05/26	vie 8/05/26	170	0%
173		4		MOVILIZACION	1 día	vie 8/05/26	sáb 9/05/26	172	0%
174		4		ENTREGA CLIENTE	0 días	vie 8/05/26	vie 8/05/26	172	0%
175		4		CAPACITACION	0 días	vie 8/05/26	vie 8/05/26	172	0%
176		4		FACTURA FINAL	0 días	vie 8/05/26	vie 8/05/26	172	0%

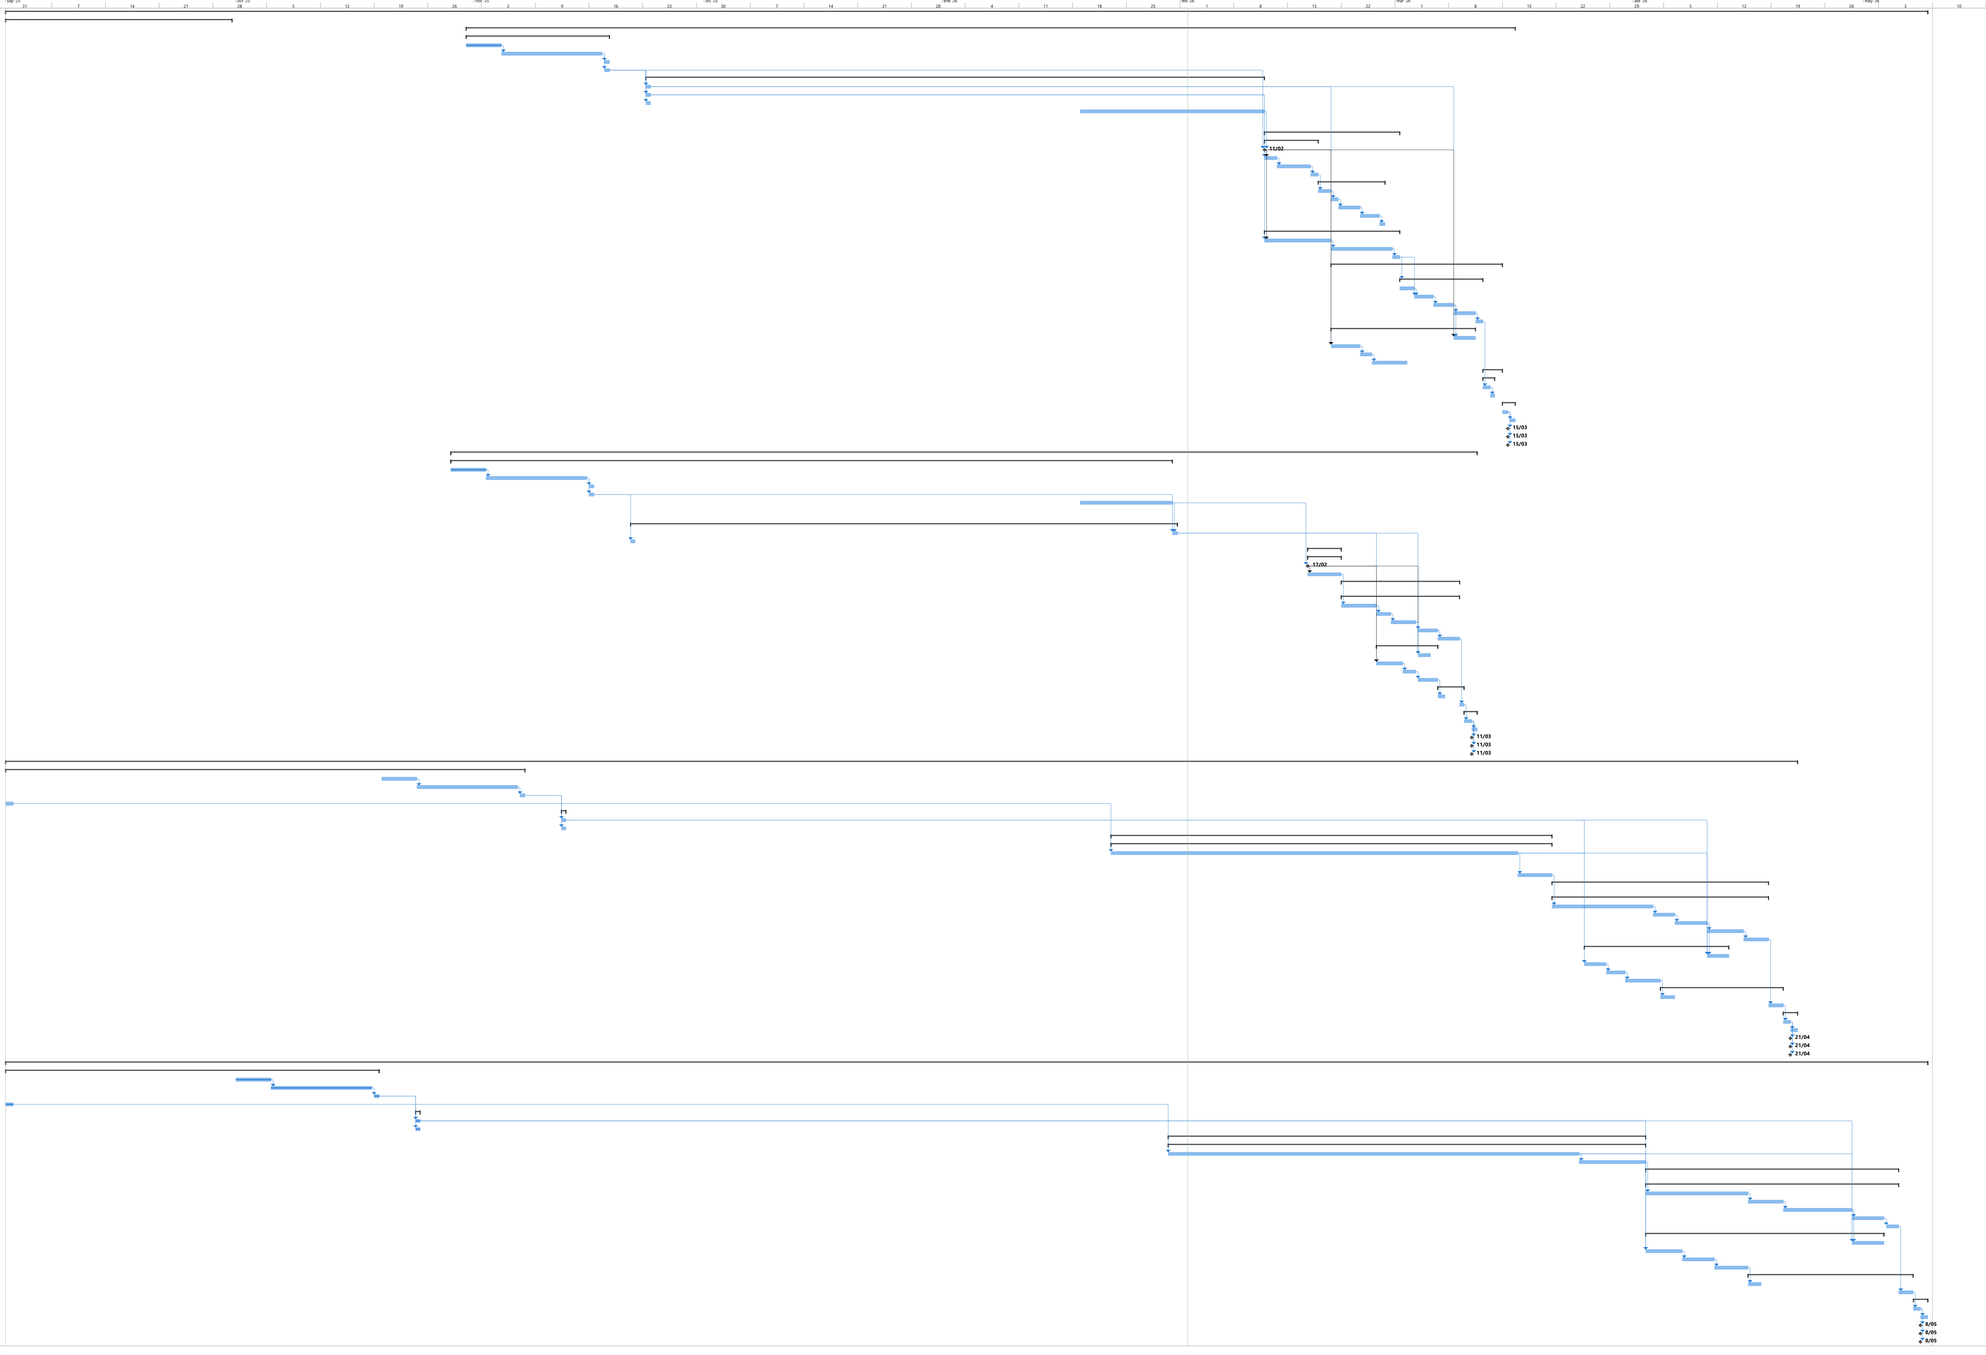

Proyecto: 25VM002 Cronograma
Fecha: lun 2/02/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Bogotá D.C, 03 de febrero del 2026

Señores
ACCESORIOS Y SISTEMAS SA / ACCEQUIP

Apreciados Señores,

Nos permitimos informar de acuerdo con lo compartido previamente para el proceso con referencia (**22409-HAMS26575533)** que el mismo presenta ajuste en su ETD inicial esto a consecuencia por temas de infraestructura por descarrilamiento del tren que haría el traslado al puerto como sigue:

quote
Unfortunately, there is bad news from Hamburg.
Yesterday, there were various problems and disruptions in the infrastructure.

- Derailment of a train in front of Eurokombi, resulting in repair work expected to last until February 11
- Signal box failure in Hamburg, causing delays and the suspension of shunting operations in the Hamburg West port area
- The dispatch control for incoming traffic was resumed as a consequence
- Damage to a crane at Eurokombi due to a foreign object entering the power line

At present, it is still unclear when the train will arrive at your container in Mannheim, as the import process in Hamburg has come to a standstill.
As soon as we have new information, we will pass it on to you.
Please note that we cannot assume any liability for damages or consequential damages.
unquote

Cordialmente,

David Bolaños
Jefe Operaciones
Geodis Colombia
