MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2** **UH-60 ˝SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ˝**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (09 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2026)** FECHA DEL INFORME: **10 DE MARZO DEL 2026**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **169-CENACAVIACIÓN-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: 15 SEPTIEMBRE DE 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1 (Prorroga No. 1)	21/NOV/2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 17 de diciembre de 2025. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese los REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto. CLAUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 169-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no haya sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio sigue vigentes y son de obligatorio cumplimiento. En constancia se expide el presente contrato modificatorio en Bogotá D.C., el cual rige una vez quede público en la plataforma SECOP II.
MODIFICATORIO No. 2 (Prorroga No. 2)	19/DIC-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 02 de marzo de 2026.
MODIFICATORIO No. 3 (Prorroga No. 3)	02/MAR-2026	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 29 de mayo de 2026

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM LOTE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CONDICION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO EN DOLARES	PRECIO TOTAL EN DOLARES
5	78181802	CIS PROCESOR	CP-2036/A	146310-7	EXCHANGE /REPARADO	1	UN	USD30.000,00	USD30.000,00
21	78181802	TRANSMISSION,MECHAN	70351-08001-049	70351-08001-050	REPARACION	1	UN	USD59.000,00	USD59.000,00
23	78181802	TRANSMISSION,MECHAN lima	70358-06600-046	N/A	REPARACION	5	UN	USD43.000,00	USD215.000,00
24	78181802	TRANSMISSION,MECHAN india	70358-06600-048	N/A	REPARACION	1	UN	USD43.000,00	USD43.000,00
26	78181802	FAN,VANEAXIAL-P/N 52E15-1- P/N 7000-5594	70361-03005-107	7000-5594	REPARACION	2	UN	USD9.500,00	USD19.000,00
31	78181802	CHAMBER,COMBUSTION,AIRCRAFT GAS TURBINE	6064T54G08	N/A	EXCHANGE OVERHAUL	1	UN	USD55.000,00	USD55.000,00
32	78181802	NOZZLE,TURBINE,AIRC	6071T04G02	N/A	EXCHANGE REPARACION	1	UN	USD39.000,00	USD39.000,00
34	78181802	VALVE ASSEMBLY,ANTI-ICING,JET ENGINE	5066T38G08	3224796-7-5064T56P07-5066T38G04-5066T38G07-59364-3224796-6-6064T56P04-6064T56P07-6064T56P08-6064T56P09	REPARACION	2	UN	USD19.000,00	USD38.000,00
36	78181802	VALVE ASSY,AUXILIAR	52900-2	70651-03300-102	REPARACION	1	UN	USD11.000,00	USD11.000,00
TOTAL ADJUDICAR									**USD509.000,00**

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

- **N/A**

2. **VALOR DEL CONTRATO:** El valor de contrato es por la suma de QUINIENTOS NUEVE MIL DOLARES (USD509.000,00) los cuales para efectos de imputación presupuestal son proyectados conforme a la TRM establecida por el MDN que equivale a $4.700 COP para la presente vigencia 2025, de acuerdo a la circular RS20250109002013 del 09 de enero 2025 equivale a de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.392.300.000,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN USD	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL USD
PRINCIPAL	509.000,00	N/A	509.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	509.000,00	N/A	509.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DOLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	509.000,00						509.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		509.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		509.000,00						509.000,00

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	2.392.300.000,00						2.392.300.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		2.392.300.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		2.392.300.000,00						2.392.300.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2025	19225	12-02-2025	122925	15-01-2026	2.392.300.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**2.392.300.000,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 29 de mayo de 2026.

Primera entrega de acuerdo a acta de recibo a satisfacción No 01730106 del 20 de noviembre 2025
RUBRO: 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO	CANTIDAD	VALOR USD
1	CIS PROCESSOR	CP-2036/A	0624	01	$30.000,00
2	CHAMBER COMBUSTION AIRCRAFT GAS TURBINE	6064T54G08	GGM928A9	01	$55.000,00
3	STAGE 1 NOZZEL ASSEMBLY	6071T04G02	MDK20MWD	01	$39.000,00
	TOTAL FACTURA No 1418 fecha 11 de noviembre de 2025				$124.000,00

SEGUNDA ENTREGA
FACTURA No 1429 de fecha 04 diciembre de 2025
ACTA DE RECIBO No 00163991 de fecha 16 de diciembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	VALVE ASSEBLY ANTIICEING, JET ENGINE	4046T28G14	COMH10019	EXC/ REP	1	$ 19.000,00
2	VALVE ASSY AUXILIAR	70651-033000-102	B363-00648	EXC/ REP	1	$ 11.000,00
3	TRANSMISSION MECHAN LIMA	70358-06600-046	A006-01490	EXC/ REP	1	$ 43.000,00
					TOTAL	**$ 73.000,00**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	509.000,00	USD 197.000,00	USD 00,00	USD 312.000,00
TOTAL RUBRO CRP			509.000,00	USD 197.000,00	00,00	USD 312.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	20-NOV-2025	USD 124.000,00
SEGUNDA ENTREGA	16-DIC-2025	USD 73.000,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 197.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 315.000,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		USD 0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		USD 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 509.000,00
VALOR ADICION		USD 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 509.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101265101 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 19-09-2025
Fecha certificado de aprobación: 19-09-2025
Fecha de aprobación: 19-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA	

	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	21/05/2026	US$ 152.700,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US$ 152.700,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US$ 152.700,00

MODIFICATORIO No 1

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101265101 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 25-11-2025
Fecha certificado de aprobación: 27-11-2025 No 411
Fecha de aprobación: 27-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	17/06/2026	US$ 152.700,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	17/12/2026	US$ 152.700,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	17/12/2026	US$ 152.700,00

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101265101 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de expedición: 19-12-2025
Fecha certificado de aprobación: 20-12-2025 No 500
Fecha de aprobación: 20-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	02/06/2026	US$ 152.700,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	02/03/2027	US$ 152.700,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	02/03/2027	US$ 152.700,00

MODIFICATORIO No 3

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101265101 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 05-03-2026
Fecha certificado de aprobación: 09-03-2026 No 092
Fecha de aprobación: 09-03-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	29/11/2026	US$ 152.700,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	29/05/2027	US$ 152.700,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	29/05/2027	US$ 152.700,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. El día 12 de febrero de 2026 se realiza reconocimiento de material mediante acta de reconocimiento N° 00202623 de fecha 12 febrero de 2026.
b. Mediante oficio No 2026675004531203 de fecha 16 de febrero de 2026, se envía al gerente de proyecto la solicitud de concepto técnico del componente TRANSMISSION, MECHAN SN/ CORE A006-03136 OFRECIDO A006-01093 ofrecido en Exchange por la empresa contratista.
c. Mediante oficio No 2026675004569993 de fecha 16 de febrero de 2026, se envía al gerente de proyecto la solicitud de concepto técnico del componente TRANSMISSION, MECHAN SN/ CORE A006-02195 OFRECIDO A006-01584 ofrecido en Exchange por la empresa contratista.
d. Mediante oficio No 2026675005254683 de fecha 20 de febrero de 2026, se envía al gerente de proyecto la solicitud de concepto técnico del componente TRANMISSION, TAIL GEAR BOX S/N A006-02423 concepto técnico B.E.R.
e. Mediante oficio No 2026675005194953 de fecha 20 de febrero de 2026, se solicita la nacionalización de material ante la dirección de comercio exterior.
f. Mediante oficio No 2026675005730303 de fecha 24 de febrero de 2026, se envía al gerente de proyecto la solicitud de concepto técnico del componente FAN ASSY, VANEAXIAL P/N 70361-03005-107 ofrecido en Exchange - Reparado por la empresa contratista.
g. Mediante oficio No 2026675006014823 de fecha 26 de febrero de 2026, se realiza solicitud modificatorio N°3 prorroga N° 3 hasta el día 29 de mayo de 2026.
h. Mediante oficio No 2026675007053813 de fecha 06 de marzo de 2026, se envía al gerente de proyecto la solicitud de concepto técnico del componente concepto técnico del componente FAN ASSY, VANEAXIAL P/N 70361-03005-107 ofrecido en Exchange - Reparado por la empresa contratista.
i. Mediante oficio No 2026675007235023 de fecha 09 de marzo de 2026, se envía al gerente de proyecto la solicitud de concepto técnico del componente concepto técnico del componente FAN ASSY, VANEAXIAL P/N 70361-03005-107 ofrecido en Exchange - Reparado por la empresa contratista.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 509.000,00	38.70%	0.00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- El plazo de ejecución del contrato está hasta el 29 de mayo de 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

a. Se encuentra pendiente la nacionalización de la factura 1451 del acta de reconocimiento No 00202623 por parte de la dirección de comercio exterior.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

10. ANEXOS AL INFORME

a. Oficio No 2026675004531203 de fecha 16 de febrero de 2026.
b. Oficio No 2026675004569993 de fecha 16 de febrero de 2026.
c. Oficio No 2026675005254683 de fecha 20 de febrero de 2026.
d. Oficio No 2026675005194953 de fecha 20 de febrero de 2026.
e. Oficio No 2026675005730303 de fecha 24 de febrero de 2026.
f. Oficio No 2026675006014823 de fecha 26 de febrero de 2026.
g. Oficio No 2026675007053813 de fecha 06 de marzo de 2026.
h. Oficio No 2026675007235023 de fecha 09 de marzo de 2026.

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 169-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 321 2581202

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026675004531203**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

Bogotá D.C, 16 de febrero de 2026

Señor Teniente Coronel
JUAN DIEGO ARIAS GIRAL
Comandante Batallón de Mantenimiento No.2 UH60
Gerente de proyecto
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Solicitud concepto técnico componente ofrecido en Exchange
Ref. Contrato No.169-CENACACIACION-2025.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante Batallón de Mantenimiento No. 2 UH-60 y Gerente de proyecto, su intervención ante el personal técnico de la sección de control calidad con el propósito de que se analice y posteriormente se emita concepto técnico a la propuesta elevada por el contratista UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT (ULS), en referencia al contrato No.169-CENACACIACION-2025 cuyo objeto es SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60, mediante oficio No. 05-2026 de fecha 16 de febrero de 2026, por el cual realiza el ofrecimiento de un componente en modalidad de Exchange – Reparada. A continuación, se amplía información:

LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N OFRECIDO	S/N CORE EJÉRCITO	CANT
21	TRANSMISSION,MECHAN	70358-06600-046	A006-01093	A006-03136	1

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026675004531203**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

Esta supervisión queda atenta a la expedición de mencionado concepto técnico, en aras de verificar si es viable o no la propuesta planteada por el contratista para la recepción de este componente.

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor contrato 169-CENACAVIACIÓN-2025

ANEXO: Solicitud Contratista ULS Oficio 05-2026

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SV. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

Universal Logistics Support corp.

Bogotá D.C, febrero 16 del 2026. **OF: 05-2026**

Señor:
TC. CORREDOR MEDINA FABIAN LEONARDO
Supervisor Contrato 169-CENACAVIACION-2025
Ciudad

Ref. **OFRECIMIENTO EXCHANGE / REPARADO**
CONTRATO 169-CENACAVIACION-2025

Respetado Coronel,

Agradeciendo de antemano su valiosa atención y con ocasión a la ejecución del contrato en mención, nos permitimos informar considerando el corto plazo de ejecución establecido para el CONTRATO 169-CENACAVIACION-2025, nos permitimos respetuosamente enviar para su respectiva verificación y aceptación, ofrecimiento en condición Exchange / Reparado, del tercer componente del Lote 23 así:

LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N OFRECIDO	S/N CORE	CANT
23	TRANSMISSION,MECHAN lima	70358-06600-046	A006-01093	A006-03136	1

Lo anterior, en aras de optimizar los tiempos y dar cumplimiento a lo pactado, dentro del plazo pactado.

Por lo anterior, enviamos documentación técnica para la respectiva verificación y aprobación por parte de la entidad.

Agradezco la atención prestada y su pronta respuesta.

Cordialmente,

ANDRES REYES SMITH
Representante legal de la firma Apoderada ULS COLOMBIA S.A.S
Representando a ULS - UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP

1. Approving Civil Aviation Authority/Country:	2.	3. Form Tracking Number:
FAA/United States	**AUTHORIZED RELEASE CERTIFICATE** FAA Form 8130–3, AIRWORTHINESS APPROVAL TAG	10469

4. Organization Name and Address:	5. Work Order/Contract/Invoice Number:
TAIGLOBAL Group LLC 6336 S. Airfield Dr. #C7 Tucson AZ, 85735 D5VR189N	25/1186

6. Item:	7. Description:	8. Part Number:	9. Quantity:	10. Serial Number:	11. Status/Work:
1	TGB	70358-06600-046	1	A006-01093	Repaired

12. Remarks:

Unit satisfactorily repaired I/A/W DMWR 1-1615-279 dated 27 FEB 2017 at TSN: 8944.3 Hrs.

Retention Plate P/N: 70358-06612-042 S/N: FM1915 installed at TSN: 1626.3 Hrs.
Bevel Gear P/N: 70358-06620-102 S/N: G320-01817 continued at TSN: 653.3 Hrs.

Unit received No-Load Bench Test per customer request. No leaks or deformations noted.

13a. Certifies the items identified above were manufactured in conformity to:		14a. ☑ 14 CFR 43.9 Return to Service ☐ Other regulation specified in Block 12 Certifies that unless otherwise specified in Block 12, the work identified in Block 11 and described in Block 12 was accomplished in accordance with Title 14, Code of Federal Regulations, part 43 and in respect to that work, the items are approved for return to service.	
☐ Approved design data and are in a condition for safe operation. ☐ Non-approved design data specified in Block 12.			
13b. Authorized Signature:	13c. Approval/Authorization No.:	14b. Authorized Signature:	14c. Approval/Certificate No.: D5VR189N
13d. Name (Typed or Printed):	13e. Date (dd/mmm/yyyy):	14d. Name (Typed or Printed): Patrick Dangle (General Manager)	14e. Date (dd/mmm/yyyy): 30-Jan-2026

User/Installer Responsibilities

It is important to understand that the existence of this document alone does not automatically constitute authority to install the aircraft engine/propeller/article.

Where the user/installer performs work in accordance with the national regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority of the country specified in Block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts aircraft engine(s)/propeller(s)/article(s) from the airworthiness authority of the country specified in Block 1.

Statements in Blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases, aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.

FGDES LLC
8080 W 26TH C
MIAMI, FL 33016
Phone: 3055460718
Email: sales@uh-trading.com

SHIPPER DATE: 02/13/2026

SALES ORDER SHIPPER

INVOICE #: SFG-24242

Bill To:

ULS-UNIVERSAL LOGISTIC LOGISTICS SUPPORT
10889 NW 17TH ST
SWEETWATER, FLORIDA 33172
UNITED STATES

Shipped To:

ULS-UNIVERSAL LOGISTIC LOGISTICS SUPPORT
10889 NW 17TH ST
SWEETWATER, FLORIDA 33172
UNITED STATES

Order Date: 02/13/2026
Sales Order #: SFG-24265
Ship Via: PICK UP
Customer PO #: 1517
Shipper #: 309
F.O.B: MIAMI
Shipping Account #: N/A

Item	P/N	Description	UM	S/N	Qty	Cond
1	70358-06600-046	TRANSMISSION, ME, GEARBOX, TAIL ROTOR DRIVE	EA	A006-01093	1.00	RP

From:
FGDES LLC
8080 W 26TH C
MIAMI, FL 33016

To: **Cust PO #:** 1517
ULS-UNIVERSAL LOGISTIC LOGISTICS SUPPORT
10889 NW 17TH ST
SWEETWATER, FLORIDA 33172
UNITED STATES

Print Name: _____

Signature: _____

Date: _____

Packing CheckList:

	Yes	No	NA
Part Number	[ ]	[ ]	[ ]
Serial Number	[ ]	[ ]	[ ]
Form 8130-3	[ ]	[ ]	[ ]
Tear Down	[ ]	[ ]	[ ]
C of C	[ ]	[ ]	[ ]
Bubble Wrap	[ ]	[ ]	[ ]

Received By: _____ **Date:** _____

MAINTENANCE RELEASE TAG

QTY.	COMPONENT PART NUMBER:	NOMENCLATURE:	COMPONENT S/N:
1	70358-06600-046	TGB	A006-01093

CUSTOMER:	CUSTOMER P.O.	WORK ORDER NO.
TAI GLOBAL Group LLC	R3374	25/1186

T.T.	T.S.O.	DATE	☐ OVERHAULED	☐ MODIFIED	☑ REPAIRED
8944.3	653.3	1/30/26			

A/C MAKE/MODEL	REG. NO.	A/C SERIAL NO.

REMARKS:

TAIGLOBAL GROUP, LLC
6336 South Airfield Drive, #C7
Tucson, AZ 85735

FAA-CRS NO. D5VR189N

TAIGLOBAL Group, LLC

www.taiglobalgroup.com
Ph: 830-769-9174, Fax: 830-769-2975

Work Order

Work Order #: R3374
Date Printed: 2/5/2026
Time: 11:23:52 AM
Page: 1

To:
FGDES LLC
8080 W 26TH C
MIAMI, FL 3301
U.S.A.

Ship To:
FGDES LLC
FGDES LLC
8080 W 26TH CT
MIAMI, FL 3301
U.S.A.

Ref #: S13794	**Phone #:** 305-546-0718	**Fax #:**	**Email:** OPERATIONS@FG-DES.COM
Code: F25	**Site:**	**PN:** 70358-06600-046	**Descr:** TAIL GEARBOX
Qty: 1	**Station:**	**Make:**	**Model:** **Mfg:** SIK

TSN: UNK	**TSO:** UNK	**TSR:** UNK	**CSN:** UNK	**CSO:** UNK	**CSR:** UNK

TECH DATA DMWR 1-1615-279. **PRIORITY**

Entry Date: 7/23/2025	**Need Date:**	**Compl. Date:**	**Warranty:** No	**Container:**

Serial Numbers: A006-01093

FAULT:

SERVICEABILITY INSPECTION DUE I.A.W. DMWR 1-1615-279

DISCREPANCIES:

UNIT IN FAIR CONDITION, NO NOTABLE DAMAGE OR CORROSION. LEAKS NOTED AT THE INBOARD RETENTION SEAL.

CORRECTIVE ACTIONS TAKEN:

REPLACED INBOARD RETENTION SEAL AND ATTACHING HARDWARE. REMOVED SEALANT AND PERFORMED NO LOAD BENCH TEST. UNIT PASSED, REAPPLIED SEALANT AND TOUCHED UP PAINT.

CERTIFIED: FAA 8130-3

Parts Total:	$0.00
Labor Total:	$0.00
Misc. Total:	$0.00
Total:	$0.00

Authorized Signature:

Alexa Gutierrez

Form created with Quantum Control(tm) technology. Product Licensed to: TAIGLOBAL Group, LLC

Time Change Components

1. NOMENCLATURE	2. NSN	3. PART NUMBER OR MODEL	4. SERIAL NUMBER	5. WUC

6. NOMENCLATURE AND WUC a.	P/N AND NSN b.	COMPONENT SER NO. LOCATION c.	NO. PREV O/H d.	NOMEN INST HRS e. NOMEN RMVL HRS f.	TIME SINCE O/H g.	COMP INST HRS h. COMP RMVL HRS i.	O/H OR REPLAC LIFE j.	REPLACE-MENT DUE (ACFT HRS) k.
TAIL ROTOR GEARBOX ASSY 06G01	70358-06600-046 1615013765089	A00601093	CC		CC	8944.3		

DA FORM 2408-16-SG, OCT 1991
EDITION OF MAY 1967 IS OBSOLETE

AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD
For use of this form, see DA PAM 738-751; the proponent agency is DCSLOG
APD LC v2.00

1. NOMENCLATURE	2. NSN	3. PART NUMBER OR MODEL	4. SERIAL NUMBER	5. WUC
TAIL ROTOR GEARBOX ASSY	1615013765089	70358-06600-046	A00601093	06G01

6. NOMENCLATURE AND WUC a.	P/N AND NSN b.	COMPONENT SER NO. LOCATION c.	NO. PREV O/H d.	NOMEN INST HRS e. / NOMEN RMVL HRS f.	TIME SINCE O/H g.	COMP INST HRS h. / COMP RMVL HRS i.	O/H OR REPLAC LIFE j.	REPLACE-MENT DUE (ACFT HRS) k.
I/B RETENTION PLATE T/R 06G01C	70358-06612-042 1615010745153	FM1915	RC	8944.3	RC	1626.3		
GEARSHAFT, BEVEL 06G01D	70358-06620-102 3040012921617	G32001817	RC	8944.3	RC	653.3		

DA FORM 2408-16-SG, OCT 1991
EDITION OF MAY 1967 IS OBSOLETE

AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD
For use of this form, see DA PAM 738-751; the proponent agency is DCSLOG
APD LC v2.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026675004569993**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

Bogotá D.C, 16 de febrero de 2026

Señor Teniente Coronel
JUAN DIEGO ARIAS GIRAL
Comandante Batallón de Mantenimiento No.2 UH60
Gerente de proyecto
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Solicitud análisis y concepto componente ofrecido en Exchange
Ref. Contrato No.169-CENACACIACION-2025.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante Batallón de Mantenimiento No. 2 UH-60 y Gerente de proyecto, su intervención ante el personal técnico de la sección de control calidad con el propósito de que se analice y posteriormente se emita concepto técnico a la propuesta elevada por el contratista UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT (ULS), en referencia al contrato No.169-CENACACIACION-2025 cuyo objeto es SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60, mediante oficio No. 06-2026 de fecha 16 de febrero de 2026, por el cual realiza el ofrecimiento de un componente en modalidad de Exchange – Reparada. A continuación, se amplía información:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N OFRECIDO	S/N CORE	CANT
TRANSMISSION,MECHAN	70358-06600-046	A006-01584	A006-02195	1

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026675004569993**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

Esta supervisión queda atenta a la expedición de mencionado concepto técnico, en aras de verificar si es viable o no la propuesta planteada por el contratista para la recepción de este componente.

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor contrato 169-CENACAVIACIÓN-2025

ANEXO: Solicitud Contratista ULS Oficio 06-2026

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SV. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

Bogotá D.C, febrero 16 de 2026 **OF: 06-2026**

Señor:
TC. CORREDOR MEDINA FABIAN LEONARDO
Supervisor Contrato 169-CENACAVIACION-2025
Ciudad

Asunto: **INFORME ACLARACION TRACE TRANSMISION – P/N: 70358-06600-046 S/N: A006-01584**

Ref. **CONTRATO 169-CENACAVIACION-2025**

Respetado Coronel,

Agradeciendo de antemano su valiosa atención, nos permitimos, en nombre de la firma ULS – UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP, aclarar muy respetuosamente que los documentos de Trazabilidad entregados con el componente detallado a continuación, no corresponden a registros actuales del componente:

LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N OFRECIDO
23	TRANSMISSION,MECHAN lima	70358-06600-046	A006-01584

Lo anterior, teniendo en cuenta que la trazabilidad entregada con el componente identifica registros históricos pasados antes de ingreso a la Estación Reparadora TAIGLOBAL, por lo que esta estación actualizara la documentación respectiva, de conformidad con los registros actuales del componente, garantizando la legitimidad de los datos allí consignados.

Como constancia de lo expuesto anteriormente, nos permitimos enviar documentos que acreditan la trazabilidad en los registros históricos del componente.

Así mismo, compartimos comunicado de la estación reparadora TAIGLOBAL, aclarando lo ya mencionado.

Finalmente es preciso señalar que involuntariamente hubo una confusión en los registros históricos teniendo en cuenta que la Aeronave a la que pertenecía el componente objeto del presente, es propiedad de la firma ULS – UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP, por lo que se anexan los documentos corregidos y el mail respectivo.

La firma ULS – UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP, se excusa de antemano con la entidad por las molestias ocasionadas y reitera su compromiso con la fuerza.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Comunicado de la estación reparadora TAIGLOBAL:

El jueves, febrero 12, 2026, 4:06 p.m., Alexandra Gutierrez <gutierrez.b@taiglobalgroup.com> escribió:

Clarification: Form DA 2408-16, which was submitted, was reviewed and found to have a Typing error by the department responsible for completing the forms after the inspection of the component TAIL ROTOR GEARBOX ASSY, Part Number 70358-06600-046, Serial Number A006-01584.

For the subcomponent I/B RETENTION PLATE T/R, Part Number 70358-06612-042, the Serial Number FM4324 is located on the nameplate.

For the GEARSHAFT BEVEL, part number 70358-06620-102, the workshop used an boroscope to confirm that the serial number of the GEARSHAFT BEVEL, the serial number found during inspection is A313-010092.

We will send the correct documentation

Thank you

Alexandra Gutierrez
Customer Service Manager
Customer Service & Sales Department
(830) 769-9174

TAIGLOBAL

URL: www.taiglobalgroup.com
T: (830) 769-9174 F: (830) 769-2975 Cage Code: 9KU64
Customer Service & Sales – Jourdanton, Texas AS9120
O&R Accessory Department – Jourdanton, Texas AS9110
O&R DyCom Department – Tucson, Arizona FAA145
Central Admin/Finance Department – San Antonio, Texas

EXPORT COMPLIANCE NOTICE: This email and any attachments may contain technical data subject to U.S export restrictions under the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) or the Export Administration Regulations (EAR). Export or transfer of this technical data and/or related information to any foreign person(s) or entity (ies), either within the U.S. or outside of the U.S., may require advance export authorization by the appropriate U.S. Government agency prior to export or transfer. In addition, technical data may not be exported or transferred to certain countries or specified designated nationals identified by U.S. embargo controls without prior export authorization. By accepting this email and any attachments, all recipients confirm that they understand and will comply with all applicable ITAR, EAR and embargo compliance requirements.

Cordialmente,

ANDRES REYES SMITH
Representante Legal de la firma Apoderada ULS COLOMBIA S.A.S
Representando a ULS - UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP

1. Approving Civil Aviation Authority/Country:	2.	3. Form Tracking Number:
FAA/United States	**AUTHORIZED RELEASE CERTIFICATE** **FAA Form 8130–3, AIRWORTHINESS APPROVAL TAG**	10460

4. Organization Name and Address:	5. Work Order/Contract/Invoice Number:
TAIGLOBAL Group LLC 6336 S. #C7 Airfield Dr. Tucson AZ, 85735 D5VR189N	25/1220

6. Item:	7. Description:	8. Part Number:	9. Quantity:	10. Serial Number:	11. Status/Work:
1	TGB	70358-06600-046	1	A006-01584	Repair

12. Remarks:


Unit satisfactorily repaired I/A/W DMWR 1-1615-279 dated 27 FEB 2017, at TSN: 2670.4 Hrs.

13a. Certifies the items identified above were manufactured in conformity to:

- ☐ Approved design data and are in a condition for safe operation.
- ☐ Non-approved design data specified in Block 12.

14a. ☑ **14 CFR 43.9 Return to Service** ☐ **Other regulation specified in Block 12**

Certifies that unless otherwise specified in Block 12, the work identified in Block 11 and described in Block 12 was accomplished in accordance with Title 14, Code of Federal Regulations, part 43 and in respect to that work, the items are approved for return to service.

13b. Authorized Signature:	13c. Approval/Authorization No.:	14b. Authorized Signature:	14c. Approval/Certificate No.:
			D5VR189N
13d. Name (Typed or Printed):	**13e. Date (dd/mmm/yyyy):**	**14d. Name (Typed or Printed):**	**14e. Date (dd/mmm/yyyy):**
		Patrick Dangle (General Manager)	08-Dec-2025

User/Installer Responsibilities

It is important to understand that the existence of this document alone does not automatically constitute authority to install the aircraft engine/propeller/article.

Where the user/installer performs work in accordance with the national regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority of the country specified in Block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts aircraft engine(s)/propeller(s)/article(s) from the airworthiness authority of the country specified in Block 1.

Statements in Blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases, aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.

TAIGLOBAL Group, LLC

www.taiglobalgroup.com
Ph: 830-769-9174, Fax: 830-769-2975

Work Order

Work Order #: R3457
Date Printed: 12/11/2025
Time: 4:40:17 PM
Page: 1

To:
UH-TRADING
8080 W 26TH C
MIAMI, FL 3301
U.S.A.

Ship To:
UH-TRADING
8080 W 26TH C
MIAMI, FL 3301
U.S.A.

Ref #: S13783 **Phone #:** 305-546-0718 **Fax #:** **Email:** SALES@UH-TRADING.COM
Code: F25 **Site:** **PN:** 70358-06600-046 **Descr:** TAIL GEARBOX
Qty: 1 **Station:** **Make:** **Model:** **Mfg:** SIK

TSN: UNK **TSO:** UNK **TSR:** UNK **CSN:** UNK **CSO:** UNK **CSR:** UNK

TECH DATA DMWR 1-1615-279. **PRIORITY**

Entry Date: 7/23/2025 **Need Date:** **Compl. Date:** **Warranty:** No **Container:**

Serial Numbers: A006-01584
Symptoms:

CUSTOMER REPORT : NONE PROVIDED

Faults:

EVALUATION:

UNIT EVALUATED AND DAMAGE FOUND ON BOTH BEARINGS ON THE INPUT HOUSING BEYOND LIMITS. EXCESSIVE WEAR ON RETENTION PLATE AND SLEEVE. BRACKET BENT AND DAMAGED. INPUT FLANGE, SEAL AND NUT FOUND MISSING.

Corrective Actions:

WORK PERFORMED:

WE RECOMMEND REPAIR AND REWORK OF WEAR ON RETENTION PLATE AND SLEEVE. REPLACED BEARINGS ON INPUT HOUSING. REPLACED BRACKET, INPUT FLANGE, SEAL AND NUTS. PERFORMED ALL OIPS, NO LOAD TEST, TOUCH UP PAINT AND CERTIFIED UNIT.

Certification: FAA 8130-3

Parts Total:	$0.00
Labor Total:	$0.00
Misc. Total:	$0.00
Total:	$0.00

Authorized Signature:

Alexa Gutierrez

Form created with Quantum Control(tm) technology. Product Licensed to: TAIGLOBAL Group, LLC

MAINTENANCE RELEASE TAG

QTY.	COMPONENT PART NUMBER:	NOMENCLATURE:	COMPONENT S/N:
1	70358-06600-046	TGB	AG06-01584

CUSTOMER:	CUSTOMER P.O.	WORK ORDER NO.
TAIGLOBAL Group LLC	R3457	25/1220

T.T.	T.S.O.	DATE	☐ OVERHAULED	☐ MODIFIED	☑ REPAIRED
2670.4	N/A	12/8/25			

A/C MAKE/MODEL	REG. NO.	A/C SERIAL NO.

REMARKS: Repaired I/A/W DMWR 1-1615-279 dated 27 FEB 2017

TAIGLOBAL GROUP, LLC
6336 South Airfield Drive, #C7
Tucson, AZ 85735

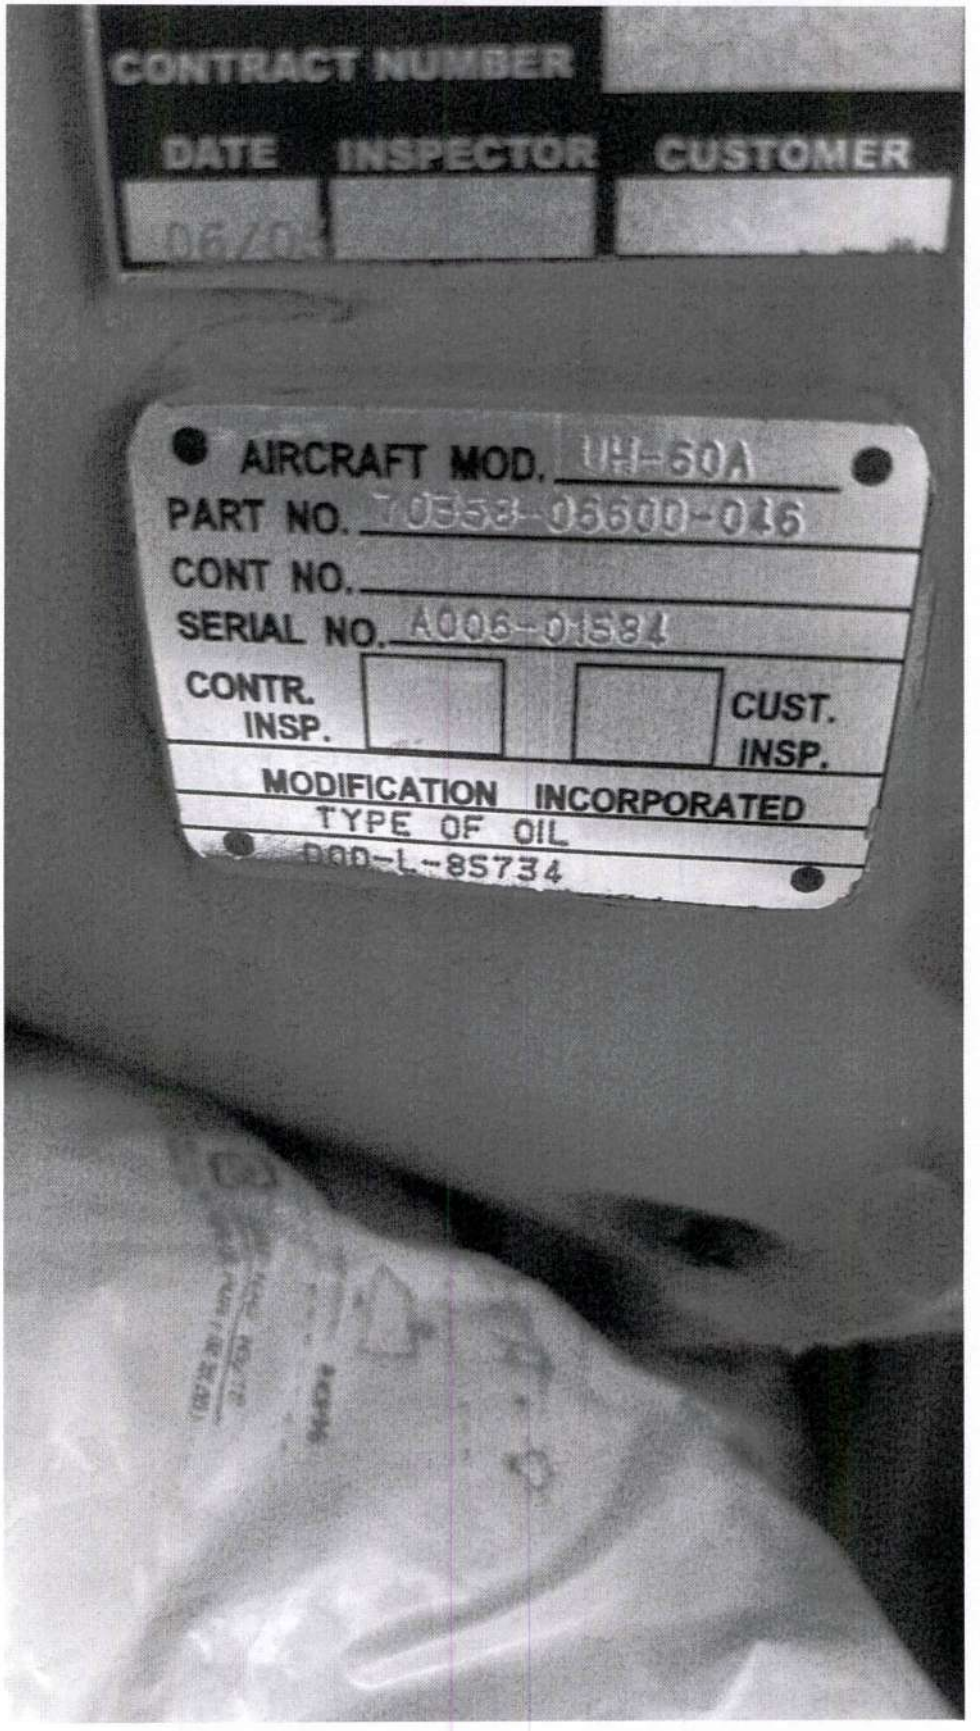
FAA-CRS NO. D5VR189N

THE AIRCRAFT, AIRCRAFT COMPONENT, AIRCRAFT ENGINE, DYNAMIC COMPONENT OR APPLIANCE IDENTIFIED ON THIS MAINTENANCE RELEASE TAG WAS REPAIRED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH CURRENT MAINTENANCE RULES OF THE FEDERAL AVIATION REGULATIONS AND IS APPROVED FOR RETURN TO SERVICE.

PERTINENT DETAILS OF THE REPAIR ARE ON FILE AT THIS REPAIR STATION

UNDER WORK ORDER NO. 25/1220 DATE: 12/8/25

AUTHORIZED SIGNATURE [signature] DATE: 12/8/25


CONTRACT NUMBER
DATE
INSPECTOR
CUSTOMER
AIRCRAFT MOD. UH-60A
PART NO. 70353-06600-046
CONT NO.
SERIAL NO. A006-01584
CONTR. INSP.
CUST. INSP.
MODIFICATION INCORPORATED
TYPE OF OIL
DOD-L-85734


P/N 960-70358-06612-102 FORG S/N FB7823
-042 ASSY. REV AD FORG H/L H19640
MFR BOEING S/N FM4324 FORG LOT 001

1. NOMENCLATURE	2. NSN	3. PART NUMBER OR MODEL	4. SERIAL NUMBER	5. WUC
HELICOPTER UTILITY UH-60	1520-01-298-4532			

6. NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE (AFCT HRS) *k*
TAIL ROTOR GEARBOX ASSY 06G01	70358-06600-046 1615-01-376-5089	A006-01584	CC		CC	2670.4	CC	Cond

DA FORM 2408-16, OCT 1991
EDITION OF MAY 1967 IS OBSOLETE

AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD
For use of this form see DA PAM 738-751; the proponent agency is DCSLOG
APD LC v2.00

NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE *(AFCT HRS)* *k*

7.

SIGNIFICANT HISTORICAL DATA

REMARKS.

12 AGU 2025 - REPAIRED AT T.T 2670.4 HRS I/A/W DMWR 1-1615-279 DATED 27 FEB 2017

1. NOMENCLATURE	2. NSN	3. PART NUMBER OR MODEL	4. SERIAL NUMBER	5. WUC
TAIL ROTOR GEARBOX ASSY	1615-01-376-5089	70358-06600-046	A006-01584	06G01

6. NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE (AFCT HRS) *k*
I/B RETENTION PLATE T/R 06G01C	70358-06612-042 1615010745153	FM4324	RC	2670.4	RC	437.4	12000	
GEARSHAFT BEVEL 06D01D	70358-06620-102 3040012921617	A313-010092	RC	2670.4	RC	767.4	5800	

DA FORM 2408-16, OCT 1991
EDITION OF MAY 1967 IS OBSOLETE

AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD
For use of this form see DA PAM 738-751; the proponent agency is DCSLOG
APD LC v2.00

NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE *(AFCT HRS)* *k*

7.

SIGNIFICANT HISTORICAL DATA

REMARKS.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026675005254683: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

Bogotá D.C, 20 de febrero de 2026

Señor Teniente Coronel
JUAN DIEGO ARIAS GIRAL
Comandante Batallón de Mantenimiento No.2 UH60
Gerente de proyecto
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Solicitud concepto técnico
Ref. Contrato No.169-CENACACIACION-2025.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel, en su calidad de Comandante del Batallón de Mantenimiento No. 2 UH-60 y Gerente de Proyecto, su intervención ante el personal técnico de la Sección de Control de Calidad, con el propósito de que se analice y, de ser procedente, se emita el correspondiente concepto técnico B.E.R. (Beyond Economy Repair), a fin de continuar con los trámites administrativos ante el Batallón de Abastecimientos y Servicios de la Aviación (BAAAS).

Lo anterior, con el objetivo de verificar la información suministrada por el contratista UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT (ULS), en el marco del Contrato No. 169-CENACAVIACIÓN-2025, cuyo objeto corresponde a la prestación de los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60"., información que fue remitida mediante Oficio No. 52-2026 de fecha 19 de febrero de 2026, mediante el cual se anexa la documentación técnica correspondiente a la inspección realizada por la estación reparadora TAIGLOBAL Group, LLC.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026675005254683: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional que se estime necesario.

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor contrato 169-CENACAVIACIÓN-2025

ANEXO: Oficio ULS- 52-2026 19/FEB/2026 (09 folios)

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SV. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

Universal Logistics Support corp.

Bogotá D.C, Febrero 19, 2026 **OF: 52-2026**

Señor:
TC.FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato No.169-CENACAVIACION-2025
Ciudad

Ref. **INFORME COMPONENTE B.E.R. (BEYOND ECONOMIC REPAIR)**
CONTRATO 169-CENACAVIACION-2025

Respetado Teniente Coronel,

Reciba un cordial saludo.

En atención a la ejecución del Contrato No. 169-CENACAVIACIÓN-2025, la firma ULS-Universal Logistics Support Corp. se permite informar respetuosamente los resultados de la evaluación técnica realizada al siguiente componente:

LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO
23	TRANSMISSION,TAIL GEAR BOX	70358-06600-046	A006-02423

La unidad fue recibida para reparación conforme al Manual de Depósito y Mantenimiento DMWR 1-1615-279. Durante el proceso de inspección inicial y posterior desarme efectuado por la estación reparadora, se evidenciaron daños estructurales y de componentes internos por fuera de los límites permitidos, entre ellos afectación del alojamiento de salida,desgaste del engranaje espiral y daño en rodamientos, así como la presencia de compuesto protector de corrosión (CPC) en el interior de la unidad, condición no permitida según la normativa aplicable.

Como resultado de la evaluación, la estación reparadora recomendó la ejecución de una reparación mayor (overhaul completo), la cual incluye el reemplazo de ítems mandatorios y adicionales, ensayos no destructivos, reensamble, pruebas funcionales, pintura y certificación aeronáutica correspondiente.

Universal Logistics Support corp.

Sin embargo, una vez analizados los aspectos técnicos, económicos y operativos, se informa a la entidad que:

- El valor total de la evaluación y de los trabajos adicionales requeridos asciende a USD 102,200.00 monto que supera el valor adjudicado contractualmente para este componente.
- Algunos de los repuestos críticos necesarios para la reparación presentan tiempos de entrega de hasta cuatrocientos (400) días.
- El tiempo estimado de ejecución de la reparación es de doce (12) semanas adicionales, contadas a partir de la recepción total de los repuestos requeridos.
- Lo anterior genera un impacto significativo en la disponibilidad operativa, afectando de manera directa el cumplimiento de las misiones asignadas a la Aviación del Ejército.

En consecuencia, y considerando los criterios económicos, contractuales y operativos, el componente TRANSMISIÓN, MECANISMO LIMA PN 70358-06600-046, SN A006-02423 es declarado en condición B.E.R. económico (Beyond Economic Repair), por no resultar viable su reparación bajo las condiciones contractuales establecidas.

Con el fin de soportar lo anteriormente expuesto, se anexan al presente el informe técnico emitido por la estación reparadora, junto con la documentación y soportes correspondientes para conocimiento y determinación de la entidad.

Agradecemos su valiosa atención y quedamos atentos a las instrucciones que se impartan al respecto.

Cordialmente,

ANDRES REYES SMITH
Representante Legal de la firma Apoderada ULS COLOMBIA S.A.S
Representando a ULS - UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP

TAIGLOBAL Group, LLC
www.taiglobalgroup.com
Ph: 830-769-9174, Fax: 830-769-2975

Acknowledgement

SO #: S13845
Date Printed: 1/29/2026
Time: 3:28:53 PM
# of Items: 1
Page: 1 of 1
Prepared By:

To:
UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP..
10889 NW 17th ST
SUITE 151
SWEETWATER, FL 33172
U.S.A.
ATTN: JENNIFER PEREZ

Ship To:
UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP..
10889 NW 17th ST
SUITE 151
SWEETWATER, FL 33172
U.S.A.

Date Open: 10/29/2025 **Ship Via:** T.B.A. **Customer PO#:** 1468
Customer #: ULSC1 **Ship Via Acc:** **Buyer:**

ACKNOWLEDGEMENT

Item	Part Number/Description	Delivery	To Ship	BackOrd	CD			Unit Price	Total Amt
1	70358-06600-046 TAIL GEARBOX NSN: 1615-01-376-5089		1	0	OH			$102,200 EA	$102,200EA

UNIT RECEIVED FOR: REPAIR I.A.W. DMWR 1-1615-279

CUSTOMER REPORT: OUTPUT BEVEL GEAR NEEDS TIME REPLACEMENT.
INITIAL INSPECTION: OUTPUT BEVEL GEAR WAS DETERMINED TO HAVE 1287.0 HOURS REMAINING

EVALUATION: UNIT INSPECTED AND TORNDOWN, DAMAGE WAS FOUND ON OUTPUT HOUSING BEYOND ALLOWABLE LIMITS.
INTERIOR OF UNIT COATED IN CPC, NOT ALLOWED. SPRIAL WORN AND BEARING DAMAGED BEYOND ALLOWABLE LIMITS.

WORKSCOPE: WE RECOMMEND FULL OVERHAUL. UNIT WILL BE FULLY STRIPPED, HAVE ALL OIPSs PERFORMED, NDT PERFORMED, AND REPLACE ALL MANDATORY ITEMS. REPLACE ALL OVER AND ABOVE ITEMS. RE-ASSEMBLE UNIT AND PERFORM NO-LOAD TEST. PRIME, REPAINT AND CERTIFY UNIT.

OVER AND ABOVE PARTS:
70358-06609-043 - OUTPUT HOUSING - 400 DAYS
70358-06616-101 - SPIRAL
SB3353-101 - BEARING CONE
SB3217-101 - BEARING CONE
SB3314-101 - BEARING CONE

TAT: 12 WEEKS**
** AFTER ALL PARTS HAVE BEEN RECEIVED

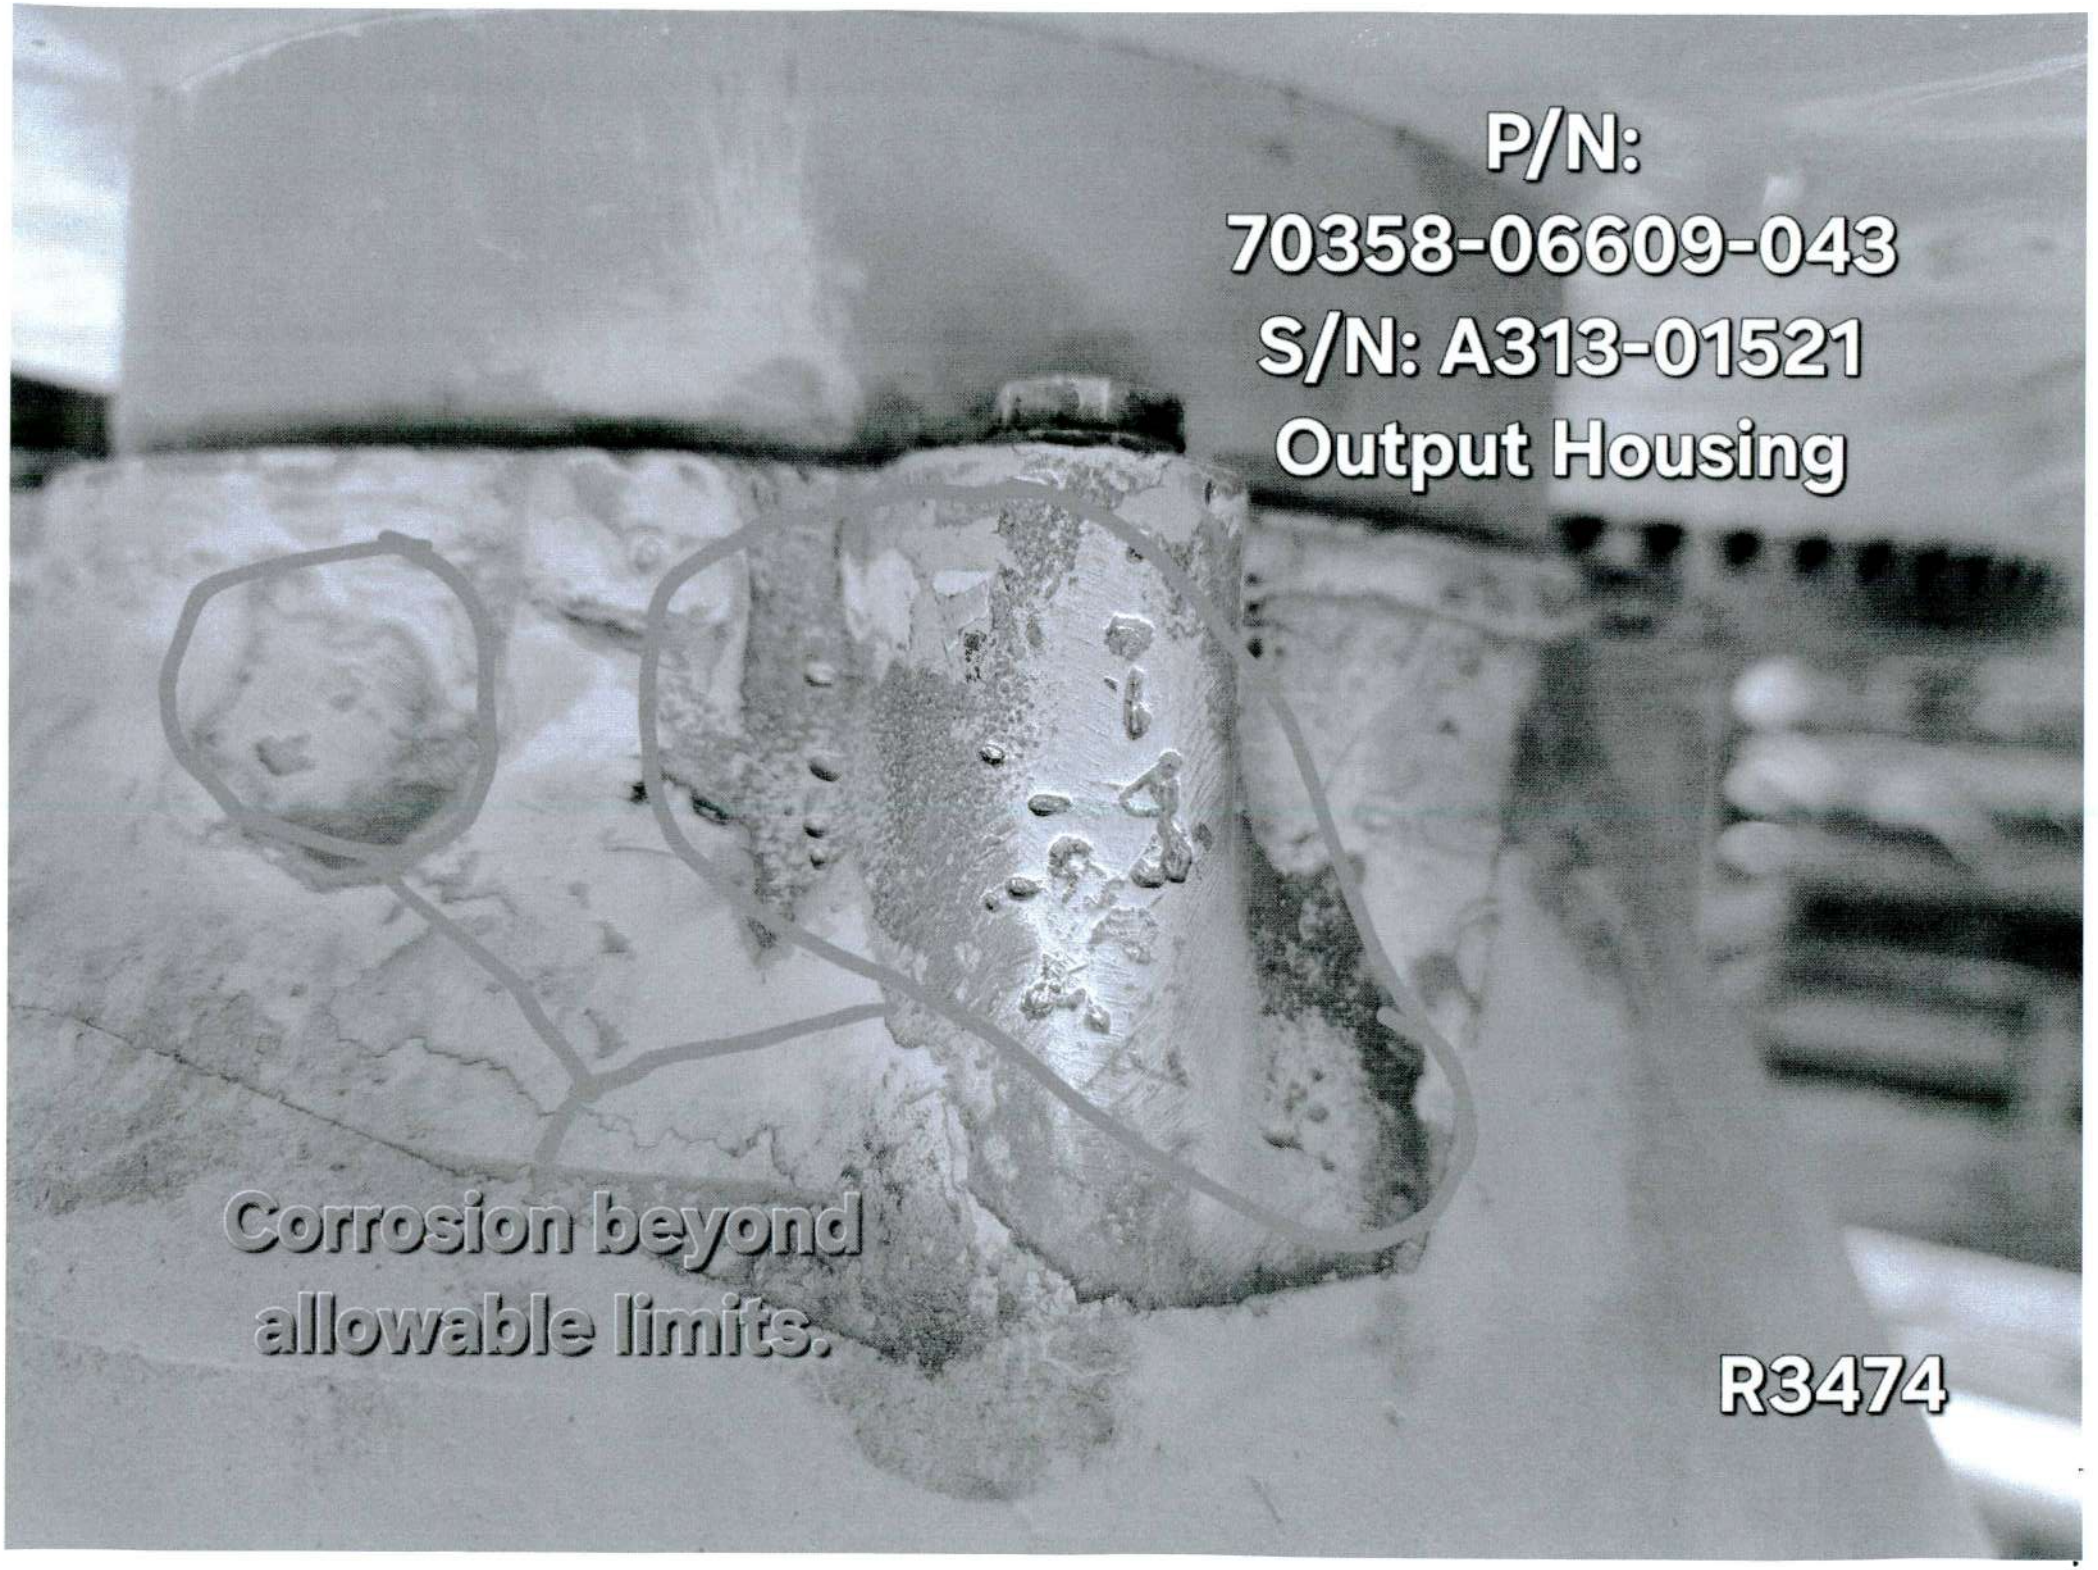
CERT: UNIT WILL BE TAGGED WITH 8130 (FAA REPAIR STATION)

SubTotal:	$102,200.00
Misc Charge:	$0.00
Freight:	$0.00
Total:	**$102,200.00**

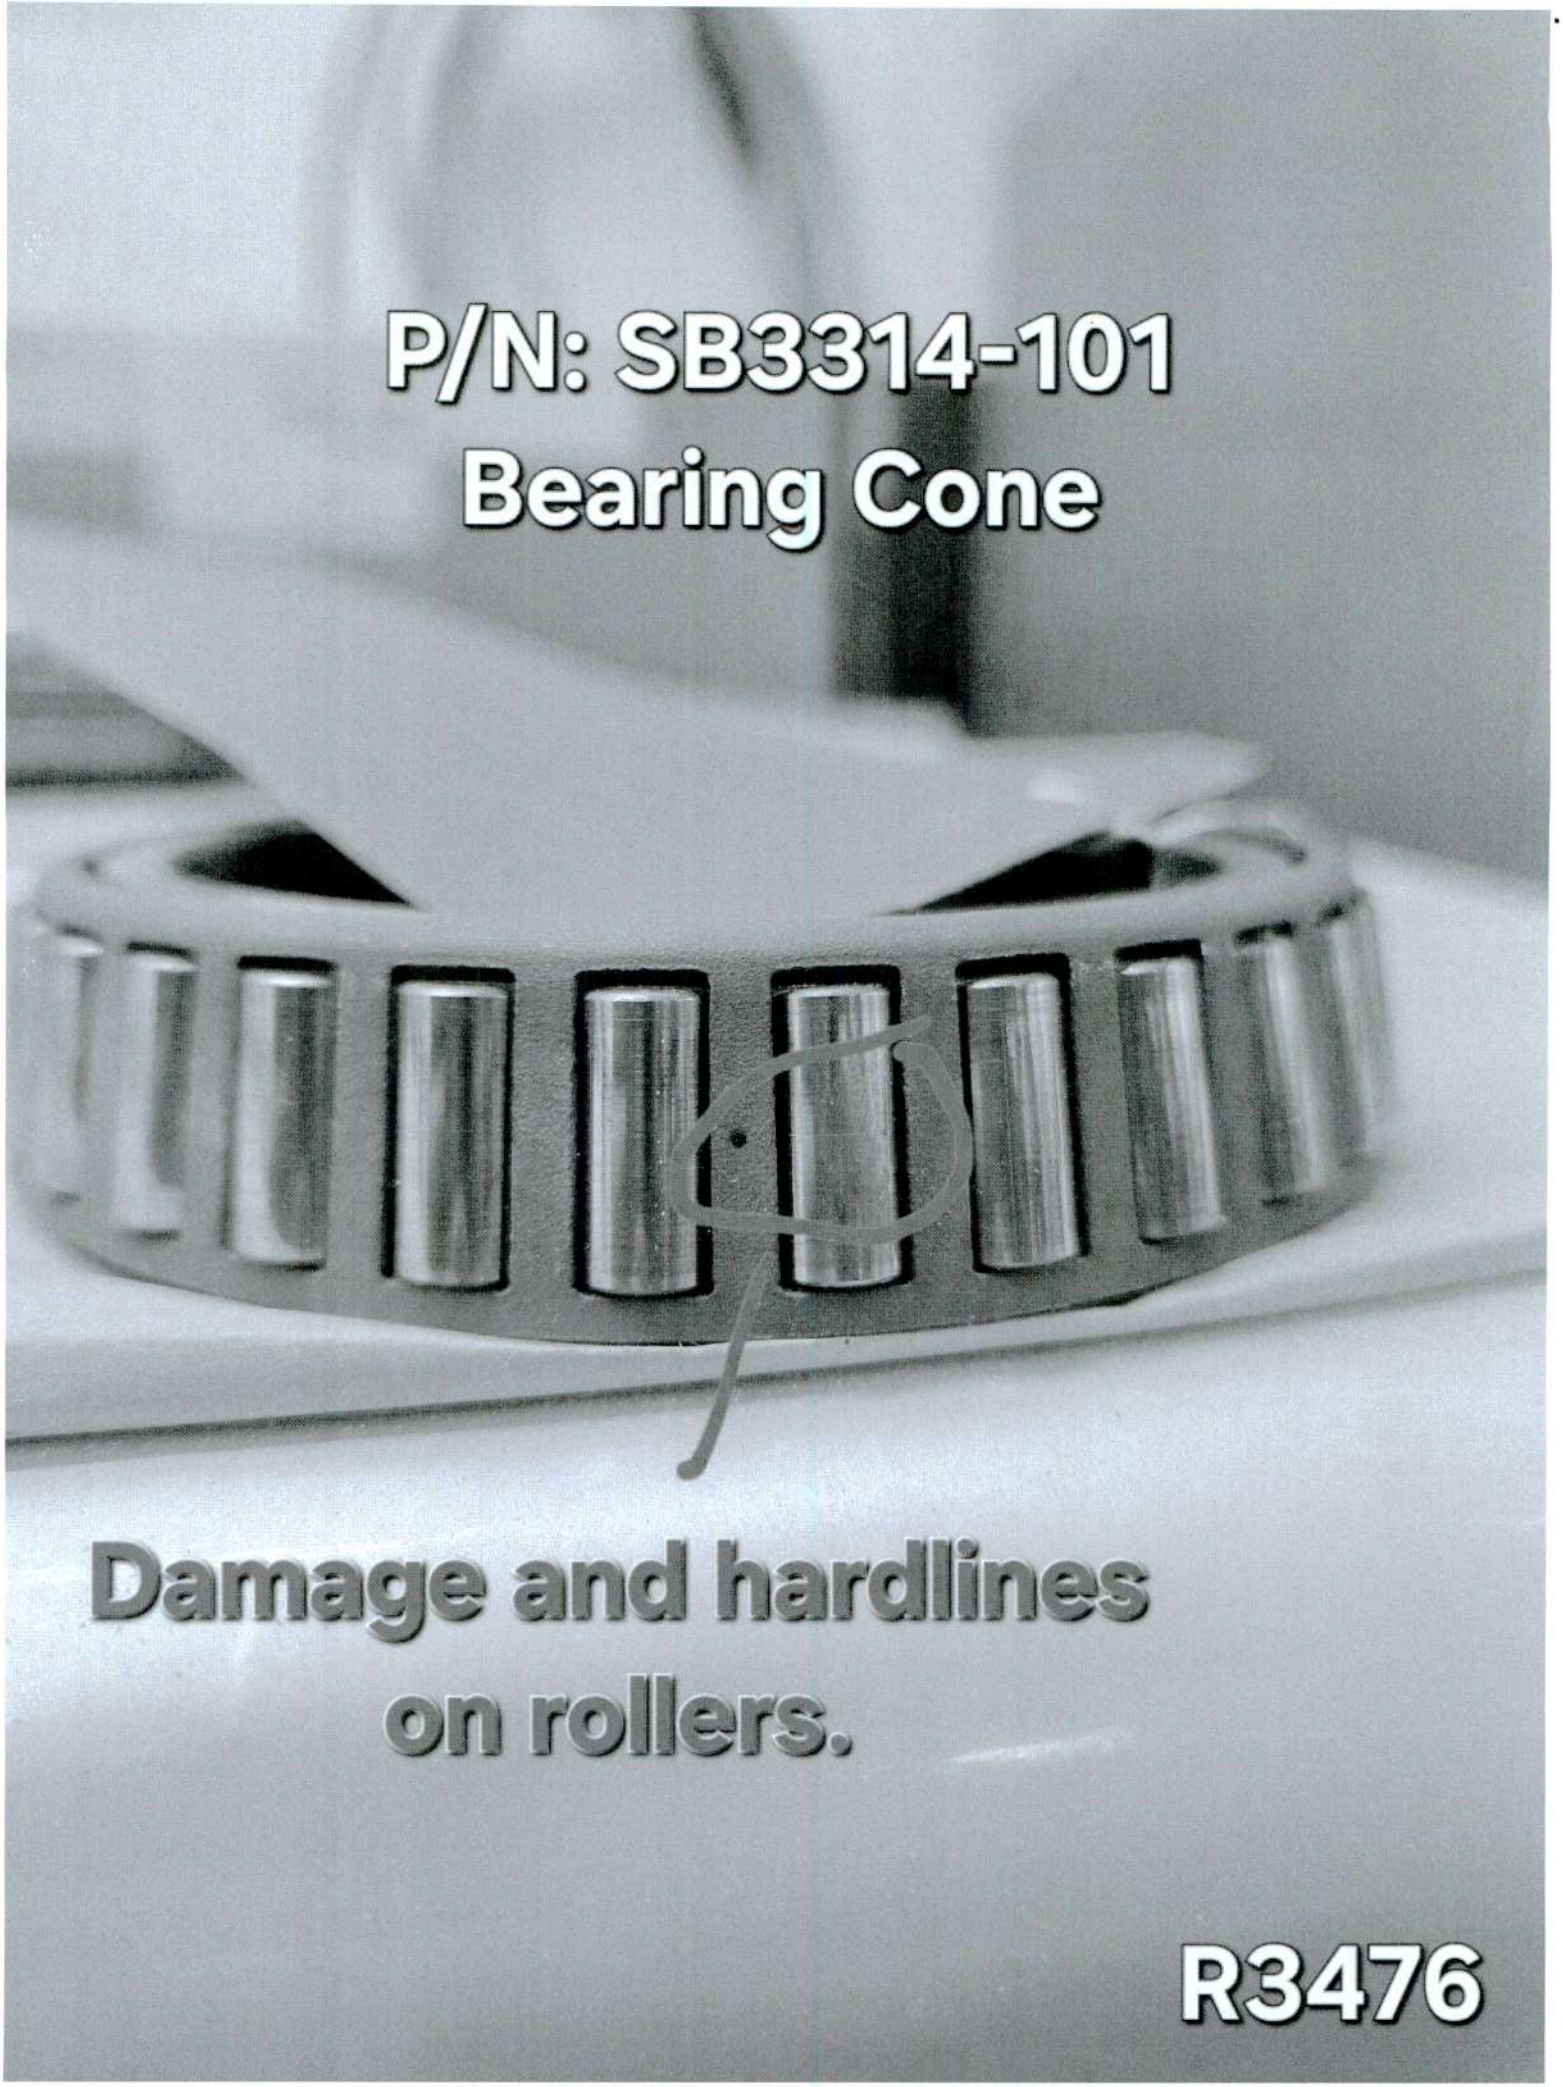
Authorized Signature:

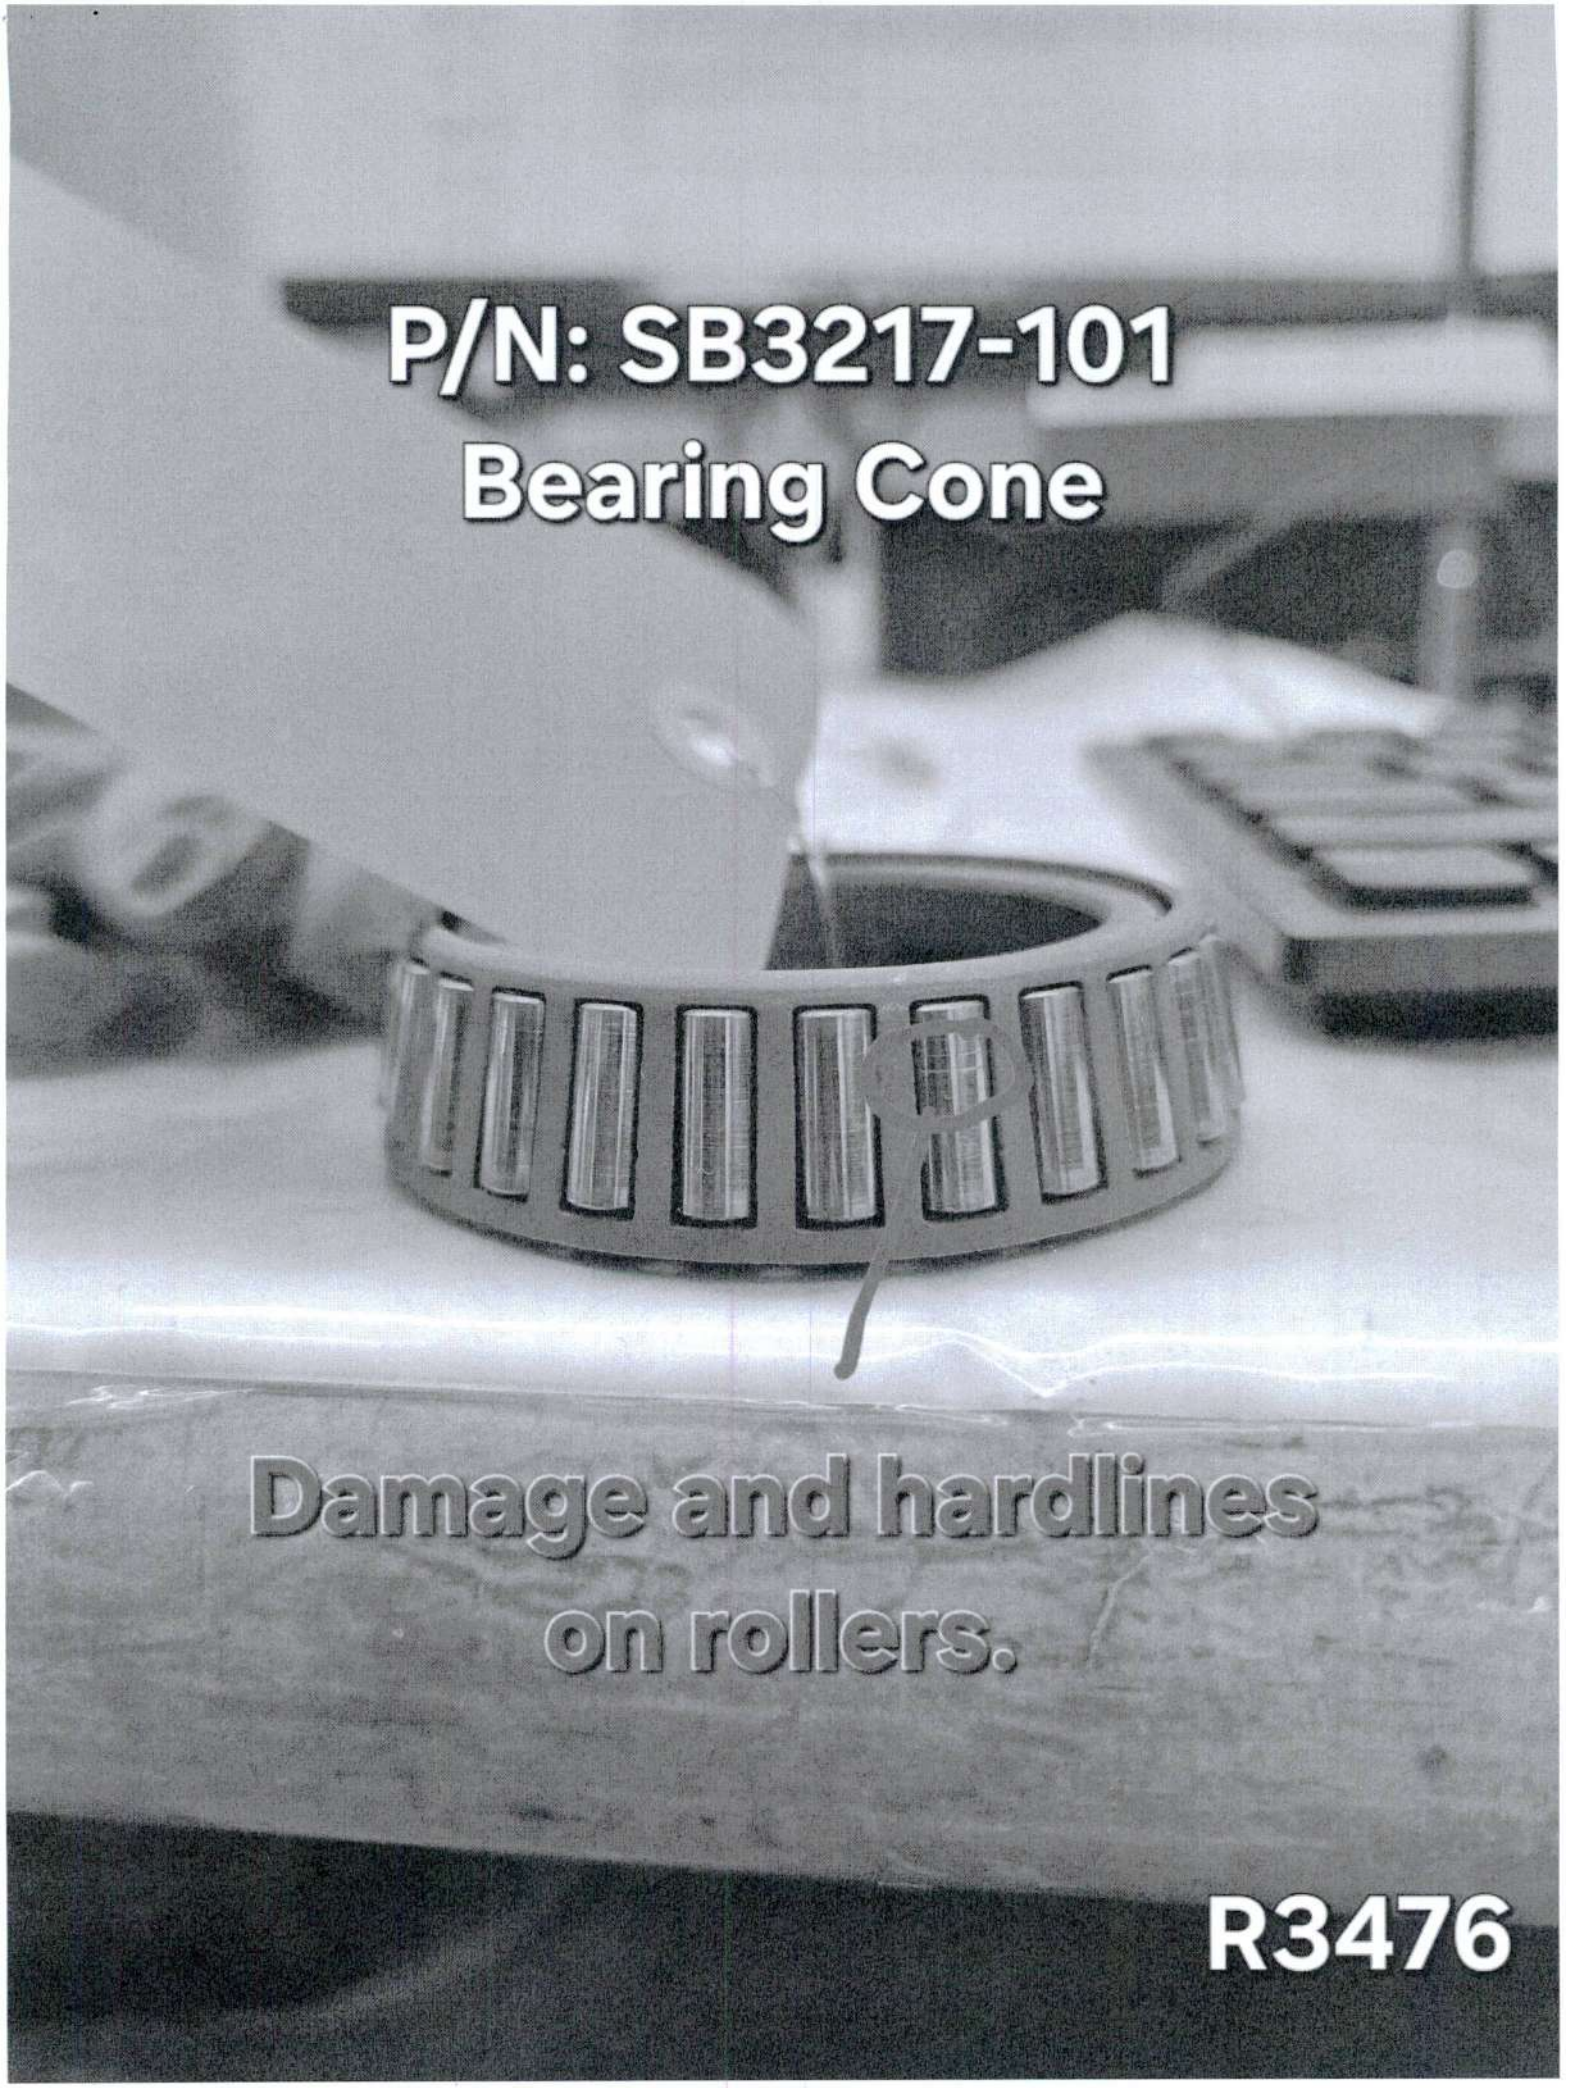
Alexa Gutierrez

Form created with Quantum Control(tm) technology. Product Licensed to: TAIGLOBAL Group, LLC


P/N:
70358-06609-043
S/N: A313-01521
Output Housing
Corrosion beyond
allowable limits.
R3474


P/N: 70358-06616-101
Spiral
ID worn beyond
allowable limits.
R3474


P/N: SB3314-101
Bearing Cone
Damage and hardlines
on rollers.
R3476


P/N: SB3217-101
Bearing Cone
Damage and hardlines
on rollers.
R3476

Miami Air Support

Aircraft Parts Sales & Services

3020 NE 41 TERR STE 424, HOMESTEAD FL 33033
PH 786-471-1544 FAX 844-222-3588
Sales@masinc.us

Quotation

Date	Estimate No.
02/19/2026	5010

Quoted to

ULS - UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT
10889 NW 17 St Suite 151
MIAMI FL, 33172
305-871-7474

Ship to

ULS - UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT
10889 NW 17 St Suite 151
MIAMI FL, 33172

We are pleased to quote you the following

Incoterm	Rep	Payment Method	Currency
FOB MIAMI	SM	WIRE-TRANSFER	USD

Part No.	Description	Qty	U/M	Cond	Total
70358-06600-046	TRANSMISSION,MECHAN GEARBOX T/R DRIVE Manufactuer (OEM)Sikorsky Aircraft United States Law prohibits distribution of these commodities to: Libya, North Korea, Iraq, Iran, Cuba, Russia, Syria, Yemen and Sudan unless otherwise authorized by the United States Government. Shipments to these countries in contrary to U.S Law are prohibited. All items are subject to 20% restocking fee and must have prior approval and RMA number. This agreement is governed by and interpreted in accordance with Miami Air Support standard terms and conditions of sale and with the laws of the state Florida and, USA (Terms and Conditions available on request). Unless otherwise noted, materials are shipped Free On Board Miami, FL. We must be notified in writing of any discrepancies within 7 days, before being returned. Without this your acceptance of Terms and Conditions of this contract is confirmed. Any warranty claims must be applied for in writing on Miami AirSupport's warranty form within the warranty terms stated on the back of the invoice. Claims for transport loses or damages must be made against the carriers and insurance companies of the account holder.	1	ea	NE	115,000.00

Total $115,000.00

ALL STOCK ITEMS ARE SUBJECT TO PRIOR SALES - DELIVERY: 400 DAYS

IN THE EVENT THE MATERIAL SUPPLIED HEREWITH IS TO BE EXPORTED OR DELIVERED TO A REPRESENTATIVE OF A FOREIGN COUNTRY, YOU MAY BE REQUIRED TO FIRST OBTAIN THE APPROPRIATE LICENSE(S) FROM EITHER THE UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE OR THE UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE.
$550.00 EXPORT LICENSE PROCESSING FEE
4% CREDIT CARD FEE FOR US DOMESTIC ORDER
6% CREDIT CARD FEE FOR INTERNATIONAL ORDER

Authorized By

Date

UH-TRADING

8080 W 26TH CT,
MIAMI, FL 33016
Phone: 305-546-0718
Email: ftemprano@uh-trading.com

ASA-100 ACCREDITED
AVIATION SUPPLIERS ASSOCIATION
ASA-100 Certified

CUSTOMER QUOTATION

Quotation #: 872

BILL TO:	**SHIP TO:**
ULS-UNIVERSAL LOGISTIC LOGISTICS SUPPORT 10889 NW 17TH ST SWEETWATER, FLORIDA 33172 UNITED STATES	ULS-UNIVERSAL LOGISTIC LOGISTICS SUPPORT 10889 NW 17TH ST SWEETWATER, FLORIDA 33172 UNITED STATES

Quote date: 02/19/2026
Valid thru: 03/19/2026
Ref #:

Quoted By: Francisco Temprano
Priority: Normal
Terms: COD

Contact: Martha Izquierdo
Email: sales.miami@ulscorp.net
Phone: 305-871-7474

Quoted Items

Item	PN	Desc.	Cond.	UM	Qty	Price	Sub Total
1	70358-06600-046 **Sales Type:** Outright	Transmission	NE	EA	1	$125,000.00	$125,000.00

Prices quoted are US$ and do not include freight charges.
All parts quoted are subject to prior sale. Prices valid 30 days
We can ship parts promptly upon receipt of your order.
NS = New Surplus Price is each. Minimum order is $20.00 US$
Material Certification on NS unless otherwise noted

Order Sub total:	$125,000.00
Misc. Charges:	$0.00
Freight:	$0.00
Tax:	$0.00
Discount:	$0.00
Total:	**$125,000.00**

Authorized Signature: Francisco Temprano

Approved by: _____ **Print Name:** _____ **Approval Date:** _____

Rejected by: _____ **Print Name:** _____ **Rejected Date:** _____

Prices quoted are US$ and do not include freight charges.
All parts quoted are subject to prior sale. Prices valid 30 days
We can ship parts promptly upon receipt of your order.
NS = New Surplus Price is each. Minimum order is $20.00 US$
Material Certification on NS unless otherwise noted

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ

Al contestar, cite este número

Radicado No 2026675005194953 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2026

Señora Brigadier General
MARTHA ROCIÓ DAVID BASTIDAS
Comandante Comando de Adquisiciones del Ejército
Carrera 46 No. 20C-79 Antigua Casa Logística
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud nacionalización componentes CTO 169-CENACAVIACION-2025

Respetuosamente, me permito solicitar a mi General, autorice a quien corresponda la nacionalización, de un material aeronáutico perteneciente al contrato N°. 169-CENACAVIACION-2025, cuyo objeto es SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60, para tal efecto anexo la documentación correspondiente así:

ENTREGA		
No.	**DOCUMENTO**	**No. DOCUMENTO**
1	GUÍA AÉREA	729 93662575
2	FACTURA	1451
3	ACTAS DE RECONOCIMIENTO	00202623
4	MODIFACTORIO	PRORROGA No 2

De acuerdo a oficio enviado por la empresa ULS No 06-2026 donde solicitan la aceptación Exchange/Reparado del componente TRANSMISSION, MECHAN TAIL GEAR BOX Parte Numero 70358-06600-046 S/N A006-01584 justificando cumpliendo las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento se envía oficio No 2026675004569993 de fecha 16 de febrero de 2026, al comandante del Batallón de Especialista de Mantenimiento de Aviación solicitando análisis documentación técnica enviada por la empresa contratista, mediante oficio No 2026675005086163 de fecha 19 de febrero de 2026, dan respuesta del análisis documentación técnica la aceptación del componente TRANSMISSION, MECHAN TAIL GEAR BOX Parte Numero 70358-

Al contestar, cite este número

Radicado No 2026675005194953 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

06600-046 S/N A006-01584 que cumple con las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento, mediante oficio No 2026675004699923 de fecha 17 de febrero de 2026, se envía respuesta de viabilidad aceptación Exchange a la empresa contratista.

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato Nº 169-CENACAVIACION-2025.

Anexo: documentación aceptación EXCHANGE (17 folios)

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Reviso: SV. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT. Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

AYUDANTIA COADE
Fecha y hora de recibido: 23/02/2026
Quien recibe: AAB. Edwin Tobre T
Nivel de clasificación:

Fuerte Militar De Tolemaida /Bamav2
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026675005730303**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

Bogotá D.C, 24 de febrero de 2026

Señor Teniente Coronel
JUAN DIEGO ARIAS GIRAL
Comandante Batallón de Mantenimiento No.2 UH60
Gerente de proyecto
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Solicitud concepto técnico contrato No.169-CENACACIACION-2025.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante Batallón de Mantenimiento No. 2 UH-60 y Gerente de proyecto, su intervención ante el comité técnico estructurador, apoyados con la sección de control calidad con el propósito de que se analice y posteriormente se emita concepto técnico a la propuesta elevada por el contratista UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT (ULS), en referencia al contrato No.169-CENACACIACION-2025 cuyo objeto es SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60, mediante oficio No. 49-2-2026 de fecha 22 de febrero de 2026, por el cual realiza el ofrecimiento de un (1) FAN ASSY, VANEAXIAL PARTE NUMERO 70361-03005-107 en modalidad de Exchange – Reparada.

Esta supervisión queda atenta a la expedición de mencionado concepto técnico emitido por el comité técnico estructurador en aras de verificar si es viable o no la propuesta planteada por el contratista para la recepción de este componente.

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor contrato 169-CENACAVIACIÓN-2025

ANEXO: documentación de FAN ASSY, VANEAXIAL ofrecida en Exchange- Reparada

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SV. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

Universal Logistics Support corp.

Bogotá D.C, febrero 23 del 2026. **OF: 49-2-2026**

Señor:
Capitán JAIME LEANDRO MURCIA MUÑOZ
Supervisor Contrato No.169-CENACAVIACION-2025
Ciudad

Ref. **OFRECIMIENTO EXCHANGE / REPARADO**
CONTRATO 169-CENACAVIACION-2025

Respetado Capitán,

Agradeciendo de antemano su valiosa atención y con ocasión a la ejecución del contrato en mención, nos permitimos informar considerando el corto plazo de ejecución establecido para el CONTRATO 169-CENACAVIACION-2025, nos permitimos respetuosamente enviar para su respectiva verificación y aceptación, ofrecimiento en condición Exchange / Reparado, del segundo componente del Lote 26 así:

LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N OFRECIDO	S/N CORE	CANT
26	FAN ASSY,VANEAXIAL	70361-03005-107	587	D512-01831	1

Lo anterior, en aras de optimizar los tiempos y dar cumplimiento a lo pactado, dentro del plazo pactado.

Por lo anterior, enviamos documentación técnica para la respectiva verificación y aprobación por parte de la entidad.

Agradezco la atención prestada y su pronta respuesta.

Cordialmente,

ANDRES REYES SMITH
Representante legal de la firma Apoderada ULS COLOMBIA S.A.S
Representando a ULS - UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP

1. Approving Civil Aviation Authority/Country:	2.	3. Form Tracking Number:
MIL	**CERTIFICATE OF CONFORMITY**	C2051-v2

4. Organization Name and Address:



TAIGLOBAL Group, LLC
www.taiglobalgroup.com
Ph: 830-769-9174, Fax: 830-769-2975

5. Work Order/Contract/Invoice Number: **BAT3340**

6. Item	7. Description:	8. Part Number:	9. Eligibility*	10. Quantity:	11. Serial Number:	12. Status/Work:
1	FAN ASSY, VANEAXIAL	70361-03005-107	N/A	1	587	REPAIRED

13. Remarks:

Inspected, balanced and tested

TSN:949 TSO::N/A

Tech Data: DMWR 1-4140-228

14. Certifies the items identified above were manufactured in conformity to:

☐ Approved design data and are in a condition for safe operation.

☐ Non-approved design data specified in Block 12

19. ☒ Certifies that unless otherwise specified in Block 12, the work identified in Block 11 and described in Block 12 was accomplished in accordance with Title 14, Code of Federal Regulations, part 43 and in respect to that work, the items are approved for return to service.

☐ Unit returning B.E.R.

15. Authorized Signature:	16. Approval Authorization No.:	20. Authorized Signature:	21. Approval/Certificate No.:
	AS9110 / AS9120#14916	Brian Casper	AS9110 / AS9120#14916
17. Name (Typed or Printed):	**18. Date (dd/mmm/yyyy):**	**22. Name (Typed or Printed):**	**23. Date (dd/mmm/yyyy):**
		Brian Casper	22-Jan-2026

TaiGlobal Group QA 15

User/Installer Responsibilities

It is important to understand that the existence of this document alone does not automatically constitute authority to install the part/assembly.

Where the user/installer performs work in accordance with the national regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority of the country specified in Block 1. It is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts aircraft engine(s)/propeller(s)/article(s) from the airworthiness authority of the country specified in Block 1.

Statement in Blocks 14 and 19 do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.

Time Change Components

1. NOMENCLATURE	2. NSN	3. PART NUMBER OR MODEL	4. SERIAL NUMBER	5. WUC

6. NOMENCLATURE AND WUC a.	P/N AND NSN b.	COMPONENT SER NO. LOCATION c.	NO. PREV O/H d.	NOMEN INST HRS e. NOMEN RMVL HRS f.	TIME SINCE O/H g.	COMP INST HRS h. COMP RMVL HRS i.	O/H OR REPLAC LIFE j.	REPLACE-MENT DUE (ACFT HRS) k.
FAN AXIAL 06H23	52E15-1 4140013293428	587	0			949.0		

DA FORM 2408-16-SG, OCT 1991
EDITION OF MAY 1967 IS OBSOLETE

AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD
For use of this form, see DA PAM 738-751; the proponent agency is DCSLOG
APD LC v2.00

1. NOMENCLATURE	2. NSN	3. PART NUMBER OR MODEL	4. SERIAL NUMBER	5. WUC
FAN AXIAL VANE	4140-01-329-3428	70361-03005-107	587	06H23

6. NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE (AFCT HRS) *k*
BEARING BALL ANNULAR 06H23A	Z33C32 3110-01-127-3005	12202	CC	949	CC	949	COND	COND
BEARING BALL ANNULAR 06H23A	Z33C32 3110-01-127-3005	12230	CC	949	CC	949	COND	COND

DA FORM 2408-16, OCT 1991
EDITION OF MAY 1967 IS OBSOLETE

AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD
For use of this form see DA PAM 738-751; the proponent agency is DCSLOG
APD LC v2.00

NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE *(AFCT HRS)* *k*

7. SIGNIFICANT HISTORICAL DATA

REVERSE OF DA FORM 2408-16, OCT 1991

APD LC v2.00

1. NOMENCLATURE	2. NSN	3. PART NUMBER OR MODEL	4. SERIAL NUMBER	5. WUC
HELICOPTER UTILITY UH-60	1520-01-298-4532			

6. NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE (AFCT HRS) *k*
FAN AXIAL 06H23	70361-03005-107 4140-01-329-3428	587	TC		TC	949.0	2520	

DA FORM 2408-16, OCT 1991
EDITION OF MAY 1967 IS OBSOLETE

AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD
For use of this form see DA PAM 738-751; the proponent agency is DCSLOG
APD LC v2.00

NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE *(AFCT HRS)* *k*

7.

SIGNIFICANT HISTORICAL DATA

REMARKS.
11JUN2025 - REPAIRED AT T.T 4939.87 HRS I/A/W DMWR 1-1615-279 DATED 27 FEB 2017

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026675006014823**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2.

Bogotá, D.C, 26 de febrero de 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto El Dorado Puerta 6, Nueva zona de aviación general
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Modificatorio No.3 (Prorroga No.3) al Contrato 169-CENACAVIACIÓN-2025.

Con toda atención, me permito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación y Ordenador del Gasto, la solicitud de Modificatorio No. 3 (Prorroga No. 3) al contrato No.169-CENACACIACION-2025 cuyo objeto son los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60," suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación y la empresa UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP (ULS), con plazo de ejecución hasta el día 02 de marzo de 2026, de acuerdo con las razones expuestas a continuación:

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO.

El Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el día 15 de septiembre de 2025 suscribió con la empresa UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP (ULS), (ID P07000131254), el Contrato No. 169-CENACAVIACIÓN-2025, cuyo objeto es la "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60", por un valor de QUINIENTOS NUEVE MIL DÓLARES AMERICANOS (509.000,00) y un plazo de ejecución hasta el día 02 de marzo de 2026.

A la fecha, mencionado contrato presenta los siguientes valores y porcentajes de ejecución:

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA Y HORA
26 FEB 2026 16:16
RECIBIDO
SUB Oficial

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 509.000,00	00,00	38,70 %	00,00%

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.

La necesidad parte de la obligación constitucional consagrada en el artículo 217, que establece lo siguiente: *"Las Fuerzas Militares tendrán cómo finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional".*

Para lo cual, la Aviación del Ejército cuenta actualmente con una flota de 53 helicópteros Black Hawk, de los cuales 46 son UH-60L y 07 son S70i. Estas aeronaves están bajo el programa de mantenimiento del Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 2 UH-60, que principalmente se basa en dos clases de mantenimiento: programado y no programado (imprevisto). Las aeronaves anteriormente mencionadas, se encuentran disponibles en apoyo a la implementación del plan Estratégico "AYACUCHO PLUS", la cual busca fortalecer el control territorial y operaciones ofensivas, en áreas donde operan los grupos armados organizados (GAO) y que están vinculados con las economías ilícitas como resultados de actividades del narcotráfico

De este modo, se exige a las unidades de Aviación del Ejército Nacional, contribuir a la conducción eficiente de la Operaciones Terrestres Unificadas (OTU), en apoyo de las áreas de responsabilidad asignadas a cada una de las divisiones que integra el Ejército Nacional en cumplimiento del plan AYACUCHO PLUS. Es por ello, que las aeronaves de ala rotatoria y en especial los de la serie UH-60 y S70i cumplen funciones de maniobra y movilidad a las tropas de superficie y demás personal que el gobierno requiera, con el propósito esencial de mantener la paz, combatir la minería ilegal y ayudar a la población civil en situaciones de crisis ecológica, social y/o humanitaria.

Por otra parte, se hace necesario dar estricto cumplimiento a los retos impuestos por el mando superior, teniéndose en cuenta los aspectos de mantenimiento que se describen a continuación:

- Las aeronaves antes mencionadas se encuentran adscritas al Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 2 UH-60 para su sostenimiento, de acuerdo a lo

establecido por los manuales técnicos aplicables de cada aeronave y bajo la administración de la sección de Control de Producción, de acuerdo a las horas voladas.

- Es de vital importancia resaltar ante la Administración, la importación de mantener un stock de repuestos en condiciones **SERVICIABLES** lo suficientemente amplio el cual cubra las necesidades de la unidad de mantenimiento presentadas durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento programado (PMI 1-PMI2-120 HORAS) en cuanto a componentes de alta rotación y que hacen parte del DRIVE SYSTEM

SITUACIÓN PRESENTADA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

En el desarrollo de la ejecución del contrato, el día 25 de febrero del año en curso el contratista UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP por intermedio de su representante legal el señor ANDRÉS REYES SMITH mediante oficio No. 08-2026 (documento anexo), manifiesta a esta supervisión la imposibilidad de realizar la entrega de los componente pendientes por reparación del PAQUETE "B" SISTEMA DE TREN DE POTENCIA, en razón que se encuentran en proceso de evaluación y posterior reparación toda vez, que los componentes han presentado daños ocultos lo que a generado retrasos en la reparación.

Con base en lo expuesto por el contratista y el argumento presentado respecto a las condiciones que han impactado el desarrollo de las actividades contractuales, esta supervisión procede a informar al Gerente del Proyecto y a someter la solicitud a consideración del Comité Técnico Estructurador.

Lo anterior, con el propósito de que dicho comité realice el análisis correspondiente desde el punto de vista técnico, evaluando las condiciones operacionales, logísticas y de disponibilidad de componentes, y determine la viabilidad o no de la prórroga solicitada así:

- El día 26 de febrero de 2026, esta supervisión mediante oficio No. **2026675006012813**, solita al gerente de proyecto su intervención ante el comité técnico estructurador para que se adelante el estudio y análisis a la propuesta planteada por el contratista mediante concepto técnico.

- El día 26 de febrero de 2026, se recibe por parte del gerente de proyecto mediante oficio No. **2026675006013053** respuesta al oficio radicado No. **2026675006012813**, de fecha 26 de febrero de 2026, adjuntando concepto técnico radicado No. **2026675006013853** de fecha 26 de febrero de 2026 en el cual el comité

técnico estructurador luego de analizar desde el punto de vista técnico y exponer los argumentos correspondientes, emitió **VIABILIDAD FAVORABLE** a la solicitud presentada por el contratista.

RECOMENDACIÓN.

El Supervisor del Contrato, con fundamento en la **VIALIDIDAD FAVORABLE** emitida por el comité técnico estructurador y con el apoyo del señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 2 UH-60 y Gerente de Proyecto, considera procedente recomendar al Señor Coronel JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS , Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, la suscripción del Contrato Modificatorio No. 3 (Prorroga No. 3) al Contrato de Prestación de Servicios No. 169-CENACAVIACIÓN-2025 hasta el día **29 mayo de 2026**, manteniendo las Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento y Especificaciones Técnicas Adicionales de Obligatorio Cumplimiento .

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIÁN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor del contrato 169-CENACAVIACION-2025

ANEXOS:

Oficio solicitud prorroga empresa contratista	(01 folios)
Oficio de solicitud concepto técnico del supervisor al gerente de proyecto	(01 folios)
Oficio de respuesta con el concepto técnico	(01 folio)
Concepto técnico	(03 folios)

Elaboró: SS. Mendoza Martha
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SV. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT. Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026675007053813**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

Bogotá D.C, 06 de marzo de 2026

Señor Teniente Coronel
JUAN DIEGO ARIAS GIRAL
Comandante Batallón de Mantenimiento No.2 UH60
Gerente de proyecto
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Solicitud concepto técnico contrato No.169-CENACACIACION-2025.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante Batallón de Mantenimiento No. 2 UH-60 y Gerente de proyecto, su intervención ante el comité técnico estructurador, apoyados con la sección de control calidad con el propósito de que se analice y posteriormente se emita concepto técnico a la propuesta elevada por el contratista UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT (ULS), en referencia al contrato No.169-CENACACIACION-2025 cuyo objeto es SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60, mediante oficio No. 49-3-2026 de fecha 03 de marzo de 2026, por el cual realiza el ofrecimiento de un (1) FAN ASSY, VANEAXIAL PARTE NUMERO 70361-03005-107 en modalidad de Exchange – Reparada.

Esta supervisión queda atenta a la expedición de mencionado concepto técnico emitido por el comité técnico estructurador en aras de verificar si es viable o no la propuesta planteada por el contratista para la recepción de este componente.

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor contrato 169-CENACAVIACIÓN-2025

ANEXO: documentación de FAN ASSY, VANEAXIAL ofrecida en Exchange- Reparada

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SV. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

Universal Logistics Support corp.

Bogotá D.C, marzo 03 de 2026 **OF: 49-3-2026**

Señor:
TC. CORREDOR MEDINA FABIAN LEONARDO
Supervisor Contrato 169-CENACAVIACION-2025
Ciudad

Asunto: **ACLARACION TRACE FAN ASSY,VANEAXIAL – P/N: 70361-03005-107 S/N: 587**

Ref. **CONTRATO 169-CENACAVIACION-2025**

Respetado Coronel,

Agradeciendo de antemano su valiosa atención y con ocasión a la ejecución del contrato en mención, nos permitimos respetuosamente enviar información recibida por parte de la estación reparadora TAIGLOBAL, correspondiente al siguiente componente ofrecido en condición Exchange / Reparado, del segundo componente del Lote 26 así:

LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N OFRECIDO	S/N CORE	CANT
26	FAN ASSY,VANEAXIAL	70361-03005-107	587	D512-01831	1

"Buenas tardes Alejandro

Durante la revisión en la estación reparadora se identificó un error de digitación en la DA FORM 2408-16, correspondiente al componente FAN AXIAL VANE, Serial Number 587. Dicho error fue subsanado conforme a las publicaciones técnicas aplicables: US ARMY - DA PAM 738-751 y TB 1-1500-341-01.

En la inspección física realizada al componente se efectuaron las siguientes acciones:

- *Limpieza, inspección, balanceo y pruebas conforme a procedimientos de mantenimiento DMWR 1-4140-228.*
- *Certificado de conformidad "Repaired" con un TSN (Time Since New) de 949.0 horas.*
- *Se verificó que el componente mantiene (0) cero Overhaul en su historial.*
- *Los subcomponentes Bearing Ball permanecen desde nuevo, acumulando igualmente 949.0 horas.*

Las correcciones fueron registradas en la documentación técnica correspondiente (DA FORM 2408-16 AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD), asegurando trazabilidad y cumplimiento con los estándares de mantenimiento aeronáutico.

Con ello, el componente queda certificado y la documentación ajustada para entrega al cliente."

Por lo anterior, enviamos documentos técnicos soportes del componente mencionado.

La firma ULS – UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP, se excusa de antemano con la entidad por las molestias ocasionadas y reitera su compromiso con la fuerza.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Comunicado de la estación reparadora TAIGLOBAL:

Cordialmente,

ANDRES REYES SMITH
Representante Legal de la firma Apoderada ULS COLOMBIA S.A.S
Representando a ULS - UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP

1. Approving Civil Aviation Authority/Country:	2.	3. Form Tracking Number:
MIL	**CERTIFICATE OF CONFORMITY**	**C2051-v2**

4. Organization Name and Address:



TAIGLOBAL Group, LLC
www.taiglobalgroup.com
Ph: 830-769-9174, Fax: 830-769-2975

5. Work Order/Contract/Invoice Number:
BAT3340

6. Item:	7. Description:	8. Part Number:	9. Eligibility*	10. Quantity:	11. Serial Number:	12. Status/Work:
1	FAN ASSY, VANEAXIAL	70361-03005-107	N/A	1	587	REPAIRED

13. Remarks:

Inspected, balanced and tested

TSN:949 TSO::N/A

Tech Data: DMWR 1-4140-228

14. Certifies the items identified above were manufactured in conformity to:

☐ Approved design data and are in a condition for safe operation.

☐ Non-approved design data specified in Block 12

19. ☒ Certifies that unless otherwise specified in Block 12, the work identified in Block 11 and described in Block 12 was accomplished in accordance with Title 14, Code of Federal Regulations, part 43 and in respect to that work, the items are approved for return to service.

☐ Unit returning B.E.R.

15. Authorized Signature:	16. Approval Authorization No.:	20. Authorized Signature:	21. Approval/Certificate No.:
	AS9110 / AS9120#14916	Brian Casper	AS9110 / AS9120#14916
17. Name (Typed or Printed):	**18. Date (dd/mmm/yyyy):**	**22. Name (Typed or Printed):**	**23. Date (dd/mmm/yyyy):**
		Brian Casper	22-Jan-2026

User/Installer Responsibilities

It is important to understand that the existence of this document alone does not automatically constitute authority to install the part/assembly.

Where the user/installer performs work in accordance with the national regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority of the country specified in Block 1. It is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts aircraft engine(s)/propeller(s)/article(s) from the airworthiness authority of the country specified in Block 1.

Statement in Blocks 14 and 19 do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.

1. NOMENCLATURE	2. NSN	3. PART NUMBER OR MODEL	4. SERIAL NUMBER	5. WUC
HELICOPTER UTILITY UH-60	1520-01-298-4532			

6. NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE (AFCT HRS) *k*
FAN AXIAL 06H23	70361-03005-107 4140-01-329-3428	587	0		0	949	2520	

DA FORM 2408-16, OCT 1991
EDITION OF MAY 1967 IS OBSOLETE

AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD
For use of this form see DA PAM 738-751; the proponent agency is DCSLOG
APD LC v2.00

NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE *(AFCT HRS)* *k*

7. SIGNIFICANT HISTORICAL DATA

REVERSE OF DA FORM 2408-16, OCT 1991

APD LC v2.00

1. NOMENCLATURE	2. NSN	3. PART NUMBER OR MODEL	4. SERIAL NUMBER	5. WUC
FAN AXIAL VANE	4140-01-329-3428	70361-03005-107	587	06H23

6. NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE (AFCT HRS) *k*
BEARING BALL ANNULAR 06H23A	Z33C32 3110-01-127-3005	12202	RC	949	RC	949	2520	
BEARING BALL ANNULAR 06H23A	Z33C32 3110-01-127-3005	12230	RC	949	RC	949	2520	

DA FORM 2408-16, OCT 1991
EDITION OF MAY 1967 IS OBSOLETE

AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD
For use of this form see DA PAM 738-751; the proponent agency is DCSLOG
APD LC v2.00

NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE *(AFCT HRS)* *k*

7. SIGNIFICANT HISTORICAL DATA

REVERSE OF DA FORM 2408-16, OCT 1991

APD LC v2.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026675007235023**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

Bogotá D.C, 09 de marzo de 2026

Señor Teniente Coronel
JUAN DIEGO ARIAS GIRAL
Comandante Batallón de Mantenimiento No.2 UH60
Gerente de proyecto
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Solicitud concepto técnico contrato No.169-CENACACIACION-2025.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante Batallón de Mantenimiento No. 2 UH-60 y Gerente de proyecto, su intervención ante el comité técnico estructurador, apoyados con la sección de control calidad con el propósito de que se analice y posteriormente se emita concepto técnico a la propuesta elevada por el contratista UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT (ULS), en referencia al contrato No.169-CENACACIACION-2025 cuyo objeto es SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60, mediante oficio No. 49-4-2026 de fecha 05 de marzo de 2026, por el cual realiza el ofrecimiento de un (1) FAN ASSY, VANEAXIAL PARTE NUMERO 70361-03005-107 en modalidad de Exchange – Reparada.

Esta supervisión queda atenta a la expedición de mencionado concepto técnico emitido por el comité técnico estructurador en aras de verificar si es viable o no la propuesta planteada por el contratista para la recepción de este componente.

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor contrato 169-CENACAVIACIÓN-2025

ANEXO: documentación de FAN ASSY, VANEAXIAL ofrecida en Exchange- Reparada

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SV. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Vo. Bo: CT Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

Universal Logistics Support corp.

Bogotá D.C, marzo 05 de 2026 **OF: 49-4-2026**

Señor:
TC. CORREDOR MEDINA FABIAN LEONARDO
Supervisor Contrato 169-CENACAVIACION-2025
Ciudad

Asunto: **TRACE FAN ASSY,VANEAXIAL – P/N: 70361-03005-107 S/N: 587**

Ref. **CONTRATO 169-CENACAVIACION-2025**

Respetado Coronel,

Agradeciendo de antemano su valiosa atención y con ocasión a la ejecución del contrato en mención, nos permitimos respetuosamente enviar Trace, correspondiente al siguiente componente ofrecido en condición Exchange / Reparado, del segundo componente del Lote 26 así:

LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	S/N OFRECIDO	S/N CORE	CANT
26	FAN ASSY,VANEAXIAL	70361-03005-107	587	D512-01831	1

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

ANDRES REYES SMITH
Representante Legal de la firma Apoderada ULS COLOMBIA S.A.S
Representando a ULS - UNIVERSAL LOGISTICS SUPPORT CORP

1. Approving Civil Aviation Authority/Country:	2.	3. Form Tracking Number:
MIL	**CERTIFICATE OF CONFORMITY**	C2051-v2

4. Organization Name and Address:



TAIGLOBAL Group, LLC
www.taiglobalgroup.com
Ph: 830-769-9174, Fax: 830-769-2975

5. Work Order/Contract/Invoice Number:
BAT3340

6. Item	7. Description:	8. Part Number:	9. Eligibility*	10. Quantity:	11. Serial Number:	12. Status/Work:
1	FAN ASSY, VANEAXIAL	70361-03005-107	N/A	1	587	REPAIRED

13. Remarks:

Inspected, balanced and tested

TSN:949 TSO::N/A

Tech Data: DMWR 1-4140-228

14. Certifies the items identified above were manufactured in conformity to:

☐ Approved design data and are in a condition for safe operation.

☐ Non-approved design data specified in Block 12

19. ☒ Certifies that unless otherwise specified in Block 12, the work identified in Block 11 and described in Block 12 was accomplished in accordance with Title 14, Code of Federal Regulations, part 43 and in respect to that work, the items are approved for return to service.

☐ Unit returning B.E.R.

15. Authorized Signature:	16. Approval Authorization No.:	20. Authorized Signature:	21. Approval/Certificate No.:
	AS9110 / AS9120#14916	Brian Casper	AS9110 / AS9120#14916
17. Name (Typed or Printed):	**18. Date (dd/mmm/yyyy):**	**22. Name (Typed or Printed):**	**23. Date (dd/mmm/yyyy):**
		Brian Casper	22-Jan-2026

TaiGlobalGroup QA 15

User/Installer Responsibilities

It is important to understand that the existence of this document alone does not automatically constitute authority to install the part/assembly.

Where the user/installer performs work in accordance with the national regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority of the country specified in Block 1. It is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts aircraft engine(s)/propeller(s)/article(s) from the airworthiness authority of the country specified in Block 1.

Statement in Blocks 14 and 19 do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.

1. NOMENCLATURE	2. NSN	3. PART NUMBER OR MODEL	4. SERIAL NUMBER	5. WUC
HELICOPTER UTILITY UH-60	1520-01-298-4532			

6. NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE (AFCT HRS) *k*
FAN AXIAL 06H23	70361-03005-107 4140-01-329-3428	587	0		0	949.0	2520	

DA FORM 2408-16, OCT 1991
EDITION OF MAY 1967 IS OBSOLETE

AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD
For use of this form see DA PAM 738-751; the proponent agency is DCSLOG
APD LC v2.00

NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE *(AFCT HRS)* *k*

7. SIGNIFICANT HISTORICAL DATA

REVERSE OF DA FORM 2408-16, OCT 1991

APD LC v2.00

1. NOMENCLATURE	2. NSN	3. PART NUMBER OR MODEL	4. SERIAL NUMBER	5. WUC
FAN AXIAL VANE	4140-01-329-3428	70361-03005-107	587	06H23

6. NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACEMENT DUE (AFCT HRS) *k*
BEARING BALL ANNULAR 06H23A	Z33C32 3110-01-127-3005	12202	RC	0	RC	0	2520	
BEARING BALL ANNULAR 06H23A	Z33C32 3110-01-127-3005	12230	RC	0	RC	0	2520	

DA FORM 2408-16, OCT 1991
EDITION OF MAY 1967 IS OBSOLETE

AIRCRAFT COMPONENT HISTORICAL RECORD
For use of this form see DA PAM 738-751; the proponent agency is DCSLOG
APD LC v2.00

NOMENCLATURE AND WUC *a*	P/N AND NSN *b*	COMPONENT SER NO. LOCATION *c*	NO. PREV O/H *d*	NOMEN INST HRS *e* / NOMEN RMVL HRS *f*	TIME SINCE O/H *g*	COMP INST HRS *h* / COMP RMVL HRS *i*	O/H OR REPLAC LIFE *j*	REPLACE-MENT DUE *(AFCT HRS)* *k*

7. SIGNIFICANT HISTORICAL DATA

REVERSE OF DA FORM 2408-16, OCT 1991

APD LC v2.00
