INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

CORTE: 16 DE NOVIEMBRE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

PRESENTADO POR

CORPORACIÓN AGUA SOMOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CAR-CONV-ASO-2849-2024 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR Y LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Y LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ENTORNOS SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA Y LA GOBERNANZA DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTÁ", PROMOVIENDO ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS.".

BOGOTA D.C. OCTUBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 5
2. OBJETIVO DEL INFORME 5
3. PROGRESO DETALLADO DEL PLAN OPERATIVO: 6
4. PERIODO DE EJECUCION: 11
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 17
5.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONVENIO 17
5.2 PRESUPUESTO AJUSTADOS DEL CONVENIO 17
5.3 APORTES CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR 19
5.4 EJECUCIÓN DE APORTES CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR 19
5.5 APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS 24
5.6 EJECUCIÓN DE APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS 25
5.7 FLUJO DE CAJA DE LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA #30400006713 PARA EL MANEJO EXCLUSIVO DEL CONVENIO. 29
5.8 ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 30400006713 30
6 AVANCE GENERAL DEL CONVENIO 31
7. COMUNICACIONES 32
8. INDICADORES: 32
9. CONCLUSION AVANCE DEL PROYECTO. 39
ANEXOS: 39

TABLA 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 5
TABLA 2. AVANCE FASE DE APRESTAMIENTO 12
TABLA 3. AVANCE FASE CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. 13
TABLA 4. AVANCE FASE 2 AUTODIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL 14
TABLA 5. AVANCE FASE 2.1 DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO 15
TABLA 6. AVANCE FASE 3 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ADECUACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVO. 15
TABLA 7. AVANCE FASE 4 SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE CONSERVACIÓN. 16
TABLA 8. AVANCE FASE 5 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN. 16
TABLA 9. AVANCE FASE 5 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN. 16
TABLA 10. PRESUPUESTO DEL CONVENIO 17
TABLA 11. PRESUPUESTO AJUSTADO DEL CONVENIO 18
TABLA 12. EJECUCIÓN DE APORTES CAR 19
TABLA 13. IMPLEMENTACIONES PAGADAS MES DE JULIO 21
TABLA 14. IMPLEMENTACIONES PAGADAS MES DE AGOSTO 21
TABLA 15. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2025 - CAR 23
TABLA 16. EJECUCIÓN DE APORTES – AGUA SOMOS 25
TABLA 17. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2025 - AGUA SOMOS 27
TABLA 18. DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS CON APORTE DE AGUA SOMOS 28
TABLA 19. FLUJO DE CAJA DE LA CUENTA DESTINADA PARA EL MANEJO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO. 29
TABLA 20. ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30
TABLA 21. DETALLE DE EJECUCIÓN DE APORTES TOTALES 31
TABLA 22. DETALLE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE Y APORTANTE. 31

ILUSTRACIÓN 1. PROGRESO DEL PLAN OPERATIVO 6
ILUSTRACIÓN 2. EJECUCIÓN DE APORTES CAR 20
ILUSTRACIÓN 3. EJECUCIÓN DE APORTES AGUA SOMOS 26
ILUSTRACIÓN 4. EJECUCIÓN DE APORTES CONSOLIDADOS 31
ILUSTRACIÓN 5. EJECUCIÓN TOTAL POR COMPONENTE 32

INTRODUCCIÓN

La Corporación Agua Somos se complace en presentar este informe de actividades, en el cual se destacan los avances significativos logrados en el marco del proyecto "Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua". Este convenio, impulsado con la visión de fortalecer la gestión integral del recurso hídrico, ha continuado su consolidación como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades en Cundinamarca. Durante este periodo, se ha reafirmado el compromiso con un enfoque holístico, que integra la protección ambiental con el empoderamiento comunitario. Las acciones ejecutadas bajo este convenio reflejan una sinergia crucial entre los objetivos de conservación y el bienestar social, alineándose directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la normativa ambiental vigente. Gracias a la participación activa de las comunidades en las microcuencas, y a través de una metodología rigurosa que incluye diagnósticos participativos y planes de adecuación ambiental, se están logrando avances tangibles. Este informe detalla las actividades realizadas, los logros alcanzados y los próximos pasos en la misión de garantizar la seguridad hídrica y una gobernanza del agua más inclusiva y equitativa. La colaboración constante entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y las comunidades sigue siendo el motor de este proyecto, asegurando la sostenibilidad y la resiliencia frente a los desafíos del cambio climático.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

TABLA 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Número del convenio:	2849 de 2024
Objeto:	Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Corporación Agua Somos en la ejecución del proyecto "Entornos sostenibles para la seguridad hídrica y la Gobernanza del Agua en la cuenca del Rio Bogotá.
Valor del convenio:	Seis Mil Trescientos Treinta y Dos Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Veinticuatro pesos ($6.332.287.924) M/CTE
Plazo de ejecución:	15 meses
Fecha de inicio:	08 de noviembre de 2024
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2025

2. OBJETIVO DEL INFORME

Dar a conocer las actividades desarrolladas, los logros alcanzados y los avances obtenidos durante la ejecución del convenio de Asociación No. CAR-CONV-ASO-2849-2024 entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Corporación Agua Somos, correspondiente al período del 16 de noviembre de 2024 al 31 de agosto de 2025.

3. PROGRESO DETALLADO DEL PLAN OPERATIVO:

ILUSTRACIÓN 1. PROGRESO DEL PLAN OPERATIVO



FASE DE APRESTAMIENTO:

La fase de aprestamiento del proyecto se completó al 100%. Se culminó exitosamente el proceso de selección del equipo de trabajo, evaluando las hojas de vida de los profesionales postulados según lo estipulado en el convenio. Agua Somos presentó a los candidatos preseleccionados, detallando sus perfiles, formación y experiencia. Posteriormente, en la reunión del Comité Técnico, se eligió al equipo definitivo, incluyendo un coordinador de campo en asistencia técnica ambiental, un tecnólogo administrativo, seis profesionales de campo ambiental, dos profesionales sociales, un profesional jurídico, un profesional financiero y un profesional SIG. Finalmente, se llevaron a cabo las jornadas de capacitación para el personal seleccionado de acuerdo con el plan operativo del convenio.

FASE 1 CONVOCATORIA Y PUBLICACION DE RESULTADOS:

Estado Actual: Finalizado

Actualmente, la Fase 1 del proyecto, "Convocatoria y Publicación de Resultados", ha alcanzado un avance del 100%. Como resultado, Agua Somos cuenta con la información consolidada de las 40 asociaciones base seleccionadas entregadas por la CAR.

FASE 2: AUTODIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL:

Estado Actual: Finalizado

Registra un avance del 100%. Se ha coordinado con la Corporación Autónoma Regional (CAR) el cronograma de visitas de campo a las 40 asociaciones base, distribuidas estratégicamente en 20 municipios de la cuenca del río Bogotá. Hasta la fecha, se realizaron 40 inspecciones oculares en las bocatomas de los acueductos. Estas inspecciones permitieron la observación *in situ* de las condiciones actuales de las fuentes hídricas, identificando problemas ambientales y recabando información crucial para la fase posterior de planificación. Adicionalmente, se socializó con los presidentes de las juntas el alcance y objetivos del proyecto "Entornos Sostenibles". Como parte del proceso de recopilación de información, se construyó el documento que resume la información secundaria de cada municipio, alcanzando a la fecha un 100% de completitud. Este entregable fundamental ofrecerá un contexto socioeconómico y ambiental para cada una de las áreas de intervención. La culminación de esta fase finalizó con la remisión de este entregable a la CAR mediante el oficio de radicado CAR No. 20251036643 de fecha 26 de marzo de 2025

FASE 2.1: DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO

Estado Actual: En Ejecución

La Fase 2.1 se encuentra actualmente en ejecución y reporta un avance del 80,37% a corte a 31 de agosto de 2025. Un logro significativo durante este periodo es la culminación de los 40 diagnósticos rurales participativos (DRP). Los informes de estos diagnósticos fueron debidamente presentados a la Corporación Autónoma Regional (CAR) mediante el radicado No. 20251069207 el 20 de junio de 2025, y han sido aprobados por el equipo técnico y social de la CAR.

El equipo de campo ambiental, los profesionales sociales, el profesional jurídico y el profesional SIG han trabajado en conjunto para consolidar la información de cada predio que conforma los acueductos donde se proponen las actividades. Esta consolidación incluye una revisión jurídica exhaustiva (abarcando certificados de libertad y tradición, autorizaciones de intervención por predio, cédulas de ciudadanía de los propietarios y conceptos jurídicos individuales) y revisiones cartográficas por predio. Toda esta información se somete a una revisión por parte del equipo técnico, financiero, jurídico y SIG de la CAR, la cual se realiza una vez que la información por acueducto está completa.

Esta fase presenta desafíos importantes. El principal radica en que algunos propietarios que inicialmente manifestaron interés en participar desisten al momento de firmar las autorizaciones, lo que obliga al equipo de campo a retomar las visitas en el territorio y asegurar que los nuevos propietarios participantes no se retracten al momento de la firma de las autorizaciones.

FASE 3: FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ADECUACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVO

- Estado Actual: En Ejecución

La Fase 3, enfocada en la Formulación e Implementación del Plan de Adecuación Ambiental Participativo (PAAP), muestra un avance del 80 %. Este progreso refleja la dedicación del equipo de trabajo en traducir los diagnósticos en acciones concretas, los acueductos que cuentan con la aprobación del plan de adecuación ambiental son 30, estos son los acueductos aprobados en comités técnicos que se adelantaron durante este periodo, el ultimo comité que se realizó fue el día 20 de agosto de 2025:

1. Acueducto No. 3: Asociación De Usuarios Junta Administradora Del Acueducto De Las Veredas De Bosavita, Chinquira
2. Acueducto No. 13 Asociación De Usuarios Del Servicio De Agua De La Vereda De Buenavista
3. Acueducto No. 21 Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De La Vereda Buenos Aires Sector Los Pinos
4. Acueducto No. 22 Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto Y Alcantarillado de La Vereda De El volcán Del Municipio De La Calera Departamento De Cundinamarca
5. Acueducto No. 25 Asociación De Usuarios Propietarios Acueducto Rural Pozo De La Nutria
6. Acueducto No. 26 Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De La Vereda El Salitre E S P.
7. Acueducto No. 27 Asociación De Usuarios De Acueducto De La Vereda Las Margaritas De La Localidad De Usme Santafé De Bogotá D.C
8. Acueducto No. 32 Junta De acción Comunal Del Barrio La Paz
9. Acueducto No. 33 Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas La Esmeralda Montelargo San Jerónimo Milán Y Limonal
10. Acueducto No. 39 Empresa De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De El Rosal S.A. E.S.P.
11. Acueducto No. 1 - Comité Empresarial Del Acueducto Vereda Boitiva

12. Acueducto No. 2: Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal De Chasquez
13. Acueducto No. 5: Asociación De Usuarios Del Acueducto Aposentos Y Capellanía
14. Acueducto No. 7: Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Las Veredas De Chigualá, Sonsa Y Guanguita Sector El Altillo
15. Acueducto No. 8: Junta De Acción Comunal San Joaquín
16. Acueducto No. 15: Acueducto Y Alcantarillado La Honda
17. Acueducto No. 23: Asociación De Suscriptores Del Acueducto Rural De Tres Quebradas
18. Acueducto No. 24: Asociación De Usuarios Acueducto Aguas Claras Vereda Olarte
19. Acueducto No. 29: Junta Administradora Del Acueducto De La Vereda San Benito
20. Acueducto No. 35: Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional De Las Veredas Rasgata Y De Otras De Los Municipios De Tausa Nemocón Cucunuba Sutatausa Y Cogua
21. Acueducto No. 11 Asociación De Suscriptores Del Acueducto El Mohan Vereda San Jose Del Municipio De El Colegio, Departamento De Cundinamarca
22. Acueducto No. 6 Asociación De Suscriptores Del Servicio De Agua Potable De La Vereda Gobernador
23. Acueducto No. 36 Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas Juaica El Carron Juaica El Santuario Y Defensa Del Medio Ambiente Asojuaica
24. Acueducto No. 4 Asociación De Usuarios Del Acueducto De La Merced Y Sector El Triunfo, Villapinzón
25. Acueducto No. 19 Asuartelam
26. Acueducto No. 20 Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional Zipacón Cachipay La Mesa - Acuazicame
27. Acueducto No. 38 Asociación De Usuarios Acueducto Vereda Paloquemao Parte Alta
28. Acueducto No. 40 Acueducto Progresar Esp
29. Acueducto No. 10 Asociación De Usuarios Del Acueducto De Pradilla
30. Acueducto No. 30 Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional De Las Veredas De Arabia, Carolina, Neptuna, La Ruidosa, Pueblo De Piedra, Glasgow, Calandaima Y Magdalena

Acueductos en proceso de análisis y validación técnica, financiera y jurídica por parte de la CAR:

1. Acueducto No. 14 Junta De Acción Comunal Vereda De Nápoles Y Ponchos, San Antonio Del Tequendama
2. Acueducto No. 17 Asociación De Suscriptores Acueducto Vereda Guasimal Aguasimal E.S.P. Aguasimal- Tena

3. Acueducto No. 9 Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional El Triunfo - La Paz.
4. Acueducto No. 31 Asociación De Usuarios Del Acueducto De Vereda Pueblo De Piedra Sector Bajo Del Municipio De Viotá.
5. Acueducto No. 16 Asociación De Usuarios De Acueducto Acuapaz, Anapoima
6. Acueducto No. 12 Asociación De Usuarios Del Acueducto Asuanaponse De Las Veredas Nápoles Ponchos Sebastopol Del Municipio De San Antonio Del Tequedama
7. Acueducto No 28 Asociación De Usuarios Del Acueducto De Integración De Las Veredas De La Inspección De Pradilla El Colegio Departamento Cundinamarca
8. Acueducto No. 18 Asociación Del Acueducto Laguneta Parte Baja – Tena
9. Acueducto No. 34 Asociación De Usuarios Del Acueducto Vereda El Salitre "Asuasal" - Tocancipá

El Acueducto No. 37, correspondiente a la Vereda Ventalarga, Sector El Carrizal de Zipaquirá, presenta dificultades y retrasos significativos que inciden en la implementación del programa. Actualmente, el acueducto , manifestó su intención de no continuar con el proceso, por lo cual se encuentra pendiente la radicación formal del oficio de desistimiento. En caso de confirmarse esta decisión, el acueducto será sustituido por otro previamente preseleccionado por la CAR.

FASE 4: SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE CONSERVACIÓN

- Estado Actual**:** En ejecución

A corte del 31 de agosto de 2025 se cuenta con un avance del 24.7% Desde la Corporación Agua Somos el área jurídica se han elaborado los acuerdos de conservación y contratos de gestión de los treinta (30) acueductos a los que se les aprobó los planes de adecuación ambiental, adicionalmente, se gestionó un primer desembolso de los recursos por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

FASE 5: ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN

- Estado Actual**:** En ejecución

A corte del 31 de agosto de 2025 se cuenta con un avance del 18.3% se han conformado 18 comités de impulso y se ha realizado la coordinación de las actividades según el cronograma establecido en los PAAP, los siguientes son los acueductos que cuentan con los comités de impulso conformados:

1. Acueducto No. 3: Asociación De Usuarios Junta Administradora Del Acueducto De Las Veredas De Bosavita, Chinquira

2. Acueducto No. 13 Asociación De Usuarios Del Servicio De Agua De La Vereda De Buenavista
3. Acueducto No. 21 Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De La Vereda Buenos Aires Sector Los Pinos
4. Acueducto No. 22 Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto Y Alcantarilladode La Vereda De El volcán Del Municipio De La Calera Departamento De Cundinamarca
5. Acueducto No. 25 Asociación De Usuarios Propietarios Acueducto Rural Pozo De La Nutria
6. Acueducto No. 26 Asociación De Usuarios Del Acueducto Rural De La Vereda El Salitre AUAS E S P.
7. Acueducto No. 27 Asociación De Usuarios De Acueducto De La Vereda Las Margaritas De La Localidad De Usme Santafé De Bogotá D.C
8. Acueducto No. 32 Junta De acción Comunal Del Barrio La Paz
9. Acueducto No. 33 Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas La Esmeralda Montelargo San Jerónimo Milán Y Limonal
10. Acueducto No. 39 Empresa De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De El Rosal S.A. E.S.P.
11. Acueducto No. 1 - Comité Empresarial Del Acueducto Vereda Boitiva
12. Acueducto No. 2: Asociación De Usuarios Del Acueducto Veredal De Chasquez
13. Acueducto No. 5: Asociación De Usuarios Del Acueducto Aposentos Y Capellanía
14. Acueducto No. 7: Asociación De Usuarios Del Servicio De Acueducto De Las Veredas De Chigualá, Sonsa Y Guanguita Sector El Altillo
15. Acueducto No. 8: Junta De Acción Comunal San Joaquín
16. Acueducto No. 15: Acueducto Y Alcantarillado La Honda
17. Acueducto No. 23: Asociación De Suscriptores Del Acueducto Rural De Tres Quebradas
18. Acueducto No. 24: Asociación De Usuarios Acueducto Aguas Claras Vereda Olarte

4. PERIODO DE EJECUCION:

A la fecha de 31 de agosto de 2025 corte de este informe, se registra una ejecución física del 65 % de las actividades propuestas en el plan operativo.

FASE DE APRESTAMIENTO:

TABLA 2. AVANCE FASE DE APRESTAMIENTO

Alcances (Fases)	Actividades	Subactividades	Año 2	
			Mes 6 Mar	Obsveraciones
Fase de aprestamiento	Formalización del convenio y firma de acta de inicio	Firma del acta de inicio	**100%**	Se cumple en un 100%
Fase de aprestamiento	Contratación del personal	Emisión de la propuesta laboral	**100%**	
Fase de aprestamiento	Contratación del personal	Recepción y análisis de HdV	**100%**	
Fase de aprestamiento	Contratación del personal	Realización de entrevistas	**100%**	
Fase de aprestamiento	Contratación del personal	Concertación de selección de perfiles para equipo del proyecto	**100%**	
Fase de aprestamiento	Contratación del personal	Contratación	**100%**	
Fase de aprestamiento	Contratación del personal	Inducción	**100%**	
Fase de aprestamiento	Elaboración y presentación del plan operativo	Desarrollo de mesas de trabajo para la elaboración del plan operativo	**100%**	
Fase de aprestamiento		Revisión y validación del plan operativo	**100%**	
Fase de aprestamiento	Comité Técnico	Elaboración de agenda	**100%**	
Fase de aprestamiento	Comité Técnico	Convocatoria	**100%**	
Fase de aprestamiento	Comité Técnico	Presentación del plan operativo	**100%**	
Fase de aprestamiento	Comité Técnico	Aprobación del plan operativo	**100%**	

FASE 1 CONVOCATORIA Y PUBLICACION DE RESULTADOS:

TABLA 3. AVANCE FASE CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.

Alcances (Fases)	Actividades	Subactividades	Año 2	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Definición de mapa de actores	Identificar y listar actores clave a nivel institucional (Alcaldías, Direcciones Regionales) y comunitario (Juntas de Acción Comunal, Juntas de Acueducto, asociaciones y comunidad)	**100%**	**Se cunmple con el 100% de las actividades propuestas, se cuenta con la publicaciòn de 40 organizaciones base**
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Diseño de la Estrategia de Comunicación	Elaborar un plan de comunicación detallado	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Diseño de la Estrategia de Comunicación	Definir los canales de comunicación de la CAR a utilizar (redes sociales, correo electrónico, medios tradicionales, etc.)	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Diseño de la Estrategia de Comunicación	Crear piezas de comunicación específicas para cada canal (post para redes sociales, boletines informativos, correos electrónicos, afiches digitales)	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Puesta en marcha de las campañas de difusión	Publicar los materiales de comunicación en los diferentes canales de la CAR y otros actores estratégicos	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Definición de Criterios para la Selección de Organizaciones de Base	Establecer y documentar los criterios de selección para las organizaciones de base participantes	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Definición de Criterios para la Selección de Organizaciones de Base	Elaborar un formulario de postulación con instrucciones claras y la lista de documentos requeridos.	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Definición de Criterios para la Selección de Organizaciones de Base	Publicar los términos de referencia y los requisitos para la postulación de las organizaciones de base	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Convocatoria y Recepción de Postulaciones	Abrir la convocatoria para la postulación de organizaciones de base dentro de un plazo definido	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Convocatoria y Recepción de Postulaciones	Recibir formularios de postulación y documentos de soporte por parte de las organizaciones interesadas	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Convocatoria y Recepción de Postulaciones	Verificar la completitud de los documentos presentados y hacer seguimiento para corregir posibles errores o faltantes	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Evaluación y Selección de Organizaciones de Base	Conformar un comité evaluador	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Evaluación y Selección de Organizaciones de Base	Evaluar las postulaciones según los criterios definidos	**100%**	
Fase 1: Convocatoria y publicación de resultados	Evaluación y Selección de Organizaciones de Base	Publicar la lista de organizaciones seleccionadas y enviar notificaciones oficiales a las organizaciones aceptadas	**100%**	

FASE 2: AUTODIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL:

TABLA 4. AVANCE FASE 2 AUTODIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL

Alcances (Fases)	Actividades	Subactividades	Año 2	
			Mes 6 Mar	Obsveraciones
Fase 2: Autodiagnóstico e identificación de acciones de fortalecimiento ambiental	Diagnóstico con información secundaria de las organizaciones identificadas en el territorio	Recopilar y analizar información secundaria del municipio, incluyendo datos ambientales, sociales y económicos	**100%**	**Esta fase se encuentra en un 100%**
Fase 2: Autodiagnóstico e identificación de acciones de fortalecimiento ambiental	Diagnóstico con información secundaria de las organizaciones identificadas en el territorio	Elaborar un informe de diagnóstico que detalle las características del municipio y las dinámicas de la microcuenca	**100%**	
Fase 2: Autodiagnóstico e identificación de acciones de fortalecimiento ambiental	Socialización del Proyecto en el Territorio	Coordinar con el equipo técnico de la Dirección de Cultura Ambiental y el socio estratégico para planificar la visita al municipio	**100%**	
Fase 2: Autodiagnóstico e identificación de acciones de fortalecimiento ambiental		Convocar a los representantes de las organizaciones de base para la jornada de socialización del proyecto	**100%**	
Fase 2: Autodiagnóstico e identificación de acciones de fortalecimiento ambiental	Inspección de las Dinámicas Territoriales	Realizar una inspección en sitio para observar las principales actividades económicas, sociales y ambientales del municipio	**100%**	
Fase 2: Autodiagnóstico e identificación de acciones de fortalecimiento ambiental		Documentar observaciones clave y recoger información adicional relevante para el proyecto	**100%**	

FASE 2.1: DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO:

TABLA 5. AVANCE FASE 2.1 DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO

Alcances (Fases)	Actividades	Sub-actividades	Año 2	
			Mes 10 agosto	Observaciones
Fase 2.1: Diagnóstico Rural Participativo	Desarrollo de la actividad de participación comunitaria planteada en la metodología para la socialización del proyecto	Desarrollo de la actividad de participación comunitaria planteada en la metodología para la socilaización del proyecto con la comunidad	**100%**	**80.37%. Los informes de DRP fueron entregados y aprobados por la CAR. Actualmente el equipo de campo se encuentra adelantando visitas para identificar predios en 9 acueductos.**
	Construcción del diagnóstico rural participativo – DRP	Construcción del diagnóstico rural participativo – DRP siguiendo la metodología planteada en las fichas del proyecto	**100%**	
	Visita técnica a los predios propuestos para la implementación del proyecto	Planificación de la Visita Técnica	**100%**	
		Programar la visita técnica a los predios propuestos para la implementación del proyecto	**75%**	
		Coordinar con el equipo técnico y legal para realizar la inspección conjunta en los predios seleccionados	**75%**	
	Validación Técnica y Cartográfica de los Predios	Evaluar en campo las condiciones ambientales del predio	**75%**	
		Realizar el levantamiento cartográfico de las áreas a intervenir	**75%**	
		Verificar la congruencia de las áreas cartografiadas con los objetivos del proyecto y los requerimientos establecidos en el DRP	**75%**	
	Validación Jurídica de los Predios	Revisar los documentos legales de los predios postulados para confirmar la propiedad y/o posesión legal del terreno	**75%**	
		Validar la autorización de intervención con el propietario o poseedor del predio, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales	**75%**	
		Recoger documentación de soporte, como certificados de tradición y libertad, acuerdos de intervención y otros documentos pertinentes	**75%**	
	Definición de Actividades Ambientales a Implementar	Analizar la información técnica y legal recopilada durante la visita para determinar las acciones ambientales específicas a implementar en cada predio.	**75%**	
		Identificar las temáticas ambientales de cada componente del proyecto	**75%**	
		Definir y priorizar las actividades ambientales definitivas para cada predio, alineadas con los componentes del proyecto	**75%**	

FASE 3: FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ADECUACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVO:

TABLA 6. AVANCE FASE 3 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ADECUACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVO.

Alcances (Fases)	Actividades	Sub-actividades	Año 2	
			Mes 10 agosto	Observaciones
Fase 3: Formulación e implementación del Plan de Adecuación Ambiental Participativo	Aprestamiento	Identificación y voluntad de colaboración de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y Agua Somos para: aportar recursos técnicos, financieros y humanos para la formulación, concertación e implementación del Plan de Adecuación Ambiental Participativo (PAAP) con la comunidad asentada en la microcuenca y la organización de base seleccionada.	**100%**	**80% (A la fecha se han aprobado 30 PAAP Y Presupuestos)**
	Consolidación del Plan de Adecuación Ambiental Participativo	Formulación del plan de adecuación ambiental participativo entre el equipo técnico y social de la Corporación y Agua Somos, de la mano con la comunidad, determinando las actividades ambientales definitivas a implementar en el territorio de acuerdo a las temáticas definidas por cada uno de los componentes del proyecto.	**75%**	
		Verificar nuevamente que las acciones a implementar están alineadas con los criterios definidos en la ficha del proyecto	**75%**	
		Elaboración del presupuesto	**75%**	
		Remitir el PAAP al comité técnico del proyecto “Entorno sostenibles para la seguridad hídrica y la gobernanza del agua” para aprobación	**75%**	

FASE 4: SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE CONSERVACIÓN:

TABLA 7. AVANCE FASE 4 SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE CONSERVACIÓN.

Fase 4: Suscripción de acuerdos de conservación	Elaborar un acuerdo de conservación que incluya los compromisos adquiridos para la sostenibilidad de las actividades implementadas	Elaborar un acuerdo de conservación que incluya los compromisos adquiridos para la sostenibilidad de las actividades implementadas	**100%**	**24.7% Desde la Corporación Agua Somos el área jurídica proyecto los acuerdos de conservación aprobados en el comité técnico del convenio y se encuentra en espera a ser aprobados por parte del área jurídica de la CAR.**
	Suscripción del acuerdo de conservación	Coordinar la firma del acuerdo con los representantes legales de las Organizaciones de Base y el Director Regional de la Corporación Ambiental (CAR)	**0%**	
		Firma del acuerdo de conservación	**0%**	
	Gestión de recursos financieros	Establecer acuerdos previos (convenio, subvención u otra modalidad jurídica) para la transferencia de recursos a las Organizaciones de Base	**0%**	
		Gestionar los desembolsos de los recursos por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y/o el socio estratégico	**23,93%**	

FASE 5: ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN

TABLA 8. AVANCE FASE 5 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN.

Fase 5: Acompañamiento técnico e implementación.	Inicio de las actividades	Conformación del comité de impulso	**45%**	**18.3% se han conformado 18 comités de impulso.**
		Coordinación de las actividades según el cronograma establecido en el PAAP	**10%**	
		Organizar y llevar a cabo espacios de formación con la comunidad durante la etapa de implementación	**0%**	

FASE 6: BALANCE DE RESULTADOS:

TABLA 9. AVANCE FASE 5 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN.

Alcances (Fases)	Actividades	Sub-actividades	Año 2	
			Mes 10 agosto	Observaciones
Fase 6: Balance de resultados	Visitas y seguimiento del comité de impulso	Desarrollo reuniones de Comité de Impulso		**Se iniciará una vez finalice la fase 4**
		Visitas de seguimiento de Comité de Impulso		
	Informe de Análisis Técnico, Financiero y de Indicadores	Construcción de informes de análisis técnico, financiero y de indicadores de las acciones priorizadas		
		Construcción de Informe de seguimiento y monitoreo a los acuerdos de conservación		
		Construcción de Informe a indicadores enmarcados en el PAAP		
		Rendición de cuentas		
		Construcción de Informe Final técnico, administrativo, contable-financiero y jurídico de ejecución del plan de adecuación ambiental participativo.		

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

5.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONVENIO

TABLA 10. PRESUPUESTO DEL CONVENIO

PRESUPUESTO CONVENIO

Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Corporación Agua SOMOS en la ejecución del proyecto "Entornos Sostenibles Para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua en la cuenca del Rio Bogotá", promoviendo acciones de fortalecimiento ambiental y participación comunitaria en los diferentes procesos de conservación y restauración que contribuyan a la adaptación al cambio climático y la protección de los ecosistemas.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	APORTE CAR - DINERO	APORTE DINERO - AGUA SOMOS
1. COMPONENTE - PROFESIONALES/ TÉCNICOS									
1.1	COORDINADOR DEL PROYECTO	1	100%	15	$ 8.000.000	$ 120.000.000		$ 32.000.000	$ 88.000.000
1.2	PROFESIONAL JURÍDICO	1	100%	15	$ 6.000.000	$ 90.000.000		$ 24.000.000	$ 66.000.000
1.3	PROFESIONAL FINANCIERO	1	100%	15	$ 6.000.000	$ 90.000.000		$ 24.000.000	$ 66.000.000
1.4	PROFESIONALES SOCIALES	2	100%	15	$ 6.000.000	$ 180.000.000		$ 48.000.000	$ 132.000.000
1.5	PROFESIONAL APOYO SIG	1	100%	15	$ 6.000.000	$ 90.000.000		$ 24.000.000	$ 66.000.000
1.6	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	1	100%	14	$ 4.389.486	$ 61.452.804		$ 13.168.458	$ 48.284.346
1.7	COORDINADOR DE ASISTENCIA TÉCNICA	1	100%	15	$ 6.000.000	$ 90.000.000		$ 24.000.000	$ 66.000.000
1.8	PROFESIONALES DE CAMPO AMBIENTAL	6	100%	15	$ 6.000.000	$ 540.000.000		$ 144.000.000	$ 396.000.000
				SUBTOTAL COMPONENTE 1	**$ 48.389.486**	**$ 1.261.452.804**	**19,9%**	**$ 333.168.458**	**$ 928.284.346**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DE APORTE	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		APORTE CAR - DINERO	APORTE DINERO - AGUA SOMOS
2. COMPONENTE - IMPLEMENTACIÓN									
2.1	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PAAP	40	100%	N/A	$ 120.000.000	$ 4.800.000.000		$ 4.002.367.177,00	$ 797.632.823,00
					SUBTOTAL COMPONENTE 2	**$ 4.800.000.000**	**75,8%**	**$ 4.002.367.177**	**$ 797.632.823**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		APORTE CAR - DINERO	APORTE DINERO - AGUA SOMOS
3. COMPONENTE - TRANSPORTE									
3.1	TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PARA MOVILIZACION TERRITORIO) INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO	2	100%	15	$ 6.500.000	$ 195.000.000		$ 52.000.000	$ 143.000.000
					SUBTOTAL COMPONENTE 3	**$ 195.000.000**	**3,1%**	**$ 52.000.000**	**$ 143.000.000**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		APORTE CAR - DINERO	APORTE DINERO - AGUA SOMOS
4. COMPONENTE - INSUMOS									
4.1	INSUMOS PARA ENCUENTROS (2 ENCUENTROS DE FORMACIÓN POR PROYECTOS)	80	100%	N/A	$ 318.439	$ 25.475.120		$ 25.475.120	
					SUBTOTAL COMPONENTE 4	**$ 25.475.120**	**0,4%**	**$ 25.475.120**	**$ -**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		APORTE CAR - DINERO	APORTE DINERO - AGUA SOMOS
5. COMPONENTE - REVISIÓN JURÍDICA									
5.1	TRÁMITE CERTIFICADO DE DE LIBERTAD Y TRADICIÓN	10	40	N/A	$ 20.900	$ 8.360.000		$ 8.360.000	
					SUBTOTAL COMPONENTE 5	**$ 8.360.000**	**0,1%**	**$ 8.360.000**	**$ -**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		APORTE CAR - DINERO	APORTE DINERO - AGUA SOMOS
6. COMPONENTE- GASTOS ADMINISTRATIVOS									
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (papelería, servicios, Arriendo oficina, gastos generales, publicidad, logistica)	N/A	N/A	15	$ 2.800.000	$ 42.000.000		$ 11.200.000	$ 30.800.000
					6. GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 42.000.000**	**0,7%**	**$ 11.200.000**	**$ 30.800.000**
				TOTAL		**$ 6.332.287.924**	**100%**	**$ 4.432.570.755,00**	**$ 1.899.717.169,00**

5.2 PRESUPUESTO AJUSTADOS DEL CONVENIO

Se presenta el presupuesto ajustado del convenio, de conformidad con lo establecido en el Otrosí Modificatorio N.º 01.

TABLA 11. PRESUPUESTO AJUSTADO DEL CONVENIO

PRESUPUESTO DEL CONVENIO AJUSTADO SEGÚN OTROSÍ MODIFICATORIO N°01								
Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Corporación Agua SOMOS en la ejecución del proyecto "Entornos Sostenibles Para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua en la cuenca del Rio Bogotá", promoviendo acciones de fortalecimiento ambiental y participación comunitaria en los diferentes procesos de conservación y restauración que contribuyan a la adaptación al cambio climático y la protección de los ecosistemas.								
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**% DEDICACIÓN**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CAR**	**APORTE DINERO - AGUA SOMOS**
1. COMPONENTE - PROFESIONALES/ TÉCNICOS								
1.1	COORDINADOR DEL PROYECTO	1	100%	13,20	$ 8.000.000,00	$ 105.600.000,00	$ 32.000.000	$ 73.600.000
1.2	PROFESIONAL JURÍDICO	1	100%	11,03	$ 6.000.000,00	$ 66.200.000,00	$ 24.000.000	$ 42.200.000
1.3	PROFESIONAL FINANCIERO	1	100%	11,27	$ 6.000.000,00	$ 67.600.000,00	$ 24.000.000	$ 43.600.000
1.4	PROFESIONALES SOCIALES	2	100%	11,27	$ 6.000.000,00	$ 135.200.000,00	$ 48.000.000	$ 87.200.000
1.5	PROFESIONAL APOYO SIG	1	100%	11,27	$ 6.000.000,00	$ 67.600.000,00	$ 24.000.000	$ 43.600.000
1.6	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO 1	1	100%	11,27	$ 4.389.486,00	$ 49.454.876,00	$ 13.168.458	$ 115.297.166
	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO 2	2	100%	7,00	$ 4.389.486,00	$ 61.452.804,00		
	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO 3	1	100%	4,00	$ 4.389.486,00	$ 17.557.944,00		
1.7	COORDINADOR DE ASISTENCIA TÉCNICA	1	100%	11,27	$ 6.000.000,00	$ 67.600.000,00	$ 24.000.000	$ 43.600.000
1.8	PROFESIONALES DE CAMPO AMBIENTAL	5	100%	11,27	$ 6.000.000,00	$ 338.000.000,00	$ 144.000.000	$ 259.400.000
	PROFESIONALES DE CAMPO AMBIENTAL	1	100%	10,90	$ 6.000.000,00	$ 65.400.000,00		
					SUBTOTAL COMPONENTE 1	**$ 63.168.458**	**$ 1.041.665.624**	**$ 333.168.458**	**$ 708.497.166**

ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**% DE APORTE**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CAR**	**APORTE DINERO - AGUA SOMOS**
2. COMPONENTE - IMPLEMENTACIÓN								
2.1	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PAAP	40	100%	N/A	$ 120.000.000	$ 4.800.000.000	$ 4.002.367.177,00	$ 797.632.823,00
					SUBTOTAL COMPONENTE 2	**$ 4.800.000.000**	**$ 4.002.367.177**	**$ 797.632.823**

ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CAR**	**APORTE DINERO - AGUA SOMOS**
3. COMPONENTE - TRANSPORTE								
3.1	TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PARA MOVILIZACION TERRITORIO) INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO	3	100%	10,0	$ 13.000.000	$ 390.000.000	$ 52.000.000	$ 364.000.000
		1	100%	2,0	$ 13.000.000	$ 26.000.000	$ -	$ -
					SUBTOTAL COMPONENTE 3	**$ 416.000.000**	**$ 52.000.000**	**$ 364.000.000**

ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CAR**	**APORTE DINERO - AGUA SOMOS**
4. COMPONENTE - INSUMOS								
4.1	INSUMOS PARA ENCUENTROS (2 ENCUENTROS DE FORMACIÓN POR PROYECTOS)	80	100%	N/A	$ 318.439	$ 25.475.120	$ 25.475.120	$ -
					SUBTOTAL COMPONENTE 4	**$ 25.475.120**	**$ 25.475.120**	**$ -**

ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CAR**	**APORTE DINERO - AGUA SOMOS**
5. COMPONENTE - REVISIÓN JURÍDICA								
5.1	TRÁMITE CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN	10	40	N/A	$ 20.900	$ 8.360.000	$ 8.360.000	
					SUBTOTAL COMPONENTE 5	**$ 8.360.000**	**$ 8.360.000**	**$ -**

ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CAR**	**APORTE DINERO - AGUA SOMOS**
6. COMPONENTE- GASTOS ADMINISTRATIVOS								
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (papelería, servicios, Arriendo oficina, gastos generales, publicidad, logistica)	N/A	N/A	15	$ 2.719.145,3	$ 40.787.180	$ 11.200.000	$ 29.587.180
					6. GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 40.787.180**	**$ 11.200.000**	**$ 29.587.180**
					TOTAL		**$ 4.432.570.755,00**	**$ 1.899.717.169,00**

5.3 APORTES CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la cláusula octava de la minuta contractual, a corte 31 de agosto del 2025 se ha recibido el primer desembolso por valor MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($1.773.028.302) M/CTE, a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 30400006713, aperturada por la Corporación Agua Somos para el manejo exclusivo de los fondos del convenio de asociación CAR-CONV-ASO-2849-2024, denominado Entornos Sostenibles.

5.4 EJECUCIÓN DE APORTES CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

El presupuesto se segmenta, asignando la financiación de los primeros cuatro meses a los aportes proporcionados por la CAR o hasta agotar el monto asignado.

TABLA 12. EJECUCIÓN DE APORTES CAR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	MESES	VALOR UNITARIO	APORTE CAR	TOTAL EJECUTADO AÑO 2024	TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1. COMPONENTE - PROFESIONALES/ TÉCNICOS													
1.1	COORDINADOR DEL PROYECTO	1	100%	4,00	$ 8.000.000,00	$ 32.000.000	$ 9.600.000,00	$ 22.400.000,00	$ 32.000.000,00	$ -	$ -	100,00%	0,00%
1.2	PROFESIONAL JURÍDICO	1	100%	4,00	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000	$ -	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00	$ -	$ -	100,00%	0,00%
1.3	PROFESIONAL FINANCIERO	1	100%	4,00	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000	$ -	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00	$ -	$ -	100,00%	0,00%
1.4	PROFESIONALES SOCIALES	2	100%	4,00	$ 6.000.000,00	$ 48.000.000	$ -	$ 48.000.000,00	$ 48.000.000,00	$ -	$ -	100,00%	0,00%
1.5	PROFESIONAL APOYO SIG	1	100%	4,00	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000	$ -	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00	$ -	$ -	100,00%	0,00%
1.6	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO 1	1	100%	3,00	$ 4.389.486,00	$ 13.168.458	$ -	$ 13.168.458,00	$ 13.168.458,00	$ -	$ -	100,00%	0,00%
1.7	COORDINADOR DE ASISTENCIA TÉCNICA	1	100%	4,00	$ 6.000.000,00	$ 24.000.000	$ -	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00	$ -	$ -	100,00%	0,00%
1.8	PROFESIONALES DE CAMPO AMBIENTAL	6	100%	4,00	$ 6.000.000,00	$ 144.000.000	$ -	$ 144.000.000,00	$ 144.000.000,00	$ -	$ -	100,00%	0,00%
				SUBTOTAL COMPONENTE 1	**$ 48.389.486**	**$ 333.168.458**	**$ 9.600.000,00**	**$ 323.568.458,00**	**$ 333.168.458,00**	**$ -**	**$ -**	**100,00%**	**0,00%**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DE APORTE	MESES	VALOR UNITARIO	APORTE CAR	TOTAL EJECUTADO AÑO 2024	TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
2. COMPONENTE - IMPLEMENTACIÓN													
2.1	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PAAP	40	83,38%	N/A	$ 120.000.000	$ 4.002.367.177,00	$ -	$ 918.393.850,11	$ 918.393.850,11	$ 3.083.973.326,89	$ -	22,95%	77,05%
					SUBTOTAL COMPONENTE 2	**$ 4.002.367.177**	**$ -**	**$ 918.393.850,11**	**$ 918.393.850,11**	**$ 3.083.973.326,89**	**$ -**	**22,95%**	**77,05%**


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	APORTE CAR	TOTAL EJECUTADO AÑO 2024	TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
3. COMPONENTE - TRANSPORTE													
3.1	TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PARA MOVILIZACION TERRITORIO) INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO	1	100%	4,0	$ 13.000.000	$ 52.000.000	$ -	$ 52.000.000,00	$ 52.000.000,00	$ -	$ -	100,00%	0,00%
					SUBTOTAL COMPONENTE 3	**$ 52.000.000**	**$ -**	**$ 52.000.000,00**	**$ 52.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**100,00%**	**0,00%**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	APORTE CAR	TOTAL EJECUTADO AÑO 2024	TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
4. COMPONENTE - INSUMOS													
4.1	INSUMOS PARA ENCUENTROS (2 ENCUENTROS DE FORMACIÓN POR PROYECTOS)	80	100%	N/A	$ 318.439	$ 25.475.120	$ -	$ 13.110.607,05	$ 13.110.607,05	$ 12.364.512,95	$ -	51,46%	48,54%
					SUBTOTAL COMPONENTE 4	**$ 25.475.120**	**$ -**	**$ 13.110.607,05**	**$ 13.110.607,05**	**$ 12.364.512,95**	**$ -**	**51,46%**	**48,54%**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	APORTE CAR	TOTAL EJECUTADO AÑO 2024	TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
5. COMPONENTE - REVISIÓN JURÍDICA													
5.1	TRÁMITE CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN	10	40	N/A	$ 20.900	$ 8.360.000	$ -	$ 7.533.600,00	$ 7.533.600,00	$ 826.400,00	$ -	90,11%	9,89%
					SUBTOTAL COMPONENTE 5	**$ 8.360.000**	**$ -**	**$ 7.533.600,00**	**$ 7.533.600,00**	**$ 826.400,00**	**$ -**	**90,11%**	**9,89%**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	APORTE CAR	TOTAL EJECUTADO AÑO 2024	TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
6. COMPONENTE- GASTOS ADMINISTRATIVOS													
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (papelería, servicios, Arriendo oficina, gastos generales, publicidad, logistica)	N/A	N/A	4	$ 2.719.145,3	$ 11.200.000	$ 1.010.521,70	$ 10.189.478,30	$ 11.200.000,00	$ -	$ 704.823,00	100,00%	0,00%
					6. GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 11.200.000**	**$ 1.010.521,70**	**$ 10.189.478,30**	**$ 11.200.000,00**	**$ -**	**$ 704.823,00**	**100,00%**	**0,00%**
					TOTAL	**$ 4.432.570.755,00**	**$ 10.610.521,70**	**$ 1.324.795.993,46**	**$ 1.335.406.515,16**	**$ 3.097.164.239,84**	**$ 704.823,00**	**30,13%**	**69,87%**

ILUSTRACIÓN 2. EJECUCIÓN DE APORTES CAR

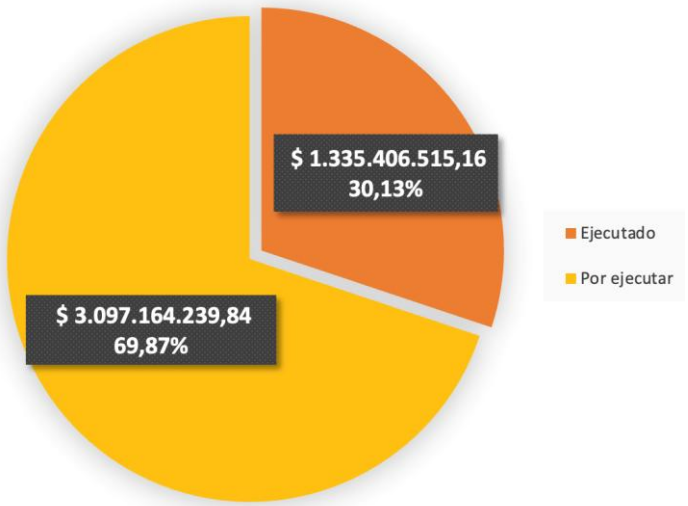

La ejecución del aporte en dinero de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, a corte del 31 de agosto de 2025 asciende a MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($1.335.406.515,16) M/CTE, lo cual representa el 30,13% del total del aporte de la CAR. Los documentos que respaldan la ejecución de los componentes se encuentran adjuntos en el Anexo 3.

Cabe señalar que, del primer desembolso efectuado por la CAR, correspondiente a MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($1.773.028.302) M/CTE, se ha ejecutado a la fecha el 75,32 % sobre este recurso.

- En relación al Componente 1. Profesionales/Técnicos, durante el mes de agosto no se registró ejecución, dado que el 100% de este componente, financiado con aportes de la CAR, fue ejecutado en su totalidad entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, alcanzando un valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($333.168.458) M/CTE.

- En relación al Componente 2. Implementación de Planes PAAP, la ejecución acumulada al mes de agosto alcanza la suma de NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($918.393.850,11) M/CTE, lo que representa el 22,95% de la ejecución presupuestal para este componente. Estos valores corresponden al primer desembolso del 40% de los primeros 20 contratos de gestión. A continuación se presenta el detalle:

TABLA 13. IMPLEMENTACIONES PAGADAS MES DE JULIO

NÚMERO DE CONTRATO DE GESTIÓN	NÚMERO DEL PAAP	MUNICIPIO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR ACUERDO	VALOR PRIMER DESEMBOLSO 40%	FECHA DE PAGO
001	PAAP 22	CALERA	8320029359	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA DE EL VOLCAN	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	29/07/2025
002	PAAP 25	CALERA	8320094969	ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS ACUEDUCTO RURAL POZO DE LA NUTRIA	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	29/07/2025
003	PAAP 33	ANOLAIMA	8320074984	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA MONTELARGO SAN JERONIMO MILAN Y LIMONAL	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	29/07/2025
004	PAAP 26	CALERA	8320043628	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL SALITRE	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	30/07/2025
005	PAAP 27	USME/ BOGOTÁ	9000147343	ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS MARGARITAS DE LA LOCALIDAD DE USME SANTA DE DE BOGOTA D C	$ 107.541.212,82	$ 43.016.485,13	29/07/2025
006	PAAP 32	SIBATÉ	8320059947	JAC BARRIO LA PAZ	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	29/07/2025
007	PAAP 13	LA MESA	8080007560	LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA DE LA VEREDA DE BUENAVISTA	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	29/07/2025
008	PAAP 3	VILLAPINZÓN	9000541306	ASOCIACION DE USUARIOS JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE BOSAVITA CHINQUIRA	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	29/07/2025
				TOTAL		**$ 379.016.485,13**	

TABLA 14. IMPLEMENTACIONES PAGADAS MES DE AGOSTO

NÚMERO DE CONTRATO DE GESTIÓN	NÚMERO DEL PAAP	MUNICIPIO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR ACUERDO	VALOR PRIMER DESEMBOLSO 40%	FECHA DE PAGO
009	PAAP 39	EL ROSAL	9003220727	EMPRESA DE ACUEDUCTO EL ROSAL SA ESP	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	11/08/2025
010	PAAP 21	CALERA	8320059123	VEREDA BUENOS AIRES SECTOR LOS PINOS	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	20/08/2025
011	PAAP 07	VILLAPINZÓN	8320052411	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE CHIGUALA SONSA Y GUANGUITA SECTOR DEL ALTILLO	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	26/08/2025
012	PAAP 23	CALERA	8320005088	ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE TRES QUEBRADAS- SIGLA ARTQ.	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	20/08/2025
013	PAAP 05	CHOCONTÁ	8001674224	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO APOSENTOS Y CAPELLANIA	$ 86.792.493,00	$ 34.716.997,00	20/08/2025
014	PAAP 01	SESQUILÉ	9002909327	COMITÉ EMPRESARIAL DEL ACUEDUCTO CEAB DE LA VEREDA BOITIVA	$ 112.301.680,00	$ 44.920.672,00	20/08/2025
015	PAAP 02	VILLAPINZÓN	8320015749	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE CHASQUEZ.	$ 95.653.217,15	$ 38.261.286,86	20/08/2025
016	PAAP 29	SIBATÉ	8320002653	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN BENITO	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	20/08/2025
017	PAAP 15	TENA	8080041086	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA HONDA	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	20/08/2025
018	PAAP 35	TAUSA	8000954636	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS RASGATA Y DE OTRAS DE LOS MUNICIPIOS DE TAUSA NEMOCON CUCUNUBA SUTATAUSA Y COGUA-SUCUNETA.	$ 110.311.135,00	$ 44.124.454,00	20/08/2025
019	PAAP 08	LA MESA	8080006129	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE INSPECCION SAN JOAQUIN	$ 103.384.887,80	$ 41.353.955,12	20/08/2025
020	PAAP 24	USME/ BOGOTÁ	9001217248	ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO AGUAS CLARAS VEREDA OLARTE – SIGLA ASOAGUASCLARASOLARTE.	$ 120.000.000,00	$ 48.000.000,00	28/08/2025
				TOTAL		**$ 539.377.364,98**	

- En relación al Componente 3. Transporte, durante el mes de agosto no se registró ejecución, dado que el 100% de este componente, financiado con aportes de la CAR, fue ejecutado en su totalidad con corte a mayo de 2025, alcanzando un valor total de CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($52.000.000) M/CTE.

- En relación al Componente 4. Insumos para encuentros, la ejecución acumulada al mes de agosto alcanza la suma TRECE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($13.110.607,05) M/CTE, lo que representa el 51,46% de la ejecución presupuestal para este componente. Estos valores corresponden a la compra de materiales de papelería e insumos, refrigerios, impresión de lona de árbol de problemas, matrices en lona, vinilos plastificados y mapas de microcuencas en material plotter, para la realización de talleres de Diagnósticos Rurales Participativos (DRP).

- En relación al Componente 5. Trámite Certificado de libertad y tradición, la ejecución acumulada al mes de agosto alcanza la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($7.533.600) M/CTE, lo que representa el 90,11% de la ejecución presupuestal para este componente. Estos valores corresponden a la adquisición de 344 certificados.

- En relación con el Componente 6. Gastos Administrativos, la ejecución acumulada al mes de agosto alcanza la suma ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($11.200.000) M/CTE, lo cual representa el 100% de la ejecución presupuestal para este componente. En la tabla N°15, se detalla el desglose de gastos correspondientes al mes de agosto del 2025.

  Durante la vigencia de los años 2024 y 2025, se financiará un 20% del costo del arrendamiento, condominio, servicios públicos, y servicios de internet y comunicaciones de la Corporación Agua Somos, de acuerdo con la dedicación mensual del 20% establecida en el marco del convenio, con el objetivo de cubrir dichos gastos indispensables para mantener la operatividad y asegurar una comunicación continua y efectiva a lo largo del proyecto.

  En relación con estos conceptos, los pagos a los proveedores de dichos servicios serán efectuados inicialmente por la Corporación Agua Somos, cubriendo el valor total de la factura o documento que soporte los gastos. Posteriormente, el valor correspondiente

al 20% del costo, será reembolsado a la Corporación Agua Somos desde la cuenta Bancolombia N° 30400006713 asociada a este convenio.

TABLA 15. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2025 - CAR

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS AGOSTO DEL 2025					DISTRIBUCIÓN DEL GASTO	
Concepto Gasto	Justificacion Gasto Mensual	Vr Unitario	% de Dedicación al proyecto mensual	Valor dedicado al proyecto	CAR	Agua Somos
Arriendo y condominio de la oficina	Arriendo Oficina Administrativa	$ 1.660.184,00	20%	$ 332.037,00	$ 332.037,00	$ -
	Administración conjunto	$ 589.000,00	20%	$ 117.800,00	$ 117.800,00	$ -
Arriendo sala de Juntas	Arriendo sala de Juntas o auditorio	$ 85.000,00	100%	$ 85.000,00	$ 85.000,00	$ -
Servicios Públicos	Servicio de Acueducto y Alcantarillado	$ 87.360,00	20%	$ 17.472,00	$ 17.472,00	$ -
	Servicio de Energía Eléctrica	$ 88.610,00	20%	$ 17.722,00	$ 17.722,00	$ -
Servicio de internet	Internet, telefonía, Tv, Celular	$ 257.461,86	20%	$ 51.492,00	$ 51.492,00	$ -
Gastos Papeleria	Resmas, tapas en yute, legajadores, banderines, notas, ganchos, mtto de impresora	$ 83.300,00	100%	$ 83.300,00	$ 83.300,00	$ -
Financieros	Gastos bancarios y financieros específicos del convenio	$ 2.544.184,09	100%	$ 2.544.184,09	$ 1.238.204,76	$ 1.305.979,33
	Totales	$ 5.395.099,95		$ 3.249.007,09	$ 1.943.027,76	$ 1.305.979,33

Al 31 de agosto de 2025, se registran compromisos pendientes de reintegro a la Corporación Agua Somos por SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($704.823) M/CTE, correspondientes a gastos administrativos del mes de agosto, los cuales en su mayoría fueron pagados por Agua Somos y están pendientes de reembolso desde la cuenta del convenio Entornos Sostenibles. Se exceptúan los gastos financieros por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($2.544.184,09) M/CTE, ya que estos son debitados directamente de la cuenta durante el mismo período. El arriendo de sala de juntas por valor de OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($85.000) M/CTE, y servicio de mantenimiento de impresora por OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS ($83.300) M/CTE, se cancelarán directamente de la cuenta bancaria del proyecto en el mes de septiembre.

Para el período de agosto, se asignó a la Corporación Autónoma Regional -CAR, la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($1.943.027,76) M/CTE, en razón a que el ítem de gastos administrativos correspondiente a la Corporación Autónoma Regional – CAR completó su ejecución al alcanzar el tope de ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($11.200.000) M/CTE, valor máximo establecido que no puede ser excedido.

En consecuencia, dicho ítem se encuentra con el 100% de ejecución, y los gastos administrativos que se generen en adelante serán asumidos directamente por la Corporación Agua Somos.

5.5 APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS

Dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula octava de la minuta contractual, al corte del 31 de agosto de 2025 se han recibido tres desembolsos por parte de Agua Somos: el primero, el 18 de noviembre de 2024, por un valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/CTE, el segundo, el 9 de junio de 2025, por un valor de SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($630.000.000) M/CTE., y el tercer desembolso el 05 de agosto de 2025, por un valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) M/CTE., para un total de MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($1.530.000.000) M/CTE.

Los desembolsos fueron consignados en la cuenta de ahorros Bancolombia N.° 30400006713, aperturada por la Corporación Agua Somos para el manejo exclusivo de los recursos del convenio de asociación CAR-CONV-ASO-2849-2024, denominado "Entornos Sostenibles".

5.6 EJECUCIÓN DE APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS

El presupuesto se segmenta, asignando la financiación de los primeros cuatro meses a los aportes proporcionados por la CAR y los siguientes a la Corporación Agua Somos.

TABLA 16. EJECUCIÓN DE APORTES – AGUA SOMOS


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	MESES	VALOR UNITARIO	APORTE DINERO - AGUA SOMOS	TOTAL EJECUTADO AÑO 2024	TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1. COMPONENTE - PROFESIONALES/ TÉCNICOS													
1.1	COORDINADOR DEL PROYECTO	1	100%	9,20	$ 8.000.000,00	$ 73.600.000	$ -	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 37.600.000,00	$ 5.333.333,00	48,91%	51,09%
1.2	PROFESIONAL JURÍDICO	1	100%	7,03	$ 6.000.000,00	$ 42.200.000	$ -	$ 18.200.000,00	$ 18.200.000,00	$ 24.000.000,00	$ 6.000.000,00	43,13%	56,87%
1.3	PROFESIONAL FINANCIERO	1	100%	7,27	$ 6.000.000,00	$ 43.600.000	$ -	$ 19.600.000,00	$ 19.600.000,00	$ 24.000.000,00	$ 6.000.000,00	44,95%	55,05%
1.4	PROFESIONALES SOCIALES	2	100%	7,27	$ 6.000.000,00	$ 87.200.000	$ -	$ 39.200.000,00	$ 39.200.000,00	$ 48.000.000,00	$ 12.000.000,00	44,95%	55,05%
1.5	PROFESIONAL APOYO SIG	1	100%	7,27	$ 6.000.000,00	$ 43.600.000	$ -	$ 19.600.000,00	$ 19.600.000,00	$ 24.000.000,00	$ 6.000.000,00	44,95%	55,05%
1.6	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO 1	1	100%	8,27	$ 4.389.486,00	$ 115.297.166	$ -	$ 19.606.371,00	$ 19.606.371,00	$ 95.690.795,00	$ 5.267.383,00	17,01%	82,99%
	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO 2	2	100%	7,00	$ 4.389.486,00								
	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO 3	1	100%	4,00	$ 4.389.486,00								
1.7	COORDINADOR DE ASISTENCIA TÉCNICA	1	100%	7,27	$ 6.000.000,00	$ 43.600.000	$ -	$ 19.600.000,00	$ 19.600.000,00	$ 24.000.000,00	$ 6.000.000,00	44,95%	55,05%
1.8	PROFESIONALES DE CAMPO AMBIENTAL	5	100%	7,27	$ 6.000.000,00	$ 259.400.000	$ -	$ 115.400.000,00	$ 115.400.000,00	$ 144.000.000,00	$ 36.000.000,00	44,49%	55,51%
	PROFESIONALES DE CAMPO AMBIENTAL	1	100%	6,90	$ 6.000.000,00								
					SUBTOTAL COMPONENTE 1	**$ 708.497.166**	**$ -**	**$ 287.206.371,00**	**$ 287.206.371,00**	**$ 421.290.795,00**	**$ 82.600.716,00**	**40,54%**	**59,46%**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DE APORTE	MESES	VALOR UNITARIO	APORTE DINERO - AGUA SOMOS	TOTAL EJECUTADO AÑO 2024	TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
2. COMPONENTE - IMPLEMENTACIÓN													
2.1	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PAAP	40	16,62%	N/A	$ 120.000.000	$ 797.632.823,00	$ -		$ -	$ 797.632.823,00	$ -	0,00%	100,00%
					SUBTOTAL COMPONENTE 2	**$ 797.632.823**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 797.632.823,00**	**$ -**	**0,00%**	**100,00%**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	APORTE DINERO - AGUA SOMOS	TOTAL EJECUTADO AÑO 2024	TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
3. COMPONENTE - TRANSPORTE													
3.1	TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PARA MOVILIZACION TERRITORIO) INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO	3	100%	9,0	$ 13.000.000	$ 364.000.000	$ -	$ 52.250.000,00	$ 52.250.000,00	$ 311.750.000,00	$ 26.250.000,00	14,35%	85,65%
		1	100%	1,0	$ 13.000.000								
					SUBTOTAL COMPONENTE 3	**$ 364.000.000**	**$ -**	**$ 52.250.000,00**	**$ 52.250.000,00**	**$ 311.750.000,00**	**$ 26.250.000,00**	**14,35%**	**85,65%**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	APORTE DINERO - AGUA SOMOS	TOTAL EJECUTADO AÑO 2024	TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
6. COMPONENTE- GASTOS ADMINISTRATIVOS													
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (papelería, servicios, Arriendo oficina, gastos generales, publicidad, logistica)	N/A	N/A	11	$ 2.719.145,3	$ 29.587.180	$ -	$ 1.305.979,33	$ 1.305.979,33	$ 28.281.200,67	$ -	4,41%	95,59%
					6. GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 29.587.180**	**$ -**	**$ 1.305.979,33**	**$ 1.305.979,33**	**$ 28.281.200,67**	**$ -**	**4,41%**	**95,59%**
					TOTAL	**$ 1.899.717.169,00**	**$ -**	**$ 340.762.350,33**	**$ 340.762.350,33**	**$ 1.558.954.818,67**	**$ 108.850.716,00**	**17,94%**	**82,06%**

ILUSTRACIÓN 3. EJECUCIÓN DE APORTES AGUA SOMOS

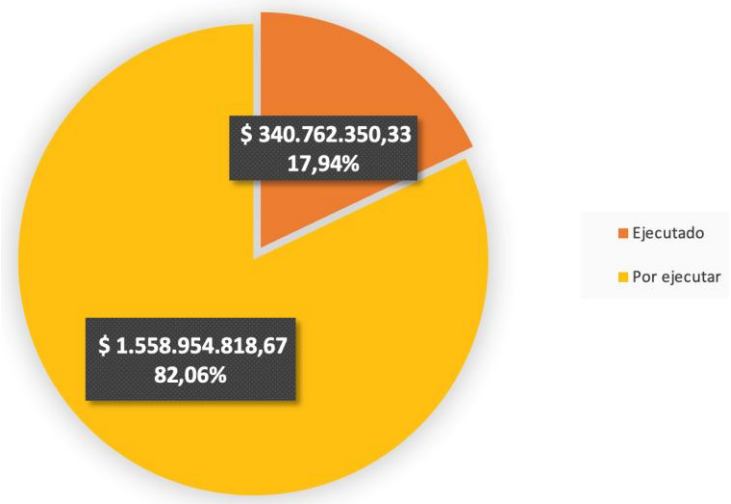

La ejecución del aporte en dinero de la Corporación Agua Somos, a corte del 31 de agosto de 2025 asciende a TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($340.762.350,33) M/CTE, lo cual representa el 17,94% del total del aporte de la Corporación Agua Somos. Los documentos que respaldan la ejecución de los componentes se encuentran adjuntos en el Anexo 3.

- En relación al Componente 1. Profesionales/Técnicos, la ejecución acumulada alcanza la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($287.206.371) M/CTE, lo que representa el 40,54% de la ejecución presupuestal para este componente. Durante el mes de agosto, los valores reportados corresponden a los honorarios del coordinador del proyecto, profesional jurídico, profesional financiero, 2 profesionales sociales, profesional SIG, 2 tecnólogos administrativos, coordinador en asistencia técnica, y 6 profesionales de campo ambiental. El detalle de las cuentas por pagar se presenta en la tabla 18.

- En relación al Componente 3. Transporte, la ejecución acumulada al mes de agosto alcanza la ejecución alcanza la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($52.250.000) M/CTE, lo que representa el 14,35% de la ejecución presupuestal para este componente. Durante el mes de agosto, los valores reportados corresponden al alquiler de cinco camionetas a todo costo, con conductores incluidos: dos de ellas durante 30 días y tres durante 5 días. Para este periodo se encuentra pendiente de pago VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($26.250.000) M/CTE., el cual será efectuado en el mes de septiembre del 2025.

- En relación con el Componente 6. Gastos Administrativos, la ejecución acumulada al mes de agosto alcanza la suma UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($1.305.979,33) M/CTE, lo cual representa el 4,41% de la ejecución presupuestal para este componente. Se detalla el desglose de gastos correspondientes al mes de agosto del 2025 en la siguiente tabla.

TABLA 17. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2025 - AGUA SOMOS

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS AGOSTO DEL 2025					DISTRIBUCIÓN DEL GASTO	
Concepto Gasto	Justificacion Gasto Mensual	Vr Unitario	% de Dedicación al proyecto mensual	Valor dedicado al proyecto	CAR	Agua Somos
Arriendo y condominio de la oficina	Arriendo Oficina Administrativa	$ 1.660.184,00	20%	$ 332.037,00	$ 332.037,00	$ -
	Administración conjunto	$ 589.000,00	20%	$ 117.800,00	$ 117.800,00	$ -
Arriendo sala de Juntas	Arriendo sala de Juntas o auditorio	$ 85.000,00	100%	$ 85.000,00	$ 85.000,00	$ -
Servicios Públicos	Servicio de Acueducto y Alcantarillado	$ 87.360,00	20%	$ 17.472,00	$ 17.472,00	$ -
	Servicio de Energía Eléctrica	$ 88.610,00	20%	$ 17.722,00	$ 17.722,00	$ -
Servicio de internet	Internet, telefonía, Tv, Celular	$ 257.461,86	20%	$ 51.492,00	$ 51.492,00	$ -
Gastos Papeleria	Resmas, tapas en yute, legajadores, banderines, notas, ganchos, mtto de impresora	$ 83.300,00	100%	$ 83.300,00	$ 83.300,00	$ -
Financieros	Gastos bancarios y financieros específicos del convenio	$ 2.544.184,09	100%	$ 2.544.184,09	$ 1.238.204,76	$ 1.305.979,33
	Totales	**$ 5.395.099,95**		**$ 3.249.007,09**	**$ 1.943.027,76**	**$ 1.305.979,33**

Para el período de agosto, se asignó a la Corporación Agua Somos la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($1.305.973,33) M/CTE, en razón a que el ítem de gastos administrativos correspondiente a la Corporación Autónoma Regional – CAR completó su ejecución al 100%. En consecuencia, los gastos administrativos que se generen en adelante serán asumidos por la Corporación Agua Somos.

A corte 31 de agosto del 2025, respecto al componente N° 1 “Profesionales/ Técnicos” se encuentran obligaciones pendientes de pago por un valor de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($82.600.716) M/CTE., los cuales serán efectuados en el mes de septiembre del 2025.

TABLA 18. DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS CON APORTE DE AGUA SOMOS

N° CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	CEDULA	CARGO	ITEM DEL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO MENSUAL	VALOR MENSUAL APALANCADO POR AGUA SOMOS	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	VALORES PTES POR PAGAR CORTE AGOSTO
CPS-C074-2025	LISANDRO RODRIGUEZ HAMON	15.877.195	COORDINADOR DE PROYECTO	1.1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	3/07/25	30/09/25	$ 5.333.333,00
CPS-C088-2025	YENNY CAROLINA ESTUPIÑAN BARRERA	20.928.038	PROFESIONAL JURÍDICO	1.2	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/08/25	31/10/25	$ 6.000.000,00
CPS-C087-2025	SHIRLEY ESTEFANIA VILLAMIZAR PORTILLA	1.090.472.530	PROFESIONAL FINANCIERO	1.3	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/08/25	31/12/25	$ 6.000.000,00
CPS-C079-2025	MARTHA IVONNE TRIANA VARGAS	60.382.343	PROFESIONAL SOCIAL	1.4	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/08/25	31/10/25	$ 6.000.000,00
CPS-C080-2025	DEISY MARCELA CHACÓN HERNÁNDEZ	1.077.148.005	PROFESIONAL SOCIAL	1.4	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/08/25	31/10/25	$ 6.000.000,00
CPS-C078-2025	JOHN JAIRO PORRAS MONDRAGÓN	80.099.214	PROFESIONAL SIG	1.5	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/08/25	31/10/25	$ 6.000.000,00
CPS-C086-2025	CRISTIAN CAMILO CASTAÑEDA VELASCO	1.022.981.490	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	1.6	$ 4.389.486,00	$ 4.389.486,00	1/08/25	31/12/25	$ 4.389.486,00
CPS C095-2025	JUAN DAVID GUTIERREZ FORERO	1.073.511.238	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	1.6	$ 4.389.486,00	$ 4.389.486,00	25/08/25	31/10/25	$ 877.897,00
CPS-C077-2025	JORGE FRANCISCO VELANDIA RAMOS	80.564.043	COORDINADORA DE CAMPO EN ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL	1.7	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/08/25	31/12/25	$ 6.000.000,00
CPS-C081-2025	EDILSON LEONARDO MELO OLARTE	1.074.928.672	PROFESIONAL DE CAMPO AMBIENTAL	1.8	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/08/25	31/10/25	$ 6.000.000,00
CPS-C085-2025	MARIA ALEJANDRA RUBIANO GONZÁLEZ	1.010.183.074	PROFESIONAL DE CAMPO AMBIENTAL	1.8	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/08/25	31/12/25	$ 6.000.000,00
CPS-C083-2025	YENNY BRIGITTE BERMÚDEZ RAMÍREZ	1.016.039.613	PROFESIONAL DE CAMPO AMBIENTAL	1.8	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/08/25	31/12/25	$ 6.000.000,00
CPS-C073-2025	ZULAY ALEXANDRA MARTINEZ CARDENAS	1.077.150.531	PROFESIONAL DE CAMPO AMBIENTAL	1.8	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/07/25	31/12/25	$ 6.000.000,00
CPS-C082-2025	ERICK SEBASTIAN GALINDO RUBIANO	1.069.753.131	PROFESIONAL DE CAMPO AMBIENTAL	1.8	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/08/25	31/10/25	$ 6.000.000,00
CPS-C084-2025	LAURA TATIANA RAMÍREZ SALAZAR	1.014.278.174	PROFESIONAL DE CAMPO AMBIENTAL	1.8	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1/08/25	31/12/25	$ 6.000.000,00
								TOTAL A PAGAR	**$ 82.600.716**

5.7 FLUJO DE CAJA DE LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA #30400006713 PARA EL MANEJO EXCLUSIVO DEL CONVENIO.

TABLA 19. FLUJO DE CAJA DE LA CUENTA DESTINADA PARA EL MANEJO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO.

FLUJO DE CAJA A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025 CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CAR-CONV-ASO-2849-2024 CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 304-0000-6713 CONVENIO ENTORNOS SOSTENIBLES											
DETALLE	**NOVIEMBRE 2024**	**DICIEMBRE 2024**	**ENERO 2025**	**FEBRERO 2025**	**MARZO 2025**	**ABRIL 2025**	**MAYO 2025**	**JUNIO 2025**	**JULIO 2025**	**AGOSTO 2025**	**VALOR TOTAL**
INGRESOS											
Primer Desembolso Agua Somos (18-11-2024)	$ 500.000.000,00										$ 500.000.000,00
Primer Desembolso CAR (05-12-2024)		$ 1.773.028.302,00									$ 1.773.028.302,00
Segundo Desembolso Agua Somos (09-06-2025)								$ 630.000.000,00			$ 630.000.000,00
Tercer Desembolso Agua Somos (05-08-2025)										$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00
Rendimientos Financieros	$ 52.057,05	$ 686.171,49	$ 767.205,38	$ 690.263,33	$ 742.089,83	$ 676.237,22	$ 670.957,84	$ 828.122,99	$ 805.454,54	$ 711.439,84	$ 6.629.999,51
Devolución de Anticipos							$ 434.429,98				$ 434.429,98
Reintegro por parte de Bancolombia de la Retención en la Fuente, debido a exoneración aplicada en la cuenta.							$ 254.542,00				$ 254.542,00
Reintegro por parte de Bancolombia de Impuesto Gobierno 4x1000							$ 1.018,56				$ 1.018,56
Ajuste al peso en Reintegro Bancolombia							$ 100,00				$ 100,00
Otros ajustes al peso							$ 0,02				$ 0,02
Reintegro de Gastos Bancarios											$ -
TOTAL INGRESOS	**$ 500.052.057,05**	**$ 1.773.714.473,49**	**$ 767.205,38**	**$ 690.263,33**	**$ 742.089,83**	**$ 676.237,22**	**$ 1.361.048,40**	**$ 630.828.122,99**	**$ 805.454,54**	**$ 400.711.439,84**	**$ 3.310.348.392,07**
EGRESOS											
(-) Pagos efectuados	$ -	$ 10.027.872,00	$ 480.799,00	$ 28.236.447,74	$ 100.257.042,72	$ 97.867.489,00	$ 92.567.743,98	$ 93.541.956,00	$ 481.720.611,13	$ 634.688.187,98	$ 1.539.388.149,55
(-) Legalización de Anticipos				$ 1.216.300,00	$ 1.174.620,04	$ 2.741.070,02	-$ 342.029,98	$ 1.752.000,00	$ 1.160.700,00	$ 1.925.160,01	$ 9.627.820,09
(-) Anticipos				$ 5.883.475,00	$ 1.998.129,96	$ 1.020.929,98	$ 4.505.600,00			$ 817.589,99	$ 14.225.724,93
(-) Gravamen a los movimientos financieros y otros gastos bancarios	$ -	$ 50.171,70		$ 138.415,62	$ 404.986,56	$ 398.291,85	$ 381.079,69	$ 375.170,99	$ 1.925.269,95	$ 2.544.184,09	$ 6.217.570,45
(-) Retención en la fuente a los rendimientos financieros	$ 3.648,00	$ 48.031,00	$ 53.701,00	$ 48.317,00	$ 51.951,00	$ 47.345,00	$ 1.549,00	$ -			$ 254.542,00
Ajuste al peso											$ -
TOTAL EGRESOS	**$ 3.648,00**	**$ 10.126.074,70**	**$ 534.500,00**	**$ 35.522.955,36**	**$ 103.886.730,28**	**$ 102.075.125,85**	**$ 97.113.942,69**	**$ 95.669.126,99**	**$ 484.806.581,08**	**$ 639.975.122,07**	**$ 1.569.713.807,02**
DISPONIBLE EN BANCO SEGÚN EXTRACTO	**$ 500.048.409,05**	**$ 2.263.636.807,84**	**$ 2.263.869.513,22**	**$ 2.229.036.821,19**	**$ 2.125.892.180,74**	**$ 2.024.493.292,11**	**$ 1.928.740.397,82**	**$ 2.463.899.393,82**	**$ 1.979.898.267,28**	**$ 1.740.634.585,05**	**$ 1.740.634.585,05**
PENDIENTES POR PAGAR											
(-) Cuentas por pagar										$ 109.555.539,00	$ 109.555.539,00
(-) Reintegro de Rendimientos Financieros corte Agosto a la Car y Corporación Agua Somos	$ 52.057,05	$ 686.171,49	$ 767.205,38	$ 690.263,33	$ 742.089,83	$ 676.237,22	$ 670.957,84	$ 828.122,99	$ 805.454,54	$ 711.439,84	$ 6.629.999,51
SALDO NETO DISPONIBLE	**$ 499.996.352**	**$ 2.262.950.636**	**$ 2.263.102.308**	**$ 2.228.346.558**	**$ 2.125.150.091**	**$ 2.023.817.055**	**$ 1.928.069.440**	**$ 2.463.071.271**	**$ 1.979.092.813**	**$ 1.630.367.606**	**$ 1.624.449.047**

A corte 31 de agosto del 2025 se evidencia un saldo en bancos por valor de MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS ($1.740.634.585,05) M/CTE. Este valor se encuentra soportado en el extracto bancario adjunto en el Anexo 3.

5.8 ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 30400006713

En relación con los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 304-0000-6713, durante los meses de noviembre del 2024 a agosto del 2025, se han generado rendimientos por un total de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($6.629.999,51) M/CTE.

A continuación, se relaciona el detalle de los financieros producidos sobre los aportes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Corporación Agua Somos.

TABLA 20. ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 304-0000-6713 CONVENIO ENTORNOS SOSTENIBLES			
MES	VALOR DE RENDIMIENTOS	DISTRIBUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	
		CAR	AGUA SOMOS
NOVIEMBRE 2024	$ 52.057,05	$ -	$ 52.057,05
DICIEMBRE 2024	$ 686.171,49	$ 534.545,79	$ 151.625,70
ENERO 2025	$ 767.205,38	$ 597.633,30	$ 169.572,08
FEBRERO 2025	$ 690.263,33	$ 535.265,31	$ 154.998,02
MARZO 2025	$ 742.089,83	$ 567.308,33	$ 174.781,50
ABRIL 2025	$ 676.237,22	$ 509.467,18	$ 166.770,04
MAYO 2025	$ 670.957,84	$ 500.405,92	$ 170.551,92
JUNIO 2025	$ 828.122,99	$ 460.881,30	$ 367.241,69
JULIO 2025	$ 805.454,54	$ 400.402,72	$ 405.051,82
AGOSTO 2025	$ 711.439,84	$ 179.387,32	$ 532.052,52
TOTAL INGRESOS	**$ 6.629.999,51**	**$ 4.285.297,17**	**$ 2.344.702,34**

Estos valores se determinaron con base en el análisis del movimiento bancario de ingresos y egresos de cada aportante. El cálculo detallado puede consultarse en la pestaña 11 del Anexo N° 2 “Informe Financiero Excel” del presente informe.


6 AVANCE GENERAL DEL CONVENIO

Una vez presentada la información detallada por rubros de ejecución de los Aportes realizados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Corporación Agua Somos, se puede concluir que a corte de este Informe se ha realizado una ejecución total del Proyecto del 26,47% y aun se tiene pendiente una ejecución del 73,53%.

TABLA 21. DETALLE DE EJECUCIÓN DE APORTES TOTALES

APORTANTES	APORTES DINERO	% APORTE AL CONVENIO	VALOR EJECUTADO PROYECTADO CORTE 31 DE AGOSTO	VALOR NO EJECUTADO	% EJECUTADO	% NO EJECUTADO
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR	$ 4.432.570.755	70%	$ 1.335.406.515,16	$ 3.097.164.239,84	30,13%	69,87%
Corporación Agua Somos	$ 1.899.717.169	30%	$ 340.762.350,33	$ 1.558.954.818,67	17,94%	82,06%
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 6.332.287.924**	**100%**	**$ 1.676.168.865,49**	**$ 4.656.119.058,51**	**26,47%**	**73,53%**

ILUSTRACIÓN 4. EJECUCIÓN DE APORTES CONSOLIDADOS

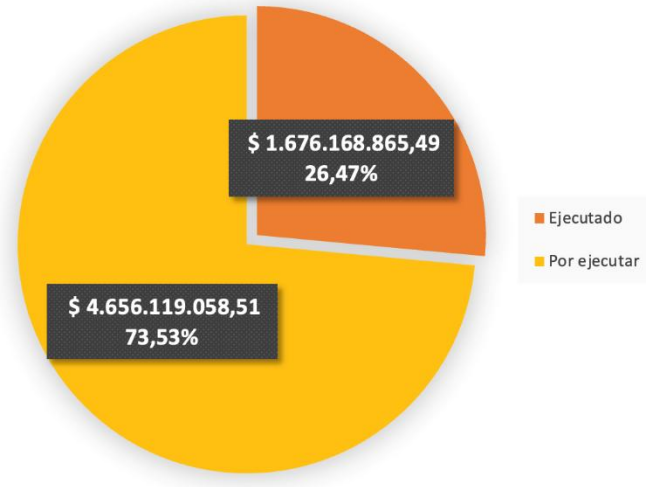


Del total del convenio por valor SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($6.332.287.924) M/CTE, al 31 de agosto del 2025, se han ejecutado MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.676.168.865,49) M/CTE., los cuales han sido destinados de la siguiente manera:

TABLA 22. DETALLE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE Y APORTANTE.

EJECUCIÓN POR COMPONENTE Y APORTANTE A 31 DE AGOSTO 2025							
COMPONENTES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN CAR	EJECUCIÓN AGUA SOMOS	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN POR ITEM	% SOBRE LO EJECUTADO	POR EJECUTAR
1. Profesionales / Técnicos	$ 1.041.665.624	$ 333.168.458	$ 287.206.371	$ 620.374.829,00	59,56%	37,01%	$ 421.290.795,00
2. Implementación	$ 4.800.000.000	$ 918.393.850	$ -	$ 918.393.850,11	19,13%	54,79%	$ 3.881.606.149,89
3. Transporte	$ 416.000.000	$ 52.000.000	$ 52.250.000	$ 104.250.000,00	25,06%	6,22%	$ 311.750.000,00
4. Insumos	$ 25.475.120	$ 13.110.607		$ 13.110.607,05	51,46%	0,78%	$ 12.364.512,95
5. Revisión Jurídica	$ 8.360.000	$ 7.533.600		$ 7.533.600,00	90,11%	0,45%	$ 826.400,00
6. Gastos Administrativos	$ 40.787.180	$ 11.200.000	$ 1.305.979	$ 12.505.979,33	30,66%	0,75%	$ 28.281.200,67
Total	**$ 6.332.287.924**	**$ 1.335.406.515,16**	**$ 340.762.350,33**	**$ 1.676.168.865,49**	**26,47%**	**100,00%**	**$ 4.656.119.058,51**

ILUSTRACIÓN 5. EJECUCIÓN TOTAL POR COMPONENTE

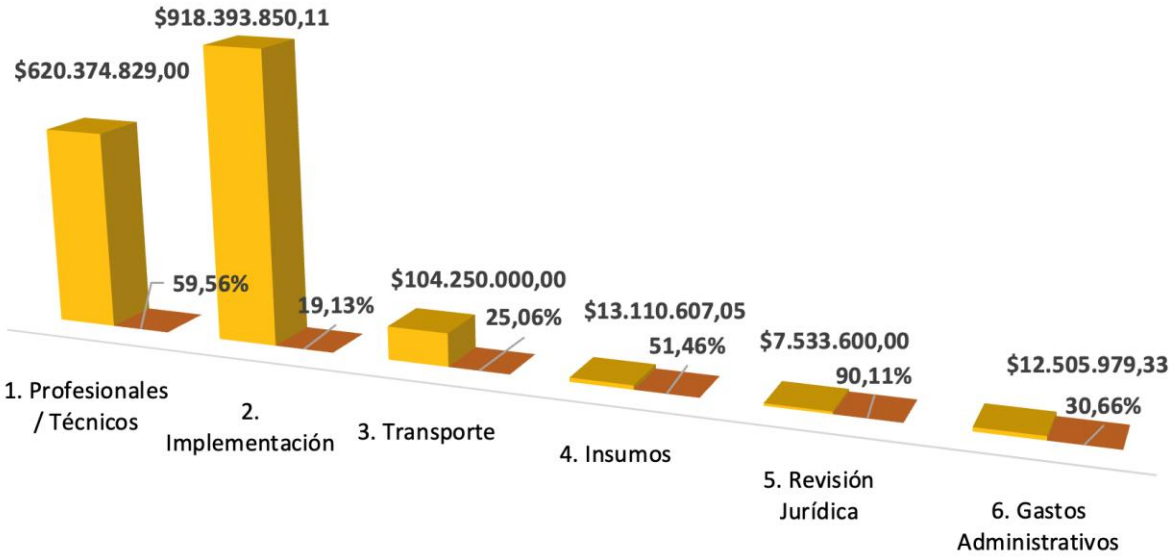

7. COMUNICACIONES

Este capítulo se presenta un resumen de las actas de reunión y los compromisos adquiridos durante los comités técnicos del convenio:

1.Comité técnico ordinario No. 11 (Anexo 1).

Se realizó con la presencia de todos sus miembros, quienes revisaron el progreso del plan operativo con corte al 20 de agosto de 2025. Se destacó que las fases de Aprestamiento, Convocatoria y Publicación de Resultados, y Autodiagnóstico e Identificación de Acciones de Fortalecimiento Ambiental (Fase 2) están completadas al 100%. La Fase 2.1: Diagnóstico Rural Participativo mostró un 80,37% de avance, con 40 diagnósticos rurales participativos aprobados, verificaciones jurídica y cartográfica. La Fase 3: Formulación e Implementación de planes de adecuación ambiental avance 80% teniendo en la cuenta los 10 PAAP adicionales que fueron aprobados en este comité. Por otro lado, fueron aprobadas tres perfiles que se presentaron para ocupar las vacantes de tecnólogos administrativos (Gloria Acero, Juan Gutiérrez y Camilo Munar).

8. INDICADORES:

A partir de la implementación de cada una las actividades acordadas en los planes de adecuación ambiental participativo (PAAP), Acueducto No. 11 Asociación De Suscriptores Del Acueducto El Mohan Vereda San José Del Municipio De El Colegio, Departamento De Cundinamarca – El Colegio. Acueducto No. 6 Asociación De Suscriptores Del Servicio De Agua Potable De La Vereda Gobernador – Sesquilé. Acueducto No. 36 Asociación De Usuarios Del Acueducto De Las Veredas Juaica El Carron Juaica El Santuario Y Defensa Del Medio Ambiente Asojuaica – Tabio. Acueducto No. 4 Asociación De Usuarios Del Acueducto

De La Merced Y Sector El Triunfo – Villapinzón. Acueducto No. 19 Asuartelam – Tena. Acueducto No. 20 Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional Zipacón Cachipay La Mesa – Acuazicame – Cachipay. Acueducto No. 38 Asociación De Usuarios Acueducto Vereda Paloquemao Parte Alta – Zipacón. Acueducto No. 40 Acueducto Progresar Esp – La Calera. Acueducto No. 10 Asociación De Usuarios Del Acueducto De Pradilla – El Colegio. Acueducto No. 30 Asociación De Usuarios Del Acueducto Regional De Las Veredas De Arabia, Carolina, Neptuna, La Ruidosa, Pueblo De Piedra, Glasgow, Calandaima Y Magdalena - Viotá, se efectuará seguimiento y análisis técnico al comportamiento de los indicadores establecidos, como ruta para garantizar el cumplimiento de la meta definida en el marco lógico de los PAAP, que se desarrollan con cada Organizaciones Base.

En el marco de los PAAP desarrollados y citados en el párrafo anterior, se abordarán los siguientes indicadores, que son la ruta de validación, verificación y reporte por parte de la Corporación Agua Somos; cabe mencionar que el cálculo de algunos indicadores dependerá de la disponibilidad de información con que cuenten los acueductos:

Indicador	**Restauración participativa en microcuencas abastecedoras a partir de acuerdos de conservación**
Código de indicador	04.1.2.2.
Descripción	Restauración participativa de 1600 Hectáreas adelantada en microcuencas abastecedoras generadas a partir de acciones comunitarias y acuerdos de conservación
Fuente de información	La restauración participativa adelantada en microcuencas surgen del levantamiento de información directa con las comunidades asentadas en las microcuencas abastecedoras y el cumplimiento de las actividades del Plan de Adecuación Ambiental Participativo que se enfocan a la restauración; información que es recopilada y consolidada por el equipo técnico de la Corporación o socio estratégico, en el marco de la implementación del proyecto entornos sostenibles para la gobernanza del Recurso Hídrico de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano.
Periodicidad	Trimestral
Metodología del calculo	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas restauradas participativamente en las microcuencas abastecedoras presentes en el territorio CAR en relación con lo planeado, mediante el desarrollo de dos subactividades. Para medir el avance de la misma, se determinó un peso porcentual por cada una de las dos subactividades, de acuerdo a lo siguiente: 50% para la Caracterización de áreas a restaurar (CARAREST) 50% para la Actividad de plantación y mantenimiento (PLANTAMANT) La actividad de acuerdo con las anteriores subactividades se medirá así: HRP= Hectáreas restauradas participativamente (CARAREST)= Levantamiento cartográfico de las áreas a intervenir 50%(LEVCARTO)+ Determinar las actividades ambientales a implementar 50%(ACTIAMBIEN) (PLANTAMANT)= Plantación de especies nativas según el territorio 60% (SELECESPECIE)+ Implementar prácticas sostenibles para el mantenimiento de siembra (IMPLESITESIEMBRA) 40%
Fórmula de caculo	HRP= (CARAREST*50%)+ (PLANTAMANT*50%)
Unidad de medida	Porcentaje

Indicador	Escorrentía evitada
Código de indicador	NA.
Descripción	El método de escorrentía de número de curva (comúnmente conocido como el método de número de curva), es un método empírico para estimar las cantidades de escorrentía basadas en la cobertura del suelo, el uso, el suelo y la pendiente.
Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a la que origine y concreten en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP), en referencia a la conservación (protección o preservación) de bosques o coberturas naturales, y la restauración de las coberturas naturales. Adicionalmente, requiere otros insumos de referencia respecto a definición de la precipitación, pendiente, línea base del área, y evaporación potencial, entre otros.
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	Generalmente se calculan como un beneficio volumétrico promedio anual a largo plazo durante la duración del proyecto Este método empírico para estimar las cantidades de escorrentía basadas en la cobertura del suelo, el uso, el suelo y la pendiente, teniendo en cuenta los cambios temporales en la precipitación y el contenido de agua del suelo. Paso 1 $$Q = \frac{(P-0.2S)^2}{(P+0.8S)} \quad (1)$$ *Q = Escorrentía (milímetros)* *P = Precipitación (milímetros)* *S = Retención máxima potencial después de que comience la escorrentía (milímetros)* Paso 2. El parámetro de retención (S) está relacionado con el número de curva (CN) de la siguiente manera. El factor de retención S se calcula en función de la evapotranspiración potencial y el clima antecedente
Fórmula de caculo	$$S = \frac{25{,}400}{CN} - 254 \quad (2)$$ Paso 3. El volumen de escorrentía se calcula multiplicando la suma de la profundidad de escorrentía diaria y el área de superficie $$VWB = Q_{\text{"Baseline"}} - Q_{\text{"With-project"}} \quad (3)$$
Unidad de medida	Volumen de escorrentía

Reporte	Numero de árboles establecidos
Código de reporte	NA.
Descripción	Hace parte del resultado de las implementaciones de enriquecimiento forestal concertados en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP).
Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a la que origine y concreten en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP), y se reporte finalmente en los informes de seguimiento a la actividad de enriquecimiento forestal.
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	Corresponderá a la suma de árboles establecidos en las actividades de enriquecimiento forestal protector, enriquecimiento forestal natural y

	conectividad forestal en cada una de las microcuencas intervenidas (organizaciones). #AE = ∑ #AEFP+#AEFN+#ACF
Fórmula de caculo	#AE = Número de árboles Establecidos #AEFP = Número árboles Establecidos Enriquecimiento Forestal Protector #AEFN = Número árboles Establecidos Enriquecimiento Forestal Natural #ACF = Número árboles Establecidos Conectividad Forestal
Unidad de medida	Numero de árboles

Reporte	**Metros lineales de cercado tradicional establecido**
Código de reporte	NA.
Descripción	Hace parte del resultado de las implementaciones del aislamiento tradicional (cercado de púas) concertados en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP)
Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a la que origine y concreten en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP), y se reporte finalmente en los informes de seguimiento a la actividad de cercado tradicional establecido.
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	Corresponderá a la suma de metros lineales de cercado tradicional establecidos en cada una de las microcuencas intervenidas (organizaciones). $MLCE= \sum CEO_1+ CEO_2+ CEO_3+ CEO_{n...}$
Fórmula de caculo	MLCE = Metros lineales de cercado establecido CEO_1 = Cercado establecido organización 1
Unidad de medida	Metros lineales

Reporte	**Número de apiarios instalados**
Código de reporte	NA.
Descripción	Hace parte del resultado de las implementación de apiarios concertados en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP)
Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a la que origine y concreten en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP), y se reporte finalmente en los informes de seguimiento a la actividad de apiarios – kit para manejo.
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	Corresponderá a la suma de apiarios establecidos en cada una de las microcuencas intervenidas (organizaciones). $\#AI= \sum \#AO_1+ \#AO_2+ \#AO_3+ \#AO_{n...}$
Fórmula de caculo	#AI = Número de apiarios instalados $\#AIO_1$ = Número de apiarios instalados organización 1
Unidad de medida	Número

Reporte	**Cambio de uso del suelo a un mejor uso (reconversión)**
Código de reporte	NA.
Descripción	Hace parte del resultado de la actividad de instalación de parcelas agroforestales, que busca efectuar un cambio de uso del suelo hacia sistemas sostenible de producción agrícola (reconversión).
Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a la que origine y concreten en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP), en lo referentes a la actividad de instalación de parcelas agroforestales, y que será reportado en los respectivos informes de seguimiento.
Periodicidad	Anual (final del proyecto)

Metodología del calculo	Corresponderá a la suma en área de las parcelas agroforestales establecidas en las microcuencas abastecedoras abordadas en el proyecto $ACU = \sum ACUM_{(1)} + ACUM_{(2)} + ACUM_{(3)}.....$
Fórmula de caculo	ACU = Área con cambio de uso $ACUM_{(1)}$ = Área con cambio de uso microcuenca 1
Unidad de medida	Hectáreas

Reporte	**Número de abrevaderos instalados**
Código de reporte	NA.
Descripción	Hace parte del resultado de las instalación de abrevaderos para ganado concertados en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP)
Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a la que origine y concreten en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP), y se reporte finalmente en los informes de seguimiento a la actividad de instalación de abrevaderos.
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	Corresponderá a la suma de abrevaderos instalados en cada una de las microcuencas intervenidas (organizaciones). $\#AGI = \sum \#AGIO_1 + \#AGIO_2 + \#AGIO_3 + \#AGIO_{n...}$
Fórmula de caculo	#AGI = Número de abrevaderos para ganado instalados $\#AGIO_1$ = Número de abrevaderos para ganado instalados por organización 1
Unidad de medida	Número

Reporte	**Aumento de la capacidad de almacenamiento del recurso hídrico del acueducto**
Código de reporte	NA.
Descripción	Hace parte del resultado de la actividad de instalación de tanques de almacenamiento de agua potable, que busca obtener una reserva para distribuir el recurso hídrico y garantizar su disponibilidad en situaciones de desabastecimiento.
Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a la que origine y concreten en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP), se reporte finalmente en los informes de seguimiento de la actividad de instalación de tanques de almacenamiento de agua potable.
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	Corresponderá a la suma en volumen de cada uno de los tanques de almacenamiento de agua potable instalados en las microcuencas intervenidas (organizaciones). $ACARHA = \sum (\#TI_{(1)} * VAT) + (\#TI_{(2)} * VAT) + (\#TI_{(n)} * VAT)$
Fórmula de caculo	ACARHA = Aumento de la capacidad de almacenamiento del recurso hídrico del acueducto $\#TI_{(i)}$ = No de tanques instalados acueducto 1 VAT = Volumen almacenado tanque
Unidad de medida	Litros

Reporte	**Aumento de la capacidad de almacenamiento del recurso hídrico comunidad**
Código de reporte	NA.
Descripción	Hace parte del resultado de la actividad de instalación de sistemas de recolección de aguas lluvias, que busca brindan almacenamiento para el agua lluvia antes de su distribución para fines domésticos

Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a la que origine y concreten en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP), en lo referentes a la actividad de instalación de sistemas de recolección de aguas lluvias
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	Corresponderá a la suma en volumen de cada uno de los tanques de almacenamiento de agua potable instalados en los predios de participantes del proyecto $ACARHC= \sum (\#TI_{(1)}*VAT)+(\#TI_{(2)}*VAT)+(\#TI_{(n)}*VAT)$
Fórmula de caculo	ACARHA = Aumento de la capacidad de almacenamiento del recurso hídrico comunidad $\#TI_{(i)}$ = No de tanques instalados hogar 1 VAT = Volumen almacenado tanque
Unidad de medida	Litros

Reporte	**Número de tanques con mantenimiento – impermeabilización**
Código de reporte	NA.
Descripción	Hace parte del resultado del desarrollo de la actividad de impermeabilización de tanques para el almacenamiento de agua potable, que se concretan a intervenir, y se incluyen en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP)
Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a la que origine y concreten en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP), y se reporte finalmente en los informes de seguimiento de la actividad de impermeabilización de tanques para el almacenamiento de agua potable
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	Corresponderá a la sumatoria de tanques para el almacenamiento de agua potable con tratamiento de impermeabilización en cada una de las microcuencas intervenidas (organizaciones). $\#TI= \sum \#TIO_1+ \#TIO_2+ \#TIO_3+ \#TIO_{n...}$
Fórmula de caculo	#TI = Número de tanques para el almacenamiento de agua potable con tratamiento de impermeabilización TIO_1 = Número de tanques para el almacenamiento de agua potable con tratamiento de impermeabilización en la organización 1
Unidad de medida	Número

Indicador	**Volumen proporcionado**
Código de indicador	NA.
Descripción	El volumen proporcionado permite estimar el beneficio volumétrico asociado a actividades donde se incorpore agua para uso productivo o acceso al agua (consumo).
Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a la que origine y concreten en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP), e información del prestador de servicios de agua potable (acueducto) Este indicador será objeto de revisión y validación de aplicación en actividades asociadas a la instalación de tanques para almacenamiento de agua, y sistemas de recolección de aguas lluvias. Su posibilidad de análisis corresponderá a la posibilidad de determinación (suministro de información) de entradas requeridas para el cálculo.
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	El volumen proporcionado puede calcularse sobre la base del número de beneficiarios directos que reciben acceso razonable al agua. Este método se puede aplicar utilizando una hoja de cálculo, siempre que los datos de entrada estén fácilmente disponibles

Fórmula de caculo	*VWB = Volumen medio anual de agua potable suministrada*
Unidad de medida	Volumen

Reporte	**Número de personas participantes en encuentros de reconocimiento de fauna y flora**
Código de reporte	NA.
Descripción	Hace parte del desarrollo de los recorridos ambientales de la comunidad presente en las microcuencas y donde se abordará el reconocimiento de la fauna y flora local.
Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a los resultados de participantes de los espacios destinados a los recorridos; recogidos en el respectivos soportes, dentro de ellos el listado de asistencia y registro fotográfico como insumos clave.
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	Corresponderá a la suma de personas participantes de la comunidad en cada uno de los recorridos ambientales donde se abordará el reconocimiento de la fauna y flora local, y que serán convocados en el marco de la iniciativa
Fórmula de caculo	$NPRA= \sum (\#PPRA_{(1)}+\#PPRA_{(2)}+\#PPRA_{(n)}..$ NPRA = Número de personas que participan en recorridos ambientales #PPRA = Número de personas que participan en recorridos ambientales por organización
Unidad de medida	Número de personas

Reporte	**Número de personas participantes en encuentros de formación participativos**
Código de reporte	NA.
Descripción	Hace parte desarrollo de los encuentros de formación participativos donde se abordará la temática de adaptación al cambio climático basado en comunidades. Como una estrategia de adaptación en la cual una comunidad está posicionada como el actor protagonista en procesos que tienen como objetivo disminuir su vulnerabilidad frente a impactos reales o esperados del cambio climático.
Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a los resultados de participantes de los espacios de formación, recogidos en el respectivos soportes de los encuentros de formación, dentro de ellos el listado de asistencia como insumo clave.
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	Corresponderá a la suma de personas participantes de la comunidad en cada uno de los encuentro de formación convocados en el marco de la iniciativa
Fórmula de caculo	$NPEF= \sum (\#PPE_{(1)}+\#PPE_{(2)}+\#PPE_{(n)}..$ NPEF = Número de personas que participan en encuentros de formación #PPE = Número de personas que participan en encuentro
Unidad de medida	Número de personas

Reporte	**Número de casas de semillas establecidas**
Código de reporte	NA.
Descripción	Corresponde a la implementación de acciones de conservación y propagación de especies nativas y emblemáticas, en cada una de las organizaciones abordadas. Corresponde a una estrategia de producción local de especies forestales propias de los ecosistemas y microcuencas de intervención para el desarrollo de las diferentes actividades de restauración requeridas por la comunidad (organización).

Fuente de información	Las fuentes de información, corresponderán a la que origine y concreten en los Planes de Adecuación Ambiental Participativa (PAAP), y se reporte finalmente en los informes de seguimiento a la actividad de implementación de acciones de conservación y propagación de especies nativas y emblemáticas
Periodicidad	Anual (final del proyecto)
Metodología del calculo	Corresponderá a la suma de casa de semillas establecidas
Fórmula de caculo	NCSE= ∑ (#NCSEO$_{(1)}$+# NCSEO$_{(2)}$+# NCSEO$_{(n)}$.. NCSE = Número de casa de semillas establecidas #NCSEO$_{(1)}$ = Número de casa de semillas establecidas por la organización 1
Unidad de medida	Número

9. CONCLUSION AVANCE DEL PROYECTO.

Al 31 de agosto de 2025, el proyecto "Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua" ha logrado un avance físico del 65%. Las fases de Aprestamiento, Convocatoria y Publicación de Resultados (Fase 1), y Autodiagnóstico e Identificación de Acciones de Fortalecimiento Ambiental (Fase 2) están completamente finalizadas. En la Fase 2.1, Diagnóstico Rural Participativo, se han completado y aprobado los 40 DRP por parte de la CAR, mientras el equipo de campo continúa con las visitas a predios potenciales y el proceso de validación jurídica y revisión cartográfica se presenta un avance de 80,37%. Respecto a la Fase 3, Formulación e Implementación de Plan de Adecuación Ambiental Participativo, treinta acueductos ya cuentan con sus planes y presupuestos aprobados por la CAR.

ANEXOS:

Anexo No.1 Acta de comité técnico ordinario No. 11

Anexo No. 2 Informe Financiero Excel Convenio corte agosto de 2025

Anexo No. 3 Soportes Financieros mes de agosto 2025

Anexo No. 4 Contratos profesionales mes de agosto 2025

Anexo No. 5 Contratos Implementaciones mes de agosto 2025

Presentado por;

LISANDRO RODRIGUEZ HAMON
Coordinador del convenio No. 2849 de 2024
Corporación Agua Somos

ESTEFANIA VILLAMIZAR PORTILLA
Profesional Financiera del convenio No. 2849 de 2024
Corporación Agua Somos.
