CONTRATO GN 3853-2025

FUNDACIÓN IMPULSO VERDE KUASPUE

INFORME PARCIAL DE AVANCE N° 2

“ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES ORIENTADOS A CONTRARRESTAR LA DEFORESTACIÓN EN LA EXPROVINCIA DE OBANDO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

SAN JUAN DE PASTO, MARZO 2025

Contenido

1. Resumen Ejecutivo 3

2. Introducción 5

3. Desarrollo de la consultoría 6

3.1. Fase de alistamiento y recopilación de información primaria 6

3.2. Fase de formulación ejecución 9

3.3 Planificación económica para la implementación del proyecto 23

4. Productos cartográficos como eje transversal del componente diagnóstico y de formulación del documento técnico, administrativo y financiero 23

5. Seguimiento del presupuesto ejecutado de la consultoría 26

1. Resumen Ejecutivo

La consultoría IMC049-2025 presenta un avance significativo en el desarrollo de los cinco ítems que estructuran el documento técnico, administrativo y financiero del producto final, con un cumplimiento general de alrededor de 70%.

En el presente documento se reporta el avance realizado tanto en campo como en la redacción documental y depuración de información, correspondiente al período comprendido entre febrero y marzo de 2026. Durante este intervalo se consolidó la culminación de las actividades territoriales desarrolladas en articulación con las alcaldías municipales, con el apoyo técnico de las UMATAS y las Secretarías de Agricultura, así como con los resguardos indígenas que, de manera voluntaria, atendieron la convocatoria para participar en el proyecto de diagnóstico de la exprovincia de Obando.

A la fecha, se culminaron los talleres participativos con comunidad local que se encontraban pendientes (3 municipios reportados en el primer informe de avance), alcanzando una cobertura de 10 municipios y seis (6) resguardos indígenas, para el periodo reportado. Estas jornadas se desarrollaron bajo la metodología previamente presentada en el primer informe de avance, garantizando rigurosidad técnica, enfoque participativo y representatividad territorial (asociaciones ambientales, productivas, Juntas de Acción Comunal y entes territoriales).

La implementación de los talleres permitió consolidar información primaria clave, fortalecer el análisis territorial y estructurar el diagnóstico socioambiental y productivo para cada municipio que integra la exprovincia de Obando. Asimismo, se generaron insumos estratégicos para la formulación de propuestas orientadas a la adopción de Sistemas Silvopastoriles y Chagras, en coherencia con las dinámicas productivas locales y los criterios de sostenibilidad ambiental.

El Ítem 1. **Diagnóstico Integral del Contexto Territorial y Socioambiental del Departamento y la exprovincia de Obando** presenta un avance correspondiente a la ejecución de los talleres participativos en los 13 municipios y la consolidación preliminar de la información primaria y cartográfica. El cierre del componente está condicionado a la culminación del proceso de depuración, análisis técnico y ajuste del diagnóstico físico-espacial, lo que permitirá entregar un documento integral y validado.

El Ítem 2. **Diseño técnico de Sistemas Silvopastoriles (SSP)** presenta un avance en el diseño de modelos SSP multiestrato y multipropósito, así como en la priorización de especies para los arreglos productivos, con base en criterios técnicos y territoriales. Las actividades pendientes corresponden a la espacialización definitiva de zonas aptas para la implementación de SSP, la, y la aplicación de

metodologías del IPCC para la estimación de captura de carbono por árboles y reducción de emisiones asociadas a prácticas productivas sostenibles.

El **Ítem 3: Diseño técnico del sistema de Chagras** el progreso de este ítem responde a la consolidación de la revisión bibliográfica, y la estructuración técnica preliminar del modelo, construida sobre los resultados del diagnóstico social y ambiental de los 13 municipios de la Exprovincia de Obando. Además, se presenta avance en el mapeo y espacialización definitiva de las áreas potenciales para la implementación de chagras, a partir de la información territorial validada con las comunidades (Cartografía Participativa).

El **Ítem 4: Diseño de capacitación y metodologías formativas** el progreso de este ítem se refleja en la formulación de talleres de sensibilización ambiental y en el diseño metodológico de los módulos de capacitación orientados a la implementación de chagras, estructurados bajo el marco de la Ley 1876 de 2017 y metodologías participativas. Las actividades pendientes corresponden a la elaboración y ajuste de los módulos de capacitación específicos para Sistemas Silvopastoriles.

El **Ítem 5: Presupuesto y análisis financiero** se encuentra en etapa preliminar. A la fecha se han reunido insumos económicos (lista de insumos, materiales, equipos, mano de obra y profesionales requeridos para implementar SSP y Chagras). Sin embargo, la consolidación de este ítem depende de la culminación de la identificación de las áreas prioritarias y del potencial para la implementación de Sistemas silvopastoriles y de Chagras y sus diseños técnicos y la estrategia de capacitación.

De manera general, el documento técnico, administrativo y financiero presenta avances principalmente en la recopilación de información primaria actualizada. Dado que gran parte de la información secundaria disponible sobre la Exprovincia de Obando se encontraba desactualizada, se optó por fortalecer el proceso mediante trabajo de campo en los 13 municipios, articulando esfuerzos con entes territoriales y comunidad local, lo que implicó un esfuerzo adicional de levantamiento y sistematización de información. Como resultado, el documento no solo consolida un diagnóstico más consolidado, sino que incorpora un componente adicional de cartografía participativa en cada territorio, identificando áreas potenciales para la implementación de Sistemas Silvopastoriles y Chagras, lo que fortalece técnicamente la propuesta y su apropiación y legitimidad con las comunidades en el territorio. Los ítems pendientes corresponden principalmente a la gestión de información aún en trámite y al proceso de depuración y análisis final de la información primaria recolectada.

2. Introducción

El presente Informe de Avance constituye la continuación del reporte presentado hasta diciembre de 2025 y da cuenta del desarrollo del proceso durante el periodo comprendido entre el 2 de febrero y el 3 de marzo de 2026.

Se precisa que el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2025 y el 1 de febrero de 2026 correspondió a una suspensión temporal de actividades, solicitada por el equipo consultor, en consideración a la coyuntura de fin de año, la cual genera retrasos en la gestión y articulación con los entes territoriales. En consecuencia, el presente informe retoma el seguimiento técnico y operativo una vez superado dicho periodo de suspensión.

En este periodo se finalizaron las actividades pendientes de campo (talleres con entes territoriales y comunidad local) y se avanzó en la revisión, ajuste y estructuración técnica del documento, integrando la información primaria recopilada en territorio como base para el fortalecimiento de los componentes técnicos, administrativos y financieros.

En continuidad con la etapa de alistamiento —que comprendió la definición de la estrategia metodológica, la recopilación y análisis bibliográfico, la gestión institucional y comunitaria con alcaldías y asociaciones ambientales y productivas del territorio —, el presente Informe de Avance da cuenta de la consolidación y depuración de la información primaria y secundaria recopilada en los 13 municipios de la Exprovincia de Obando. Asimismo, presenta el desarrollo de la fase prospectiva del documento, estructurada a partir del árbol de problemas, desde la cual se plantean las líneas de acción orientadas al establecimiento de Sistemas Silvopastoriles (SSP) y sistemas tradicionales de Chagra, integrando el enfoque técnico-productivo con el componente de sostenibilidad, particularmente a través del diseño de módulos de capacitación.

Este informe refleja tres aspectos fundamentales: en primer lugar, plantea el cronograma final que permitirá garantizar el cumplimiento al 100 % de los ítems establecidos en el documento técnico , administrativo y financiero (documento anexo); en segundo lugar, evidencia el esfuerzo realizado para recopilar información primaria y secundaria suficiente y de calidad, con el fin de consolidar un diagnóstico sólido que sustente adecuadamente la línea base; y, en tercer lugar, incorpora productos adicionales generados por iniciativa del equipo consultor para robustecer el documento diagnóstico de cada municipio de la Exprovincia de Obando, materializados en la elaboración de 13 mapas de cartografía participativa, resultados de los talleres comunitarios participativos, como insumos complementarios a los 6 mapas requeridos contractualmente, como un esfuerzo adicional que se plantea desde el equipo consultor; en cuarto lugar, reconoce, a su vez, que algunas limitaciones percibidas en la culminación al 100% del documento, obedecen a la limitada respuesta de Corponariño en la entrega de insumos cartográficos actualizados, necesarios para realizar cruces técnicos más precisos en el proceso de elaboración cartográfica.

3. Desarrollo de la consultoría

El avance de la consultoría se dividió en dos etapas principales: la primera correspondiente a la fase de alistamiento y recopilación de información primaria, y la segunda orientada a la fase de formulación del documento técnico, administrativo y financiero. Durante el periodo comprendido entre febrero y el inicio de marzo de 2026 se desarrollaron y surtieron actividades propias de ambas etapas, consolidando los insumos necesarios para la estructuración integral del documento. En la siguiente tabla se presenta de manera clara en qué consistió cada etapa y los procesos surtidos por cada etapa:

Tabla 1. Etapas administrativas ejecutadas en el marco del Desarrollo del documento técnico, administrativo y financiero

Fase	Acción o proceso
Alistamiento y recopilación de información primaria	Consolidación de base de datos bibliográfica con más de 200 referencias citadas hasta el momento en el documento técnico*
	Ejecución de 10 talleres en los 10 últimos municipios con entes territoriales y comunidad local, y seis espacios de socialización con resguardos indígenas
	Gestión de obtención de información secundaria
Fase de formulación	Formulación de 5 ítems del documento técnico, administrativo y financiero

* En el primer informe de avance presentado en diciembre se reportó la base de datos bibliográfica constituida, para el presente informe este aspecto corresponde a que las referencias bibliográficas recopiladas en la primera fase de la consultoría al momento se encuentran citadas y referenciadas en el documento técnico, administrativo y financiero

3.1. Fase de alistamiento y recopilación de información primaria

- **Ejecución de talleres con comunidad y entes territoriales en la Exprovincia de Obando**

Una vez surtida la etapa de definición metodológica y aplicada en un piloto inicial desarrollado en tres talleres en los municipios de Gualmatán, Córdoba y Potosí, se procedió a ajustar la metodología conforme a los aprendizajes obtenidos. Posteriormente, se llevaron a cabo los demás encuentros bajo la metodología ajustada, para un total de 16 espacios desarrollados, correspondientes a 10 talleres con comunidad y alcaldías municipales, y 6 socializaciones en resguardos indígenas.

En relación con los resguardos indígenas, en el primer informe de avance se reportó la solicitud formal de espacio a 19 resguardos; de estos, seis atendieron el llamado y participaron en el proceso, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

*Tabla 2 Talleres y socializaciones realizadas en municipios de la Exprovincia de Obando en el periodo de 6 de febrero a 3 de marzo del 2026**

ID	Municipio	Tipo de actividad	Fecha
1	Aldana	Taller con comunidad y alcaldía municipal	11/02/2026
		Socialización con Resguardo Indígena de Aldana	11/02/2026
2	Carlosama	Taller con comunidad y alcaldía municipal	11/02/2026
		Socialización con Resguardo Indígena de Carlosama	09/02/2026
3	Contadero	Taller con comunidad y alcaldía municipal	12/02/2026
4	Pupiales	Taller con comunidad y alcaldía municipal	12/12/2025
5	Funes	Taller con comunidad y alcaldía municipal	13/02/2026
		Socialización con Resguardo Indígena de Funes	13/02/2026
6	Puerres	Taller con comunidad y alcaldía municipal	14/02/2026
7	Iles	Taller con comunidad y alcaldía municipal	16/02/2026
8	Cumbal	Taller con comunidad y alcaldía municipal	18/02/2026
		Socialización con Resguardo Indígena de Cumbal	18/02/2026
9	Guachucal	Taller con comunidad y alcaldía municipal	10/02/2026
10	Ipiales	Taller con comunidad y alcaldía municipal	15/02/2026

		Socialización con Resguardo Indígena de Yaramal	17/02/2025
		Socialización con Resguardo Indígena de Ipiales	17/02/2025

*****se reportan 10 municipios en los cuales se adelantaron talleres con comunidad, entes territoriales y resguardos indígenas durante el periodo de febrero a inicio de marzo 2026. Para el caso de Gualmatán, Potosí y Córdoba se reportó en el primer informe de avance que comprendió el periodo de septiembre a diciembre del 2025

- **Gestión de obtención de información secundaria (Solicitudes formales de información a entidades presentes en territorio**

En el primer informe de avance, en la fase de alistamiento, se informó que se realizaron las solicitudes pertinentes a diferentes entidades para dar inicio a la consultoría, información con la cual se avanzó en el desarrollo del proceso. No obstante, en esta etapa fue necesario reiterar dichas solicitudes a las entidades relacionadas en la siguiente tabla, debido a que no se obtuvo respuesta en los primeros envíos. Considerando la alta relevancia de la información requerida para la adecuada estructuración del documento técnico, administrativo y financiero, estas solicitudes fueron remitidas nuevamente de manera formal y reiterada en el periodo reportado para este informe de avance.

Tabla 3. Solicitudes institucionales enviadas y estado de respuesta Gestión administrativa

Institución	Solicitud realizada	Respuesta a la solicitud
Pastoral Social de Ipiales	Solicitud de información sobre asociaciones agroecológicos y productivas presentes en los municipios de la Provincia de Obando	*Respuesta: No poseen base de datos estructurada para compartir. En Febrero 2026 se renovó solicitud y se generó un espacio presencial, a partir de este se obtuvo información secundaria y articulación para la ejecución del taller en Ipiales en la sede de Pastoral Social*
Corponariño	Solicitud de información técnica y cartográfica sobre mapa de cobertura vegetal y usos del suelo en formatos GIS (Shapefile o GeoTIFF), para los municipios de la región de la Exprovincia de Obando:	*Hasta la fecha de reporte del presente avance no se ha obtenido respuesta. Se han realizados reiteradas solicitudes formales de información cartográfica (en total se han realizado 4 solicitudes de la misma información cartográfica)*

3.2. Fase de formulación ejecución

3.2.1 Avance conceptual del documento técnico, administrativo y financiero

En el presente apartado se expone una visión más detallada del avance alcanzado en los cinco ítems que conforman el documento técnico, administrativo y financiero. De manera global, tal como se indicó en el resumen ejecutivo de este informe de avance, se ha logrado un progreso en el cumplimiento de los compromisos contractuales.

No obstante, se reitera la principal dificultad señalada en el primer informe de avance, relacionada con la consecución de información primaria en los 13 municipios que integran la Exprovincia de Obando. Este proceso implicó un esfuerzo considerable en términos de tiempo y gestión, particularmente en cuatro momentos clave: (1) la elaboración y ajuste de la metodología; (2) la ejecución en territorio, desarrollada durante aproximadamente dos meses; (3) la depuración, análisis y estructuración del diagnóstico socioambiental y productivo; (4) la elaboración de 13 mapas que espacializan áreas potenciales de SSP y Chagras, resultado del ejercicio de Cartografía Participativa con la comunidad.

En los siguientes apartados se presenta el detalle de acciones realizadas entre febrero e inicio de marzo 2026, detallado por cada uno de los 5 ítems globales y sub-ítems que integran el documento técnico, administrativo y financiero:

3.2.2 Diagnóstico Integral del contexto territorial y socioambiental del Departamento y la Ex provincia de Obando

En la siguiente tabla se presenta las actividades correspondientes al Ítem 1: Diagnóstico Integral de la Exprovincia de Obando. Como se puede observar, dos subcomponentes presentan retraso y aún no han podido culminarse. El primero corresponde al diagnóstico socioambiental y productivo, cuya ejecución ha implicado una alta demanda de acciones tanto en campo como en la fase de formulación documental, análisis y depuración de información, proceso que ha requerido la mayor dedicación del equipo consultor. El segundo retraso se relaciona con la consolidación de la cartografía requerida en este ítem, que contempla la elaboración de tres salidas gráficas: (1) mapa de traslapes, (2) mapa de núcleos de presión y (3) mapa de áreas de restauración. La culminación del segundo mapa y el desarrollo del tercero se han visto afectados por las dificultades en la obtención de capas oficiales administradas por Corponariño, insumo fundamental para garantizar la rigurosidad técnica de los productos cartográficos.

Tabla 4. Actividades reportadas y/o pendientes en el desarrollo del item 1. Diagnóstico Integral del contexto territorial y socioambiental del Departamento y la Ex provincia de Obando durante el periodo reportado para el presente informe de avance

Ítem	Descripción	Observación
1.1	Análisis del contexto Departamental y de la Ex provincia de Obando	Revisión final pendiente
1.2	Estado del arte y revisión técnica	Revisión final pendiente
1.3	Diagnóstico socioambiental y productivo	Teniendo en cuenta que se realizaron 13 talleres, en 13 municipios, se desarrollaron 26 encuestas (comunitarias y con entidades territoriales, con más de 100 preguntas por analizar y depurar), 5 fichas de consolidación de información secundaria por cada municipio para un total de 65 fichas de información secundaria por depurar y 3 matrices de análisis global de análisis información primaria VS información secundaria por municipio, para un total de 39 matrices por analizar y depurar para estructurar el documento, se ha requerido invertir un esfuerzo en tiempo y el avance se ve retrasado
1.4	Diagnóstico territorial y espacial	De acuerdo con el último reporte, el avance se ve en retraso, debido a que no se cuenta con una capa de cobertura actualizada y oficial. De manera extraoficial Corponariño manifestó tener una capa de cobertura vegetal del 2023, se han realizado solicitudes oficiales (en total 4 solicitudes por correo y hasta el momento no se ha obtenido respuesta)
1.5	Diagnóstico institucional y de gobernanza	Revisión final pendiente
1.6	Normatividad legal y marco normativo y político	Revisión final pendiente
1.7	Prácticas tradicionales: Diagnóstico de la chagra	Avance en diseño de Chagra, pendiente especialización de áreas potenciales en la Exprovincia de Obando
1.8	Justificación técnica del proyecto y análisis de alternativas	Revisión final pendiente
1.9	Objetivos estratégicos del proyecto	Revisión final pendiente
1.10	Conclusiones del diagnóstico	Revisión final pendiente

En los siguientes apartados se describe avances y gestiones técnicas que han conllevado a emplear tiempo en su ejecución:

- **Reformulación árbol de problemas**

Durante el avance del diagnóstico socioambiental y productivo se revisó el árbol de problemas inicial y se propuso una versión actualizada que reorganiza problema central, efectos y causas en tres niveles, integrando factores productivos, socioambientales e institucionales. El problema central se define como “Alta tasa de deforestación en la Exprovincia de Obando, Nariño, por la expansión de la frontera agrícola debido a sistemas productivos convencionales y no sostenibles”. Este árbol se valida además con los hallazgos metodológicos y participativos levantados en campo. El ajuste permite alinear el diagnóstico con la implementación de SSP y chagras como respuesta técnica al problema central y a las causas de primer y segundo nivel. Los cambios realizados se pueden apreciar en la siguiente ilustración:

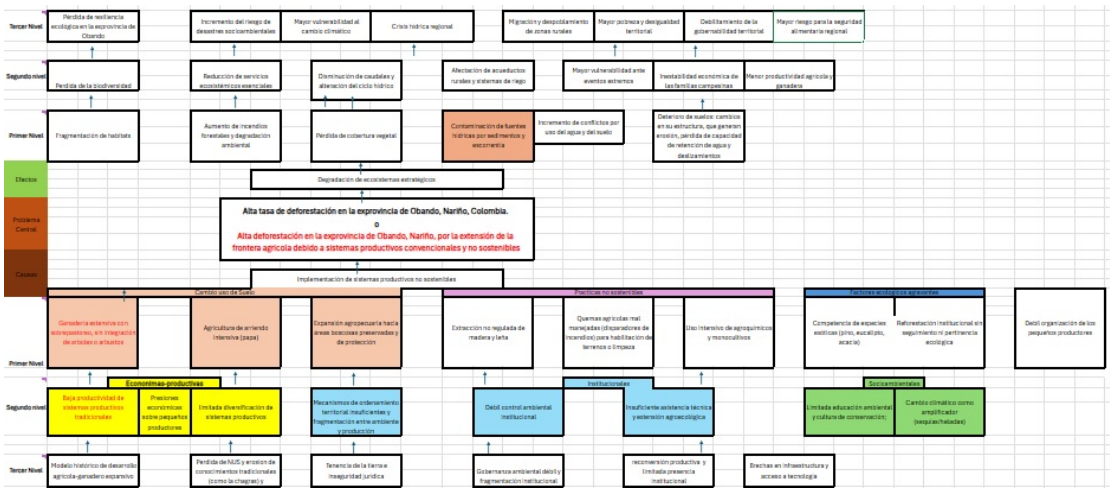


Ilustración 1. Árbol de problemas ajustado

- **Diagnóstico socioambiental y productivo**

Otro de los avances realizados, es la metodología propuesta para el análisis del diagnóstico socioambiental y productivo de los municipios de la exprovincia de Obando. Esta propuesta integró información secundaria, primaria y cartografía participativa, permitiendo realizar una lectura territorial completa y multiescalar. Su objetivo principal es garantizar que el

diagnóstico sea comparativo, depurado, coherente y aplicable a la toma de decisiones para la implementación de sistemas de producción sostenibles.

El análisis no se construye de forma aislada por fuente, sino mediante un enfoque integrado por recurso temático (suelo, agua, cobertura vegetal, sistemas productivos, gobernanza), evitando la fragmentación entre talleres, encuestas y documentos técnicos. Además, el enfoque está orientado identificar y caracterizar las áreas dentro de cada municipio donde es más viable implementar SSP y chagras, tomando en cuenta aspectos biofísicos, productivos, socioeconómicos, socioambientales y bioculturales. Para llegar a este punto en este periodo reportado se elaboró una metodología de análisis, depuración y estructuración de la información tanto primaria como secundaria resumida en documentos alternos al documento técnico, administrativo y financiero tales como:

- Documento Word donde describe la metodología paso a paso para analizar y plasmar el diagnóstico por municipio a partir de información primaria y secundaria.
- Documento Excel donde se elaboró fichas por componente biótico y abiótico por cada municipio para integrar y analizar información secundaria.
- Documento Excel donde se elaboró matrices ambientales, productivas y sociales para depurar la información primaria obtenida a través de los talleres con la comunidad y con los entes territoriales.
- Documento Word del modelo de ficha técnica por municipio donde se consolida ordena los datos primarios y segundarios y sus análisis.

En relación con los documentos Excel para depurar información primaria y secundaria se realizaron las siguientes acciones que denotan el proceso que conlleva esta actividad:

→ Para realizar la depuración de información primaria y secundaria, se consolidaron dos matrices que permiten tener un panorama socioambiental y productivo a nivel municipal y subregional. En la matriz de información secundaria se recopilaron datos cuantitativos, mientras que la matriz de información primaria se recogieron datos cualitativos y de percepción comunitaria e institucional. La información consolidada en las matrices se refleja en las tablas presentadas en este apartado, que reflejan una parte de la ficha del municipio de Córdoba, la cual se tomó como insumo para la diagramación de infografías por municipio. El proceso descrito a continuación se realizó para cada municipio, aclarando que, este pro

→ El diagnóstico integral se realizó desde las dimensiones social, ambiental y productiva. En la dimensión social, se analizó la estructura territorial, la organización

comunitaria y las capacidades institucionales que inciden en la gestión del desarrollo rural. En la dimensión ambiental, se examinaron los ecosistemas estratégicos, la cobertura vegetal y el sistema hídrico, además de las principales presiones y riesgos identificados. Finalmente, en la dimensión productiva, se evaluaron los sistemas agrícolas y pecuarios, la coherencia entre vocación y uso del suelo y el estado de la transición hacia prácticas más sostenibles. Estas sirvieron de base para el análisis integrado del territorio.

- **Dimensión social**

Tabla 5. Ficha de información secundaria – Dimensión social

Grupos Étnicos				
ID	Municipio	Población total	Indígenas	Afrocolombianos
1	Córdoba	17675	99,9%	0,10%

Nota. Los datos se extrajeron del Esquema de Ordenamiento Territorial Y Plan de Desarrollo Municipal

Información Primaria

Tabla 6. Ficha información primaria – dimensión social

Categoría	Información primaria (porcentajes según total de encuestados)	Información Primaria (Encuestas y Talleres)	Lectura Integrada
Composición étnica	El 100% de las comunidades reporta prácticas tradicionales y conocimientos locales (Chagras, manejo ancestral del suelo y semillas nativas).	Fuerte arraigo cultural, prácticas tradicionales como las Chagras y conocimientos propios del territorio.	La identidad étnica constituye un capital social y cultural clave para la transición sostenible, aunque requiere mayor articulación institucional.
Organización comunitaria	El 54,5% cuenta con organizaciones formalmente constituidas (asociaciones, comités o procesos organizativos); el 100% participa en espacios comunitarios colectivos.	Asociaciones lecheras, comités de agua y escuelas agroecológicas con capacidad media de gestión y dificultades en formulación de proyectos.	Hay base organizativa existente, pero con brechas técnicas y administrativas que limitan su consolidación.

Nota. Los datos se calcularon y extrajeron de las encuestas institucional y comunitaria realizadas en los 13 municipios que integran la Exprovincia de Obando

- **Dimensión ambiental**

Tabla 7. Ficha información secundaria – dimension Ambiental (red hpidrica)

Municipio	Cuenca	Afluente	Casco Urbano, Vereda o Corregimiento
Córdoba	Cuenca Río Guaitará: Río Tescual, Río Chiguaco	ALTO SINAI	YUNGANCHALA
		GRANDE	SANTA BRÍGIDA
	Cuenca Río Guamez: Río Afiladores y Río Sucio	CHURUCUA	LA CUMBRE
		GRANDE Y CHURUCUANA	EL QUEMADO

Nota. Los datos se extrajeron del Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA), Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y Plan de Desarrollo Municipal

Tabla 8. Ficha información secundaria – dimension Ambiental (Calidad de agua)

Municipio	Fuente	Valor	Interpretación
Córdoba	ACUEDUCTO EL MIRADOR	86,30	Riesgo inviable sanitariamente
	ACUEDUCTO MIRADOR AGUA LIMPIA	50,67	Riesgo alto
	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA AGUAS DE SAN FRANCISCO	23,00	Riesgo medio
	ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO VEREDA SAN FRANCISCO DE YUNGACHALA	23,30	Riesgo medio
	ASOCIACION DEL ACUEDUCTO TERCERA ETAPA DEL RESGUARDO INDIGENA DE MALES	39,87	Riesgo alto
	ASOCIACION PIEDRAS BLANCAS	28,25	Riesgo medio
	ASOCIACIÓN DE JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUITUNGAL MUNICIPIO DE CÓRDOBA	87,20	Riesgo inviable sanitariamente
	JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO CHAIR	2,30	Sin riesgo

	JUNTA DE ACCION COMUNAL ACUEDUCTO GRAN TEQUIZ	74,98	Riesgo alto
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN CHICO SECTOR LA MINA	66,00	Riesgo alto
	JUNTA DE ACUEDUCTO SAN JUAN CHICO-SECTOR LA ESCUELA	83,30	Riesgo inviable sanitariamente
	ACUEDUCTO LA CUMBRE	34,40	Riesgo medio

Tabla 9. Ficha información primaria – dimension ambiental

Categoría	Información primaria (porcentajes según total de encuestados)	Información Primaria (administración + talleres)	Lectura Integrada
Sistema hídrico	El 95,2% identifica afectaciones en la disponibilidad o estabilidad del recurso hídrico asociadas a cambios ambientales y productivos.	Reportes de disminución de caudal en verano y conflictos por abastecimiento.	Oferta estructural suficiente, pero vulnerable a variabilidad climática y presión local.

Nota. Los datos se calcularon y extrajeron de las encuestas institucional y comunitaria realizadas en los 13 municipios que integran la Exprovincia de Obando

- **Dimensión productiva**

Tabla 10. Ficha información secundaria – dimension productiva

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA					
Municipio	**Área sembrada (ha) año 2024 (todos los cultivos)**	**Área cosechada (ha) año 2024 (todos los cultivos)**	**Área sembrada (ha) año 2024**	**Área cosechada (ha) año 2024**	**Principales cultivos**
Córdoba	3554,50	2544	900	400	Papa
			515	515	Mora
			1500	1150	Arveja
			110	80	Zanahoria

Nota. Los datos se extrajeron de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA)

Tabla 11. Ficha información primaria – dimension productiva

Categoría Productiva	Información primaria (porcentajes según total de encuestados)	Información Primaria (Encuestas y Talleres)	Lectura Integrada
Producción agrícola	El 100% de los participantes desarrolla actividades agrícolas, destacándose cultivos de papa, arveja, maíz, hortalizas y café.	Agricultura familiar combinada con ganadería a pequeña escala; interés en prácticas agroecológicas y rescate de semillas nativas.	Sistema agrícola activo y diversificado, pero con brechas de eficiencia productiva y dependencia de insumos externos.

Nota. Los datos se calcularon y extrajeron de las encuestas institucional y comunitaria realizadas en los 13 municipios que integran la Exprovincia de Obando

3.2.3 Diagnóstico ítem 2 Diseño técnico de Sistemas Silvopastoriles (SSP) para la Ex provincia de Obando

Para el **Ítem 2, diseño técnico de los Sistemas Silvopastoriles (SSP)** se ha logrado un avance conceptual del modelo silvopastoril propuesto para la Exprovincia de Obando. Se profundizó en el análisis integral de las tipologías y componentes que conforman el sistema, integrando criterios biofísicos, climáticos y productivos que permiten definir arreglos adaptados al territorio altoandino. Se fortaleció la caracterización agroecológica, incorporando información climática detallada y análisis espaciales que sustentan la viabilidad técnica del diseño multiestrato en cada uno de los municipios, de tal forma que el modelo propuesto cuenta con flexibilidad para ser adaptado los diversos ambientes.

En consecuencia, se avanzó en la consolidación de un modelo silvopastoril multiestrato–multipropósito, el cual integra árboles dispersos en potrero, cercas vivas multiestrato, bancos de proteína y pasturas bajo manejo racional. Este avance incluye la definición de densidades, distancias de siembra, distribución espacial y criterios de adaptación a heladas y variabilidad climática, lo que permite contar con un modelo técnico robusto, con alta aplicabilidad para los sistemas ganaderos predominantes en la región. También se propone la estructuración de la infraestructura agroecológica necesaria para el funcionamiento del SSP, con énfasis en cosecha de agua, manejo de estiércol y elementos estratégicos para la reducción de impactos climáticos y operativos.

En relación con el proceso de zonificación, se ha avanzado en la definición y consolidación de los criterios técnicos por parte del equipo consultor, los cuales se encuentran alineados con los lineamientos y requerimientos contractuales establecidos para su incorporación en el documento final. De manera paralela, se estructuró el proceso metodológico para la construcción del modelo

espacial, mediante la identificación, depuración y estandarización de las capas de información necesarias para el análisis multicriterio. Esto incluyó la selección de variables biofísicas, ambientales y territoriales pertinentes, la homologación de sistemas de referencia, la verificación de calidad de datos y la definición de escalas de trabajo compatibles.

A demás, se priorizó la identificación de especies nativas y naturalizadas aptas para los SSP, lo que permitió construir un listado completo y criterios técnicos de selección por estrato y función. Asimismo, se avanzó en la estructuración metodológica de los módulos de capacitación para productores, se está consolidando lineamientos generales y estructurales del enfoque pedagógico que orientará los procesos formativos de educación informal y participativa, con lineamientos de extensión rural, que, durante la implementación del proyecto, fortalezcan el componente operativo del diseño, permitiendo articular el modelo SSP con la formación comunitaria y el proceso de adopción en finca.

Finalmente, se avanzó parcialmente en la priorización de insumos y materiales requeridos para los sistemas agroecológicos y en la definición preliminar de criterios para el sistema de geolocalización y monitoreo de los SSP, los cuales deberán completarse. Aún se encuentran pendientes los desarrollos técnicos relacionados con prácticas sostenibles, estimación de reducciones de GEI y articulación con iniciativas climáticas. En la siguiente tabla se presenta un panorama general de actividades pendientes y obsevaciones por cada sub ítem del ítem No.2.

Tabla 12. Observaciones sobre actividades desarrolladas en el ítem 2. Diseño técnico de Sistemas Silvopastoriles (SSP)

Ítem	Actividad	Observación	Pendiente
2.1.	Identificación y caracterización de sistemas silvopastoriles pertinentes	experiencias previas, tipologías, estudio agroecológico y diagnóstico ganadero.	
2.2	Zonificación de áreas aptas para sistemas SSP	Avance SIG en traslape de capas.	Aún no se ha recibido la capa oficial de Uso Potencial del Suelo de Nariño, requerida para completar la zonificación. Pese a varias solicitudes formales a CORPONARIÑO, no se ha obtenido respuesta.
2.3	Diseño del modelo multiestrato/multipropósito de SSP	Modelo completo	Definir parte de la infraestructura funcional agroecológica y presupuesto.
2.4	Prácticas sostenibles en SSP	Sin desarrollo durante el periodo.	Las prácticas sostenibles deben definirse a partir del modelo silvopastoril y de la estructura agroecológica, recientemente finalizados. Hasta no contar con estos insumos, no era posible establecer las prácticas de manejo.

2.5	Identificación de las especies de árboles y plantas forrajeras más adecuadas para las condiciones locales a utilizarse en los sistemas Silvopastoriles	Listado completo y criterios de selección terminados.	Definir especies potenciales de la lista obtenida en la priorización de individuos aptos para la implementación.
2,6	Plantear diseños metodológicos de módulos para capacitaciones en sistemas silvopastoriles	Avance estructural en módulos y enfoque pedagógico.	Clasificación de temáticas por módulos
2.7	Identificación de insumos y materiales que deben acompañar los sistemas agroecológicos	Avance en criterios e insumos generales.	Consolidación de matriz de insumos priorizados y avalados.
2.8	Sistema de geolocalización y monitoreo	Proceso de geolocalización	Definir Lineamientos preliminares
2.9	Estimación de reducción de GEI	Sin avance técnico.	No presenta avance porque la estimación de GEI depende del modelo silvopastoril final y de los arreglos definidos por estrato, densidades y manejo, los cuales se completaron recientemente. Sin esta base técnica, no era posible iniciar los cálculos de carbono.
2.10	Propuesta de integración con iniciativas climáticas	Sin avance técnico.	No se ha iniciado porque su desarrollo requiere primero contar con la estimación preliminar de GEI y con el modelo SSP consolidado, que servirá de referencia para vincular el proyecto con programas y mecanismos climáticos. Sin estos insumos, no era viable avanzar en la integración.

3.2.4. Ítem 3, Diseño técnico del sistema de Chagras para la Ex provincia de Obando

El Ítem 3: Metodología de implementación de Chagras, avanzó en el diseño técnico del sistema de Chagras para la Exprovincia de Obando, las bases para desarrollar esta actividad partieron de un análisis integral que articula modelos agroecológicos contemporáneos con estudios sobre sistemas tradicionales andinos y sostenibilidad biocultural. Este ejercicio permitió identificar las limitaciones de enfoques estandarizados que no incorporan plenamente las dinámicas socioculturales y espirituales del territorio. En respuesta, la metodología formulada propone un enfoque de co-construcción comunitaria, donde el conocimiento técnico dialoga de manera horizontal con los saberes ancestrales.

Un avance central fue la diferenciación conceptual y práctica entre Chagra, Shagra y huerta agroecológica. Esta delimitación evitó la homogenización técnica de intervenciones rurales previas y permitió estructurar una herramienta metodológica flexible y culturalmente pertinente. Mientras la Chagra y la Shagra se entienden como sistemas bioculturales integrales que articulan producción, espiritualidad y organización comunitaria, la huerta agroecológica se reconoce como un sistema productivo contemporáneo basado en principios de sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria.

Los talleres comunitarios desarrollados en la Exprovincia de Obando permitieron identificar desafíos técnicos, organizativos y culturales asociados a la implementación de sistemas diversificados. Se evidenció que, mientras en algunos municipios existen comunidades campesinas renuencia frente a la implementación de shagras o chagras y pre, en los resguardos indígenas hay respaldo decidido a la implementación de shagras/chagras, al considerarse parte constitutiva de su identidad territorial. Estas diferencias fueron incorporadas explícitamente en el documento, fortaleciendo su enfoque diferencial.

El componente metodológico también se consolidó mediante el análisis de experiencias nacionales y regionales, identificando factores críticos de éxito como la participación comunitaria efectiva, la aplicación de la Investigación Acción Participativa (IAP), la priorización de especies nativas y NUS, y la articulación con estrategias de bioeconomía territorial. Asimismo, se incorporaron aprendizajes derivados de limitaciones recurrentes en intervenciones previas, como la falta de seguimiento técnico y la débil articulación institucional.

Como resultado, se avanzó en la estructuración de un Manual Técnico Orientador para la implementación de Chagras o huertas agroecológicas, concebido como herramienta flexible de planificación comunitaria. Este manual integra priorización de especies por piso térmico, inclusión planificada de NUS, manejo agroecológico del suelo, integración de biofábricas y un esquema de monitoreo participativo con indicadores ecológicos, socioculturales y productivos.

La única dificultad identificada corresponde a la consecución de la capa oficial y actualizada de uso potencial del suelo solicitada a la Corponariño, necesaria para la elaboración del mapa de localización de áreas potenciales para la implementación de Chagras.

En términos generales, el avance del Ítem 3 puede considerarse sólido y estructural, al integrar validación participativa, soporte técnico especializado, análisis comparativo de experiencias y coherencia con la planificación territorial.

Tabla 13. Actividades pendientes en el Ítem No. 3. Diseño técnico de Chagras

Item	Actividad	Pendiente
3.1.	Identificación de sistemas agroecológicos pertinentes para la implementar en la Exprovincia de Obando	Revisión final por equipo consultor (coherencia con árbol de problemas, alternativas de solución, objetivos y justificación)
3.2.	Mapeo y georeferenciación de zonas potenciales	Este ítem presenta un retraso debido a la consecución de cartografía oficial (uso potencial del suelo y cobertura vegetal) para realizar el cruce con los mapas de cartografía participativa. Sin embargo, ya se cuenta con 13 mapas participativas con áreas potenciales para implementar Shagras en los 13 municipios de la Exprovincia de Obando, según el conocimiento tradicional y ancestral de la comunidad
3.3.	Identificación de especies agrícolas y forestales	Revisión final por equipo consultor (coherencia con árbol de problemas, alternativas de solución, objetivos y justificación)
3.4.	Diseño técnico de modelo de chagra	Revisión final por equipo consultor (coherencia con árbol de problemas, alternativas de solución, objetivos y justificación)
3.5.	Identificación de insumos y materiales que deben acompañar los sistemas agroecológicos	Revisión final por equipo consultor (coherencia con árbol de problemas, alternativas de solución, objetivos y justificación)
3.6.	Plan de capacitación teórico para la implementación y/o fortalecimiento de una chagra; 3.7. Plan se seguimiento de inversión familiar	Revisión final por equipo consultor (coherencia con árbol de problemas, alternativas de solución, objetivos y justificación)
3.7.	Planteo de un plan de seguimiento de inversión familiar en alimentación cotidiana	Revisión final por equipo consultor (coherencia con árbol de problemas, alternativas de solución, objetivos y justificación)

3.2.5. Ítem 4. Diseño de capacitación y diseños metodológicos

Dentro del diseño de capacitación y diseños metodológicos, para la formulación de talleres de sensibilización ambiental, además de elaborar una matriz de perfiles de forma general para toda la Exprovincia de Obando, plantear módulos de concientización con objetivos de aprendizaje enfocados en los perfiles caracterizados, considerando problemáticas ambientales clave en el territorio como deforestación, degradación de suelos, pérdida de servicios ecosistémicos y disminución del recurso hídrico, se avanzó en la elaboración de la ficha de capacitación base como insumo para el desarrollo de este componente, lo cual representa un 60% de avance. Además, para el planteamiento de diseños metodológicos de módulos para capacitaciones en sistemas silvopastoriles y chagras se ha desarrollado una estructura de capacitación con base en la ley 1876 de 2017, lo cual representa un 4% de avance. En la siguiente tabla se presenta los avances en el item 4. Diseño de capacitación y diseños metodológicos:

Tabla 14. Avances desarrollados en ítem No. 4. Diseño de capacitación y diseños metodológicos

Item	Actividad	Observación
4.1.	Formulación de talleres de sensibilización ambiental	Selección de grupo focal (productores capacitados)
4.2.	Diseños metodológicos de módulos para capacitaciones en sistemas silvopastoriles y chagras	Pendiente avanzar en módulos de capacitación de SSP. Módulos de capacitación en Chagras ya se realizó

- **Formulación de Talleres de sensibilización Ambiental**

Se avanzó en el diseño metodológico y técnico de los talleres de sensibilización ambiental orientados a contrarrestar la deforestación en la exprovincia de Obando. Primero, se realizó la caracterización del grupo focal de productores agropecuarios, construyendo una matriz de perfiles. Esta matriz se fundamentó en la recolección de información primaria, proveniente de las encuestas comunitarias, en la caracterización de los participantes de los talleres y en información secundaria, lo que permitió obtener un panorama amplio sobre los perfiles predominantes en el territorio. No obstante, para desarrollar una caracterización de perfiles y necesidades más específica y detallada para cada municipio, es necesario contar con información desagregada, a través de las encuestas comunitarias que se llevan a cabo durante los talleres. Además, información oficial de cada entidad territorial.

Posteriormente, con la información recopilada, se desarrolló la línea base, definiendo objetivos, indicadores y criterios de medición para evaluar conocimientos, prácticas y percepciones ambientales iniciales. Este proceso permitió identificar el estado actual del territorio y de los productores frente a problemáticas ambientales. Con esta información se plantearon los objetivos de aprendizaje claros y coherentes con la meta del proyecto para los módulos temáticos de los talleres de sensibilización.

- **Plantear diseños metodológicos de módulos para capacitaciones en Sistemas Silvopastoriles y Chagras**

→ *Chagras*

El diseño de los talleres y módulos de capacitación requiere la finalización de los componentes técnicos estructurales (SSP y Chagras), dado que los contenidos formativos deben responder de manera estricta a las propuestas productivas definidas en el proyecto. A la fecha, se ha avanzado en la estructuración de un esquema general de capacitación alineado con los lineamientos de la Ley 1876 de 2017, incorporando metodologías participativas de educación horizontal. Entre estas se contemplan talleres prácticos, demostraciones de método y Escuelas de Campo (ECAs), priorizando procesos de construcción colectiva del conocimiento. Algunos módulos ya formulados abordan el diagnóstico crítico de la ganadería convencional y sus implicaciones ambientales, el enfoque sistémico de la producción pecuaria y la transición hacia modelos sostenibles. En las siguientes etapas se avanzará en el ajuste metodológico detallado de cada módulo, garantizando coherencia temática, claridad pedagógica y pertinencia territorial, de modo que facilite la apropiación y adopción efectiva de las alternativas de sostenibilidad planteadas.

En el caso específico de las Chagras, los diseños metodológicos de los módulos se fundamentan en un enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP), orientado al rescate, fortalecimiento y actualización de prácticas tradicionales productivas y culturales. Esta metodología combina el diálogo de saberes ancestrales con la incorporación estratégica de técnicas agroecológicas modernas, generando una dinámica de “aprender haciendo” similar a una Escuela de Campo, pero con un enfoque transversal que integra dimensiones productivas, ecológicas, espirituales y organizativas. Más que replicar un modelo formativo convencional, se propone un proceso vivencial y contextualizado, donde la Chagra se convierte en espacio pedagógico, laboratorio comunitario y escenario de

transmisión intergeneracional de conocimiento. Este enfoque busca no solo mejorar capacidades técnicas, sino fortalecer identidad territorial, autonomía alimentaria y cohesión comunitaria, asegurando que la innovación productiva sea culturalmente pertinente y socialmente sostenible.

3.3 Planificación económica para la implementación del proyecto

El Ítem 5: Presupuesto y análisis financiero presenta un avance en su fase de estructuración preliminar. A la fecha, ya se cuenta con un listado consolidado de insumos, materiales, equipos, mano de obra y perfiles profesionales requeridos para la implementación de Sistemas Silvopastoriles (SSP) y Chagras.

Actualmente, se está a la espera de la definición del mapa de áreas potenciales para la implementación de SSP y Chagras en la Exprovincia de Obando, ya que este insumo permitirá extrapolar el potencial de áreas por implementar SSP y chagras a una escala territorial más amplia (con hectáreas totales definidas). Además, será necesario realizar al menos tres cotizaciones por cada tipo de insumos o costo, con el fin de establecer un valor promedio mediante un análisis del sector que garantice la solidez y viabilidad financiera del presupuesto proyectado (próximo paso a ejecutarse).

Este ejercicio requiere un tiempo adicional de gestión y consolidación de información, dado que implica la verificación de precios actualizados en el mercado regional. Una vez surtido este proceso, se procederá a proyectar el presupuesto general para la totalidad de la Exprovincia de Obando, asegurando coherencia entre el componente técnico, la escala territorial y la estimación financiera final.

4. Productos cartográficos como eje transversal del componente diagnóstico y de formulación del documento técnico, administrativo y financiero

En relación con los productos cartográficos estipulados en la consultoría, correspondientes a cinco (5) mapas: tres hacen referencia a la fase diagnóstica y dos orientados a la espacialización de la implementación de Sistemas Silvopastoriles (SSP) y Chagras. A la fecha, se encuentran elaborados dos (2) de los tres mapas del componente diagnóstico, quedando pendiente uno para su culminación.

De manera complementaria, y como resultado de los ejercicios de cartografía participativa desarrollados en territorio, se elaboraron trece (13) mapas adicionales, uno por cada municipio que integra la Exprovincia de Obando, en los cuales se espacializaron, desde el conocimiento local, las

áreas potencialmente aptas para la implementación de SSP y Chagras. Estos insumos constituyen una base fundamental para el análisis multicriterio posterior y fortalecen la articulación entre información técnica y saber comunitario.

En lo correspondiente a la fase de espacialización de áreas potenciales para Chagras y SSP, se cuenta actualmente con el diagrama estructurado de geoprocesos que orientará la modelación cartográfica final. Este esquema metodológico integra de manera sistemática: 1). los criterios técnicos solicitados por la Gobernación de Nariño, 2). los lineamientos técnicos de implementación definidos por la Fundación Impulso Verde y 3). los insumos cartográficos oficiales disponibles a la fecha. El modelo contempla procesos de estandarización de capas, análisis de restricciones y aptitud, superposición temática, clasificación por niveles de potencial y validación preliminar de consistencia espacial. Esta estructuración garantiza que la delimitación final de áreas potenciales responda a criterios técnicos verificables (tanto ambiental, como de aptitud de la tierra), coherencia territorial y trazabilidad metodológica, asegurando así rigor técnico en el producto cartográfico definitivo.

Posterior a este proceso técnico, se vinculará la información derivada de la cartografía participativa desarrollada en los municipios de la Exprovincia de Obando, la cual será cruzada con el mapa técnico resultante, permitiendo integrar el conocimiento local con el análisis geoespacial y consolidar una visión global e integral de las áreas potenciales para la implementación de Sistemas Silvopastoriles y Chagras.

En las siguientes ilustraciones se observa la clasificación de insumos y criterios priorizados para generar los mapas de áreas potenciales para implementar SSP y Chagras:



Ilustración 2. Insumos identificados para la elaboración de mapa con áreas potenciales para implementación de chagras en la Exprovincia de Obando

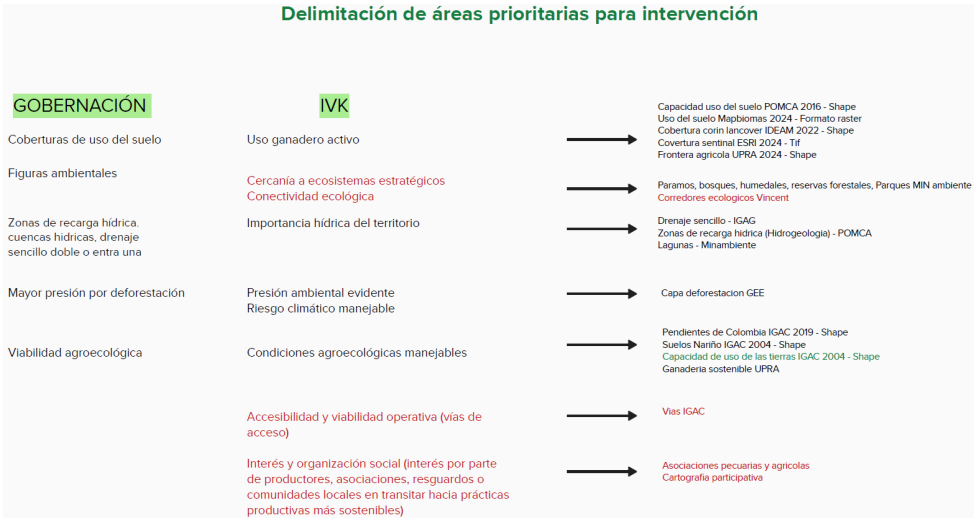


Ilustración 3. Insumos identificados para la elaboración de mapa con áreas potenciales para implementación de SSP en la Exprovincia de Obando

5. Seguimiento del presupuesto ejecutado de la consultoría

Para este segundo informe de avance se registró la ejecución del **24% del presupuesto**, correspondiente al saldo que había quedado pendiente tras el primer informe. De esta manera, el rubro de **Costos Directos de Personal Profesional** alcanza una **ejecución acumulada del 100%**, cumpliendo íntegramente con el presupuesto aprobado en el contrato por un valor total de **$44.843.930,25 COP**.

El valor ejecutado en el periodo asciende a **$10.585.385,67 COP**, discriminado de la siguiente manera:

- **Subtotal antes del factor multiplicador:** $4.969.43,33
- **Factor multiplicador (1,79):** $8.895.282,08
- **IVA (19%):** $1.690.103,59
- **Total ejecutado en el periodo:** $10.585.385,67

Este valor corresponde exclusivamente al cierre del saldo pendiente, dado que el **76% restante ($34.258.544,58)** había sido ejecutado durante el periodo informado en el Informe de avance No 1. No se presentaron variaciones en la estructura del equipo profesional, manteniéndose las condiciones contractuales de los dos profesionales vinculados. Los cálculos aplicados siguen los lineamientos financieros establecidos en el contrato.

Con esta ejecución, el rubro queda totalmente liquidado y sin saldos pendientes para el desarrollo del proyecto.

Katherine Masso Muñoz
CC 29108813
Directora y Representante Legal Suplente

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FUNDACION IMPULSO VERDE KUASPUE identificado(a) con NI 901284534 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO JOSUE MUÑOZ GOMEZ identificado(a) con CC 1085289683

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9501157378	119551357	E	2026-03-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$4,380,000	12.5%	$547,500
9501157378	119551357	E	2026-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$4,380,000	16%	$700,800
9501157378	119551357	E	2026-03-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30									X									$4,380,000		$0
9501157378	119551357	E	2026-03-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30									X									$4,380,000		$0
9501157378	119551357	E	2026-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30									X									$0	0%	$0
9501157378	119551357	E	2026-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30									X									$0	0%	$0
9501157378	119551357	E	2026-03-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$4,380,000	2.436%	$106,700
9501157378	119551357	E	2026-03-09	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$3,550,000	4%	$142,000
9501157378	119551357	E	2026-03-09	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$3,550,000	2%	$71,000
9501157378	119551357	E	2026-03-09	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$3,550,000	3%	$106,500

Este certificado se expide el día 2026-03-11 a las 07:58.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FUNDACION IMPULSO VERDE KUASPUE identificado(a) con NI 901284534 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA ELIZABETH VILLOTA CERON identificado(a) con CC 1085257645

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9501157378	119551357	E	2026-03-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$6,300,000	12.5%	$787,500
9501157378	119551357	E	2026-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$6,300,000	16%	$1,008,000
9501157378	119551357	E	2026-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30									X									$6,300,000		$0
9501157378	119551357	E	2026-03-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30									X									$6,300,000		$0
9501157378	119551357	E	2026-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30									X									$0	0%	$0
9501157378	119551357	E	2026-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30									X									$0	0%	$0
9501157378	119551357	E	2026-03-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$6,300,000	2.436%	$153,500
9501157378	119551357	E	2026-03-09	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$4,400,000	4%	$176,000
9501157378	119551357	E	2026-03-09	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$4,400,000	2%	$88,000
9501157378	119551357	E	2026-03-09	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30									X									$4,400,000	3%	$132,000

Este certificado se expide el día 2026-03-11 a las 07:57.
