MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 17

CONTRATO No. 1976-2024

PERÍODO: NOVIEMBRE DE 2025

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2

CARRETERAS:

1002 JUNÍN - TUQUERRES PR 0+0000 – PR 95+0000
1701 GUACHUCAL - EL ESPINO PR 28+0900 – PR 40+0200
0801 GUACHUCAL - IPIALES PR 0+0000-PR 23+0900
25NR01 IPIALES - LAS LAJAS PR 0+0000-PR 5+0870

CONSULTOR:

CONSORCIO JOERING 2024

SUPERVISOR TÉCNICO:

JONNY FAJARDO ROSERO

TABLA DE CONTENIDO

1. **Información general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial**
2. **Relación de Interventorías a Contratos de Mantenimiento Rutinario.**
3. **Relación de Interventoría a Obras Menores**
4. **Información sobre emergencias presentadas en el periodo.**
5. **Relación de correspondencia enviada**
6. **Relación de correspondencia recibida.**
7. **Relación de informes semanales**
8. **Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial.**
9. **Registro Fotográfico.**

1. Información general del Contrato de Administración de Mantenimiento Vial

Contrato No. 1976-2024

Objeto del Contrato: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2 LOTE 4".

Contratista:	CONSORCIO JOERING 2024
Supervisor de Contrato:	JONNY FAJARDO ROSERO
Valor Contrato Principal:	$ 4.050.198.082,00
Vigencia Contrato Principal:	29 MESES
Adiciones	$ 0,00
Fecha de Iniciación del Contrato:	26 DE JULIO DE 2024
Fecha de terminación del contrato:	31 DE JULIO DE 2026

2. Relación de Interventorías a Contratos de Mantenimiento Rutinario

Se realizó la interventoría a los contratos de mantenimiento rutinario en los sectores asignados a la AMV Grupo 5, a las Cooperativas de trabajo asociado relacionadas a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	CARRETERA
3702-2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 0+0000 (JUNÍN) - PR 31+0000 (RICAURTE)" LOTE 9
3698-2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 31+0000 (RICAURTE) - PR 62+0000 (EL VERDE)" LOTE 6.
3674-2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 62+0000 (EL VERDE) - PR 95+0000 (TÚQUERRES)/ 1701 GUACHUCAL - EL ESPINO, PR28+0900 - PR 40+0200. LOTE 1.
3809-2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 0801 GUACHUCAL - IPIALES, PR 0+0000 - PR 23+09000801 GUACHUCAL - IPIALES, PR 0+0000 - PR 23+0900 25NR01 IPIALES-LAS LAJAS, PR0+0000 - PR 5+0870. LOTE 9.

3. Relación apoyo a Interventorías a Obras Menores.

Se realiza apoyo al contrato 1234-2024 de Atención de emergencias por el sistema de monto agotable. Durante el presente mes se atendieron emergencias ocurridas en la vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres, habilitando paso y desalojando los derrumbes presentados.

4. Emergencias presentadas en el periodo.

El tiempo predominante durante el mes de noviembre correspondió a lluvias en todos los sectores, principalmente en la carretera 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres, donde se presentaron varias emergencias en los sectores del PR 10 al 36, generando cierres totales y parciales que requirieron del trabajo conjunto de cooperativas, maquinaria del contrato de monto agotable y el apoyo de maquinaria con cargo al ítem de insumos del contrato de AMV.

COD VÍA	NOMBRE DE LA VÍA	UBICACIÓN (PR)	TIPO DE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	ATENDIDO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1002	Junín - Pedregal	22+0140 - 35+0770	Deslizamientos sobre la banca que generó el cierre parcial de la vía. Se habilita paso a un carril.	13/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	10+0620	Deslizamiento sobre la banca que generó el cierre parcial de la vía. Se habilita paso a un carril.	19/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	15+0950	Deslizamiento sobre la banca y flujo de lodos del talud superior que generó el cierre total de la vía. Se habilita paso a un carril.	19/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	20+0260	Deslizamiento sobre la banca con cierre total de la vía. Se habilita paso a un carril.	19/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	21+0870	Deslizamiento sobre la banca con cierre total de la vía. Se habilita paso a un carril.	19/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	24+0040	Deslizamiento sobre la banca con cierre total de la vía	19/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	12+0950	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía. Se habilita paso a un carril.	20/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	13+0090	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía. Se habilita paso a un carril.	20/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	13+0240	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía. Se habilita paso a un carril.	20/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	14+0180	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía	20/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	17+0180	Deslizamiento sobre la banca del talud superior que generó el cierre parcial de la vía. Se habilita paso a un carril.	20/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	19+0040	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía	20/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	21+0700	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía. Se habilita paso a un carril.	20/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	23+0090	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía	20/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	23+0300	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía	20/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	23+0520	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía	20/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	34+0550	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía	20/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	22+0600	Deslizamiento sobre la banca de gran magnitud que generó el cierre total de la vía en varias oportunidades durante el mes. Se habilita paso a un carril.	22/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	24+0880	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía	25/11/2025	X		
1002	Junín - Pedregal	22+0600	Nuevo deslizamiento sobre la banca que generó el cierre total de la vía. Se habilita paso a un carril.	29/11/2025	X		
25NR01	Ipiales - Las Lajas	4+0750	Deslizamiento sobre la banca con cierre parcial de la vía	30/11/2025	X		

5. Relación de Correspondencia Enviada

FECHA	OFICIO No.	DESTINATARIO - CARGO	ASUNTO
29/10/2025	1976-2024-Tec-386	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES DIRECTORA TERRITORIAL-NARIÑO	2025E-VUVRAZ-123153 COMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO E INVENTARIO PARA EMERGENCIAS
30/10/2025	1976-2024-Tec-387	GIOVANNY MUÑOZ BURBANO ALCALDE MUNICIPAL DE MALLAMA	NOTIFICACIÓN POR INVASIÓN A LA ZONA DE VÍA, PR.(KM) 56+0170 RUTA 1002 JUNÍN - TÚQUERRES
31/10/2025	1976-2024-Tec-388	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES DIRECTORA TERRITORIAL-NARIÑO	INFORME DE ACCIDENTALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LAS VÍAS A CARGO DE LA AMV G2
31/10/2025	1976-2024-Tec-389	GIOVANNY MUÑOZ BURBANO ALCALDE MUNICIPAL DE MALLAMA	NOTIFICACIÓN POR INVASIÓN A LA ZONA DE VÍA, PR.(KM) 48+0730 RUTA 1002 JUNÍN - TÚQUERRES
31/10/2025	1976-2024-Tec-390	GIOVANNY MUÑOZ BURBANO ALCALDE MUNICIPAL DE MALLAMA	NOTIFICACIÓN POR AFECTACIÓN A LA ZONA DE VÍA, PR.(KM) 50+0070 RUTA 1002 JUNÍN - TÚQUERRES
5/11/2025	1976-2024-Tec-391	POLICIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PASTO-NARIÑO	SOLICITUD INFORMES ACCIDENTALIDAD PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
5/11/2025	1976-2024-Tec-392	POLICIA DE CARRETERAS TUQUERRES - NARIÑO	SOLICITUD INFORMES ACCIDENTALIDAD PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
5/11/2025	1976-2024-Tec-393	POLICIA DE CARRETERAS IPIALES - NARIÑO	SOLICITUD INFORMES ACCIDENTALIDAD PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
5/11/2025	1976-2024-Tec-394	INSPECCION DE POLICIA GUACHUCAL - NARIÑO	SOLICITUD INFORMES ACCIDENTALIDAD PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
5/11/2025	1976-2024-Tec-395	INSPECCION DE POLICIA ALDANA - NARIÑO	SOLICITUD INFORMES ACCIDENTALIDAD PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
5/11/2025	1976-2024-Tec-396	POLICIA RICAURTE(N)	SOLICITUD INFORMES ACCIDENTALIDAD PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
5/11/2025	1976-2024-Tec-397	POLICIA DE CARRETERAS MALLAMA - NARIÑO	SOLICITUD INFORMES ACCIDENTALIDAD PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
7/11/2025	1976-2024-Tec-398	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES DIRECTORA TERRITORIAL-NARIÑO	RESPUESTA SOLICITUD SEÑALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN TAPA, RUTA 1002 JUNÍN - TÚQUERRES.
7/11/2025	1976-2024-Tec-399	PATRICIA PAZOS GERENTE COOPSERMA	CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN TAPA Y SOLICITUD REPOSICIÓN TAPA CÁMARA DE INSPECCIÓN RED DE ALCANTARILLADO.
7/11/2025	1976-2024-Tec-400	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES DIRECTORA TERRITORIAL-NARIÑO	RESPUESTA SOLICITUD INSPECCIÓN ALCANTARILLA TAPONADA, RUTA 1002 JUNÍN - TÚQUERRES.
7/11/2025	1976-2024-Tec-401	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES DIRECTORA TERRITORIAL-NARIÑO	RADICACION PETICION DT NARINO 04 11 2025. RADICADO 2025E-VUVRAZ-124977.
19/11/2025	1976-2024-Tec-402	HAROLD YANDUN CHIRAN RL COOPERATIVA VIAL EL ACIAL	SOLICITUD CAPACITACIÓN
19/11/2025	1976-2024-Tec-403	REPRESENTANTES LEGALES COOPERTAIVAS GRUPO2	CITACION A CAPACITACION 21 DE NOVIEMBRE 2025
20/11/2025	1976-2024-Tec-404	EDGAR RAMIRO VELASQUEZ GOBERNADOR CABILDO INDIGENA"EL GRAN MALLAMA"	SOLICITUD PRESTAMO DE SALON
19/11/2025	1976-2024-Tec-405	JORGE BAYARDO PEREZ LEGARDA ABOGADO CONTRATISTA INVIAS	INFORMACIÓN SOBRE POSIBLE INVASIÓN VÍA ANTIGUA PASTO – TUMACO, SECTOR LA ENSILLADA.
20/11/2025	1976-2024-Tec-406	MARIO ALEXANDER HURTADO QUIÑONES ALCALDE MUNICIPAL BARBACOAS	INVASIÓN DERECHO DE VÍA, PR.(Km) 15+0240 y PR.(Km) 15+0400 RUTA 1002 JUNÍN - PEDREGAL MUNICIPIO DE BARBACOAS.
26/11/2025	1976-2024-Tec-407	GIOVANNY MUÑOZ BURBANO ALCALDE MUNICIPAL DE MALLAMA	NOTIFICACIÓN POR INVASIÓN A LA ZONA DE VÍA, PR.(KM) 43+0545 RUTA 1002 JURISDICCIÓN MUNICIPIO DE MALLAMA
28/11/2025	1976-2024-Tec-408	LUIS EDUARDO LEDEZMA DIRECTOR TERRITORIAL-NARIÑO (E)	CONCEPTO DE VIABILIDAD ADICION AL CONTRATO NO. 1744 DE 2025
28/11/2025	1976-2024-Tec-409	MILLER YAMITH PEREZ CUASTUMAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION MUNICIPAL	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION
28/11/2025	1976-2024-Tec-410	LUIS EDUARDO LEDEZMA DIRECTOR TERRITORIAL-NARIÑO (E)	RESPUESTA INFORME ESPECIAL DE POLICÍA 076 VÍA 0801 GUACHUCAL - IPIALES
29/11/2025	1976-2024-Tec-411	MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES DIRECTORA TERRITORIAL-NARIÑO	INFORME DE ACCIDENTALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 EN LAS VÍAS A CARGO DE LA AMV G2

6. Relación de Correspondencia Recibida.

FECHA	OFICIO No.	REMITENTE - CARGO	ASUNTO
4/11/2025	2025I-VBOG-087126	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	MATERIAL DE APOYO CAPACITACION SIGPAV
4/11/2025	CORREO ELECTRONICO	HENRY ALBERTO GUARIN QUIROGA SUBDIRECCION GESTION HUMANA	MATERIAL CAPACITACIÓN "DILIGENCIAMIENTO DE REPORTE DE EMERGENCIAS Y SITIOS CRÍTICOS" - 30-10-2025
5/11/2025	CORREO ELECTRONICO	EDINSON JAVIER CHICANGANA ASESOR SG - SST PUERTA DEL MACIZO	INFORME CTA PUERTA DEL MACIZO MES DE OCTUBRE 2025
5/11/2025	2025E-VUVRAZ-124977	PEDRO ANTONIO CANTICUS	SOLICITUD SOLUCIÓN DE AFECTACIONES POR DESVIÓ DE AGUA Y RENOVACIÓN DE MURO EN ZONA DE ALTO RIESGO
5/11/2025	2025E-VUVR-111360	GUILLERMO BENAVIDES	SOLICITUD DE SEÑALIZACION EN LA VIA DEL SECTOR EL ESPINO - RICAURTE
5/11/2025	2025E-VUVRAZ-122084	JUAN CARLOS PANTOJA	SOLICITUD DE INSPECCION OCULAR
6/11/2025	2025I-VNAR-086011	JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO SUPERVISOR TERRITORIAL	RADICADOS ACTAS MES DE OCTUBRE 2025
7/11/2025	CORREO ELECTRONICO	JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO SUPERVISOR TERRITORIAL	INFORME CONTRATO 1744-2025 "MONTO AGOTABLE"
7/11/2025	CORREO ELECTRONICO	JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO SUPERVISOR TERRITORIAL	DOCUMENTOS CONTRATO 1744-2025 "MONTO AGOTABLE"
7/11/2025	2025I-VBOG-088809	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FORMULARIOS DE SITIOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS
7/11/2025	GS-2025-198705-DENAR	ROBERTO BAUTISTA ESCOBAR MAYOR JEFE SECCIONAL TRANSITO Y TRASPORTE DENAR	RESPUESTA A SOLICITUD REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE OCTUBRE.
10/11/2025	-	MILLER YAMITH PEREZ CUASTUMAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION MUNICIPAL	RESPUESTA AL OFICIO NO. 1976-2024-TEC-0384 – INVASIÓN ZONA DE VÍA PR (KM) 9+0280, RUTA 0801 GUACHUCAL–IPIALES
11/11/2025	CORREO ELECTRONICO	COMANDANTE CESAR HERNANDO ORTIZ FORERO - IPIALES NARIÑO	INFORMES DE ACCIDENTES MES DE OCTUBRE 2025
11/11/2025	CORREO ELECTRONICO	DIANA YAMILE RUANO SST COOPERATIVA EL ACIAL	INFORME COOPERATIVA VIAL EL ACIAL MES DE OCTUBRE
12/11/2025	IP-120-007-01-088	JUAN PABLO LOPEZ INSPECTOR DE POLICIA GUACHUCAL	RESPUESTA SOLICITUD INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES DE COTUBRE 2025
12/11/2025	GS- 2025 -DENAR / SETRA – GUNIR– 29.25	JOSE MANUEL MANRIQUE MILLAN COMANDANTE TUQUERRES	SOLICITUD INFORMES ACCIDENTALIDAD PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
12/11/2025	CORREO ELECTRONICO	ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ MONTERO PROFESIONAL ESPECIALIZADO	FORMATO PARA REPORTE QUINCENAL DE SITIOS CRÍTICOS
12/11/2025	-	EDINSON JAVIER CHICANGANA ASESOR SG - SST PUERTA DEL MACIZO	NOTIFICACIÓN CAPACITACIÓN MENSUAL CTA PUERTA DEL MACIZO
18/11/2025	CORREO ELECTRONICO	JORGE BAYARDO PEREZ LEGARDA ABOGADO CONTRATISTA INVIAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SECTOR LA ENSILLADA.
19/11/2025	2025E-VUVRAZ-131084	UVEIMAN HERNADO LAGOS VEGA SUPERVISOR TERRITORIAL	FAVOR APOYAR EN LAS REPUESTAS 1 Y 2
20/11/2025	CORREO ELECTRONICO	ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ MONTERO PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS
21/11/2025	2025I-VBOG-093381	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	REITERACIÓN SOLICITUD SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO FORMULARIOS SITIOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS
24/11/2025	2025I-VBOG-093896	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE PUENTES EN VÍAS NACIONALES INVAS
25/11/2025	2025S-VNAR-090160	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO(E)	RECORDATORIO PARA EL USO DE LOS FORMULARIOS DE SITIOS CRITICOS Y EMERGENCIAS -AMVG2
25/11/2025	CORREO ELECTRONICO	UVEIMAN HERNADO LAGOS VEGA SUPERVISOR TERRITORIAL	TARJETA PROFESIONAL DIRECTOR ENCARGADO LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS TP 19202 – 79853 CAUCA
25/11/2025	CORREO ELECTRONICO	GUSTAVO ADOLFO DORADO RL COOPERATIVA PUERTA DEL MACIZO	INFORME DE CALIDAD - PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
25/11/2025	GS-2025-210214-DENAR	COMANDANTE CESAR HERNANDO ORTIZ FORERO - IPIALES NARIÑO	RESPUESTA INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES DE OCTUBRE
26/11/2025	CORREO ELECTRONICO	ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CANTIDADES SEÑALIZACION VIAL - NARIÑO
27/11/2025	2025E-VUVRAZ-133331	SUBINTENDENTE OMAR EDUARDO OVALLE MORENO JUNIN- PIEDRANCHA	ENTREGA INFORME ESPECIAL DE POLICIA EN SEGURIDAD VIAL
28/11/2025	CORREO ELECTRONICO	SUBINTENDENTE FREDY YOVANY RUGE BONILLA POLICIA PIEDRANCHA	ACCIDENTES DE TRÁNSITO OCURRIDOS EN EL MES DE OCTUBRE

7. Relación de informes semanales

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS	FECHA	3	11	25

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO CONTRATO No: 1976 de 2024

Semana Número: 67 Del: 27/10/2025 Al: 02/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 464 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato: Jonny Andrés Fajardo Rosero

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	-	-
Valor básico de la Obra programada:	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	-	-
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ -	$ -

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:
Contrato No.
Valor Inicial: $
Valor Actualizado: $
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

CONTRATO DE CONSULTORÍA

Consultor: **CONSORCIO JOERING 2024**

Contrato No.	1976 de 2024
Valor Inicial:	$4.050.198.082,00
Valor Actualizado:	$4.050.198.082,00
Valor ejecutado:	$1.486.818.345,39
Porcentaje de avance:	37%
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026
Plazo Actualizado:	Hasta el 31 de julio de 2026
Fecha de Iniciación:	26/07/2024
Fecha de Vencimiento:	31/07/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DIA	27	Atención de emergencias presentadas en la Ruta 1002 sector, Junín -Túquerres en los siguientes puntos PR 17+0900, PR 19+0020, PR 27+0000, PR 17+0700, PR 32+0550, PR 34+0720, PR 35+0420. Labores de oficina, elaboración informe semanal, registro de odómetros.
DIA	28	Labores de oficina, avance informe de accidentalidad para el periodo del mes de septiembre de 2025.
DIA	29	Recorrido de la vía 1002 sector Ospina Pérez, toma de registro fotográfico sitios criticos. Labores de oficina, avance informe de accidentalidad para el periodo del mes de septiembre de 2025.
DIA	30	Recorrido de las vías, 1002 sector Mallama – Túquerres, 1701 Guachucal – El Espino, 0801 Guachucal – Ipiales, 25NR01 Ipiales – Las Lajas. Supervisión del estado de las vías. Labores de oficina, notificación por invasión a la zona de vía de la Ruta 1002 sector Junín – Túquerres PR 56+0170.
DIA	31	Labores de oficina, se realizó el informe de accidentalidad para el periodo del mes de septiembre de 2025. Notificación por invasión a la zona de vía de la Ruta 1002 sector Junín – Túquerres en el PR 56+0170 y en el PR 48+0730.
DIA	1	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	2	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DIA	3	Labores de oficina. Realización del informe semanal, odómetros, registro fotográfico.
DIA	4	Recorrido de las vías 1701 Guachucal - El Espino, 0801 Guachucal - Ipiales, 25NR01 Ipiales - Las Lajas, 1002 sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	5	Labores de oficina. Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	6	Recorrido de las vías 1701 Guachucal - El Espino, 0801 Guachucal - Ipiales, 25NR01 Ipiales - Las Lajas, 1002 sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	7	Recorrido de la vía 1002 Sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	8	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	9	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE CONSULTORÍA

Firma
Nombre: RICHARD M RINCON JURADO
Matrícula No. : 52202-62923 NRÑ

Semana Número: 67 Del: 27/10/2025 Al: 02/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 464 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LA SEMANA



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 35+0440



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 35+0440



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL DESLIZAMIENTO UBICADO EN EL PR 27+0000



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL DESLIZAMIENTO UBICADO EN EL PR 27+0000



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. NOTIFICACIÓN INVASIÓN ZONA DE VÍA EN EL PR 56+0160



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. SUPERVISIÓN LIMPIEZA DE CALZADA POR CAIDA DE MATERIAL EN EL PR 72+0900

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS	FECHA	10	11	25

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO CONTRATO No: 1976 de 2024

Semana Número: 68 Del: 03/11/2025 Al: 09/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 471 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato: Jonny Andrés Fajardo Rosero

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	-	-
Valor básico de la Obra programada:	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	-	-
Valor básico de la Obra Ejecutada:	-	$ -

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:
Contrato No.
Valor Inicial: $
Valor Actualizado: $
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

CONTRATO DE CONSULTORÍA

Consultor:	**CONSORCIO JOERING 2024**
Contrato No.	1976 de 2024
Valor Inicial:	$4.050.198.082,00
Valor Actualizado:	$4.050.198.082,00
Valor ejecutado:	$1.486.818.345,39
Porcentaje de avance:	37%
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026
Plazo Actualizado:	Hasta el 31 de julio de 2026
Fecha de Iniciación:	26/07/2024
Fecha de Vencimiento:	31/07/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DIA	3	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	4	Labores de oficina, elaboración informe semanal, registro de odómetros. Señalización por deslizamiento en el PR 52+0160.
DIA	5	Atención de emergencia presentada en el PR 34+0100 de la Ruta 1002, sector Junín – Túquerres. Labores de oficina, solicitud informe de accidentalidad para el mes de octubre 2025, notificación por afectación a la zona de vía en el PR 50+0070 de la Ruta 1002 sector Junín – Túquerres.
DIA	6	Recorrido de las vías, 1002 sector Junín – Túquerres, 1701 Guachucal – El Espino. Supervisión del estado de las vías. Visita técnica al derecho de petición vía 1002 PR 94+0870, Túquerres Barrio El Carmen. Labores de oficina.
DIA	7	Labores de oficina, respuesta solicitud señalización y construcción tapa, Ruta 1002 Junín – Túquerres. Respuesta solicitud inspección alcantarilla taponada, Ruta 1002 Junín - Túquerres. Solicitud construcción o reposición tapa y solicitud reposición tapa cámara de inspección red de alcantarillado.
DIA	8	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	9	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DIA	10	Labores de oficina. Realización del informe semanal, odómetros, registro fotográfico.
DIA	11	Recorrido de las vías 1701 Guachucal - El Espino, 0801 Guachucal - Ipiales, 25NR01 Ipiales - Las Lajas, 1002 sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	12	Labores de oficina. Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	13	Recorrido de las vías 1701 Guachucal - El Espino, 0801 Guachucal - Ipiales, 25NR01 Ipiales - Las Lajas, 1002 sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	14	Recorrido de la vía 1002 Sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	15	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	16	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE CONSULTORÍA

Firma
Nombre: RICHARD M RINCON JURADO
Matrícula No. : 52202-62923 NRÑ

Semana Número: 68 Del: 03/11/2025 Al: 09/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 471 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LA SEMANA



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. SEÑALIZACIÓN POR DESLIZAMIENTO EN EL PR 52+0430



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 34+0100



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 34+0100



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. - NOTIFICACIÓN POR INVASIÓN A LA ZONA DE VÍA, PR 56+0170



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. VISITA TECNICA AL DERECHO DE PETICIÓN, BARRIO EL CARMEN



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO AEREO A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 34+0100

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS	FECHA	18	11	25

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO CONTRATO No: 1976 de 2024

Semana Número: 69 Del: 10/11/2025 Al: 16/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 478 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato: Jonny Andrés Fajardo Rosero

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	-	-
Valor básico de la Obra programada:	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	-	-
Valor básico de la Obra Ejecutada:	-	$ -

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:
Contrato No.
Valor Inicial: $
Valor Actualizado: $
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

CONTRATO DE CONSULTORÍA

Consultor:	**CONSORCIO JOERING 2024**
Contrato No.	1976 de 2024
Valor Inicial:	$4.050.198.082,00
Valor Actualizado:	$4.050.198.082,00
Valor ejecutado:	$1.486.818.345,39
Porcentaje de avance:	37%
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026
Plazo Actualizado:	Hasta el 31 de julio de 2026
Fecha de Iniciación:	26/07/2024
Fecha de Vencimiento:	31/07/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DIA	10	Labores de oficina, elaboración informe semanal, registro de odómetros. Envió evaluación del Estado de la red vial con Criterio Técnico.
DIA	11	Recorrido de la vía 1002, sector Mallama – El Espino, supervisión del estado de la vía. Supervisión de la cooperativa de trabajo Puerta del Macizo por parte de la Sst. Labores de oficina.
DIA	12	Atención de emergencia presentada en el PR 15+0900 y PR 15+0500 de la Ruta 1002, sector Junín – Túquerres. Labores de oficina.
DIA	13	Atención de emergencia presentada en el PR 22+0140, PR 34+0100, PR 35+0770. Labores de oficina. Supervisión demarcación de zona escolar en la Ruta 25NR01 Ipiales – Lajas en el PR 1+0840. Labores de oficina.
DIA	14	Recorrido de la vía 1002, sector Junín – Túquerres. Supervisión del estado de la vía. Supervisión demarcación de zona escolar en la Ruta 25NR01 Ipiales – Lajas en el PR 1+0840. Labores de oficina.
DIA	15	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	16	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DIA	17	Labores de oficina. Realización del informe semanal, odómetros, registro fotográfico.
DIA	18	Recorrido de las vías 1701 Guachucal - El Espino, 0801 Guachucal - Ipiales, 25NR01 Ipiales - Las Lajas, 1002 sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	19	Labores de oficina. Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	20	Recorrido de las vías 1701 Guachucal - El Espino, 0801 Guachucal - Ipiales, 25NR01 Ipiales - Las Lajas, 1002 sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	21	Recorrido de la vía 1002 Sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	22	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	23	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE CONSULTORÍA

Firma
Nombre: RICHARD M RINCON JURADO
Matrícula No. : 52202-62923 NRÑ

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MES-FR-21		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	3

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA	FECHA	18	11	25
DIRECCIÓN TERRITORIAL	NARIÑO	Contrato No:	1976 de 2024		

Semana Número: 69 Del: 10/11/2025 Al: 16/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 478 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LA SEMANA



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. SUPERVISION DE LA CTA PUERTA DEL MACIZO POR PARTE DE LA SST



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. SUPERVISION DE LA CTA PUERTA DEL MACIZO POR PARTE DE LA SST



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. SUPERVISION DE LA CTA PUERTA DEL MACIZO POR PARTE DE LA SST



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 15+0900



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 15+0900



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 15+0500

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MES-FR-21		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	3	DE	3
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA	FECHA	18	11	25
DIRECCIÓN TERRITORIAL	NARIÑO	Contrato No:	1976 de 2024		

Semana Número: 69 Del: 10/11/2025 Al: 16/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 478 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LA SEMANA



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 34+0100



VIA 25NR01 IPIALES - LAS LAJAS. SUPERVISION DEMARCACION ZONA ESCOLAR EN EL PR 1+0840



VIA 25NR01 IPIALES - LAS LAJAS. SUPERVISION DEMARCACION ZONA ESCOLAR EN EL PR 1+0840



VIA 25NR01 IPIALES - LAS LAJAS. SUPERVISION DEMARCACION ZONA ESCOLAR EN EL PR 1+0840



VIA 25NR01 IPIALES - LAS LAJAS. SUPERVISION DEMARCACION ZONA ESCOLAR EN EL PR 1+0840



VIA 25NR01 IPIALES - LAS LAJAS. SUPERVISION DEMARCACION ZONA ESCOLAR EN EL PR 1+0840

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS	FECHA	24	11	25

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO CONTRATO No: 1976 de 2024

Semana Número: 70 Del: 17/11/2025 Al: 23/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 485 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato: Jonny Andrés Fajardo Rosero

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	-	-
Valor básico de la Obra programada:	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	-	-
Valor básico de la Obra Ejecutada:	-	$ -

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:
Contrato No.
Valor Inicial: $
Valor Actualizado: $
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

CONTRATO DE CONSULTORÍA

Consultor:	**CONSORCIO JOERING 2024**
Contrato No.	1976 de 2024
Valor Inicial:	$4.050.198.082,00
Valor Actualizado:	$4.050.198.082,00
Valor ejecutado:	$1.486.818.345,39
Porcentaje de avance:	37%
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026
Plazo Actualizado:	Hasta el 31 de julio de 2026
Fecha de Iniciación:	26/07/2024
Fecha de Vencimiento:	31/07/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DIA	17	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	18	Labores de oficina, elaboración informe semanal, registro de odómetros. Seguimiento eventos de orden público en la Ruta 1002 sector Junín – Túquerres PR 12+0360.
DIA	19	Recorrido de la vía 1002, sector Mallama – Ricaurte, supervisión del estado de la vía. Labores de oficina. Seguimiento eventos de orden público en la Ruta 1002 sector Junín – Túquerres PR 12++0360.
DIA	20	Atención de las emergencias presentadas en los puntos PRs 10+0620, 12+0950, 13+0240, 14+0180, 15+0950, 17+0180, 20+0260, 21+0870, 23+0520, 24+0040 de la Ruta 1002 sector Junín - Túquerres. Seguimiento eventos de orden público en la Ruta 1002, PR 12+0360. Labores de oficina, notificación por invasión a la zona de vía, PR 15+0240 y PR 15+0400 Ruta 1002, sector Junín – Túquerres.
DIA	21	Recorrido de las vías, 1002 sector Junín – Túquerres, 1701 Guachucal – El Espino, 0801 Guachucal – Ipiales. Supervisión del estado de las vías. Labores de oficina, capacitación de cooperativas de mantenimiento rutinario.
DIA	22	Atención de emergencia presentada en el punto PR 22+0600 de la Ruta 1002 sector Junín – Túquerres.
DIA	23	Se continua con atención de emergencia presentada en el punto PR 24+0600 de la Ruta 1002 sector Junín – Túquerres.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DIA	24	Labores de oficina. Realización del informe semanal, odómetros, registro fotográfico.
DIA	25	Recorrido de las vías 1701 Guachucal - El Espino, 0801 Guachucal - Ipiales, 25NR01 Ipiales - Las Lajas, 1002 sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	26	Labores de oficina. Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	27	Recorrido de las vías 1701 Guachucal - El Espino, 0801 Guachucal - Ipiales, 25NR01 Ipiales - Las Lajas, 1002 sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	28	Recorrido de la vía 1002 Sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	29	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	30	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE CONSULTORÍA

Firma
Nombre: RICHARD M RINCON JURADO
Matrícula No. : 52202-62923 NRÑ

Semana Número: 70 Del: 17/11/2025 Al: 23/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 485 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LA SEMANA



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. TOMA DE REGISTRO FOTOGAFICO DE LA ALCANTARILLA DEL PUNTO PR 21+0640



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 10+0620



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 15+0950



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 20+0260



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 24+0040



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 17+0180

Semana Número: 70 Del: 17/11/2025 Al: 23/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 485 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LA SEMANA



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 21+0870



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. CAPACITACIÓN DE COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. CAPACITACIÓN DE COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. TOMA DE REGISTRO FOTOGAFICO DEL DESLIZAMIENTO PR 21+0870



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 22+0600



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. ATENCIÓN DE EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR 22+0600

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS	FECHA	1	12	25

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — CONTRATO No: 1976 de 2024

Semana Número: 71 Del: 24/11/2025 Al: 30/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 492 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato: Jonny Andrés Fajardo Rosero

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada	-	-
Valor básico de la Obra programada:	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	-	-
Valor básico de la Obra Ejecutada:	-	$ -

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:
Contrato No.
Valor Inicial: $
Valor Actualizado: $
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

CONTRATO DE CONSULTORÍA

Consultor:	**CONSORCIO JOERING 2024**
Contrato No.	1976 de 2024
Valor Inicial:	$4.050.198.082,00
Valor Actualizado:	$4.050.198.082,00
Valor ejecutado:	$1.574.860.929,74
Porcentaje de avance:	39%
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026
Plazo Actualizado:	Hasta el 31 de julio de 2026
Fecha de Iniciación:	26/07/2024
Fecha de Vencimiento:	31/07/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DIA	24	Recorrido de la vía 1002, sector Junín – Mallama, supervisión de las emergencias presentadas. Labores de oficina, elaboración informe semanal, registro de odómetros. Avance de actas parciales de obra de contratos de mantenimiento rutinario de las cooperativas Caminantes, Camineros, Acial indígena y Puerta del Macizo.
DIA	25	Recorrido de la vía 1002, sector Junín – Túquerres. Supervisión del estado de la vía. Labores de oficina, avance de actas parciales de obra de contratos de mantenimiento rutinario de las cooperativas Caminantes, Camineros, Acial indígena y Puerta del Macizo.
DIA	26	Recorrido de la vía 1002, sector Junín – Túquerres. Supervisión del estado de la vía. Supervisión de la cooperativa de trabajo Puerta del Macizo por parte de la Sst. Labores de oficina, notificación por invasión a la zona de vía, PR 43+0545 Ruta 1002 sector Junín – Túquerres. Avance de actas de costos de la AMV del periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025.
DIA	27	Recorrido de la vía 1002, sector Junín – Mallama. Supervisión del estado de la vía. Labores de oficina, avance de actas de costos de la AMV del periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025.
DIA	28	Recorrido de las vías, 1002 sector Junín – Túquerres, 1701 Guachucal – El Espino, 0801 Guachucal - Ipiales. Supervisión del estado de la vía. Labores de oficina, elaboración de actas de costos de la AMV del periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025. Se realizó el informe de accidentalidad para el periodo del mes de noviembre de 2025.
DIA	29	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	30	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DIA	1	Labores de oficina. Realización del informe semanal, odómetros, registro fotográfico.
DIA	2	Recorrido de las vías 1701 Guachucal - El Espino, 0801 Guachucal - Ipiales, 25NR01 Ipiales - Las Lajas, 1002 sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	3	Labores de oficina. Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	4	Recorrido de las vías 1701 Guachucal - El Espino, 0801 Guachucal - Ipiales, 25NR01 Ipiales - Las Lajas, 1002 sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	5	Recorrido de la vía 1002 Sector Junín - Túquerres. Supervisión para verificar el estado de las vías.
DIA	6	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.
DIA	7	Personal y vehículos disponibles para atención de emergencias.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE CONSULTORÍA

Firma
Nombre: RICHARD M RINCON JURADO
Matrícula No. : 52202-62923 NRÑ

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MES-FR-21		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	2
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA	FECHA	1	12	25

DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Contrato No: **1976 de 2024**

Semana Número: 71 Del: 24/11/2025 Al: 30/11/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 492 DÍAS

Supervisor Técnico de Contrato:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LA SEMANA



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. TOMA DE REGISTRO FOTOGAFICO DERRUMBE PR 22+0600



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. TOMA DE REGISTRO FOTOGAFICO DERRUMBE PR 24+0040



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. SUPERVISIÓN DE LA CTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PUERTA DEL MACIZO POR PARTE DE LA SST



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. SUPERVISIÓN DE LA CTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PUERTA DEL MACIZO POR PARTE DE LA SST



VÍA 1002 SECTOR JUNÍN - TÚQUERRES. SUPERVISIÓN DE LA CTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PUERTA DEL MACIZO POR PARTE DE LA SST



VÍA 0801 GUACHUCAL - IPIALES. SUPERVISIÓN DE LA VÍA PARCHEO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL PR 7+0580

8. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial.

Para el presente periodo se realizaron las actividades enmarcadas dentro del contrato de la Administración vial.

- Recorridos de inspección para seguimiento de indicadores de las carreteras:
  1002 Junín - Túquerres PR 0+0000 – PR 95+0000
  1701 Guachucal - el espino PR 28+0900 – PR 40+0200
  0801 Guachucal - Ipiales PR 0+0000- PR 23+0900
  25NR01 Ipiales - las lajas PR 0+0000- PR 5+0870

- Atención de emergencias en las carreteras 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres y 25NR01 Ipiales - Las Lajas apoyando la supervisión del contrato de monto agotable y directamente mediante insumos del contrato de AMV.

- Elaboración de acta de costos de la AMV del periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025.

- Elaboración de actas parciales de obra de contratos de mantenimiento rutinario de las cooperativas Caminantes, Camineros, Acial indígena y Puerta del Macizo

- Envío actualización y novedades de sitios críticos semanales.

- Elaboración de informes semanales de Administración Vial.

Otras actividades:

- Se realizó vigilancia del buen uso de la zona de vía de reserva y se realizaron las respectivas notificaciones a las autoridades locales en donde se presentan las infracciones con relación a la ley 1228 de 2008, relación en correspondencia enviada.

- Se dio respuesta a las diferentes solicitudes realizadas por el INVIAS como entidades y usuarios que tienen influencia sobre las vías nacionales.

- Se realizó el informe de accidentalidad para el periodo del mes de octubre de 2025.

- Seguimiento y supervisión contratos de mantenimiento rutinario en materia de SST.

- Programación y coordinación de obras menores con recursos de insumos y mano de obra de las cooperativas de mantenimiento rutinario. Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres; construcción de obra de mitigación con sacas.

9. Registro fotográfico



INSPECCION SOLICITUD DE LA COMUNIDAD
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 56+0170



INSPECCIÓN SOLICITUD DE LA COMUNIDAD
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 94+0870



SUPERVISIÓN DE LAS COOPERATIVAS POR PARTE DE LA SST
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 62+0620



DEMARCACION ZONA ESCOLAR
Vía 25NR01 Ipiales – Las Lajas
PR 1+0840



NOTIFICACIONES POR INVASIÓN A LA ZONA DE VÍA
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 15+0240



TOMA DE REGISTRO FOTOGAFICO
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 21+0640

9. Registro fotográfico



CAPACITACIÓN COOPERATIVAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres



NOTIFICACIONES POR INVASIÓN A LA ZONA DE VÍA
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 43+0545



SUPERVISIÓN DE LAS COOPERATIVAS POR PARTE DE LA SST
Vía 1701 Guachucal – El Espino
PR 40+0050



SUPERVISIÓN PARCHEO CONTRATO MANTENIMIENTO
Vía 0801 Guachucal – Ipiales
PR 7+0580



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 19+0020




ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 34+0100

9. Registro fotográfico



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 15+0920

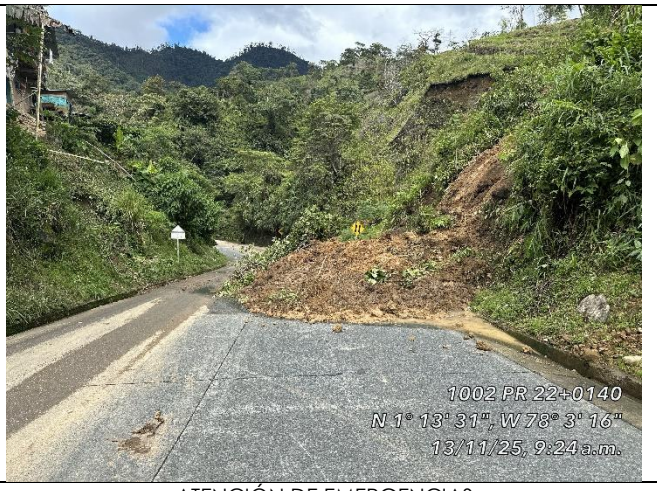

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 22+0140



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres
PR 21+0850



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres
PR 20+0260



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres
PR 15+0950



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres
PR 24+0040

10. Registro fotográfico



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 25+0220



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín - Túquerres
PR 24+0880



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres
PR 17+0180



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres
PR 23+0500



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres
PR 22+0600



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Vía 1002 Junín - Pedregal, sector Junín – Túquerres
PR 22+0600
