
CONTRATO ANH-607-2025 "VOLCANES DEL SUR"

ITEM		Duracion	Comienzo	Fin
1	**FASE PREOPERATIVA**	100 días	8/09/2025	3/11/2025
1.1	Firma del contrato	0 días	10/09/2025	10/09/2025
1.2	FirmaActa de inicio	0 días	16/09/2025	16/09/2025
	Workshop Pre-Operaciones	0 días	26/09/2025	26/09/2025
1.3	Informe Operativo	10 días	16/09/2025	15/10/2025
1.4	Informe diagnóstico de información	20 días	17/09/2025	15/10/2025
1.5	Informe social	20 días	16/09/2025	15/10/2025
	Factura Primer 25 %			16/10/2025
1.6	Alistamiento Operaciones Aereas	75 días	16/09/2025	30/11/2025
2	**FASE OPERATIVA**	51 días	31/10/2025	8/04/2026
2.1	Calibración de equipos (gravimetro)	7 días	1/12/2025	8/12/2025
2.2	Adquisición de datos	112 días	9/12/2025	31/03/2026
2.3	Procesamiento en campo	120 días	9/12/2025	8/04/2026
3	**FASE DE INTERPRETACION (Con preinterpretación)**	107 días	23/02/2026	24/05/2026
3.1	Pre-Interpretación	25 dias	5/11/2025	30/11/2025
3.2	Interpretacion Campos de Potencial	35 días	18/04/2026	18/05/2026
3.3	Integracion	35 días	22/04/2026	27/05/2026
4	INFORME FINAL	10 días	24/05/2026	3/06/2026

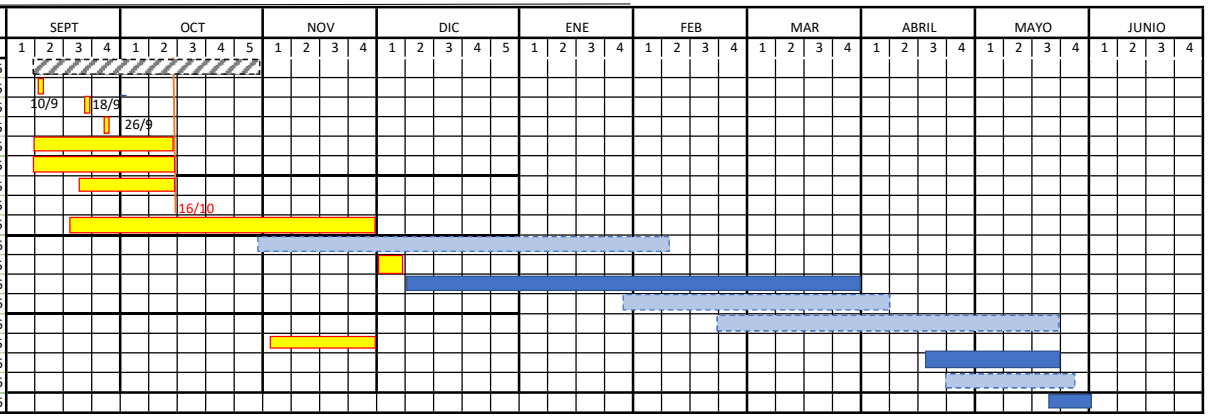

CONVENCIONES	
	Planificado
	Realizado
	Continuo
