FEBRERO DE 2026

INFORME PARCIAL No. 1

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO No. 130 de 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, MEDIANTE ACCIONES OPERATIVAS, EDUCATIVAS Y DE FORTALECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

ACUAEDUCTO, ALCANTARILLA Y ASEO DE URIBIA S.A.S. E.S.P. URIBIA - LA GUAJIRA

CONTENIDO

1. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO....2
2. INTRODUCCION....3
3. OBJETIVO GENERAL....4
3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS....4
4. ALCANCE Y COBERTURA GEOGRÁFICA....5
4.1. COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL....5
4.2. ALCANCE POBLACIONAL Y SECTORIAL....5
5. MARCO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN....6
5.1. COMPONENTE DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL....6
5.2. COMPONENTE OPERATIVO Y DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 7
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO....9
7. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y AVANCE....13
7.1. FASES DE EJECUCIÓN....14
7.2. TABLA RESUMEN DEL CRONOGRAMA....15
7.3. AVANCE DEL CRONOGRAMA Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO 16
8. MATRIZ DE INDICADORES (KPIS) Y METAS ALCANZADAS....17
8.1. TABLA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO....18
9. EJECUCIÓN FINANCIERA / PRESUPUESTO RESUMIDO....18
10. RIESGOS, SST Y ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD....19
10.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)....19
10.2. MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS....20
11. ANEXOS Y SOPORTES....21

1. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	No. 130 DEL 29 DE ENERO DEL 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, MEDIANTE ACCIONES OPERATIVAS, EDUCATIVAS Y DE FORTALECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.
NIT	892.115.155-4
CONTRATISTA	LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBIA S.A.S. E.S.P.
NIT	900735703-3
REPRESENTANTE LEGAL	INDIS ELINA MEJIA MENDOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.124.497.062 expedida en Uribia, La Guajira
DIRECCIÓN	AVENIDA HOSPITAL NO. 5-119
TELÉFONO	7177519
EMAIL	aaadeuribia@gmail.com
VALOR	MIL MILLONES DE PESOS ($ 1.000.000.000) M/L
PLAZO	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	18 DE AGOSTO DE 2026
TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL No. 1
PERIODO REPORTADO	01 AL 28 DE FEBRERO 2026

2. INTRODUCCION

La Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), en el marco del Artículo 2.3.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), trasciende la recolección básica para consolidarse como un sistema estratégico. Este enfoque prioriza la reducción de la generación en la fuente, la valorización y aprovechamiento de los materiales según sus características y viabilidad financiera, así como el tratamiento y la disposición final técnica de la fracción no aprovechable.

En el contexto del municipio de Uribia, la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 2015-2027 ha evidenciado tanto avances como desafíos estructurales. Si bien la empresa reporta una cobertura del 86% en la zona urbana, existen sectores periféricos y rurales donde las condiciones topográficas y sociodemográficas limitan drásticamente la prestación del servicio. A esta barrera logística se suma una profunda brecha conductual frente a la separación en la fuente: los diagnósticos municipales indican que, aunque el 95% de la población del casco urbano conoce el concepto de reciclaje, la aplicación práctica de este hábito es mínima.

La ausencia de una cultura de separación no solo impide la reintegración de materiales a la cadena de valor y debilita la economía circular, sino que detona la disposición inadecuada de residuos en el espacio público y la proliferación de puntos críticos de acumulación en zonas urbanas y rurales.

Para mitigar esta problemática y dar cumplimiento real a las metas del PGIRS, es imperativo estructurar una intervención integral. Se requiere un despliegue articulado de acciones operativas, un monitoreo más riguroso en el territorio y estrategias de educación ambiental —como talleres de sensibilización comunitaria— que transformen los hábitos de los usuarios.

Respondiendo a esta necesidad de articulación territorial y social, el Municipio ha formulado el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO No. 130 de 2026: **"APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, MEDIANTE ACCIONES OPERATIVAS, EDUCATIVAS Y DE FORTALECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES"**. Esta iniciativa se proyecta como la herramienta fundamental para sincronizar la gestión técnica del servicio de aseo con la participación activa de la comunidad.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

3. OBJETIVO GENERAL

Promover, fortalecer e implementar prácticas sostenibles en la gestión integral de residuos sólidos, mediante acciones de sensibilización, capacitación, acompañamiento técnico y articulación institucional, orientadas a la reducción de impactos ambientales y sanitarios asociados a la generación, manejo y disposición inadecuada de los residuos.

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Sensibilizar y capacitar a la comunidad urbana y rural del municipio de Uribia sobre prácticas adecuadas de separación en la fuente, almacenamiento, presentación y disposición de residuos sólidos.

- Promover la reducción, reutilización y aprovechamiento de residuos, fomentando hábitos de consumo responsable y el enfoque de economía circular a nivel domiciliario, comercial e institucional.

- Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los actores involucrados en la gestión de residuos sólidos, incluyendo personal de la empresa de aseo, líderes comunitarios y funcionarios públicos.

- Apoyar la implementación de acciones contempladas en el PGIRS municipal, contribuyendo al cumplimiento de metas relacionadas con el manejo ambientalmente adecuado de los residuos.

- Fomentar la participación comunitaria e interinstitucional, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y la articulación entre la administración municipal, la empresa prestadora del servicio de aseo y otros actores locales.

- Reducir los impactos ambientales y sanitarios asociados a prácticas inadecuadas de manejo y disposición de residuos, contribuyendo a la protección del entorno natural y la calidad de vida de la población.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

4. ALCANCE Y COBERTURA GEOGRÁFICA

El CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO No. 130 de 2026 está diseñado para promover, fortalecer e implementar prácticas sostenibles en la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS). Su ejecución se enmarca en la reducción de impactos ambientales y sanitarios asociados a la generación, manejo y disposición inadecuada de los residuos, mediante acciones de sensibilización, capacitación, acompañamiento técnico y articulación institucional.

Cabe destacar que la intervención se centra estrictamente en el fortalecimiento operativo, educativo y organizacional, sin contemplar inversiones en infraestructura física mayor.

Para garantizar la efectividad y la medición de las actividades, el proyecto se delimita bajo los siguientes ejes de cobertura:

4.1. COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL

Las acciones operativas y educativas se desplegarán de manera estratégica en dos zonas clave del municipio de Uribia, atendiendo a sus particularidades demográficas y logísticas:

- Zona Urbana (Cabecera Municipal): La intervención abarcará los barrios y sectores del casco urbano, priorizando aquellas áreas comerciales y residenciales con alta tasa de generación de residuos, así como los espacios públicos donde se ha identificado la aparición recurrente de puntos críticos de acumulación clandestina.

- Zona Rural (Cabo de la Vela): Reconociendo las condiciones topográficas y las dinámicas turísticas y socioculturales de la región, el proyecto extenderá su radio de acción hacia el sector de Cabo de la Vela. En esta zona se adaptará la logística operativa para superar las barreras de acceso y garantizar la inclusión de estas comunidades en manejo adecuado de residuos.

4.2. ALCANCE POBLACIONAL Y SECTORIAL

El enfoque metodológico del proyecto es inclusivo y transversal, impactando directamente a los diferentes actores que componen el ciclo de generación de

residuos en el territorio. La población objetivo e instituciones beneficiarias se categorizan de la siguiente manera:

- Usuarios Residenciales: Familias y hogares de las zonas urbana y rural intervenidas, quienes serán el foco principal de las campañas puerta a puerta y talleres comunitarios para la adopción de la separación en la fuente.
- Sector Comercial: Establecimientos de comercio, restaurantes y prestadores de servicios turísticos, a quienes se orientará hacia el cumplimiento de horarios de recolección y la minimización de plásticos de un solo uso.
- Instituciones Educativas: Estudiantes y docentes de colegios focalizados, quienes recibirán ciclos de capacitación formal (certificada) para actuar como multiplicadores del mensaje ambiental y promotores del relevo generacional en la cultura del aseo.
- Actores Comunitarios y Operativos: Líderes barriales y /o operarios EIC que serán capacitados y dotados como "Vigías Ambientales", consolidando una red de apoyo ciudadano que trabajará de la mano con el personal operativo de la empresa prestadora del servicio.

5. MARCO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Para dar cumplimiento a los objetivos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO No. 130 de 2026 en el municipio de Uribia (abarcando el casco urbano y el sector rural de Cabo de la Vela), la intervención se ha estructurado bajo un modelo de acción dual. Este modelo integra un Componente de Educación y Participación Social para la transformación de hábitos, y un Componente Operativo para la mitigación directa de los impactos ambientales en terreno.

A continuación, se detalla la ruta metodológica para cada frente de trabajo:

5.1. COMPONENTE DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Este componente busca generar corresponsabilidad en los usuarios residenciales, comerciales e institucionales frente a la separación en la fuente y la entrega adecuada de los residuos. La metodología se desarrollará en tres fases:

- Conformación y Dotación del Equipo de Vigías Ambientales: Para garantizar la confianza y el acercamiento efectivo con las comunidades, el personal en

campo operará bajo la figura de "Vigías Ambientales". Para su correcta identificación y posicionamiento institucional en el territorio, el equipo será dotado con Kits de Logística que incluyen chalecos y gorras con los distintivos visuales de la campaña, así como carnets de identificación en PVC. Esto es fundamental para formalizar las visitas puerta a puerta y las intervenciones en espacios públicos.

- Ejecución de Talleres y Jornadas de Sensibilización: Se realizarán sesiones teóricas y prácticas orientadas a enseñar el ciclo de los residuos y la economía circular. Para garantizar la permanencia y receptividad de los asistentes en estas jornadas de transferencia de conocimiento, se entregará refrigerio e hidratación a los usuarios (residenciales, comerciales y estudiantes).

- Validación en Instituciones Educativas: El trabajo con estudiantes es clave para el relevo generacional de la cultura ambiental. Al finalizar los ciclos de capacitación en los colegios, se realizará un acto de clausura donde se entregarán Certificados de Participación impresos (en papel propalcote de 240 gr a full color), con el fin de avalar el compromiso de los jóvenes como multiplicadores del mensaje ambiental en sus hogares.

5.2. COMPONENTE OPERATIVO Y DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS

De manera simultánea a la educación, se ejecutarán acciones correctivas en el espacio público para eliminar los focos de contaminación e insalubridad. La metodología de campo será la siguiente:

- Identificación y Aislamiento de Puntos Críticos: El equipo operativo, en conjunto con los vigías ambientales, realizará un mapeo de las zonas de acumulación clandestina de residuos sólidos en el área urbana, asentamientos y zonas periféricas.

- Intervención y Limpieza en Terreno: Una vez focalizado el punto crítico, el personal de la empresa de aseo procederá con la recolección y remoción del material. Para garantizar la eficiencia de los tiempos y movimientos de esta labor, se dispondrá de herramientas, haciendo uso intensivo de palas metálicas, rastrillos para la remoción de material particulado y escombros ligeros, carretillas de carga para el acopio temporal, y la disposición final en bolsas de basura de alta resistencia y gran capacidad.

- Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Dado el riesgo biológico y mecánico inherente a la manipulación de residuos acumulados, la intervención operativa se realizará bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El personal estará equipado con Elementos de Protección Personal (EPP) completos, incluyendo botas de seguridad, guantes tipo ingeniero, gafas protectoras y tapabocas N95. Adicionalmente, se contará permanentemente con un botiquín de primeros auxilios en el sitio de acopio para atender cualquier eventualidad o laceración menor durante las jornadas.

- Articulación con el Esquema de Recolección: El material recuperado y embolsado durante estas jornadas operativas será enrutado de manera coordinada con los vehículos compactadores o volquetas, garantizando su traslado inmediato al sitio de disposición final autorizado, evitando que el punto recuperado vuelva a ser impactado.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En el periodo comprendido entre el 02 al 28 de febrero de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas a continuación:

ACTUALIZACIÓN DE RUTAS EN ZONA DE DIFICIL ACCESO

En cumplimento de reducir los impactos ambientales y sanitarios asociados a prácticas inadecuadas de manejo y disposición de residuos, contribuyendo a la protección del entorno natural y la calidad de vida de la población, en ese sentido, se actualizo y detallo un cronograma de recolección de residuos sólidos para la zona Urbana y Rural de municipio de Uribia, donde en concordancia con los diferentes lideres de barrios y asentamientos en donde la recolección esa deficiente o nula.

Tabla Cronograma de Recolección de Residuos Sólidos en Zonas de Difícil Acceso


ZONA	SECTOR	LOCALIDAD, COMUNAS O SIMILARES	FRECUENCIA	HORA INICIAL	HORA FINAL
URBANA	NORTE	Patio Bonito (Calles Sin pavimentar), Zona Industrial.	Lunes y Jueves	7:00 a.m.	10:00 a.m.
		San José, Fonseca Siosi, Esfuerzo Wayuu (Calles Sin Pavimentar).	Martes y Viernes	07:00 p.m.	10:00 a.m.
		Etnia Wayuu, Simón Bolívar (Calles Sin Pavimentar), Villa Fausta.	Miércoles y Sábado	07:00 p.m.	10:00 a.m.
	SUR	Abuchaibe (Calles Sin Pavimentar), Zona Industrial.	Lunes y Jueves	02:00 p.m.	05:00 p.m.
		Mercedes, Enrique Ipuana (Calles Sin Pavimentar)	Martes y Viernes	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		Aipiamana (Calles Sin Pavimentar).	Miércoles y Sábado	07:00 a.m.	10:00 a.m.
ASENTAIMENTO	GENERAL	Bendición de Dios, 3 de Abril	Lunes	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		Villa del Rosario, Villa Ramon	Martes	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		La Donación	Miércoles	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		La Esperanza, Aeropuerto 2	Jueves	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		Aeropuerto 1	Viernes	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		Transformación	Sábado	07:00 a.m.	10:00 a.m.
RURAL	GENERAL	Cabo de la Vela	Lunes – Miércoles - Viernes	07:00 a.m.	03:00 p.m.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Tabla Cargas de Recolección

VEHICULO	PERIODO	CARGA TON / MES	RENDIMIEN TON / VIAJE	N° VIAJES
VOLQUETAS	FEBRERO	246,69	4,11	60

Gráfico Histórico de Toneladas Totales Transportada Año 2026

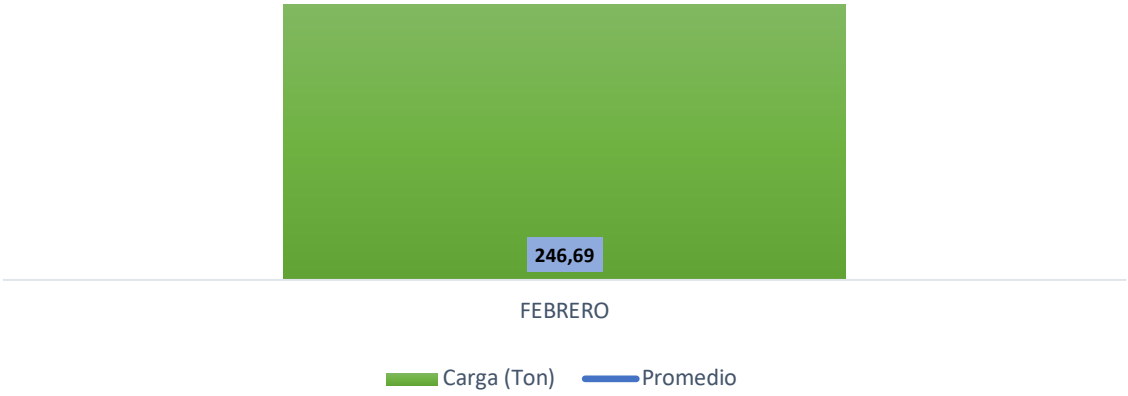

La gráfica describe el comportamiento histórico de las toneladas transportadas con volquetas durante proyecto en el año 2026; reportando un promedio de **(246,69Ton/mes).** **Ver Anexo para observar recolección con vehículos.**


Imagen Cronograma de Recolección de Residuos Solidos en Zonas de Difícil Acceso



ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS

El decreto 1077 de 2015, define los puntos críticos como aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros. Dentro de este contexto, la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE URIBIA S.A.S. E.S.P. realiza un censo de Puntos Críticos, con el fin de coordinar acciones orientadas a intervenirlos en aras de eliminarlos y propender por su conservación.

Imagen Puntos Críticos – Acumulación de Residuos Solidos

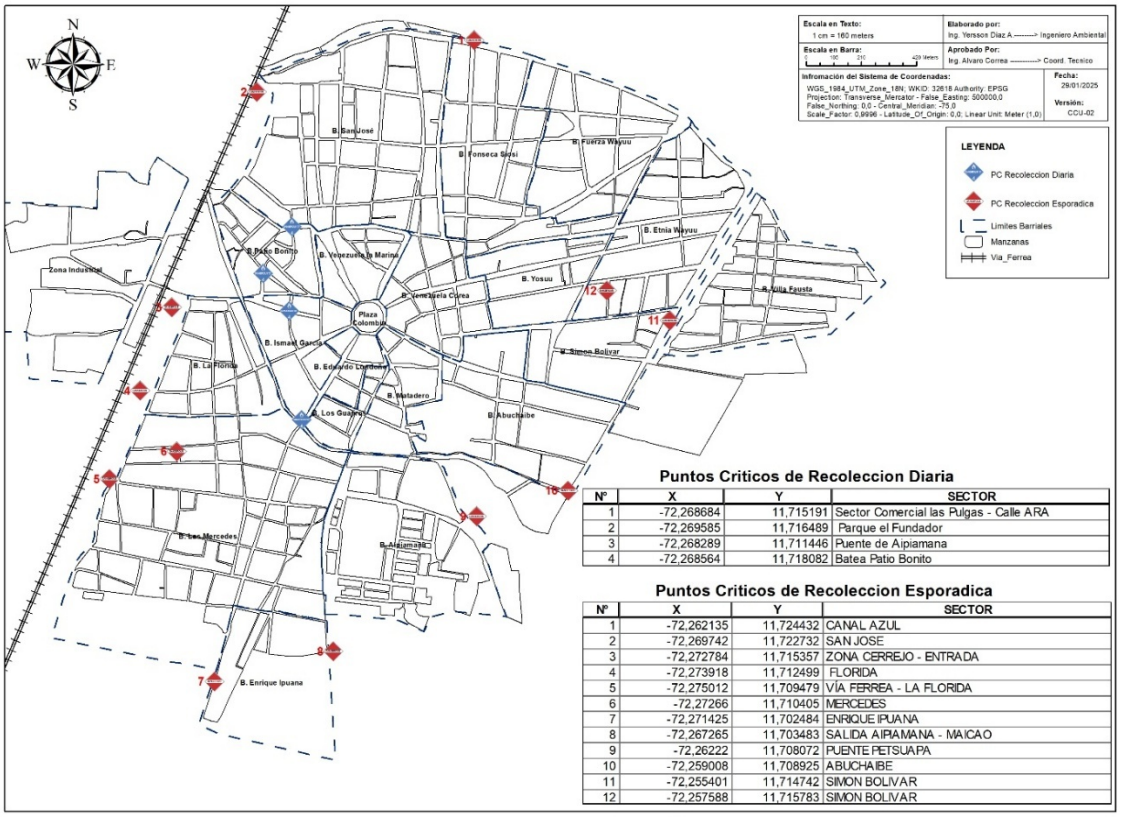

Puntos Criticos de Recoleccion Diaria

Nº	X	Y	SECTOR
1	-72,268684	11,715191	Sector Comercial las Pulgas - Calle ARA
2	-72,269585	11,716489	Parque el Fundador
3	-72,268289	11,711446	Puente de Aipiamana
4	-72,268564	11,718082	Batea Patio Bonito

Puntos Criticos de Recoleccion Esporadica

Nº	X	Y	SECTOR
1	-72,262135	11,724432	CANAL AZUL
2	-72,269742	11,722732	SAN JOSE
3	-72,272784	11,715357	ZONA CERREJO - ENTRADA
4	-72,273918	11,712499	FLORIDA
5	-72,275012	11,709479	VÍA FERREA - LA FLORIDA
6	-72,27266	11,710405	MERCEDES
7	-72,271425	11,702484	ENRIQUE IPUANA
8	-72,267265	11,703483	SALIDA AIPIAMANA - MAICAO
9	-72,26222	11,708072	PUENTE PETSUAPA
10	-72,259008	11,708925	ABUCHAIBE
11	-72,255401	11,714742	SIMON BOLIVAR
12	-72,257588	11,715783	SIMON BOLIVAR

En e grafico anterior se puede observar que los puntos críticos de color azul (4 puntos) están ubicados en la zona céntrica y comercial del municipio y a su vez la alcaldía con apoyo de la Empresa AAA en estos puntos se instalaron Caja Estacionarios para la adecuada presentación de residuos sólidos, donde anteriormente estos puntos la acumulación de residuos al aire libre impactaba negativa el paisaje visual. Los puntos rojos (12 puntos) están en zonas periféricas y áreas mas desoladas o con menos población.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

Para este primer periodo se realizaron barrido y despapeleo en las siguientes áreas/zonas: Entrada de Uribia, Avenida Hospital y Calles, Venezuela la Marina, San José Punto Crítico Arroyo, Parque Fundador, Parque Los Guajiros. **Ver Anexo de barrido y limpieza**

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AL PERSONAL RECOLECTOR DE LA EMPRESA TRIPLE A

La entrega de elementos de protección personal (EPP) y dotación se llevó a cabo con el propósito de garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de equipo de barrido y limpieza contratada para el proyecto. Esta actividad se realizó con el fin de brindar a los trabajadores las herramientas necesarias para prevenir accidentes laborales, protegerse de los riesgos propios de la labor, como cortes, pinchazos, exposición a residuos peligrosos o condiciones climáticas adversas y promover una cultura de autocuidado y prevención. Asimismo, esta entrega permitió dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortaleciendo el compromiso de la empresa con la protección y el bienestar de su personal operativo, y mejorando las condiciones en las que desarrollan sus actividades diarias.



Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

MESA DE TRABAJO SECRETARIAS DE LA ALCALDÍA Y ENTIDADES PUBLICAS

Se realizo socialización del Proyecto APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, MEDIANTE ACCIONES OPERATIVAS, EDUCATIVAS Y DE FORTALECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES, y al mismo tiempo una mesa de trabajo para crear y articular estrategias para la reducción y eliminación de la inadecuada disposición de residuos sólidos en espacios y áreas públicos del municipio de Uribia, a cual se contó con la participación de la Secretaria de Obras, SEDEPROMA, Secretaria de Salud, Inspección de Policía, Secretaria de Tránsito y Transporte, en el cual se concluyó en las siguientes dos actividades:

1. Primera Jornada de Limpieza en la entrada del municipio de Uribia.
2. La creación de Vigías Ambientales para el seguimiento de infractores que disponen inadecuadamente los residuos en sitios no autorizados

La empresa AAA junto con al apoyo de las secretarias y la Policía, participaran en la gran jornada de limpieza y se coordinaran actividades programas con Vigías Ambientales para implementar los seguimientos.





7. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y AVANCE

La ejecución del Proyecto No. 130 de 2026 está proyectada para un periodo ininterrumpido de seis (6) meses y veinte (20) días. El plan de trabajo se ha estructurado en tres fases principales: Alistamiento, Ejecución Continua y Cierre, garantizando que el despliegue del personal, la operación vehicular y las actividades de sensibilización se realicen de manera secuencial y articulada.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

7.1. FASES DE EJECUCIÓN

Fase 1: Alistamiento y Logística Inicial (Semanas 1 a 3 del Mes 1) Esta fase contempla la estructuración administrativa, la vinculación del talento humano y la adquisición de todos los insumos necesarios para el despliegue en campo.

- Vinculación del equipo base: Coordinador del proyecto, Profesional de apoyo técnico-ambiental, supervisores de volquetas y limpieza, auxiliares de apoyo EIC y los 13 auxiliares de limpieza y despapeleo.
- Contratación y alistamiento de la flota vehicular: Cuatro (4) volquetas tipo 750 para la zona urbana, una (1) volqueta tipo 750 para la zona rural (Cabo de la Vela) y una (1) camioneta de apoyo.
- Adquisición de la dotación y herramientas: Compra de 20 kits de logística (chalecos, gorras, carnets PVC) para el equipo, y el banco de herramientas y elementos de seguridad (palas, rastrillos, guantes, botiquín).
- Producción de material publicitario y didáctico: Impresión del pendón (2x1.00 m), 600 folletos trípticos, 1000 tarjetas imantadas y 600 bolsas de compra reutilizables.
- Dotación para recicladores: Compra del kit logístico y de seguridad (gafas, guantes, tapabocas N95, chalecos y gorras) para el personal de recuperación.

Fase 2: Ejecución Operativa y Educativa Continua (Mes 1 al Mes 6) Fase central del proyecto donde se materializan las intervenciones simultáneas en terreno.

- **Operación de Limpieza:** Despliegue continuo (durante los 6 meses y 20 días) del personal operativo y la flota vehicular para la recolección, transporte y disposición final en el relleno sanitario de Maicao, utilizando el stock de 1000 bolsas de basura de alta resistencia para el control de puntos críticos.
- **Jornadas de Sensibilización Comunitaria:** Realización de los doce (10) talleres programados con usuarios residenciales, comerciales e institucionales, haciendo uso del servicio de alquiler de sillas plásticas, video beam y computador, acompañados de la entrega de refrigerios e hidratación.
- **Capacitaciones a Instituciones Educativas:** Ejecución de dos (2) capacitaciones mensuales en tres (3) instituciones educativas focalizadas, distribuyendo de manera proporcional los 36 paquetes de refrigerio e hidratación destinados para este fin a lo largo de los 6 meses.

- **Acompañamiento a Recicladores:** Jornadas de seguimiento y apoyo al aprovechamiento de residuos, incluyendo la entrega de hidratación y refrigerios.

Fase 3: Cierre, Consolidación y Reporte (Últimos 20 días) Etapa de finalización de actividades en terreno, consolidación de la información y entrega de resultados a la administración municipal.

- Clausura del componente educativo: Impresión y entrega de 60 certificados de participación en propalcote a los estudiantes y actores clave.
- Desmovilización operativa: Finalización de los contratos de alquiler vehicular y recolección final de herramientas.
- Consolidación de soportes: Organización de registros de asistencia, actas de entrega, registro fotográfico y consolidación de indicadores.
- Presentación del Informe Final de Ejecución.

7.2. TABLA RESUMEN DEL CRONOGRAMA

Actividad / Componente	M1	M2	M3	M4	M5	M6	20 Días
1. Contratación y Alistamiento							
Vinculación de personal y vehículos	X						
Compra de kits, herramientas y bolsas	X						
Impresión de material publicitario y POP	X						
2. Operación y Recuperación (Continuo)							
Rutas de volquetas (Urbana/Rural/Camioneta)	X	X	X	X	X	X	X
Intervención de auxiliares de limpieza	X	X	X	X	X	X	X
3. Sensibilización y Educación							
10 Talleres Comunitarios (Alquiler de equipos)		X	X	X	X	X	
Capacitaciones a Colegios (2/mes)		X	X	X	X	X	
Entrega de material didáctico y bolsas		X	X	X	X	X	
4. Cierre y Evaluación							
Entrega de Certificados Educativos						X	X
Consolidación de informes y liquidación							X

7.3. AVANCE DEL CRONOGRAMA Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO

El seguimiento a la ejecución del Proyecto No. 130 de 2026 se evalúa midiendo el progreso real de las actividades frente a las metas totales establecidas para los seis (6) meses y veinte (20) días de duración del contrato.

A la fecha de corte del presente informe, el **Avance del Tiempo** corresponde al **15%** (equivalente a 1 mes de ejecución). De manera paralela, el **Avance Físico** detallado por cada componente operativo y educativo se describe en la siguiente matriz de cumplimiento:

Matriz de Cumplimiento y Avance Físico

Actividad / Componente Contractual	Meta Total (Contratada)	Ejecutado en el Periodo	Acumulado Total	% de Avance
1. Contratación y Alistamiento Logístico				
Kits de Logística (Chalecos, gorras, carnets)	20 Kits	20	20	100%
Impresión de Pendón (2x1.0m)	1 Unidad	1	1	100%
Compra de Herramientas y EPP (Puntos críticos)	1 Banco Global	1	1	100%
Kit Logístico y de Seguridad para Recicladores	1 Unidad	0	0	0%
2. Operación Continua (Recolección y Limpieza)				
Volquetas Zona Urbana (Camión 750)	4 Unidades x 6.6 Meses	4 operando	Mes a Mes	15%
Volqueta Zona Rural (Cabo de la Vela)	1 Unidad x 6.6 Meses	1 operando	Mes a Mes	15%
Bolsas de basura para limpiezas y despapeleo	1000 Unidades	200	200	20%
3. Sensibilización y Educación (Talleres)				

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Charlas a Usuarios Residenciales/Comerciales	10 Talleres	0	0	0%
Capacitaciones a Instituciones Educativas	36 Capacitaciones	0	0	0%
Entrega de Folletos Trípticos (Propalcote)	600 Unidades	0	0	0%
Entrega de Bolsas de compra reutilizables	600 Unidades	0	0	0%
4. Cierre y Certificación				
Entrega de Certificados a Estudiantes	60 Unidades	0	0	0%

Análisis del Avance Acumulado

Como se evidencia en la matriz, durante esta fase inicial el proyecto alcanzó un 75% de cumplimiento en el componente de Contratación y Alistamiento Logístico (Kits, herramientas, contratación de personal). Respecto al componente operativo y educativo, el avance físico se encuentra alineado con la curva de ejecución esperada para el mes reportado, cumpliendo un 100% de las operaciones del periodo, garantizando el despliegue sin contratiempos de los vehículos en Uribia y Cabo de la Vela, así como el inicio de los ciclos de talleres en las comunidades. Para el componente de sensibilización y comulación se empezará a implementar en el próximo periodo como establece el cronograma de actividades. En general el proyecto lleva un 29% de cumplimiento físico en el desarrollo del proyecto.

8. MATRIZ DE INDICADORES (KPIS) Y METAS ALCANZADAS

Para evaluar la efectividad y el nivel de cumplimiento del Proyecto No. 130 de 2026, se ha diseñado un tablero de indicadores de gestión y de impacto. Esta matriz permite cuantificar el avance físico del proyecto en sus tres componentes principales: Educación y Sensibilización, Operación en Terreno, y Fortalecimiento al Aprovechamiento.

A continuación, se presenta la matriz de seguimiento con las metas establecidas para el periodo de ejecución de seis (6) meses y veinte (20) días:

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

8.1. TABLA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Componente de Intervención	Nombre del Indicador	Fórmula de Medición / Meta Esperada	Medio de Verificación (Soporte)
1. Sensibilización Comunitaria	Cobertura de Talleres a Usuarios	(Talleres realizados / 10 Talleres programados) * 100 = 100%	Listados de asistencia, registro fotográfico y actas de uso de alquiler de equipos (Video beam/sillas).
	Distribución de Material Didáctico	(Material entregado / 2200 unidades totales*) * 100 = 100%	Planillas de entrega firmadas por la comunidad (Folletos, imanes, bolsas reutilizables).
2. Educación Institucional	Capacitación a Instituciones Educativas	(Capacitaciones ejecutadas / 36 Capacitaciones programadas) * 100 = 100%	Actas de visita a los 3 colegios, planillas de asistencia y registro fotográfico.
	Certificación Escolar	(Certificados entregados / 60 Certificados impresos) * 100 = 100%	Actas de clausura y copias o fotos de los 60 certificados entregados a estudiantes.
3. Operación y Mitigación	Despliegue de Flota Vehicular	(Días operados por flota / Días totales del contrato) * 100	Bitácoras de viaje o planillas de recorrido de las 5 volquetas y la camioneta.
	Suministro de Insumos Operativos	(Bolsas utilizadas / 1000 Bolsas presupuestadas) * 100 = 100%	Actas de entrega de insumos al personal de las 13 cuadrillas de limpieza.
4. Fortalecimiento Operativo	Dotación de Personal Propio	(Kits entregados / 20 Kits de logística presupuestados) * 100 = 100%	Actas de entrega de dotación (Chaleco, gorra, carnet) firmadas por el personal.
	Apoyo a Recicladores de Oficio	(Kits entregados a recicladores / 1 Kit integral programado) * 100 = 100%	Acta de entrega del kit de seguridad (gafas, guantes, tapabocas) y registro de jornadas de seguimiento.

9. EJECUCIÓN FINANCIERA / PRESUPUESTO RESUMIDO

Durante el periodo reportado, la ejecución de los recursos se ha ceñido a las especificaciones técnicas y cantidades aprobadas en la propuesta económica. A continuación, se presenta el resumen financiero del proyecto, estructurado por componentes de inversión:

Tabla Resumen Financiero del Proyecto

Componente de Inversión	Descripción General	Valor Proyectado (COP)
1. Coordinación y Servicios Profesionales	Pago de honorarios del coordinador, profesional ambiental, técnicos de supervisión y 15 auxiliares operativos y de limpieza.	$ 359.226.666,66
2. Recolección y Transporte (Flota Vehicular)	Contratación de 5 volquetas (zona urbana y Cabo de la Vela) y 1 camioneta, incluyendo combustible y desplazamiento al relleno sanitario en Maicao.	$ 507.210.326,19
3. Logística, Educación y Suministros	Compra de kits logísticos, material didáctico, herramientas de recuperación, refrigerios y alquiler de equipos para talleres.	$ 26.420.150,00
	Subtotal Costos Directos	**$ 892.857.142,85**
	A.I.	**$ 107.142.857,14**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 1.000.000.000,00**

Nota de ejecución: Hasta la fecha de entrega de este informe, no se ha cobrado ningún anticipo o pago parcial de las actividades.

10. RIESGOS, SST Y ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Este proyecto, por su naturaleza operativa en espacio público y su alcance hacia zonas de difícil acceso como el Cabo de la Vela, requiere un control estricto de las condiciones de terreno y de la seguridad del personal.

10.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Para mitigar los riesgos biomecánicos, biológicos y físicos asociados a la manipulación de residuos y la exposición climática en el municipio de Uribia, el contratista ha implementado los siguientes controles basados en la dotación adquirida:

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

- Protección Climática y Visual: Uso obligatorio de gorras (incluidas en los kits logísticos) y gafas de seguridad para el personal operativo y de educación, mitigando el impacto de la radiación solar y el material particulado (polvo) durante los recorridos en calle y la zona rural.
- Manejo Seguro de Puntos Críticos: La intervención operativa para la limpieza y "despapeleo" se realiza con herramientas especializadas (palas, rastrillos) para evitar el contacto directo con focos de infección. Asimismo, es obligatorio el uso de tapabocas N95 y guantes de carnaza/nitrilo.
- Atención de Emergencias: Se dispone de un botiquín de primeros auxilios en terreno para la atención inmediata de incidentes menores (laceraciones o deshidratación) durante las jornadas operativas.

10.2. MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS

- Riesgo Logístico (Transporte a Maicao): Demoras o fallas mecánicas en el trayecto de las volquetas hacia el relleno sanitario regional en Maicao o en las vías hacia el Cabo de la Vela. *Mitigación:* Mantenimiento preventivo de la flota y supervisión constante por parte de los dos (2) técnicos de apoyo vehicular contratados.
- Riesgo Social (Baja participación): Ausentismo de la comunidad en los talleres ambientales. *Mitigación:* Entrega de refrigerios, uso de material publicitario atractivo (pendón, trípticos) y la vocería de los Vigías Ambientales locales para generar confianza barrial.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

11. ANEXOS Y SOPORTES

Recolección de residuos sólidos mediante vehículos tipo volquetas

Barrido y Limpieza - Simon Bolivar	
	
	
	

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Barrido y Limpieza – Venezuela la Marina









Barrido y Limpieza – Punto Parque Av. Hospital





Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/





Barrido y Limpieza – Calles Hospital









Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Barrido y Limpieza – Calle Hospital al CDI San Jose	
	
	
	

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Barrido y Limpieza – Entrada Municipal









Barrido y Limpieza - San Jose Punto Critico





Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/





Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900’375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Recolección de residuos sólidos mediante vehículos tipo volquetas

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Ismael García

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Parque Fundador

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Punto Av. Hospital – Punto Las Pulgas





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana

BARRIO	Av. Bogotá (Abuchaibe)





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Avenida Ismael García





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de

	la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Patio Bonito





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	La Florida - Alistamiento





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Parque el Fundador





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Abuchaibe

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

<table>
<tr><td colspan="2">


</td></tr>
<tr><td>ASEO:</td><td>Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.</td></tr>
<tr><td>ZONA</td><td>Urbana</td></tr>
<tr><td>BARRIO</td><td>Las Mercedes</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">


</td></tr>
<tr><td>ASEO:</td><td>Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.</td></tr>
<tr><td>ZONA</td><td>Urbana</td></tr>
<tr><td>BARRIO</td><td>Asentamiento la Bendición de Dios</td></tr>
</table>





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Las Mercedes





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	La Esperanza





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Villa Fausta





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Aipiamana

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Asentamiento la Donación

Recolección de residuos sólidos mediante vehículos tipo volquetas – Cabo de la vela

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales

Registro Fotográfico Jornada de Aseo

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/



Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/








Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/








Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900’375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Oficios de Invitaciones y Reuniones

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.

NIT: 900'375.703-3

Uribia, Febrero 19 de 2026.

Señor(es):
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE URIBIA
Municipio de Uribia – La Guajira

Asunto: Invitación y solicitud de apoyo – Jornada de aseo y limpieza

Cordial Saludo

La **Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P.**, en cumplimiento de su compromiso con el bienestar ambiental y la promoción de espacios saludables, se permite extender cordial invitación a esa honorable entidad para participar en la **jornada de aseo y limpieza en la entrada del municipio de Uribia**, programada para el día **viernes 27 de febrero a las 5:30 a.m.**

Esta actividad tiene como propósito fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones del municipio, promover la cultura ciudadana y contribuir al embellecimiento y conservación de nuestro entorno.

De manera especial, solicitamos el valioso apoyo de la E.S.E. con:

- La instalación de un **Punto de Primeros Auxilios**, con carpa institucional.
- Personal básico de atención para cualquier eventualidad durante la jornada.
- Elementos de protección personal que puedan ser suministrados en apoyo a la actividad.

Por nuestra parte, la empresa se encargará de suministrar las herramientas necesarias para el desarrollo de la jornada de limpieza.

Agradecemos de antemano su disposición y compromiso institucional, fundamentales para garantizar el bienestar y la seguridad de los participantes en esta importante actividad comunitaria.

Atentamente,

INDIS MEJIA MENDOZA
Gerente AAA de Uribia SAS ESP

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA
ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.

NIT: 900'375.703-3

Uribia, Febrero 19 de 2026.

Señor(es):
SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE DEPENDENCIA
Alcaldía Municipal de Uribia

Asunto: Invitación a jornada de aseo y limpieza – Articulación institucional

Cordial Saludo

La **Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P.**, en el marco de sus acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura ambiental y el embellecimiento de los espacios públicos, se permite extender cordial invitación a todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Uribia para participar activamente en la **jornada de aseo y limpieza en la entrada del municipio de Uribia**, programada para el día **viernes 27 de febrero a las 5:30 a.m.**

Esta iniciativa tiene como objetivo promover el trabajo articulado entre las diferentes dependencias de la administración municipal, fortalecer el sentido de pertenencia institucional y contribuir al mejoramiento de la imagen y condiciones ambientales de nuestro territorio.

En este sentido, agradecemos contar con:

- La participación de funcionarios de cada dependencia.
- El apoyo logístico o técnico que cada secretaría considere pertinente aportar según su competencia.
- Elementos de protección personal para su respectivo equipo de trabajo.

La empresa se encargará de suministrar las herramientas necesarias para el desarrollo de la jornada.

Estamos convencidos de que el liderazgo institucional y el trabajo conjunto son fundamentales para generar impacto positivo en nuestra comunidad y dar ejemplo de compromiso con el cuidado del entorno.

Agradecemos de antemano su disposición y acompañamiento en esta importante actividad.

Atentamente,

INDIS MEJIA MENDOZA
Gerente AAA de Uribia SAS ESP

Calle 13 No. 18 – 52. Teléfono (5) 717 7907 Uribía – La Guajira. aaadeuribia@hotmail.com

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.

NIT: 900'375.703-3

Uribia, Febrero 11 de 2026.

Señor(es):
SECRETARIO DE GOBIERNO
SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIO DE SALUD
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INSPECTOR DE POLICÍAS
Municipio de Uribia – La Guajira

Asunto: Invitación a mesa de trabajo para el manejo integral de residuos sólidos en el municipio de Uribia.

Cordial Saludo

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P. se permite extenderles una cordial invitación a participar en una mesa de trabajo interinstitucional, con el propósito de analizar la situación actual relacionada con el inadecuado manejo de los residuos sólidos en distintos espacios públicos del municipio y articular esfuerzos entre las diferentes dependencias de la Administración Municipal, a fin de elaborar e implementar estrategias conjuntas que permitan minimizar y, de ser posible, eliminar esta problemática que afecta el entorno, la salud pública y la imagen de nuestro municipio.

El objetivo principal de esta reunión será concertar acciones concretas, definir responsabilidades y establecer un plan de trabajo coordinado que fortalezca la cultura ciudadana, optimice los procesos de recolección y disposición de residuos, y garantice el cumplimiento de la normatividad vigente.

La reunión se llevará a cabo el día miércoles 18 de febrero de 2026 a las 10:00 a.m., en la oficina de Gerencia de la Empresa AAA de Uribia.

Agradecemos de antemano su disposición y compromiso con esta iniciativa, la cual consideramos fundamental para el bienestar de la comunidad Uribiera.

Atentamente,

INDIS MEJIA MENDOZA
Gerente AAA de Uribia SAS ESP

Calle 13 No. 18 – 52. Teléfono (5) 717 7907 Uribia – La Guajira. aaadeuribia@hotmail.com

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA
ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.

NIT: 900'375.703-3

Uribia, Febrero 19 de 2026.

Señor(es):
PERSONERÍA MUNICIPAL DE URIBIA
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE URIBIA
CONCEJO MUNICIPAL DE URIBIA
Municipio de Uribia – La Guajira

Asunto: Invitación a jornada de aseo y limpieza – Apoyo institucional

Cordial Saludo

La **Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P.**, en desarrollo de sus acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura ambiental y el mejoramiento de los espacios públicos, se permite extender cordial invitación a sus respectivas entidades para participar y acompañar la **jornada de aseo y limpieza en la entrada del municipio de Uribia**, programada para el día **viernes 27 de febrero a las 5:30 a.m.**

Esta actividad tiene como propósito promover el trabajo articulado entre las instituciones municipales, fortalecer el sentido de pertenencia y contribuir al embellecimiento y conservación del entorno.

En este sentido, agradecemos contar con:

- El acompañamiento institucional durante la jornada.
- Apoyo con personal disponible para la actividad.
- En el caso del Cuerpo de Bomberos, apoyo preventivo y logístico que consideren pertinente para garantizar la seguridad de los participantes.

La empresa se encargará de suministrar las herramientas necesarias para el desarrollo de la jornada.

Reiteramos nuestro agradecimiento por su permanente compromiso con el bienestar del municipio y esperamos contar con su valiosa participación en esta importante iniciativa comunitaria.

Atentamente,

INDIS MEJIA MENDOZA
Gerente AAA de Uribia SAS ESP

Calle 13 No. 18 – 52. Teléfono (5) 717 7907 Uribia – La Guajira. aaadeuribia@hotmail.com

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.

NIT: 900'375.703-3

Uribia, Febrero 19 de 2026.

Señor(es):
CERREJON
Área de Responsabilidad Social y Ambiental

Asunto: Invitación a jornada de aseo y limpieza – Entrada del municipio de Uribia

Cordial Saludo

La **Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P.**, comprometida con la protección del medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del municipio, se permite extender cordial invitación a su reconocida empresa para participar y apoyar la **jornada de aseo y limpieza en la entrada del municipio de Uribia**, programada para el día **viernes 27 de febrero a las 5:30 a.m.** La actividad se desarrollará en un sector que constituye área de influencia de sus operaciones, especialmente por el tránsito asociado al transporte de carbón en la vía férrea, razón por la cual consideramos fundamental el acompañamiento de su empresa en el marco de su política de responsabilidad social y ambiental.

En este sentido, solicitamos en lo posible y respetuosamente su valioso apoyo con:

- Equipos y maquinaria necesaria para el desarrollo de la jornada (cargadores, volquetas u otros que se consideren pertinentes).
- Aporte para la disposición final de los residuos recolectados en el relleno sanitario.
- Acompañamiento institucional en el marco de sus programas de responsabilidad social empresarial.

Por nuestra parte, la empresa suministrará las herramientas manuales necesarias para la ejecución de la actividad y coordinará la logística general de la jornada con persona humano para otras áreas aleñadas y que por las condiciones es requerido de forma manual.

Estamos convencidos de que el trabajo articulado entre el sector público y privado fortalece el desarrollo sostenible del municipio y contribuye significativamente al bienestar de la comunidad.

Agradecemos de antemano su disposición y compromiso con esta iniciativa ambiental.

Atentamente,

INDIS MEJIA MENDOZA
Gerente AAA de Uribia SAS ESP

Calle 13 No. 18 – 52. Teléfono (5) 717 7907 Uribia – La Guajira. aaadeuribia@hotmail.com

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.

NIT: 900'375.703-3

Uribia, Febrero 21 de 2026.

Señor(es):
Primera Dama del Municipio de Uribia
Despacho
Municipio de Uribia – La Guajira

Asunto: Invitación a la Gran Jornada de Aseo y Limpieza

Cordial Saludo,

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P., en articulación con la Alcaldía Municipal de Uribia, se permite extenderle una cordial invitación para que nos acompañe y participe activamente en la **Gran Jornada de Aseo y Limpieza**, que se llevará a cabo el día viernes 27 de febrero a partir de las 5:30 a.m., teniendo como punto de encuentro la entrada del municipio, sector "Bienvenido Uribia".

Esta jornada tiene como objetivo embellecer y recuperar este importante acceso al municipio, promoviendo el sentido de pertenencia, la cultura ciudadana y el compromiso ambiental de toda la comunidad. Su presencia y acompañamiento institucional fortalecerán el impacto social de esta iniciativa, incentivando la participación activa de los diferentes sectores y reafirmando el compromiso con el bienestar colectivo.

Desde nuestra empresa estaremos suministrando las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad; no obstante, agradecemos el apoyo con personal voluntario y la difusión de esta importante jornada.

Con el liderazgo y compromiso de todos, seguimos trabajando por una Uribia más limpia, organizada y próspera.

Agradecemos de antemano su valiosa disposición y apoyo.

Atentamente,

INDIS MEJIA MENDOZA
Gerente AAA de Uribia SAS ESP

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.

NIT: 900'375.703-3

Uribia, Febrero 21 de 2026.

Señor(es):
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTACIÓN DE POLICÍA URIBIA
Municipio de Uribia – La Guajira

Asunto: Invitación y solicitud de acompañamiento – Jornada de aseo y limpieza

Cordial Saludo

La **Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P.**, en el marco de sus acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura ambiental y el mejoramiento de los espacios públicos, se permite extender cordial invitación a esa institución para participar y brindar acompañamiento en la **jornada de aseo y limpieza en la entrada del municipio**, programada para el día **viernes 27 de febrero a las 5:30 a.m.**

Esta actividad contará con la participación de diferentes entidades públicas, privadas, instituciones educativas y comunidad en general, por lo cual consideramos fundamental el acompañamiento de la Policía Nacional, con el fin de garantizar el orden, la seguridad y la movilidad durante el desarrollo de la jornada.

En este sentido, solicitamos respetuosamente:

- Presencia y acompañamiento preventivo durante la actividad.
- Apoyo en la regulación del tránsito si se requiere.
- Coordinación institucional ante cualquier eventualidad.

La empresa se encargará de suministrar las herramientas necesarias para la ejecución de la jornada.

Agradecemos de antemano su disposición y compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad.

Atentamente,

INDIS MEJIA MENDOZA
Gerente AAA de Uribia SAS ESP

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBÍA S.A.S. E.S.P.

NIT: 900'375.703-3

Uribia, Febrero 23 de 2026.

Señor(es):
Medios de Comunicación y Prensa
Municipio de Uribia – La Guajira

Asunto: Invitación a cubrir y apoyar la Gran Jornada de Aseo y Limpieza

Cordial Saludo,

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P., en articulación con la Alcaldía Municipal de Uribia, se permite extenderles una cordial invitación para que nos acompañen y brinden su valioso apoyo comunicativo en la **Gran Jornada de Aseo y Limpieza**, que se llevará a cabo el día viernes 27 de febrero a partir de las 5:30 a.m., teniendo como punto de encuentro la entrada del municipio, sector "Bienvenido Uribia".

Esta jornada tiene como objetivo recuperar y embellecer este importante acceso al municipio, promoviendo la cultura ciudadana, el sentido de pertenencia y la responsabilidad ambiental en nuestra comunidad.

Reconocemos el importante papel que desempeñan los medios de comunicación en la construcción de conciencia colectiva y en la difusión de iniciativas que fortalecen el desarrollo local. Por ello, solicitamos respetuosamente su acompañamiento en la cobertura de la actividad, así como el apoyo en la divulgación previa del evento, motivando la participación de entidades públicas, privadas y ciudadanía en general.

Su presencia contribuirá significativamente a visibilizar el compromiso institucional y comunitario por una Uribia más limpia y organizada.

Agradecemos de antemano su disposición y compromiso con el progreso de nuestro municipio, para más información puede comunicarse al 3012193137.

Atentamente,

INDIS MEJIA MENDOZA
Gerente AAA de Uribia SAS ESP

Calle 13 No. 18 – 52. Teléfono (5) 717 7907 Uribia – La Guajira. aaadeuribia@hotmail.com

Registro de Disposición de Residuos Solidos en el Relleno Sanitario Regional del Norte

N_TIQ	FEC_ENT	PESO_ENT	PESO_SAL	PESO_NETO	PLACA
TIQ-050815	3/02/2026 12:40	9000	5880	3120	75L VAW
TIQ-050833	4/02/2026 13:22	9870	6020	3850	A95BC2R
TIQ-050835	4/02/2026 13:48	9490	5880	3610	75L VAW
TIQ-050859	5/02/2026 12:40	9520	5880	3640	75L VAW
TIQ-050860	5/02/2026 14:00	9750	6020	3730	A95BC2R
TIQ-050874	6/02/2026 5:20	9970	6880	3090	A03AR7T
TIQ-050880	6/02/2026 11:24	9840	6880	2960	A03AR7T
TIQ-050882	6/02/2026 12:16	9810	6020	3790	A95BC2R
TIQ-050883	6/02/2026 12:37	9530	5880	3650	75L VAW
TIQ-050890	6/02/2026 18:32	9440	6020	3420	A95BC2R
TIQ-050902	7/02/2026 11:22	9790	5880	3910	A03AR7T
TIQ-050904	7/02/2026 12:00	9620	6020	3600	A95BC2R
TIQ-050927	11/02/2026 22:00	10140	5880	4260	75L VAW
TIQ-050930	13/02/2026 9:40	10530	5980	4550	962VAC
TIQ-050936	13/02/2026 16:30	10810	5940	4870	75L VAW
TIQ-050942	13/02/2026 16:30	10810	5980	4830	75L VAW
TIQ-050956	14/02/2026 5:39	9440	5890	3550	A03AR7T
TIQ-050957	14/02/2026 9:28	10310	6020	4290	A95AL7H
TIQ-050970	14/02/2026 16:57	10510	5980	4530	75L VAW
TIQ-050971	14/02/2026 8:58	10210	5980	4230	75L VAW
TIQ-050982	15/02/2026 5:30	9440	5880	3560	A03AR7T
TIQ-051008	16/02/2026 11:34	9940	6020	3920	A95BC2R
TIQ-051012	16/02/2026 12:58	9520	5880	3640	A03AR7T
TIQ-051013	16/02/2026 13:14	9090	5980	3110	75L VAW

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

TIQ-051023	16/02/2026 19:31	9950	6020	3930	A95BC2R
TIQ-051043	17/02/2026 12:04	9650	6020	3630	A95BC2R
TIQ-051044	17/02/2026 12:08	9560	5880	3680	A03AR7T
TIQ-051051	17/02/2026 13:49	9490	5880	3610	75L VAW
TIQ-051057	18/02/2026 13:02	9890	6020	3870	A95BC2R
TIQ-051058	18/02/2026 13:07	9740	5880	3860	A03AR7T
TIQ-051059	18/02/2026 13:28	9260	5880	3380	75L VAW
TIQ-051091	19/02/2026 6:05	9770	6020	3750	A95BC2R
TIQ-051100	19/02/2026 11:53	9320	5880	3440	A03AR7T
TIQ-051101	19/02/2026 12:22	9430	5880	3550	75L VAW
TIQ-051103	19/02/2026 13:33	9830	6020	3810	A95BC2R
TIQ-051124	20/02/2026 12:27	9840	6020	3820	A95BC2R
TIQ-051125	20/02/2026 12:52	9320	5980	3340	75L VAW
TIQ-051143	21/02/2026 7:32	9760	6020	3740	A95BC2R
TIQ-051151	21/02/2026 13:55	9580	5980	3600	75L VAW
TIQ-051155	21/02/2026 14:50	9840	6020	3820	A95BC2R
TIQ-051168	23/02/2026 5:30	12550	6880	5670	A03AR7T
TIQ-051177	23/02/2026 11:23	10510	6020	4490	A95BC2R
TIQ-051182	23/02/2026 13:00	12330	6890	5440	75L VAW
TIQ-051197	24/02/2026 5:30	11880	6880	5000	A03AR7T
TIQ-051199	24/02/2026 7:13	9970	6020	3950	A95BC2R
TIQ-051210	24/02/2026 13:03	11640	6020	5620	75L VAW
TIQ-051211	24/02/2026 13:57	10120	6020	4100	A95BC2R
TIQ-051225	25/02/2026 5:39	12580	6880	5700	A03AR7T
TIQ-051233	25/02/2026 12:40	12320	6880	5440	75L VAW
TIQ-051234	25/02/2026 12:50	11650	6020	5630	A95BC2R
TIQ-051250	26/02/2026 5:20	11680	6880	4800	A03AR7T

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

TIQ-051251	26/02/2026 7:30	11530	7350	4180	TZK233
TIQ-051262	26/02/2026 13:00	10550	6020	4530	A95BC2R
TIQ-051263	26/02/2026 15:00	11210	5880	5330	75L VAW
TIQ-051275	27/02/2026 5:30	12550	6880	5670	A03AR7T
TIQ-051278	27/02/2026 9:05	10550	6880	3670	75L VAW
TIQ-051304	28/02/2026 5:14	12630	6880	5750	A03AR7T
TIQ-051312	28/02/2026 12:15	10850	6880	3970	A03AR7T
TIQ-051315	28/02/2026 13:07	10580	6880	3700	75L VAW
TIQ-051339	25/02/2026 5:39	9390	5880	3510	A03AR7T

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/
