CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-021-2025 - "REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER".

VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA $ 781.787.894

ID	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	Inicio	Fin	N°Dias
0,00	Firma Contrato Consultor	Consultor - Supervision	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**27/11/2025**	27/11/2025	0
0,00	Firma Contrato Interventor	Consultor - Supervision	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**20/11/2025**	20/11/2025	0
0,00	Documentacion	Consultor - Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21/11/2025	29/11/2025	8
0,00	Acta de Inicio	Consultor - Supervision - Interventoria	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9/12/2025	**9/12/2025**	0
Admon	**ACCIONES PREVIAS**								**11/12/2025**	**18/01/2026**	
Admon	Solicitud de Documentacion Contractual a Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Documentacion Contractual	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Documentacion Contractual (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	14/12/2025	3
Admon	Revision de Certificacion de Equipos a Utilizar (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/12/2025	19/12/2025	4
Admon	Solicitud de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	6/01/2026	25
Admon	Revision de Arte y especificaciones Pendon (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6/01/2026	10/01/2026	4
Admon	Instalacion Pendon	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13/01/2026	18/01/2026	5
Admon	Solicitud de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Indumentarias (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud de Entrega de la politica de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de la politica de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Politica Ambiental (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud Certificacion Min interior	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26/12/2025	10/01/2026	15
Admon	Solicitud informacion a entidades oficiales	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/01/2026	15/01/2026	5
1.1	**FASE PREPARATORIA**		**10,62%**	**10,62%**	**4,38%**	**$ 83.020.061**	**$ 83.020.061**	**$ 34.245.776**	**8/01/2026**	**24/02/2026**	
1.1.01	Entrega de documento de análisis y caracterización de actores sociales. (Identificación y caracterización de actores estratégicos para la declaratoria del área protegida)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	8/01/2026	15/01/2026	7
1.1.02	Entrega de evidencias de convocatoria y actas de socialización con actores estratégicos. (Panorama de las categorías de manejo y los beneficios)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	8/01/2026	15/01/2026	7
1.1.03	Espacios de acercamiento con las administraciones municipales y espacios de participación con actores para la construcción de la fase de Preparación (2 Espacios)	Consultor	1,33%	1,33%	1,06%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 8.302.006	30/01/2026	1/02/2026	2
1.1.04	Realizar levantamiento de información primaria para la elaboración de capitulo socioeconómico teniendo en cuenta información sobre tenencia de la tierra	Consultor	1,33%	1,33%		$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ -	2/02/2026	4/02/2026	2
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 1	**Consultor**								**23/01/2026**	
1.1.05	Entrega de resultado Fase de Preparación	Consultor	1,33%	1,33%		$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ -	7/02/2026	8/02/2026	1
1.1.06	Concepto la revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	CAS - WWF							8/02/2026	16/02/2026	8
1.1.07	Revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	Interventoria							17/02/2026	20/02/2026	3
1.1.08	Entrega de documento Resultado Fase de Preparación, teniendo en cuenta la revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	Consultor	1,33%	1,33%	0,66%	$ 10.377.507	$ 10.377.507	$ 5.188.754	21/02/2026	22/02/2026	1
1.1.09	Entrega de documento Análisis percepción sobre la declaratoria con informe de cartografía social.	Consultor	1,33%	1,33%		$ 10.377.507	$ 10.377.507	$ -	21/02/2026	22/02/2026	1
1.1.10	Entrega de documento con la Caracterización socioeconómica y cultural de la población y actores clave. Análisis y caracterización de actores sociales. (Aspectos demográficos y socioeconómicos, actividades, sistemas de producción empleados, volúmenes de producción y flujos de mercado en los municipios que integran el área a declarar)	Consultor	1,33%	1,33%		$ 10.377.507	$ 10.377.507	$ -	23/02/2026	24/02/2026	1
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 2	**Consultor**								**23/02/2026**	
	Entrega Informe Consolidado - Fase Preparatoria por parte del Consultor	**Consultor**							25/02/2026	28/02/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							1/03/2026	6/03/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							7/03/2026	12/03/2026	5
1.2	**FASE APRESTAMIENTO**		**76,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 594.173.934**	**$ -**	**$ -**	**12/03/2026**	**1/04/2026**	
1.2.1	Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB.	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	12/03/2026	13/03/2026	1
1.2.2	Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	12/03/2026	13/03/2026	1
1.2.3	Entrega de documento con el análisis de integridad ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.)	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	14/03/2026	15/03/2026	1
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 3	**Consultor**								**23/03/2026**	
1.2.4	Entrega de documento final que integre los productos geográficos con sus correspondientes anexos cartográficos.	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	16/03/2026	17/03/2026	1
1.2.5	Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas, teniendo en cuenta la información entregada por la CAS y la información actualizada y complementada en este proyecto. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital).	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	18/03/2026	19/03/2026	1
1.2.6	Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas. Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital). para ser radicado ante el instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.	CAS							20/03/2026	25/03/2026	5
1.2.7	Espacio de participación con actores (grupos focales) para la construcción de la fase de aprestamiento (11 Espacios)	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	26/03/2026	1/04/2026	6
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 4	**Consultor**								**23/04/2026**	
	Entrega Informe Consolidado - Fase Aprestamiento por parte del Consultor	**Consultor**							2/04/2026	5/04/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							6/04/2026	11/04/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							12/04/2026	17/04/2026	5
1.3	**FASE II DE APRESTAMIENTO DE LA RUTA DE**		**6,69%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 52.296.949**	**$ -**	**$ -**	**17/04/2026**	**22/04/2026**	
1.3.1	Entrega de documento Resultado Fase aprestamiento Ruta de Declaratoria con anexos y soportes.	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.474	$ -	$ -	17/04/2026	18/04/2026	1
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 5	**Consultor**								**23/05/2026**	
1.3.2	Mesas de concertación - Proceso de Declaratoria (11 Espacios)	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	19/04/2026	22/04/2026	3
	Entrega Informe Consolidado - Fase II de aprestamiento de la Ruta de Declaratoria por parte del Consultor	**Consultor**							23/04/2026	26/04/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							27/04/2026	2/05/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							3/05/2026	8/05/2026	5
1.4	**FASE III DE LA RUTA DE DECLARATORIA**		**6,69%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 52.296.950**	**$ -**	**$ -**	**8/05/2026**	**24/05/2026**	
1.4.1	Entrega de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	8/05/2026	9/05/2026	1
1.4.2	Revision de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	Interventoria							10/05/2026	15/05/2026	5
1.4.3	Revision de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	CAS							16/05/2026	21/05/2026	5
1.4.4	Espacios de participación con actores para socialización de los resultados del proceso de Declaratoria (6 Espacios)	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	22/05/2026	24/05/2026	2
	Entrega Informe Consolidado - Fase III de la Ruta de Declaratoria por parte del	**Consultor**							25/05/2026	29/05/2026	4
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							30/05/2026	7/06/2026	8
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							30/05/2026	7/06/2026	8
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 6	**Consultor**								**23/06/2026**	
2	**Acta de Terminacion**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**8/06/2026**	**8/06/2026**	0
3	**Acta de Recibo Final**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**9/06/2026**	**14/06/2026**	5
4	**Acta de Liquidacion / la entidad la firma dentro de los 4 meses despues de la terminacion**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**24/06/2026**	**3/07/2026**	9
			100,00%	10,62%	4,38%	$ 781.787.894	$ 83.020.061	$ 34.245.776			
				FISICO			FINANCIERO				

$ 0

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 1 - 6 DE ENERO DE 2026

INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA DE CORTE	FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE COMUNICADO	TIEMPO EJECUTADO REAL	TIEMPO (Días) A EJECUTAR LA ACTIVIDAD	% PROGRAMADO A FECHA DE CORTE	ATRASO % POR ACTIVIDAD
	10/03/2026						
					% PROGRAMADO PROYECTO	**10,62%**	**-6,24%**
11/12/25	10/03/2026						
12/12/25	10/03/2026						
22/12/25	10/03/2026						
11/12/25	10/03/2026						
11/12/25	10/03/2026						
15/12/25	10/03/2026						
11/12/25	10/03/2026						
12/12/25	10/03/2026						
06/01/26	10/03/2026						
13/01/26	10/03/2026						
11/12/25	10/03/2026						
12/12/25	10/03/2026						
22/12/25	10/03/2026						
11/12/25	10/03/2026						
12/12/25	10/03/2026						
22/12/25	10/03/2026						
26/12/25	10/03/2026						
10/01/26	10/03/2026						
					% FASE PREPARATORIA	**10,62%**	**-6,24%**
08/01/26	10/03/2026	30/01/2026	CIF-DAP-20-25	22,00	- 15,00	1,33%	0,00%
08/01/26	10/03/2026	30/01/2026	CIF-DAP-20-25	22,00	- 15,00	1,33%	0,00%
30/01/26	10/03/2026			2,00	-	1,33%	-0,27%
02/02/26	10/03/2026			2,00	-	1,33%	-1,33%
07/02/26	10/03/2026			1,00	-	1,33%	-1,33%
21/02/26	10/03/2026			1,00	-	1,33%	-0,66%
21/02/26	10/03/2026			1,00	-	1,33%	-1,33%
23/02/26	10/03/2026			1,00	-	1,33%	-1,33%
					% FASE APRESTAMIENTO	**0,00%**	**0,00%**
12/03/26	10/03/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
12/03/26	10/03/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
14/03/26	10/03/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
16/03/26	10/03/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
18/03/26	10/03/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
20/03/26	10/03/2026			-	5,00	0,00%	0,00%
26/03/26	10/03/2026			-	6,00	0,00%	0,00%
					% FASE II DE APRESTAMIENTO DE LA RUTA DE DECLARATORIA	**0,00%**	**0,00%**
17/04/26	10/03/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
19/04/26	10/03/2026			-	3,00	0,00%	0,00%
					% FASE III DE LA RUTA DE DECLARATORIA	**0,00%**	**0,00%**
08/05/26	10/03/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
10/05/26	10/03/2026			-	5,00	0,00%	0,00%
16/05/26	10/03/2026			-	5,00	0,00%	0,00%
22/05/26	10/03/2026			-	2,00	0,00%	0,00%

Fecha de Seguimiento a Plan de Trabajo	**10/03/2026**
Programado a Fecha de Corte	**10,62%**
Ejecutado a Fecha de Corte	**4,38%**
Diferencia	**-6,24%**

FECHA DE INICIO	9/12/2025
FECHA DE FIN	8/06/2026
DURACION EN MESES	6,00

Notas y/o Comentarios:

1. Ver Anexo 1 - Flujo (Ind. Fisico y Financiero)

ELABORÓ CONSULTOR - CTO N° 01407 DE 2025
NOMBRE: JOSE MARIA SOLANO SALTAREN
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

APROBO INTERVENTOR - CTO N° 01353 DE 2025
NOMBRE: DIANA CAROLINA RAMOS M
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL


NO OBJECION SUPERVISION - CAS
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA BARAJAS BARAJAS
CARGO: SECRETARIA GENERAL

ANEXO 1 - IND. FISICO Y FINANCIERO - CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-021-2025 - "REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER". - CONTRATO N° 01407-2025

BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA	MES 1					MES 2				MES 3					MES 4				MES 5				MES 6				
	09/12/25	16/12/25	23/12/25	30/12/25	06/01/26	13/01/26	20/01/26	27/01/26	03/02/26	10/02/26	17/02/26	24/02/26	03/03/26	10/03/26	17/03/26	24/03/26	31/03/26	07/04/26	14/04/26	21/04/26	28/04/26	05/05/26	12/05/26	19/05/26	26/05/26	02/06/26	08/06/26
$ 781.787.894	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26
% FISICO PROGRAMADO	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,90%**	**2,65%**	**2,65%**	**4,65%**	**6,64%**	**6,64%**	**10,62%**	**10,62%**	**10,62%**	**61,29%**	**73,95%**	**84,51%**	**86,62%**	**86,62%**	**92,20%**	**93,31%**	**93,31%**	**96,66%**	**96,66%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
% FISICO EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,65%	3,32%	3,98%	3,98%	4,38%	4,38%													
FINANCIERO PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.825	$ 20.755	$ 20.755	$ 36.321	$ 51.888	$ 51.888	$ 83.020	$ 83.020	$ 83.020	$ 479.136	$ 578.165	$ 660.689	$ 677.194	$ 677.194	$ 720.775	$ 729.491	$ 729.491	$ 755.639	$ 755.639	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788
FINANCIERO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.755	$ 25.944	$ 31.133	$ 31.133	$ 34.246	$ 34.246	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DIFERENCIA FISICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,90%	-2,65%	-2,65%	-1,99%	-3,32%	-2,65%	-6,64%	-6,24%	-6,24%													
DIFERENCIA FINANCIERA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 14.825	-$ 20.755	-$ 20.755	-$ 15.566	-$ 25.944	-$ 20.755	-$ 51.888	-$ 48.774	-$ 48.774													

Cierre Mes

RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA - IND. FISICO

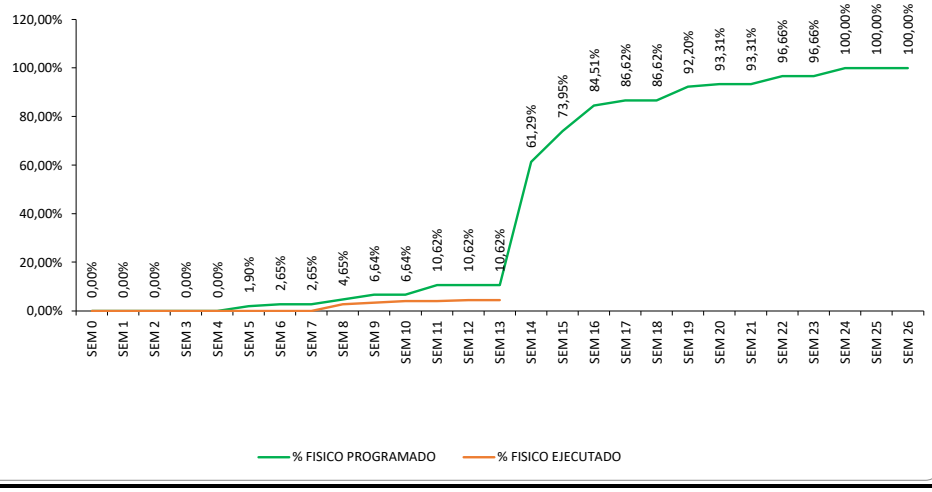

RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA - IND. FINANCIERO

