
Id	Item	Nombre	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**"PP- Construcción e instalación de sistemas sépticos en el corregimiento de San Sebastián. Contrato No 460106239 de 2025**		**120 días**	**lun 24/11/25**	**lun 23/03/26**	**$984.000.000**
2	**0**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**		15 días	lun 24/11/25	lun 8/12/25	$0
3	**1**	**VEREDA 1**		**15 días**	**mar 9/12/25**	**mar 23/12/25**	**$123.000.000**
4	**1.1**	**POZO 1**	2	5 días	mar 9/12/25	sáb 13/12/25	$10.250.000
5	**1.2**	**POZO 2**	2	5 días	mar 9/12/25	sáb 13/12/25	$10.250.000
6	**1.3**	**POZO 3**	2	5 días	mar 9/12/25	sáb 13/12/25	$10.250.000
7	**1.4**	**POZO 4**	2	5 días	mar 9/12/25	sáb 13/12/25	$10.250.000
8	**1.5**	**POZO 5**	6	5 días	dom 14/12/25	jue 18/12/25	$10.250.000
9	**1.6**	**POZO 6**	6	5 días	dom 14/12/25	jue 18/12/25	$10.250.000
10	**1.7**	**POZO 7**	6	5 días	dom 14/12/25	jue 18/12/25	$10.250.000
11	**1.8**	**POZO 8**	6	5 días	dom 14/12/25	jue 18/12/25	$10.250.000
12	**1.9**	**POZO 9**	9	5 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25	$10.250.000
13	**1.10**	**POZO 10**	9	5 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25	$10.250.000
14	**1.11**	**POZO 11**	9	5 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25	$10.250.000
15	**1.12**	**POZO 12**	9	5 días	vie 19/12/25	mar 23/12/25	$10.250.000
16	**2**	**VEREDA 2**		**15 días**	**mié 24/12/25**	**mié 7/01/26**	**$123.000.000**
17	**2.1**	**POZO 1**	15	5 días	mié 24/12/25	dom 28/12/25	$10.250.000
18	**2.2**	**POZO 2**	15	5 días	mié 24/12/25	dom 28/12/25	$10.250.000
19	**2.3**	**POZO 3**	15	5 días	mié 24/12/25	dom 28/12/25	$10.250.000
20	**2.4**	**POZO 4**	15	5 días	mié 24/12/25	dom 28/12/25	$10.250.000
21	**2.5**	**POZO 5**	19	5 días	lun 29/12/25	vie 2/01/26	$10.250.000
22	**2.6**	**POZO 6**	19	5 días	lun 29/12/25	vie 2/01/26	$10.250.000
23	**2.7**	**POZO 7**	19	5 días	lun 29/12/25	vie 2/01/26	$10.250.000
24	**2.8**	**POZO 8**	19	5 días	lun 29/12/25	vie 2/01/26	$10.250.000
25	**2.9**	**POZO 9**	22	5 días	sáb 3/01/26	mié 7/01/26	$10.250.000
26	**2.10**	**POZO 10**	22	5 días	sáb 3/01/26	mié 7/01/26	$10.250.000
27	**2.11**	**POZO 11**	22	5 días	sáb 3/01/26	mié 7/01/26	$10.250.000
28	**2.12**	**POZO 12**	22	5 días	sáb 3/01/26	mié 7/01/26	$10.250.000
29	**3**	**VEREDA 3**		**15 días**	**jue 8/01/26**	**jue 22/01/26**	**$123.000.000**
30	**3.1**	**POZO 1**	28	5 días	jue 8/01/26	lun 12/01/26	$10.250.000
31	**3.2**	**POZO 2**	28	5 días	jue 8/01/26	lun 12/01/26	$10.250.000
32	**3.3**	**POZO 3**	28	5 días	jue 8/01/26	lun 12/01/26	$10.250.000
33	**3.4**	**POZO 4**	28	5 días	jue 8/01/26	lun 12/01/26	$10.250.000
34	**3.5**	**POZO 5**	32	5 días	mar 13/01/26	sáb 17/01/26	$10.250.000
35	**3.6**	**POZO 6**	32	5 días	mar 13/01/26	sáb 17/01/26	$10.250.000
36	**3.7**	**POZO 7**	32	5 días	mar 13/01/26	sáb 17/01/26	$10.250.000
37	**3.8**	**POZO 8**	32	5 días	mar 13/01/26	sáb 17/01/26	$10.250.000
38	**3.9**	**POZO 9**	35	5 días	dom 18/01/26	jue 22/01/26	$10.250.000
39	**3.10**	**POZO 10**	35	5 días	dom 18/01/26	jue 22/01/26	$10.250.000
40	**3.11**	**POZO 11**	35	5 días	dom 18/01/26	jue 22/01/26	$10.250.000
41	**3.12**	**POZO 12**	35	5 días	dom 18/01/26	jue 22/01/26	$10.250.000
42	**4**	**VEREDA 4 POTRERA**		**12 días**	**vie 23/01/26**	**mar 3/02/26**	**$123.000.000**
43	**4.1**	**POZO 1**	41	4 días	vie 23/01/26	lun 26/01/26	$10.250.000
44	**4.2**	**POZO 2**	41	4 días	vie 23/01/26	lun 26/01/26	$10.250.000
45	**4.3**	**POZO 3**	41	4 días	vie 23/01/26	lun 26/01/26	$10.250.000
46	**4.4**	**POZO 4**	41	4 días	vie 23/01/26	lun 26/01/26	$10.250.000
47	**4.5**	**POZO 5**	45	4 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26	$10.250.000
48	**4.6**	**POZO 6**	45	4 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26	$10.250.000
49	**4.7**	**POZO 7**	45	4 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26	$10.250.000
50	**4.8**	**POZO 8**	45	4 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26	$10.250.000
51	**4.9**	**POZO 9**	48	4 días	sáb 31/01/26	mar 3/02/26	$10.250.000
52	**4.10**	**POZO 10**	48	4 días	sáb 31/01/26	mar 3/02/26	$10.250.000
53	**4.11**	**POZO 11**	48	4 días	sáb 31/01/26	mar 3/02/26	$10.250.000
54	**4.12**	**POZO 12**	48	4 días	sáb 31/01/26	mar 3/02/26	$10.250.000
55	**5**	**VEREDA 5 SUCIA**		**12 días**	**mié 4/02/26**	**dom 15/02/26**	**$123.000.000**
56	**5.1**	**POZO 1**	54	4 días	mié 4/02/26	sáb 7/02/26	$10.250.000
57	**5.2**	**POZO 2**	54	4 días	mié 4/02/26	sáb 7/02/26	$10.250.000
58	**5.3**	**POZO 3**	54	4 días	mié 4/02/26	sáb 7/02/26	$10.250.000
59	**5.4**	**POZO 4**	54	4 días	mié 4/02/26	sáb 7/02/26	$10.250.000
60	**5.5**	**POZO 5**	58	4 días	dom 8/02/26	mié 11/02/26	$10.250.000
61	**5.6**	**POZO 6**	58	4 días	dom 8/02/26	mié 11/02/26	$10.250.000
62	**5.7**	**POZO 7**	58	4 días	dom 8/02/26	mié 11/02/26	$10.250.000
63	**5.8**	**POZO 8**	58	4 días	dom 8/02/26	mié 11/02/26	$10.250.000
64	**5.9**	**POZO 9**	61	4 días	jue 12/02/26	dom 15/02/26	$10.250.000
65	**5.10**	**POZO 10**	61	4 días	jue 12/02/26	dom 15/02/26	$10.250.000
66	**5.11**	**POZO 11**	61	4 días	jue 12/02/26	dom 15/02/26	$10.250.000
67	**5.12**	**POZO 12**	61	4 días	jue 12/02/26	dom 15/02/26	$10.250.000
68	**6**	**VEREDA 6**		**12 días**	**lun 16/02/26**	**vie 27/02/26**	**$123.000.000**
69	**6.1**	**POZO 1**	67	4 días	lun 16/02/26	jue 19/02/26	$10.250.000
70	**6.2**	**POZO 2**	67	4 días	lun 16/02/26	jue 19/02/26	$10.250.000
71	**6.3**	**POZO 3**	67	4 días	lun 16/02/26	jue 19/02/26	$10.250.000
72	**6.4**	**POZO 4**	67	4 días	lun 16/02/26	jue 19/02/26	$10.250.000
73	**6.5**	**POZO 5**	71	4 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	$10.250.000
74	**6.6**	**POZO 6**	71	4 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	$10.250.000
75	**6.7**	**POZO 7**	71	4 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	$10.250.000
76	**6.8**	**POZO 8**	71	4 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	$10.250.000
77	**6.9**	**POZO 9**	74	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	$10.250.000
78	**6.10**	**POZO 10**	74	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	$10.250.000
79	**6.11**	**POZO 11**	74	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	$10.250.000
80	**6.12**	**POZO 12**	74	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	$10.250.000
81	**7**	**VEREDA 7**		**12 días**	**sáb 28/02/26**	**mié 11/03/26**	**$123.000.000**
82	**7.1**	**POZO 1**	80	4 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	$10.250.000
83	**7.2**	**POZO 2**	80	4 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	$10.250.000
84	**7.3**	**POZO 3**	80	4 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	$10.250.000
85	**7.4**	**POZO 4**	80	4 días	sáb 28/02/26	mar 3/03/26	$10.250.000
86	**7.5**	**POZO 5**	84	4 días	mié 4/03/26	sáb 7/03/26	$10.250.000
87	**7.6**	**POZO 6**	84	4 días	mié 4/03/26	sáb 7/03/26	$10.250.000
88	**7.7**	**POZO 7**	84	4 días	mié 4/03/26	sáb 7/03/26	$10.250.000
89	**7.8**	**POZO 8**	84	4 días	mié 4/03/26	sáb 7/03/26	$10.250.000
90	**7.9**	**POZO 9**	87	4 días	dom 8/03/26	mié 11/03/26	$10.250.000
91	**7.10**	**POZO 10**	87	4 días	dom 8/03/26	mié 11/03/26	$10.250.000
92	**7.11**	**POZO 11**	87	4 días	dom 8/03/26	mié 11/03/26	$10.250.000
93	**7.12**	**POZO 12**	87	4 días	dom 8/03/26	mié 11/03/26	$10.250.000
94	**8**	**VEREDA 5 SECTOR CENTRAL**		**12 días**	**jue 12/03/26**	**lun 23/03/26**	**$123.000.000**
95	**8.1**	**POZO 1**	93	4 días	jue 12/03/26	dom 15/03/26	$10.250.000
96	**8.2**	**POZO 2**	93	4 días	jue 12/03/26	dom 15/03/26	$10.250.000
97	**8.3**	**POZO 3**	93	4 días	jue 12/03/26	dom 15/03/26	$10.250.000
98	**8.4**	**POZO 4**	93	4 días	jue 12/03/26	dom 15/03/26	$10.250.000
99	**8.5**	**POZO 5**	97	4 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26	$10.250.000
100	**8.6**	**POZO 6**	97	4 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26	$10.250.000
101	**8.7**	**POZO 7**	97	4 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26	$10.250.000
102	**8.8**	**POZO 8**	97	4 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26	$10.250.000
103	**8.9**	**POZO 9**	100	4 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26	$10.250.000
104	**8.10**	**POZO 10**	100	4 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26	$10.250.000
105	**8.11**	**POZO 11**	100	4 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26	$10.250.000
106	**8.12**	**POZO 12**	100	4 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26	$10.250.000
107	**1**	**FIN DE OBRA**	**1**	**0 días**	**lun 23/03/26**	**lun 23/03/26**	**$0**

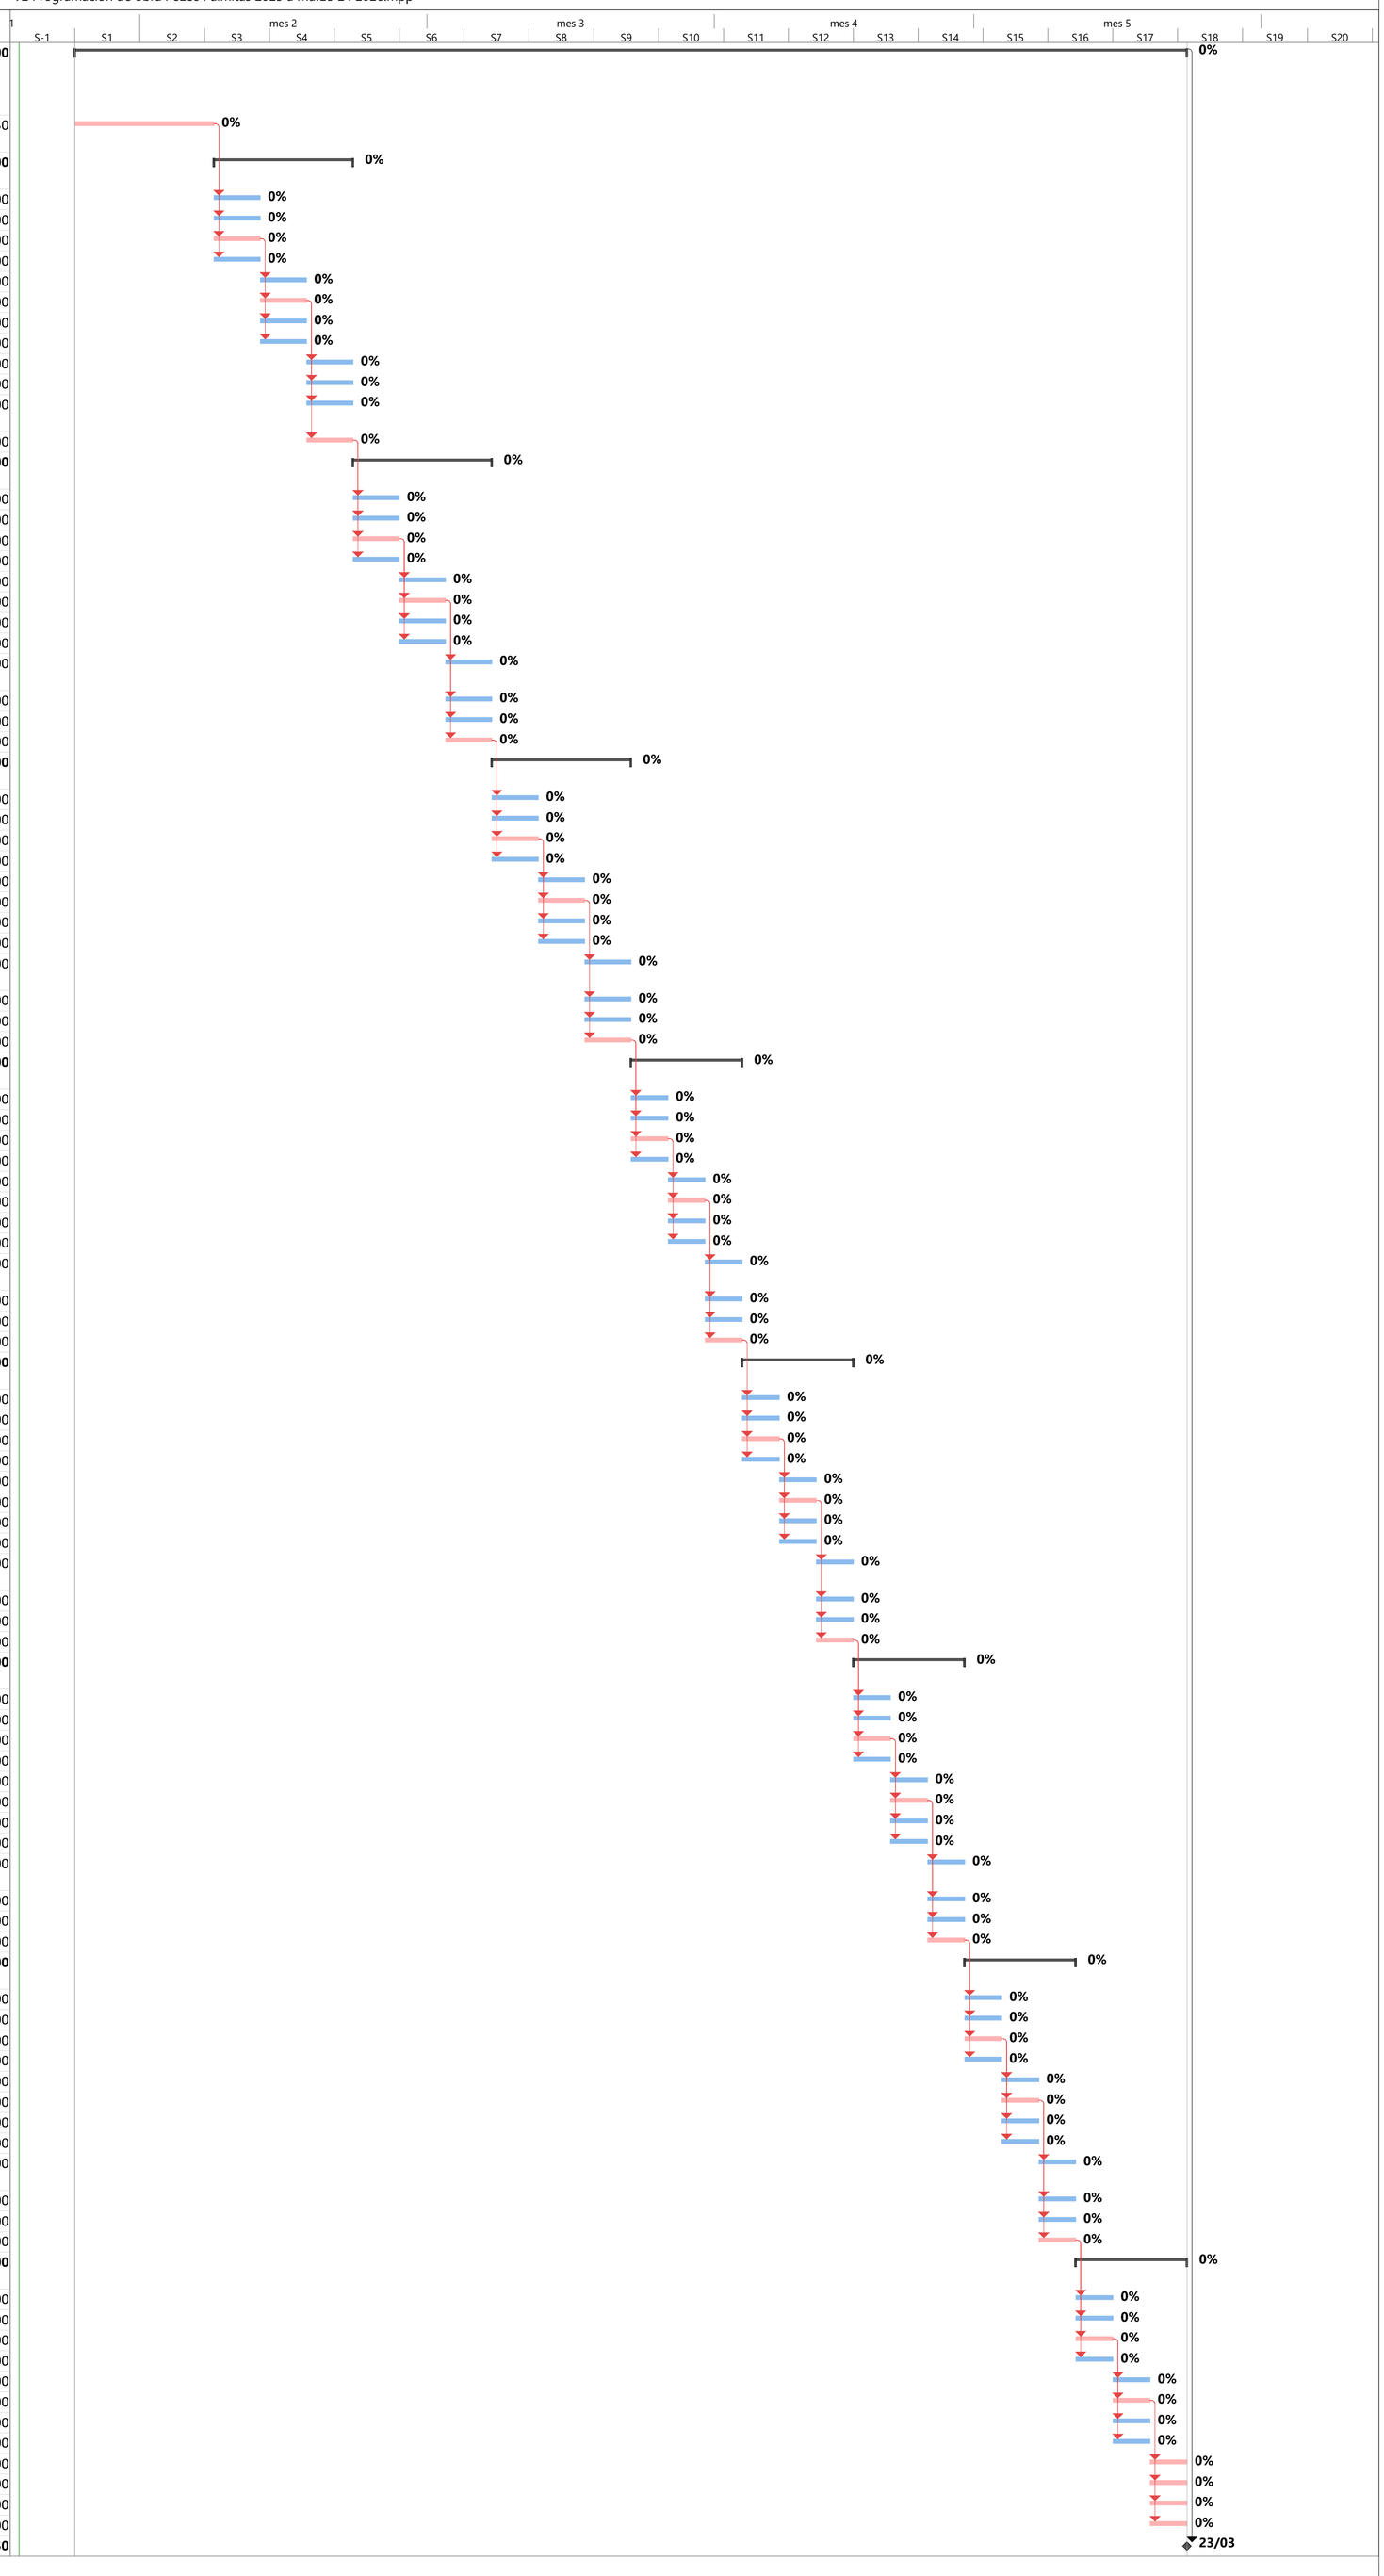

Tareas críticas · Tarea · Tarea manual · solo duración · Hito de línea base · Resumen · Tareas externas · Hito inactivo
División crítica · División · solo el comienzo · Línea base · Hito · Resumen manual · Hito externo · Resumen inactivo
Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · solo fin · División de la línea base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Fecha límite
