Outlook

RE: Cronograma propuesto GoLive2-Prorróga

Desde Vanesa Granda <vgranda@ita.biz>
Fecha Vie 27/03/2026 15:01
Para Proyecto ERP <erp@caldas.gov.co>
CC Diana Patricia Builes Morales <dbuiles@ita.biz>; Laura Melissa Castellanos Giraldo <lmcastellanos@caldas.gov.co>; Paola Ibañez <Paola.Ibanez@co.ey.com>; John Alexander Alzate Quiceno <jaalzateq@caldas.gov.co>; Ingrid K Vela Beltran <Ingrid.Vela@co.ey.com>; Natalia Ariza <Natalia.Ariza@co.ey.com>; Fernando Calderon <fcalderon@ita.biz>; Mauricio Contreras <mcontreras@ita.biz>; Sandra Marcela Osorio Castellanos <smosorio@caldas.gov.co>; Interventoria ey GobCaldas <Interventoria.ey.gobcaldas@co.ey.com>

Buenas tardes, Felipe
En atención a tu solicitud, se realizó la revisión del cronograma en la sesión convocada el día de ayer 26 de marzo a las 2:20 p.m., inicialmente con la persona indicada por tu parte. No obstante, y por solicitud de la Dra. Sandra Marcela Osorio, fue necesario ampliar la participación a otros integrantes.

Durante esta sesión se definieron las prioridades de atención de cada desarrollo, información clave que debía estar previamente consolidada como insumo para la construcción. Posteriormente, y también por solicitud de la Dra. Sandra Marcela, se llevó a cabo una sesión adicional el día de hoy 27 de marzo a las 2:00 p.m. con el equipo de GL, con el fin de realizar el mismo ejercicio.

Como resultado de estas sesiones, se cuenta con un cronograma ajustado para los desarrollos de GL y FM, el cual fue revisado y aprobado por el Dr. Danilo y Mónica, y que se adjunta para tu conocimiento.

Es importante resaltar que la consolidación de estas definiciones con los líderes funcionales era una actividad que se esperaba fuera gestionada previamente de tu parte, de manera que se contara oportunamente con las observaciones necesarias para la construcción del cronograma.

Cronograma 27032026 GoLive2.mpp
Planificación reportes FM_FI.xlsx

Quedamos atentos a cualquier comentario adicional.
Muchas gracias.

Se espera respuesta de éste correo, al respecto de los comentarios y afirmaciones. Si en el lapso de 3 días hábiles no se ha recibido respuesta, dichos comentarios y/o afirmaciones se entienden como válidas.

ita innovation & technology ally

Vanesa Granda Uribe
Project Manager SAP
vgranda@ita.biz
3207513625
Colombia - Chile - USA

ita.biz

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Queda estrictamente prohibido compartir cualquier parte de este mensaje con terceros sin el consentimiento por escrito del remitente. Si recibió este mensaje por error, le rogamos que lo responda y lo elimine para evitar que vuelva a ocurrir.

De: Proyecto ERP <erp@caldas.gov.co>
Enviado el: jueves, 26 de marzo de 2026 1:37 p. m.
Para: Vanesa Granda <vgranda@ita.biz>
CC: Diana Patricia Builes Morales <dbuiles@ita.biz>; Laura Melissa Castellanos Giraldo <lmcastellanos@caldas.gov.co>; Paola Ibañez <Paola.Ibanez@co.ey.com>; John Alexander Alzate Quiceno <jaalzateq@caldas.gov.co>; Ingrid K Vela Beltran <Ingrid.Vela@co.ey.com>; Natalia Ariza <Natalia.Ariza@co.ey.com>; Fernando Calderon <fcalderon@ita.biz>; Mauricio Contreras <mcontreras@ita.biz>; Sandra Marcela Osorio Castellanos <smosorio@caldas.gov.co>; Interventoria ey GobCaldas <Interventoria.ey.gobcaldas@co.ey.com>
Asunto: Re: Cronograma propuesto GoLive2-Prorróga

Hola buena tarde, confirmada la reunión a las 2:20

Obtener Outlook para Android

From: Vanesa Granda <vgranda@ita.biz>
Sent: Thursday, March 26, 2026 12:04:34 PM
To: Proyecto ERP <erp@caldas.gov.co>
Cc: Diana Patricia Builes Morales <dbuiles@ita.biz>; Laura Melissa Castellanos Giraldo <lmcastellanos@caldas.gov.co>; Paola Ibañez <Paola.Ibanez@co.ey.com>; John Alexander Alzate Quiceno <jaalzateq@caldas.gov.co>; Ingrid K Vela Beltran <Ingrid.Vela@co.ey.com>; Natalia Ariza <Natalia.Ariza@co.ey.com>; Fernando Calderon <fcalderon@ita.biz>; Mauricio Contreras <mcontreras@ita.biz>; Sandra Marcela Osorio Castellanos <smosorio@caldas.gov.co>; Interventoria ey GobCaldas <Interventoria.ey.gobcaldas@co.ey.com>
Subject: RE: Cronograma propuesto GoLive2-Prorróga

Hola Felipe
Buenas tardes

Agradezco por favor me indiques si a las 2 pm nos podemos reunir para validar el orden de atención de los desarrollos de FM y de la importancia del usuario clave de FM en la construcción de los escenarios y pruebas de estos.

Gracias.

Se espera respuesta de éste correo, al respecto de los comentarios y afirmaciones. Si en el lapso de 3 días hábiles no se ha recibido respuesta, dichos comentarios y/o afirmaciones se entienden como válidas.

Vanesa Granda Uribe
Project Manager SAP
vgranda@ita.biz
3207513625
Colombia - Chile - USA

ita.biz

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Queda estrictamente prohibido compartir cualquier parte de este mensaje con terceros sin el consentimiento por escrito del remitente. Si recibió este mensaje por error, le rogamos que lo responda y lo elimine para evitar que vuelva a ocurrir.

De: Proyecto ERP <erp@caldas.gov.co>
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2026 9:27 p. m.
Para: Vanesa Granda <vgranda@ita.biz>; Interventoria ey GobCaldas <Interventoria.ey.gobcaldas@co.ey.com>
CC: Diana Patricia Builes Morales <dbuiles@ita.biz>; Laura Melissa Castellanos Giraldo <lmcastellanos@caldas.gov.co>; Paola Ibañez <Paola.Ibanez@co.ey.com>; John Alexander Alzate Quiceno <jaalzateq@caldas.gov.co>; Ingrid K Vela Beltran <Ingrid.Vela@co.ey.com>; Natalia Ariza <Natalia.Ariza@co.ey.com>; Fernando Calderon <fcalderon@ita.biz>; Mauricio Contreras <mcontreras@ita.biz>; Sandra Marcela Osorio Castellanos <smosorio@caldas.gov.co>
Asunto: RE: Cronograma propuesto GoLive2-Prorróga

Buena noche.

En relación con el cronograma propuesto para el GoLive 2, nos permitimos presentar las siguientes observaciones:

De acuerdo con lo indicado en nuestra comunicación anterior, es fundamental que el equipo de la Gobernación cuente con el tiempo suficiente para ejecutar las pruebas necesarias que permitan validar y garantizar el correcto funcionamiento de los reportes requeridos por las entidades externas, los cuales deben estar disponibles a más tardar el 30 de abril.

En este sentido, las fechas planteadas en el cronograma, que finalizan muy próximas a dicha fecha, no resultan viables, en la medida en que no permiten surtir de manera adecuada las pruebas integrales, validaciones y eventuales ajustes que se deriven de estas.

Por lo anterior, solicitamos ajustar el cronograma de manera que se garantice un margen adecuado para la ejecución completa de las pruebas integrales, asegurando así la calidad y confiabilidad de los entregables antes de su salida a producción.

Quedamos atentos a la actualización del cronograma con los ajustes correspondientes

Gerencia Proyecto
Proyecto InnovaGOB - ERP
Secretaria de Planeación
Gobernación de Caldas

De: Vanesa Granda <vgranda@ita.biz>
Enviado: miércoles, 25 de marzo de 2026 16:37
Para: Proyecto ERP <erp@caldas.gov.co>; Interventoria ey GobCaldas <Interventoria.ey.gobcaldas@co.ey.com>
Cc: Diana Patricia Builes Morales <dbuiles@ita.biz>; Laura Melissa Castellanos Giraldo <lmcastellanos@caldas.gov.co>; Paola Ibañez <Paola.Ibanez@co.ey.com>; John Alexander Alzate Quiceno <jaalzateq@caldas.gov.co>; Ingrid K Vela Beltran <Ingrid.Vela@co.ey.com>; Natalia Ariza <Natalia.Ariza@co.ey.com>; Fernando Calderon <fcalderon@ita.biz>; Mauricio Contreras <mcontreras@ita.biz>; Sandra Marcela Osorio Castellanos <smosorio@caldas.gov.co>
Asunto: RE: Cronograma propuesto GoLive2-Prorróga

Buenas tardes, Felipe
Los desarrollos tienen las fechas antes de la que solicitas, a excepción de los que están con * que finalizan después del 30 de abril, ya que en validación con el consultor indicó que quizás estos se cubrían con otros desarrollos, estoy pendiente de confirmación por parte del consultor y equipo presupuesto GDC, si me ayudas por favor revisando con Laura y Eduardo.
Gracias.

FM	FMR003-Informe de Fuentes y Usos	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA EFECTUAR CONTROL PRESUPUESTAL	**Termina 23 de ab**
FM	FMR008-Integración Dirección territorial de salud	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO	**Termina 29 de ab**
FM	FMR009-Contraloría departamental y asamblea de caldas	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO	**Termina 9 de abr**

FM	FMR010-Colegio Integrado Nacional de Oriente	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO	**Termina 15 de m**
FM	FMR011-Marco Fiscal	ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2026 PARA PRESUPUESTO 2027	**Termina 21 de m**
FM	FMR014-Reporte FUT	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO	**Termina 22 de m**
FM	FMR015-Reporte CUIPO	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO	**Termina 22 de ab**
FM	FMR016-Reporte Regalias	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO	**Termina 27 de ab**
FM	FMR017-Reporte APPUI	NECESARIO PARA REPORTAR CADA MES (PENDIENTES EL CARGUE DE 2 INFORMES ENERO Y FEBRERO) Antes del 30	**Termina 30 de ab**
GL	FIGLR002-Reporte operaciones reciprocas, Generación de reporte tabla z para cuentas y terceros	NECESARIA PARA REPORTE CHIP QUE SE REPORTA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026	**El desarrollo fina de abril**
GL	FIGLR006-Reporte detallado de movimiento por cuenta (Saldo Inicial, detalle débitos, detalle créditos y saldo final).	NECESARIA PARA REPORTE CHIP QUE SE REPORTA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026	**Este desarrollo l porque lo solicit desarrollo FIGLR Libro Mayor que acumulativos y l finaliza 27 de ma**
GL	FIGLR008-Reporte CHIP de saldos y movimientos (contaduría) modificación para que se visualice en pesos colombianos (ver desarrollo actual)	NECESARIA PARA REPORTE CHIP QUE SE REPORTA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026	**Finaliza 27 de m de abril al client la disponibilidad**
AP	FIAPR002-Reporte operaciones reciprocas, Generación de reporte tabla z para cuentas y terceros.	NECESARIA PARA REPORTE CHIP QUE SE REPORTA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026	**Se desestima po FIGLR002 Repor reciprocas, Gene tabla z para cuer idéntico al desar El FIGLR002 fina**

Se espera respuesta de éste correo, al respecto de los comentarios y afirmaciones. Si en el lapso de 3 días hábiles no se ha recibido respuesta, dichos comentarios y/o afirmaciones se entienden como válidas.

Vanesa Granda Uribe
Project Manager SAP
vgranda@ita.biz
3207513625
Colombia - Chile - USA

ita.biz

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Queda estrictamente prohibido compartir cualquier parte de este mensaje con terceros sin el consentimiento por escrito del remitente. Si recibió este mensaje por error, le rogamos que lo responda y lo elimine para evitar que vuelva a ocurrir.

De: Proyecto ERP <erp@caldas.gov.co>
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2026 4:01 p. m.
Para: Vanesa Granda <vgranda@ita.biz>; Interventoria ey GobCaldas <Interventoria.ey.gobcaldas@co.ey.com>
CC: Diana Patricia Builes Morales <dbuiles@ita.biz>; Laura Melissa Castellanos Giraldo <lmcastellanos@caldas.gov.co>; Paola Ibañez <Paola.Ibanez@co.ey.com>; John Alexander Alzate Quiceno <jaalzateq@caldas.gov.co>; Ingrid K Vela Beltran <Ingrid.Vela@co.ey.com>; Natalia Ariza <Natalia.Ariza@co.ey.com>; Fernando Calderon <fcalderon@ita.biz>; Mauricio Contreras <mcontreras@ita.biz>; Sandra Marcela Osorio Castellanos <smosorio@caldas.gov.co>
Asunto: RE: Cronograma propuesto GoLive2-Prorróga

Buena tarde.

Una vez realizada la revisión de las fechas establecidas por la Secretaría de Hacienda para la entrega de los reportes, se solicita de manera atenta realizar el ajuste de dichas fechas, con el fin de contar oportunamente con la información para la ejecución de las pruebas integrales y validar su correcto funcionamiento.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las fechas definidas para la solución de cada uno de los requerimientos deben estar alineadas con los plazos de reporte de información ante las entidades de control, garantizando así el cumplimiento normativo y la calidad de los entregables.

FM	FMR003-Informe de Fuentes y Usos	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA EFECTUAR CONTROL PRESUPUESTAL
FM	FMR008-Integración Dirección territorial de salud	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO
FM	FMR009-Contraloría departamental y asamblea de caldas	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO
FM	FMR010-Colegio Integrado Nacional de Oriente	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO
FM	FMR011-Marco Fiscal	ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2026 PARA PRESUPUESTO 2027
FM	FMR014-Reporte FUT	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO
FM	FMR015-Reporte CUIPO	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO
FM	FMR016-Reporte Regalias	ANTES DEL 30 DE ABRIL PARA REPORTE CUIPO
FM	FMR017-Reporte APPUI	NECESARIO PARA REPORTAR CADA MES (PENDIENTES EL CARGUE DE 2 INFORMES ENI FEBRERO) Antes del 30
GL	FIGLR002-Reporte operaciones reciprocas, Generación de reporte tabla z para cuentas y terceros	NECESARIA PARA REPORTE CHIP QUE SE REPORTA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026

GL	FIGLR006-Reporte detallado de movimiento por cuenta (Saldo Inicial, detalle débitos, detalle créditos y saldo final).	NECESARIA PARA REPORTE CHIP QUE SE REPORTA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026
GL	FIGLR008-Reporte CHIP de saldos y movimientos (contaduría) modificación para que se visualice en pesos colombianos (ver desarrollo actual)	NECESARIA PARA REPORTE CHIP QUE SE REPORTA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026
AP	FIAPR002-Reporte operaciones reciprocas, Generación de reporte tabla z para cuentas y terceros.	NECESARIA PARA REPORTE CHIP QUE SE REPORTA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026

Gerencia Proyecto
Proyecto InnovaGOB - ERP
Secretaria de Planeación
Gobernación de Caldas

De: Vanesa Granda <vgranda@ita.biz>
Enviado: miércoles, 25 de marzo de 2026 13:51
Para: Proyecto ERP <erp@caldas.gov.co>; Interventoria ey GobCaldas <Interventoria.ey.gobcaldas@co.ey.com>
Cc: Diana Patricia Builes Morales <dbuiles@ita.biz>; Laura Melissa Castellanos Giraldo <lmcastellanos@caldas.gov.co>; Paola Ibañez <Paola.Ibanez@co.ey.com>; Ingrid K Vela Beltran <Ingrid.Vela@co.ey.com>; Natalia Ariza <Natalia.Ariza@co.ey.com>; Fernando Calderon <fcalderon@ita.biz>; Mauricio Contreras <mcontreras@ita.biz>
Asunto: RE: Cronograma propuesto GoLive2-Prorróga

Buenas tardes,

Adjunto respuesta a las observaciones enviadas y adjunto enlace de la nueva versión del cronograma:

Cronograma 25032026 GoLive2.mpp

1. Las actividades de 1554 a la 1558 deben actualizarse en función de la ejecución y avance final programado para pruebas funcionales:

   Se actualizan las fechas y se mueven para wave 3

2. Las fechas de la integración Nómina-Antares-Humano se encuentran vencidas, y se debe confirmar si estas estarán incluidas en la salida en vivo 2.

   La línea 2760 esta con fechas actualizadas

3. Actualizar la actividad 1889 Hito: Aceptación de pruebas Integrales Manuales, ya que se encuentra vencido.

   Se actualiza hasta el 10 de abril de 2026

4. Las siguientes actividades se encuentran vencidas, además no se encuentra la programación propuesta teniendo en cuenta que es una entrega escalonada a la Gobernación de Caldas sujeta a la finalización de la salida en vivo 2.



323		0%		Transición basis sesión 1	2h	Wed 11/03/26	Wed 11/03/26
324		0%		Transición basis sesión 2	2h	Thu 19/03/26	Thu 19/03/26
325		0%		Transición roles 1	2h	Thu 19/03/26	Fri 20/03/26
326		0%		Transición roles 2	3d	Tue 24/03/26	Fri 27/03/26
327		0%		Hito:Finalización plan de transición	0d	Fri 27/03/26	Fri 27/03/26

   No están vencidas, son actividades ya ejecutadas.

   Basis ya finalizó, seguridad hará entrega hasta el 27

5. La actividad 1923 “Hito: cierre de actividades wave 2” se encuentra vencida

   Queda actualizada

6. Revisar fechas definidas para el paquete de trabajo “cierre de wave 2 y aprobación de entregables”, ya que las fechas propuestas de cierre son durante semana santa, por tanto, recomendamos confirmar con Gobernación de Caldas si las fechas propuestas les funciona para generar aprobaciones.

1986	0%		Informe de pruebas unitarias, integrales y de aceptación técnica y/o funcional en QA del ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP8 de los requerimientos establecidos para las fases Wave 1 y 2	42d	Wed 4/02/26	Wed 1/04/26
2000	0%		Informe de evolución funcional de requerimientos del ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP 8 en alcance de la wave 2	14d	Wed 26/11/25	Tue 16/12/25
2015	0%		Informe de calidad de la información en el ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP 8	7d	Mon 24/11/25	Tue 2/12/25
2030	0%		Documentación de interfaces	15d	Tue 30/09/25	Wed 22/10/25
2045	0%		Informe de capacitación a líderes funcionales	92,13d	Wed 5/11/25	Wed 25/02/26
2060	0%		Manuales técnicos y funcionales	35d	Mon 9/02/26	Tue 31/03/26
2075	0%		Informe de control de cambios	11d	Wed 4/02/26	Mon 16/02/26
2089	0%		Informe de estado y progreso del proyecto	44d	Wed 4/02/26	Mon 6/04/26
2104	0%		Requerimientos funcionales en alcance de la fase 3 (sprint 3) – Sprint Backlog	15,6d	Wed 4/02/26	Fri 20/02/26
2119	0%		Actas de aceptación	1d	Wed 1/04/26	Sat 4/04/26
2124	0%		Documento y/o informe del Upgrade Técnico de SAP ECC 6.0 EHP0 a SAP ECC 6.0 EHP8. (sistema operativo, motor de bases de datos oracle, SAP) Productivo	12d	Thu 5/02/26	Wed 18/02/26
2139	0%		Acta de cierre de fase (sprint 2)	15d	Wed 4/02/26	Fri 20/02/26
2140	0%		Acta de cierre de fase (wave 2).	2d	Wed 4/02/26	Fri 6/02/26

Se actualiza solo para los entregables que aun no se han cerrado

7. La actividad 2153 y 2154 “Recolección firmas acta y ordenación del gasto” “Hito: cierre wave 2” se encuentran vencidas, verificar.

   Se actualizan

8. Confirmar que los tiempos definidos para la revisión y refinación del cutover con el cliente son acordes con la disponibilidad para llevar a cabo las sesiones.

   Se extiende unos días

9. Las siguientes actividades no tienen coherencia en la fecha y secuencia entre la finalización de los desarrollos y la fecha de cierre de pruebas, teniendo en cuenta que los desarrollos de marco fiscal y reporte FUT finalizan el 21 y 22 de mayo de 2026. Por tanto, recomendamos validar la fecha de cierre de pruebas de wave 3 con todo, la cual está propuesta para el 17 de abril 2026, fecha que antecede los desarrollos descritos:

2372	0%		FMR003-Informe de Fuentes y Usos	55,88d	Sat 7/02/26	Thu 23/04/26
2380	0%		FMR007-Informes de registro de totales	35d	Tue 24/03/26	Mon 11/05/26
2388	0%		FMR008-Integración Dirección territorial de salud	39,88d	Wed 4/03/26	Wed 29/04/26
2396	0%		FMR009-Contraloría departamental y asamblea de caldas	25,85d	Wed 4/03/26	Mon 13/04/26
2404	0%		FMR010-Colegio Integrado Nacional de Oriente	52,53d	Wed 4/03/26	Fri 15/05/26
2412	0%		FMR011-Marco Fiscal	43,5d	Tue 24/03/26	Thu 21/05/26
2422	0%		FMR014-Reporte FUT	44,88d	Fri 20/03/26	Fri 22/05/26
2430	0%		FMR015-Reporte CUIPO	35,63d	Wed 4/03/26	Wed 22/04/26
2438	0%		FMR016-Reporte Regalias	38,13d	Wed 4/03/26	Mon 27/04/26
2446	0%		FMR017-Reporte APPUI	37,38d	Wed 11/03/26	Fri 1/05/26
2454	0%		FMR012-Consulta de CDP	40,38d	Fri 20/03/26	Fri 15/05/26
2463	0%		FMR013-Libros Presupuestales	42,5d	Mon 9/03/26	Wed 6/05/26
2472	8%		Reportes financieros	74d	Tue 27/01/26	Thu 30/04/26
2473	13%		Contabilidad	74d	Tue 27/01/26	Thu 30/04/26
2545	0%		Reportes AA	51,5d	Tue 27/01/26	Tue 31/03/26
2570	0%		Reportes AP	19,08d	Tue 27/01/26	Thu 12/02/26
2579	0%		Reportes TR	38d	Wed 4/03/26	Mon 27/04/26
3023	0%		*Hito: Cierre de pruebas Wave 3 con todo*	0d	Fri 17/04/26	Fri 17/04/26	3021

Los reportes de presupuesto tendrán sus propios escenarios y serán ejecutadas las pruebas en los tiempos indicados para cada uno, el día que se haga la entrega al cliente.

10. Además, el hito de salida en vivo no muestra las fechas propuestas para los desarrollos que salen después del 20 de abril de 2026, agradecemos verificar y detallar. Por tanto, recomendamos que queden atados a los desarrollos y ejecución respectiva de las pruebas. De la misma manera, la estrategia de salida en vivo de reportes debe quedar descrita de manera detallada en el control de cambios presentado por Ita.

    Los reportes se irán transportando a productivo a medida que se entreguen al cliente y estos acepten su correcto funcionamiento

11. No se evidencia el movimiento de fechas asociadas a la integración con Realtech, Humano y Almera, en todo caso si la integración se cancela debe haber un soporte. De la misma manera, en caso de que se desplace también debe haber un soporte que la respalde; lo anterior debe quedar detallado en el control de cambios presentado por Ita:

    Realtech y Antares tiene la fecha actualizada, finalizando pruebas 17 de abril.

    Almera no queda en esta fase del proyecto por decisión del comité ejecutivo.

12. No se evidencia la capacitación de los reportes de rentas. De la misma manera, no es claro por qué las capacitaciones de los reportes de presupuesto finalizan el 3 de marzo de 2026, si los desarrollos están programados para mayor. Agradecemos verificar las fechas generales, teniendo en cuenta las fechas de entrega de los reportes.

2796	16%	Capacitación Usuarios clave	271,5d	Tue 22/04/25	Mon 27/04/26
2797	0%	Hito: Inicio capacitación usuarios clave	0d	Wed 18/02/26	Wed 18/02/26
2798	0%	Programar capacitaciones a usuario líder w3	1d	Wed 18/02/26	Thu 19/02/26
2799	0%	Programar capacitaciones a usuario final	1d	Wed 18/02/26	Thu 19/02/26
2800	0%	Preparar material de capacitación a usuario líder w3	20d	Wed 18/02/26	Wed 18/03/26
2801	20%	Capacitación prestaciones sociales	33,62d	Wed 18/02/26	Wed 8/04/26
2853	100%	Capacitaciones PM Mantenimiento	4d	Wed 18/02/26	Tue 24/02/26
2858	0%	Capacitacion reportes Presupuesto	7d	Fri 20/02/26	Tue 3/03/26
2892	0%	Reportes Financieros	2,75d	Wed 18/02/26	Mon 23/02/26
2935	0%	Reportes Proyectos	2,25d	Mon 23/02/26	Wed 25/02/26
2960	0%	Reporte TR	271,5d	Tue 22/04/25	Mon 27/04/26
2979	0%	*Hito: Capacitaciones finalizadas*	0d	Tue 10/03/26	Tue 10/03/26

Se corrige la fecha de capacitación de los reportes de presupuesto y capacitación en reportes de rentas no hay.

13. No se evidencian las pruebas de los reportes que están posteriores a la salida en vivo propuesta para el 20 de abril de 2026.

    Las pruebas corresponden a los ejercicios que realiza el cliente cuando en la sesión se realiza la entrega del desarrollo

14. Confirmar con la Gobernación de Caldas la viabilidad de ejecutar pruebas manuales, UAT y regresión en paralelo.

    Las pruebas integrales de prestaciones sociales se ejecutarán entre el 14 y 16 de abril

    Las UAT se ejecutan cuando finalicen las integrales, los días 16 y 17 de abril

    Las de regresión son ejecutadas por el equipo de cxp y cxc con el equipo FI, equipo diferente al que ejecuta las pruebas integrales.

15. No se evidencia la extensión de la entrega de los informes mensuales hasta la fecha fin del cronograma.

    Se actualiza, ver línea 3677, 3678

16. Confirmar que esté la totalidad de entregables:

    No se han cambiado al cronograma anterior aprobado

Se espera respuesta de éste correo, al respecto de los comentarios y afirmaciones. Si en el lapso de 3 días hábiles no se ha recibido respuesta, dichos comentarios y/o afirmaciones se entienden como válidas.

Vanesa Granda Uribe
Project Manager SAP

vgranda@ita.biz

3207513625
Colombia - Chile - USA

ita.biz

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Queda estrictamente prohibido compartir cualquier parte de este mensaje con terceros sin el consentimiento por escrito del remitente. Si recibió este mensaje por error, le rogamos que lo responda y lo elimine para evitar que vuelva a ocurrir.

De: Interventoria ey GobCaldas <Interventoria.ey.gobcaldas@co.ey.com>
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2026 10:27 a. m.
Para: Vanesa Granda <vgranda@ita.biz>; Mauricio Contreras <mcontreras@ita.biz>; Fernando Calderon <fcalderon@ita.biz>
CC: Diana Patricia Builes Morales <dbuiles@ita.biz>; Laura Melissa Castellanos Giraldo <lmcastellanos@caldas.gov.co>; Proyecto ERP <erp@caldas.gov.co>; Paola Ibañez <Paola.Ibanez@co.ey.com>; Ingrid K Vela Beltran <Ingrid.Vela@co.ey.com>; Natalia Ariza <Natalia.Ariza@co.ey.com>
Asunto: RE: Cronograma propuesto GoLive2-Prorróga

Buenos días,


Nos permitimos remitir las observaciones del borrador del cronograma para su atención, el cual fue revisado en conjunto con la Gobernación de Caldas:

1. Las actividades de 1554 a la 1558 deben actualizarse en función de la ejecución y avance final programado para pruebas funcionales.
2. Las fechas de la integración Nómina-Antares-Humano se encuentran vencidas, y se debe confirmar si estas estarán incluidas en la salida en vivo 2.
3. Actualizar la actividad 1889 Hito: Aceptación de pruebas Integrales Manuales, ya que se encuentra vencido.
4. Las siguientes actividades se encuentran vencidas, además no se encuentra la programación propuesta teniendo en cuenta que es una entrega escalonada a la Gobernación de Caldas sujeta a la finalización de la salida en vivo 2.



323	0%	Transición basis sesión 1	2h	Wed 11/03/26	Wed 11/03/26
324	0%	Transición basis sesión 2	2h	Thu 19/03/26	Thu 19/03/26
325	0%	Transición roles 1	2h	Thu 19/03/26	Fri 20/03/26
326	0%	Transición roles 2	3d	Tue 24/03/26	Fri 27/03/26
327	0%	Hito:Finalización plan de transición	0d	Fri 27/03/26	Fri 27/03/26

5. La actividad 1923 “Hito: cierre de actividades wave 2” se encuentra vencida
6. Revisar fechas definidas para el paquete de trabajo “cierre de wave 2 y aprobación de entregables”, ya que las fechas propuestas de cierre son durante semana santa, por tanto, recomendamos confirmar con Gobernación de Caldas si las fechas propuestas les funciona para generar aprobaciones.

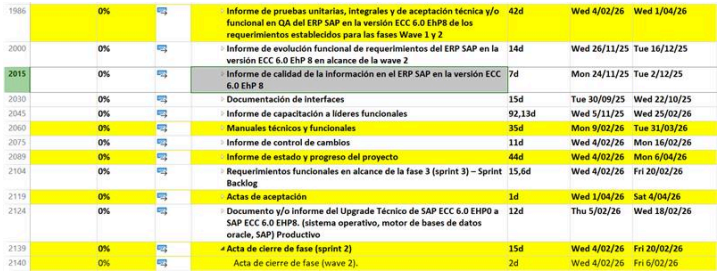


1986	0%	Informe de pruebas unitarias, integrales y de aceptación técnica y/o funcional en QA del ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP8 de los requerimientos establecidos para las fases Wave 1 y 2	42d	Wed 4/02/26	Wed 1/04/26
2000	0%	Informe de evolución funcional de requerimientos del ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP 8 en alcance de la wave 2	14d	Wed 26/11/25	Tue 16/12/25
2015	0%	Informe de calidad de la información en el ERP SAP en la versión ECC 6.0 EhP 8	7d	Mon 24/11/25	Tue 2/12/25
2030	0%	Documentación de interfaces	15d	Tue 30/09/25	Wed 22/10/25
2045	0%	Informe de capacitación a líderes funcionales	92,13d	Wed 5/11/25	Wed 25/02/26
2060	0%	Manuales técnicos y funcionales	35d	Mon 9/02/26	Tue 31/03/26
2075	0%	Informe de control de cambios	11d	Wed 4/02/26	Mon 16/02/26
2089	0%	Informe de estado y progreso del proyecto	44d	Wed 4/02/26	Mon 6/04/26
2104	0%	Requerimientos funcionales en alcance de la fase 3 (sprint 3) – Sprint Backlog	15,6d	Wed 4/02/26	Fri 20/02/26
2119	0%	Actas de aceptación	1d	Wed 1/04/26	Sat 4/04/26
2124	0%	Documento y/o informe del Upgrade Técnico de SAP ECC 6.0 EHP0 a SAP ECC 6.0 EHP8. (sistema operativo, motor de bases de datos oracle, SAP) Productivo	12d	Thu 5/02/26	Wed 18/02/26
2139	0%	Acta de cierre de fase (sprint 2)	15d	Wed 4/02/26	Fri 20/02/26
2140	0%	Acta de cierre de fase (wave 2).	2d	Wed 4/02/26	Fri 6/02/26

7. La actividad 2153 y 2154 “Recolección firmas acta y ordenación del gasto” “Hito: cierre wave 2” se encuentran vencidas, verificar.
8. Confirmar que los tiempos definidos para la revisión y refinación del cutover con el cliente son acordes con la disponibilidad para llevar a cabo las sesiones.
9. Las siguientes actividades no tienen coherencia en la fecha y secuencia entre la finalización de los desarrollos y la fecha de cierre de pruebas, teniendo en cuenta que los desarrollos de marco fiscal y reporte FUT finalizan el 21 y 22 de mayo de 2026. Por tanto, recomendamos validar la fecha de cierre de pruebas de wave 3 con todo, la cual está propuesta para el 17 de abril 2026, fecha que antecede los desarrollos descritos:



2372	0%	FMR003-Informe de Fuentes y Usos	55,88d	Sat 7/02/26	Thu 23/04/26
2380	0%	FMR007-Informes de registro de totales	35d	Tue 24/03/26	Mon 11/05/26
2388	0%	FMR008-Integración Dirección territorial de salud	39,88d	Wed 4/03/26	Wed 29/04/26
2396	0%	FMR009-Contraloría departamental y asamblea de caldas	25,85d	Wed 4/03/26	Mon 13/04/26
2404	0%	FMR010-Colegio Integrado Nacional de Oriente	52,53d	Wed 4/03/26	Fri 15/05/26
2412	0%	FMR011-Marco Fiscal	43,5d	Tue 24/03/26	Thu 21/05/26
2422	0%	FMR014-Reporte FUT	44,88d	Fri 20/03/26	Fri 22/05/26
2430	0%	FMR015-Reporte CUIPO	35,63d	Wed 4/03/26	Wed 22/04/26
2438	0%	FMR016-Reporte Regalias	38,13d	Wed 4/03/26	Mon 27/04/26
2446	0%	FMR017-Reporte APPUI	37,38d	Wed 11/03/26	Fri 1/05/26
2454	0%	FMR012-Consulta de CDP	40,38d	Fri 20/03/26	Fri 15/05/26
2463	0%	FMR013-Libros Presupuestales	42,5d	Mon 9/03/26	Wed 6/05/26
2472	8%	Reportes financieros	74d	Tue 27/01/26	Thu 30/04/26
2473	13%	Contabilidad	74d	Tue 27/01/26	Thu 30/04/26
2545	0%	Reportes AA	51,5d	Tue 27/01/26	Tue 31/03/26
2570	0%	Reportes AP	19,08d	Tue 27/01/26	Thu 12/02/26
2579	0%	Reportes TR	38d	Wed 4/03/26	Mon 27/04/26
3023	0%	*Hito: Cierre de pruebas Wave 3 con todo*	0d	Fri 17/04/26	Fri 17/04/26

10. Además, el hito de salida en vivo no muestra las fechas propuestas para los desarrollos que salen después del 20 de abril de 2026, agradecemos verificar y detallar. Por tanto, recomendamos que queden atados a los desarrollos y ejecución respectiva de las pruebas. De la misma manera, la estrategia de salida en vivo de reportes debe quedar descrita de manera detallada en el control de cambios presentado por Ita.
11. No se evidencia el movimiento de fechas asociadas a la integración con Realtech, Humano y Almera, en todo caso si la integración se cancela debe haber un soporte. De la misma manera, en caso de que se desplace también debe haber un soporte que la respalde; lo anterior debe quedar detallado en el control de cambios presentado por Ita.
12. No se evidencia la capacitación de los reportes de rentas. De la misma manera, no es claro por qué las capacitaciones de los reportes de presupuesto finalizan el 3 de marzo de 2026, si los desarrollos están programados para mayor. Agradecemos verificar las fechas generales, teniendo en cuenta las fechas de entrega de los reportes.



2796	16%	Capacitación Usuarios clave	271,5d	Tue 22/04/25	Mon 27/04/26
2797	0%	Hito: Inicio capacitación usuarios clave	0d	Wed 18/02/26	Wed 18/02/26
2798	0%	Programar capacitaciones a usuario líder w3	1d	Wed 18/02/26	Thu 19/02/26
2799	0%	Programar capacitaciones a usuario final	1d	Wed 18/02/26	Thu 19/02/26
2800	0%	Preparar material de capacitación a usuario líder w3	20d	Wed 18/02/26	Wed 18/03/26
2801	20%	Capacitación prestaciones sociales	33,62d	Wed 18/02/26	Wed 8/04/26
2853	100%	Capacitaciones PM Mantenimiento	4d	Wed 18/02/26	Tue 24/02/26
2858	0%	Capacitacion reportes Presupuesto	7d	Fri 20/02/26	Tue 3/03/26
2892	0%	Reportes Financieros	2,75d	Wed 18/02/26	Mon 23/02/26
2935	0%	Reportes Proyectos	2,25d	Mon 23/02/26	Wed 25/02/26
2960	0%	Reporte TR	271,5d	Tue 22/04/25	Mon 27/04/26
2979	0%	*Hito: Capacitaciones finalizadas*	0d	Tue 10/03/26	Tue 10/03/26

13. No se evidencian las pruebas de los reportes que están posteriores a la salida en vivo propuesta para el 20 de abril de 2026.
14. Confirmar con la Gobernación de Caldas la viabilidad de ejecutar pruebas manuales, UAT y regresión en paralelo.
15. No se evidencia la extensión de la entrega de los informes mensuales hasta la fecha fin del cronograma.
16. Confirmar que esté la totalidad de entregables.

Agradecemos que se realice la revisión, ajuste y entrega del cronograma a más tardar el día de hoy a las 2pm. De la misma manera, quedamos atentos al control de cambios con el detalle de todas las actualizaciones requeridas.

Atentamente,

Interventoría Integral

Proyecto de actualización técnica y evolución funcional del ERP SAP
Ernst & Young S.A.S
Carrera 11 No. 98 – 07 Edificio Pijao Piso 3, Bogotá, Colombia

Website: http://www.ey.com

From: Vanesa Granda <vgranda@ita.biz>
Sent: Tuesday, March 24, 2026 10:49 PM
To: Proyecto ERP <erp@caldas.gov.co>; Interventoria ey GobCaldas <Interventoria.ey.gobcaldas@co.ey.com>
Cc: Mauricio Contreras <mcontreras@ita.biz>; Fernando Calderon <fcalderon@ita.biz>; Diana Patricia Builes Morales <dbuiles@ita.biz>; Laura Melissa Castellanos Giraldo <lmcastellanos@caldas.gov.co>
Subject: Cronograma propuesto GoLive2-Prorróga

Cordial saludo,

Espero se encuentren muy bien.

Enviamos cronograma propuesto para la salida en vivo 2 y finalización actividades Fase 1.

Cronograma 24032016 GoLive2.mpp

Se espera respuesta de éste correo, al respecto de los comentarios y afirmaciones. Si en el lapso de 3 días hábiles no se ha recibido respuesta, dichos comentarios y/o afirmaciones se entienden como válidas.

Vanesa Granda Uribe
Project Manager SAP

vgranda@ita.biz

3207513625
Colombia - Chile - USA

ita.biz

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario especificado en el mensaje. Queda estrictamente prohibido compartir cualquier parte de este mensaje con terceros sin el consentimiento por escrito del remitente. Si recibió este mensaje por error, le rogamos que lo responda y lo elimine para evitar que vuelva a ocurrir.

_____
The information contained in this communication is intended solely for The use of The individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. it may contain confidential or legally privileged information. If you are not The intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on The contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. EY is neither liable for The proper and complete transmission of The information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

EY está comprometida con el tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de Información en:ey.com, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: proteccion_datos@co.ey.com.

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal."
"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal."
"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal."
