

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**FASE 1**	**39 días**	**lun 9/02/26**	**jue 2/04/26**	
2		***TOPOGRAFIA***	**27 días**	**mar 10/02/26**	**mié 18/03/26**	
3		Visita de reconocimiento	2 días	mar 10/02/26	mié 11/02/26	
4		Traslados de BMs	6 días	jue 12/02/26	jue 19/02/26	3
5		Georreferenciación (Receptor GNSS)	15 días	jue 12/02/26	mié 4/03/26	
6		Levantamiento topográfico detallado en campo	2 días	jue 5/03/26	vie 6/03/26	5
7		Estudios topográficos para redes de servicios públicos	2 días	lun 9/03/26	mar 10/03/26	6
8		Procesamiento, cálculo y control de calidad	2 días	mié 11/03/26	jue 12/03/26	7
9		Elaboración de productos topográficos	2 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	8
10		Consolidación y entrega final	3 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26	9
11		***GEOMETRÍA***	**10 días**	***mar 10/03/26***	**lun 23/03/26**	
12		Diseño geometrico en planta perfil	5 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26	6FC+1 día
13		Diseño de secciones transversales y cotas de pavimento	2 días	mar 17/03/26	mié 18/03/26	12
14		Elaboración de planos	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	13
15		Elaboracion y entrega de Anexos - Presentación e informe Ejecutivo	1 día	lun 23/03/26	lun 23/03/26	14
16		***URBANISMO***	**10 días**	***lun 16/03/26***	**vie 27/03/26**	
17		Diagnostico Urbano de las vías	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	12FC-1 día
18		Esquema básico	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26	17
19		Anteproyecto de diseño	3 días	mié 18/03/26	vie 20/03/26	18
20		Proyecto de diseño definitivo	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	19
21		Cronograma y coordinación con otras especialidades	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	17CC
22		***TRÁNSITO***	**9 días**	***lun 2/03/26***	**jue 12/03/26**	
23		Caracterización De Las Condiciones De Operación Actuales De Transito En La Red Vial Del Área De Influencia.	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	
24		Caraterísticas del sistema vial y de transporte	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	23CC
25		Características Del Sistema Vial Y De Transporte.	1 día	mar 3/03/26	mar 3/03/26	23CC
26		Identificación de los puntos críticos e información secundaria del tránsito	1 día	mar 3/03/26	mar 3/03/26	23CC
27		Metodología Para La Toma De Información Primaria De Transito	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	26
28		Aforos Vehiculares Y Peatonales	2 días	jue 5/03/26	vie 6/03/26	27
29		Procesamiento y análisis gráfico de los aforos realizados, así como la información secundaria	2 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	28CC+1 día
30		Estimación del volumen vehícular y peatonal generado y atraído por el proyecto	2 días	mar 10/03/26	mié 11/03/26	29
31		Modelación de la red vial circundante con proyecto	2 días	mar 10/03/26	mié 11/03/26	30CC
32		Modelación de la red vial circundante con proyección a 5, 10 y 20 años, teniendo en cuenta el desarrollo de las etapas del proyecto y los planes viales	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	30CC
33		Diseño de señalización	2 días	mié 11/03/26	jue 12/03/26	32CC+1 día
34		Diseño plan de manejo de tránsito	2 días	mié 11/03/26	jue 12/03/26	32CC+1 día
35		***ESTRUCTURAS***	**7 días**	***mié 25/03/26***	**jue 2/04/26**	
36		Revisión de información y diagnóstico inicial	1 día	mié 25/03/26	mié 25/03/26	

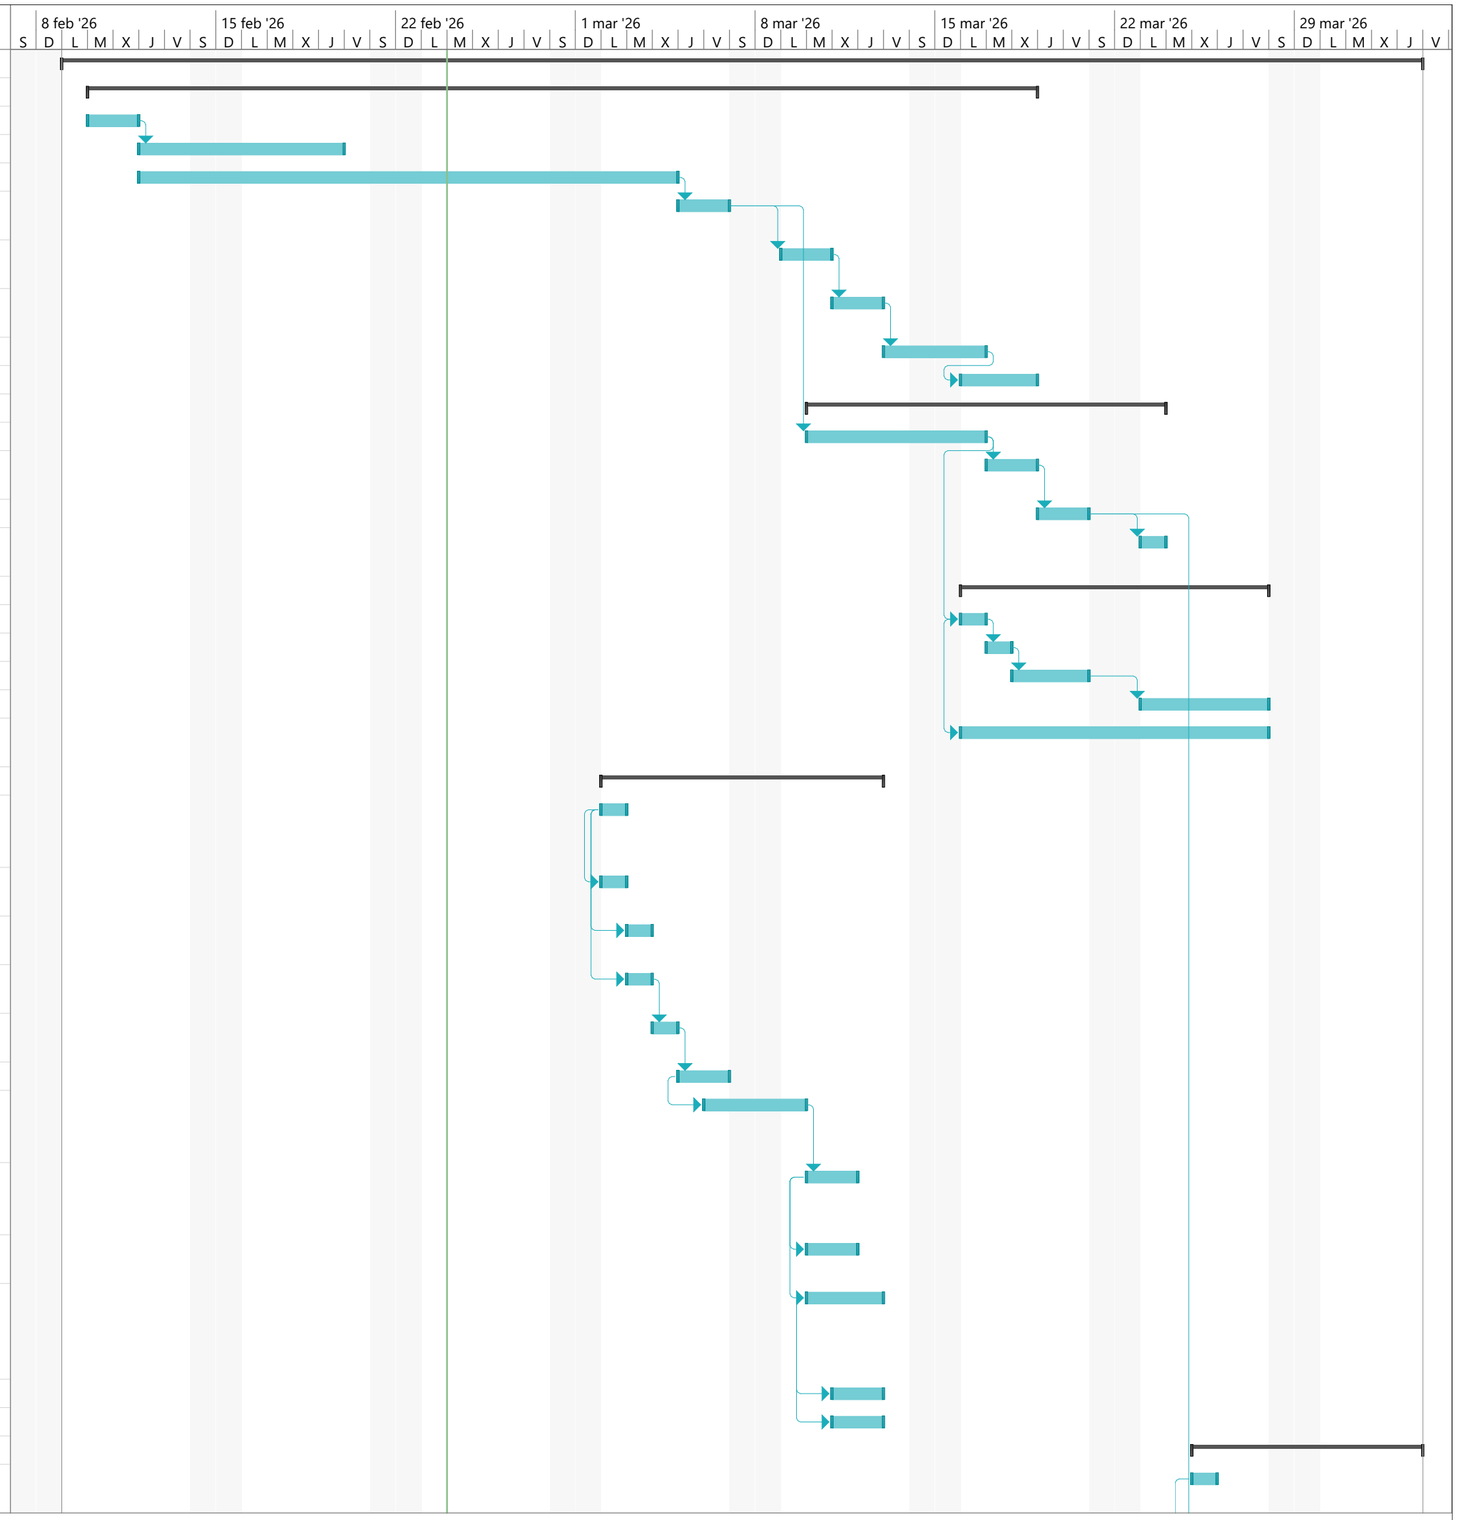

Proyecto: CRONOGRAMA FASE
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo		


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
37		Estudios y Diseños estructurales de drenaje y estructuras de contención	4 días	mié 25/03/26	lun 30/03/26	36CC;14
38		Elaboración del informe técnico de memorias de diseño estructural	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26	37
39		Planos y detalles estructurales	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26	38CC
40		Entrega informe estructural	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26	39
41		***GEOTECNIA***	**10 días**	***mié 11/02/26***	**mar 24/02/26**	
42		Reconocimiento preliminar e inspección en campo.	1 día	mié 11/02/26	mié 11/02/26	
43		Exploración directa o indirecta en campc	6 días	jue 12/02/26	jue 19/02/26	42
44		Ensayos IN-SITU.	6 días	jue 12/02/26	jue 19/02/26	43CC
45		Caracterización de muestras alteradas e inalteradas.	5 días	lun 16/02/26	vie 20/02/26	44CC+2 días
46		Elaboración de informe geotécnico	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26	45
47		***REDES SECAS***	**11 días**	***mar 10/03/26***	**mar 24/03/26**	
48		Recopilación de información.	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	
49		Levantamiento en campo de redes existentes.	2 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	48
50		Investigación y análisis de información redes secas recopiladas	3 días	vie 13/03/26	mar 17/03/26	49CC
51		Integración de planos digitalizados de redes secas existentes.	1 día	mié 18/03/26	mié 18/03/26	50
52		Diseño de redes secas (redes de energía eléctrcia, redes de telecomunicaciones, redes de alumbrado público, redes de gas	5 días	mié 18/03/26	mar 24/03/26	51CC
53		***HIDRÁULICA***	**14 días**	***mar 10/03/26***	**vie 27/03/26**	
54		Planeación y coordinación institucional.	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	
55		Recopilación y revisión de información secundaria.	6 días	mar 10/03/26	mar 17/03/26	54CC
56		Levantamiento e inventario de redes en campo (Planimétrico y altimétrico).	4 días	mar 10/03/26	vie 13/03/26	54CC
57		Verificación de existencia y funcionamiento de redes.	4 días	mar 10/03/26	vie 13/03/26	56CC
58		Consolidado de información y redes existentes.	2 días	lun 16/03/26	mar 17/03/26	57
59		Identificación de interferencias y condicionantes para el diseño.	2 días	lun 16/03/26	mar 17/03/26	58CC
60		Compatibilización con el diseño vial y definición de criterios de intervención.	3 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26	58CC
61		Diseño definitivo de redes de acueducto	4 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	60
62		Elaboración de productos de diseño,	4 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	61CC
63		Control de calidad técnico posterior a entrega	3 días	mié 25/03/26	vie 27/03/26	62
64		***AMBIENTAL***	**10 días**	***lun 9/03/26***	**vie 20/03/26**	
65		Planificación y metodología.	2 días	lun 9/03/26	mar 10/03/26	
66		Diagnostico socioambiental preliminar.	3 días	lun 9/03/26	mié 11/03/26	65CC
67		Revisión de información secundaria y marco normativo.	4 días	lun 9/03/26	jue 12/03/26	65CC
68		Identificación y evaluación de impactos ambientales potenciales.	3 días	vie 13/03/26	mar 17/03/26	67
69		Estructuración de la guía de manejo ambiental.	3 días	mié 18/03/26	vie 20/03/26	68
70		***SOCIAL***	**15 días**	***lun 9/02/26***	**vie 27/02/26**	
71		Diagnostico Zona de Influencia Directa del Proyecto.	3 días	lun 9/02/26	mié 11/02/26	
72		Censo de Inmuebles.	6 días	jue 12/02/26	jue 19/02/26	71

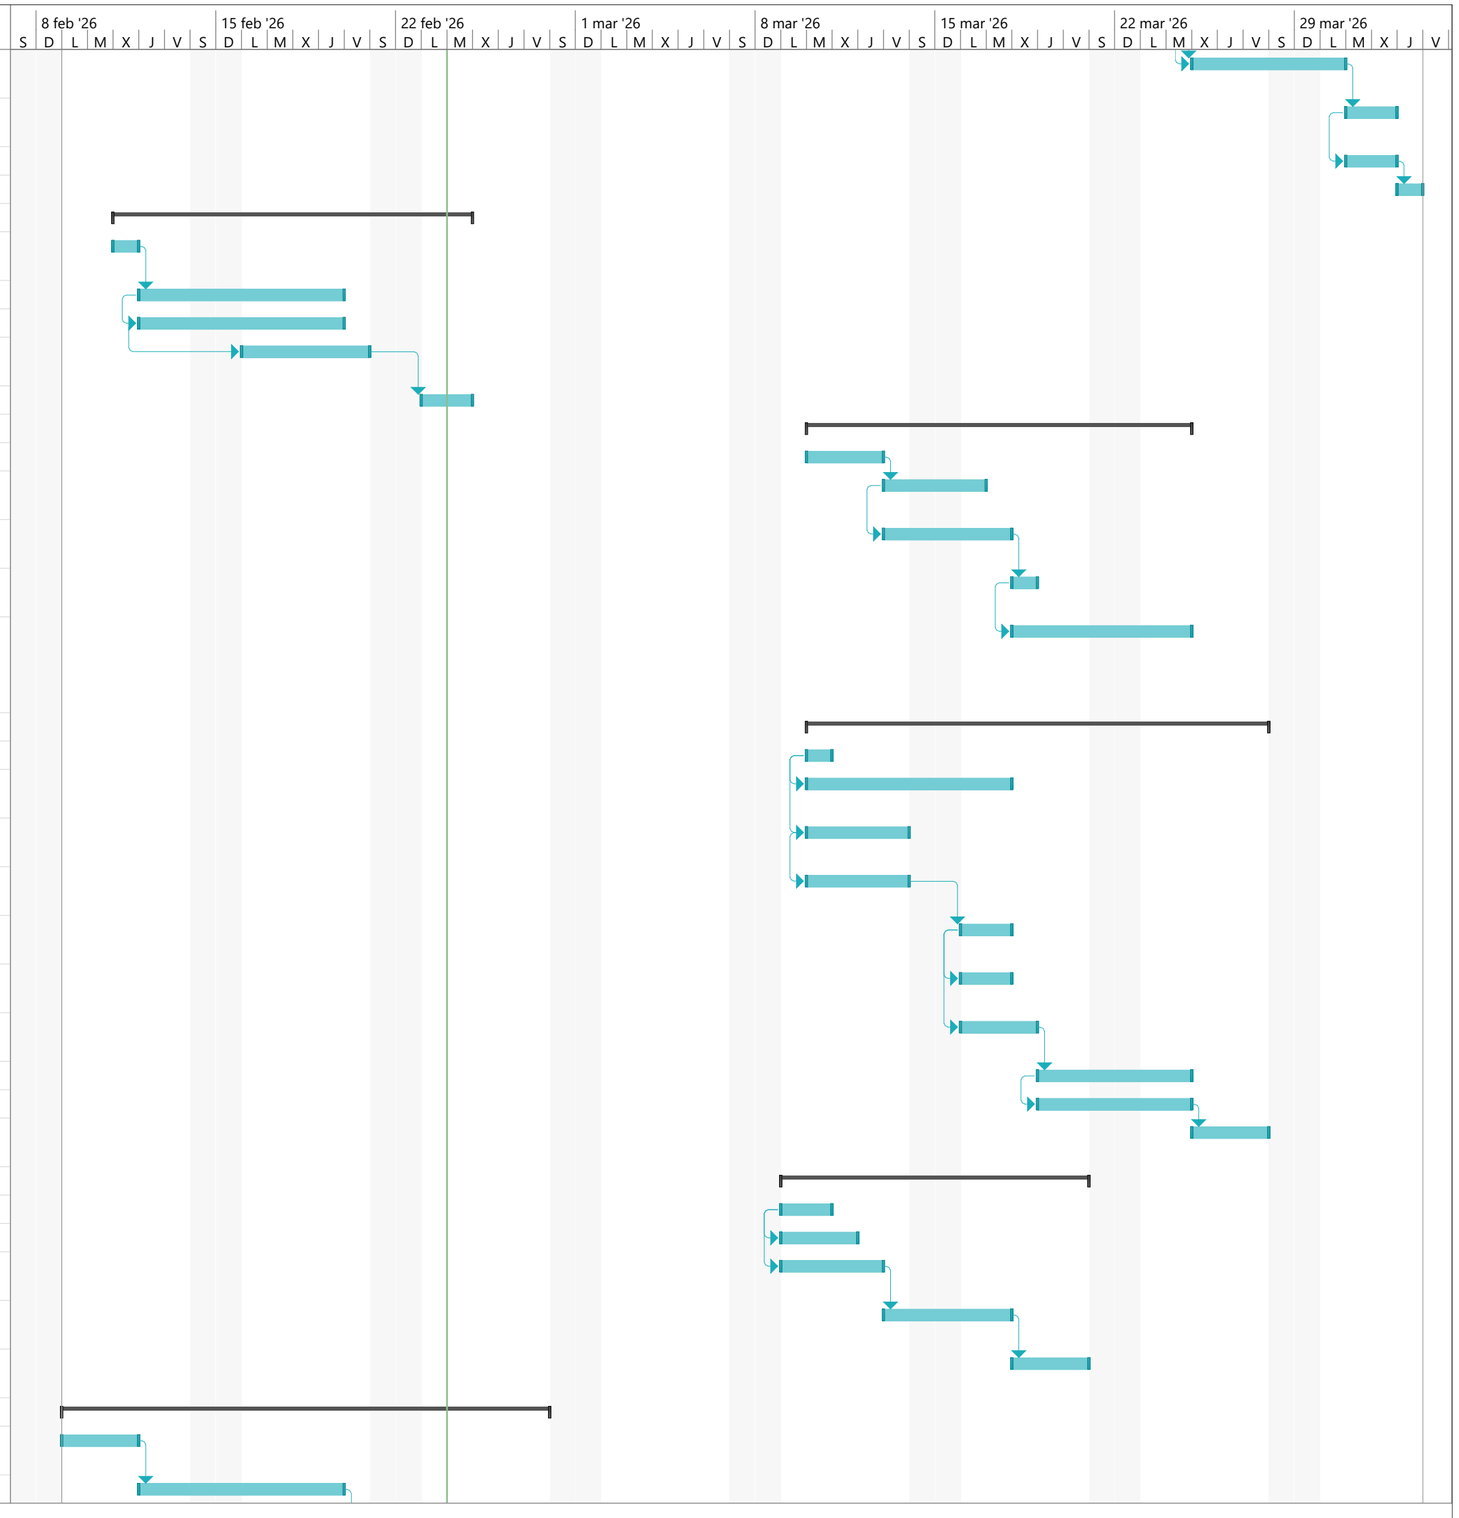

Proyecto: CRONOGRAMA FASE
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
73		Base de Datos de Actores.	2 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	72
74		Análisis de impactos positivos y negativos durante la fase de estudios y	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	73
75		Identificación de afectaciones temporale	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26	74
76		Evaluación del nivel de sencibilidad social del territorio.	1 día	jue 26/02/26	jue 26/02/26	75
77		Priorización de impactos según magnitud, duración y población	1 día	vie 27/02/26	vie 27/02/26	76
78		Diseño de programas sociales alineados con la normatividad distrital y	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	73
79		Definición de medidas de manejo social.	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	78CC
80		Consolidado documento plan de gestión social.	4 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	78CC
81		***PAVIMENTOS***	**7 días**	***lun 9/03/26***	**mar 17/03/26**	
82		Revisión y análisis de información existente.	2 días	lun 9/03/26	mar 10/03/26	
83		Inventario y diagnostico de la infraestructura existente.	3 días	lun 9/03/26	mié 11/03/26	82CC
84		Resultados de la exploración geotécnica existente y complementaria.	3 días	lun 9/03/26	mié 11/03/26	82CC
85		Definición de lineamientos generales de diseño.	1 día	jue 12/03/26	jue 12/03/26	84
86		Dimensionamiento estructural.	3 días	vie 13/03/26	mar 17/03/26	85
87		Estructuración informe técnico final.	4 días	jue 12/03/26	mar 17/03/26	85CC
88		Elaboración planos de detalle.	4 días	jue 12/03/26	mar 17/03/26	85CC

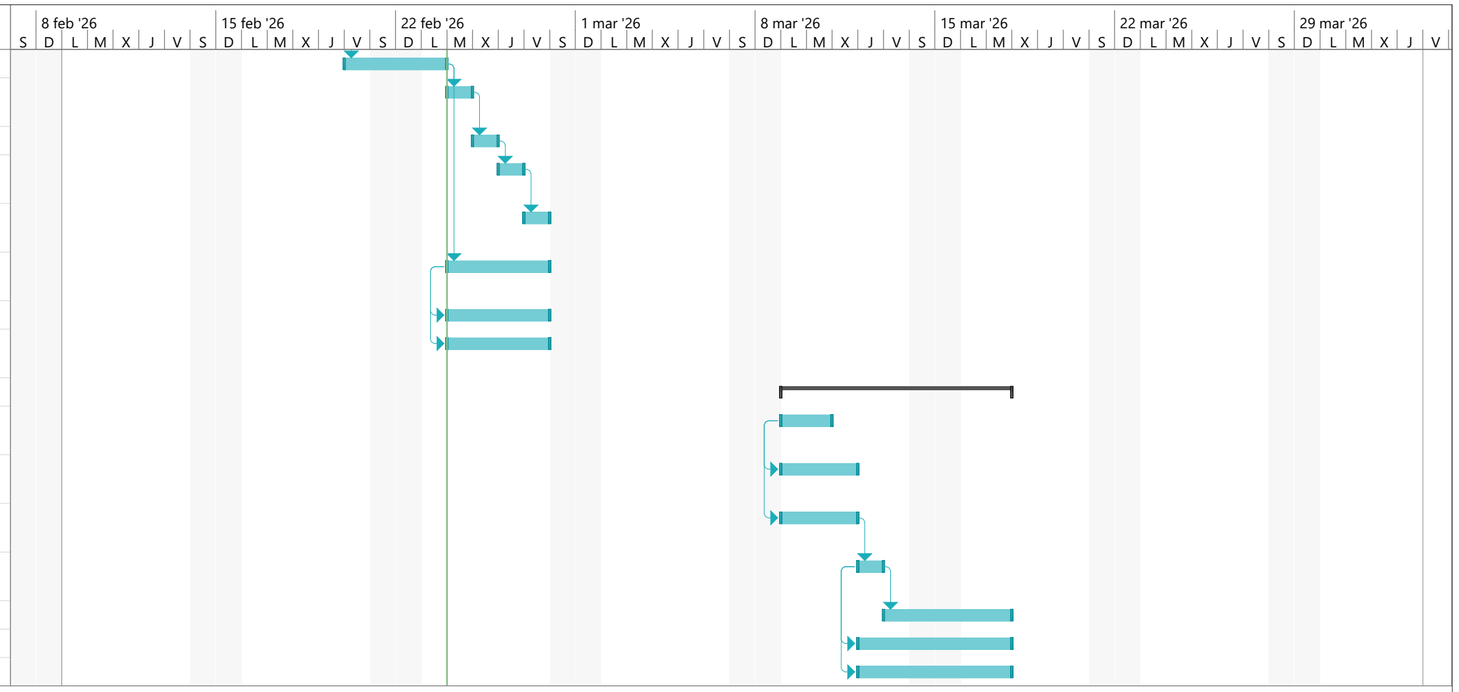

Proyecto: CRONOGRAMA FASE
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
