

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**FASE 2**	**41 días**	**lun 16/02/26**	**lun 13/04/26**	
2		***TOPOGRAFIA***	**23 días**	**lun 16/02/26**	**mié 18/03/26**	
3		Visita de reconocimiento	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	
4		Traslados de BMs	4 días	mié 18/02/26	lun 23/02/26	3
5		Georreferenciación (Receptor GNSS)				
6		Levantamiento topográfico detallado en campo	3 días	mar 24/02/26	jue 26/02/26	4
7		Estudios topográficos para redes de servicios públicos	3 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	6
8		Procesamiento, cálculo y control de calidad	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	7
9		Elaboración de productos topográficos	4 días	lun 9/03/26	jue 12/03/26	8
10		Consolidación y entrega final	4 días	vie 13/03/26	mié 18/03/26	9
11		***GEOMETRÍA***	**9 días**	***mar 24/03/26***	**vie 3/04/26**	
12		Diseño geometrico en planta perfil	5 días	mar 24/03/26	lun 30/03/26	6FC+17 días
13		Diseño de secciones transversales y cotas de pavimento	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26	12
14		Elaboración de planos	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26	13
15		Elaboracion y entrega de Anexos - Presentación e informe Ejecutivo	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26	14
16		***URBANISMO***	**10 días**	***lun 30/03/26***	**vie 10/04/26**	
17		Diagnostico Urbano de las vías	1 día	lun 30/03/26	lun 30/03/26	12FC-1 día
18		Esquema básico	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26	17
19		Anteproyecto de diseño	3 días	mié 1/04/26	vie 3/04/26	18
20		Proyecto de diseño definitivo	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	19
21		Cronograma y coordinación con otras especialidades	10 días	lun 30/03/26	vie 10/04/26	17CC
22		***TRÁNSITO***	**9 días**	***vie 13/03/26***	**mié 25/03/26**	
23		Caracterización De Las Condiciones De Operación Actuales De Transito En La Red Vial Del Área De Influencia.	1 día	vie 13/03/26	vie 13/03/26	
24		Carasterísticas del sistema vial y de transporte	1 día	vie 13/03/26	vie 13/03/26	23CC
25		Características Del Sistema Vial Y De Transporte.	1 día	vie 13/03/26	vie 13/03/26	23CC
26		Identificación de los puntos críticos e información secundaria del tránsito	1 día	vie 13/03/26	vie 13/03/26	23CC
27		Metodología Para La Toma De Información Primaria De Transito	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	26
28		Aforos Vehiculares Y Peatonales	2 días	mar 17/03/26	mié 18/03/26	27
29		Procesamiento y análisis gráfico de los aforos realizados, así como la información secundaria	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26	28CC+1 día
30		Estimación del volumen vehícular y peatonal generado y atraído por el proyecto	2 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26	29
31		Modelación de la red vial circundante con proyecto	2 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26	30CC
32		Modelación de la red vial circundante con proyección a 5, 10 y 20 años, teniendo en cuenta el desarrollo de las etapas del proyecto y los planes viales	3 días	vie 20/03/26	mar 24/03/26	30CC
33		Diseño de señalización	3 días	lun 23/03/26	mié 25/03/26	32CC+1 día
34		Diseño plan de manejo de tránsito	2 días	lun 23/03/26	mar 24/03/26	32CC+1 día
35		***ESTRUCTURAS***	**7 días**	***vie 3/04/26***	**lun 13/04/26**	
36		Revisión de información y diagnóstico inicial	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26	

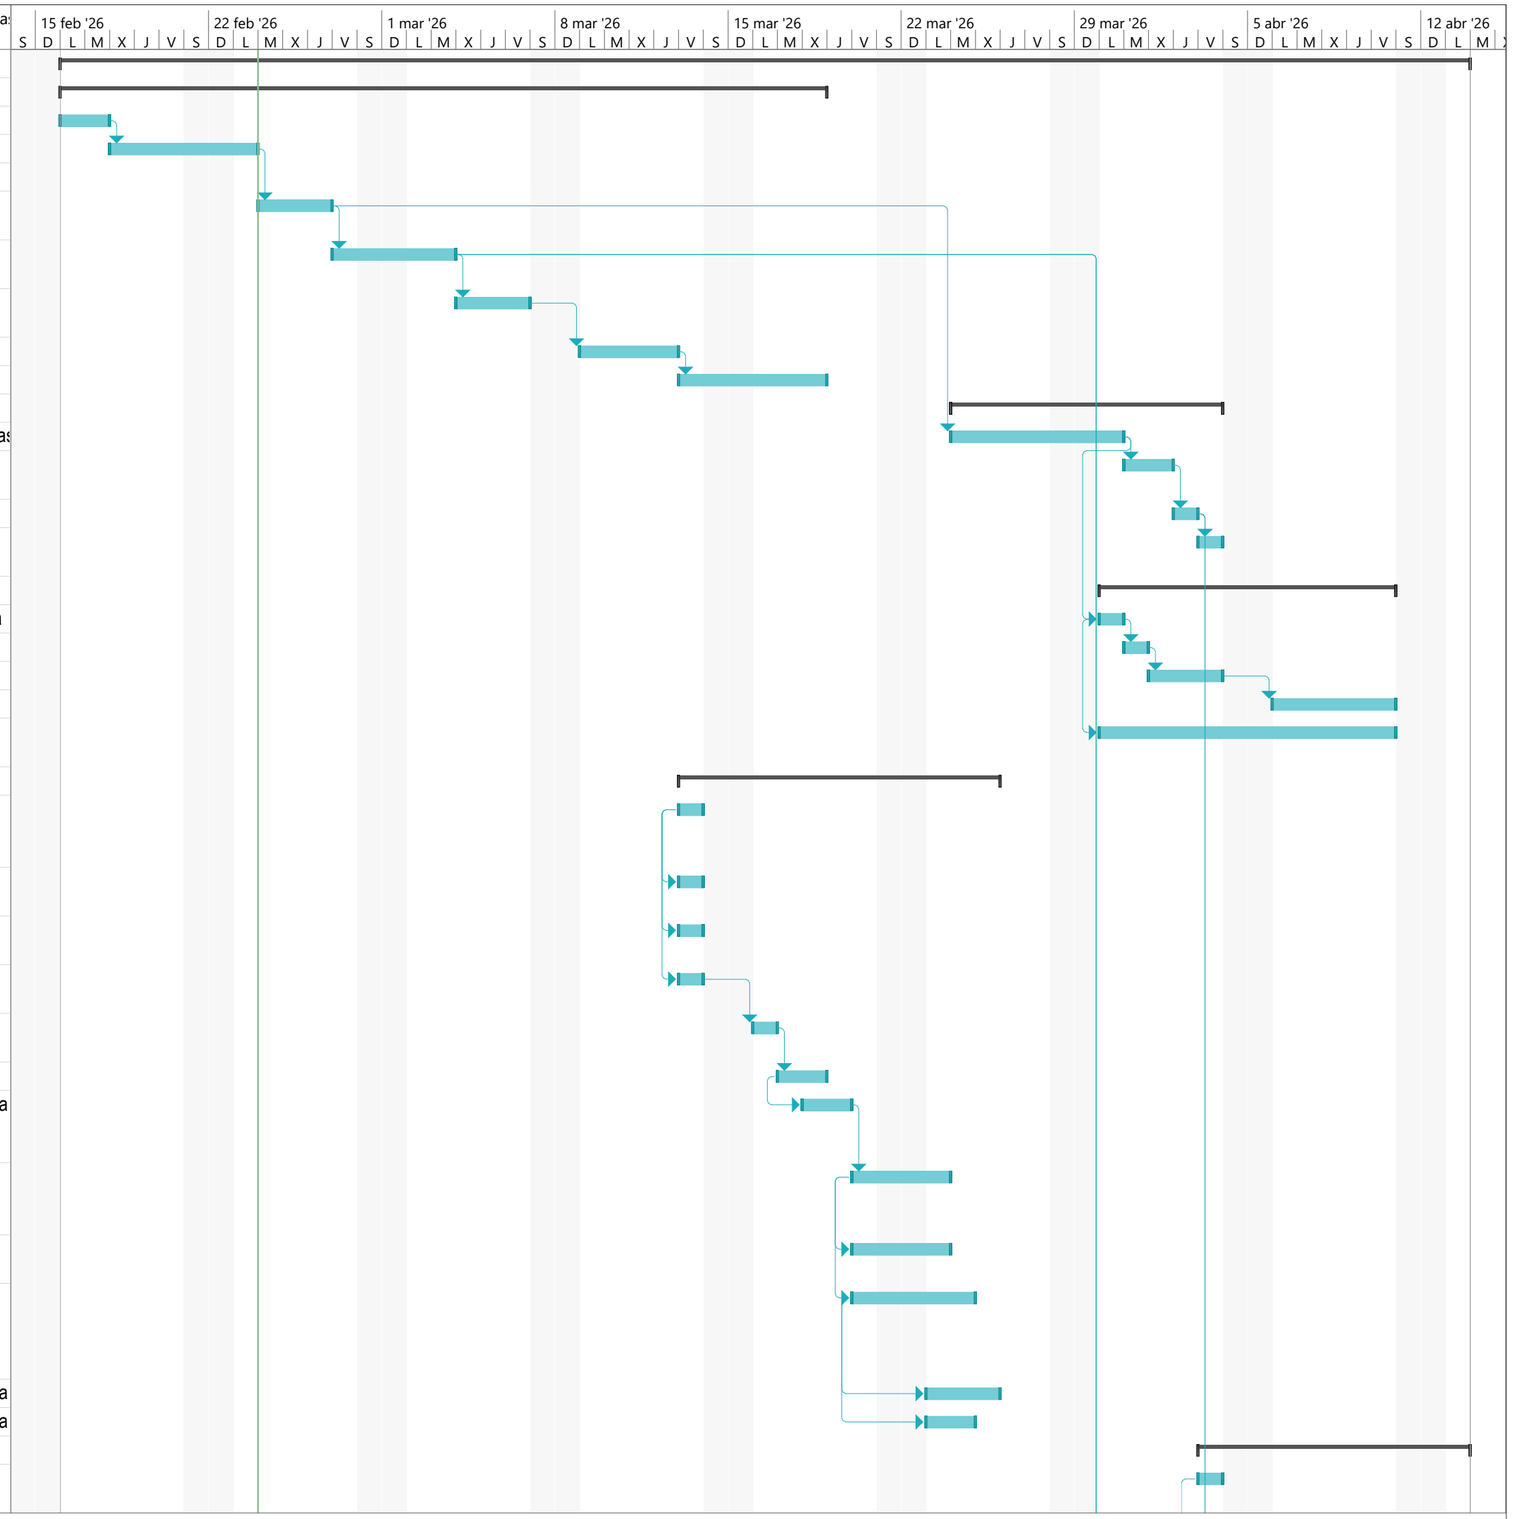

Proyecto: CRONOGRAMA FASE
Fecha: mar 24/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
37		Estudios y Diseños estructurales de drenaje y estructuras de contención	4 días	vie 3/04/26	mié 8/04/26	36CC;14
38		Elaboración del informe técnico de memorias de diseño estructural	2 días	jue 9/04/26	vie 10/04/26	37
39		Planos y detalles estructurales	2 días	jue 9/04/26	vie 10/04/26	38CC
40		Entrega informe estructural	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	39
41		***GEOTECNIA***	**13 días**	***mié 25/02/26***	**vie 13/03/26**	
42		Reconocimiento preliminar e inspección en campo.	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26	
43		Exploración directa o indirecta en campc	6 días	jue 26/02/26	jue 5/03/26	42
44		Ensayos IN-SITU.	6 días	jue 26/02/26	jue 5/03/26	43CC
45		Caracterización de muestras alteradas e inalteradas.	7 días	lun 2/03/26	mar 10/03/26	44CC+2 días
46		Elaboración de informe geotécnico	3 días	mié 11/03/26	vie 13/03/26	45
47		***REDES SECAS***	**11 días**	***mié 25/03/26***	**mié 8/04/26**	
48		Recopilación de información.	3 días	mié 25/03/26	vie 27/03/26	
49		Levantamiento en campo de redes existentes.	2 días	lun 30/03/26	mar 31/03/26	48;7
50		Investigación y análisis de información redes secas recopiladas	3 días	lun 30/03/26	mié 1/04/26	49CC
51		Integración de planos digitalizados de redes secas existentes.	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26	50
52		Diseño de redes secas (redes de energía eléctrcia, redes de telecomunicaciones, redes de alumbrado público, redes de gas	5 días	jue 2/04/26	mié 8/04/26	51CC
53		***HIDRÁULICA***	**9 días**	***sáb 28/03/26***	**jue 9/04/26**	
54		Planeación y coordinación institucional.	1 día	sáb 28/03/26	sáb 28/03/26	
55		Recopilación y revisión de información secundaria.	4 días	lun 30/03/26	jue 2/04/26	54CC
56		Levantamiento e inventario de redes en campo (Planimétrico y altimétrico).	4 días	lun 30/03/26	jue 2/04/26	54CC;7
57		Verificación de existencia y funcionamiento de redes.	3 días	lun 30/03/26	mié 1/04/26	56CC
58		Consolidado de información y redes existentes.	2 días	jue 2/04/26	vie 3/04/26	57
59		Identificación de interferencias y condicionantes para el diseño.	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26	58CC
60		Compatibilización con el diseño vial y definición de criterios de intervención.	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26	58CC;14
61		Diseño definitivo de redes de acueducto	2 días	lun 6/04/26	mar 7/04/26	60
62		Elaboración de productos de diseño,	2 días	mar 7/04/26	mié 8/04/26	61CC
63		Control de calidad técnico posterior a entrega	1 día	jue 9/04/26	jue 9/04/26	62
64		***AMBIENTAL***	**10 días**	***lun 23/03/26***	**vie 3/04/26**	
65		Planificación y metodología.	2 días	lun 23/03/26	mar 24/03/26	
66		Diagnostico socioambiental preliminar.	3 días	lun 23/03/26	mié 25/03/26	65CC
67		Revisión de información secundaria y marco normativo.	4 días	lun 23/03/26	jue 26/03/26	65CC
68		Identificación y evaluación de impactos ambientales potenciales.	3 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	67
69		Estructuración de la guía de manejo ambiental.	3 días	mié 1/04/26	vie 3/04/26	68
70		***SOCIAL***	**6 días**	***dom 1/03/26***	**lun 9/03/26**	
71		Diagnostico Zona de Influencia Directa del Proyecto.				
72		Censo de Inmuebles.				

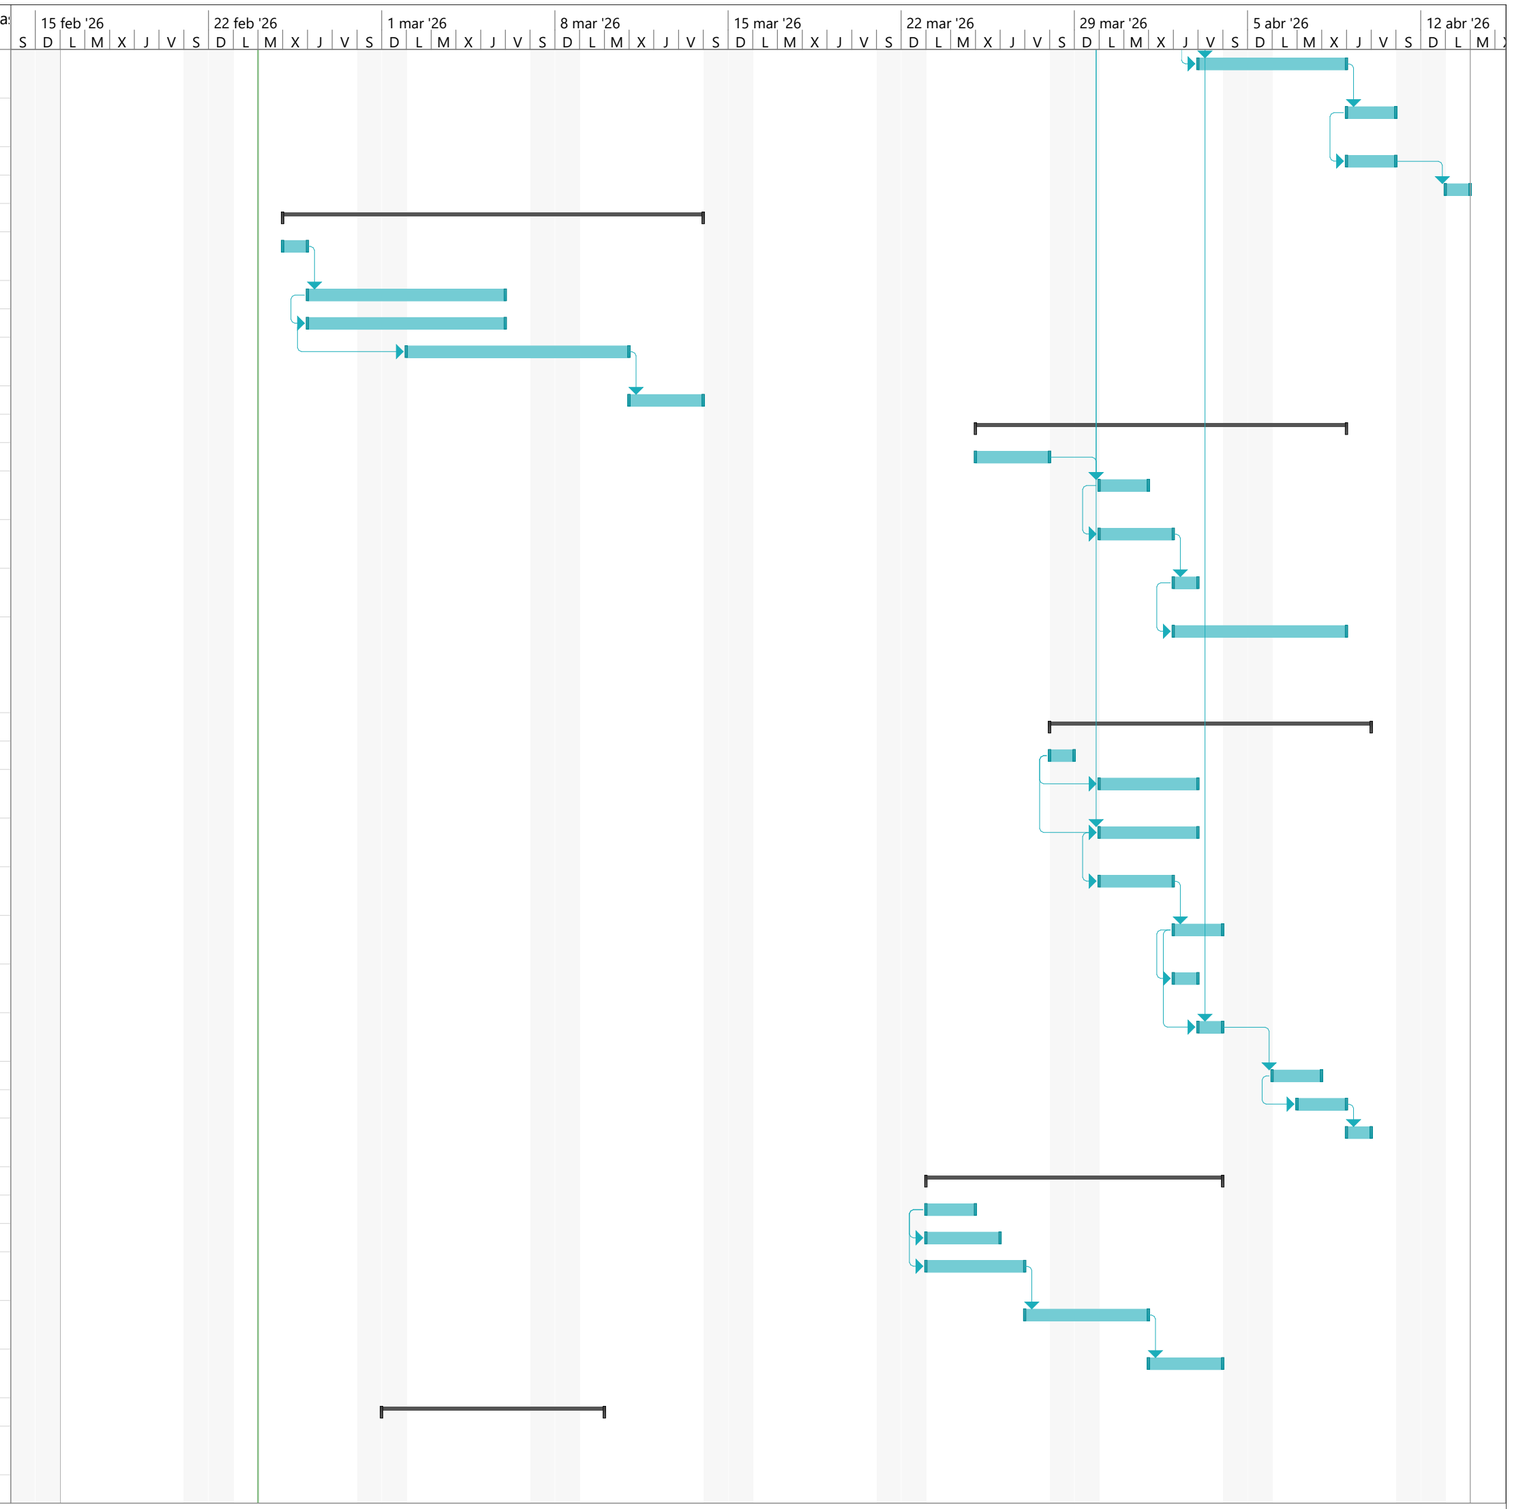

Proyecto: CRONOGRAMA FASE
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
73		Base de Datos de Actores.				
74		Análisis de impactos positivos y negativos durante la fase de estudios y	1 día	dom 1/03/26	dom 1/03/26	
75		Identificación de afectaciones temporale	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	74
76		Evaluación del nivel de sencibilidad social del territorio.	1 día	mar 3/03/26	mar 3/03/26	75
77		Priorización de impactos según magnitud, duración y población	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	76
78		Diseño de programas sociales alineados con la normatividad distrital y	4 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	75
79		Definición de medidas de manejo social.	5 días	mar 3/03/26	lun 9/03/26	78CC
80		Consolidado documento plan de gestión social.	5 días	mar 3/03/26	lun 9/03/26	78CC
81		***PAVIMENTOS***	**8 días**	***mié 18/03/26***	**vie 27/03/26**	
82		Revisión y análisis de información existente.	2 días	mié 18/03/26	jue 19/03/26	
83		Inventario y diagnostico de la infraestructura existente.	3 días	mié 18/03/26	vie 20/03/26	82CC
84		Resultados de la exploración geotécnica existente y complementaria.	3 días	mié 18/03/26	vie 20/03/26	82CC
85		Definición de lineamientos generales de diseño.	1 día	lun 23/03/26	lun 23/03/26	84
86		Dimensionamiento estructural.	3 días	mar 24/03/26	jue 26/03/26	85
87		Estructuración informe técnico final.	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	85CC
88		Elaboración planos de detalle.	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	85CC

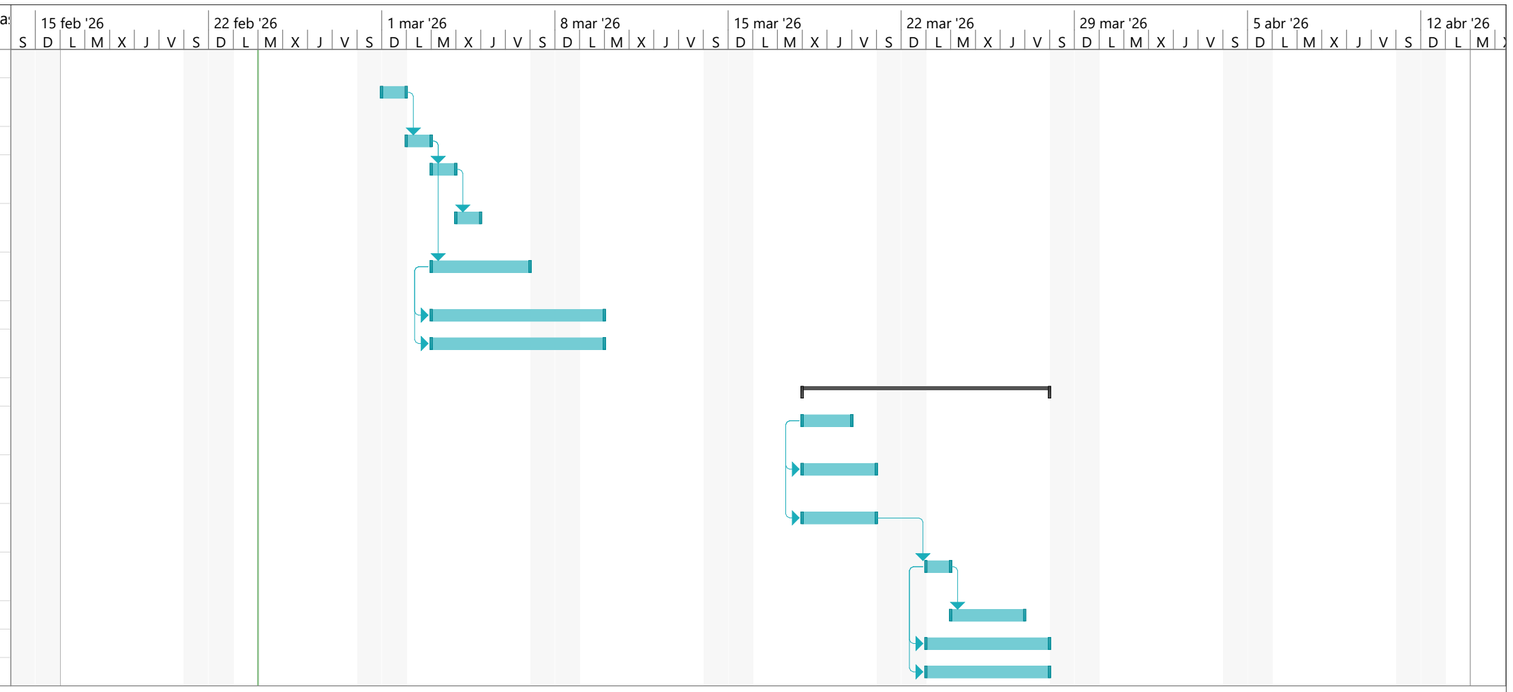

Proyecto: CRONOGRAMA FASE
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
