

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**FASE 3**	**47 días?**	**jue 19/02/26**	**vie 24/04/26**	
2		***TOPOGRAFIA***	**23 días?**	**jue 19/02/26**	**lun 23/03/26**	
3		Visita de reconocimiento	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	
4		Traslados de BMs	4 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26	3
5		Georreferenciación (Receptor GNSS)	1 día?	jue 19/02/26	jue 19/02/26	
6		Levantamiento topográfico detallado en campo	3 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	4
7		Estudios topográficos para redes de servicios públicos	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	6
8		Procesamiento, cálculo y control de calidad	3 días	lun 9/03/26	mié 11/03/26	7
9		Elaboración de productos topográficos	4 días	jue 12/03/26	mar 17/03/26	8
10		Consolidación y entrega final	4 días	mié 18/03/26	lun 23/03/26	9
11		***GEOMETRÍA***	**3 días**	***mié 8/04/26***	**vie 10/04/26**	
12		Diseño geometrico en planta perfil	3 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26	6FC+15 días
13		Diseño de secciones transversales y cotas de pavimento	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	12CC+2 días
14		Elaboración de planos	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	13CC
15		Elaboracion y entrega de Anexos - Presentación e informe Ejecutivo	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	14CC
16		***URBANISMO***	**11 días**	***vie 10/04/26***	**vie 24/04/26**	
17		Diagnostico Urbano de las vías	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	12FC-1 día
18		Esquema básico	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	17
19		Anteproyecto de diseño	4 días	mar 14/04/26	vie 17/04/26	18
20		Proyecto de diseño definitivo	5 días	lun 20/04/26	vie 24/04/26	19
21		Cronograma y coordinación con otras especialidades	11 días	vie 10/04/26	vie 24/04/26	17CC
22		***TRÁNSITO***	**7 días**	***jue 26/03/26***	**vie 3/04/26**	
23		Caracterización De Las Condiciones De Operación Actuales De Transito En La Red Vial Del Área De Influencia.	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26	
24		Carasterísticas del sistema vial y de transporte	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26	23CC
25		Características Del Sistema Vial Y De Transporte.	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26	23CC
26		Identificación de los puntos críticos e información secundaria del tránsito	1 día	jue 26/03/26	jue 26/03/26	23CC
27		Metodología Para La Toma De Información Primaria De Transito	1 día	vie 27/03/26	vie 27/03/26	26
28		Aforos Vehiculares Y Peatonales	2 días	lun 30/03/26	mar 31/03/26	27
29		Procesamiento y análisis gráfico de los aforos realizados, así como la información secundaria	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26	28CC+1 día
30		Estimación del volumen vehícular y peatonal generado y atraído por el proyecto	2 días	mié 1/04/26	jue 2/04/26	29
31		Modelación de la red vial circundante con proyecto	2 días	mié 1/04/26	jue 2/04/26	30CC
32		Modelación de la red vial circundante con proyección a 5, 10 y 20 años, teniendo en cuenta el desarrollo de las etapas del proyecto y los planes viales	3 días	mié 1/04/26	vie 3/04/26	30CC
33		Diseño de señalización	2 días	jue 2/04/26	vie 3/04/26	32CC+1 día
34		Diseño plan de manejo de tránsito	2 días	jue 2/04/26	vie 3/04/26	32CC+1 día

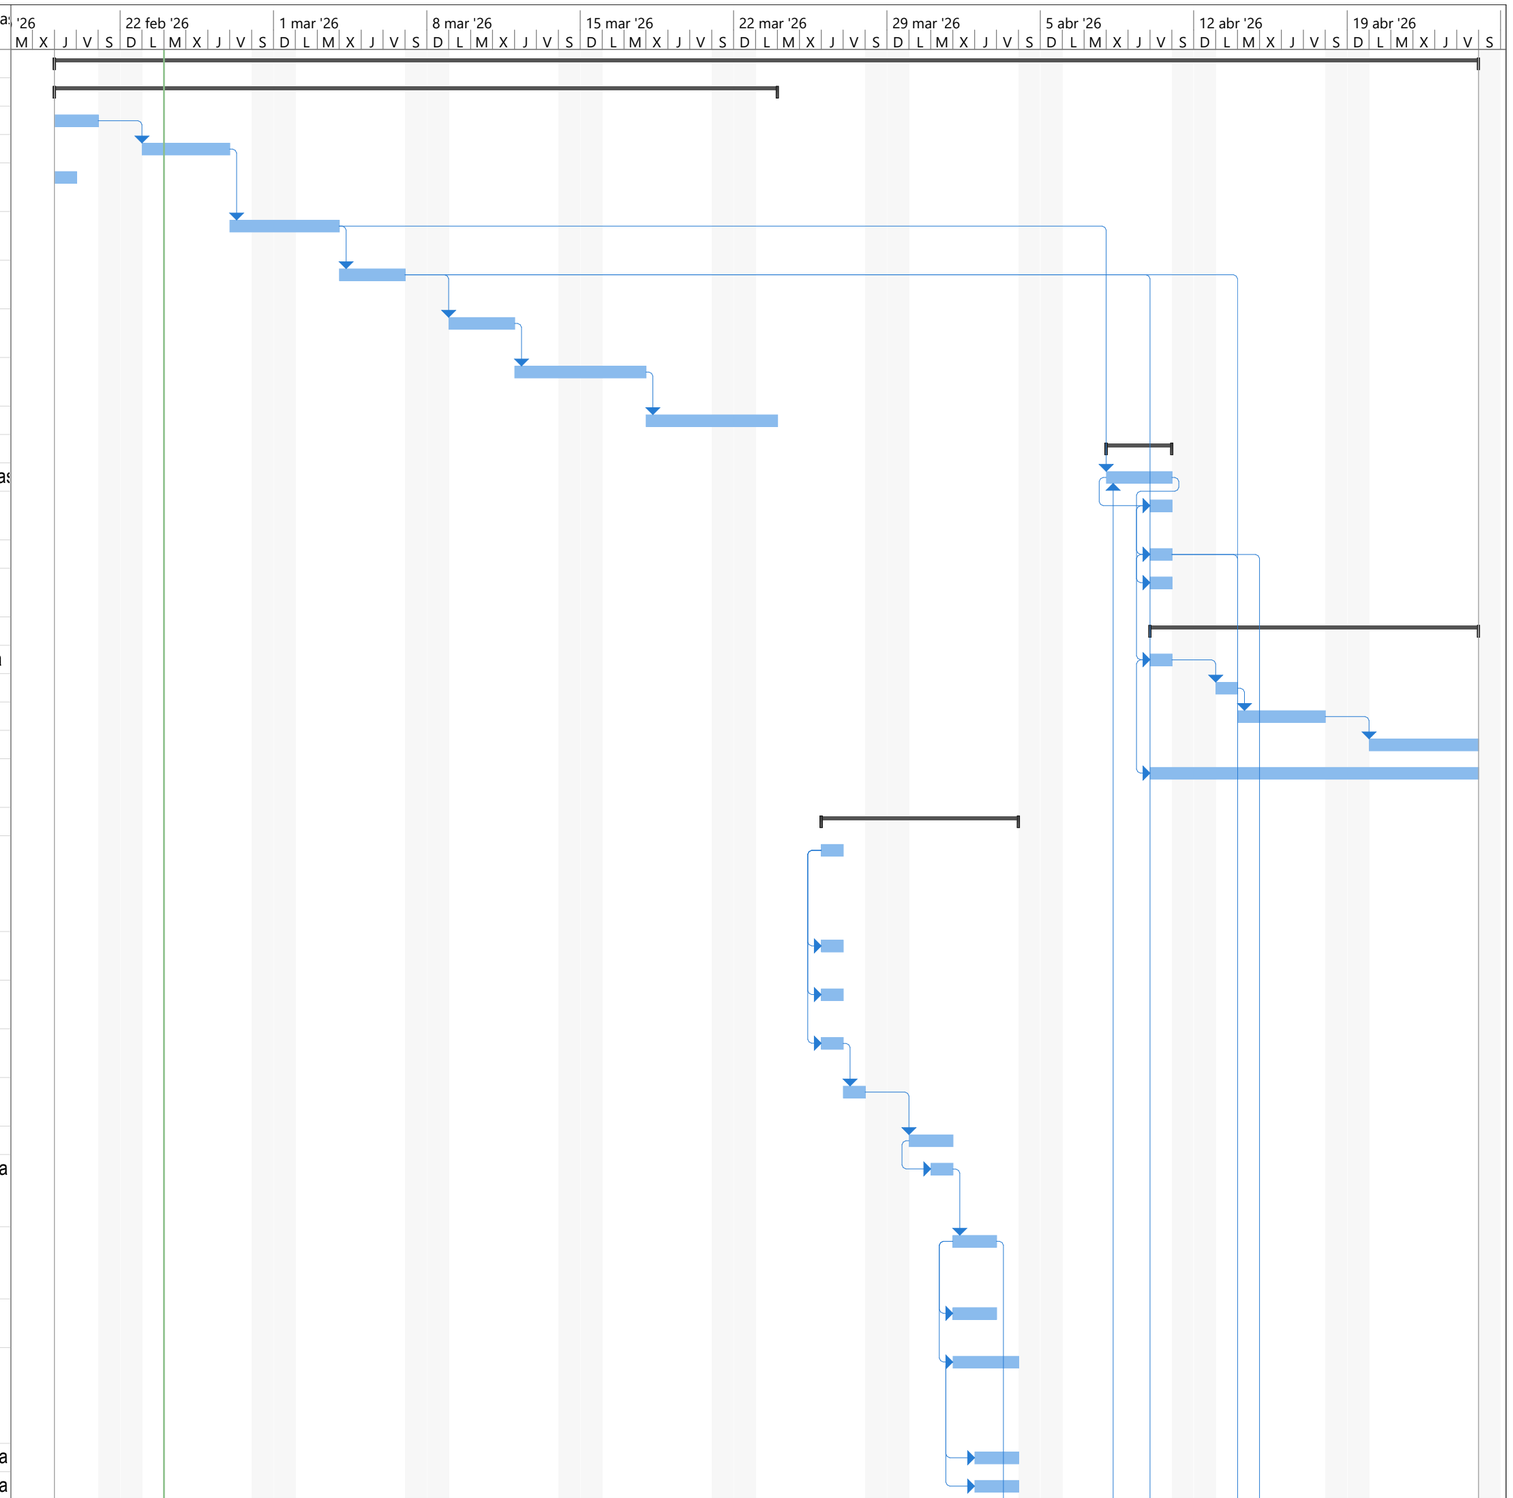

Proyecto: CRONOGRAMA FASE
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
35		***ESTRUCTURAS***	**9 días**	***mar 14/04/26***	**vie 24/04/26**	
36		Revisión de información y diagnóstico inicial	1 día	mar 14/04/26	mar 14/04/26	
37		Estudios y Diseños estructurales de drenaje y estructuras de contención	4 días	mar 14/04/26	vie 17/04/26	36CC;14
38		Elaboración del informe técnico de memorias de diseño estructural	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	37
39		Planos y detalles estructurales	4 días	lun 20/04/26	jue 23/04/26	38CC
40		Entrega informe estructural	1 día	vie 24/04/26	vie 24/04/26	39
41		***GEOTECNIA***	**8 días**	***lun 16/03/26***	**mié 25/03/26**	
42		Reconocimiento preliminar e inspección en campo.	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	
43		Exploración directa o indirecta en campo	4 días	mar 17/03/26	vie 20/03/26	42
44		Ensayos IN-SITU.	4 días	mar 17/03/26	vie 20/03/26	43CC
45		Caracterización de muestras alteradas e inalteradas.	3 días	jue 19/03/26	lun 23/03/26	44CC+2 días
46		Elaboración de informe geotécnico	2 días	mar 24/03/26	mié 25/03/26	45
47		***REDES SECAS***	**10 días**	***jue 9/04/26***	**mié 22/04/26**	
48		Recopilación de información.	3 días	jue 9/04/26	lun 13/04/26	
49		Levantamiento en campo de redes existentes.	2 días	mar 14/04/26	mié 15/04/26	48;7
50		Investigación y análisis de información redes secas recopiladas	3 días	mar 14/04/26	jue 16/04/26	49CC
51		Integración de planos digitalizados de redes secas existentes.	1 día	vie 17/04/26	vie 17/04/26	50
52		Diseño de redes secas (redes de energía eléctrcia, redes de telecomunicaciones, redes de alumbrado público, redes de gas	4 días	vie 17/04/26	mié 22/04/26	51CC
53		***HIDRÁULICA***	**9 días**	***vie 10/04/26***	**mié 22/04/26**	
54		Planeación y coordinación institucional.	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	
55		Recopilación y revisión de información secundaria.	4 días	vie 10/04/26	mié 15/04/26	54CC
56		Levantamiento e inventario de redes en campo (Planimétrico y altimétrico).	4 días	vie 10/04/26	mié 15/04/26	54CC;7
57		Verificación de existencia y funcionamiento de redes.	3 días	vie 10/04/26	mar 14/04/26	56CC
58		Consolidado de información y redes existentes.	2 días	mié 15/04/26	jue 16/04/26	57
59		Identificación de interferencias y condicionantes para el diseño.	2 días	mié 15/04/26	jue 16/04/26	58CC
60		Compatibilización con el diseño vial y definición de criterios de intervención.	2 días	mié 15/04/26	jue 16/04/26	58CC;14
61		Diseño definitivo de redes de acueducto	3 días	vie 17/04/26	mar 21/04/26	60
62		Elaboración de productos de diseño,	3 días	vie 17/04/26	mar 21/04/26	61CC
63		Control de calidad técnico posterior a entrega	1 día	mié 22/04/26	mié 22/04/26	62
64		***AMBIENTAL***	**11 días**	***vie 3/04/26***	**vie 17/04/26**	
65		Planificación y metodología.	2 días	vie 3/04/26	lun 6/04/26	
66		Diagnostico socioambiental preliminar.	3 días	vie 3/04/26	mar 7/04/26	65CC
67		Revisión de información secundaria y marco normativo.	4 días	vie 3/04/26	mié 8/04/26	65CC
68		Identificación y evaluación de impactos ambientales potenciales.	4 días	jue 9/04/26	mar 14/04/26	67
69		Estructuración de la guía de manejo ambiental.	3 días	mié 15/04/26	vie 17/04/26	68
70		***SOCIAL***	**22 días**	***jue 19/02/26***	**vie 20/03/26**	

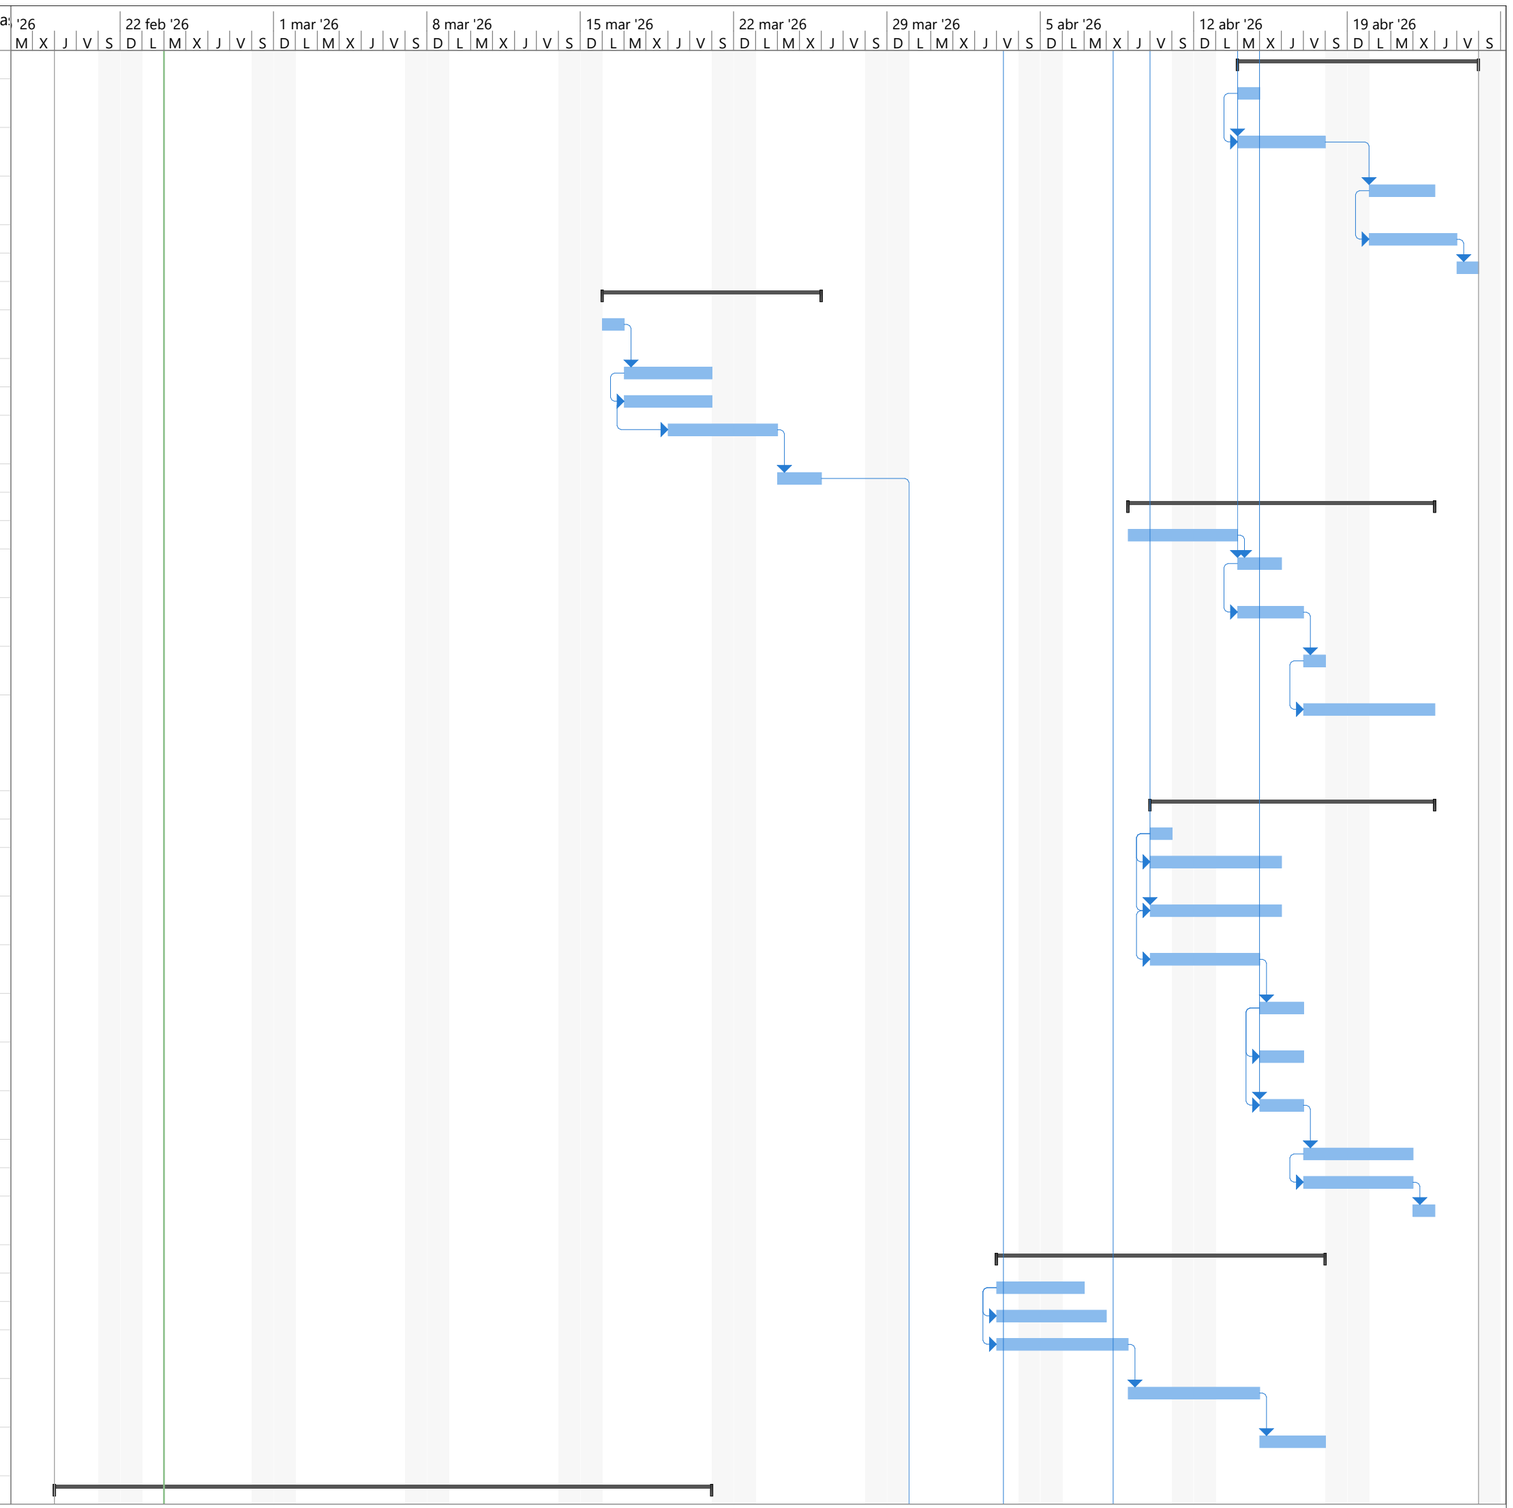

Proyecto: CRONOGRAMA FASE
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
71			Diagnostico Zona de Influencia Directa del Proyecto.	0 días	jue 19/02/26	jue 19/02/26	
72			Censo de Inmuebles.	0 días	jue 19/02/26	jue 19/02/26	
73			Base de Datos de Actores.	0 días	jue 19/02/26	jue 19/02/26	
74			Análisis de impactos positivos y negativos durante la fase de estudios y	2 días	lun 9/03/26	mar 10/03/26	
75			Identificación de afectaciones temporale	3 días	mié 11/03/26	vie 13/03/26	74
76			Evaluación del nivel de sencibilidad social del territorio.	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	75
77			Priorización de impactos según magnitud, duración y población	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26	76
78			Diseño de programas sociales alineados con la normatividad distrital y	4 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26	75
79			Definición de medidas de manejo social.	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	78CC
80			Consolidado documento plan de gestión social.	5 días	lun 16/03/26	vie 20/03/26	78CC
81			***PAVIMENTOS***	**10 días**	***lun 30/03/26***	**vie 10/04/26**	
82			Revisión y análisis de información existente.	2 días	lun 30/03/26	mar 31/03/26	46
83			Inventario y diagnostico de la infraestructura existente.	3 días	lun 30/03/26	mié 1/04/26	82CC
84			Resultados de la exploración geotécnica existente y complementaria.	4 días	lun 30/03/26	jue 2/04/26	82CC
85			Definición de lineamientos generales de diseño.	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26	84;30
86			Dimensionamiento estructural.	2 días	lun 6/04/26	mar 7/04/26	85
87			Estructuración informe técnico final.	6 días	vie 3/04/26	vie 10/04/26	85CC
88			Elaboración planos de detalle.	6 días	vie 3/04/26	vie 10/04/26	85CC

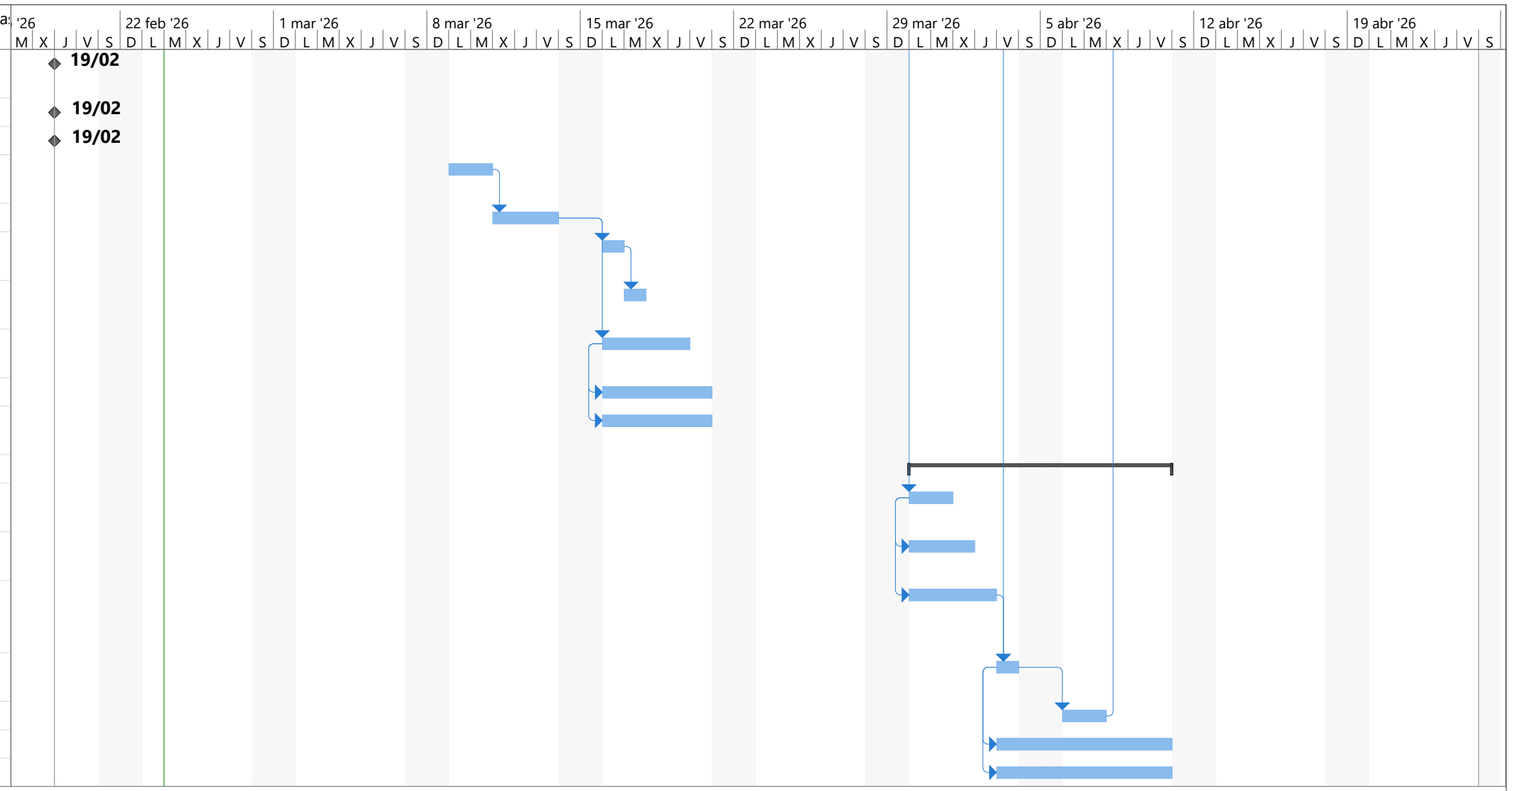

Proyecto: CRONOGRAMA FASE
Fecha: mar 24/02/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
