Número de Informe	01
Fecha del Informe	Febrero 2026
Período verificado	26 de enero al 28 de febrero de 2026
Supervisor/Interventor	**DAPHNE MORALES SOTO**

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	SYGMATECH S.A.S.		
CC- NIT	900.886.636-0		
Número de contrato:	237 de 2026		
Objeto:	Prestación de servicios para la actualización, soporte técnico, desarrollo y migración del software de procesamiento y liquidación de créditos condonables (MINOTAURO), el cual se encuentra alojado en el módulo de cartera, a los módulos de comités y reportes del mismo sistema de información perteneciente a la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín.		
Valor inicial:	Ciento sesenta millones trecientos veintidós mil quinientos doce pesos m/l ($160.322.512) IVA incluido.		
Valor Adición:	N/A	Fecha de Adición:	N/A
Valor Total del Contrato:	Ciento sesenta millones trecientos veintidós mil quinientos doce pesos m/l ($160.322.512) IVA incluido.		
Duración inicial:	Desde la fecha de inicio parametrizada en la plataforma SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2026		
Ampliaciones:	N/A		
Fecha de inicio:	26 de enero de 2026		
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2026		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA


Según lo dispone la Ley 1474 de 2011, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:


Se validó el informe presentado por el contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado comprendido entre el 26 de enero al 28 de febrero de 2026, previamente validadas y aprobadas por el Líder del proceso, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.

ENTREGA	DESCRIPCIÓN ENTREGA	% DE ENTREGA	PAGOS IVA INLCUIDO
Primera entrega	Plan de Trabajo o cronograma con las actividades del proyecto, donde se describirá de forma detallada los plazos de entrega de los avances de las obligaciones contractuales para la consecución de los pagos	**15%**	$ 24.048.377

El día 06 de febrero de 2026 se realizó reunión entre los representantes de SYGMATECH y SAPIENCIA (cartera y TI), en donde se fijaron todas las condiciones y plazos en los cuales se realizará todo el proyecto incluido en el contrato 237 de 2026.

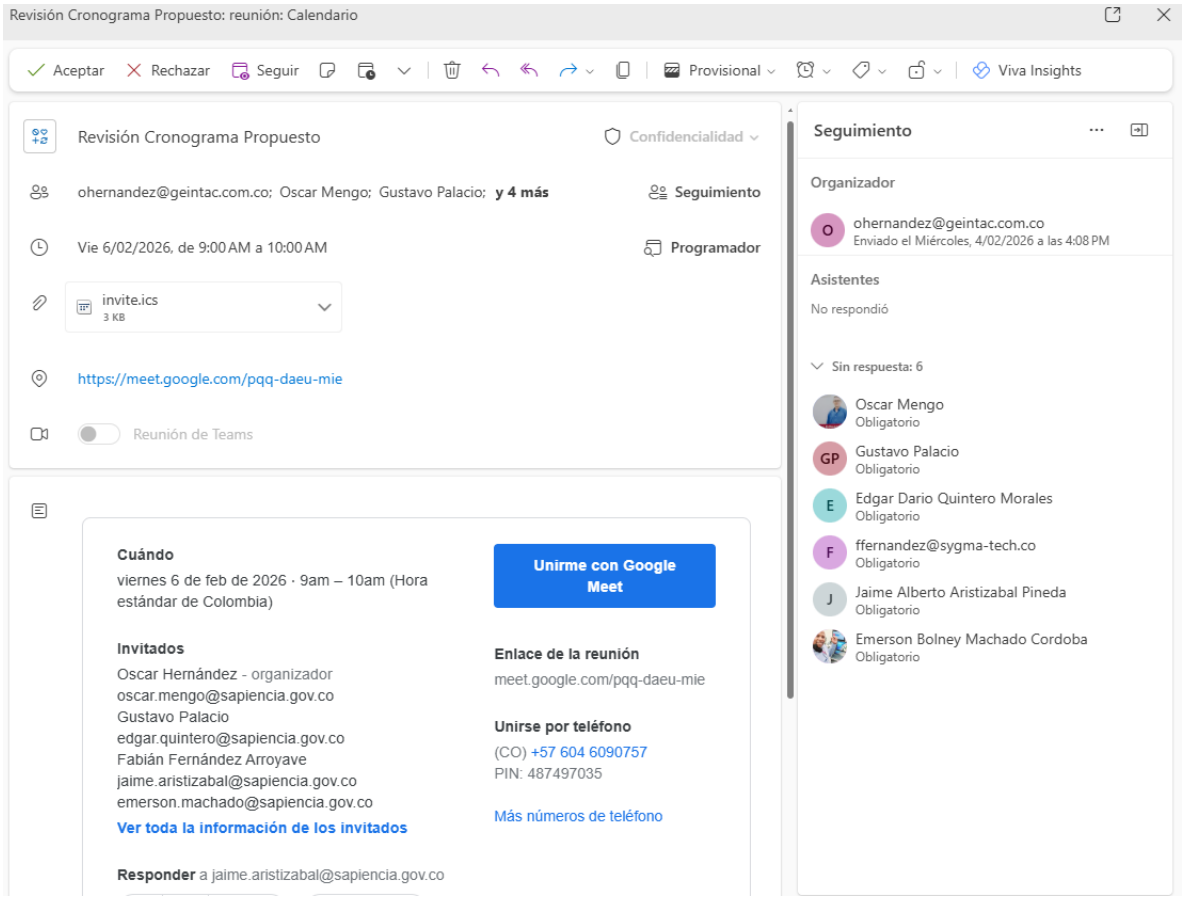

Este mismo día se entregó el cronograma de trabajo para la migración referida en el contrato 237 de 2026:

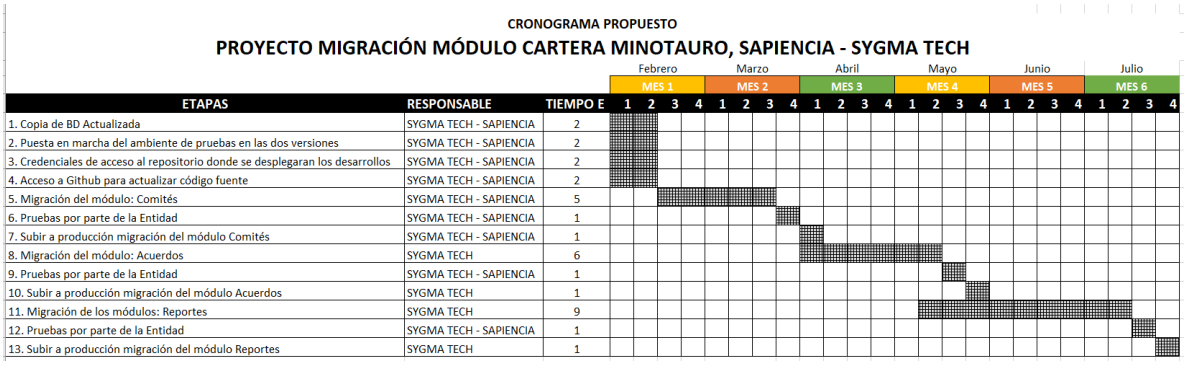

CRONOGRAMA PROPUESTO

PROYECTO MIGRACIÓN MÓDULO CARTERA MINOTAURO, SAPIENCIA - SYGMA TECH

			Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio			
			MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
ETAPAS	RESPONSABLE	TIEMPO E	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Copia de BD Actualizada	SYGMA TECH - SAPIENCIA	2																								
2. Puesta en marcha del ambiente de pruebas en las dos versiones	SYGMA TECH - SAPIENCIA	2																								
3. Credenciales de acceso al repositorio donde se desplegaran los desarrollos	SYGMA TECH - SAPIENCIA	2																								
4. Acceso a Github para actualizar código fuente	SYGMA TECH - SAPIENCIA	2																								
5. Migración del módulo: Comités	SYGMA TECH - SAPIENCIA	5																								
6. Pruebas por parte de la Entidad	SYGMA TECH - SAPIENCIA	1																								
7. Subir a producción migración del módulo Comités	SYGMA TECH - SAPIENCIA	1																								
8. Migración del módulo: Acuerdos	SYGMA TECH	6																								
9. Pruebas por parte de la Entidad	SYGMA TECH - SAPIENCIA	1																								
10. Subir a producción migración del módulo Acuerdos	SYGMA TECH	1																								
11. Migración de los módulos: Reportes	SYGMA TECH	9																								
12. Pruebas por parte de la Entidad	SYGMA TECH - SAPIENCIA	1																								
13. Subir a producción migración del módulo Reportes	SYGMA TECH	1																								

2.2 **COMPONENTE ADMINISTRATIVO:**

Durante la ejecución del contrato se ha efectuado un (1) reporte y el mismo número de informes de recibo a satisfacción, que se describen a continuación:

a) **Informes, seguimientos y actas:**

Se ha presentado (1) informe, correspondiente al siguiente periodo:

- 26 de enero al 28 de febrero de 2026.

b) **Modificaciones y/o alteraciones del contrato:**

- Suspensiones y reinicios

  N/A

- Modificaciones u otro si

  N/A

- Requerimientos y planes de mejoramiento

Al respecto de los mismos la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

c) **Estado del plazo del contrato**

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Fecha inicial: 26/01/2026
Ampliaciones: N/A
% Ejecución: 9,73% (al 28 febrero)

La fecha prevista para la terminación del mismo es el 31 de diciembre de 2025.

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) <u>Manejo de recursos</u>

El valor desembolsado al contratista se consigna en BBVA, CUENTA CORRIENTE 0241005057

b) <u>La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:</u>

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período
26 de enero al 28 de febrero de 2026	ST 1003	$24.048.377	15%
Valor total del contrato		$160.322.512	100%
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$24.048.377	15%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		$136.274.135	85%

VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($24.048.377).

2.4 COMPONENTE LEGAL:

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

a. <u>Multas o Sanciones</u>

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. <u>Garantías</u>

Póliza N° 4438476 de Seguros Sura:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	26/01/2026	01/07/2027	$16.032.251
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	26/01/2026	31/12/2029	$8.016.126
Calidad del servicio	26/01/2026	31/12/2027	$16.032.251

3 CONCLUSIONES

La suscrita supervisora del presente contrato, actuando según designación de SAPIENCIA, certifica que el contratista que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él contratista, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS

- Factura
- Parafiscales, Planilla de SS y documentos del contador
- Recibo a satisfacción
- Reporte de actividades

DAPHNE MORALES SOTO
SUPERVISORA

Elaboró: Apoyo Técnico a la Supervisión	Revisó: Apoyo Jurídico a la supervisión
Firma:	Firma:
Nombre: Jaime Alberto Aristizabal Pineda y Edgar Darío Quintero Morales	Nombre: Paulina Ríos Arce
