INFORMACIÓN GENERAL		
No. DE CONTRATO/CONVENIO	2488 de 2024	
OBJETO	PRESTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2194 DEL 2013 Y A LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PASTOS Y QUILLASINGAS	
CONTRATANTE	NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR	
NIT	830.114.475-6	
CONTRATISTA/CONVENIDO	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	
NIT	800.096.329-1	
REPRESENTANTE LEGAL (E)	IVAN ALIRIO RAMÍREZ RUSINQUE	
C.C.	1.136.879.425	
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	31/12/2024	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 40.000.000.000	
1 ADICIONES (si aplica)	N/A	
2 ADICIONES (si aplica)	N/A	
1 PRORROGAS (si aplica)	PRÓRROGA No. 1 del 29/10/2025 (del 30 de octubre de 2025 al 29 de marzo de 2026)	
SUSPENSIONES (si aplica)	N/A	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**FECHA**	**VALOR**
172824	8/11/2024	$ 40.000.000.000
TOTAL		**$ 40.000.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	**FECHA**	**VALOR**
699524	27/12/2024	$ 40.000.000.000
TOTAL		**$ 40.000.000.000**
SUPERVISIÓN		
NOMBRE	**ROQUELINA SABIS BLANCO MOSCARELLA**	
CARGO	**DIRECTORA ASUNTOS INDIGENAS ROM Y MINORIAS**	
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	**2231**	
FECHA	**3 DICIEMBRE 2024**	
GESTIÓN DE PAGOS/DESEMBOLSO DE APORTES		

CLAÚSULA SEXTA - DESEMBOLSOS: El Ministerio del Interior desembolsará el valor del presente contrato previa disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en un (1) único desembolso al patrimonio autónomo constituido por FINDETER S.A., para su administración, libre de impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse por la suscripción y registro del Contrato Interadministrativo. No obstante, de generarse alguno de ellos, deberá ser asumido con cargo a los recursos administrados por el patrimonio autónomo. La remuneración por la asistencia Técnica Integral y Administración de Recursos de FINDETER S.A., se realizará previa presentación de la cuenta de cobro avalada por el supervisor del contrato interadministrativo. Una vez cumplido lo anterior, la fiduciaria que administre el patrimonio autónomo podrá efectuar el pago a favor de FINDETER S.A

SEGUIMIENTO AL CONVENIO

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, según lo pactado, el contratista/convenido constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros del estado S.A como sigue:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
33-44-101257956 (Anexo 3)	Cumplimiento	$ 712.315.611,80	31/12/2024	29/09/2026
	Calidad del Servicio	$ 712.315.611,80	31/12/2024	29/09/2026
	Pago de salarios y prestaciones sociales indemnizaciones laborales	$ 178.078.902,95	31/12/2024	29/103/2029

A corte de 30 de noviembre de 2025 , no se han realizado pagos a Findeter por parte de la Fiduciaria con relación a la Asistencia Técnica prestada hasta la fecha, a continuación se detalla el estado de giros por este concepto.

Actividad / Hitos	%	CDP	Valor Total (Cláusula Quinta Parágrafo Segundo Contrato Interadministrativo)	No. FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO	VALOR NETO	FECHA DE PAGO
Costo Fijo Mensual 1	10,0%	172824	$ 326.157.806,00			326.157.806,00		
Costo Fijo Mensual 2	10,0%	172824	$ 326.157.806,00			326.157.806,00		
Costo Fijo Mensual 3	10,0%	172824	$ 326.157.806,00			326.157.806,00		
Costo Fijo Mensual 4	10,0%	172824	$ 326.157.806,00			326.157.806,00		
Costo Fijo Mensual 5	10,0%	172824	$ 326.157.806,00			326.157.806,00		
Costo Fijo Mensual 6	10,0%	172824	$ 326.157.806,00			326.157.806,00		
Costo Fijo Mensual 7	10,0%	172824	$ 326.157.806,00			326.157.806,00		
Costo Fijo Mensual 8	10,0%	172824	$ 326.157.806,00			326.157.806,00		
Costo Fijo Mensual 9	10,0%	172824	$ 326.157.806,00			326.157.806,00		
Costo Fijo Mensual 10	10,0%	172824	$ 326.157.806,00			326.157.806,00		
TOTAL	100,0%		$ 3.261.578.060,00		$ -	$ 3.261.578.060,00	$ -	

Página 1

Durante el pasado mes de octubre de 2025 se suscribió el Otrosí No. 1, correspondiente a la Prórroga No. 1 del Contrato Interadministrativo 2488 de 2024, solicitada por FINDETER con fundamento en circunstancias de **fuerza mayor** que afectaron el avance en la ejecución de los convenios asociados. Esta situación fue oportunamente informada a la Supervisión, al Comité Técnico y Operativo del convenio y al Comité de Contratación del Ministerio del Interior. La prórroga fue formalizada en el aplicativo SECOP II el 29 de octubre de 2025, otorgando un plazo adicional de cinco (5) meses contados a partir del 30 de octubre de 2025, con fecha de terminación prevista para el 29 de marzo de 2026**.**

Durante el mes de noviembre de 2025, por parte de la supervisión de la DAIRM se realizó reunión de seguimiento el día 11 de noviembre de 2025 se realizó reunión de seguimiento de manera presencial en las instalaciones de Findeter y con la participación de los diferentes profesionales de la Dirección de Asuntos Indígenas por parte del Ministerio del Interior y de FINDETER, en esta reunión se rindió elreporte del estado de ejecución del proyecto por parte de este último, en donde se reportó el Estado General de los proyectos derivados a la fecha, el cual se indica a continuación:

Estado de avance de ejecución del contrato interadministrativo 2488 del 2024

Se realiza revisión conjuntamente entre los funcionarios de Findeter y los apoyos a la supervisión por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del avance de ejecución física de los convenios derivados suscritos a la fecha con relación al avance reportado y verificado a hoy 11 de noviembre de 2025.

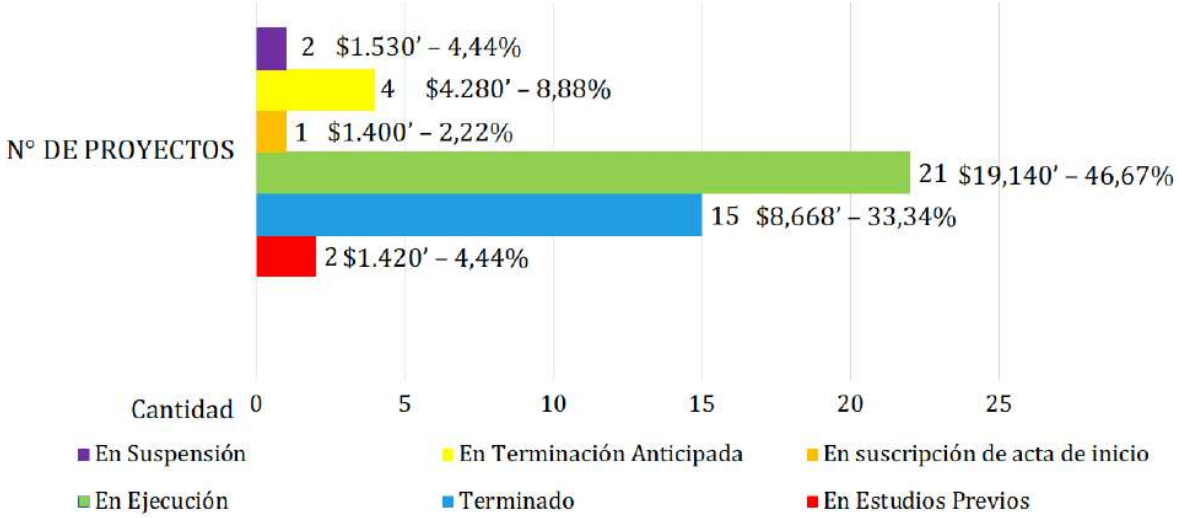
Conforme a la información reportada por Findeter y verificada por parte de los apoyos a la supervisión con relación al avance de ejecución de cada uno de los convenios derivados, se puede establecer que el avance de ejecución física corresponde al 57.11% con relación a los 45 proyectos, aumentado de esta manera desde el último avance reportado en un 6.78% desde el 20 de octubre, así mismo, se reportó y verificó el avance financiero de los diferentes giros realizados a los ejecutores de los convenios derivados iniciados y en ejecución.

Avance de ejecución Física del Contrato Interadministrativo desde el giro del recurso a Findeter (16/05/2025) → 59,10 % Programado — 57,11 % Ejecutado

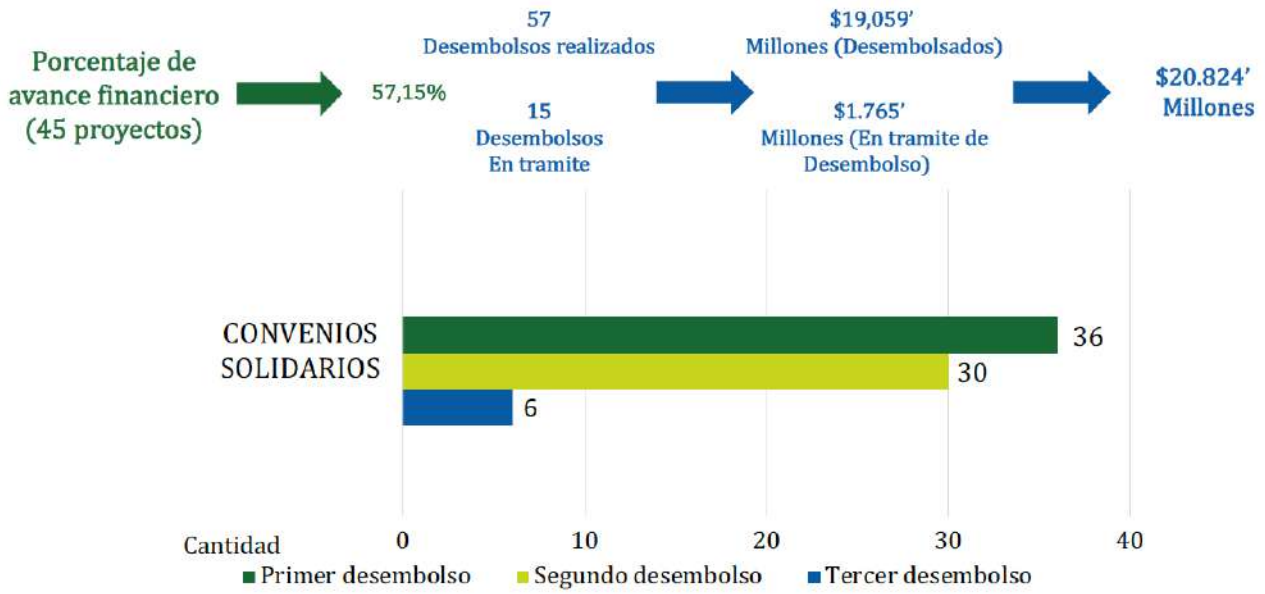
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interadministrativo 2488-2024 → 57,15 % Desembolsado

Nota Aclaratoria: Los porcentajes calculados y presentados en la presenta diapositiva se realizaron con base en el total de los proyectos dentro del C.I. 2488-2024 (45 proyectos) y en el valor total de los mismos $36,438 millones de pesos

Es de mencionar que dentro de la información reportada y verificada se tiene el siguiente estado particular de los proyectos que se encuentran en el marco del Contrato Interadministrativo 2488 de 2024, en donde de los 45 convenios derivados previstos en el presente contrato, actualmente se cuenta con 21 proyectos en ejecución física, 15 proyectos terminados, 2 en estructuración, 4 con terminación anticipada (ASOPASTOS), 2 proyectos suspendidos por causas de fuerza mayor y 1 pendientes de firma de acta de inicio (AICO).



Frente a los desembolsos realizados a las comunidades con relación a los proyectos firmados e iniciados se indica que a la fecha, se tiene el siguiente estado de pagos.



Proyectos pendientes por iniciar ejecución

En Terminación Anticipada

Asociación de Autoridades Indígenas de los Pastos – ASOPASTOS
Proyectos: 7, 8, 9 y 10

→ El ejecutor inicial ASOPASTOS solicitó la terminación bilateral, sin la firma del acta de inicio de los convenios solidarios la cual fue aprobada en los comités correspondientes.

En Elaboración de Estudios Previos

ADER – y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO
Proyectos: 12 y 35

→ Los dos proyectos relacionados ya fueron viabilizados técnica y jurídicamente y están en elaboración de estudios previos para presentarlos en los comités correspondientes.

Pendiente por Acta de Inicio

Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO
Proyecto: 28

→ El representante legal de AICO ejerció funciones hasta el 12 de septiembre de 2025 imposibilitando la firma del acta de inicio del Convenio Solidario

Nota Aclaratoria: Los presentes proyectos representan la diferencia de 10,52% en los porcentajes de avance de ejecución de los convenios solidarios para los dos escenarios presentados previamente, lo cual ha venido afectando el avance de ejecución.

Situaciones presentadas en la ejecución de los proyectos derivados: Durante la ejecución del presente convenio se han presentado algunas situaciones ajenas a las acciones que se vienen adelantando por parte de Findeter y por parte del Ministerio del Interior, las cuales se relacionan a continuación:

ADER – y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO Proyectos: 29, 30, 31, 32, 33 y 34	El ejecutor presenta problemas en el desarrollo de los convenios solidarios debido a la falta de representante legal de AICO, los proyectos se encuentran detenidos y sin posibilidad de solicitar, suspensiones, prorrogas o desembolso de recursos pendientes para garantizar una ejecución según los cronogramas de actividades. Adicionalmente, el proyecto 32 (Convenio Solidario No. 028-2025) esta próximo a vencerse (27/11/2025).
Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas – INTY-QUILLA Proyecto: 14	El presente proyecto tiene problemas de ejecución debido a problemas de orden público en el Resguardo Indígena de Mayasquer, no hay autorización para la entrada del personal técnico tanto de la asociación como de Findeter para ejecutar actividades del proyecto. (Suspendido por un mes hasta el 04/12/2025).
Asociación de Cabildos y/o Autoridades Indígenas del Nudo de los Pastos - Shaquiñan Proyecto: 2	El presente proyecto tiene problemas de ejecución debido a la intervención por parte de la alcaldía de la vía principal de acceso al Resguardo de Mueses – Potosí y a que la vía alterna tiene una pendiente muy pronunciada la cual impide la entrada de material a la zona de ejecución del Convenio Solidario.

Organización Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama – NIT 900.519.729-4

Actualmente **la organización Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama,** no cuenta con representante legal vigente, lo cual ha impedido la presentación de informes y la atención de requerimientos.

Esta circunstancia ha generado dificultades en la ejecución e incluso derivar en declaratoria de incumplimiento por parte de Findeter.

Se adelantó una reunión el día 3 de octubre de 2025, con la organización para buscar soluciones, sin resultados hasta la fecha para designar, ni siquiera de manera provisional, a un representante legal.

Terminación de convenios con ASOPASTOS – NIT 814.004.121-4

Es de tener en cuenta que, los proyectos 7, 8, 9 y 10 suscritos con la **Asociación de Autoridades Indígenas de los Pastos**, fueron terminados de mutuo acuerdo entre esta y Findeter, atendiendo a la solicitud de la propia Asociación. La decisión fue revisada y aceptada en el comité técnico y financiero realizado el día 12 de septiembre de 2025, considerando las circunstancias expuestas por la asociación.

A continuación se detallan los proyectos en mención:

N° DE PROYECTO	SOLIDARIO	NO. DE CONVENIO SOLIDARIO	OBJETO	VALOR PROYECTO
7	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDIGENAS DE LOS PASTOS - ASOPASTOS	016-PAF-ATMININTERIOR-CS-123-2025	Fortalecimiento integral del resguardo indígena de Panan mediante el mejoramiento de las vías interverdales	$ 1.120.000.000,00
8	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDIGENAS DE LOS PASTOS - ASOPASTOS	022-PAF-ATMININTERIOR-CS-129-2025	Fortalecimiento del gobierno propio y cultural mediante el mejoramiento de un escenario deportivo en la vereda la calera del Resguardo indígena de chiles en el Departamento de Nariño	$ 1.020.000.000,00
9	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDIGENAS DE LOS PASTOS - ASOPASTOS	034-PAF-ATMININTERIOR-CS-146-2025	Fortalecimiento integral mediante la habilitación de un espacio ancestral y adecuación de un espacio deportivo en el Resguardo indígena Refugio del sol, Departamento de Nariño.	$ 1.020.000.000,00
10	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDIGENAS DE LOS PASTOS - ASOPASTOS	023-PAF-ATMININTERIOR-CS-130-2025	Fortalecimiento integral del resguardo indígena Guachucal mediante el mejoramiento de las vías interverdales	$ 1.120.000.000,00

En consecuencia, el valor de estos proyectos es de $4.280.000.000 equivalente a un 11,75% del valor total de los proyectos.

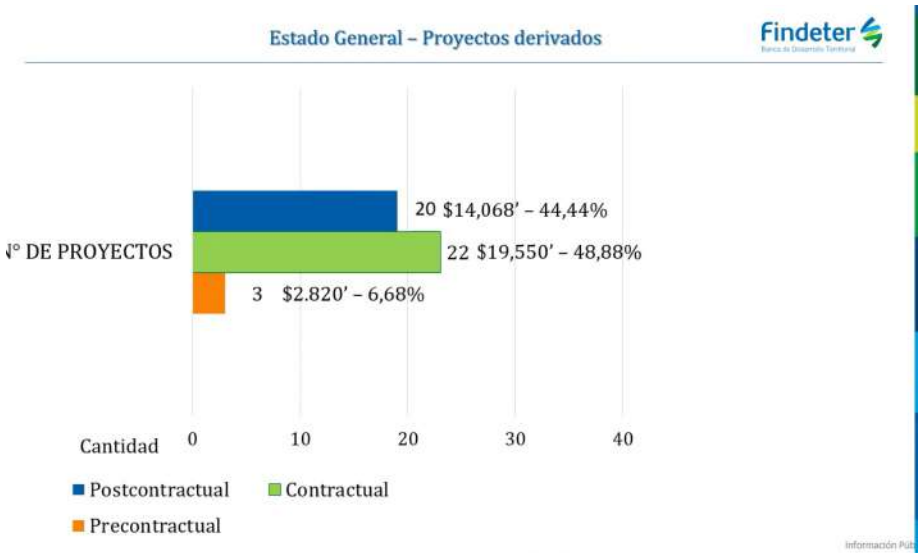
De igual forma, por parte de la supervisión de la DAIRM se realizó reunión de seguimiento el día 27 de noviembre de 2025 se realizó reunión de seguimiento de manera presencial en las instalaciones de Findeter y con la participación de los diferentes profesionales de la Dirección de Asuntos Indígenas por parte del Ministerio del Interior y de FINDETER, en esta reunión se rindió elreporte del estado de ejecución del proyecto por parte de este último, en donde se reportó el Estado General de los proyectos derivados a la fecha, el cual se indica a continuación:

Estado de avance de ejecución del contrato interadministrativo 2488 del 2024

FINDETER presentó de manera detallada el estado de avance de los proyectos, indicando que un grupo importante se encuentra en fase postcontractual —es decir, ejecutados y en cierre—, mientras que la mayor parte avanza en etapa contractual, y solamente tres permanecen en precontractual debido a necesidades específicas de ajustes o trámites internos. Se explicó que las variaciones en el estado de algunos proyectos, en comparación con el comité anterior, obedecen a avances administrativos propios del proceso de revisión, suscripción de actas, concertación con las autoridades indígenas y validaciones técnicas. Estas variaciones, según FINDETER, reflejan un comportamiento dinámico del portafolio, donde los tiempos dependen tanto de la articulación entre entidades como del cumplimiento de requisitos por parte de los ejecutores en territorio.

- **Postcontractual**: 20 proyectos – $14.068 millones (44.44%)
- **Contractual**: 22 proyectos – $19.500 millones (48.88%)

- **Precontractual**: 3 proyectos – $282 millones (6.68%)



Se realiza revisión conjuntamente entre los funcionarios de Findeter y los apoyos a la supervisión por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del avance de ejecución física de los convenios derivados suscritos a la fecha con relación al avance reportado y verificado a hoy 27 de noviembre de 2025.

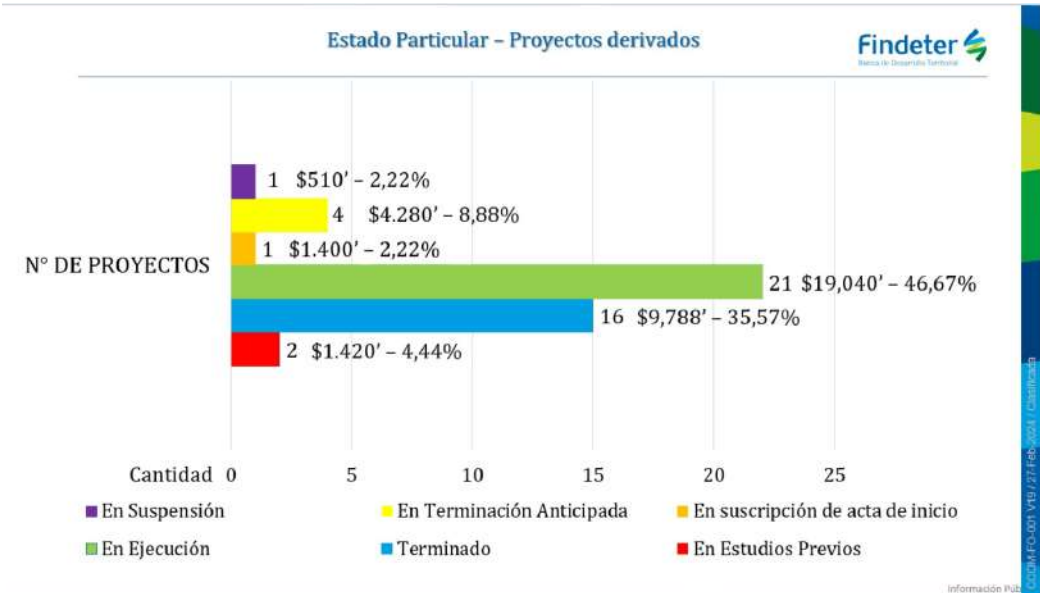
Conforme a la información reportada por Findeter y verificada por parte de los apoyos a la supervisión con relación al avance de ejecución de cada uno de los convenios derivados, se puede establecer que el avance de ejecución física corresponde al 60.09% con relación a los 45 proyectos, aumentado de esta manera desde el último avance reportado en un 2.98% desde el 11 de noviembre, así mismo, se reportó y verificó el avance financiero de los diferentes giros realizados a los ejecutores de los convenios derivados iniciados y en ejecución.

Avance de ejecución Física del Contrato Interadministrativo desde el giro del recurso a Findeter (16/05/2025) → 61,50 % Programado — 60,09 % Ejecutado

Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interadministrativo 2488-2024 → 57,15 % Desembolsado

Nota Aclaratoria: Los porcentajes calculados y presentados en la presenta diapositiva se realizaron con base en el total de los proyectos dentro del C.I. 2488-2024 (45 proyectos) y en el valor total de los mismos $36,438 millones de pesos

Es de mencionar que dentro de la información reportada y verificada se tiene el siguiente estado particular de los proyectos que se encuentran en el marco del Contrato Interadministrativo 2488 de 2024, en donde de los 45 convenios derivados previstos en el presente contrato, actualmente se cuenta con 21 proyectos en ejecución física, 16 proyectos terminados, 2 en estructuración, 4 con terminación anticipada (ASOPASTOS), 1 proyecto suspendido por causas de fuerza mayor y 1 pendientes de firma de acta de inicio (AICO).



Proyectos pendientes por iniciar ejecución

En Terminación Anticipada

Asociación de Autoridades Indígenas de los Pastos – ASOPASTOS
Proyectos: 7, 8, 9 y 10 → El ejecutor inicial ASOPASTOS solicitó la terminación bilateral, sin la firma del acta de inicio de los convenios solidarios la cual fue aprobada en los comités correspondientes.

En Elaboración de Estudios Previos

ADER – y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO
Proyectos: 12 y 35 → Los dos proyectos relacionados ya fueron viabilizados técnica y jurídicamente y están en elaboración de estudios previos para presentarlos en los comités correspondientes.

Pendiente por Acta de Inicio

Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO
Proyecto: 28 → El representante legal de AICO ejerció funciones hasta el 12 de septiembre de 2025 imposibilitando la firma del acta de inicio del Convenio Solidario

Nota Aclaratoria: Los presentes proyectos representan la diferencia de 10,52% en los porcentajes de avance de ejecución de los convenios solidarios para los dos escenarios presentados previamente, lo cual ha venido afectando el avance de ejecución.

Situaciones presentadas en la ejecución de los proyectos derivados: Durante la ejecución del presente convenio se han presentado algunas situaciones ajenas a las acciones que se vienen adelantando por parte de Findeter y por parte del Ministerio del Interior, las cuales se relacionan a continuación:

ADER – y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO Proyectos: 29, 30, 31, 32, 33 y 34	El ejecutor presenta problemas en el desarrollo de los convenios solidarios debido a la falta de representante legal de AICO, los proyectos se encuentran detenidos y sin posibilidad de solicitar, suspensiones, prorrogas o desembolso de recursos pendientes para garantizar una ejecución según los cronogramas de actividades. Adicionalmente, el proyecto 32 (Convenio Solidario No. 028-2025) esta próximo a vencerse (27/11/2025).
Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas – INTY-QUILLA Proyecto: 14	El presente proyecto tiene problemas de ejecución debido a problemas de orden público en el Resguardo Indígena de Mayasquer, no hay autorización para la entrada del personal técnico tanto de la asociación como de Findeter para ejecutar actividades del proyecto. (Suspendido por un mes hasta el 04/12/2025). Se va a presentar una prórroga a la suspensión por el termino de un mes debido a que la situación de orden público no ha mejorado y el acceso al resguardo indígena de Mayasquer sigue bloqueado.

Organización Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama – NIT 900.519.729-4

Actualmente **la organización Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama,** no cuenta con representante legal vigente, lo cual ha impedido la presentación de informes y la atención de requerimientos.

Esta circunstancia ha generado dificultades en la ejecución e incluso derivar en declaratoria de incumplimiento por parte de Findeter.

Se adelantó una reunión el día 3 de octubre de 2025, con la organización para buscar soluciones, sin resultados hasta la fecha para designar, ni siquiera de manera provisional, a un representante legal.

Terminación de convenios con ASOPASTOS – NIT 814.004.121-4

Es de tener en cuenta que, los proyectos 7, 8, 9 y 10 suscritos con la **Asociación de Autoridades Indígenas de los Pastos**, fueron terminados de mutuo acuerdo entre esta y Findeter, atendiendo a la solicitud de la propia Asociación. La decisión fue revisada y aceptada en el comité técnico y financiero realizado el día 12 de septiembre de 2025, considerando las circunstancias expuestas por la asociación.

Proyectos con suspensión por orden público

En relación con las dificultades operativas, FINDETER expuso con especial atención el caso del proyecto ubicado en el resguardo Mayasquer, donde persiste una situación crítica de orden público. Se informó que la presencia simultánea de múltiples grupos armados ilegales ha generado restricciones que afectan directamente el desarrollo

del proyecto, incluyendo amenazas, controles indebidos, cobros ilegales y riesgos para la integridad de los equipos técnicos. Se mencionaron episodios recientes de violencia, desplazamientos y enfrentamientos que han impedido el ingreso del personal y la movilización de materiales, lo cual hace inviable la continuidad de las actividades proyectadas. Por este motivo, FINDETER argumentó que es necesario mantener la suspensión y tramitar su prórroga ante el comité correspondiente, soportando esta decisión en criterios técnicos y de seguridad, así como en las comunicaciones recibidas desde los territorios. El Ministerio tomó nota de esta situación e indicó que evaluará los documentos para emitir la respectiva recomendación jurídica dentro del marco regulatorio.

Se explicó la situación del proyecto en resguardo Mayasquer, afectado por:

- Presencia de aprox. 5 grupos armados.
- Riesgos de desplazamiento y homicidios recientes.
- Exigencia de pagos ilegales para permitir ingreso de personal y materiales.

Se dejó clara la imposibilidad total de ingreso, lo que justifica mantener la suspensión y solicitar prórroga.Por parte de la Supervisión se solicitó conocer los soportes y la justificación formal del requerimiento que se presentará al comité.

Proyectos en trámite contractual

En relación con los proyectos 12 y 35, FINDETER detalló que el proyecto 35 ya surtió el trámite ante el Comité de Contratación y ahora se encuentra a la espera de los comités técnico y fiduciario que definirán su viabilidad final para la suscripción de minutas. Por su parte, el proyecto 12 requirió una reestructuración profunda debido a que su plazo original de seis meses no se ajusta a las condiciones del contrato interadministrativo; esto obligó a la entidad a solicitar nuevos cronogramas, cotizaciones actualizadas y modificaciones a las fichas técnicas. FINDETER indicó que ambos proyectos podrían contar con minutas firmadas entre el 10 y el 15 de diciembre, siempre y cuando no se presenten nuevas observaciones de carácter técnico, financiero o jurídico. El Ministerio recalcó la importancia de mantener comunicación estrecha y oportuna para evitar retrasos que afecten el cumplimiento de las metas de cierre anual.

Proyecto 35 – Parque Yascual: Ya pasó por Comité de Contratación. Falta Comité Técnico y fiduciario.

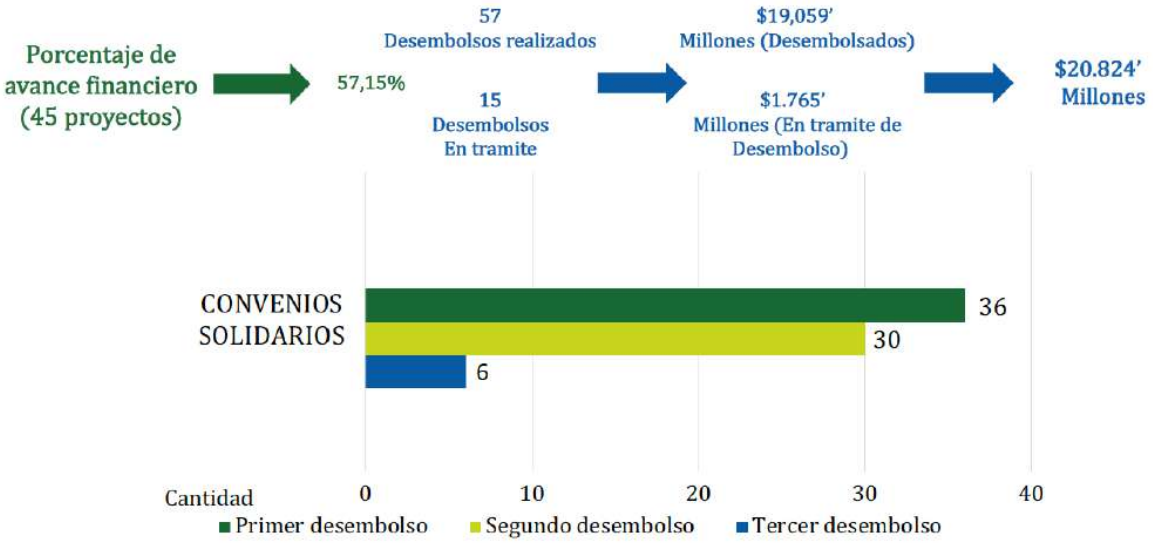
Proyecto 12 – FINDETER requirió reestructuración por tener plazo de 6 meses. Nuevo cronograma, cotizaciones y fichas ya están en revisión. Se espera llevar a Comité de Contratación en la siguiente semana.

FINDETER estima obtener minutas entre 10 y 15 de diciembre para ambos proyectos.

Estado de desembolsos y ejecución financiera

En lo referente al avance financiero del contrato, FINDETER informó que el porcentaje de ejecución se mantiene en 57.15 %, cifra que corresponde a los desembolsos tramitados con corte en el periodo anterior. Se explicó que existen varios desembolsos en trámite que deberían ser aprobados por la fiducia en las siguientes horas, y que se proyecta realizar alrededor de 27 desembolsos durante el mes de diciembre, siempre que las asociaciones radiquen la documentación completa antes del 2 de dicho mes. Asimismo, FINDETER señaló que, siguiendo la instrucción del Ministerio, los reportes financieros se presentarán de ahora en adelante con base en el escenario consolidado de los 45 proyectos, lo que permitirá una trazabilidad más clara y una visión unificada del comportamiento financiero del convenio.

- 57.15% de avance financiero.
- 57 proyectos con desembolso realizado.
- 15 desembolsos en trámite, con fecha estimada de giro entre hoy y mañana.
- Proyección de desembolsos diciembre: aprox. 27 proyectos, sujeta a radicación hasta el 2 de diciembre.



Problemática Jurídica – Representación Legal de AICO

El Ministerio del Interior expuso que, tras una revisión exhaustiva de los documentos y actuaciones internas de la organización, indicó a Findeter que no es posible reconocer una representación legal en firme. Esto se debe a la existencia de dos asambleas distintas, dos procesos electorales realizados en escenarios independientes y la interposición de recursos cruzados ante la Cámara de Comercio.

Dicha situación ha dado lugar a inscripciones simultáneas, solicitudes de reposición e impugnaciones actualmente en trámite, lo que impide contar con una certificación clara sobre quién ostenta jurídicamente la representación de la organización. El Ministerio advirtió que la definición de este asunto podría tardar entre cuatro y seis meses, considerando los tiempos ordinarios de decisión de la Cámara de Comercio y, eventualmente, de la Superintendencia de Sociedades.

En contraste, el equipo jurídico y técnico de FINDETER presentó una postura distinta, sustentada en el artículo 164 del Código de Comercio, el cual establece que las personas inscritas en la Cámara de Comercio como representantes legales conservarán tal carácter para todos los efectos legales mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección.

Desde esta perspectiva, FINDETER considera que, aunque el señor Gilberto Buenaventura presentó su renuncia, esta no produciría efectos plenos frente a terceros en ausencia de un nuevo nombramiento en firme. En

consecuencia, el registro previo continuaría generando efectos legales para actuar ante la entidad, permitiendo la radicación de cuentas de cobro y el avance de los trámites contractuales mientras se define la situación definitiva.

Frente a esta interpretación, el Ministerio —a través de los abogados Carolina Mejía y Andrés Arango— manifestó que el artículo 164 del Código de Comercio no resulta aplicable en este caso. Señaló que existe evidencia documental de una asamblea en la que se eligió un nuevo representante legal, cuya inscripción fue realizada ante la Cámara de Comercio. Sin embargo, dicha inscripción fue impugnada, lo que derivó en su suspensión provisional.

Desde la perspectiva del Ministerio, esta circunstancia impide reconocer al nuevo representante, pero también imposibilita que se mantengan los efectos del anterior, ya que la elección sí ocurrió y fue registrada, aunque no esté en firme. En consecuencia, se configura una situación jurídica atípica en la que no es posible reconocer plenamente a ninguno de los dos.

Este escenario —caracterizado por una renuncia inscrita, una elección registrada pero suspendida y una impugnación en trámite— evidencia un vacío jurídico que impacta directamente la continuidad operativa de los proyectos a cargo de AICO, así como la gestión de cuentas de cobro que superan los 4.700 millones de pesos.

Ante la falta de certeza jurídica, se acordó elevar una consulta formal mediante derecho de petición ante la Cámara de Comercio de Pasto, con el fin de obtener un pronunciamiento expreso sobre los efectos actuales de la renuncia, la elección impugnada y la validez del ejercicio de la representación legal en este contexto.

Por otra parte, durante el presente mes de noviembre, se adelantaron los Comités Técnicos No. 17, 18 y 19 en donde se realizaron las siguientes votaciones por parte de los delegados del Ministerio del interior:

Comité Técnico 17: *“Aprobar la suspensión por el término de un (01) mes del Convenio Solidario No. 037-PAF-ATMININTERIORCS-147-2025 cuyo objeto es “CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER AL RESGUARDO INDÍGENA DE MAYASQUER MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERVEREDALES” debido a los problemas de orden público y conflicto armado en el Resguardo Indígena de Mayasquer, lo que ha imposibilitado la entrada del personal mínimo y los materiales al lugar de ejecución del proyecto.”*

Comité Técnico 18: *“Aprobación de acta de balance de mayores y menores cantidades al Convenio solidario No. 032-PAF-ATMININTERIOR-CS-144-2025 cuyo objeto es “(…) CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO Y CULTURAL MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA CASA DE PENSAMIENTO DEL CABILDO DE CATAMBUCO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”*

Comité Técnico 19: *“Aprobar la prórroga por el término de un (01) mes y quince (15) días y balance de mayores y menores cantidades del Convenio Solidario No. 029-PAFATMININTERIOR-CS-141-2025 cuyo objeto es “CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO Y CULTURAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LA CASA DEL PENSAMIENTO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE YARAMAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” debido a malas condiciones climáticas, al hallazgo de restos óseos humanos que suspendieron ciertas actividades en tanto se realizaba el retiro de los mismos, a la realización de sepelios recurrentes, al mal estado del corredor vial principal de Ipiales a Yaramal, a bloqueos por parte de la comunidad debido al mal estado de la vía de*

acceso al resguardo de Yaramal y bloqueos en la vía Panamericana, lo cual dificulta la entrada de material y el transporte de estos a la zona del proyecto."

Así mismo, durante el presente mes de noviembre, se adelantaron los Comités Fiducarios No. 14 y 16 en donde se realizaron las siguientes votaciones por parte de los delegados del Ministerio del interior:

Comité Fiduciario 14: *"Solicitud: Suspensión por el término de un (01) mes del Convenio Solidario No. 037-PAFATMININTERIOR- CS-147-2025"*

Comité Fiduciario 16: "*"Aprobar la prórroga por el término de un (01) mes y quince (15) días y balance de mayores y menores cantidades del Convenio Solidario No. 029-PAFATMININTERIOR-CS-141-2025 cuyo objeto es "CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO Y CULTURAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LA CASA DEL PENSAMIENTO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE YARAMAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO" debido a malas condiciones climáticas, al hallazgo de restos óseos humanos que suspendieron ciertas actividades en tanto se realizaba el retiro de los mismos, a la realización de sepelios recurrentes, al mal estado del corredor vial principal de Ipiales a Yaramal, a bloqueos por parte de la comunidad debido al mal estado de la vía de acceso al resguardo de Yaramal y bloqueos en la vía Panamericana, lo cual dificulta la entrada de material y el transporte de estos a la zona del proyecto."*

Fecha de expedición: noviembre del 2025.

ROQUELINA SABIS BLANCO MOSCARELLA
Directora Asuntos indígenas rom y Minorías
Ministerio del Interior

Elaboró: Arq. Edwin Ulloa Calvo

ACTA No.	
FECHA	11-11-2025
CIUDAD	Bogotá D.C
No. CONTRATO y/o CONTRATO	2488 del 2024
OBJETO:	Prestar la asistencia técnica, administrativa, operativa y financiera en el desarrollo de los proyectos priorizados por el ministerio del interior en el marco de los compromisos orientados al cumplimiento del decreto 2194 del 2013 y a la protección, promoción y fortalecimiento integral de los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	57,11%
MOTIVO:	El presente Comité Técnico de Seguimiento del Contrato Interadministrativo No. 2488 de 2025, celebrado entre el Ministerio del Interior y Findeter, tiene como propósito revisar el estado de avance físico y financiero de los convenios derivados.

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Nohora Alicia Celis Cruz C.C.: 52029269 Cargo: Profesional Especialista	Nombre: Gerardo Alzate C.C.:10278512 Cargo: Contratista
Nombre: Edwin Ulloa C.C.: 79950166 Cargo: Contratista	Nombre: Ismael León R C.C.: 80198254 Cargo: Contratista
Nombre: C.C.: Cargo:	Nombre: Juan Camilo Aguilar C.C.: 1082955990 Cargo: Profesional Juridico

DESARROLLO DE LA REUNION

Estado de avance de ejecución del contrato interadministrativo 2488 del 2024

Se realiza revisión conjuntamente entre los funcionarios de Findeter y los apoyos a la supervisión por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del avance de ejecución física de los convenios derivados suscritos a la fecha con relación al avance reportado y verificado a hoy 11 de noviembre de 2025.

Conforme a la información reportada por Findeter y verificada por parte de los apoyos a la supervisión con relación al avance de ejecución de cada uno de los convenios derivados, se puede establecer que el avance de ejecución física corresponde al 57.11% con relación a los 45 proyectos, aumentado de esta manera desde el último avance reportado en un 6.78% desde el 20 de octubre, así mismo, se reportó y verificó el avance financiero de los diferentes giros realizados a los ejecutores de los convenios derivados iniciados y en ejecución.

Porcentajes de ejecución

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

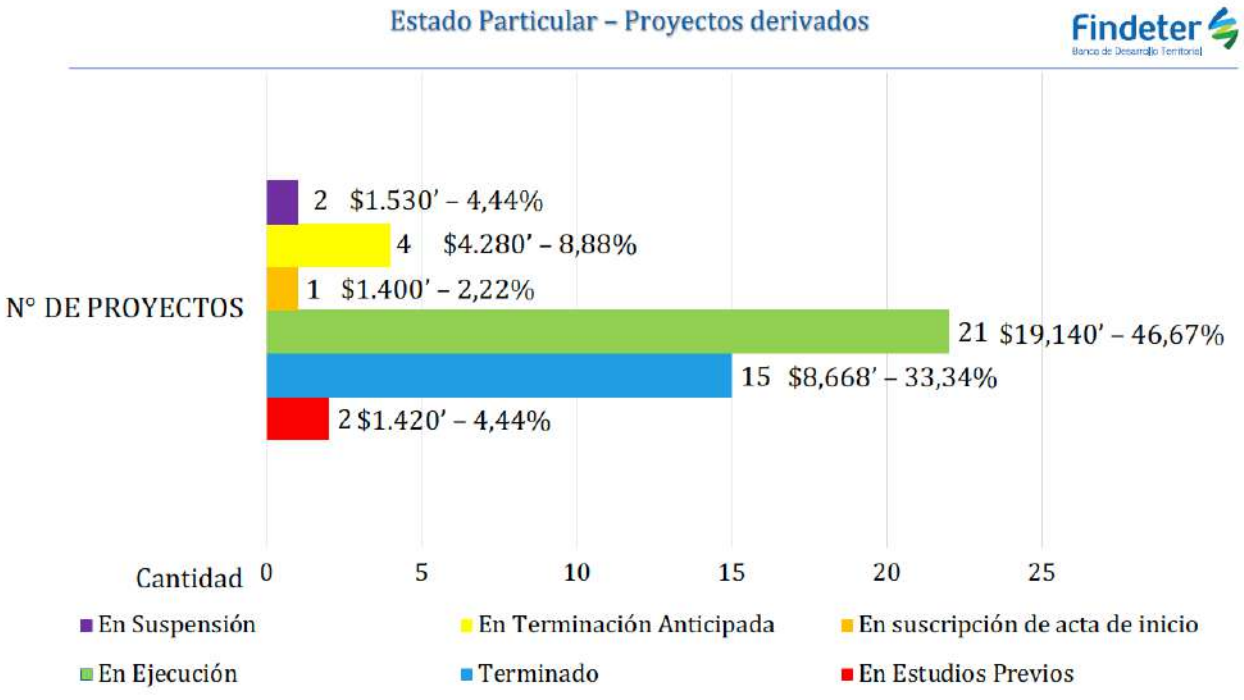
Escenario No. 1 (Totalidad de los proyectos C.I. 2488-2024)

Avance de ejecución Física del Contrato Interadministrativo desde el giro del recurso a Findeter (16/05/2025) → 59,10 % Programado — 57,11 % Ejecutado

Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interadministrativo 2488-2024 → 57,15 % Desembolsado

Nota Aclaratoria: Los porcentajes calculados y presentados en la presenta diapositiva se realizaron con base en el total de los proyectos dentro del C.I. 2488-2024 (45 proyectos) y en el valor total de los mismos $36,438 millones de pesos

Es de mencionar que dentro de la información reportada y verificada se tiene el siguiente estado particular de los proyectos que se encuentran en el marco del Contrato Interadministrativo 2488 de 2024, en donde de los 45 convenios derivados previstos en el presente contrato, actualmente se cuenta con 21 proyectos en ejecución física, 15 proyectos terminados, 2 en estructuración, 4 con terminación anticipada (ASOPASTOS), 2 proyectos suspendidos por causas de fuerza mayor y 1 pendientes de firma de acta de inicio (AICO).



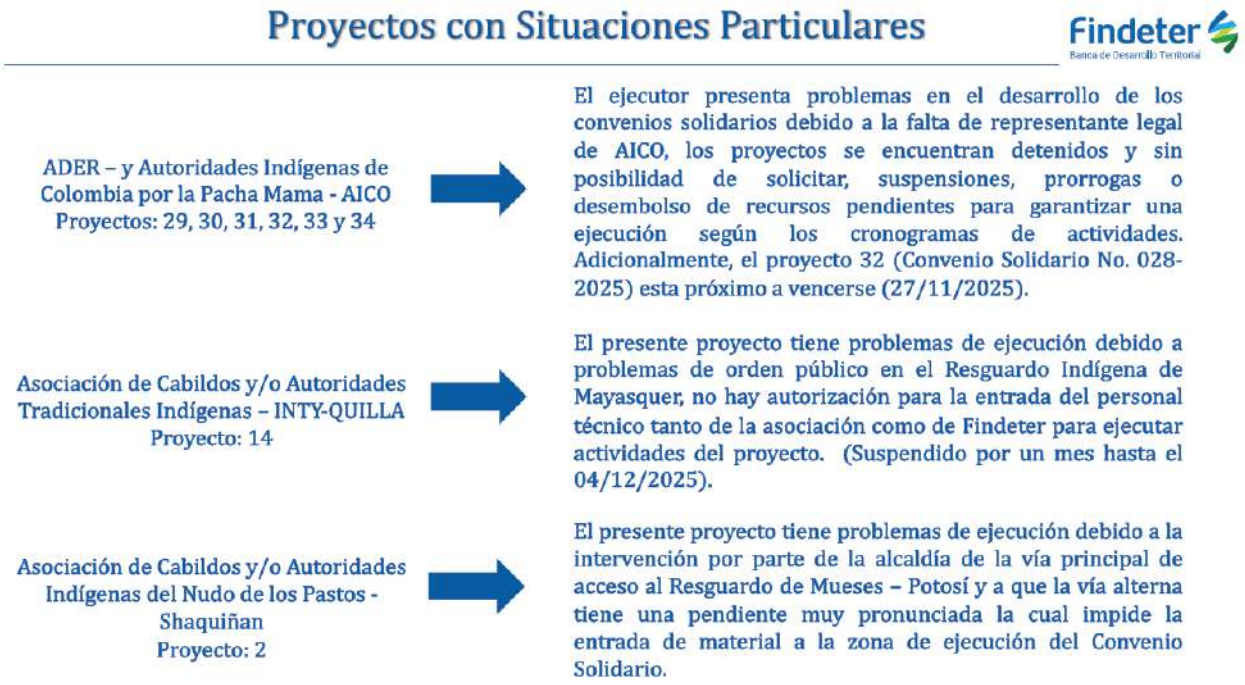
Frente a los desembolsos realizados a las comunidades con relación a los proyectos firmados e iniciados se indica que a la fecha, se tiene el siguiente estado de pagos.



Proyectos pendientes por iniciar ejecución



Situaciones presentadas en la ejecución de los proyectos derivados: Durante la ejecución del presente convenio se han presentado algunas situaciones ajenas a las acciones que se vienen adelantando por parte de Findeter y por parte del Ministerio del Interior, las cuales se relacionan a continuación:



Organización Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama – NIT 900.519.729-4

Actualmente **la organización Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama,** no cuenta con representante legal vigente, lo cual ha impedido la presentación de informes y la atención de requerimientos.

Esta circunstancia ha generado dificultades en la ejecución e incluso derivar en declaratoria de incumplimiento por parte de Findeter.

Se adelantó una reunión el día 3 de octubre de 2025, con la organización para buscar soluciones, sin resultados hasta la fecha para designar, ni siquiera de manera provisional, a un representante legal.

Terminación de convenios con ASOPASTOS – NIT 814.004.121-4

Es de tener en cuenta que, los proyectos 7, 8, 9 y 10 suscritos con la **Asociación de Autoridades Indígenas de los Pastos**, fueron terminados de mutuo acuerdo entre esta y Findeter, atendiendo a la solicitud de la propia Asociación. La decisión fue revisada y aceptada en el comité técnico y financiero realizado el día 12 de septiembre de 2025, considerando las circunstancias expuestas por la asociación.

A continuación se detallan los proyectos en mención:

N° DE PROYECTO	SOLIDARIO	NO. DE CONVENIO SOLIDARIO	OBJETO	VALOR PROYECTO
7	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDIGENAS DE LOS PASTOS - ASOPASTOS	016-PAF-ATMININTERIOR-CS-123-2025	Fortalecimiento integral del resguardo indígena de Panan mediante el mejoramiento de las vías interverdales	$ 1.120.000.000,00
8	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDIGENAS DE LOS PASTOS - ASOPASTOS	022-PAF-ATMININTERIOR-CS-129-2025	Fortalecimiento del gobierno propio y cultural mediante el mejoramiento de un escenario deportivo en la vereda la calera del Resguardo indígena de chiles en el Departamento de Nariño	$ 1.020.000.000,00
9	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDIGENAS DE LOS PASTOS - ASOPASTOS	034-PAF-ATMININTERIOR-CS-146-2025	Fortalecimiento integral mediante la habilitación de un espacio ancestral y adecuación de un espacio deportivo en el Resguardo indígena Refugio del sol, Departamento de Nariño.	$ 1.020.000.000,00
10	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDIGENAS DE LOS PASTOS - ASOPASTOS	023-PAF-ATMININTERIOR-CS-130-2025	Fortalecimiento integral del resguardo indígena Guachucal mediante el mejoramiento de las vías interverdales	$ 1.120.000.000,00

En consecuencia, el valor de estos proyectos es de $4.280.000.000 equivalente a un 11,75% del valor total de los proyectos.

Adicional a lo anterior, es importante resaltar que durante la ejecución de los convenios derivados, se han presentado situaciones de fuerza mayor que soporta la necesidad de extender el plazo inicialmente estipulado, para lo cual FINDETER realizó formalmente solicitud de prórroga por 5 meses. Esta solicitud no requirió adición de recursos toda vez que no se está cobrando la asistencia técnica por parte de FINDETER para el periodo prorrogado.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

En constancia de lo anterior, se anexa listado de asistencia de los participantes de la misma.

Anexos: Listado de asistencia – Folio 1

Proyectó: Edwin Ulloa Calvo

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema:	Reunión de Seguimiento Contrato Interadministrativo Nº 2488-2024						
Responsable u organizador:	Edwin Ulloa.	Dependencia:	DAIRM.				
Ciudad:	Bogotá D.C.	Lugar y/o enlace:	FINDETER Calle 104	☒Presencial ☐Virtual	Fecha		Hora inicial
					Día / Mes / Año		Hora final
Tipo	☐ Comité ☐ Junta ☒ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____				11 / 11 / 2025		

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE)**: Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI	NO	PN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Edwin Ulloa C.	79.952.166	46	H	NA	NA		X		DAIRM	Contratista	edwin.ulloa@mininterior.gov.co	3214752754	
2	Jose Guila Aguila Hdz	1.082.955.910	33					X		Tesoreria	Lider Juridico	Jeaguila@tesoreria.gov.co	3207063291	
3	Jesica Ventura Tadeo	2106736		F				Y		Tesoreria	Contadora	ventura@tesoreria.gov.co	3153283629	
4	Nelcora Alicia Celis Cruz	52029269	54	M	NA	NA		X		DAIRM	Prof. Especial.	nchoracelis@mininterior.gov.co	3126186260	
5	Ismael Leon R	80198253	41	NA	NA			X		Findeter	Gestor	jolleon@findeter.gov.co	3006560	
6	GERARDO ACZARO A	10278512	57	H	NA	NA		X		FINDETER	GESTOR	gaolzate@findeter.gov.co	3132430004	
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

- Se realiza reunión de Seguimiento frente a la ejecución del Contrato Interadministrativo en donde se evidencia un avance con corte al día de hoy 21 de noviembre de 2025 del 57.11% de ejecución física frente a un 59.10% de ejecución programado, esto teniendo en cuenta los 45 proyectos.
- Se indica que existen 15 proyectos o convenios derivados ejecutados al 100%, 4 proyectos con Terminación anticipada, 23 proyectos en ejecución, de los cuales hay 2 suspendidos (proyecto 2 y 14) 2 en proceso de contratación y 1 pendiente de firma del acta de inicio (AIC0)
- Se indica a FINDETER que ningún proyecto podrá superar el plazo contractual del 29 de marzo de 2026, y que los proyectos que aún no han iniciado deberán ajustar su plazo de ejecución.
- Se presenta un avance financiero del 57.17%, frente a los 45 proyectos, se han realizado 57 desembolsos por valor de $19.057'000.000 millones y están en trámite 15 desembolsos por valor de $1.765'000.000 para un total de $20.824.000.000.

2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

1. Se debe solicitar ajuste en el cronograma de aquellos proyectos
2. que no han iniciado su ejecución y que sobrepasen el plazo
3. contractual del 29/03/2026, para de lo contrario no se daría aval
4. por parte del ministerio para su ejecución.

2. Programar reunión con AICO para revisión del estado del R.L.

- En el Item "2. *Observaciones y/o conclusiones generales*", se sugiere incluir el listado de compromisos, sus responsables y fechas de cumplimiento.
-

Elaboró resumen y conclusiones

Firma:

Nombres: Edwin Ulloa
Cargo o Rol: Contratista.
Área: DAI



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Programa MININTERIOR:

Contrato Interadministrativo 2488 de 2024

Hacienda

Interior

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Datos Generales	
Objeto	"Prestar la asistencia técnica, administrativa, operativa y financiera en el desarrollo de los proyectos priorizados por el ministerio del interior en el marco de los compromisos orientados al cumplimiento del decreto 2194 del 2013 y a la protección, promoción y fortalecimiento integral de los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas".
Valor Inicial	Cuarenta mil millones de pesos M/CTE ($40.000.000.000)
Fecha de Suscripción	27 de diciembre de 2024
Fecha de Inicio	31 de diciembre de 2024
Plazo Inicial	Diez (10) meses
Plazo Actual	Quince (15) meses
Fecha de Terminación inicial	29 de octubre de 2025
Fecha de Terminación actual	29 de marzo de 2026
Fecha de recepción de los recursos	16 de mayo de 2025

Información Pú

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

45 Proyectos → **$36.438'** Millones

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE EJECUCIÓN

1 Línea
Fortalecimiento de la infraestructura vial

2 Línea
Desarrollo Productivo

3 Línea
Fortalecimiento de la Mujer, Familia y Generaciones

4 Línea
Fortalecimiento de Gobierno Propio, integridad cultural, armonía y equilibrio

5 Línea
Adquisición de maquinaria verde y amarilla


6 Línea
Construcción, mejoramiento y dotación de Casas de Pensamiento y Culturales para los Resguardos y Cabildos Indígenas

7 Línea
Plataformas digitales, desarrollo tecnológico y dotación

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
Información Púb

Pueblos Indígenas Beneficiarios





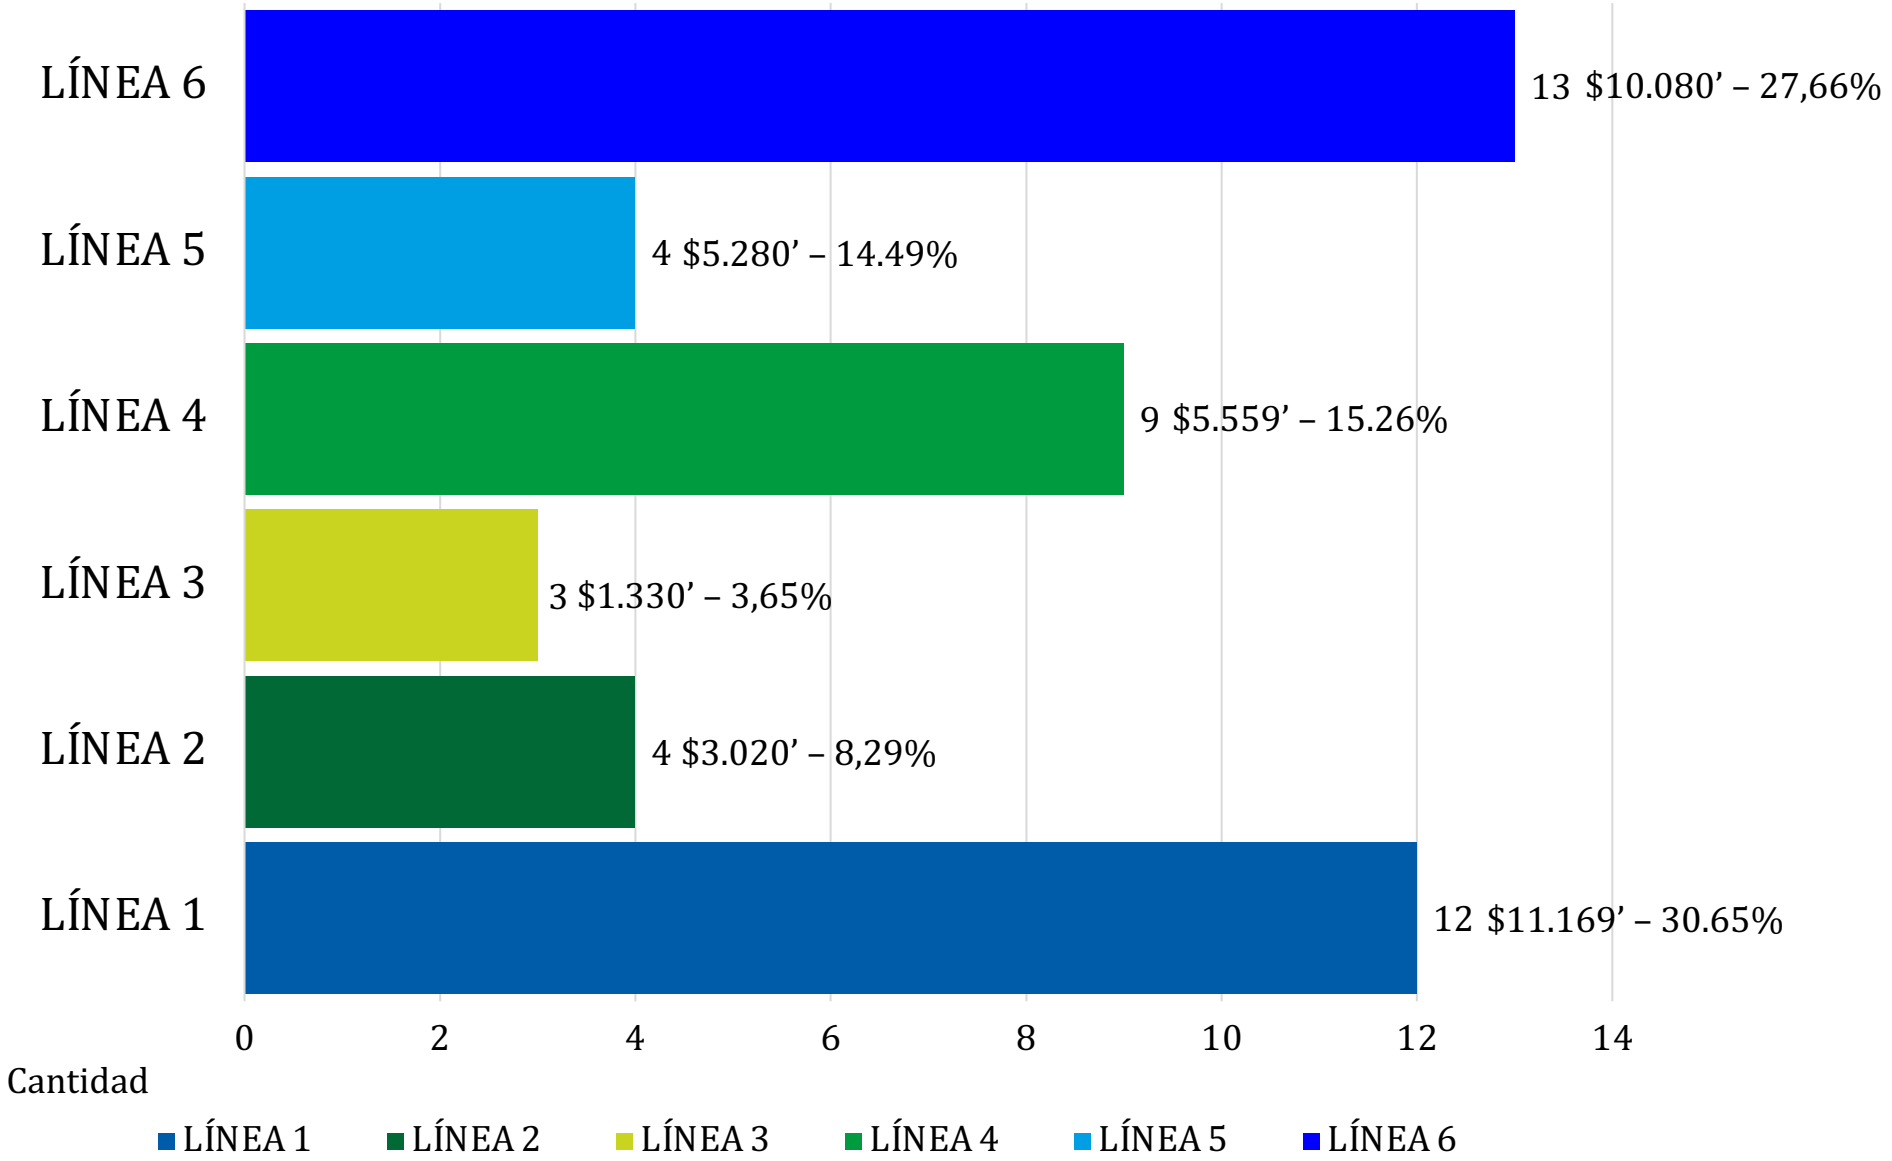
9 Solidarios

31 Resguardos beneficiados

110.274 personas beneficiadas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
Información Púb

Proyectos por líneas estratégicas



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
Información Púb

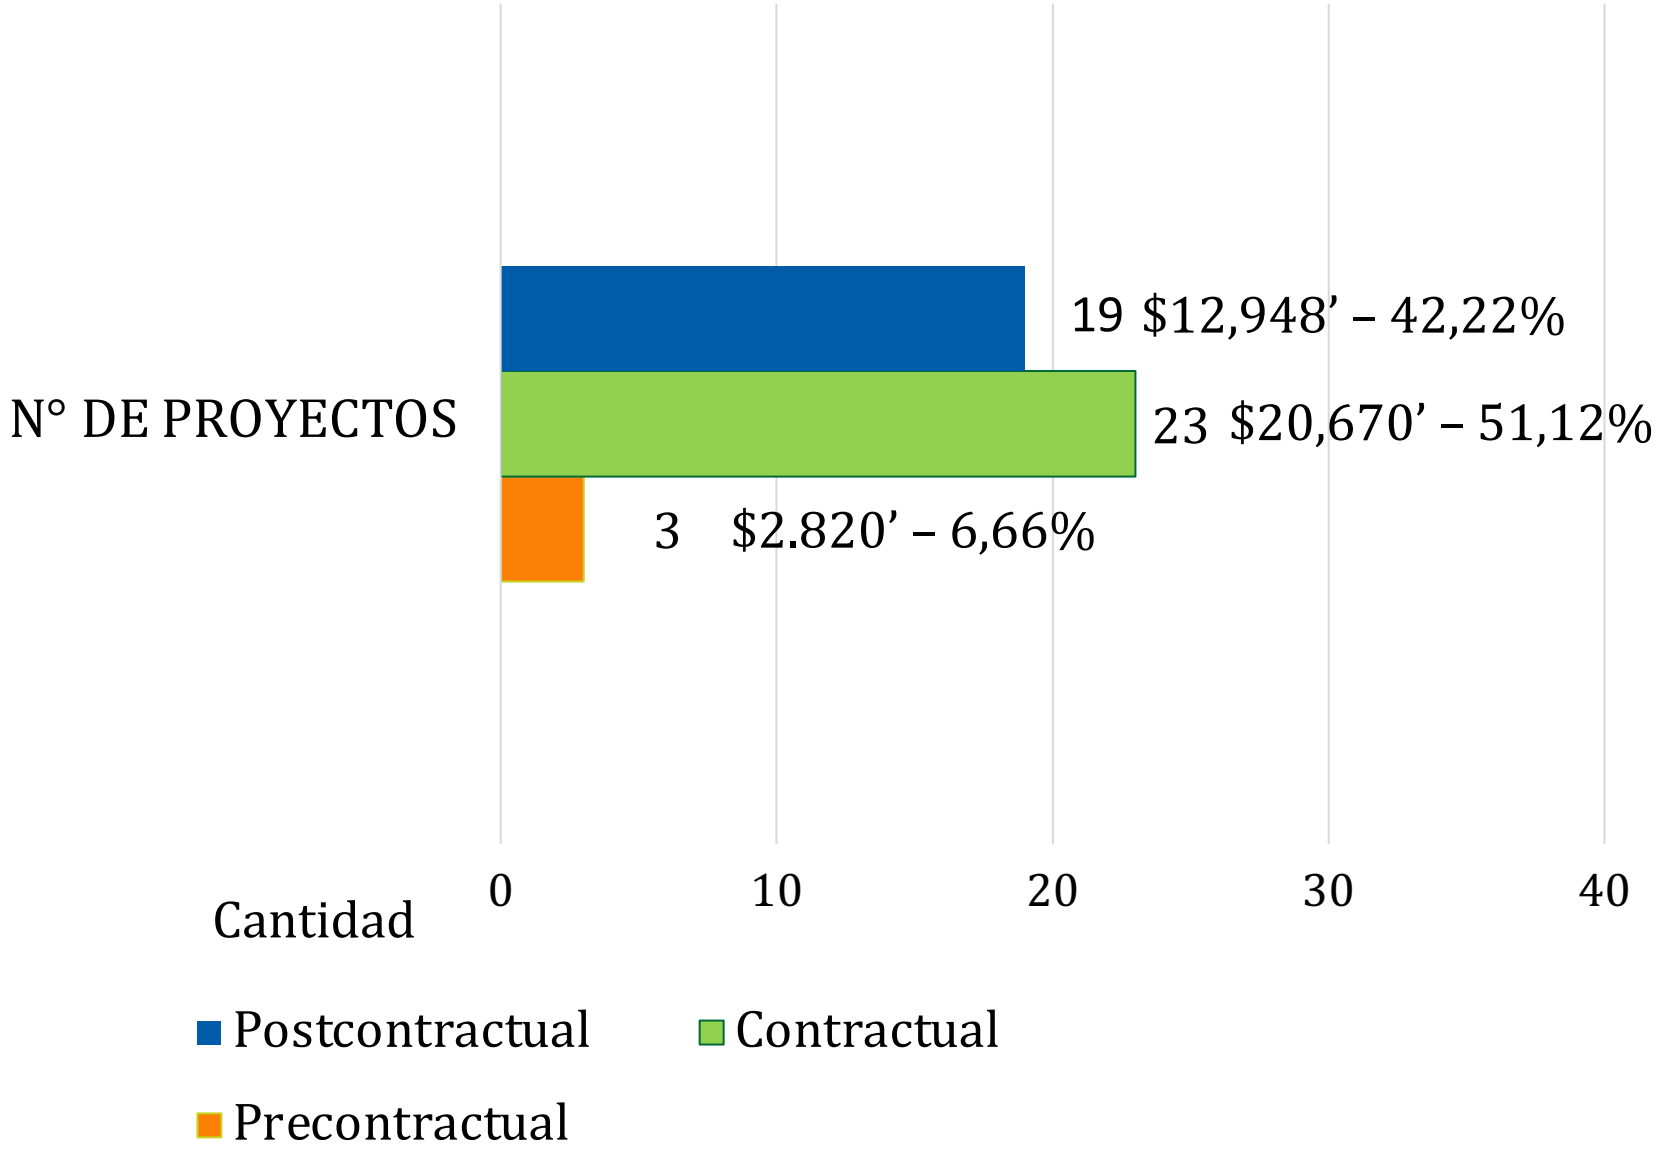
Cronograma de proyección de actividades inicial

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ACTIVIDADES	2025									
MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
Recepción de documentos iniciales										
Verificación de la documentación inicial										
Mesas de Trabajo Inicial Pastos y Quillasingas										
Subsanaciones a la documentación jurídica y técnica										
Verificación de Findeter a los ajustes jurídicos y técnicos y viabilización										
Elaboración de los Estudios Previos										
Presentación ante los Órganos del Patrimonio Autónomo										
Elaboración de minuta por parte de Fiduagraria										
Firma de minuta por parte de los Solidarios y Fiduagraria										
Expedición de garantías por parte de los solidarios										
Aprobación de garantías por parte de Fiduagraia										
Aprobación de requisitos para suscripción del acta de inicio										
Seguimiento a la ejecución de los Convenios Solidarios Suscritos										
Trámites desembolsos convenios solidarios										
Visitas de acompañamiento técnico a los proyectos por parte de Findeter										
Reuniones de seguimiento Ministerio del Interior - Findeter										

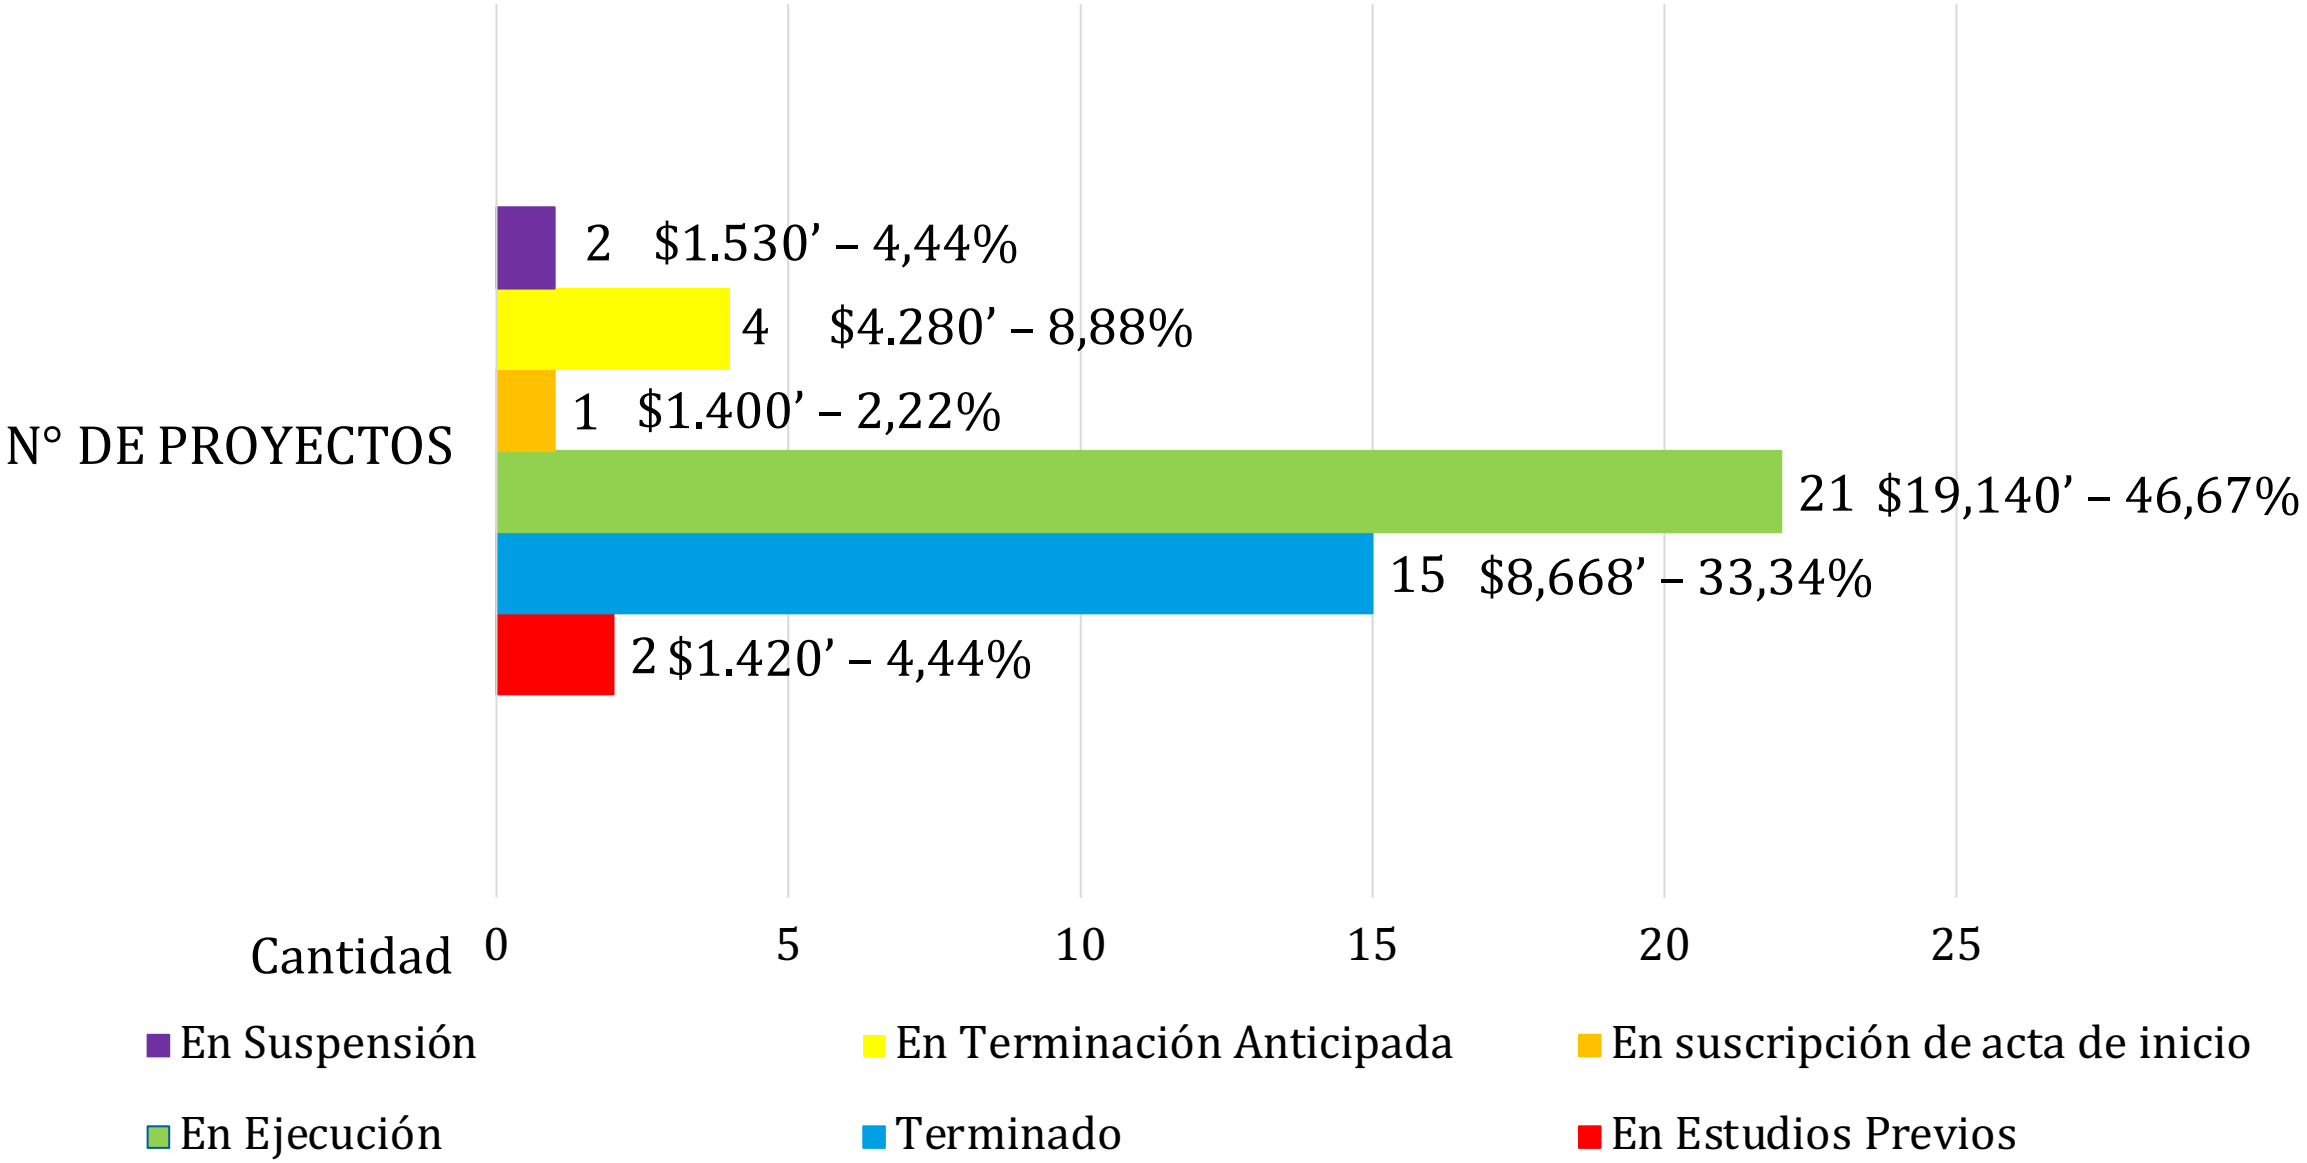
Información Púb

Estado General – Proyectos derivados



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
Información Púb

Estado Particular – Proyectos derivados



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
Información Púb

Desembolsos realizados a las comunidades

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Porcentaje de avance financiero (45 proyectos)

57,15%

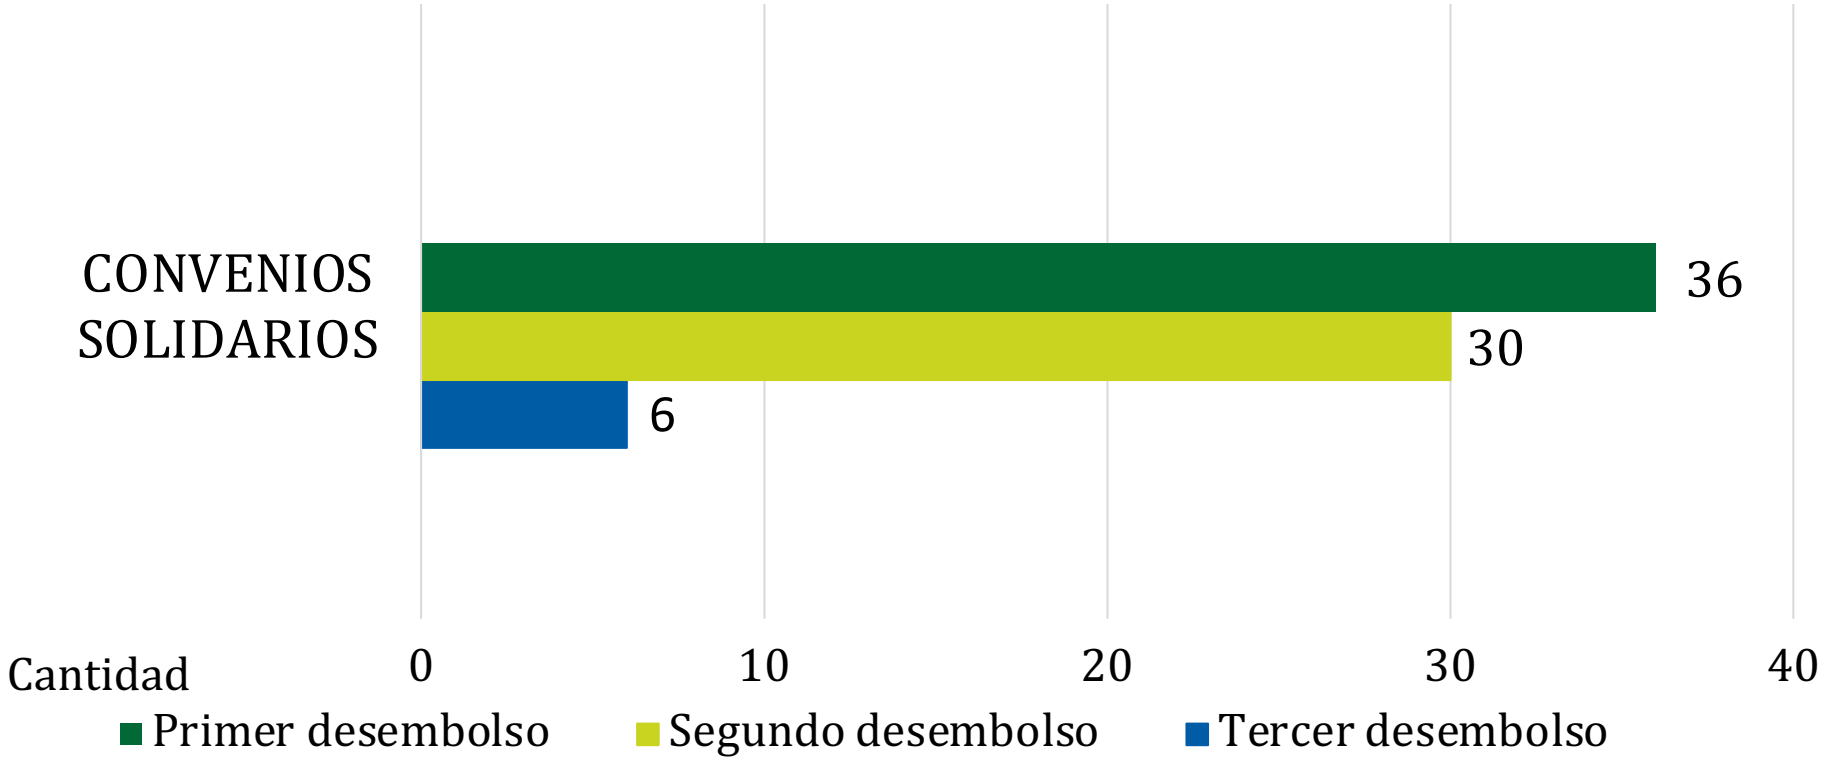
57
Desembolsos realizados

15
Desembolsos
En tramite

$19,059'
Millones (Desembolsados)

$1.765'
Millones (En tramite de Desembolso)

$20.824'
Millones



Información Púb
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Desembolsos realizados a las comunidades

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Porcentaje de avance financiero (38 proyectos)

70,98%

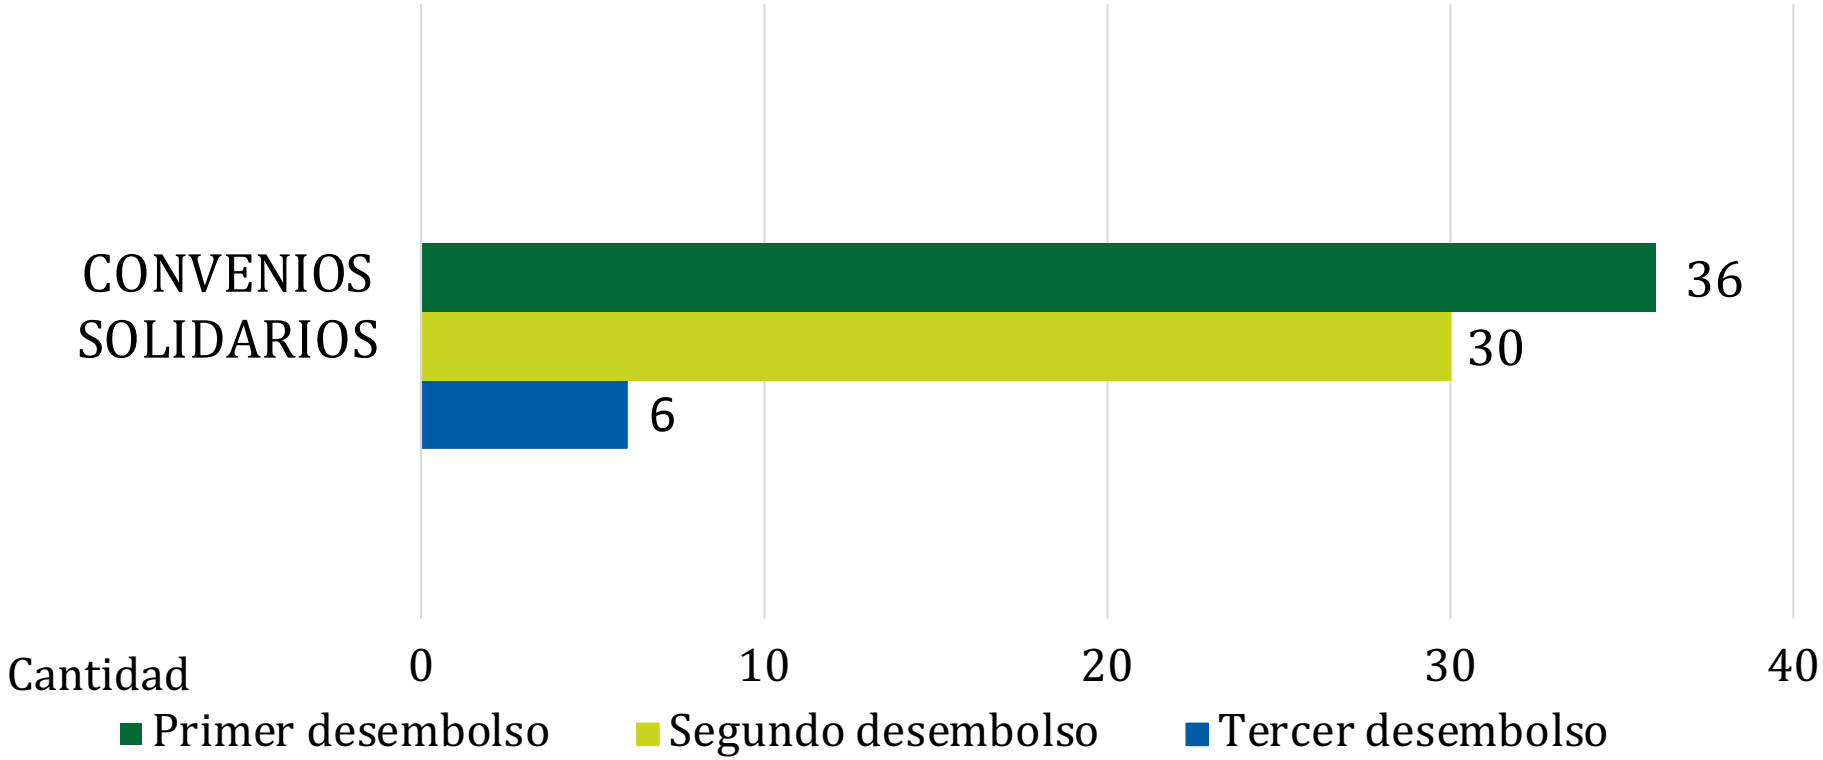
57
Desembolsos realizados

15
Desembolsos En tramite

$19,059'
Millones (Desembolsados)

$1.765'
Millones (En tramite de Desembolso)

$20.824'
Millones



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
Información Púb

Porcentajes de ejecución

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Escenario No. 1 (Totalidad de los proyectos C.I. 2488-2024)

Avance de ejecución Física del Contrato Interadministrativo desde el giro del recurso a Findeter (16/05/2025)

59,10 % Programado

57,11 % Ejecutado

Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interadministrativo 2488-2024

57,15 % Desembolsado

Nota Aclaratoria: Los porcentajes calculados y presentados en la presenta diapositiva se realizaron con base en el total de los proyectos dentro del C.I. 2488-2024 (45 proyectos) y en el valor total de los mismos $36,438 millones de pesos

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
Información Púb

Porcentajes de ejecución

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Escenario No. 2 (Proyectos en Ejecución y Terminados del C.I. 2488-2024)

Avance de ejecución Física del Contrato Interadministrativo desde el giro del recurso a Findeter (16/05/2025)

70 % Programado

67,63 % Ejecutado

Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interadministrativo 2488-2024

70,98 % Desembolsado

Nota Aclaratoria: Los porcentajes calculados y presentados en la presenta diapositiva se realizaron con base en el total de los proyectos dentro del C.I. 2488-2024 (38 proyectos) y en el valor total de los mismos $29,338 millones de pesos

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Información Púb

Proyectos por Iniciar

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

En Terminación Anticipada

Asociación de Autoridades Indígenas de los Pastos – ASOPASTOS
Proyectos: 7, 8, 9 y 10

→ El ejecutor inicial ASOPASTOS solicitó la terminación bilateral, sin la firma del acta de inicio de los convenios solidarios la cual fue aprobada en los comités correspondientes.

En Elaboración de Estudios Previos

ADER – y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO
Proyectos: 12 y 35

→ Los dos proyectos relacionados ya fueron viabilizados técnica y jurídicamente y están en elaboración de estudios previos para presentarlos en los comités correspondientes.

Pendiente por Acta de Inicio

Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO
Proyecto: 28

→ El representante legal de AICO ejerció funciones hasta el 12 de septiembre de 2025 imposibilitando la firma del acta de inicio del Convenio Solidario

Nota Aclaratoria: Los presentes proyectos representan la diferencia de 10,52% en los porcentajes de avance de ejecución de los convenios solidarios para los dos escenarios presentados previamente, lo cual ha venido afectando el avance de ejecución.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
Información Púb

Proyectos con Situaciones Particulares

ADER – y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO Proyectos: 29, 30, 31, 32, 33 y 34	El ejecutor presenta problemas en el desarrollo de los convenios solidarios debido a la falta de representante legal de AICO, los proyectos se encuentran detenidos y sin posibilidad de solicitar, suspensiones, prorrogas o desembolso de recursos pendientes para garantizar una ejecución según los cronogramas de actividades. Adicionalmente, el proyecto 32 (Convenio Solidario No. 028-2025) esta próximo a vencerse (27/11/2025).
Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas – INTY-QUILLA Proyecto: 14	El presente proyecto tiene problemas de ejecución debido a problemas de orden público en el Resguardo Indígena de Mayasquer, no hay autorización para la entrada del personal técnico tanto de la asociación como de Findeter para ejecutar actividades del proyecto. (Suspendido por un mes hasta el 04/12/2025).
Asociación de Cabildos y/o Autoridades Indígenas del Nudo de los Pastos - Shaquiñan Proyecto: 2	El presente proyecto tiene problemas de ejecución debido a la intervención por parte de la alcaldía de la vía principal de acceso al Resguardo de Mueses – Potosí y a que la vía alterna tiene una pendiente muy pronunciada la cual impide la entrada de material a la zona de ejecución del Convenio Solidario.

Información Pú
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Terminación de Convenios Solidarios

Convenios Solidarios Terminados a la Fecha	15
Convenios Solidarios Terminados a la Fecha Diciembre de 2025	12
Convenios Solidarios Terminados a la Fecha Enero de 2026	6
Convenios Solidarios Terminados a la Fecha Febrero de 2026	3
Convenios Solidarios Terminados a la Fecha Marzo de 2026	2

Información Púb



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación | icontec | Cámara de Comercio de Bogotá | efr www.masfamilia.org | SGS CO18/8256 | SGS CO18/8257 | SGS CO21/962851

ACTA No.	
FECHA	27/11/2025
CIUDAD	Bogotá D.C
No. CONTRATO y/o CONTRATO	2488 del 2024
OBJETO:	Prestar la asistencia técnica, administrativa, operativa y financiera en el desarrollo de los proyectos priorizados por el ministerio del interior en el marco de los compromisos orientados al cumplimiento del decreto 2194 del 2013 y a la protección, promoción y fortalecimiento integral de los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	xxxxx
MOTIVO:	Realizar seguimiento técnico, jurídico y financiero al Contrato Interadministrativo 2488 de 2024, revisar el estado de los 45 proyectos, avances, dificultades, suspensiones, solicitud de cambio de ejecutores y asuntos críticos relacionados con orden público y representación legal de asociaciones indígenas, particularmente AICO – Por la Pachamama.

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Nohora Alicia Celis Cruz C.C.: 52029269 Cargo: Delegada DAIRM- Secretaria Tecnica de Comite Tecnico Operativo	Nombre: Martha Patricia Martinez Barragan C.C. Cargo: Vicepresidente Tecnica de FINDETER
Nombre: Carolina Mejia C.C.: 36300932 Cargo: Abogada – Contratista DAIRM	Nombre: Ismael León R C.C.: 80198254 Cargo: Contratista
Nombre:Edwin Ulloa C.C.: 79950166 Cargo: Arquitecto – Contratista DAIRM	Nombre: Juan Camilo Aguilar C.C.: 1082955990 Cargo: Profesional Jurídico
Nombre: Andrés Felipe Arango Arias C.C.: 1037582768 Cargo: Contratista	Nombre: Iván Otero C.C.: Cargo:
Nombre: Camilo Vieco C.C.: Cargo: Contratista	

DESARROLLO DE LA REUNION

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia y apertura de la sesión
2. Presentación general del estado del Contrato Interadministrativo 2488 de 2024
3. Revisión del estado actual de los 45 proyectos
4. Análisis técnico y jurídico de la solicitud de cambio de ejecutores (Proyectos 7, 8, 9 y 10)
5. Avance de proyectos en trámite de estructuración y contratación
6. Inicio de ejecución del Proyecto 28 (AICO por la Pachamama)

7. Avance financiero y operación fiduciaria
8. Situación Jurídica de la Representación Legal de AICO
9. Presentación y socialización de la base de seguimiento actualizada
10. Definición de compromisos, tareas y responsables
11. Proposiciones y varios
12. Cierre de la sesión

1. Presentación General – FINDETER

Ismael León proyectó la presentación actualizada del estado contractual:

La sesión inició con la presentación general del Contrato Interadministrativo No. 2488 de 2024, donde FINDETER expuso el estado global de los 45 proyectos, su distribución por líneas, el alcance territorial y el número de beneficiarios, destacando el impacto en los pueblos Pastos y Quillacingas. Se socializó además el cronograma general ajustado, teniendo en cuenta la prórroga que extiende la vigencia del contrato hasta el 29 de marzo de 2026.

- 45 proyectos por un valor total de $36.438 millones.
- Distribución por líneas 1 a 6, sin proyectos en la línea 7.
- Impacto territorial en pueblos Pastos y Quillacingas:Más de 10.000 beneficiarios.

2. Estado General de Proyectos

Posteriormente, FINDETER presentó de manera detallada el estado de avance de los proyectos, indicando que un grupo importante se encuentra en fase postcontractual —es decir, ejecutados y en cierre—, mientras que la mayor parte avanza en etapa contractual, y solamente tres permanecen en precontractual debido a necesidades específicas de ajustes o trámites internos. Se explicó que las variaciones en el estado de algunos proyectos, en comparación con el comité anterior, obedecen a avances administrativos propios del proceso de revisión, suscripción de actas, concertación con las autoridades indígenas y validaciones técnicas. Estas variaciones, según FINDETER, reflejan un comportamiento dinámico del portafolio, donde los tiempos dependen tanto de la articulación entre entidades como del cumplimiento de requisitos por parte de los ejecutores en territorio.

- **Postcontractual**: 20 proyectos – $14.068 millones (44.44%)
- **Contractual**: 22 proyectos – $19.500 millones (48.88%)
- **Precontractual**: 3 proyectos – $282 millones (6.68%)

FINDETER informó que algunos estados variaron frente al comité anterior.

3. Proyectos con suspensión por orden público

En relación con las dificultades operativas, FINDETER expuso con especial atención el caso del proyecto ubicado en el resguardo Mayasquer, donde persiste una situación crítica de orden público. Se informó que la presencia simultánea de múltiples grupos armados ilegales ha generado restricciones que afectan directamente el desarrollo del proyecto, incluyendo amenazas, controles indebidos, cobros ilegales y riesgos para la integridad de los equipos técnicos. Se mencionaron episodios recientes de violencia, desplazamientos y enfrentamientos que han impedido el ingreso del personal y la movilización de materiales, lo cual hace inviable la continuidad de las actividades proyectadas. Por este motivo, FINDETER argumentó que es necesario mantener la suspensión y tramitar su prórroga ante el comité correspondiente, soportando esta decisión en

criterios técnicos y de seguridad, así como en las comunicaciones recibidas desde los territorios. El Ministerio tomó nota de esta situación e indicó que evaluará los documentos para emitir la respectiva recomendación jurídica dentro del marco regulatorio.

Ismael León explicó la situación del proyecto en resguardo Mayasquer, afectado por:

- Presencia de aprox. 5 grupos armados.
- Riesgos de desplazamiento y homicidios recientes.
- Exigencia de pagos ilegales para permitir ingreso de personal y materiales.

Se dejó clara la imposibilidad total de ingreso, lo que justifica mantener la suspensión y solicitar prórroga.

El apoyo a la supervisión Arq. Edwin Ulloa solicitó conocer los soportes y la justificación formal del requerimiento que se presentará al comité.

4. Solicitud de cambio de ejecutores – Proyectos 7, 8, 9 y 10

El Ministerio del Interior consultó expresamente sobre el estado de la solicitud de cambio de ejecutores de los proyectos 7, 8, 9 y 10. FINDETER informó que aún no había recibido el oficio formal de la Mesa Indígena con la designación del nuevo ejecutor, pese a que el Ministerio confirmó que dicha comunicación había sido remitida previamente a la entidad bancaria. Se realizó una verificación en tiempo real, donde se constató que el oficio sí existía, pero no se había compartido con los soportes anexos requeridos para continuar los trámites. FINDETER insistió en que no es posible avanzar sin ese documento oficial, pues constituye el soporte jurídico que valida la modificación del ejecutor. Además, la entidad recordó que todos los proyectos deben ajustarse a un plazo máximo de tres meses de ejecución, una vez se reciba la confirmación de cambio, ya que los planes originales contemplaban cronogramas de seis meses, los cuales no son compatibles con el marco temporal del contrato interadministrativo. Esto implicará ajustes a las fichas técnicas, presupuestos, rutas de ejecución y proyecciones financieras, por lo cual FINDETER solicitó la mayor celeridad en el envío del oficio definitivo.

El apoyo a la supervisión Arq. Edwin Ulloa informó que el Ministerio ya envió por correo la respuesta a la Mesa y solicitó verificar recepción.

Tras revisar en vivo, se constató que:

- FINDETER no había recibido aún el oficio formal de la Mesa con la designación del nuevo ejecutor.
- El Ministerio confirmó que sí envió el documento a la mesa, pero faltaba enviar copia a Findeter.
- FINDETER reiteró que no puede continuar el proceso sin ese soporte.

El apoyo a la supervisión jurídica Carolina Mejía (MinInterior) precisó que la autorización de cambio está condicionada a que los proyectos garanticen ejecución dentro del plazo del interadministrativo, es decir hasta el 29 de marzo de 2026.

Impacto en la ejecución:

FINDETER advierte que:

- Los proyectos originalmente tenían 6 meses, por lo que deben ser reestructurados a 3 meses.
- Esto implica ajuste completo de fichas técnicas, presupuesto, cronogramas y actividades.
- Se acordó que, una vez lleguen los oficios, se realizará contacto inmediato con los resguardos.

5. Proyectos en trámite contractual

En relación con los proyectos 12 y 35, FINDETER detalló que el proyecto 35 ya surtió el trámite ante el Comité de Contratación y ahora se encuentra a la espera de los comités técnico y fiduciario que definirán su viabilidad final para la suscripción de minutas. Por su parte, el proyecto 12 requirió una reestructuración profunda debido a que su plazo original de seis meses no se ajusta a las condiciones del contrato interadministrativo; esto obligó a la entidad a solicitar nuevos cronogramas, cotizaciones actualizadas y modificaciones a las fichas técnicas. FINDETER indicó que ambos proyectos podrían contar con minutas firmadas entre el 10 y el 15 de diciembre, siempre y cuando no se presenten nuevas observaciones de carácter técnico, financiero o jurídico. El Ministerio recalcó la importancia de mantener comunicación estrecha y oportuna para evitar retrasos que afecten el cumplimiento de las metas de cierre anual.

Proyecto 35 – Parque Yascual: Ya pasó por Comité de Contratación. Falta Comité Técnico y fiduciario.

Proyecto 12 – FINDETER requirió reestructuración por tener plazo de 6 meses. Nuevo cronograma, cotizaciones y fichas ya están en revisión. Se espera llevar a Comité de Contratación en la siguiente semana.

FINDETER estima obtener minutas entre 10 y 15 de diciembre para ambos.

6. Estado de desembolsos y ejecución financiera

En lo referente al avance financiero del contrato, FINDETER informó que el porcentaje de ejecución se mantiene en 57.15 %, cifra que corresponde a los desembolsos tramitados con corte en el periodo anterior. Se explicó que existen varios desembolsos en trámite que deberían ser aprobados por la fiducia en las siguientes horas, y que se proyecta realizar alrededor de 27 desembolsos durante el mes de diciembre, siempre que las asociaciones radiquen la documentación completa antes del 2 de dicho mes. Asimismo, FINDETER señaló que, siguiendo la instrucción del Ministerio, los reportes financieros se presentarán de ahora en adelante con base en el escenario consolidado de los 45 proyectos, lo que permitirá una trazabilidad más clara y una visión unificada del comportamiento financiero del convenio.

- 57.15% de avance financiero.
- 57 proyectos con desembolso realizado.
- 15 desembolsos en trámite, con fecha estimada de giro entre hoy y mañana.
- Proyección de desembolsos diciembre: aprox. 27 proyectos, sujeta a radicación hasta el 2 de diciembre.

7. Inicio del Proyecto 28 – AICO POR LA PACHAMAMA

En cuanto al Proyecto 28, contratado por AICO por la Pachamama, FINDETER informó que el acta de inicio está pendiente de firma y que, de acuerdo con los compromisos asumidos por el ejecutor, la ejecución se desarrollará en un plazo reducido para ajustarse a las condiciones del contrato interadministrativo, sin necesidad de modificar el cronograma contractual. Se destacó que, debido al cierre financiero de la fiducia hacia los días 15 o 16 de diciembre, es indispensable que la cuenta de cobro correspondiente sea radicada en los primeros días del mes para evitar retrasos en el primer desembolso. El Ministerio tomó nota de este aspecto y reiteró la importancia de asegurar la documentación de forma completa y oportuna.

8. Problemática Jurídica – Representación Legal de AICO

Uno de los puntos más extensos y sensibles de la reunión fue el análisis jurídico sobre la representación legal de AICO, asunto que ha generado un vacío significativo para la continuidad de los proyectos en ejecución. El Ministerio del Interior explicó que, después de una revisión exhaustiva de los documentos y actuaciones internas de la organización, no es posible reconocer una representación legal firme debido a la existencia de dos asambleas diferentes, dos elecciones realizadas en escenarios independientes y la radicación de recursos

cruzados ante la Cámara de Comercio. Esta situación ha derivado en inscripciones simultáneas, solicitudes de reposición e impugnaciones que actualmente se encuentran en trámite, razón por la cual no existe una certificación clara sobre quién ostenta jurídicamente la representación de la organización. El Ministerio advirtió que la definición de este asunto podría tardar entre cuatro y seis meses, considerando los tiempos ordinarios de decisión por parte de la Cámara de Comercio y, eventualmente, la Superintendencia de Sociedades.

En este contexto, el equipo jurídico y técnico de FINDETER presentó una postura distinta, fundamentada en el artículo 164 del Código de Comercio, el cual establece que "las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representantes de una sociedad (…) conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección". Desde esta perspectiva, FINDETER considera que, dado que el señor Gilberto Buenaventura radicó su renuncia, pero no existe un nuevo nombramiento firme y plenamente válido, dicha renuncia no habría producido efectos plenos frente a terceros mientras no exista un reemplazo con inscripción en firme. En consecuencia, según FINDETER, el registro previo de Gilberto en Cámara de Comercio seguiría produciendo efectos legales para actuar frente a la entidad, permitir la radicación de cuentas de cobro y adelantar los trámites contractuales, mientras se define la situación definitiva del nombramiento de su reemplazo.

Ante esta postura, el Ministerio —a través de los abogados Carolina Mejía y Andrés Arango por parte del Mininterior— manifestaron que el artículo 164 del Código de Comercio no resulta aplicable en este caso, puesto que sí existe evidencia documental y formal de que AICO realizó una asamblea en la cual se eligió un nuevo representante legal, y que esta elección sí fue inscrita en la Cámara de Comercio. No obstante, esta inscripción fue objeto de impugnación, la cual generó una suspensión provisional del acto registral. Desde la perspectiva del Ministerio, esta suspensión impide reconocer de inmediato al nuevo representante, pero también impide aplicar el artículo 164 para retrotraer automáticamente los efectos al representante anterior, puesto que la elección sí se produjo y sí fue registrada, aunque no en firme. En esa medida, para el Ministerio, la existencia de dicha inscripción, aun suspendida, genera una situación jurídica especial donde no resulta posible afirmar que el representante anterior conserva sus efectos plenos, ni tampoco reconocer la validez del nuevo representante hasta que la Cámara de Comercio resuelva definitivamente la impugnación.

Este escenario jurídico mixto —con una renuncia inscrita, una elección registrada pero suspendida, y una impugnación en trámite— dejó en evidencia un vacío jurídico que afecta directamente la continuidad operativa de los proyectos a cargo de AICO y la posibilidad de tramitar cuentas de cobro que superan los 4.700 millones de pesos. Por ello, y ante la falta de certeza absoluta, se acordó elevar una consulta formal mediante derecho de petición dirigido directamente a la Cámara de Comercio de Pasto, solicitando concepto expreso sobre los efectos actuales de la renuncia, la elección impugnada y la validez o no del ejercicio de representación del anterior representante mientras se resuelve la situación administrativa. Esta consulta se adoptará como medida para obtener claridad jurídica vinculante que permita a ambas entidades tomar decisiones sin poner en riesgo la legalidad ni la ejecución contractual. Andrés Arango informó que: El Ministerio proyectó y envió respuesta formal a la petición de AICO.

En dicha respuesta, el Ministerio no reconoce actualmente representación legal válida, por existir conflicto interno.

9. Presentación y socialización de la base de seguimiento actualizada

FINDETER informó oficialmente la designación de Iván Otero como responsable del envío semanal de la base de seguimiento, quien realizará esta remisión todos los viernes a los correos proporcionados por el Ministerio. La finalidad de este mecanismo es fortalecer el flujo de información, garantizar actualizaciones periódicas y evitar retrasos en el seguimiento administrativo, técnico y financiero del contrato interadministrativo. Tanto el Ministerio como FINDETER coincidieron en la importancia de mantener esta herramienta como soporte clave para la toma de decisiones.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Ministerio del Interior	Remitir nuevamente a FINDETER el oficio de la Mesa sobre el cambio de ejecutores de los proyectos 7, 8, 9 y 10, incluyendo todos los soportes anexos.	Inmediato
FINDETER	Revisar y validar el oficio de cambio de ejecutores una vez sea recibido y coordinar contacto directo con los resguardos para ajuste de los proyectos a un plazo de 3 meses.	Dentro de los 2 días siguientes a la recepción del oficio
FINDETER	Estructurar y presentar al Comité Técnico y Fiduciario los proyectos 12 y 35 para lograr su avance hacia suscripción de minutas.	Entre el 10 y 15 de diciembre de 2024
FINDETER	Enviar al Ministerio los soportes actualizados sobre la situación de orden público del proyecto del Resguardo Mayasquer para sustentar la prórroga de suspensión.	Antes del siguiente comité
FINDETER	Mantener la actualización semanal de la base de seguimiento consolidada de los 45 proyectos y remitirla todos los viernes a los correos del Ministerio.	Semanal – Todos los viernes
AICO / FINDETER (acompañamiento)	Radicar oportunamente la cuenta de cobro del Proyecto 28 para garantizar trámite antes del cierre financiero de la fiducia.	Antes del 16 de diciembre de 2024
Ministerio del Interior y FINDETER	Evaluar internamente la postura jurídica relacionada con la representación legal de AICO y definir un criterio unificado entre el Ministerio y FINDETER.	Antes del próximo comité de seguimiento
Ministerio del Interior	Presentar consulta directa mediante derecho de petición a la Cámara de Comercio de Pasto solicitando concepto sobre los efectos jurídicos de la renuncia, inscripción suspendida y representación legal vigente de AICO.	Máximo dentro de 5 días hábiles
Ministerio del Interior	Revisar documentación, anticipar observaciones y coordinar acompañamiento jurídico para evitar retrasos en proyectos ajustados a plazos de 3 meses.	Continuo – Revisión permanente
FINDETER	Identificar riesgos de siniestros por la situación de representación legal de AICO y proponer medidas de contingencia para evitar afectación a los proyectos en ejecución.	Próximo comité

Anexos: Presentación

Proyectó: Andrés Felipe Arango Arias
Revisó: Camila Mejía Liévano, Edwin Ulloa, Contratistas

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) V...

jueves, 27 de noviembre de 2025 de 11:00 a 13:00

Unirse | Chat | Reunión de Microsoft Teams

Detalles de la reunión | Conclusiones de la reunión (9)

Cordial saludo,

Con relación al apoyo a la supervisión que se adelanta a través de la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías, respecto a la ejecución del CONVENIO 2488-2024, cuyo objeto es: "Prestar la asistencia técnica, administrativa, operativa y financiera en el desarrollo de los proyectos priorizados por el ministerio del interior en el marco de los compromisos orientados al cumplimiento del decreto 2194 del 2013 y a la protección, promoción y fortalecimiento integral de los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas."

Nos permitimos informarle que se convoca reunión de seguimiento para el día jueves 27 de Noviembre de 2025.
Modalidad: Virtual
Hora: A partir de las 3:00 PM.

Se sugiere el presente orden del día para el comité, si se tiene alguna sugerencia favor indicarla por este medio y se socializará previo a la aprobación del orden del día

1. Socialización del estado general del Contrato Interadministrativo 2488 de 2024 que incluya:
- Estado individual de avance físico de cada uno de los convenios derivados.
- Estado individual de avance financiero de cada uno de los convenios derivados.
- Análisis del avance programado a la fecha vs el avance reportado en la última reunión de seguimiento realizada el pasado 11 de noviembre de 2025.
- Situaciones particulares a tener en cuenta que hayan impedido el normal desarrollo en la ejecución en cada convenio derivado (ej. Orden público, ola invernal, mano de ora, estado representación legal AICO y afectaciones en la ejecución de los convenios, entre otros).

2. Estado Financiero del proyecto, pagos realizados a ejecutores y estado de rendimientos financieros.

3. Estado convenios firmados con AICO y análisis de la representación legal.

4. Estado proyectos en estructuración y pendiente de firma de acta de inicio

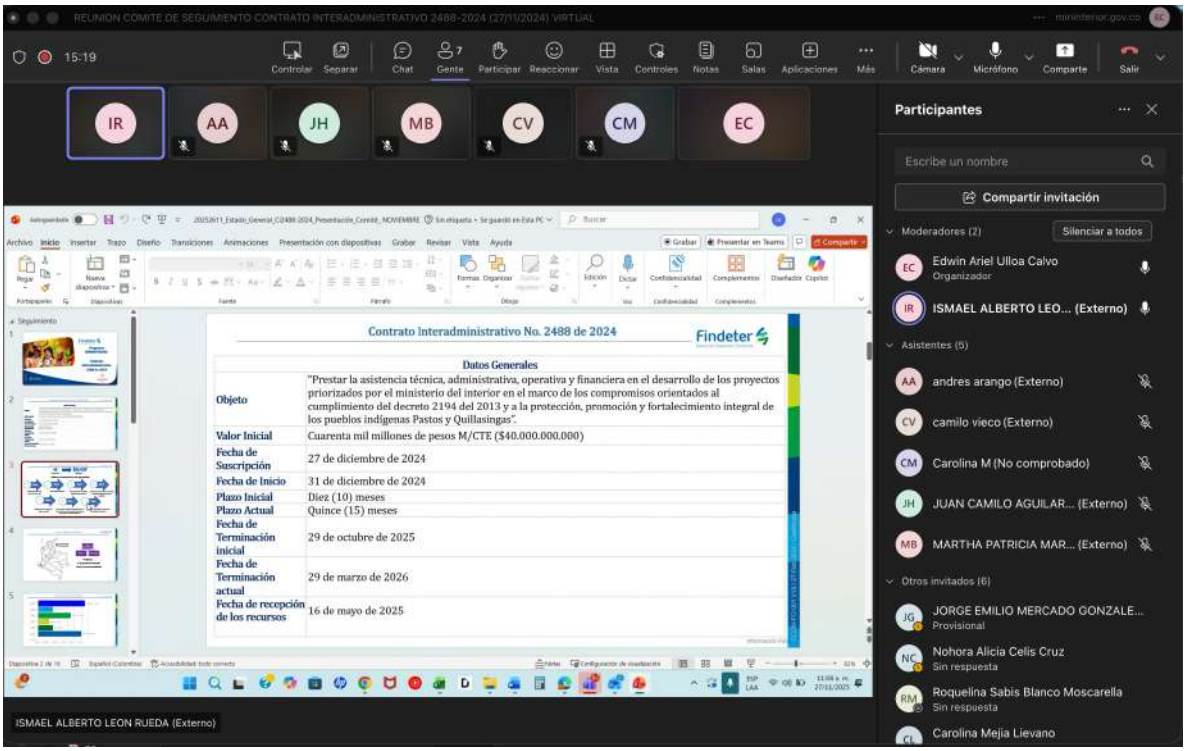
Invitados

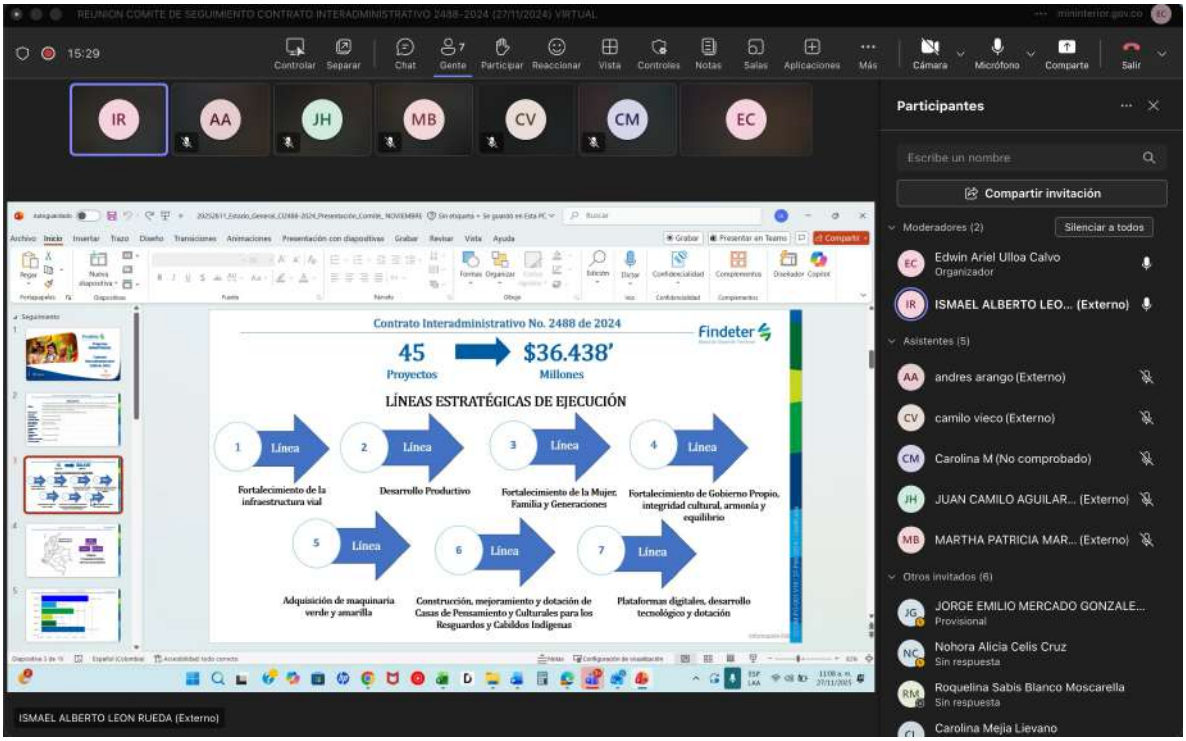
Organizador
- EA Edwin Ariel Ulloa Calvo — Obligatorio

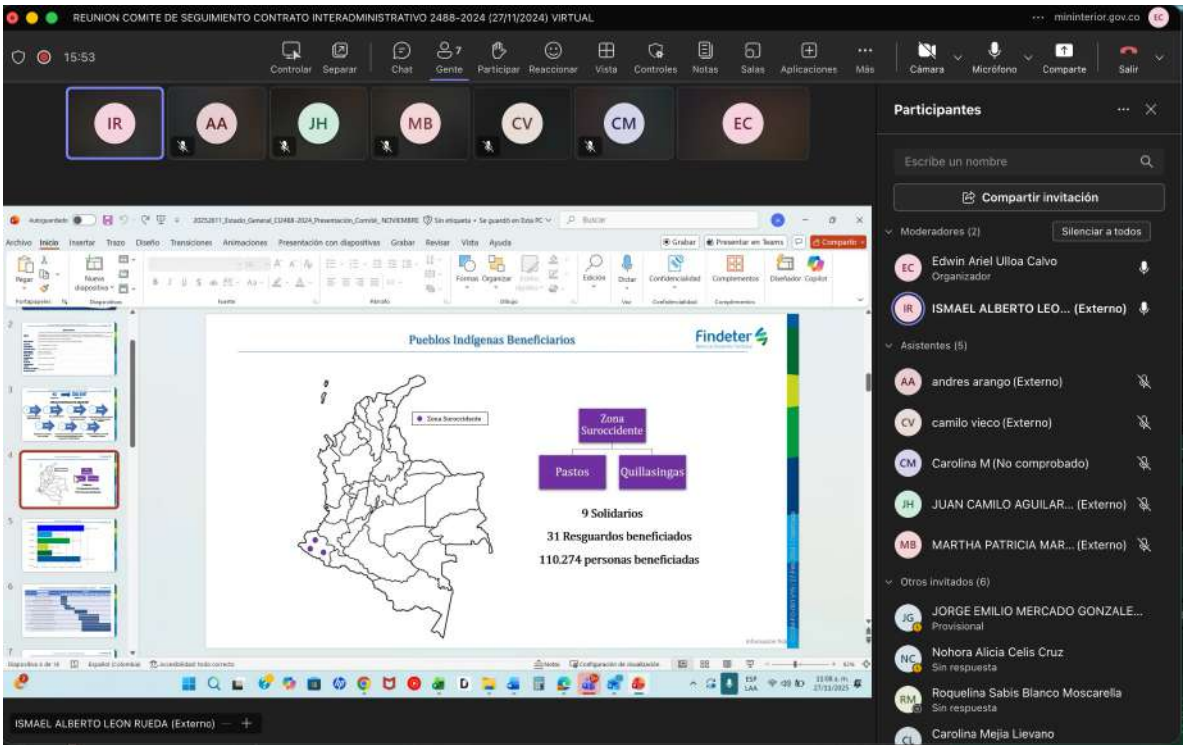
2 aceptada
- IA ISMAEL ALBERTO LEON R... — Obligatorio
- AA Andres Arango — Obligatorio

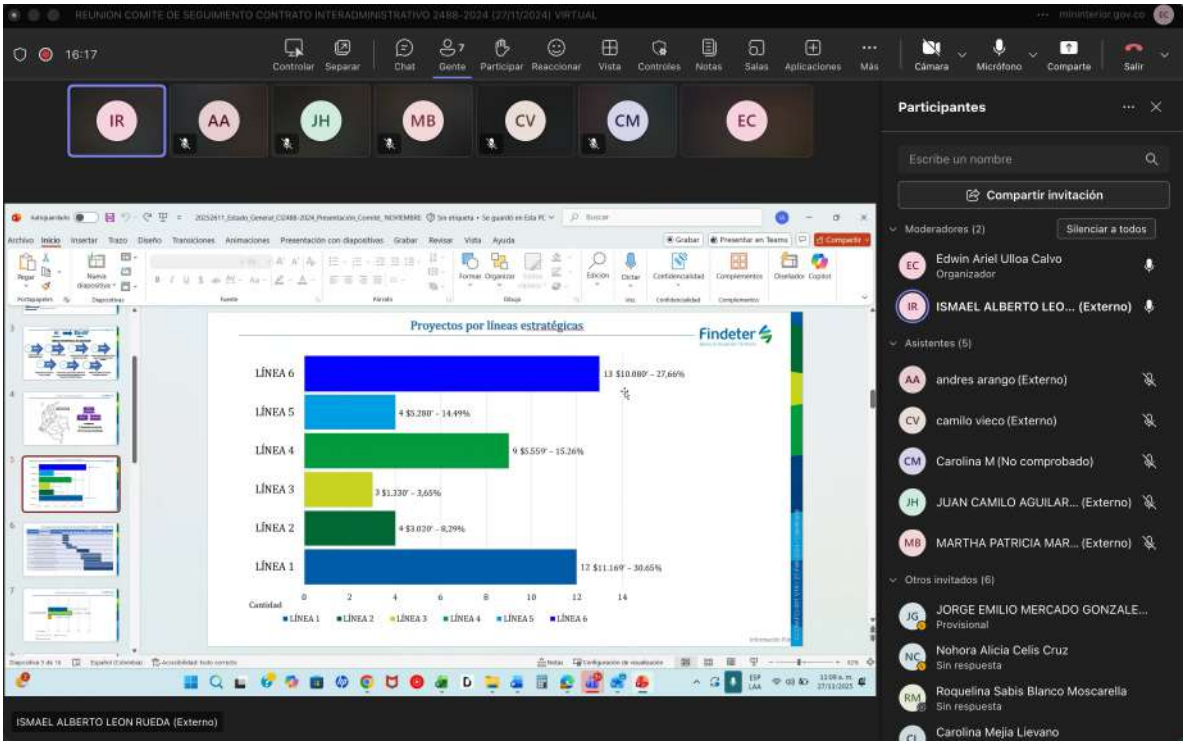
1 provisional
- JE JORGE EMILIO MERCADO... — Obligatorio

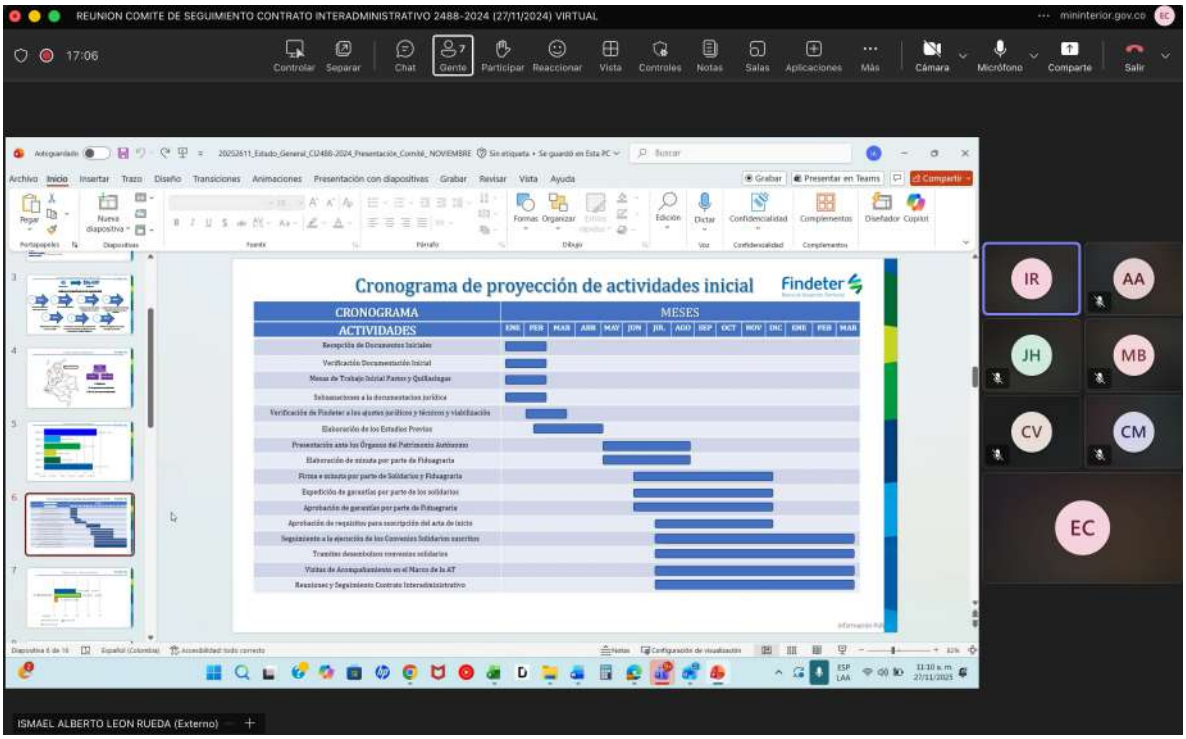
8 no respondida
- MP MARTHA PATRICIA MARTI... — Obligatorio
- JC JUAN CAMILO AGUILAR H... — Obligatorio
- NA Nohora Alicia Celis Cruz — Obligatorio
- RS Roquelina Sabis Blanco Mo... — Obligatorio
- CM Carolina Mejia Lievano — Obligatorio
- MR Merardo Rivera Mosquera — Obligatorio
- CA Camilo Alfredo Vieco Merla... — Obligatorio
- CV camilo vieco — Obligatorio

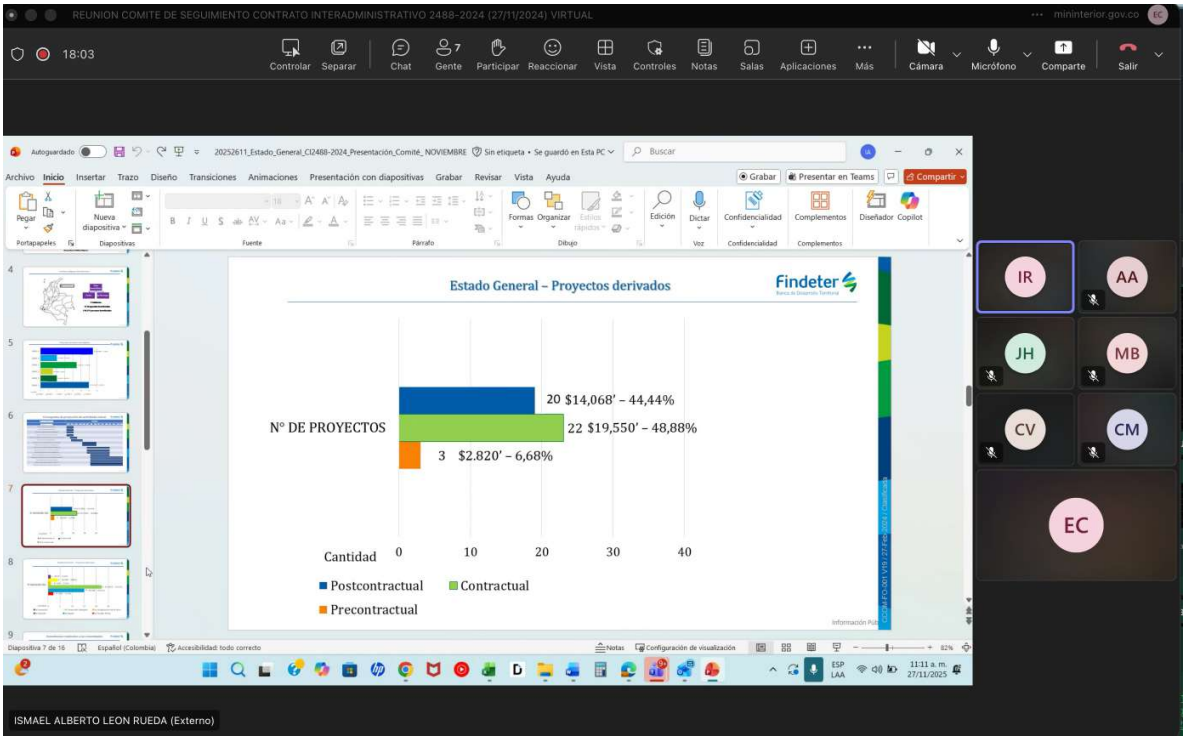

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
15:19
Participantes
Contrato Interadministrativo No. 2488 de 2024
Findeter
Datos Generales
Objeto
"Prestar la asistencia técnica, administrativa, operativa y financiera en el desarrollo de los proyectos priorizados por el ministerio del interior en el marco de los compromisos orientados al cumplimiento del decreto 2194 del 2013 y a la protección, promoción y fortalecimiento integral de los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas".
Valor Inicial
Cuarenta mil millones de pesos M/CTE ($40.000.000.000)
Fecha de Suscripción
27 de diciembre de 2024
Fecha de Inicio
31 de diciembre de 2024
Plazo Inicial
Diez (10) meses
Plazo Actual
Quince (15) meses
Fecha de Terminación inicial
29 de octubre de 2025
Fecha de Terminación actual
29 de marzo de 2026
Fecha de recepción de los recursos
16 de mayo de 2025
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

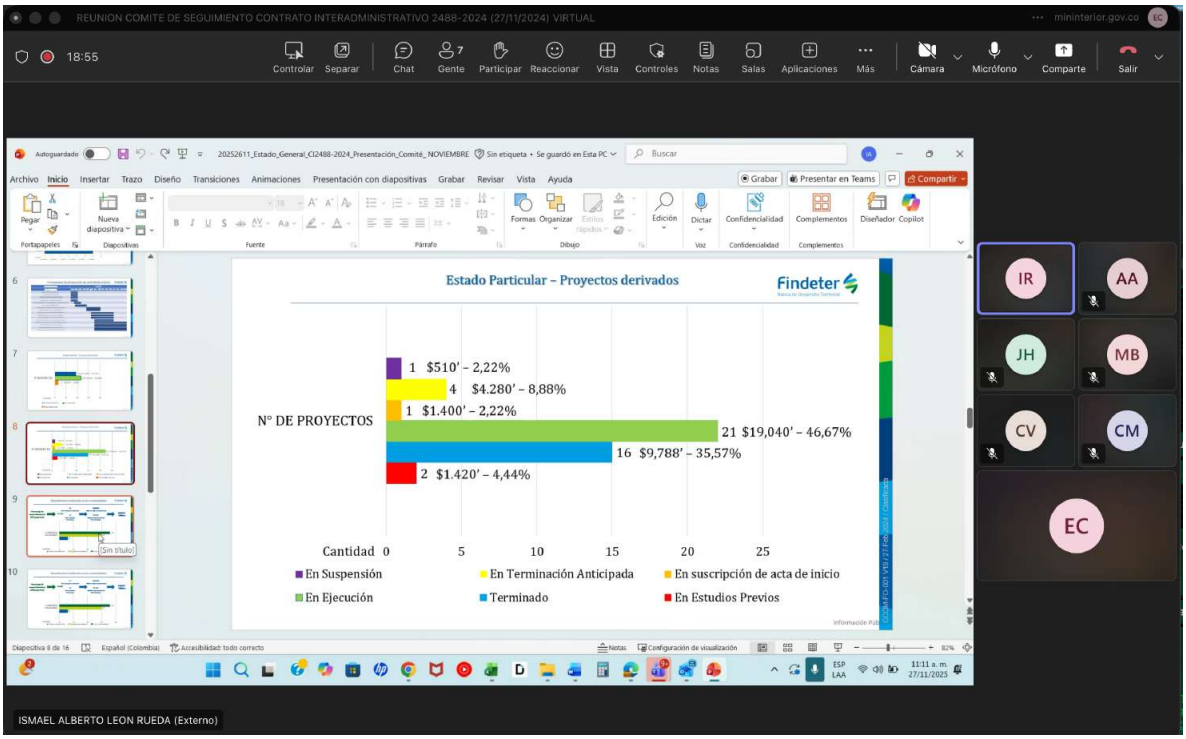

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
15:29
Participantes
Contrato Interadministrativo No. 2488 de 2024
Findeter
45
Proyectos
$36.438'
Millones
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE EJECUCIÓN
1 Línea
Fortalecimiento de la infraestructura vial
2 Línea
Desarrollo Productivo
3 Línea
Fortalecimiento de la Mujer, Familia y Generaciones
4 Línea
Fortalecimiento de Gobierno Propio, integridad cultural, armonía y equilibrio
5 Línea
Adquisición de maquinaria verde y amarilla
6 Línea
Construcción, mejoramiento y dotación de Casas de Pensamiento y Culturales para los Resguardos y Cabildos Indígenas
7 Línea
Plataformas digitales, desarrollo tecnológico y dotación
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

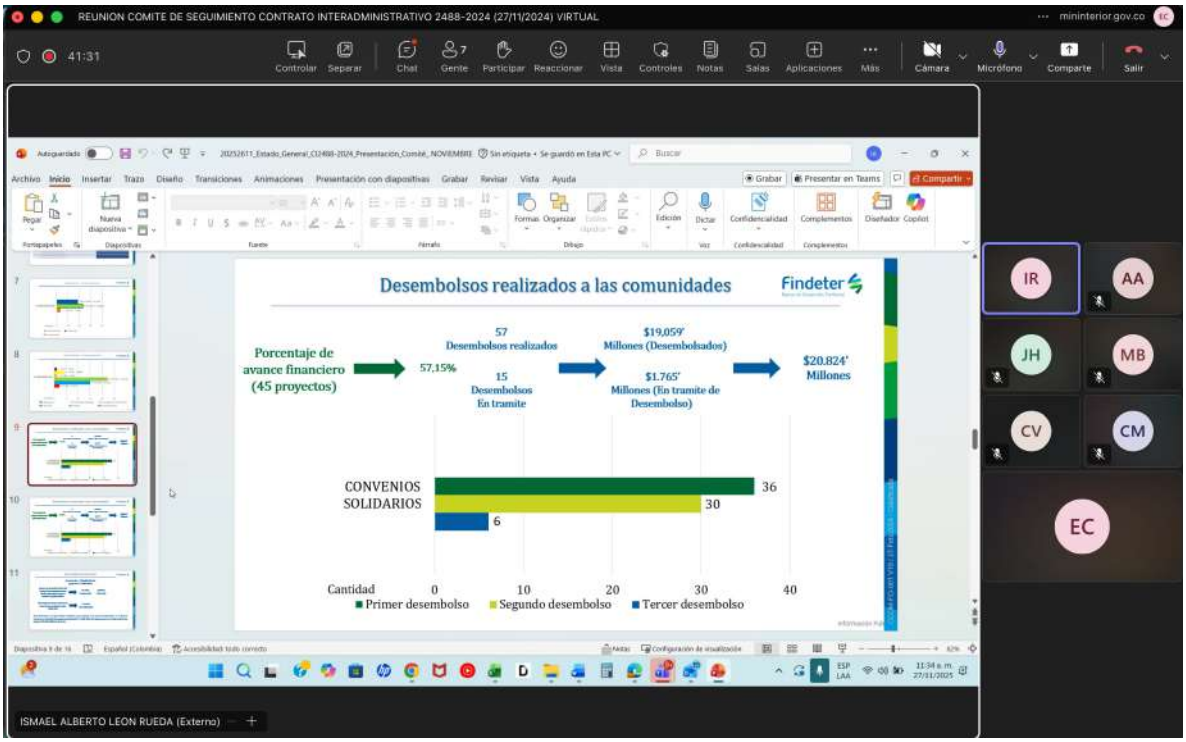

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
mininterior.gov.co
15:53
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
IR
AA
JH
MB
CV
CM
EC
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
Moderadores (2)
Silenciar a todos
Edwin Ariel Ulloa Calvo
Organizador
ISMAEL ALBERTO LEO... (Externo)
Asistentes (5)
andres arango (Externo)
camilo vieco (Externo)
Carolina M (No comprobado)
JUAN CAMILO AGUILAR... (Externo)
MARTHA PATRICIA MAR... (Externo)
Otros invitados (6)
JORGE EMILIO MERCADO GONZALE...
Provisional
Nohora Alicia Celis Cruz
Sin respuesta
Roquelina Sabis Blanco Moscarella
Sin respuesta
Carolina Mejia Lievano
Pueblos Indígenas Beneficiarios
Findeter
Zona Suroccidente
Pastos
Quillasingas
9 Solidarios
31 Resguardos beneficiados
110.274 personas beneficiadas
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

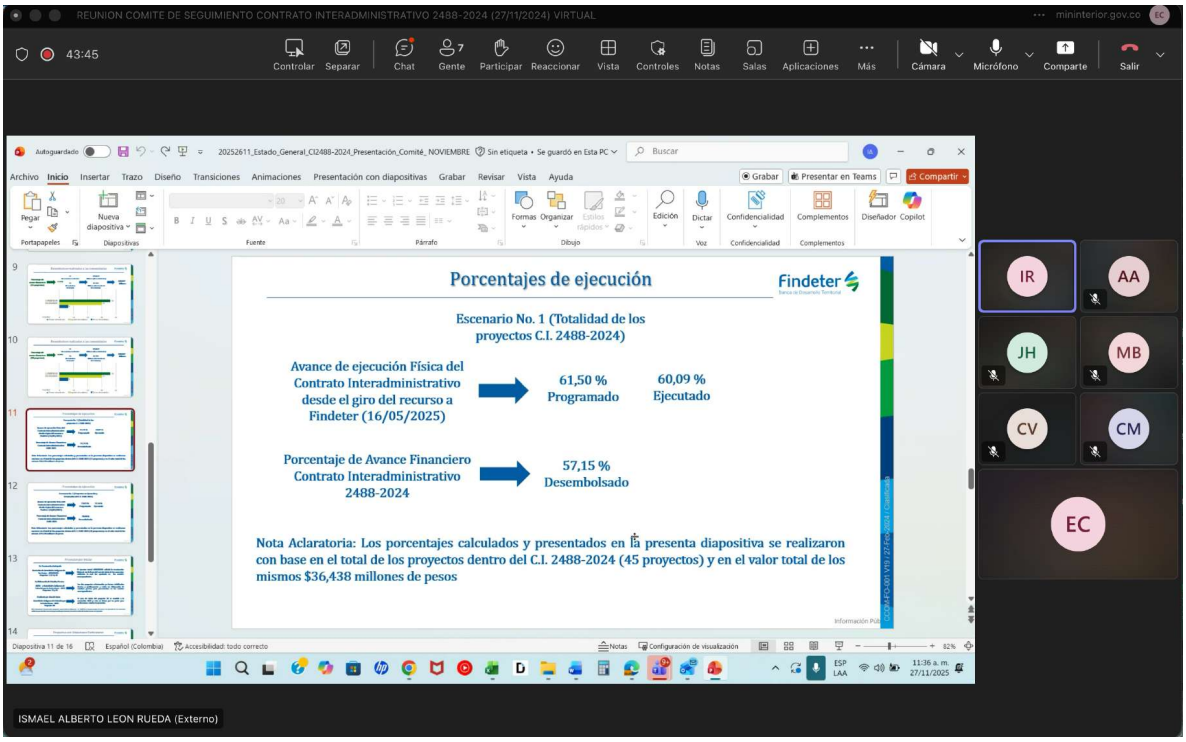

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
mininterior.gov.co
16:17
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
IR
AA
JH
MB
CV
CM
EC
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
Moderadores (2)
Silenciar a todos
Edwin Ariel Ulloa Calvo
Organizador
ISMAEL ALBERTO LEO... (Externo)
Asistentes (5)
andres arango (Externo)
camilo vieco (Externo)
Carolina M (No comprobado)
JUAN CAMILO AGUILAR... (Externo)
MARTHA PATRICIA MAR... (Externo)
Otros invitados (6)
JORGE EMILIO MERCADO GONZALE...
Provisional
Nohora Alicia Celis Cruz
Sin respuesta
Roquelina Sabis Blanco Moscarella
Sin respuesta
Carolina Mejia Lievano
Proyectos por líneas estratégicas
Findeter
LÍNEA 6
LÍNEA 5
LÍNEA 4
LÍNEA 3
LÍNEA 2
LÍNEA 1
13 $10.080' - 27,66%
4 $5.280' - 14,49%
9 $5.559' - 15,26%
3 $1.330' - 3,65%
4 $3.020' - 8,29%
12 $11.169' - 30,65%
Cantidad
0
2
4
6
8
10
12
14
LÍNEA 1
LÍNEA 2
LÍNEA 3
LÍNEA 4
LÍNEA 5
LÍNEA 6
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

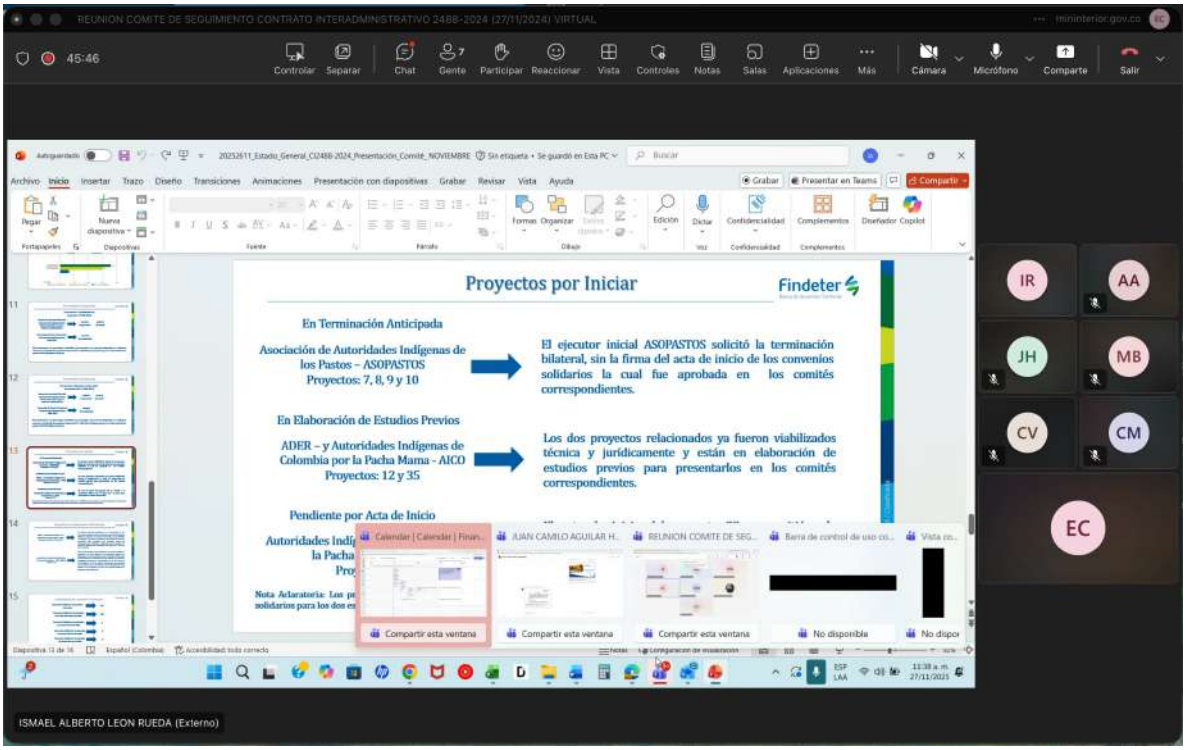

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
mininterior.gov.co
17:06
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Cronograma de proyección de actividades inicial
Findeter
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
Recepción de Documentos Iniciales
Verificación Documentación Inicial
Mesas de Trabajo Inicial Fantor y Quillacinga
Subsanaciones a la documentacion jurídica
Verificación de Findeter a los ajustes jurídicos y técnicos y viabilización
Elaboración de los Estudios Previos
Presentación ante los Órganos del Patrimonio Autónomo
Elaboración de minuta por parte de Fiduagraria
Firma e minuta por parte de Solidarios y Fiduagraria
Expedición de garantías por parte de los solidarios
Aprobación de garantías por parte de Fiduagraria
Aprobación de requisitos para suscripción del acta de inicio
Seguimiento a la ejecución de los Convenios Solidarios suscritos
Tramites desembolsos convenios solidarios
Visitas de Acompañamiento en el Marco de la AT
Reuniones y Seguimiento Contrato Interadministrativo
IR
AA
JH
MB
CV
CM
EC
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

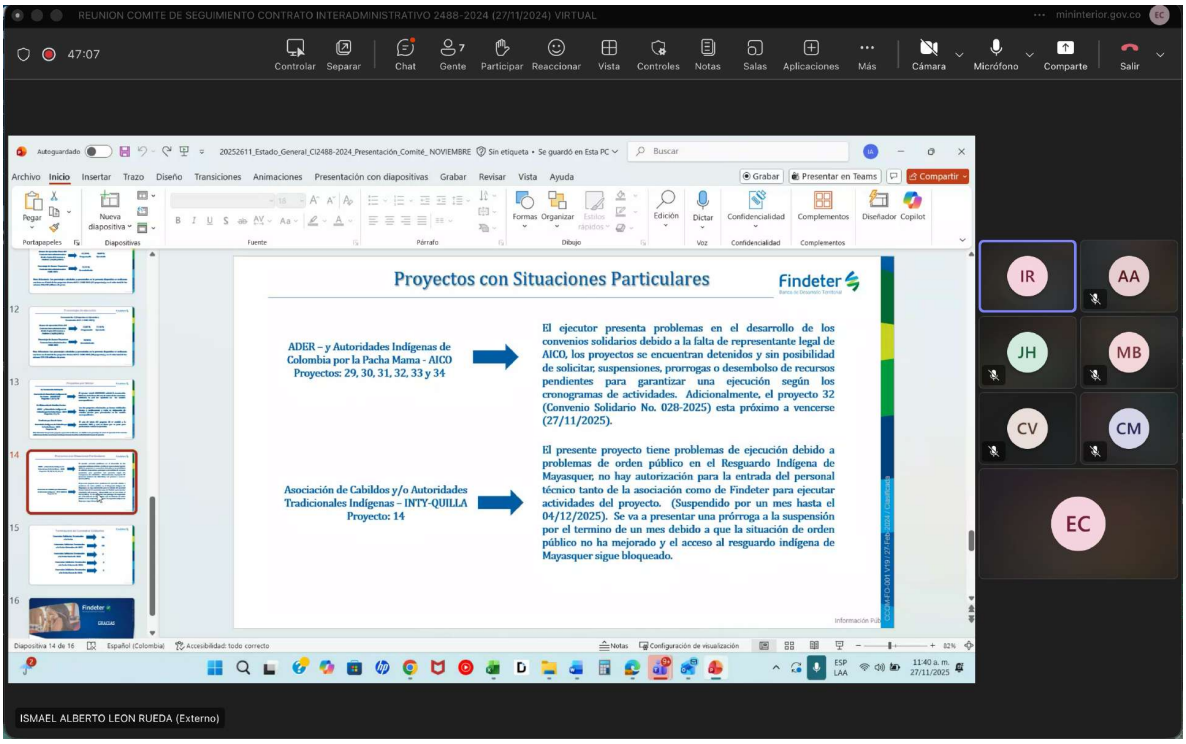

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
mininterior.gov.co
18:03
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Estado General – Proyectos derivados
Findeter
N° DE PROYECTOS
20 $14,068' – 44,44%
22 $19,550' – 48,88%
3 $2.820' – 6,68%
Cantidad
0
10
20
30
40
Postcontractual
Contractual
Precontractual
IR
AA
JH
MB
CV
CM
EC
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

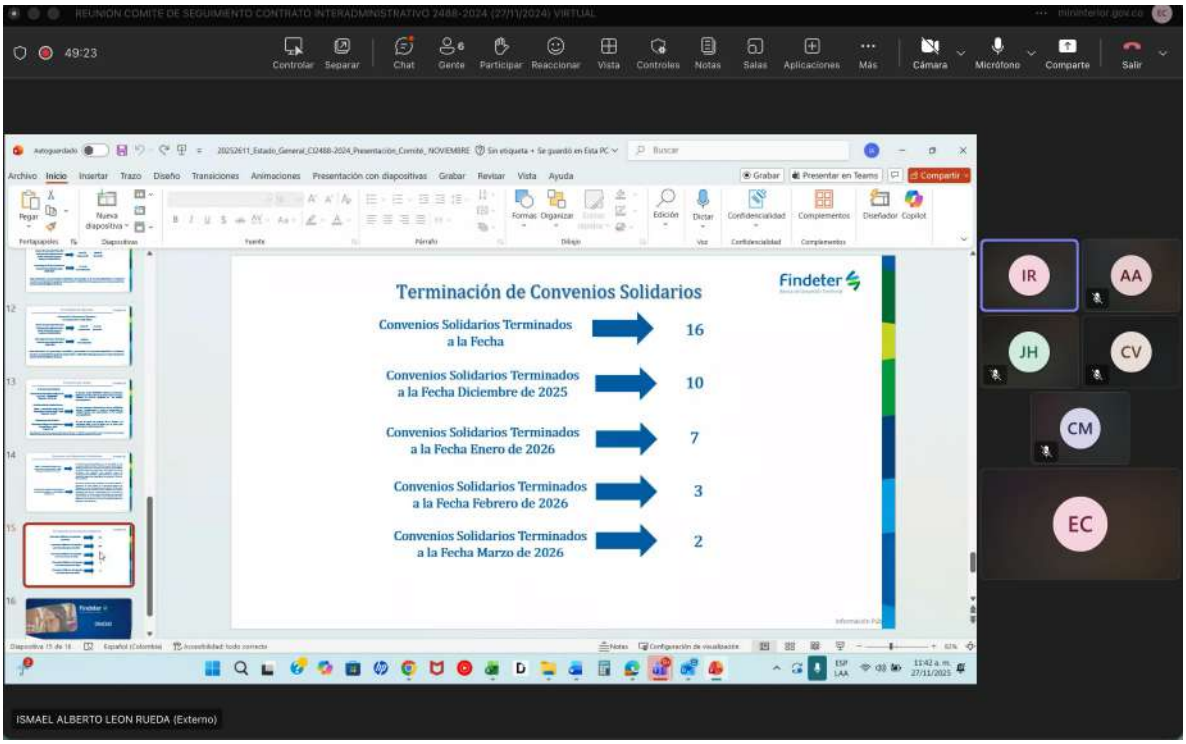

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
18:55
Estado Particular – Proyectos derivados
Findeter
N° DE PROYECTOS
1 $510' – 2,22%
4 $4.280' – 8,88%
1 $1.400' – 2,22%
21 $19,040' – 46,67%
16 $9,788' – 35,57%
2 $1.420' – 4,44%
Cantidad 0 5 10 15 20 25
En Suspensión
En Terminación Anticipada
En suscripción de acta de inicio
En Ejecución
Terminado
En Estudios Previos
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

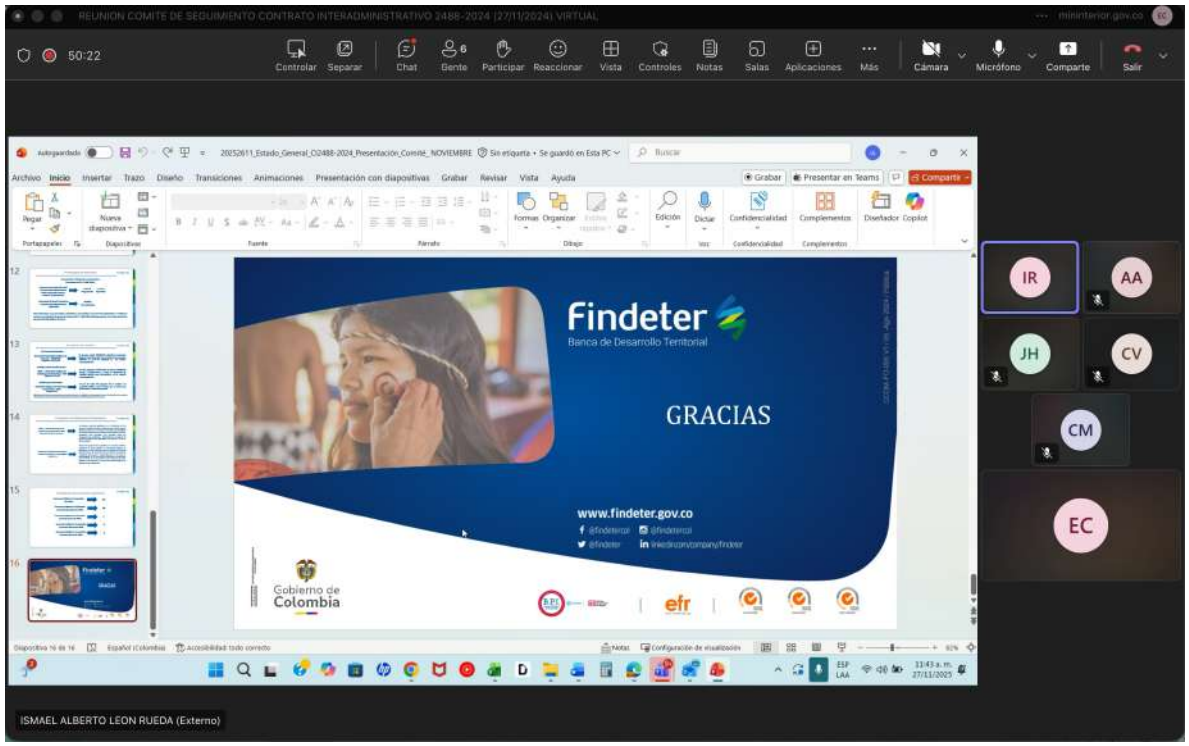

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
41:31
Desembolsos realizados a las comunidades
Findeter
Porcentaje de avance financiero (45 proyectos)
57,15%
57 Desembolsos realizados
$19,059' Millones (Desembolsados)
15 Desembolsos En tramite
$1.765' Millones (En tramite de Desembolso)
$20.824' Millones
CONVENIOS SOLIDARIOS
36
30
6
Cantidad 0 10 20 30 40
Primer desembolso
Segundo desembolso
Tercer desembolso
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

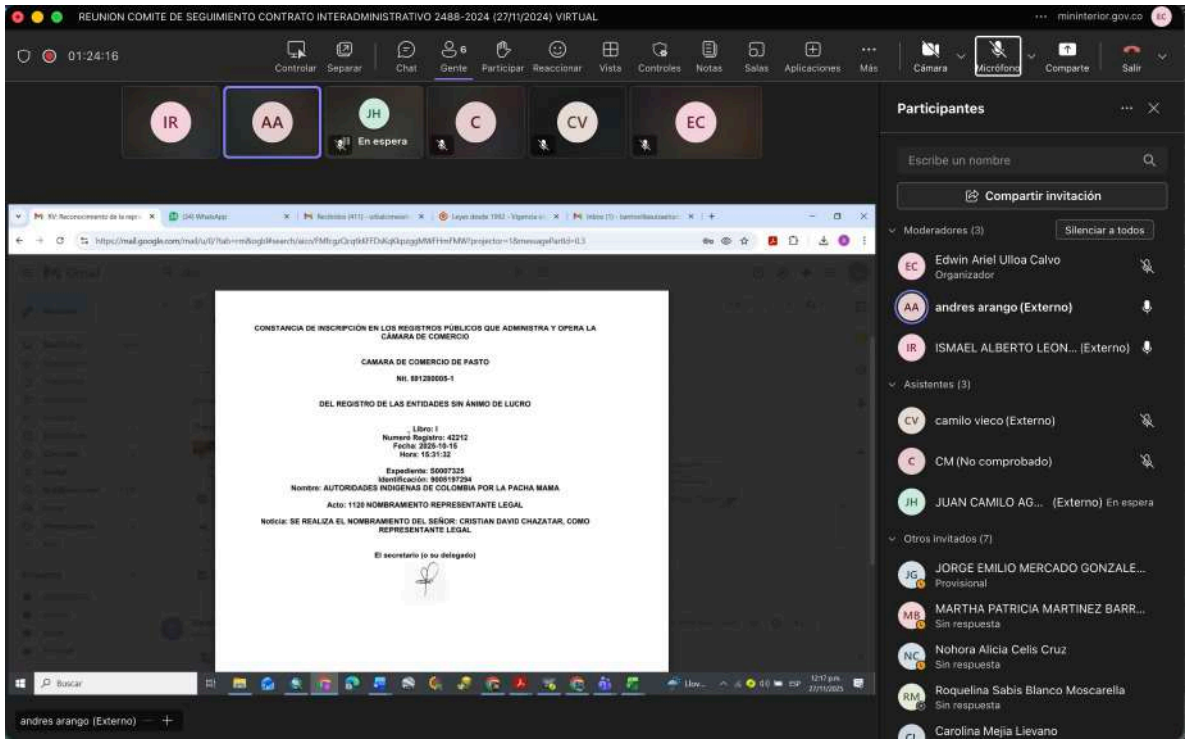

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
43:45
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Porcentajes de ejecución
Findeter
Escenario No. 1 (Totalidad de los proyectos C.I. 2488-2024)
Avance de ejecución Física del Contrato Interadministrativo desde el giro del recurso a Findeter (16/05/2025)
61,50 % Programado
60,09 % Ejecutado
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interadministrativo 2488-2024
57,15 % Desembolsado
Nota Aclaratoria: Los porcentajes calculados y presentados en la presenta diapositiva se realizaron con base en el total de los proyectos dentro del C.I. 2488-2024 (45 proyectos) y en el valor total de los mismos $36,438 millones de pesos
IR
AA
JH
MB
CV
CM
EC
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

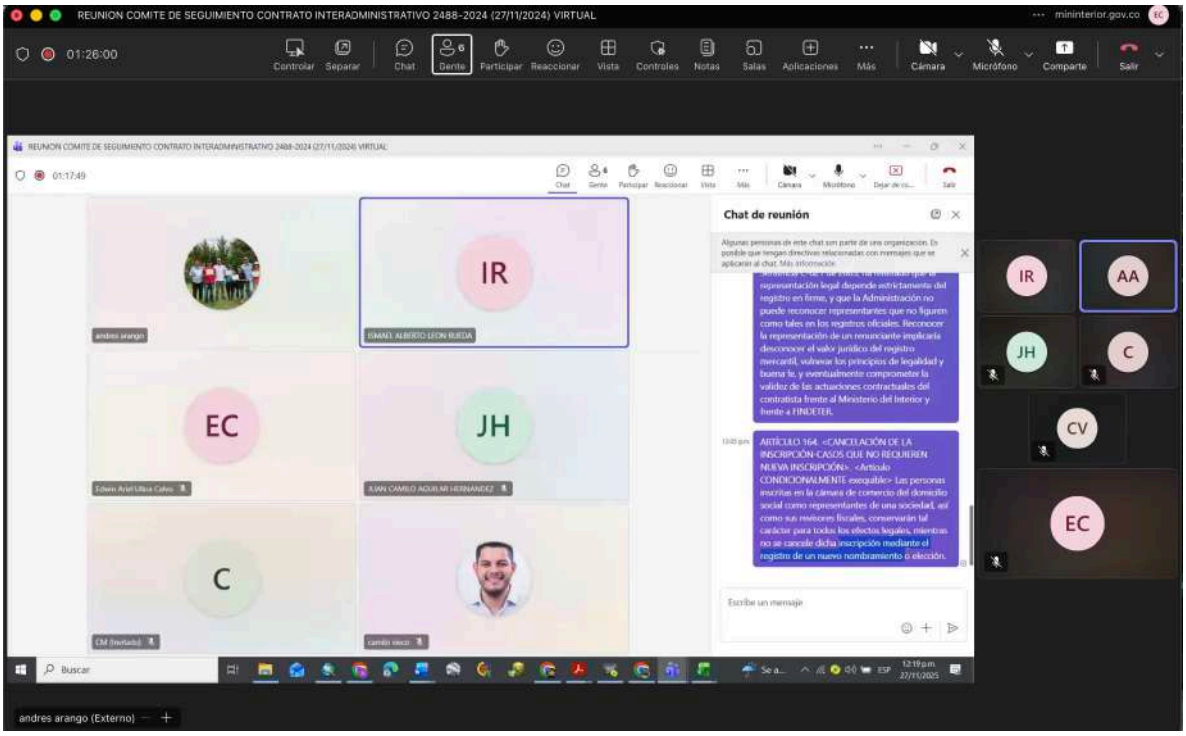

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
45:46
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Proyectos por Iniciar
Findeter
En Terminación Anticipada
Asociación de Autoridades Indígenas de los Pastos – ASOPASTOS
Proyectos: 7, 8, 9 y 10
El ejecutor inicial ASOPASTOS solicitó la terminación bilateral, sin la firma del acta de inicio de los convenios solidarios la cual fue aprobada en los comités correspondientes.
En Elaboración de Estudios Previos
ADER – y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO
Proyectos: 12 y 35
Los dos proyectos relacionados ya fueron viabilizados técnica y jurídicamente y están en elaboración de estudios previos para presentarlos en los comités correspondientes.
Pendiente por Acta de Inicio
Compartir esta ventana
Compartir esta ventana
Compartir esta ventana
No disponible
IR
AA
JH
MB
CV
CM
EC
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

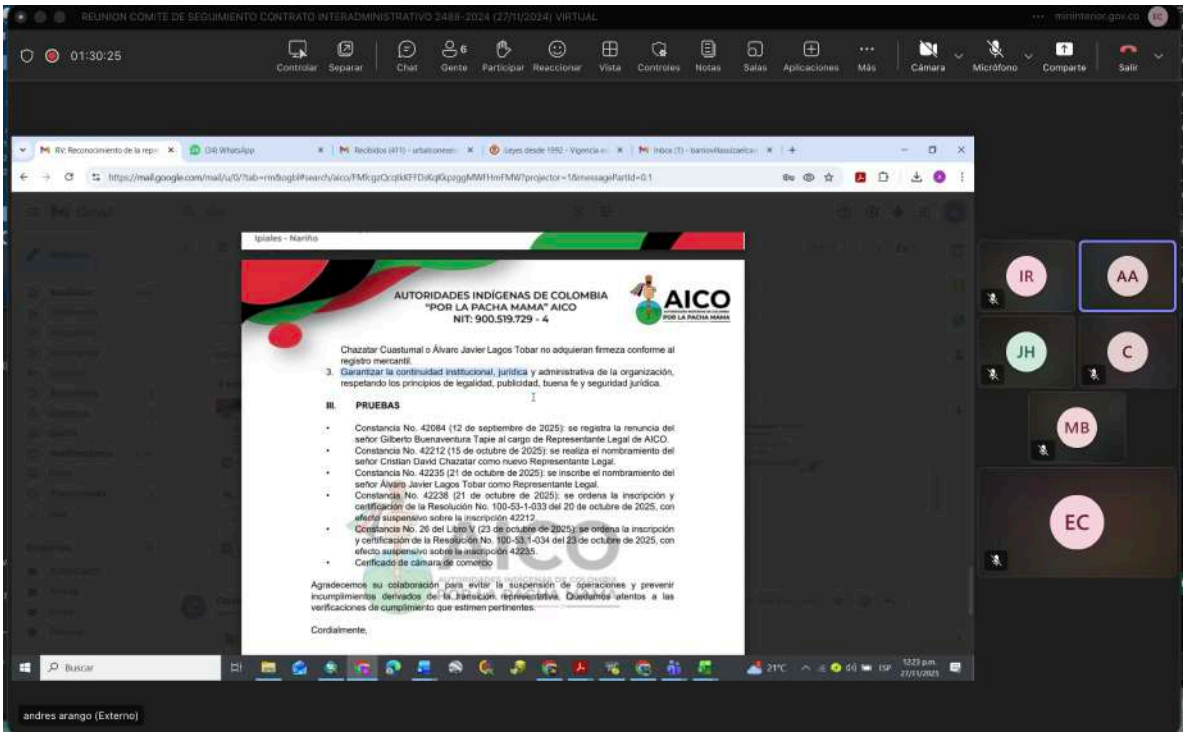

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
47:07
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Proyectos con Situaciones Particulares
Findeter
ADER – y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO Proyectos: 29, 30, 31, 32, 33 y 34
El ejecutor presenta problemas en el desarrollo de los convenios solidarios debido a la falta de representante legal de AICO, los proyectos se encuentran detenidos y sin posibilidad de solicitar, suspensiones, prorrogas o desembolso de recursos pendientes para garantizar una ejecución según los cronogramas de actividades. Adicionalmente, el proyecto 32 (Convenio Solidario No. 028-2025) esta próximo a vencerse (27/11/2025).
Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas – INTY-QUILLA Proyecto: 14
El presente proyecto tiene problemas de ejecución debido a problemas de orden público en el Resguardo Indígena de Mayasquer, no hay autorización para la entrada del personal técnico tanto de la asociación como de Findeter para ejecutar actividades del proyecto. (Suspendido por un mes hasta el 04/12/2025). Se va a presentar una prórroga a la suspensión por el termino de un mes debido a que la situación de orden público no ha mejorado y el acceso al resguardo indígena de Mayasquer sigue bloqueado.
IR
AA
JH
MB
CV
CM
EC
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

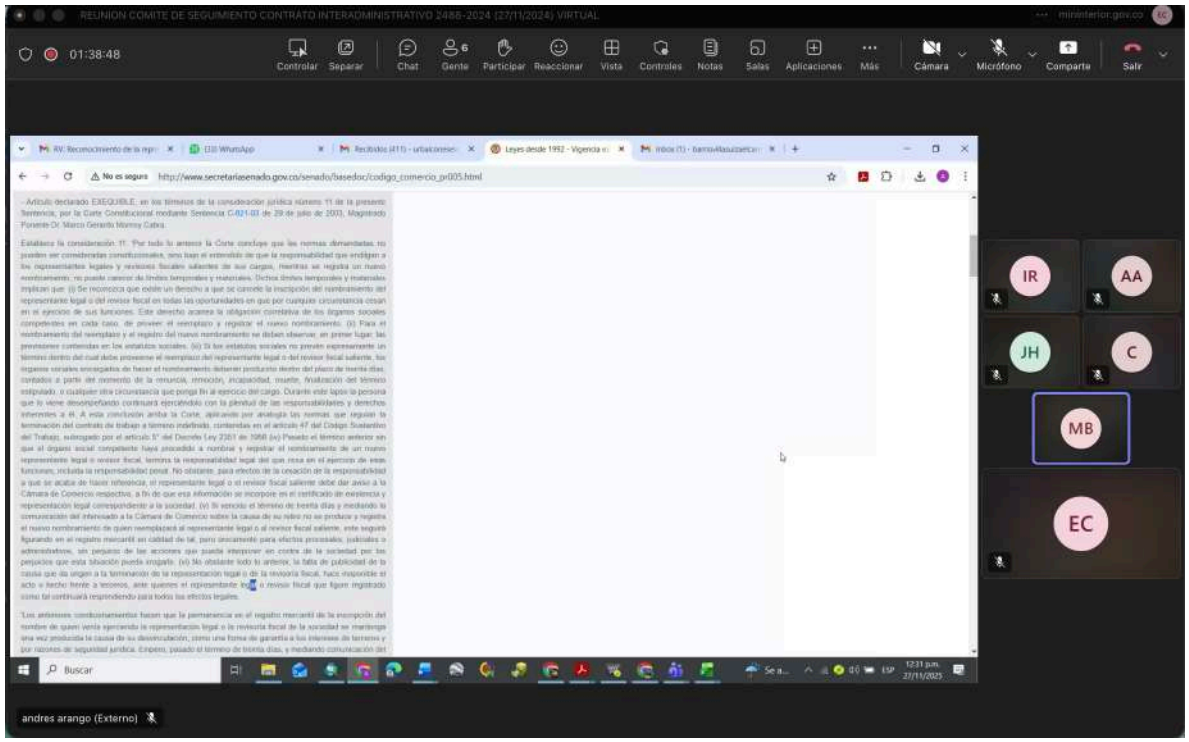

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
49:23
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Terminación de Convenios Solidarios
Findeter
Convenios Solidarios Terminados a la Fecha
16
Convenios Solidarios Terminados a la Fecha Diciembre de 2025
10
Convenios Solidarios Terminados a la Fecha Enero de 2026
7
Convenios Solidarios Terminados a la Fecha Febrero de 2026
3
Convenios Solidarios Terminados a la Fecha Marzo de 2026
2
IR
AA
JH
CV
CM
EC
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)

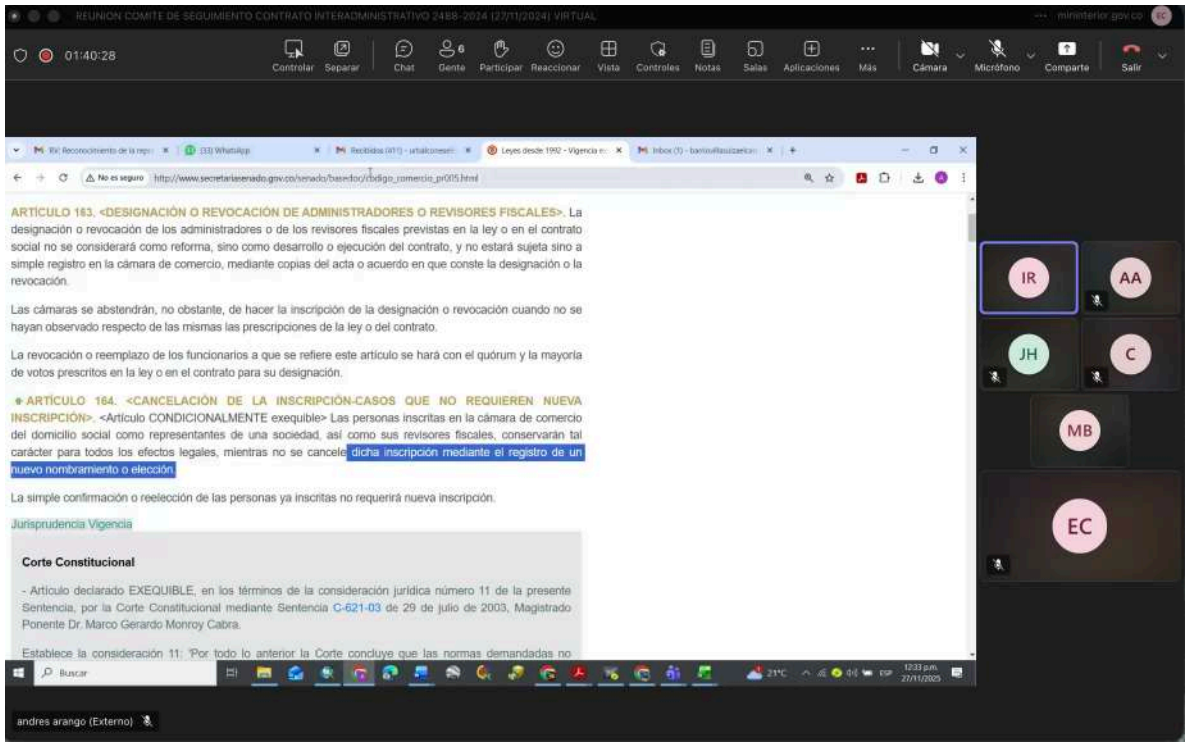

REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
50:22
Findeter
Banca de Desarrollo Territorial
GRACIAS
www.findeter.gov.co
Gobierno de Colombia
IR
AA
JH
CV
CM
EC
ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA (Externo)


REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
01:24:16
En espera
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS QUE ADMINISTRA Y OPERA LA CÁMARA DE COMERCIO
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO
NIt. 891280005-1
DEL REGISTRO DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Libro: I
Numero Registro: 42212
Fecha: 2025-10-15
Hora: 15:31:32
Expediente: S0007325
Identificación: 9005197294
Nombre: AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA MAMA
Acto: 1120 NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
Noticia: SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR: CRISTIAN DAVID CHAZATAR, COMO REPRESENTANTE LEGAL
El secretario (o su delegado)
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
Moderadores (3)
Silenciar a todos
Edwin Ariel Ulloa Calvo
Organizador
andres arango (Externo)
ISMAEL ALBERTO LEON... (Externo)
Asistentes (3)
camilo vieco (Externo)
CM (No comprobado)
JUAN CAMILO AG... (Externo) En espera
Otros invitados (7)
JORGE EMILIO MERCADO GONZALE...
Provisional
MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARR...
Sin respuesta
Nohora Alicia Celis Cruz
Sin respuesta
Roquelina Sabis Blanco Moscarella
Sin respuesta
Carolina Mejia Lievano
andres arango (Externo)


REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
01:26:00
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Chat de reunión
IR
EC
JH
C
CV
AA
andres arango (Externo)


REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
01:30:25
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Ipiales - Nariño
AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA
"POR LA PACHA MAMA" AICO
NIT: 900.519.729 - 4
AICO
POR LA PACHA MAMA
Chazatar Cuastumal o Álvaro Javier Lagos Tobar no adquieran firmeza conforme al registro mercantil.
3. Garantizar la continuidad institucional, jurídica y administrativa de la organización, respetando los principios de legalidad, publicidad, buena fe y seguridad jurídica.
III. PRUEBAS
Constancia No. 42084 (12 de septiembre de 2025): se registra la renuncia del señor Gilberto Buenaventura Tapie al cargo de Representante Legal de AICO.
Constancia No. 42212 (15 de octubre de 2025): se realiza el nombramiento del señor Cristian David Chazatar como nuevo Representante Legal.
Constancia No. 42235 (21 de octubre de 2025): se inscribe el nombramiento del señor Álvaro Javier Lagos Tobar como Representante Legal.
Constancia No. 42238 (21 de octubre de 2025): se ordena la inscripción y certificación de la Resolución No. 100-53.1-033 del 20 de octubre de 2025, con efecto suspensivo sobre la inscripción 42212.
Constancia No. 26 del Libro V (23 de octubre de 2025): se ordena la inscripción y certificación de la Resolución No. 100-53.1-034 del 23 de octubre de 2025, con efecto suspensivo sobre la inscripción 42235.
Certificado de cámara de comercio.
Agradecemos su colaboración para evitar la suspensión de operaciones y prevenir incumplimientos derivados de la transición representativa. Quedamos atentos a las verificaciones de cumplimiento que estimen pertinentes.
Cordialmente,
IR
AA
JH
C
MB
EC
andres arango (Externo)


REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
01:38:48
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr005.html
IR
AA
JH
C
MB
EC
andres arango (Externo)


REUNION COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488-2024 (27/11/2024) VIRTUAL
01:40:28
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr005.html
ARTÍCULO 163. <DESIGNACIÓN O REVOCACIÓN DE ADMINISTRADORES O REVISORES FISCALES>. La designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el contrato social no se considerará como reforma, sino como desarrollo o ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple registro en la cámara de comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste la designación o la revocación.
Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designación o revocación cuando no se hayan observado respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato.
La revocación o reemplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo se hará con el quórum y la mayoría de votos prescritos en la ley o en el contrato para su designación.
ARTÍCULO 164. <CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN-CASOS QUE NO REQUIEREN NUEVA INSCRIPCIÓN>. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección.
La simple confirmación o reelección de las personas ya inscritas no requerirá nueva inscripción.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE, en los términos de la consideración jurídica número 11 de la presente Sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-621-03 de 29 de julio de 2003, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Establece la consideración 11: 'Por todo lo anterior la Corte concluye que las normas demandadas no
IR
AA
JH
C
MB
EC
andres arango (Externo)

Asunto: RE: Comité Técnico No. 17 SUBCUENTA MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS. C.I. 2488 DE 2024
Fecha: martes, 4 de noviembre de 2025, 09:51:39 hora estándar de Colombia
De: Merardo Rivera Mosquera
A: Edwin Ariel Ulloa Calvo, MANUELA VELEZ URBINA, GERARDO ANDRES ALZATE ALZATE, JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ, Nohora Alicia Celis Cruz, JUAN CAMILO AGUILAR HERNANDEZ, ANDREA ALEXANDRA BOHORQUEZ LOPEZ, Carolina Mejia Lievano
CC: PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO, ANA MARIA MORALES QUINTERO, COMITÉS TECNICOS FINDTER, FEDERICO RAFAEL SEVERINI CAMPO, ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA, LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO, MARIA ANDREA ACEVEDO MANOSALVA, OMAR ANDRES PENALOZA PRADO, SANTIAGO CASTILLO TORO, SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS, SANDRA MILENA VELASCO RUA, LUISA FERNANDA MURCIA GUERRERO, CAMILO JOSE ALVAREZ BETIN, ANDREA CAROLINA CABARCAS TAMARA, ANA MARIA LEON VALENCIA, JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA, ALBA LUCIA GARCIA SUAREZ, ADRIAN BUSTOS FORERO, JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA

Cordial saludo,

Voto favorable

De: Edwin Ariel Ulloa Calvo <edwin.ulloa@mininterior.gov.co>
Enviado: martes, 4 de noviembre de 2025 9:48 a. m.
Para: MANUELA VELEZ URBINA <MVELEZU@findeter.gov.co>; GERARDO ANDRES ALZATE ALZATE <GAALZATE@findeter.gov.co>; JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ <JEMERCADO@findeter.gov.co>; Merardo Rivera Mosquera <merardo.rivera@mininterior.gov.co>; Nohora Alicia Celis Cruz <nohora.celis@mininterior.gov.co>; JUAN CAMILO AGUILAR HERNANDEZ <JCAGUILAR@findeter.gov.co>; ANDREA ALEXANDRA BOHORQUEZ LOPEZ <AABOHORQUEZ@findeter.gov.co>; Carolina Mejia Lievano <carolina.mejia@mininterior.gov.co>
Cc: PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO <pfchiquillo@findeter.gov.co>; ANA MARIA MORALES QUINTERO <AMMORALES@findeter.gov.co>; COMITÉS TECNICOS FINDTER <comitestecnicos.findeter@findeter.gov.co>; FEDERICO RAFAEL SEVERINI CAMPO <FRSEVERINI@findeter.gov.co>; ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA <IALEON@findeter.gov.co>; LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO <LATOLOSA@findeter.gov.co>; MARIA ANDREA ACEVEDO MANOSALVA <MACEVEDO@findeter.gov.co>; OMAR ANDRES PENALOZA PRADO <OAPENALOZA@findeter.gov.co>; SANTIAGO CASTILLO TORO <SCASTILL@findeter.gov.co>; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS <SMSANCHEZ@findeter.gov.co>; SANDRA MILENA VELASCO RUA <SMVELASC@findeter.gov.co>; LUISA FERNANDA MURCIA GUERRERO <LFMURCIA@findeter.gov.co>; CAMILO JOSE ALVAREZ BETIN <CJALVAREZ@findeter.gov.co>; ANDREA CAROLINA CABARCAS TAMARA <ACCABARC@findeter.gov.co>; ANA MARIA LEON VALENCIA <AMLEON@findeter.gov.co>; JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA <JISANCHE@findeter.gov.co>; ALBA LUCIA GARCIA SUAREZ <ALGARCIA@findeter.gov.co>; ADRIAN BUSTOS FORERO <ABUSTOS@findeter.gov.co>; JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA <JKPENAGOS@findeter.gov.co>
Asunto: Re: Comité Técnico No. 17 SUBCUENTA MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS. C.I. 2488 DE 2024

Buen día, por medio del presente emito **voto favorable**

Obtener Outlook para Mac

De: MANUELA VELEZ URBINA <MVELEZU@findeter.gov.co>
Fecha: viernes, 31 de octubre de 2025, 14:39
Para: GERARDO ANDRES ALZATE ALZATE <GAALZATE@findeter.gov.co>, JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ <JEMERCADO@findeter.gov.co>, Merardo Rivera Mosquera <merardo.rivera@mininterior.gov.co>, Nohora Alicia Celis Cruz <nohora.celis@mininterior.gov.co>, JUAN CAMILO AGUILAR HERNANDEZ <JCAGUILAR@findeter.gov.co>, ANDREA ALEXANDRA BOHORQUEZ LOPEZ <AABOHORQUEZ@findeter.gov.co>, Edwin Ariel Ulloa Calvo <edwin.ulloa@mininterior.gov.co>, Carolina Mejia Lievano <carolina.mejia@mininterior.gov.co>
CC: PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO <pfchiquillo@findeter.gov.co>, ANA MARIA MORALES QUINTERO <AMMORALES@findeter.gov.co>, COMITÉS TECNICOS FINDTER <comitestecnicos.findeter@findeter.gov.co>, FEDERICO RAFAEL SEVERINI CAMPO <FRSEVERINI@findeter.gov.co>, ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA <IALEON@findeter.gov.co>, LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO <LATOLOSA@findeter.gov.co>, MARIA ANDREA ACEVEDO MANOSALVA <MACEVEDO@findeter.gov.co>, OMAR ANDRES PENALOZA PRADO <OAPENALOZA@findeter.gov.co>, SANTIAGO CASTILLO TORO <SCASTILL@findeter.gov.co>, SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS <SMSANCHEZ@findeter.gov.co>, SANDRA MILENA VELASCO RUA <SMVELASC@findeter.gov.co>, LUISA FERNANDA MURCIA GUERRERO <LFMURCIA@findeter.gov.co>, CAMILO JOSE ALVAREZ BETIN <CJALVAREZ@findeter.gov.co>, ANDREA CAROLINA CABARCAS TAMARA <ACCABARC@findeter.gov.co>, ANA MARIA LEON VALENCIA <AMLEON@findeter.gov.co>, JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA <JISANCHE@findeter.gov.co>, ALBA LUCIA GARCIA SUAREZ <ALGARCIA@findeter.gov.co>, ADRIAN BUSTOS FORERO <ABUSTOS@findeter.gov.co>, JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA <JKPENAGOS@findeter.gov.co>
Asunto: Comité Técnico No. 17 SUBCUENTA MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS. C.I. 2488 DE 2024

Cordial saludo,

Nos permitimos citar a comité técnico No. 17 SUBCUENTA MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488 DE 2024 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 DE 2023, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Solicitud: Aprobar la suspensión por el término de un (01) mes del Convenio Solidario No. 037-PAF-ATMININTERIORCS-147-2025 cuyo objeto es “CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER AL RESGUARDO INDÍGENA DE MAYASQUER MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERVEREDALES” debido a los problemas de orden público y conflicto armado

en el Resguardo Indígena de Mayasquer, lo que ha imposibilitado la entrada del personal mínimo y los materiales al lugar de ejecución del proyecto.

3. Proposiciones y varios

Cordialmente,

Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada o clasificada que interesa únicamente a su destinatario. Si llegó a usted por error, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar de tal hecho al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Las opiniones contenidas en este mensaje o sus archivos no necesariamente coinciden con el criterio institucional de FINDETER. En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, se le informa que los datos personales que sean suministrados por este medio serán tratados de acuerdo con nuestra Política de Protección de Datos Personales que puede consultar en la página web www.findeter.gov.co. En cumplimiento a la Ley 1328 de 2009 se le informa que los procedimientos, responsables designados y canales establecidos para ejercer sus derechos como Consumidor Financiero pueden ser consultados en el siguiente enlace https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al-consumidor-financiero-sac

This message and its attachments may contain reserved or classified information that is of interest only to its recipient. If it reached you by mistake, you must completely delete it from your system, notify the sender of this fact and refrain in any case from divulging, reproducing or using it. The opinions contained in this message or its files do not necessarily coincide with the institutional criteria of FINDETER. In compliance with Law 1581 of 2012, you are informed that the personal data provided by this means will be treated in accordance with our Personal Data Protection Policy that can be consulted on the website www.findeter.gov.co. In compliance with Law 1328 of 2009 you are informed that the procedures, designated managers and channels established to exercise your rights as a Financial Consumer can be consulted at the following link https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al - consumer-financial-sac

Asunto:	Re: Comité Técnico No. 18 SUBCUENTA MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS. C.I. 2488 DE 2024
Fecha:	martes, 18 de noviembre de 2025, 10:46:34 hora estándar de Colombia
De:	Edwin Ariel Ulloa Calvo
A:	MANUELA VELEZ URBINA, GERARDO ANDRES ALZATE ALZATE, JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ, Merardo Rivera Mosquera, Nohora Alicia Celis Cruz, JUAN CAMILO AGUILAR HERNANDEZ, ANDREA ALEXANDRA BOHORQUEZ LOPEZ, Carolina Mejia Lievano
CC:	PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO, ANA MARIA MORALES QUINTERO, COMITÉS TECNICOS FINDTER, FEDERICO RAFAEL SEVERINI CAMPO, ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA, LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO, MARIA ANDREA ACEVEDO MANOSALVA, OMAR ANDRES PENALOZA PRADO, SANTIAGO CASTILLO TORO, SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS, SANDRA MILENA VELASCO RUA, LUISA FERNANDA MURCIA GUERRERO, CAMILO JOSE ALVAREZ BETIN, ANDREA CAROLINA CABARCAS TAMARA, ANA MARIA LEON VALENCIA, JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA, ALBA LUCIA GARCIA SUAREZ, ADRIAN BUSTOS FORERO, JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA, GRUPO COMITES PATRIMONIOS AUTONOMOS CCD
Datos adjuntos:	image001.png, image002.png

Buen día, por medio del presente se da **voto favorable**

Obtener Outlook para Mac

De: MANUELA VELEZ URBINA <MVELEZU@findeter.gov.co>
Fecha: martes, 18 de noviembre de 2025, 10:21
Para: GERARDO ANDRES ALZATE ALZATE <GAALZATE@findeter.gov.co>, JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ <JEMERCADO@findeter.gov.co>, Merardo Rivera Mosquera <merardo.rivera@mininterior.gov.co>, Nohora Alicia Celis Cruz <nohora.celis@mininterior.gov.co>, JUAN CAMILO AGUILAR HERNANDEZ <JCAGUILAR@findeter.gov.co>, ANDREA ALEXANDRA BOHORQUEZ LOPEZ <AABOHORQUEZ@findeter.gov.co>, Edwin Ariel Ulloa Calvo <edwin.ulloa@mininterior.gov.co>, Carolina Mejia Lievano <carolina.mejia@mininterior.gov.co>
CC: PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO <pfchiquillo@findeter.gov.co>, ANA MARIA MORALES QUINTERO <AMMORALES@findeter.gov.co>, COMITÉS TECNICOS FINDTER <comitestecnicos.findeter@findeter.gov.co>, FEDERICO RAFAEL SEVERINI CAMPO <FRSEVERINI@findeter.gov.co>, ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA <IALEON@findeter.gov.co>, LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO <LATOLOSA@findeter.gov.co>, MARIA ANDREA ACEVEDO MANOSALVA <MACEVEDO@findeter.gov.co>, OMAR ANDRES PENALOZA PRADO <OAPENALOZA@findeter.gov.co>, SANTIAGO CASTILLO TORO <SCASTILL@findeter.gov.co>, SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS <SMSANCHEZ@findeter.gov.co>, SANDRA MILENA VELASCO RUA <SMVELASC@findeter.gov.co>, LUISA FERNANDA MURCIA GUERRERO <LFMURCIA@findeter.gov.co>, CAMILO JOSE ALVAREZ BETIN <CJALVAREZ@findeter.gov.co>, ANDREA CAROLINA CABARCAS TAMARA <ACCABARC@findeter.gov.co>, ANA MARIA LEON VALENCIA <AMLEON@findeter.gov.co>, JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA <JISANCHE@findeter.gov.co>, ALBA LUCIA GARCIA

SUAREZ <ALGARCIA@findeter.gov.co>, ADRIAN BUSTOS FORERO <ABUSTOS@findeter.gov.co>, JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA <JKPENAGOS@findeter.gov.co>, GRUPO COMITES PATRIMONIOS AUTONOMOS CCD <GCPA_CCD@findeter.gov.co>
Asunto: Comité Técnico No. 18 SUBCUENTA MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS. C.I. 2488 DE 2024

Cordial saludo,

Nos permitimos citar a comité técnico No. 18 SUBCUENTA MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488 DE 2024 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 DE 2023, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Solicitud: Aprobación de acta de balance de mayores y menores cantidades al Convenio solidario No. 032-PAF-ATMININTERIOR-CS-144-2025 cuyo objeto es "(...) CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO Y CULTURAL MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA CASA DE PENSAMIENTO DEL CABILDO DE CATAMBUCO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO."
3. Proposiciones y varios

Link soportes: pastos y quillasingas

Cordialmente,

Manuela Vélez Urbina
Profesional
Jefatura de Contratación Derivada
PBX: (601) 623 0311 – 623 0388
Correo institucional: mvelezu@findeter.gov.co
www.findeter.gov.co

Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada o clasificada que interesa únicamente a su destinatario. Si llegó a usted por error, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar de tal hecho al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Las opiniones contenidas en este mensaje o sus archivos no necesariamente coinciden con el criterio institucional de FINDETER. En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, se le informa que los datos personales que sean suministrados por este medio serán tratados de acuerdo con nuestra Política de Protección de Datos Personales que puede consultar en la página web www.findeter.gov.co. En cumplimiento a la Ley 1328 de 2009 se le informa que los procedimientos, responsables designados y canales establecidos para ejercer sus derechos como Consumidor Financiero pueden ser consultados en el siguiente enlace https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al-consumidor-financiero-sac

This message and its attachments may contain reserved or classified information that is of interest only to its recipient. If it reached you by mistake, you

must completely delete it from your system, notify the sender of this fact and refrain in any case from divulging, reproducing or using it. The opinions contained in this message or its files do not necessarily coincide with the institutional criteria of FINDETER. In compliance with Law 1581 of 2012, you are informed that the personal data provided by this means will be treated in accordance with our Personal Data Protection Policy that can be consulted on the website www.findeter.gov.co. In compliance with Law 1328 of 2009 you are informed that the procedures, designated managers and channels established to exercise your rights as a Financial Consumer can be consulted at the following link https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al - consumer-financial-sac

---

Asunto:	Re: Comité Técnico No. 19 SUBCUENTA MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS. C.I. 2488 DE 2024
Fecha:	lunes, 24 de noviembre de 2025, 10:15:44 hora estándar de Colombia
De:	Nohora Alicia Celis Cruz
A:	Edwin Ariel Ulloa Calvo, MANUELA VELEZ URBINA, GERARDO ANDRES ALZATE ALZATE, JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ, Merardo Rivera Mosquera, JUAN CAMILO AGUILAR HERNANDEZ, ANDREA ALEXANDRA BOHORQUEZ LOPEZ, Carolina Mejia Lievano
CC:	PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO, ANA MARIA MORALES QUINTERO, COMITÉS TECNICOS FINDTER, FEDERICO RAFAEL SEVERINI CAMPO, ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA, LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO, MARIA ANDREA ACEVEDO MANOSALVA, OMAR ANDRES PENALOZA PRADO, SANTIAGO CASTILLO TORO, SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS, SANDRA MILENA VELASCO RUA, LUISA FERNANDA MURCIA GUERRERO, CAMILO JOSE ALVAREZ BETIN, ANDREA CAROLINA CABARCAS TAMARA, ANA MARIA LEON VALENCIA, JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA, ALBA LUCIA GARCIA SUAREZ, ADRIAN BUSTOS FORERO, JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA, GRUPO COMITES PATRIMONIOS AUTONOMOS CCD
Datos adjuntos:	image001.png

Cordial saludo

Cómo delegada de la DAIRM emito voto favorable.

Obtener Outlook para Android

From: Edwin Ariel Ulloa Calvo <edwin.ulloa@mininterior.gov.co>
Sent: Monday, November 24, 2025 5:45:14 AM
To: MANUELA VELEZ URBINA <MVELEZU@findeter.gov.co>; GERARDO ANDRES ALZATE ALZATE <GAALZATE@findeter.gov.co>; JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ <JEMERCADO@findeter.gov.co>; Merardo Rivera Mosquera <merardo.rivera@mininterior.gov.co>; Nohora Alicia Celis Cruz <nohora.celis@mininterior.gov.co>; JUAN CAMILO AGUILAR HERNANDEZ <JCAGUILAR@findeter.gov.co>; ANDREA ALEXANDRA BOHORQUEZ LOPEZ <AABOHORQUEZ@findeter.gov.co>; Carolina Mejia Lievano <carolina.mejia@mininterior.gov.co>
Cc: PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO <pfchiquillo@findeter.gov.co>; ANA MARIA MORALES QUINTERO <AMMORALES@findeter.gov.co>; COMITÉS TECNICOS FINDTER <comitestecnicos.findeter@findeter.gov.co>; FEDERICO RAFAEL SEVERINI CAMPO <FRSEVERINI@findeter.gov.co>; ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA <IALEON@findeter.gov.co>; LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO <LATOLOSA@findeter.gov.co>; MARIA ANDREA ACEVEDO MANOSALVA <MACEVEDO@findeter.gov.co>; OMAR ANDRES PENALOZA PRADO <OAPENALOZA@findeter.gov.co>; SANTIAGO CASTILLO TORO <SCASTILL@findeter.gov.co>; SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS <SMSANCHEZ@findeter.gov.co>; SANDRA MILENA VELASCO RUA <SMVELASC@findeter.gov.co>; LUISA FERNANDA MURCIA GUERRERO <LFMURCIA@findeter.gov.co>; CAMILO JOSE ALVAREZ BETIN <CJALVAREZ@findeter.gov.co>; ANDREA CAROLINA CABARCAS TAMARA <ACCABARC@findeter.gov.co>; ANA MARIA LEON VALENCIA <AMLEON@findeter.gov.co>; JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA <JISANCHE@findeter.gov.co>; ALBA LUCIA GARCIA SUAREZ <ALGARCIA@findeter.gov.co>; ADRIAN BUSTOS FORERO <ABUSTOS@findeter.gov.co>; JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA <JKPENAGOS@findeter.gov.co>; GRUPO COMITES PATRIMONIOS AUTONOMOS CCD <GCPA_CCD@findeter.gov.co>
Subject: Re: Comité Técnico No. 19 SUBCUENTA MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS. C.I. 2488 DE 2024

Buen día, teniendo en cuenta la solicitud del convenido y el concepto dado por Findeter,
Se emite voto favorable

Obtener Outlook para Mac

De: MANUELA VELEZ URBINA <MVELEZU@findeter.gov.co>
Fecha: viernes, 21 de noviembre de 2025, 14:34
Para: GERARDO ANDRES ALZATE ALZATE <GAALZATE@findeter.gov.co>, JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ <JEMERCADO@findeter.gov.co>, Merardo Rivera Mosquera <merardo.rivera@mininterior.gov.co>, Nohora Alicia Celis Cruz <nohora.celis@mininterior.gov.co>, JUAN CAMILO AGUILAR HERNANDEZ <JCAGUILAR@findeter.gov.co>, ANDREA ALEXANDRA BOHORQUEZ LOPEZ <AABOHORQUEZ@findeter.gov.co>, Edwin Ariel Ulloa Calvo <edwin.ulloa@mininterior.gov.co>, Carolina Mejia Lievano <carolina.mejia@mininterior.gov.co>
CC: PAULA FERNANDA CHIQUILLO LONDONO <pfchiquillo@findeter.gov.co>, ANA MARIA MORALES QUINTERO <AMMORALES@findeter.gov.co>, COMITÉS TECNICOS FINDTER <comitestecnicos.findeter@findeter.gov.co>, FEDERICO RAFAEL SEVERINI CAMPO <FRSEVERINI@findeter.gov.co>, ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA <IALEON@findeter.gov.co>, LAURA ALEJANDRA TOLOSA HURTADO <LATOLOSA@findeter.gov.co>, MARIA ANDREA ACEVEDO MANOSALVA <MACEVEDO@findeter.gov.co>, OMAR ANDRES PENALOZA PRADO <OAPENALOZA@findeter.gov.co>, SANTIAGO CASTILLO TORO <SCASTILL@findeter.gov.co>, SONIA MAGALY SANCHEZ CUEVAS <SMSANCHEZ@findeter.gov.co>, SANDRA MILENA VELASCO RUA <SMVELASC@findeter.gov.co>, LUISA FERNANDA MURCIA GUERRERO <LFMURCIA@findeter.gov.co>, CAMILO JOSE ALVAREZ BETIN <CJALVAREZ@findeter.gov.co>, ANDREA CAROLINA CABARCAS TAMARA <ACCABARC@findeter.gov.co>, ANA MARIA LEON VALENCIA <AMLEON@findeter.gov.co>, JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA <JISANCHE@findeter.gov.co>, ALBA LUCIA GARCIA SUAREZ <ALGARCIA@findeter.gov.co>, ADRIAN BUSTOS FORERO <ABUSTOS@findeter.gov.co>, JEIMMY KATHERINE PENAGOS GARCIA <JKPENAGOS@findeter.gov.co>, GRUPO COMITES PATRIMONIOS AUTONOMOS CCD <GCPA_CCD@findeter.gov.co>
Asunto: Comité Técnico No. 19 SUBCUENTA MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS. C.I. 2488 DE 2024

Cordial saludo,

Nos permitimos citar a comité técnico No. 19 SUBCUENTA MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2488 DE 2024 CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 DE 2023, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Solicitud: Aprobar la prórroga por el término de un (01) mes y quince (15) días y balance de mayores y menores cantidades del Convenio Solidario No. 029-PAF-ATMININTERIOR-CS-141-2025 cuyo objeto es “CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO Y CULTURAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LA CASA DEL PENSAMIENTO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE YARAMAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” debido a malas condiciones climáticas, al hallazgo de restos óseos humanos que suspendieron ciertas actividades en tanto se realizaba el retiro de los mismos, a la realización de sepelios recurrentes, al mal estado del corredor vial principal de Ipiales a Yaramal, a bloqueos por parte de la comunidad debido al mal estado de la vía de acceso al resguardo de Yaramal y bloqueos en la vía Panamericana, lo cual dificulta la entrada de material y el transporte de estos a la zona del proyecto.
3. Proposiciones y varios

Cordialmente,

Manuela Vélez Urbina
Profesional
Jefatura de Contratación Derivada
PBX: (601) 623 0311 – 623 0388
Correo institucional: mvelezu@findeter.gov.co
www.findeter.gov.co

Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada o clasificada que interesa únicamente a su destinatario. Si llegó a usted por error, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar de tal hecho al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Las opiniones contenidas en este mensaje o sus archivos no necesariamente coinciden con el criterio institucional de FINDETER. En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, se le informa que los datos personales que sean suministrados por este medio serán tratados de acuerdo con nuestra Política de Protección de Datos Personales que puede consultar en la página web www.findeter.gov.co. En cumplimiento a la Ley 1328 de 2009 se le informa que los procedimientos, responsables designados y canales establecidos para ejercer sus derechos como Consumidor Financiero pueden ser consultados en el siguiente enlace https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al-consumidor-financiero-sac

This message and its attachments may contain reserved or classified information that is of interest only to its recipient. If it reached you by mistake, you must completely delete it from your system, notify the sender of this fact and refrain in any case from divulging, reproducing or using it. The opinions contained in this message or its files do not necessarily coincide with the institutional criteria of FINDETER. In compliance with Law 1581 of 2012, you are informed that the personal data provided by this means will be treated in accordance with our Personal Data Protection Policy that can be consulted on the website www.findeter.gov.co. In compliance with Law 1328 of 2009 you are informed that the procedures, designated managers and channels established to exercise your rights as a Financial Consumer can be consulted at the following link https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al - consumer-financial-sac

Asunto: Re: COMITÉ FIDUCIARIO VIRTUAL No. 14 - PA ALIADOS FINDETER SUBCUENTA 3355 MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS

Fecha: miércoles, 5 de noviembre de 2025, 16:58:32 hora estándar de Colombia

De: Nohora Alicia Celis Cruz

A: Patrimonios Autónomos Findeter, Merardo Rivera Mosquera, Leonardo Fabian Hernandez Jaramillo, MGUTIERREZ@findeter.gov.co, MPMARTINEZ@findeter.gov.co, IARAMIREZ@findeter.gov.co, EEFRANCO@findeter.gov.co, SANDRA XIMENA HERRERA MONGE, VSANGREGORIO@findeter.gov.co, ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA, mfcifuentes@findeter.gov.co, ANGELICA MARIA GOMEZ COGOLLO, cjalvarez@findeter.gov.co, JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA, latolosa@findeter.gov.co, MANUELA VELEZ URBINA, ANA MARIA LEON VALENCIA, PATRICIA EUGENIA PATIÑO MALDONADO, SMSANCHEZ@findeter.gov.co, Yaneth Santamaria Delgado, Diana Valentina Martinez Rodriguez, Jose Miguel Ruiz Ramos, CESAR EMILIO LEON GALLARDO, Omaira Rodriguez Mahecha, JLGIRALDO@findeter.gov.co, Edwin Ariel Ulloa Calvo

Cordial saludo

En mi calidad de delegada de la DAIRM se emite voto favorable.

Obtener Outlook para Android

From: Patrimonios Autónomos Findeter <patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co>
Sent: Wednesday, November 5, 2025 4:34:34 PM
To: Merardo Rivera Mosquera <merardo.rivera@mininterior.gov.co>; Leonardo Fabian Hernandez Jaramillo <leonardo.hernandez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; MGUTIERREZ@findeter.gov.co <MGUTIERREZ@findeter.gov.co>; MPMARTINEZ@findeter.gov.co <MPMARTINEZ@findeter.gov.co>; IARAMIREZ@findeter.gov.co <IARAMIREZ@findeter.gov.co>; EEFRANCO@findeter.gov.co <EEFRANCO@findeter.gov.co>; SANDRA XIMENA HERRERA MONGE <sxherrera@findeter.gov.co>; VSANGREGORIO@findeter.gov.co <VSANGREGORIO@findeter.gov.co>; ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA <ialeon@findeter.gov.co>; mfcifuentes@findeter.gov.co <MFCIFUENTES@findeter.gov.co>; ANGELICA MARIA GOMEZ COGOLLO <agomezc@findeter.gov.co>; cjalvarez@findeter.gov.co <CJALVAREZ@findeter.gov.co>; JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA <JISANCHE@findeter.gov.co>; latolosa@findeter.gov.co <LATOLOSA@findeter.gov.co>; MANUELA VELEZ URBINA <MVELEZU@findeter.gov.co>; ANA MARIA LEON VALENCIA <AMLEON@findeter.gov.co>; PATRICIA EUGENIA PATIÑO MALDONADO <PEPATINO@findeter.gov.co>; SMSANCHEZ@findeter.gov.co <SMSANCHEZ@findeter.gov.co>; Yaneth Santamaria Delgado <yaneth.santamaria@fiduagraria.gov.co>; Diana Valentina Martinez Rodriguez <dimartinez@fiduagraria.gov.co>; Jose Miguel Ruiz Ramos <jose.ruiz@mininterior.gov.co>; CESAR EMILIO LEON GALLARDO <celeon@findeter.gov.co>; Omaira Rodriguez Mahecha <omaira.rodriguez@mininterior.gov.co>; JLGIRALDO@findeter.gov.co <JLGIRALDO@findeter.gov.co>; Edwin Ariel Ulloa Calvo <edwin.ulloa@mininterior.gov.co>; Nohora Alicia Celis Cruz <nohora.celis@mininterior.gov.co>
Subject: COMITÉ FIDUCIARIO VIRTUAL No. 14 - PA ALIADOS FINDETER SUBCUENTA 3355 MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS
When: martes, 4 de noviembre de 2025, 11:00 a. m. a miércoles, 5 de noviembre de 2025, 6:00 p. m..
Where:

Cordial Saludo,

Se convoca a Comité Fiduciario virtual No. 14 del P.A. ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - **SUBCUENTA 3355 MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS**, el cual tiene por objeto:

AGENDA

1. Verificación del quorum

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General (E) IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE Voto por correo electrónico
Directora de Asuntos Fiduciarios MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ Voto por correo electrónico
Vicepresidenta Técnica MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN Voto por correo electrónico

PRINCIPAL MINISTERIO DEL INTERIOR
DAIRM Director(a) o Su delegado NOHORA ALICIA CELIS CRUZ Voto por correo electrónico
Viceministerio del dialogo o su delegado MERARDO RIVERA Voto por correo electrónico
Funcionario o Contratista de la DAIRM EDWIN ARIEL ULLOA CALVO Voto por correo electrónico

2. Solicitud: Suspensión por el término de un (01) mes del Convenio Solidario No. 037-PAF-ATMININTERIOR-CS-147-2025

3. Proposiciones y varios

Enlace: COMITE FIDUCIARIO

Día: 04-11-2025 a 05-11-2025
Hora: 11:00 a.m. a 06:00 p.m.

Cordial Saludo,

YANETH SANTAMARIA DELGADO
Jefe Administración de Negocios
Vicepresidencia de Administración
de Negocios y Operaciones
patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co
Tel: (57) 6015802080 Ext: 9133
Calle 16 No 6 - 66 Piso 29 Btá- Col
www.fiduagraria.gov.co

Asunto: RE: COMITÉ FIDUCIARIO VIRTUAL No. 16 - PA ALIADOS FINDETER SUBCUENTA 3355 MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS

Fecha: martes, 25 de noviembre de 2025, 20:53:56 hora estándar de Colombia

De: Nohora Alicia Celis Cruz

A: Edwin Ariel Ulloa Calvo, Patrimonios Autónomos Findeter, Merardo Rivera Mosquera, Leonardo Fabian Hernandez Jaramillo, MGUTIERREZ@findeter.gov.co, CARLOS ALBERTO SAAD LLINAS, MPMARTINEZ@findeter.gov.co, IARAMIREZ@findeter.gov.co, EEFRANCO@findeter.gov.co, SANDRA XIMENA HERRERA MONGE, VSANGREGORIO@findeter.gov.co, ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA, mfcifuentes@findeter.gov.co, ANGELICA MARIA GOMEZ COGOLLO, cjalvarez@findeter.gov.co, JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA, latolosa@findeter.gov.co, MANUELA VELEZ URBINA, ANA MARIA LEON VALENCIA, PATRICIA EUGENIA PATIÑO MALDONADO, SMSANCHEZ@findeter.gov.co, Yaneth Santamaria Delgado, Diana Valentina Martinez Rodriguez, Jose Miguel Ruiz Ramos, CESAR EMILIO LEON GALLARDO, Omaira Rodriguez Mahecha, JLGIRALDO@findeter.gov.co, Carlos Alfredo Cristancho Lopez

Datos adjuntos: image.png, Outlook-gxdryhud.png

cordial saludo

en mi condición de delegada de la DAIRM, emito voto favorable

Interior

Ing. NOHORA ALICIA CELIS CRUZ
Profesional Especializado
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías/Ministerio del Interior
Teléfono: +57 601 242 74 00
Dirección: Carrera 8 No. 12 B – 31. Bogotá, D.C
Nohora.celis@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

De: Edwin Ariel Ulloa Calvo <edwin.ulloa@mininterior.gov.co>
Enviado: martes, 25 de noviembre de 2025 16:40
Para: Patrimonios Autónomos Findeter <patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co>; Merardo Rivera Mosquera <merardo.rivera@mininterior.gov.co>; Leonardo Fabian Hernandez Jaramillo <leonardo.hernandez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; MGUTIERREZ@findeter.gov.co <MGUTIERREZ@findeter.gov.co>; CARLOS ALBERTO SAAD LLINAS <casaad@findeter.gov.co>; MPMARTINEZ@findeter.gov.co <MPMARTINEZ@findeter.gov.co>; IARAMIREZ@findeter.gov.co <IARAMIREZ@findeter.gov.co>; EEFRANCO@findeter.gov.co <EEFRANCO@findeter.gov.co>; SANDRA XIMENA HERRERA MONGE <sxherrera@findeter.gov.co>; VSANGREGORIO@findeter.gov.co <VSANGREGORIO@findeter.gov.co>; ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA <ialeon@findeter.gov.co>; mfcifuentes@findeter.gov.co <MFCIFUENTES@findeter.gov.co>; ANGELICA MARIA GOMEZ COGOLLO <agomezc@findeter.gov.co>; cjalvarez@findeter.gov.co <CJALVAREZ@findeter.gov.co>; JOELLY IAN

SANCHEZ BARRERA <JISANCHE@findeter.gov.co>; latolosa@findeter.gov.co <LATOLOSA@findeter.gov.co>; MANUELA VELEZ URBINA <MVELEZU@findeter.gov.co>; ANA MARIA LEON VALENCIA <AMLEON@findeter.gov.co>; PATRICIA EUGENIA PATIÑO MALDONADO <PEPATINO@findeter.gov.co>; SMSANCHEZ@findeter.gov.co <SMSANCHEZ@findeter.gov.co>; Yaneth Santamaria Delgado <yaneth.santamaria@fiduagraria.gov.co>; Diana Valentina Martinez Rodriguez <dimartinez@fiduagraria.gov.co>; Jose Miguel Ruiz Ramos <jose.ruiz@mininterior.gov.co>; CESAR EMILIO LEON GALLARDO <celeon@findeter.gov.co>; Omaira Rodriguez Mahecha <omaira.rodriguez@mininterior.gov.co>; JLGIRALDO@findeter.gov.co <JLGIRALDO@findeter.gov.co>; Nohora Alicia Celis Cruz <nohora.celis@mininterior.gov.co>; Carlos Alfredo Cristancho Lopez <clcristancho@fiduagraria.gov.co>
Asunto: Re: COMITÉ FIDUCIARIO VIRTUAL No. 16 - PA ALIADOS FINDETER SUBCUENTA 3355 MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS

Buen día, teniendo en cuenta la solicitud del convenido y el concepto dado por Findeter, **Se emite voto favorable**

Obtener Outlook para Mac

De: Patrimonios Autónomos Findeter <patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co>
Fecha: martes, 25 de noviembre de 2025, 11:22
Para: Merardo Rivera Mosquera <merardo.rivera@mininterior.gov.co>, Leonardo Fabian Hernandez Jaramillo <leonardo.hernandez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>, MGUTIERREZ@findeter.gov.co <MGUTIERREZ@findeter.gov.co>, CARLOS ALBERTO SAAD LLINAS <casaad@findeter.gov.co>, MPMARTINEZ@findeter.gov.co <MPMARTINEZ@findeter.gov.co>, IARAMIREZ@findeter.gov.co <IARAMIREZ@findeter.gov.co>, EEFRANCO@findeter.gov.co <EEFRANCO@findeter.gov.co>, SANDRA XIMENA HERRERA MONGE <sxherrera@findeter.gov.co>, VSANGREGORIO@findeter.gov.co <VSANGREGORIO@findeter.gov.co>, ISMAEL ALBERTO LEON RUEDA <ialeon@findeter.gov.co>, mfcifuentes@findeter.gov.co <MFCIFUENTES@findeter.gov.co>, ANGELICA MARIA GOMEZ COGOLLO <agomezc@findeter.gov.co>, cjalvarez@findeter.gov.co <CJALVAREZ@findeter.gov.co>, JOELLY IAN SANCHEZ BARRERA <JISANCHE@findeter.gov.co>, latolosa@findeter.gov.co <LATOLOSA@findeter.gov.co>, MANUELA VELEZ URBINA <MVELEZU@findeter.gov.co>, ANA MARIA LEON VALENCIA <AMLEON@findeter.gov.co>, PATRICIA EUGENIA PATIÑO MALDONADO <PEPATINO@findeter.gov.co>, SMSANCHEZ@findeter.gov.co <SMSANCHEZ@findeter.gov.co>, Yaneth Santamaria Delgado <yaneth.santamaria@fiduagraria.gov.co>, Diana Valentina Martinez Rodriguez <dimartinez@fiduagraria.gov.co>, Jose Miguel Ruiz Ramos <jose.ruiz@mininterior.gov.co>, CESAR EMILIO LEON GALLARDO <celeon@findeter.gov.co>, Omaira Rodriguez Mahecha <omaira.rodriguez@mininterior.gov.co>, JLGIRALDO@findeter.gov.co <JLGIRALDO@findeter.gov.co>, Edwin Ariel Ulloa Calvo <edwin.ulloa@mininterior.gov.co>, Nohora Alicia Celis Cruz <nohora.celis@mininterior.gov.co>, Carlos Alfredo Cristancho Lopez <clcristancho@fiduagraria.gov.co>
Asunto: COMITÉ FIDUCIARIO VIRTUAL No. 16 - PA ALIADOS FINDETER SUBCUENTA 3355 MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS

Cordial Saludo,

Se convoca a Comité Fiduciario virtual No. 16 del P.A. ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - **SUBCUENTA 3355 MININTERIOR 2488 PASTOS Y QUILLASINGAS**, el cual tiene por objeto:

AGENDA

1. Verificación del quorum

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General (E) IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE Voto por TEAMS
Vicepresidente de Planeación CARLOS ALBERTO SAAD LLINAS Voto por TEAMS
Vicepresidenta Técnica MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN Voto por TEAMS

PRINCIPAL MINISTERIO DEL INTERIOR
DAIRM Director(a) o Su delegado NOHORA ALICIA CELIS CRUZ Voto por correo electrónico
Viceministerio del dialogo o su delegado MERARDO RIVERA Voto por correo electrónico
Funcionario o Contratista de la DAIRM EDWIN ARIEL ULLOA CALVO Voto por correo electrónico

2. Solicitud: Aprobar la prórroga por el término de un (01) mes y quince (15) días y balance de mayores y menores cantidades del Convenio Solidario No. 029-PAF-ATMININTERIOR-CS-141-2025 cuyo objeto es “CONVENIO SOLIDARIO PARA FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO Y CULTURAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LA CASA DEL PENSAMIENTO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE YARAMAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” debido a malas condiciones climáticas, al hallazgo de restos óseos humanos que suspendieron ciertas actividades en tanto se realizaba el retiro de los mismos, a la realización de sepelios recurrentes, al mal estado del corredor vial principal de Ipiales a Yarumal, a bloqueos por parte de la comunidad debido al mal estado de la vía de acceso al resguardo de Yarumal y bloqueos en la vía Panamericana, lo cual dificulta la entrada de material y el transporte de estos a la zona del proyecto.
3. Proposiciones y varios

Día: 25-11-2025
Hora: 11:00 a.m. a 06:00 p.m.

Soportes: COMITE FIDUCIARIO

Cordial Saludo,

YANETH SANTAMARIA DELGADO
Jefe Administración de Negocios
Vicepresidencia de Administración
de Negocios y Operaciones
patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co
Tel: (57) 6015802080 Ext: 9133
Calle 16 No 6 - 66 Piso 29 Btá- Col
www.fiduagraria.gov.co
