ANEXOS

Dirección: Calle 5 No. 3-25 San Vicente del Caguán-©, Calle 21 No. 9-81 Florencia – ©.
E- mail: ut.interventoria.sum.2025@gmail.com
Cel. 3132165462

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

INFORME No. 5

AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202500000556

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, MATERIALES Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, TÉCNICO, LOGÍSTICO Y COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" BPIN 202500000018040.

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

ALIS LICETH ARISTIZABAL GÓMEZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

FLORENCIA, DICIEMBRE 3 DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (EJECUTOR). 3
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUJETAS DE SEGUIMIENTO. 4
3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO 4
3.1. Contratación de personal. 4
3.2. Condiciones técnicas. 5
3.3. Cumplimiento de actividades. 12
4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO 16
4.1. Perfeccionamiento y requisitos para la ejecución, legalización y jurídica del contrato. 16
4.1.1. Garantías: 16
4.1.1.1. Cumplimiento 16
4.1.1.2. Responsabilidad Extracontractual 17
4.1.2. Planilla de Seguridad Social 18
4.1.3. Gestión jurídica 19
5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA. 19
6. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES. 21

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (EJECUTOR).

Tabla No. 1. Información contractual contrato de suministro 202500000556 del 16 de mayo de 2025.

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	202500000556 de 2025
CONTRATANTE	Gobernación del Caquetá
NIT	800.091.594-4
OPERADOR	GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S.
NIT	900.756.366-1
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, MATERIALES Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, TÉCNICO, LOGÍSTICO Y COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".
NUMERO DE CDP	2025040853 del 23 de abril de 2025
NUMERO DE RP	2025052235 del 23 de mayo de 2025
FECHA DE INICIO	08 de julio de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 de diciembre de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.889.917.334
PLAZO DE EJECUCIÓN	*Plazo de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES, contados a partir de la legalización del mismo y suscripción del acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato, sin superar el 30 de diciembre de 2025.*
PRORROGA 1	No aplica.
SUSPENSIÓN	No aplica.
INFORME DE SEGUIMIENTO	Informe No. 5.
% DE PAGO ANTICIPADO	Hasta del 30%
VALOR DE PAGO ANTICIPADO	$566.974.202,63
NOMBRE DEL INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME No. 5	Del 1 al 30 de Noviembre de 2025.

13

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUJETAS DE SEGUIMIENTO.

De acuerdo al cronograma establecido, se realiza una reunión entre el ejecutor *Grupo Empresarial Mundo Verde SAS*, la Entidad con la representación de la *Secretaria de Ambiente y Agricultura* quien funge como supervisor y la interventoría con la *Unión Temporal Interventoría Suministro Agropecuario 2025*, en aras de verificar el avance de acuerdo al cronograma establecido, el cual debió ser ajustado para discriminar las actividades establecidas, respecto al avance de la actividad 1.1.2, del proyecto que se identifica con el BPIN 202500000018040, el cual fue planeado así:

Tabla No. 2

Actividad	Meses					
	1	2	3	4	5	6
1.1.1 Realizar espacios de formación grupales socialización, caracterización de las asociaciones, revisión de documentos legales y firma de actas de compromisos (Producto principal del proyecto).						
1.1.2. Realizar asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores.						
1.1.3. Realizar la adquisición y entrega de mobiliario, equipos y logística para los mercados campesinos.						
1.1.4 Desarrollar estrategia de publicidad y marketing digital para la visualización de los productos agropecuarios que se comercializan en los mercados campesinos.						

Fuente: Documento técnico proyecto PIIP Mercados Campesinos.

De acuerdo, al análisis del cronograma se ha solicitado al ejecutor ir presentando en la medida de avance el cumplimiento de las actividades de acuerdo al cronograma establecido, como de hacer uso de las contingencias que sean necesarias en aras de dar cumplimiento en los tiempos planeados con la ejecución del contrato objeto de esta interventoría, de manera especial sobre la actividad mencionada.

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO

En cumplimiento del Contrato de suministro No. 202500000556 de 2025, se tiene que su lugar de ejecución será el Departamento de Caquetá, en nueve (09) municipios como es: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, El Doncello, El Paujil, Florencia, San José del Fragua, Solita y Valparaíso, donde se tienen las actividades de avance del 1 al 30 de Noviembre de 2025, de la siguiente manera:

3.1. Contratación de personal.

En cumplimiento al contrato de Suministro No. 202500000556 del 04 de junio de 2025, se mantiene la contratación del personal realizado por el ejecutor.

Los profesionales cumplen con las condiciones ofertadas en la propuesta y las condiciones técnicas del contrato de Suministro No. 202500000556 del 04 de junio de 2025.

3.2. Condiciones técnicas.

En el desarrollo del contrato de suministro No. 202500000556 del 04 de junio de 2025, se realizó la verificación de las condiciones técnicas de las actividades de visitas, formación, materiales y equipos, dirigidas por el equipo de ejecución, donde en cumplimiento de los términos técnicos se obtiene lo siguiente:

- Primera entrega de equipos y materiales.

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	**PROYECTO: " APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"** **Contrato de suministro 202500000556 del 16 de mayo de 2025.** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN**	MUNDO VERDE
VERSIÓN 2	FECHA 7-11-2025	PÁGINA 1

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE MATERIALES Y EQUIPOS

En el municipio de Florencia, departamento del Caquetá, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año 2025, se suscribe la presente Acta de Entrega y Recibido a Satisfacción entre el GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S A S , identificado con NIT 900 756 366-1, en calidad de Operador Local, contratista de la GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ para la ejecución del Contrato de Suministro No 202500000556, en el marco del proyecto "Apoyo del sector agropecuario a través del fortalecimiento a las iniciativas de comercialización de los mercados campesinos en el departamento del Caquetá"; y la ASOCIACION MERCADO CAMPESINO LA MANIGUA - ASOMANIGUA, en calidad de beneficiaria del proyecto

Con el fin de llevar a cabo la entrega del materiales y equipos, de conformidad con lo requerido por el beneficiario, así:

ITEM	ELEMENTOS	CANTIDAD
1	Carpa en Cercha 4 Aguas	4
2	Mesa Banquetera Plegable Tipo Portafolio.	4
3	Vitrina Refrigerada Frost – Una Puerta	2
4	Vitrina Refrigerada Exhibidora de Cristal	1
5	Silla Plástica con Brazos	19
6	Mesa Plastica Cuadrada	4
7	Mesón de Acero Inoxidable 1.50MT – MA-150X60X090	1
8	Estufa Industrial de Lujo – 2 Puestos Dobles (E2PD)	1
9	Planta Eléctrica Diesel 5.5 kW	1
10	Combo Cabina Activa Pro DJ PB12E-MP3	1
11	Báscula Eléctrica Tipo Gramera (Capacidad máxima 40 kg)	2
12	Báscula de Pesaje Eléctrica de Plataforma (Capacidad máxima 300 kg)	2
13	Báscula de Reloj en Acero Inoxidable (Capacidad máxima 50 kg)	2
14	Botiquín de Emergencia (Caja plástica con chapa de seguridad, tipo cruz roja)	1
15	Camilla de Emergencia con Inmovilizador y Cuello Filadelfia	1
16	Termo de Icopor – 70 Litros	4
17	Termo de Icopor – 100 Litros	4
18	Congelador Profundo de 200 Litros	2
19	Dispensador de Agua Fría y Caliente Eléctrico – 500W	1
20	Extintor ABC Multipropósito 20 lb	1
21	Gramera Digital – 5000g	2
22	Horno de Panadería en Acero Inoxidable – 3 Cámaras (con rodachines para fácil movilidad y 3 latas)	1

Las partes intervinientes dejan constancia de que los materiales y equipos descritos en la tabla precedente se entregan en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento, sin daños ni desperfectos

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

CAQUETA	**PROYECTO: " APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"** **Contrato de suministro 202500000556 del 16 de mayo de 2025.** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN**	MUNDO VERDE

VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
2	7-11-2025	2

aparentes, y que dichos bienes cumplen con las especificaciones tecnicas establecidas en el Contrato de Suministro No. 202500000556, suscrito el 16 de mayo de 2025.

Por su parte, la señora MIRIAM RUMIQUE ARANGO, declara haber recibido los materiales y equipos relacionados en el presente documento, en perfecto estado y en las cantidades y caracteristicas indicadas, comprometiéndose expresamente a:

1. Destinar los materiales y equipos entregados exclusivamente al cumplimiento de los fines especificos del Proyecto No. 202500000556, denominado "Apoyo del sector agropecuario a través del fortalecimiento a las iniciativas de comercialización de los mercados campesinos en el departamento del Caquetá", conforme a los lineamientos, normas y objetivos establecidos en el mismo.
2. Hacer uso adecuado y responsable de los materiales y equipos recibidos, garantizando su correcta utilización y conservación de acuerdo con las recomendaciones técnicas y los propósitos del proyecto.
3. Informar oportunamente a la entidad competente sobre cualquier eventualidad que afecte la correcta utilización o el desarrollo de las actividades asociadas al uso de los materiales y equipos entregados.

Observaciones _____

FIRMAN

JULIO GIOVANNY JURADO SANABRIA
Representante legal
Grupo Empresarial Mundo Verde S.A.S

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
Secretario Ambiental y de Agricultura Dptal
Supervisión Gobernación Del Caquetá

MIRIAN RUMIQUE ARANGO
Representante Legal
Asociacion Mercado Campesino la Manigua - ASOMANIGUA

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

En reunión amplia con todas las asociaciones y en cabeza del señor Gobernador del departamento del Caquetá, el Secretario Ambiental y de Agricultura y las Asociaciones de mercados campesinos sombrilla de cada uno de los municipios beneficiados, se realiza la entrega de todos los materiales y equipos, que fueron relacionados en el acta de entrega que se hace para el Municipio de Florencia, la asociación ASOMANIGUA.

Registro fotográfico: Entrega de equipos y materiales en la ciudad de Florencia.

Foto 1.



Foto 2.



Foto 3.



Dirección: Calle 5 No. 3-25 San Vicente del Caguán-©, Calle 21 No. 9-81 Florencia – ©.
E- mail: ut.interventoria.sum.2025@gmail.com
Cel. 3132165462

Foto 4.



Foto 5.



- Segunda entrega de equipos y materiales.

Se realizaron las entregas del materia publicitario donde se suscribió el Acta de Entrega y Recibido a Satisfacción entre el GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S., identificado con NIT 900.756.366-1, en calidad de Operador Local, contratista de la GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ para la ejecución del Contrato de Suministro No. 202500000556, en el marco del proyecto "Apoyo del sector agropecuario a través del fortalecimiento a las iniciativas de comercialización de los mercados campesinos en el departamento del Caquetá" así:

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

Acta de entrega y satisfacción de material publicitario.

GOBERNACIÓN CAQUETÁ	**PROYECTO: " APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" Contrato de suministro 202500000556 del 16 de mayo de 2025.**	MUNDO VERDE
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION	
	VERSIÓN 2 / FECHA 7-11-2025 / PÁGINA 1	

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE MATERIALES

En el municipio de Florencia, departamento del Caquetá, al primer (1) día del mes de diciembre del año 2025, se suscribe la presente Acta de Entrega y Recibido a Satisfacción entre el GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S., identificado con NIT 900.756.366-1, en calidad de Operador Local, contratista de la GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ para la ejecución del Contrato de Suministro No. 202500000556, en el marco del proyecto "Apoyo del sector agropecuario a través del fortalecimiento a las iniciativas de comercialización de los mercados campesinos en el departamento del Caquetá", y la ASOCIACIÓN MERCADO CAMPESINO LA MANIGUA - ASOMANIGUA, en calidad de beneficiaria del proyecto.

Con el fin de llevar a cabo la entrega de los materiales y equipos, de conformidad con lo requerido por el beneficiario, así:

ITEM	ELEMENTOS	CANTIDAD
1	Agenda Mini Semanal	16
2	Impresión de Brochure a Full Color con Carátula Plastificado	16
3	Gorra con Logos Institucionales	16
4	Pendon Publicitario Tipo Araña	4

Las partes intervinientes dejan constancia de que los materiales y equipos descritos en la tabla precedente se entregan en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento, sin daños ni desperfectos aparentes, y que dichos ítems cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de Suministro No. 202500000556, suscrito el 16 de mayo de 2025.

Por su parte, la señora MIRIAM RUMIQUE ARANGO, declara haber recibido los materiales y equipos relacionados en el presente documento, en perfecto estado y en las cantidades y características indicadas, comprometiéndose expresamente a:

1. Destinar los materiales y equipos entregados exclusivamente al cumplimiento de los fines específicos del Proyecto No. 202500000556, denominado "Apoyo del sector agropecuario a través del fortalecimiento a las iniciativas de comercialización de los mercados campesinos en el departamento del Caquetá", conforme a los lineamientos, normas y objetivos establecidos en el mismo.
2. Hacer uso adecuado y responsable de los materiales y equipos recibidos, garantizando su correcta utilización y conservación de acuerdo con las recomendaciones técnicas y los propósitos del proyecto.
3. Informar oportunamente a la entidad competente sobre cualquier eventualidad que afecte la correcta utilización o el desarrollo de las actividades asociadas al uso de los materiales y equipos entregados.

Observaciones _____

FIRMAN

JULIO GIOVANNY JURADO SANABRIA
Representante legal
Grupo Empresarial Mundo Verde S.A.S

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
Supervisor Gobernación Del Caquetá

MIRIAN RUMIQUE ARANGO
Representante Legal
Asociación Mercado Campesino la Manigua - ASOMANIGUA

Registro fotográfico: Entrega de material publicitario.



Foto 6.



Foto 7.



Foto 8.



Foto 9.

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

Entrega de pendones publicitarios a las 40 organizaciones de mercados campesino de los 09 municipios.



Foto 10.



Foto 11.



Foto 12.



Foto 13.

3.3. Cumplimiento de actividades.

En el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2025, se avanzaron con las actividades en el marco de cumplimiento del Contrato de Suministro No. 202500000556 de tal que se realizo de manera puntual las acciones, asi:

- Durante este periodo el ejecutor tuvo vinculado el personal para el desarrollo del contrato, quienes presentaban sus informes ante el Grupo Empresarial Mundo Verde SAS, quien los tenia contratado.
- Se verifica el espacio físico que se soporta en el contrato de arrendamiento de inmueble.
- Se tiene la disponibilidad del vehículo que se soporta en el contrato de alquiler de vehículo.
- Se hace revisión que se soporta en el registro fotográfico y actas de equipos y materiales del contrato objeto de esta interventoría.
- Se solicitó se actualizara el cronograma general del proyecto, teniendo en cuenta los tiempos de avance en formaciones, visitas de campo y de registro de campo INNOVA.
- Se realiza la entrega de los equipos, materiales, herramientas relacionadas en acta de entrega.
- Se realizo el cargue de la información en plataforma de campo INNOVA de los 40 beneficiarios de los nueve (09) municipios.
- Se adelantaron las capacitaciones en prácticas higiénicas y manipulación de alimentos a las asociaciones beneficiarias del proyecto.
- Se adelantaron las capacitaciones en manejo de enfermedades en hortalizas a las asociaciones beneficiarias del proyecto.
- Se adelantaron las capacitaciones en establecimiento y manejo de producciones traspatio a las asociaciones beneficiarias del proyecto.
- Se realizaron las formaciones en establecimiento y manejo de especies menores para las asociaciones beneficiarias del proyecto.

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

- Se realizaron las visitas de extensión agropecuaria a las asociaciones beneficiarias del proyecto.

- Se avanzó con el documento donde se recopila las estrategias para el fortalecimiento de la agricultura familiar comunitaria y los ciclos cortos de comercialización.

Registro Fotográfico:

Visita número 03, acompañamiento a la siembra de huertos caseros.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 14. Florencia: ASOAVIPROAGRO Cesar Augusto Montealegre</td><td>Foto 15. Florencia : ASFERA Nora Astudillo Lozada,</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 16. Florencia: DELICIAS DEL PARAISO Otilia Medina</td><td>Foto 17. Florencia : ASOMACAQ Daniel Córdoba Quiñonez</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 18. Solita: ASMERCASO - ASOPRODUCFOR Leidy Yohana Castro Beltrán</td><td>Foto 19. Solita: COMGASOL Oscar Castro Aguirre</td></tr>
</table>

Dirección: Calle 5 No. 3-25 San Vicente del Caguán-©, Calle 21 No. 9-81 Florencia – ©.
E- mail: ut.interventoria.sum.2025@gmail.com
Cel. 3132165462

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)
Visita número 04, acompañamiento a la elaboración de abonos orgánicos

CAQUETÁ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

	
Foto 20. Solita: ASMERCASO - ASOPRODUCFOR Leidy Yohana Castro Beltrán	Foto 21. Solita: COMGASOL Oscar Castro Aguirre
	
Foto 22. Solita: - ASMERCASO - Cesar Linares Moreno	Foto 23. Solita: BARACK OBAMA – ASMERCASO Sandra Milena Joven Musse
	
Foto 24. Valparaíso: AVIRESS Luz Mary Triana Rueda	Foto 25. Valparaíso: COMCAV Simeón Cortes Valencia

Dirección: Calle 5 No. 3-25 San Vicente del Caguán-©, Calle 21 No. 9-81 Florencia – ©.
E- mail: ut.interventoria.sum.2025@gmail.com
Cel. 3132165462

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)
Registro fotográfico:

FORMACIONES:	
	
Foto 26.	Foto 27.

Respecto a las capacitaciones, se tiene:

- Practicas higiénicas y manipulación de alimentos

Durante este lapso de tiempo se realizaron en seis (06) municipios del Departamento del Caquetá, el taller No. 6. Un total de 180 personas participantes.

- Manejo de enfermedades en hortalizas

Durante este lapso de tiempo se realizaron en los nueve (09) municipios del Departamento del Caquetá, el taller No. 4. Sin total de personas participantes.

- Establecimiento y manejo de producciones traspatio

Durante este lapso de tiempo se realizaron en los nueve (09) municipios del Departamento del Caquetá, el taller No. 3. Sin total de personas participantes.

- Formación en establecimiento y manejo de especies menores

Durante este lapso de tiempo se realizaron en los nueve (09) municipios del Departamento del Caquetá, el taller No. 5. Sin total de personas participantes.

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO

4.1. Perfeccionamiento y requisitos para la ejecución, legalización y jurídica del contrato.

En cumplimiento de la Cláusula Vigésima Cuarta.

4.1.1. Garantías:

Debidamente aprobadas, sin ningún tipo de riesgos en el avance de ejecución del contrato de suministros, con sus amparos vigentes.

4.1.1.1. Cumplimiento

Tabla No. 3

CHU-100048174 (Anexo 0) – Condición inicial.		
FECHA DE APROBACIÓN	08/07/2025	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	21/05/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
Pago anticipado	$ 566.975.200,20	16/05/2025 – 16/05/2026
Prestaciones Sociales	$ 94.495.866,70	16/05/2025 – 16/11/2028
Calidad de Servicio	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
Calidad de los elementos	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
CHU-100048174 (Anexo 1) - Condición inicial.		
FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	8/07/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
Pago anticipado	$ 566.975.200,20	16/05/2025 – 16/05/2026
Prestaciones Sociales	$ 94.495.866,70	16/05/2025 – 16/11/2028
Calidad de Servicio	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
Calidad de los elementos	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
CHU-100048174 (Anexo 2)		
FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	8/07/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 188.991.733,40	03/07/2025 – 03/07/2026
Pago anticipado	$ 566.975.200,20	03/07/2025 – 03/07/2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

Prestaciones Sociales	$ 94.495.866,70	03/07/2025 – 03/01/2029
Calidad de Servicio	$ 188.991.733,40	03/07/2025 – 03/07/2026
Calidad de los elementos	$ 188.991.733,40	03/07/2025 – 03/07/2026
CHU-100048174 (Anexo 3) - Condición final.		
FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	15/07/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 188.991.733,40	08/07/2025 – 08/07/2026
Pago anticipado	$ 566.975.200,20	08/07/2025 – 08/07/2026
Prestaciones Sociales	$ 94.495.866,70	08/07/2025 – 08/01/2029
Calidad de Servicio	$ 188.991.733,40	08/07/2025 – 08/07/2026
Calidad de los elementos	$ 188.991.733,40	08/07/2025 – 08/07/2026

Número de certificado: 533097128

4.1.1.2. Responsabilidad Extracontractual

Tabla No. 4

CHU-100008996 (Anexo 0) – Condición inicial.			
FECHA DE APROBACIÓN	08/07/2025		
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	21/05/2025	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial		
VALOR ASEGURADO	$ 284.700.000,00	**VIGENCIA**	16/05/2025 - 16/11/2025
CHU-100008996 (Anexo 1) – Condición inicial.			
FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025		
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	8/07/2025	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial		
VALOR ASEGURADO	$ 284.700.000,00	**VIGENCIA**	16/05/2025 - 16/11/2025
CHU-100008996 (Anexo 2)			
FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025		
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	8/07/2025	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial		
VALOR ASEGURADO	$ 284.700.000,00	**VIGENCIA**	03/07/2025 - 03/01/2026
CHU-100008996 (Anexo 3) – Condición final.			
FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025		
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	15/07/2025	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial		
VALOR ASEGURADO	$ 284.700.000,00	**VIGENCIA**	03/07/2025 - 08/01/2026

Número de certificado: 533097129

14

4.1.2. Planilla de Seguridad Social

Se anexa planilla de pago de seguridad social de la persona jurídica Grupo Empresarial Mundo verde S.A.S. No. 9494735512, correspondiente al mes de Noviembre de 2025; como los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensión y Riesgos Profesionales) de cada uno de los contratistas.

NOTA: Se anexa certificado conforme a lo dispuesto en al artículo 50 de la ley 789 de la ley 2002 dando cumplimiento emitiendo el paz y salvo de aportes a seguridad social y aportes a parafiscales.

Tabla No. 5. **MES DE NOVIEMBRE**

IBC	$1.423.500
SALUD	$57.000
PENSION	$227.800
CCF	$57.000
RIESGOS	$14.900
No. DE PLANILLA	9494735512

Tabla No. 6. Personal contratista para la ejecución del contrato:

NOMBRE	**MES DE NOVIEMBRE**	
	No. PLANILLA	**VALOR PAGADO**
Alejandro Geobanny Jurado Mejía	9495373593	$ 699.300
Robinson Almario Penagos	9494791409	$ 421.400
Sandra Tatiana Pérez Zambrano	8391747241	$ 508.600
Diana Carolina Lozano Torres	35124922	$ 638.400
Julio Giovanny Jurado Sanabria	8391747306	$ 600.800
Yohany Salazar Puentes	35575759	$ 601.400
Adriana Marcela Álvarez Vega	35328348	$ 572.100
Cristian Andrés Arango Rojas	81883046	$ 475.800
Cesar Augusto Ortiz Meneses	7994701619	$ 1.046.400
Daily Katherine Rodríguez Ocaña	8391747683	$ 413.300

4.1.3. Gestión jurídica

Durante la ejecución y con el informe No. 5 del contrato, se cumplió con las clausulas y se verifico el cumplimiento de las garantías del mismo. Es de anotar, que no se presentaron prorrogas y en término general no se presentaron anomalías durante su ejecución.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

El Contrato de suministro No. 202500000556 de 2025, presenta la siguiente gestión financiera, del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025, donde únicamente se ha efectuado el pago correspondiente al 30 % del valor total del contrato, equivalente a $566.975.200, asociado a la adquisición de materiales y equipos (compras), como también se ha ejecutado en este periodo lo concerniente a personal y administración, teniendo un avance financiero, así:

5.1. COMPOSICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Tabla No. 7

Componente	Descripción	Valor Ejecutado	% sobre el total	Observaciones
Compras Personal Administración	Adquisición de materiales, insumos y equipos. Honorarios profesionales, técnicos y administrativo. Arriendo, transporte, servicios públicos, internet, etc.	$57.534.467,00	3,04%	Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025.
Total		**$57.534.467,00**	3,04%	

5.2. PAGOS EN TRÁMITE (8 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE / 2025 PENDIENTES)

Tabla No. 10

Componente	Descripción	Valor Ejecutado	% sobre el total	Observaciones
Compras Personal Administración	Honorarios profesionales, técnicos y administrativo. Arriendo, transporte, servicios públicos, internet, etc.	$86.719.384,00	4,59%	Periodo del 8 de julio al 31 de octubre de 2025.
Compras Personal Administración	Adquisición de materiales, insumos y equipos. Honorarios profesionales, técnicos y administrativo. Arriendo, transporte, servicios públicos, internet, etc.	$ 986.914.369,00	52,22%	
Total		**$1.073.633.753,00**	56,81%	

5.3. BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO.

El avance de la gestión financiera de la presente ejecución, así:

Tabla No. 11

Valor inicial del contrato.	$1.889.917.334,00
(-) Valor Anticipo, hasta del (30%) pagado.	$566.974.202,63
Valor segundo pago (8 de julio al 30 de agosto de 2025, pendiente de pago).	$86.719.384
Valor tercer pago (1 de septiembre al 30 de octubre de 2025, pendiente de pago).	$986.914.369,00
Valor cuarto pago (1 al 30 de noviembre de 2025, pendiente de pago).	**$57.534.467,00**
Valor ejecución parcial del contrato.	$1.698.142.422,63
Saldo Pendiente:	$191.774.911,37

Por lo tanto, el valor de ejecución ascienda al valor con el pago anticipado de: **MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($1.698.142.422,63) M/CTE.**

En esa medida con la presentación de la factura electrónica de venta, con este informe No. 5 y el informe No. 3 y 4 y el informe No. 1 y 2, será el soporte parcial para el respectivo pago del contrato de suministro No. 202500000556 de 2025 a la fecha del 30 de noviembre de 2025.

6. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES.

El Contrato de suministro No. 202500000556 de 2025, con el informe No. 5, presenta la gestión financiera, del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025 en un 3,04%, por valor de $$57.534.467,00 y una ejecución física de cumplimiento en las actividades desarrolladas.

De otro lado respecto a las actividades 1, 2, 3 y 4 se avanzan de manera parcial en cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto que contribuyen en el cumplimiento del alcance, cronograma y presupuesto.

Se efectuaron visitas de extensión agropecuaria a los **40 beneficiarios**, generando diagnósticos prediales, identificación de prácticas productivas y recomendaciones técnicas personalizadas, lo que permite orientar las siguientes fases del acompañamiento.

Todas las actividades ejecutadas, incluidas capacitaciones, entregas y visitas técnicas, cuentan con registros fotográficos, listados de asistencia y soportes administrativos; sin embargo, se deberá continuar consolidando y organizando esta documentación para su inclusión en los informes finales y en el proceso de liquidación contractual.

El presente informe se soporta en los documentos entregados por parte del ejecutor, y que que reposan en la secretaria ambiental y de agricultura, así:

1. Informe de ejecución Mundo Verde (informe 5), en cuarenta (40) folios.
2. De documentación de listado de asistencia y registro fotográfico.
3. De documentación de visitas de extensión agropecuaria.
4. De documentación de entrega de materiales y equipos.
5. De documentación de visitas técnicas y formaciones.
6. De documentación de seguridad social.
7. Informe No. 5, al Contrato de Suministro No. 202500000556, por la interventoría, en veintidós (22) folios.

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

En términos generales, se realiza un control y seguimiento por parte de esta interventoría a las labores desarrolladas con eficiencia, para avanzar en las diferentes actividades, donde se soporta con las planillas de asistencia a las reuniones, registro fotográfico y certificación de aportes de seguridad social y parafiscales.

Sin otro particular,

ALIS LICETH ARISTIZABAL GÓMEZ
C.C. 1.112.775.272 de Cartago, Valle
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025.
N.I.T. No. 901.959.061-4

Vo.Bo.: Ing. Juan Pablo Jaramillo Murcia – Secretario Ambiental y de Agricultura / Supervisor.

Anexo: Lo enunciado.

Copia: Archivo del contrato de interventoria No. 202500000629 de 2025.

Dirección: Calle 5 No. 3-25 San Vicente del Caguán-©, Calle 21 No. 9-81 Florencia – ©.
E- mail: ut.interventoria.sum.2025@gmail.com
Cel. 3132165462

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

COPIA 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

I.UT.SA.25. No. 038

SECRETARIA DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL
FECHA 2025 DIC. 23
HORA 8:00 a.m.
Luz Daly R

Florencia, Caquetá. Diciembre 23 de 2025

Doctor
JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
Secretario Ambiental y de Agricultura
Supervisor del Contrato
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
Edificio de la Gobernación, piso 4.
Ciudad

Ref.: Presentación Informe final No. 6, del contrato de suministro No. 202500000556 de 2025, consistente en: "Suministro de insumos, equipos, materiales y ejecución de actividades de fortalecimiento organizacional, técnico, logistico y comercial, en el marco del proyecto denominado: "apoyo del sector agropecuario a través del fortalecimiento a las iniciativas de comercialización de los mercados campesinos en el Departamento del Caquetá"

Cordial saludo:

De manera atenta y respetuosa, me permito presentar informe final No. 6 del contrato de suministro No. 202500000556 de 2025, del periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025, consistente en: "Suministro de insumos, equipos, materiales y ejecución de actividades de fortalecimiento organizacional, técnico, logistico y comercial, en el marco del proyecto denominado: "apoyo del sector agropecuario a través del fortalecimiento a las iniciativas de comercialización de los mercados campesinos en el Departamento del Caquetá". Lo anterior, en aras de brindar el correcto seguimiento al proyecto con BPIN 202500000018040, ejecutado por la Gobernación del Caquetá, a través del Grupo Empresarial Mundo Verde S.A.S., NIT. No. 900.756.366-1.

Asi mismo se entregan anexos impresos, que reposan en la Secretaria Ambiental y de Agricultura Departamental, de la siguiente manera:

1. Informe de ejecución Mundo Verde (informe final 6), en treinta y un (31) folios.
2. De documentación de listado de asistencia y registro fotográfico.
3. De documentación de entrega de materiales.
4. De documentación de seguridad social.
5. Informe No. 6, al Contrato de Suministro No. 202500000556, por la interventoria, en dieciséis (16) folios.

Dirección: Calle 5 No. 3-25 San Vicente del Caguán-©, Calle 21 No. 9-81 Florencia – ©.
E- mail: ut.interventoria.sum.2025@gmail.com
Cel. 3132165462

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

... CONTINUACIÓN OFICIO No. I.UT.SA.25. No. 038...

Lo anterior, para que haga del expediente del contrato de suministro No. 202500000556 de 2025, que se conservará en la Secretaria de Ambiente y Agricultura Departamental.

Agradezco su atención.

Atentamente,

ALIS LICETH ARISTIZABAL GÓMEZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025.
N.I.T. No. 901.959.061-4

Anexo: Documentos de ítem 5, en dieciséis (16) folios.

Copia: Archivo del contrato de interventoria No. 202500000629 de 2025.

INFORME No. 6

AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202500000556

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, MATERIALES Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, TÉCNICO, LOGÍSTICO Y COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" BPIN 202500000018040.

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025.

ALIS LICETH ARISTIZABAL GÓMEZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

FLORENCIA, DICIEMBRE 23 DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (EJECUTOR). 3
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUJETAS DE SEGUIMIENTO. 4
3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO 4
3.1. Contratación de personal. 5
3.2. Condiciones técnicas. 5
3.3. Cumplimiento de actividades. 5
4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO 10
4.1. Perfeccionamiento y requisitos para la ejecución, legalización y jurídica del contrato. 10
4.1.1. Garantías: 10
4.1.1.1. Cumplimiento 10
4.1.1.2. Responsabilidad Extracontractual 11
4.1.2. Planilla de Seguridad Social 12
4.1.3. Gestión jurídica 13
5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA. 13
6. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES. 16

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (EJECUTOR).

Tabla No. 1. Información contractual contrato de suministro 202500000556 del 16 de mayo de 2025.

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	202500000556 de 2025
CONTRATANTE	Gobernación del Caquetá
NIT	800.091.594-4
OPERADOR	GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S.
NIT	900.756.366-1
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, MATERIALES Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, TÉCNICO, LOGÍSTICO Y COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".
NUMERO DE CDP	2025040853 del 23 de abril de 2025
NUMERO DE RP	2025052235 del 23 de mayo de 2025
FECHA DE INICIO	08 de julio de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 de diciembre de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.889.917.334
PLAZO DE EJECUCIÓN	*Plazo de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES, contados a partir de la legalización del mismo y suscripción del acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato, sin superar el 30 de diciembre de 2025.*
PRORROGA 1	No aplica.
SUSPENSIÓN	No aplica.
INFORME DE SEGUIMIENTO	Informe No. 6.
% DE PAGO ANTICIPADO	Hasta del 30%
VALOR DE PAGO ANTICIPADO	$566.974.205
NOMBRE DEL INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME No. 6	Del 1 al 30 de Diciembre de 2025.

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUJETAS DE SEGUIMIENTO.

De acuerdo al cronograma establecido, se realiza una reunión entre el ejecutor *Grupo Empresarial Mundo Verde SAS*, la Entidad con la representación de la *Secretaria de Ambiente y Agricultura* quien funge como supervisor y la interventoría con la *Unión Temporal Interventoría Suministro Agropecuario 2025*, en aras de verificar el avance de acuerdo al cronograma establecido, el cual debió ser ajustado para discriminar las actividades establecidas, respecto al avance de la actividad 1.1.4, del proyecto que se identifica con el BPIN 202500000018040, el cual fue planeado así:

Tabla No. 2

Actividad	Meses					
	1	2	3	4	5	6
1.1.1 Realizar espacios de formación grupales socialización, caracterización de las asociaciones, revisión de documentos legales y firma de actas de compromisos (Producto principal del proyecto).						
1.1.2. Realizar asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores.						
1.1.3. Realizar la adquisición y entrega de mobiliario, equipos y logística para los mercados campesinos.						
1.1.4 Desarrollar estrategia de publicidad y marketing digital para la visualización de los productos agropecuarios que se comercializan en los mercados campesinos.						

Fuente: Documento técnico proyecto PIIP Mercados Campesinos.

De acuerdo, al análisis del cronograma se ha solicitado al ejecutor presentar el avance final del cumplimiento de las actividades de acuerdo al cronograma establecido, como de hacer uso de las contingencias que sean necesarias en aras de dar cumplimiento en los tiempos planeados con la ejecución del contrato objeto de esta interventoría, de manera especial sobre la actividad mencionada.

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO

En cumplimiento del Contrato de suministro No. 202500000556 de 2025, se tiene que su lugar de ejecución es el Departamento de Caquetá, en nueve (09) municipios como es: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, El Doncello, El Paujil, Florencia, San José del Fragua, Solita y Valparaíso, donde se tienen las actividades de avance del 1 al 23 de Diciembre de 2025, de la siguiente manera:

3.1. Contratación de personal.

En cumplimiento al contrato de Suministro No. 202500000556 del 16 de mayo de 2025, se mantiene la contratación del personal realizado por el ejecutor, para la finalización de Contrato de Suministro.

Los profesionales cumplen con las condiciones ofertadas en la propuesta y las condiciones técnicas del contrato de Suministro No. 202500000556 del 16 de mayo de 2025.

3.2. Condiciones técnicas.

En el desarrollo del contrato de suministro No. 202500000556 del 16 de mayo de 2025, se realizó la verificación de las condiciones técnicas de las actividades de publicidad y marketing para la visualización de producto agropecuarios, como la relación del cumplimiento de los ítems dirigidos a los consumibles de refrigerios y almuerzos, donde en cumplimiento de los términos técnicos se realizó un control desagregado de la siguiente manera:

- Elaboración de Calendarios 2026.
- Filmación de video publicitarios.
- Elaboración de Flayer.
- Construcción de folletos informativos.
- Cuñas Radiales.
- Fortalecimiento en el manejo de Redes Sociales

Así mismo, se da la entrega del consumible de entrega de refrigerios y almuerzos.

3.3. Cumplimiento de actividades.

En el periodo comprendido del 1 al 23 de diciembre de 2025, se avanzaron con las actividades en el marco de cumplimiento del Contrato de Suministro No. 202500000556 de tal que se realizo de manera puntual las acciones, asi:

- Durante este periodo el ejecutor tuvo vinculado el personal para el desarrollo del contrato, quienes presentaban sus informes ante el Grupo Empresarial Mundo Verde SAS, quien los tenía contratado.

- Se verifica el espacio fisico que se soporta en el contrato de arrendamiento de inmueble.

- Se tiene la disponibilidad del vehículo que se soporta en el contrato de alquiler de vehículo.

- Se hace revisión que se soporta en el registro fotográfico y actas de equipos y materiales del contrato objeto de esta interventoría.

- Se realiza la entrega de ítems que soportan las actividades de publicidad y marketing.

- Se brindo fortalecimiento para el manejo de redes sociales, como estrategia de mejora de conexión, visibilidad y compromiso de una marca.

- Se creo la red digital para las asociaciones en Facebook, Instagram, cuenta de correo electrónico, YouTube.

- Se soporta todo lo relacionado con el ítem de almuerzos y refrigerios brindados en las capacitaciones en prácticas higiénicas y manipulación de alimentos, manejo de enfermedades en hortalizas, establecimiento y manejo de producciones traspatio, establecimiento y manejo de especies menores para las asociaciones beneficiarias del proyecto.

- Se construyó el documento donde se recopila las estrategias para el fortalecimiento de la agricultura familiar comunitaria y los ciclos cortos de comercialización.

Registro Fotográfico:



Imagen 01: Calendario ASOMANIGUA del municipio de Florencia.



Imagen 02: Video promocional del municipio de Puerto Rico.



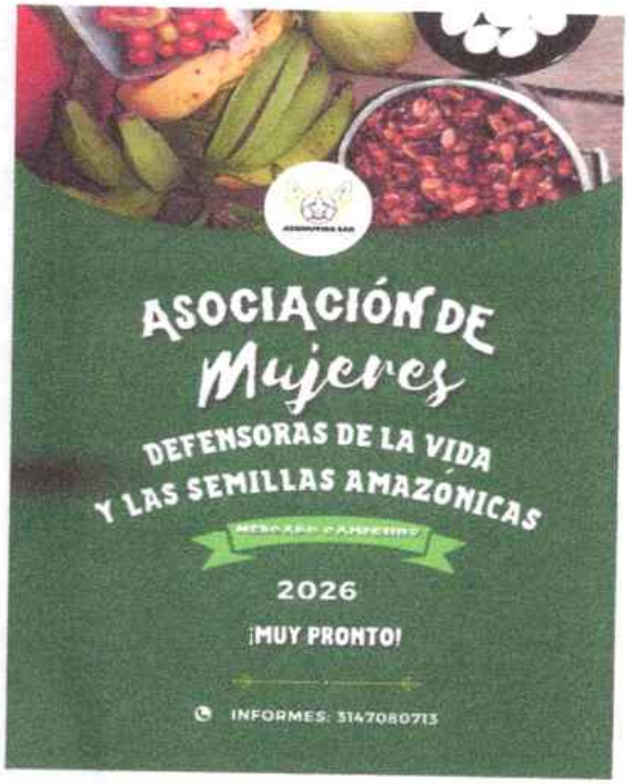


Imagen 03 y 04: Flayer de Mercados Campesinos del municipio de Paujil y Puerto Rico

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ





Imagen No. 05: Folleto informativo de ASOAVIPOAGRO del municipio de Florencia.



EMISORA COMUNITARIA 104.1 FM

LA EMISORA COMUNITARIA DE FLORENCIA 104.1 F.M. STEREO
NIT: 800.058.132-6

CERTIFICA QUE:

Se dio emisión de dos (02) cuñas diarias del Mercado Campesino en apoyo al sector agropecuario organizado por la gobernación del Caquetá y la Secretaría de Agricultura a realizarse el 28 de noviembre en la plazoleta de la gobernación del Caquetá.

Las cuñas se emitieron del 6 al 28 de noviembre de 2025 en 104.Noticias de mediodía de la Emisora 104.1 de Florencia.

MIGUEL ANGEL TOVAR
Director Emisora Comunitaria 104.1

Imagen No. 6: Certificado de emisión de dos cuñas radiales en la emisora 104.1 de la cuidad de Florencia.

Respecto a la entrega de refrigerios y almuerzos, se tiene:

Del item 45 y 46; se entregaron 1.121 refrigerios y 971 almuerzos dentro de las actividades de las capacitaciones en los meses de septiembre a noviembre en las cuales se relacionaron en cuadro del informe del ejecutor y se soporto en el anexo No. 6, como también con sus planillas y registro fotográfico, así:





Imagen 7 y 8: Registro fotográfico del refrigerios y almuerzo en capacitación del municipio de Cartagena del Chaira.

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO

4.1. Perfeccionamiento y requisitos para la ejecución, legalización y jurídica del contrato.

En cumplimiento de la Cláusula Vigésima Cuarta.

4.1.1. Garantías:

Debidamente aprobadas, sin ningún tipo de riesgos en el avance de ejecución del contrato de suministros, con sus amparos vigentes.

4.1.1.1. Cumplimiento

Tabla No. 3

CHU-100048174 (Anexo 0) – Condición inicial.		
FECHA DE APROBACIÓN	08/07/2025	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	FECHA DE EXPEDICIÓN	21/05/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial	
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
Pago anticipado	$ 566.975.200,20	16/05/2025 – 16/05/2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

Prestaciones Sociales	$ 94.495.866,70	16/05/2025 – 16/11/2028
Calidad de Servicio	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
Calidad de los elementos	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
CHU-100048174 (Anexo 1) - Condición inicial.		
FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	8/07/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
Pago anticipado	$ 566.975.200,20	16/05/2025 – 16/05/2026
Prestaciones Sociales	$ 94.495.866,70	16/05/2025 – 16/11/2028
Calidad de Servicio	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
Calidad de los elementos	$ 188.991.733,40	16/05/2025 – 16/05/2026
CHU-100048174 (Anexo 2)		
FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	8/07/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 188.991.733,40	03/07/2025 – 03/07/2026
Pago anticipado	$ 566.975.200,20	03/07/2025 – 03/07/2026
Prestaciones Sociales	$ 94.495.866,70	03/07/2025 – 03/01/2029
Calidad de Servicio	$ 188.991.733,40	03/07/2025 – 03/07/2026
Calidad de los elementos	$ 188.991.733,40	03/07/2025 – 03/07/2026
CHU-100048174 (Anexo 3) - Condición final.		
FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	15/07/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial	
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 188.991.733,40	08/07/2025 – 08/07/2026
Pago anticipado	$ 566.975.200,20	08/07/2025 – 08/07/2026
Prestaciones Sociales	$ 94.495.866,70	08/07/2025 – 08/01/2029
Calidad de Servicio	$ 188.991.733,40	08/07/2025 – 08/07/2026
Calidad de los elementos	$ 188.991.733,40	08/07/2025 – 08/07/2026

Número de certificado: 533097128

4.1.1.2. Responsabilidad Extracontractual

Tabla No. 4

CHU-100008996 (Anexo 0) – Condición inicial.			
FECHA DE APROBACIÓN	08/07/2025		
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	21/05/2025	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial		
VALOR ASEGURADO	$ 284.700.000,00	**VIGENCIA**	16/05/2025 - 16/11/2025
CHU-100008996 (Anexo 1) – Condición inicial.			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025		
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	8/07/2025	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial		
VALOR ASEGURADO	$ 284.700.000,00	**VIGENCIA**	16/05/2025 - 16/11/2025
CHU-100008996 (Anexo 2)			
FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025		
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	8/07/2025	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial		
VALOR ASEGURADO	$ 284.700.000,00	**VIGENCIA**	03/07/2025 - 03/01/2026
CHU-100008996 (Anexo 3) – Condición final.			
FECHA DE APROBACIÓN	16/07/2025		
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	15/07/2025	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial		
VALOR ASEGURADO	$ 284.700.000,00	**VIGENCIA**	03/07/2025 - 08/01/2026

Número de certificado: 533097129

4.1.2. Planilla de Seguridad Social

Se anexa planilla de pago de seguridad social de la persona jurídica Grupo Empresarial Mundo verde S.A.S. No. 9494735512, correspondiente al mes de Diciembre de 2025; como los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensión y Riesgos Profesionales) de cada uno de los contratistas.

NOTA: Se anexa certificado conforme a lo dispuesto en al artículo 50 de la ley 789 de la ley 2002 dando cumplimiento emitiendo el paz y salvo de aportes a seguridad social y aportes a parafiscales.

Tabla No. 5. **MES DE DICIEMBRE**

IBC	$1.423.500
SALUD	$57.000
PENSION	$227.800
CCF	$57.000
RIESGOS	$14.900
No. DE PLANILLA	9495979552

Tabla No. 6. Personal contratista para la ejecución del contrato:

NOMBRE	MES DE DICIEMBRE	
	No. PLANILLA	VALOR PAGADO
Alejandro Geobanny Jurado Mejía	9495957626	$ 699.300
Robinson Almario Penagos	9496355903	$ 421.400
Sandra Tatiana Pérez Zambrano	92047894	$ 508.600
Diana Carolina Lozano Torres	35591869	$ 638.400
Julio Giovanny Jurado Sanabria	92048075	$ 600.800
Yohany Salazar Puentes	35581206	$ 601.400
Adriana Marcela Álvarez Vega	35581668	$ 572.100
Cristian Andrés Arango Rojas	82324939	$ 475.800
Cesar Augusto Ortiz Meneses	7998941541	$ 1.046.400
Daily Katherine Rodríguez Ocaña	92048629	$ 413.300

4.1.3. Gestión jurídica

Durante la ejecución y con el informe final No. 6 del contrato, se cumplió con las clausulas y se verifico el cumplimiento de las garantías del mismo. Es de anotar, que no se presentaron prorrogas y en término general no se presentaron anomalías durante su ejecución.

5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA.

El Contrato de suministro No. 202500000556 de 2025, presenta la siguiente gestión financiera, del periodo del 1 al 23 de diciembre de 2025, donde únicamente se ha efectuado el pago correspondiente al 30 % del valor total del contrato, equivalente a $566.975.200, asociado a la adquisición de materiales y equipos (compras), como también se ha ejecutado en este periodo lo concerniente a personal y administración, teniendo un avance financiero, así:

16

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629
(25 DE JUNIO DE 2025)

CAQUETÁ

5.1. COMPOSICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Tabla No. 7. Ejecutado este periodo.

Componente	Descripción	Valor Ejecutado	% sobre el total	Observaciones
Compras Personal Administración	Adquisición de materiales y equipos. Honorarios profesionales, técnicos y administrativo. Arriendo, transporte, servicios públicos, internet, etc.	$191.774.911,37	10,15%	Periodo del 1 al 23 de diciembre de 2025.
Total		**$191.774.911,37**	10,15%	

5.2. PAGOS EN TRÁMITE (8 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE / 2025 PENDIENTES)

Tabla No. 8

Componente	Descripción	Valor Ejecutado	% sobre el total	Observaciones
Compras Personal Administración	Honorarios profesionales, técnicos y administrativo. Arriendo, transporte, servicios públicos, internet, etc.	$86.719.384,00	4,59%	Periodo del 8 de julio al 31 de octubre de 2025.
Compras Personal Administración	Adquisición de materiales, insumos y equipos. Honorarios profesionales, técnicos y administrativo. Arriendo, transporte, servicios públicos, internet, etc.	$ 986.914.369,00	52,22%	
Compras Personal	Adquisición de materiales, insumos y equipos. Honorarios profesionales,	$57.534.467,00	3,04%	Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025.

16

Administración	técnicos y administrativo. Arriendo, transporte, servicios públicos, internet, etc.			
Total		**$1.131.168.220,00**	59,85%	

5.3. BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO.

El avance de la gestión financiera de la presente ejecución, así:

Tabla No. 9

Valor inicial del contrato.	$1.889.917.334,00
(-) Valor Anticipo, hasta del (30%) pagado.	$566.974.205,00
Valor segundo pago (8 de julio al 30 de agosto de 2025, pendiente de pago).	$86.719.384,00
Valor tercer pago (1 de septiembre al 30 de octubre de 2025, pendiente de pago).	$986.914.369,00
Valor cuarto pago (1 al 30 de noviembre de 2025, pendiente de pago).	$57.534.467,00
Valor quinto pago final (1 al 23 de diciembre de 2025, pendiente de pago).	**$191.774.909,00**
Valor ejecución total del contrato.	$1.889.917.334,00
Saldo Pendiente:	$0,00

Por lo tanto, el valor de ejecución asciende al valor con el pago anticipado de: **MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.889.917.334,00) M/CTE.**

En esa medida con la presentación de la factura electrónica de venta, con este informe No. 6, será el soporte para el respectivo pago final del contrato de suministro No. 202500000556 de 2025 a la fecha del 23 de diciembre de 2025.

6. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES.

El Contrato de suministro No. 202500000556 de 2025, con el informe No. 6, presenta la gestión financiera, del periodo del 1 al 23 de diciembre de 2025 en un 10,15%, por valor de $191.774.909,00 y una ejecución física de cumplimiento en el 100% de las actividades desarrolladas.

De otro lado respecto a las actividades 1, 2, 3 y 4 se da cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto que contribuyen en el cumplimiento del alcance, cronograma y presupuesto.

Se efectuó el cumplimiento de fortalecimiento a los mercados campesinos de las 10 asociaciones establecidas en el proyecto, con 40 familias beneficiarias, para un total de 160 personas directas.

Todas las actividades ejecutadas, incluidas capacitaciones, entregas y visitas técnicas, cuentan con registros fotográficos, listados de asistencia y soportes administrativos; quedando el proceso de liquidación contractual.

El presente informe se soporta en los documentos entregados por parte del ejecutor, y que que reposan en la secretaria ambiental y de agricultura, así:

1. Informe de ejecución Mundo Verde (informe 6), en treinta y un (31) folios.
2. De documentación de listado de asistencia y registro fotográfico.
3. De documentación de entrega de materiales.
4. De documentación de seguridad social.
5. Informe No. 6, al Contrato de Suministro No. 202500000556, por la interventoría, en dieciséis (16) folios.

En términos generales, se realizó un control y seguimiento por parte de esta interventoria a las labores desarrolladas con eficiencia, para avanzar en las diferentes actividades, donde se soporta con las planillas de asistencia a las reuniones, registro fotográfico y certificación de aportes de seguridad social y parafiscales.

Sin otro particular,

ALIS LICETH ARISTIZABAL GÓMEZ
C.C. 1.112.775.272 de Cartago, Valle
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025.
N.I.T. No. 901.959.061-4

Vo.Bo: Ing. Juan Pablo Jaramillo Murcia – Secretario Ambiental y de Agricultura / Supervisor.

Anexo: Lo enunciado

Copia: Archivo del contrato de interventoria No. 202500000629 de 2025.
