**OTROSI No. 02 DE ADICIÓN EN RECURSOS Y PRORROGA EN PLAZO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2371 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2025.**

**CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS**

**NIT: 899999336-9**

**CONTRATISTA: MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO**

**NIT No. 800.103.161-2**

**REPRESENTANTE LEGAL: EDILBERTO SUAREZ PINTO**

**C.C No. 15.888.441**

**OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS Y LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS EMBARCADEROS FLUVIALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.**

**CONDICIONES ORIGINALES:**

**VALOR TOTAL: CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($115. 799.243,77).**

**APORTE GOBERNACIÓN: CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($105.272.038,45)**

**APORTE ALCALDÍA DE PUERTO NARIÑO: DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($10.527.205,32)**

**CONDICIONES ACTUALES**

**ADICIÓN PRESUPUESTAL**
**GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (39.325.652,57)**

**ADICIÓN PRESUPUESTAL**
**ALCALDÍA DE PUERTO NARIÑO: DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/TE. ($16.000.000)**

**VALOR TOTAL DEL**
**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2371 DE 2025: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/TE. ($171.124.896,34).**

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: NOVENTA Y UN (91) DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.**

**PLAZO ADICIONAL**
**OTROSI No 1: SESENTA (60) DIAS. A PARTIR DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL DE 2026**

**PLAZO ADICIONAL: SESENTA (60) DIAS A PARTIR DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO DE 2026**

---

**WILSON ELIZALDE MUR**, identificado con cédula de ciudadanía No.19.335.258, Secretario de Desarrollo Institucional actuando en nombre y representación de la GOBERNACIÓN DE AMAZONAS con NIT 899999336-9 , facultado a través del decreto 0017 del 10 de enero de 2025 quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y, el MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO con NIT: 800.103.161-2, representado legalmente por EDILBERTO SUAREZ PINTO con Cédula de Ciudadanía No 15.888.441, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** acordamos con observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y reglamentarias, celebrar el presente OTRO SI No 2 de adición de recursos y prórroga en plazo al convenio interadministrativo No 2371 del 1 de octubre de 2025, previa las siguientes consideraciones:

| **MODIFICACIÓN ACTUAL** | |
|---|---|
| **PRORROGA** | SESENTA (60) DÍAS contados a partir del tres (3) de abril de 2026 hasta el dos (2) de junio de 2026. |
| **ADICIÓN PRESUPUESTAL** | TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (39.325.652,57) |

Traslado de recursos para para priorizar la atención del sector transporte.

| PROYECTO | ACTIVIDAD PROGRAMADA | PROGRAMACIÓN FINANCIERA | AJUSTE ADICIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CODIGO RUBRO | DENOMINACIÓN RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASLADO DE RECURSOS PARA PRIORIZAR LA ATENCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. | Apoyo económico para la atención del sector de transporte fluvilal en el Municipio de Puerto Nariño. | $54.550.800.00 | $ 39.325.652,67 | $ 93.876.452,57 | 02-2.3.2.24.03.005-07 | Acceso Fluvial para la Vida. |

## INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

| | |
|---|---|
| **TIPO DE MODIFICACIÓN** | SE REQUIERE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN: **CLAUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN**. MODIFÍQUESE **LA CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN**: QUE DE AHORA EN ADELANTE QUEDARÁ ASÍ: PRORRÓGUESE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR SESENTA (60) DÍAS, DOS (2) MESES A PARTIR DEL TRES (3) DE ABRIL DE 2026 HASTA EL DOS (2) DE JUNIO DE 2026. **CLÁUSULA QUINTA**: **FORMA DE APORTES: LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS ADICIONARÁ AL CONVENIO EL VALOR DE TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (39.325.652,57) CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN**: EL PRESENTE OTRO SI AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SE PERFECCIONA CON LA FIRMA DE LAS PARTES. **CLAUSULA TERCERA:** LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO MODIFICADAS POR ESTE DOCUMENTO PERMANECERÁN VIGENTES E INDEMNES. |

## JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

### 1. FUNDAMENTOS DE LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA – PLAZO Y DE LA CLÁUSULA QUINTA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2371 DE 2025.

Que en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2371 del 1 de octubre de 2025; se suscribió Contrato No. 0479 del 27 de noviembre de 2025, entre el Municipio de Puerto Nariño y Distribuidora Amazonas la cual en su ejecución presenta modificación en prórroga de plazo.

Que el Contrato No. 0479 del 27 de noviembre de 2025; derivado del Convenio Interadministrativo No 2371 del 2025; fue suscrito entre el Municipio de Puerto Nariño; cuyo Representante Legal es Edilberto Suarez Pinto, alcalde de Puerto Nariño y el Contratista: “Distribuidora Amazonas S.A.S, cuyo objeto es: *EL MEJORAMIENTO DE DOS* EMBARCADEROS FLUVIALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2371-2025 ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS Y LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO.

Que el Contrato No. 0479 de 2025, tiene un valor de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($115.796.583).

Que, En el marco del proyecto de Mejoramiento correctivo de dos embarcaderos fluviales, se realizó previamente un diagnóstico técnico con el fin de identificar las intervenciones necesarias para garantizar la operatividad y seguridad de las estructuras flotantes.

Que dicho diagnóstico se efectuó con las embarcaciones en condición de inmersión (en el agua), lo que impidió observar el deterioro real del fondo de los flotadores y solo al sacarlas a tierra se evidenció el daño estructural, lo cual permitió evaluar los componentes visibles y accesibles en ese momento.

Que con base en ese análisis se estructuró el presupuesto y el alcance de las actividades contempladas en el proyecto.

Que una vez iniciadas las actividades de mantenimiento correctivo y al proceder con el varado de las embarcaciones en tierra firme, condición técnica necesaria para realizar trabajos estructurales, se efectuó una inspección más detallada de los elementos que permanecían sumergidos.

Que esta revisión se evidenció que el fondo de los flotadores presenta un avanzado estado de deterioro, caracterizado por:

- Corrosión significativa en las láminas metálicas.
- Pérdida de espesor del material.
- Presencia de perforaciones y debilitamiento estructural en algunos sectores.

## 2. NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN ADICIONAL

Que las nuevas actividades identificadas resultan indispensables para cumplir adecuadamente el objeto del proyecto, toda vez que el estado actual de los flotadores compromete:

1. La estabilidad de las estructuras flotantes.
2. La seguridad de los usuarios.
3. La vida útil de los embarcaderos.

Por lo anterior, resulta técnicamente necesario realizar actividades adicionales, tales como:

- Reposición de láminas metálicas deterioradas en los flotadores
- Refuerzo estructural de los flotadores.
- Trabajos de soldadura especializada.
- Tratamiento anticorrosivo y pintura protectora.
- Aplicación de pintura protectora para ambientes fluviales

Estas actividades no estaban contempladas inicialmente en el presupuesto del proyecto, razón por la cual se requiere la adición de recursos para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.

## 3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA ADICIÓN

La adición de recursos encuentra sustento en los principios que rigen la contratación estatal en Colombia, particularmente los establecidos en la Ley 80 de 1993, los cuales orientan la gestión contractual hacia el cumplimiento de los fines del Estado y la adecuada prestación de los servicios públicos.

En este sentido, el principio de planeación exige que los proyectos se ejecuten conforme a las condiciones técnicas necesarias para cumplir su finalidad; sin embargo, durante la ejecución pueden presentarse situaciones no previsibles que requieren ajustes para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Así mismo, el principio de responsabilidad y economía obliga a la administración a adoptar las decisiones necesarias para evitar la pérdida de recursos públicos o la ejecución de obras que no cumplan adecuadamente su función.

Adicionalmente, conforme a lo previsto en la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales pueden realizar modificaciones a los contratos cuando estas resulten necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, siempre que se encuentren debidamente justificadas desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero.

En el presente caso, la adición de recursos se sustenta en condiciones técnicas sobrevinientes no detectadas durante el diagnóstico inicial, las cuales hacen necesario ampliar el alcance de las actividades para asegurar la funcionalidad y seguridad de los embarcaderos fluviales.

## 4. CONCLUSION.

De acuerdo con las condiciones técnicas evidenciadas durante la ejecución del proyecto y en cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública, se hace necesario y procedente realizar una adición de recursos, con el fin de ejecutar las actividades adicionales requeridas para garantizar la estabilidad estructural, seguridad y adecuada operación de los embarcaderos fluviales del municipio de Puerto Nariño.


La adición solicitada permitirá asegurar el cumplimiento del objeto del proyecto y la correcta inversión de los recursos públicos destinados al mejoramiento de la infraestructura fluvial del municipio.

Que como resultado de dicho análisis técnico se identificó la necesidad de efectuar ajustes de mayores y menores cantidades de obra, así como la incorporación de ítems no previstos (NP), indispensables para garantizar la estabilidad, funcionalidad, durabilidad y adecuado desempeño de las soluciones constructivas adoptadas en obra.

**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N.P.1 | PINTURA EPOXICA INTERNA Y EXTERNA DE CASCO DE BASE ANTICORROSIVA | M2 | 51.789,48 |
| N.P.2 | PINTURA EPOXICA PARA BARANDAS Y TUBERIAS ESTRUCTURA METALICA DESM. PROV | ML | 37.789,00 |
| N.P.3 | INSTALACION Y SOLDADURA DE TUBERIA DE ACERO DE Ø 3" COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL DE SOPORTE DE CUBIERTA | ML | 22.500,00 |
| N.P.4 | LAVADO Y DESENGRASE DE SUPERFICIES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS | M2 | 6.000,00 |
| N.P.5 | REPARACION DE CASCO METÁLICO MEDIANTE INSTALACION DE PLANCHAS DE REFUERZO SOLDADAS, INCLUYE PASADORES, BISAGRAS DE 1" 12 UNI. POR BALZA | M2 | 58.000,00 |
| N.P.6 | MANTENIMIENTO MALACATES Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS Y PIEZAS (POLEAS), INCLUYE 70ML DE CABLE TENSOR DE 3/8" POR BALZA | UND | 420.000,00 |
| N.P.7 | MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN CON COMPUESTO ELASTOMÉRICO TIPO NEOPRENO EN LAS ESCOTILLAS MAS TORNILLOS | UND | 50.000,00 |
| N.P.8 | PINTURA Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA INCLUYE MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE TENSORES | UND | 44.500,00 |
| N.P.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EXPANDIDA METÁLICA 1*2.50 EN RAMPA MEDIANTE SOLDADURA, INCLUYE ELREFUERZO EN ANGULO DE 1 1/2" * 3/16" CADA .30CM | M2 | 325.000,00 |

| CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA | | | | | | PRESENTES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS EMBARCADORES FLUVIALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". | | | | | | +/- | CANTIDADES ADICIONALES | VALOR | CANTIDADES A EJECUTAR | VALOR TOTAL A EJECUTAR |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | | | |
| 1. | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1 | RETIRO DE MUELLES A BORDA Y REUBICACION | M2 | 126.00 | 14.742.00 | $ 1.857.492.00 | + | 11.81 | 171.154.82 | 137.81 | $ 2.028.646.82 |
| 1.2 | SOLDADURA Y REPARACION DE TUBO 2" EN ACERO | ML | 9.24 | 41.500.00 | $ 383.737.20 | - | -9.24 | -383.737.20 | 0.00 | $ 0.00 |
| 1.3 | CORTE Y DESMONTE DE TUBO EN ACERO DE 2" | ML | 30.12 | 34.999.00 | $ 1.041.125.00 | + | 65.20 | 2.357.401.20 | 95.32 | $ 3.398.529.12 |
| 1.4 | LIJADO Y LIMPIEZA DE TUBOS METALICO | ML | 135.81 | 33.999.00 | $ 4.573.788.32 | + | 5.14 | 207.977.42 | 141.20 | $ 4.781.743.74 |
| | SUB - TOTAL | | | | $ 7.856.123.52 | | | $ 2.352.796.04 | | $ 10.208.919.48 |
| 1. | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.4 | LIJADO Y LIMPIEZA DE TUBOS METALICO | ML | 113.67 | 33.999.00 | $ 3.949.354.83 | - | -113.67 | -3.949.354.83 | 0.00 | $ 0.00 |
| 1.5 | RETIRO DE TUBERIA PROV. DE DESMONTE | ML | 51.00 | 34.851.00 | $ 1.777.401.00 | + | 26.72 | 1.035.771.72 | 50.72 | $ 2.813.172.72 |
| 1.6 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 126.00 | 4.464.00 | $ 564.864.00 | + | 11.81 | 52.759.24 | 137.81 | $ 617.043.24 |
| | SUB - TOTAL | | | | $ 6.191.769.84 | | | -2.791.553.72 | | $ 3.430.215.96 |
| 2. | PUENTE CENTRAL | | | | | | | | | |
| 2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 2" PARA BARANDA | ML | 30.12 | 145.851.00 | $ 4.457.305.20 | + | 65.20 | 10.180.504.20 | 95.32 | $ 14.647.811.92 |
| 2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 2" PARA PARALES | ML | 20.56 | 220.372.00 | $ 4.691.367.00 | - | -15.62 | -3.442.216.64 | 5.06 | $ 1.159.156.72 |
| 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO METALICO | UND | 4.00 | 54.375.00 | $ 219.512.00 | | | | 4.00 | $ 219.512.00 |
| | SUB - TOTAL | | | | $ 9.368.187.00 | | | 6.718.293.56 | | $ 16.026.480.64 |
| 3.00 | PASARELA | | | | | | | | | |
| 3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE ACERO A-36 TIPO ALFAJOR E=3/16" | M2 | 24.00 | 981.900.00 | $ 5.656.800.00 | - | -24.00 | -5.656.800.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 3.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 2x2x 3/16" | ML | 22.80 | 110.376.00 | $ 2.516.572.80 | - | -22.80 | -2.516.572.80 | 0.00 | $ 0.00 |
| 3.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TENSOR DE EN ACERO DE 1/2", Y ENGRASE PARA MALACATES | ML | 80.00 | 49.517.00 | $ 2.971.020.00 | - | -80.00 | -2.971.020.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 3.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALACATES (INCLUYE SOLDADURA Y ACCESORIOS) | UND | 2.00 | 1.286.687.00 | $ 2.553.374.00 | - | -2.00 | -2.533.374.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| | SUB - TOTAL | | | | $ 16.707.767.00 | | | -16.707.766.80 | | $ 0.00 |
| 4.00 | PINTURA EXTERIOR | | | | | | | | | |
| 4.1 | PINTURA PARA TUBERIAS DE BASE ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE COLOR, A TRES MANOS | ML | 246.72 | 37.756.00 | $ 9.386.550.05 | - | -246.72 | -9.386.550.05 | 0.00 | $ 0.00 |
| 4.2 | PINTURA PARA CASCO DE BASE ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE COLOR, A TRES MANOS | M2 | 196.55 | 51.759.45 | $ 10.179.444.00 | - | -196.55 | -10.179.443.77 | 0.00 | $ 0.00 |
| | SUB - TOTAL | | | | $ 19.570.324.05 | | | -19.570.323.82 | | $ 0.00 |
| 5.00 | CUBIERTA | | | | | | | | | |
| 5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 1/2x1/2x 1/8 | ML | 37.80 | 63.010.00 | $ 2.380.176.00 | - | -37.80 | -2.380.176.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 5.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TIPO ACESCO CALIBRE 26 de 0.60 | ML | 15.50 | 107.553.00 | $ 2.025.200.40 | + | | 0.00 | 15.50 | $ 2.025.200.40 |
| 5.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ARQUITECTONICA TIPO ACESCO CALIBRE 26 de 2.44mts x1.01 mts | M2 | 142.58 | 123.276.00 | $ 17.813.675.00 | + | 37.12 | 4.576.005.12 | 180.00 | $ 22.189.680.00 |
| | SUB - TOTAL | | | | $ 22.011.051.00 | | | 2.206.829.12 | | $ 24.217.880.40 |
| 6.00 | SISTEMA ELECTRICO | | | | | | | | | |
| 6.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE LED (SOLAR REFLECTOR 1000 LUMENES - EXTERIOR (5 REFLECTORES) | UND | 2.00 | 2.352.062.00 | $ 4.784.124.00 | + | | 0.00 | 2.00 | $ 4.784.124.00 |
| | SUB - TOTAL | | | | $ 4.784.124.00 | + | | 0.00 | | $ 4.784.124.00 |
| | N.P.S | | | | | | | | | |
| N.P.1 | PINTURA EPOXICA INTERNA Y EXTERNA DE CASCO DE BASE ANTICORROSIVA | M2 | | 51.759.45 | | + | 488.43 | 25.295.574.84 | 488.43 | $ 25.295.574.84 |
| N.P.2 | PINTURA EPOXICA PARA BARANDAS Y TUBERIAS ESTRUCTURA METALICA DESM. PROV. | ML | | 37.756.00 | | + | 343.16 | 12.957.673.24 | 343.16 | $ 12.957.673.24 |
| N.P.3 | INSTALACION Y SOLDADURA DE TUBERIA DE ACERO DE 2 3" COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL DE SOPORTE DE CUBIERTA | ML | | 22.500.00 | | + | 80.72 | 1.816.200.00 | 80.72 | $ 1.816.200.00 |

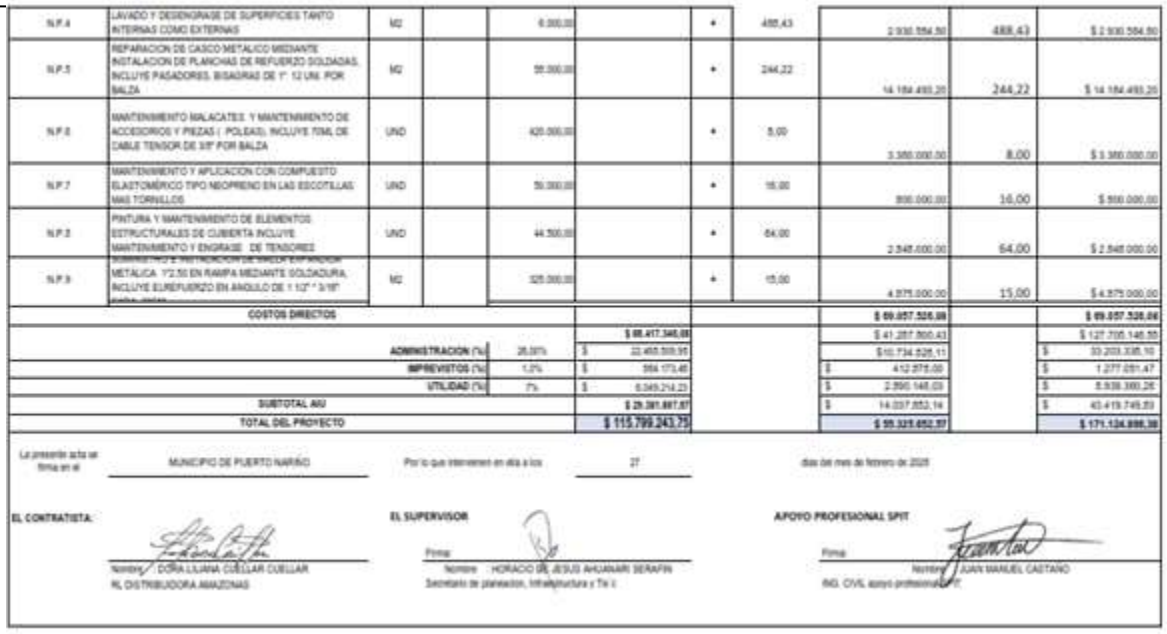

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.P.4 | LAVADO Y DESENGRASE DE SUPERFICIES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS | M2 | | 6.000,00 | | * | 488,43 | 2.930.584,80 | 488,43 | $ 2.930.584,80 |
| N.P.5 | REPARACION DE CASCO METALICO MEDIANTE INSTALACION DE PLANCHAS DE REFUERZO SOLDADAS, INCLUYE PASADORES, BISAGRAS DE 1". 12 UNI. POR BALZA | M2 | | 58.000,00 | | * | 244,22 | 14.164.493,20 | 244,22 | $ 14.164.493,20 |
| N.P.6 | MANTENIMIENTO MALACATES Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS Y PIEZAS ( POLEAS), INCLUYE 70ML DE CABLE TENSOR DE 3/8" POR BALZA | UND | | 420.000,00 | | * | 8,00 | 3.360.000,00 | 8,00 | $ 3.360.000,00 |
| N.P.7 | MANTENIMIENTO Y APLICACION CON COMPUESTO ELASTOMÉRICO TIPO NEOPRENO EN LAS ESCOTILLAS MAS TORNILLOS | UND | | 50.000,00 | | * | 16,00 | 800.000,00 | 16,00 | $ 800.000,00 |
| N.P.8 | PINTURA Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA INCLUYE MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE TENSORES | UND | | 44.500,00 | | * | 64,00 | 2.848.000,00 | 64,00 | $ 2.848.000,00 |
| N.P.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EXPANDIDA METALICA Y=2.50 EN RAMPA MEDIANTE SOLDADURA, INCLUYE EUREFUERZO EN ANGULO DE 1 1/2" * 3/16" | M2 | | 325.000,00 | | * | 15,00 | 4.875.000,00 | 15,00 | $ 4.875.000,00 |
| | **COSTOS DIRECTOS** | | | | $ 88.417.340,68 | | | $ 41.257.800,43 | | $ 127.705.140,55 |
| | **ADMINISTRACION (%)** | 25,00% | | | $ 22.465.509,95 | | | $ 10.734.528,11 | | $ 33.200.038,10 |
| | **IMPREVISTOS (%)** | 1,0% | | | $ 884.173,48 | | | $ 412.878,00 | | $ 1.277.051,47 |
| | **UTILIDAD (%)** | 7% | | | $ 6.249.214,23 | | | $ 2.890.146,03 | | $ 9.139.360,26 |
| | **SUBTOTAL AIU** | | | | $ 29.391.897,67 | | | $ 14.037.552,14 | | $ 43.419.749,83 |
| | **TOTAL DEL PROYECTO** | | | | $ 115.799.243,75 | | | $ 55.325.652,57 | | $ 171.124.890,38 |

La presente acta se firma en el MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO Por lo que intervienen en ella a los 27 días del mes de febrero de 2025

**EL CONTRATISTA:**
Nombre: DORA LILIANA CUELLAR CUELLAR
RL DISTRIBUIDORA AMAZONAS

**EL SUPERVISOR**
Firma:
Nombre: HORACIO DE JESUS AHUANARI SERAFIN
Secretario de planeación, Infraestructura y Tic´s

**APOYO PROFESIONAL SPIT**
Firma:
Nombre: JUAN MANUEL CAETANO
ING. CIVIL apoyo profesional SPIT

Que teniendo en cuenta la información y una vez revisada la solicitud hecha por el contratista del contrato de obra No 0479 de 2025, derivado del convenio interadministrativo y estudiado el aval por parte de la Alcaldía de Puerto Nariño 2025, la supervisión designada por la Gobernación del Amazonas, considera **viable la prórroga en plazo y adición de recursos.**

Dicho lo anterior, la supervisión solicita a la Oficina Jurídica la realización del OTROSÍ No. 02 de PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL al Convenio Interadministrativo No 2371 de 2025.

Es válido anotar que en el desarrollo del convenio interadministrativo No 2371 de 2025 no ha ocurrido ningún siniestro.

En este orden de ideas, se deben efectuar las siguientes modificaciones:

**CLAUSULA PRIMERA. MODIFIQUESE LA CLAUSULA CUARTA** denominada PLAZO DE EJECUCION del presente convenio, la cual quedará de la siguiente manera: Prorróguese el plazo de ejecución del convenio en DOS (2) MESES, en este orden de ideas el plazo de ejecución del mismo será de SIETE (7) MESES contados a partir del acta de inicio.

**CLAUSULA SEGUNDA.** ADICIONESE al valor inicial del convenio la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($55.325.652,57), del cual el aporte de la Gobernación del Amazonas es TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($39.325.652,57), mientras que el aporte de la Alcaldía de Puerto Nariño es de DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000). El aporte de la Gobernación del Amazonas se

encuentra respaldado por el CDP No. 2432 del 25 de marzo de 2026, por su parte el aporte de la Alcaldía de Puerto Nariño se encuentra respaldado por el CDP No. 000410 del 24 de marzo de 2026.

**CLAUSULA TERCERA.** De conformidad con la CLAUSULA anterior **MODIFIQUESE LA CLAUSULA QUINTA** denominada **FORMA DE APORTES**, la cual quedará de la siguiente manera: APORTE GOBERNACION DEL AMAZONAS: La Gobernación del Amazonas aportará la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DOS CENTAVOS ($144.597.691,02) M/cte. APORTE ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO: La Alcaldía de Puerto Nariño aportará la suma de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($26.527.205,32) M/Cte.

**PARÁGRAFO.** Una vez se suscriba el presente otrosi, la Alcaldía de Puerto Nariño se encuentra en la obligación de transferir su aporte de DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000) a la cuenta que a bien disponga la Gobernación del Amazonas.

**CLAUSULA CUARTA.** Que, con el fin de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del presupuesto, los efectos de la presente adición en el contrato de prestación de servicios será una vez se expida el respectivo Registro Presupuestal.

**CLAUSULA QUINTA.** El presente otro si modificatorio No. 2 se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma SECOP 2.

**CLAUSULA SEXTA.** Las demás cláusulas no modificadas permanecerán indemnes.

Hacen parte de la presente prórroga los documentos enunciados en los considerandos y los demás que durante el desarrollo del mismo se susciten.

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento y en constancia se firma en el municipio de Leticia, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2026.

**EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA.**

**Nota: La fecha de suscripción del presente documento se determinará de conformidad con la fecha y hora en la cual se realice la autenticación en el SECOP II por parte del contratista y el supervisor, es decir, las aprobaciones realizadas por los usuarios asignados constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.**
